**CONTENIDO DEL INFORME**

1. CONDICIONES DEL CONTRATO ..... 1
2. OBJETO DEL CONTRATO ..... 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ..... 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ..... 13
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. ..... 13
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ..... 14

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 18000982 H4 de 2018 de la vigencia 2018 |
| Nombre del Contratista: | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS |
| Periodo informe: | Del 27 de octubre al 5 de diciembre de 2018 |
| Nombre de Supervisor: | Álvaro Hernán Restrepo Guzmán |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | Grupo Administrativo y Financiero Regional Antioquia |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

**Contrato original**

**1 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**
**1,1. Desmonte, rocería y limpieza. 60,00 ML para un acumulado de 1.200 ML.**
**1,2. Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). 69.58 M3 para un acumulado de 202.18 M3**
**1,3. Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. 5.70 M3 para un acumulado de 72 M3**
**1,4. Cimiento concreto ciclopeo 11.40 M3 para un acumulado de 144 M3**
**1,5. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedetal concreto 3000 PSI. 18.36 M3 para un acumulado de 18.36 M3**
**1,6. Mortero 1:4. 700,00 ML para un acumulado de 1.200,00 M3**
**1,7. Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios. ML 0,00 No se ejecutá.**
**1,8. Desmonte de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas 60,00 ML para un acumulado de 1.200 ML.**
**OBRA EXTRA**

**OE 1 Suministro e instalación de Cerramiento en tela verde para protección de ganado contra predio vecino H:1.50 m GLB 1,00**


**OE 2 Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada C.10 sin recubrimiento de PVC. Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios. 280 ML para un acumulado de 1.200 ML.**


| ITEMS | DESCRIPCION | CONDICIONES MODIFICADAS | | | | EJECUTADO PARCIAL 1 | | EJECUTADO PARCIAL 2 | | EJECUTADO PARCIAL 3 | | EJECUTADO EN PERIODO | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VR. TOTAL | % AVANCE |
| 1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Desmonte, rocería y limpieza. | ML | 1.200,00 | $ 7.759,9 | $ 9.359.905,00 | 720,00 | 5.615.943,00 | 420,00 | 3.275.967,00 | 60,00 | 467.995,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1.200,00 | $ 9.359.905,00 | 100,00% |
| 1,2 | Excavacion manual: (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales). | M3 | 202,16 | $ 48.760,2 | $ 9.856.255,00 | 56,00 | 2.730.011,00 | 49,20 | 2.398.510,00 | 27,40 | 1.335.765,00 | 69,56 | $ 3.391.976,00 | 202,16 | $ 9.856.256,00 | 100,00% |
| 1,3 | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | M3 | 72,00 | $ 633.750,3 | $ 45.630.021,50 | 19,20 | 12.041.255,00 | 31,80 | 20.153.259,00 | 18,50 | 9.825.130,00 | 5,70 | $ 3.612.377,00 | 72,00 | $ 45.630.021,00 | 100,00% |
| 1,4 | Cimiento concreto ciclopeo | M3 | 144,00 | $ 380.249,7 | $ 54.755.957,00 | 56,00 | 21.293.963,20 | 49,20 | 18.708.285,50 | 27,40 | 10.418.842,00 | 11,40 | $ 4.334.847,00 | 144,00 | $ 54.755.957,00 | 100,00% |
| 1,5 | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | M3 | 18,36 | $ 731.249,3 | $ 13.425.737,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 18,36 | $ 13.425.737,00 | 18,36 | $ 13.425.737,00 | 100,00% |
| 1,6 | Mortero 1:4. | M2 | 1.200,00 | $ 9.750,3 | $ 11.700.354,00 | 0,00 | - | - | - | 500,00 | 4.875.148,00 | 700,00 | $ 6.825.207,00 | 1.200,00 | $ 11.700.354,00 | 100,00% |
| 1,7 | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios. | ML | 0,00 | $ 87.750,3 | $ 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 1,8 | Desmonte de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas | ML | 1.200,00 | $ 9.750,3 | $ 11.700.354,00 | 720,00 | 7.020.213,00 | 420,00 | 4.095.124,00 | - | - | 60,00 | $ 585.016,80 | 1.200,00 | $ 11.700.354,00 | 100,00% |
| | OBRA EXTRA | | | | | | - | - | - | - | - | 0,00 | | 0,00 | $ - | |
| OE 1 | Suministro e instalacion de Cerramiento en tela verde para protección de ganado contra predio vecino H:1.50 m | GLB | 1,00 | $ 2.519.954,6 | $ 2.519.954,00 | 1,00 | 2.519.954,00 | - | - | - | - | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.519.954,00 | 100,00% |
| OE 2 | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada C.10 sin recubrimiento de PVC. Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios. | ML | 1.200,00 | $ 85.650,5 | $ 102.780.400,00 | 0,00 | - | 500,00 | 42.825.187,00 | 420,00 | 35.973.140,00 | 280,00 | $ 23.982.095,00 | 1.200,00 | $ 102.780.400,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | 261.728.940,00 | | 51.221.360,00 | | 91.456.312,00 | | 62.894.010,00 | | 56.157.258,00 | | 261.728.940,00 | 100,00% |
| | Administración | | | 20% | 52.345.788,00 | 20% | 10.244.272,00 | 20% | 18.291.262,00 | 20% | 12.578.802,00 | 20% | 11.231.452,00 | 20% | 52.345.788,00 | 100,00% |
| | Imprevistos | | | 1% | 2.617.289,40 | 1% | 512.214,00 | 1% | 914.563,00 | 1% | 628.940,00 | 1% | 561.572,40 | 1% | 2.617.289,40 | 100,00% |
| | Utilidad | | | 5% | 13.086.447,00 | 5% | 2.561.068,00 | 5% | 4.572.815,00 | 5% | 3.144.701,00 | 5% | 2.807.862,00 | 5% | 13.086.447,00 | 100,00% |
| | I.V.A sobre utilidad | | | 19% | 2.486.425,00 | 19% | 486.603,00 | 19% | 868.836,00 | 19% | 597.493,00 | 19% | 533.494,00 | 19% | 2.486.425,00 | 100,00% |
| COSTO TOTAL | | | | | 332.264.889,40 | | 65.025.517,00 | | 116.103.788,00 | | 79.843.946,00 | | 71.291.635,40 | | 332.264.889,40 | 100,00% |


REGISTRO FOTOGRAFICO

1,1. Desmonte, rocería y limpieza


1,8. Desmonte de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas

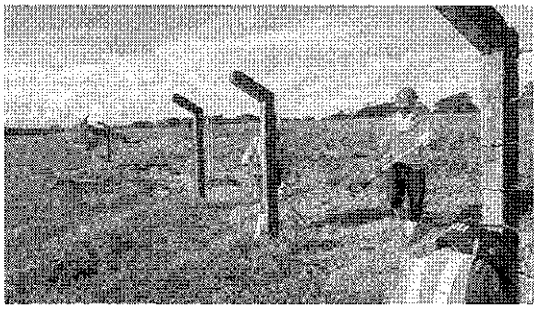

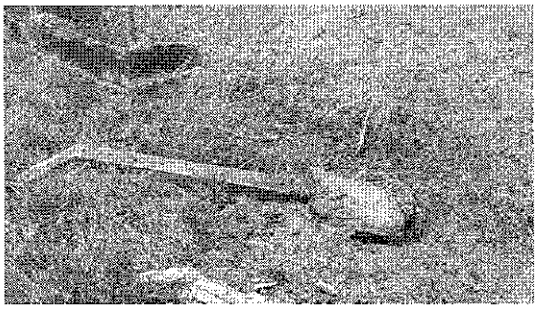

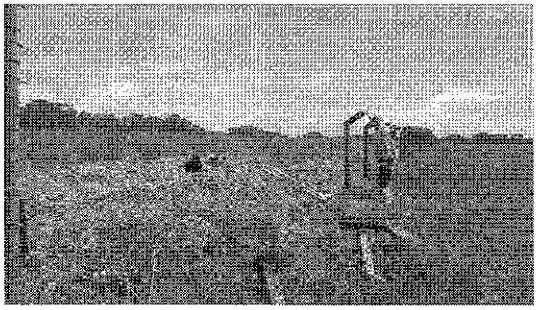




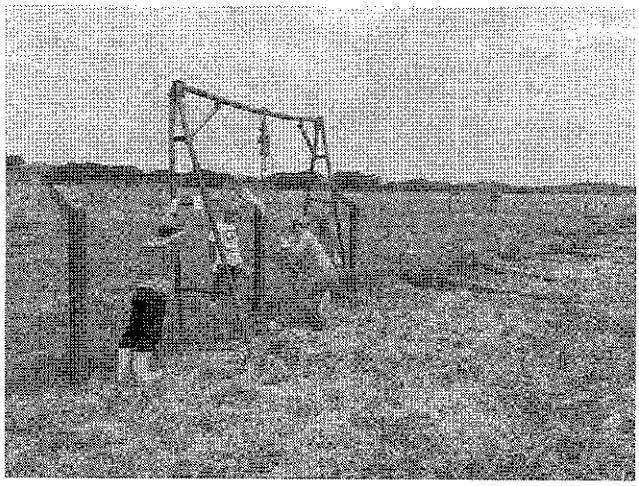

1,2. Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales).






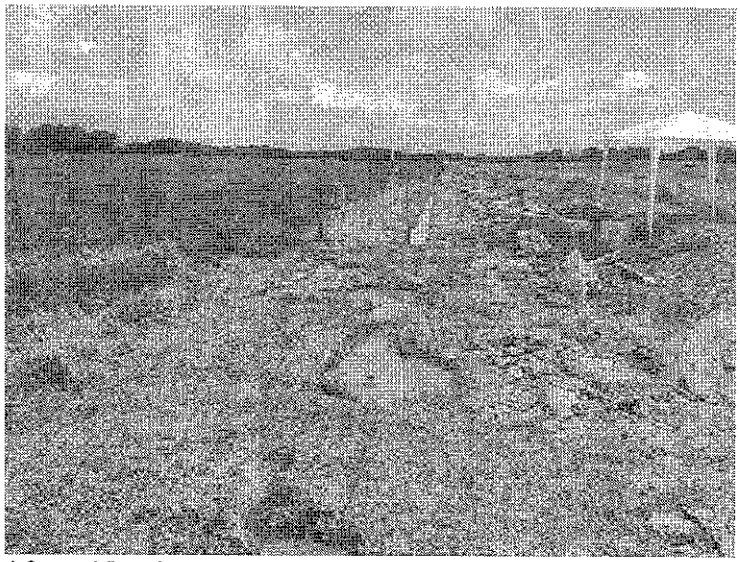


1,3. Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. M3 19,00


1,4. Cimiento concreto ciclópeo








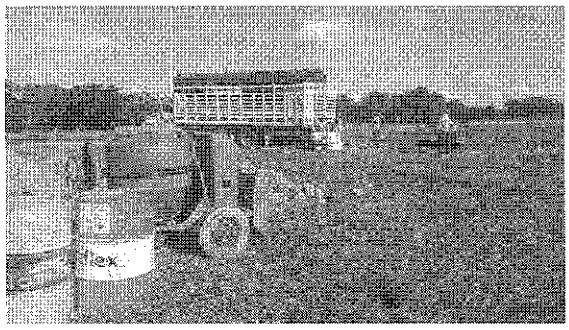




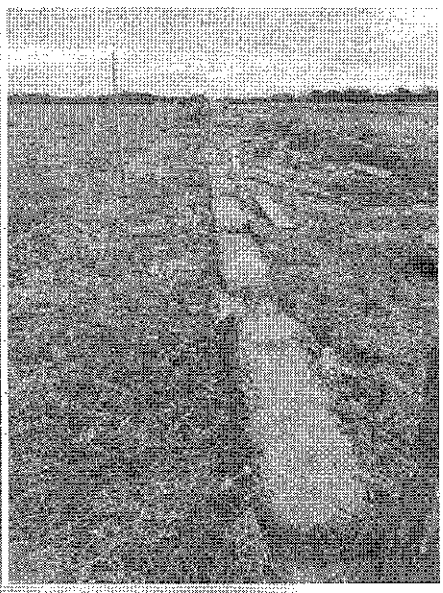


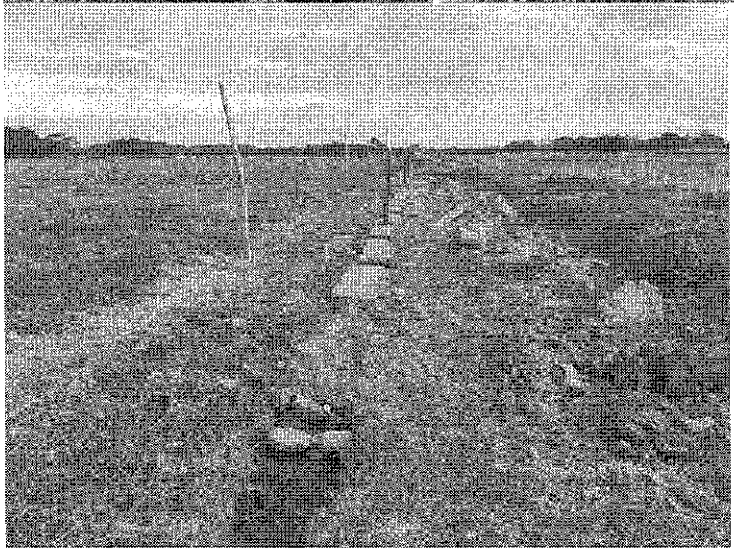



OE 1 Suministro e instalación de Cerramiento en tela verde para protección de ganado contra predio vecino H:1.50 m GLB 1,00
OE 2 Suministro e instalación tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Falta lo siguiente:
OE 2 Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada C.10 sin recubrimiento de PVC. Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.

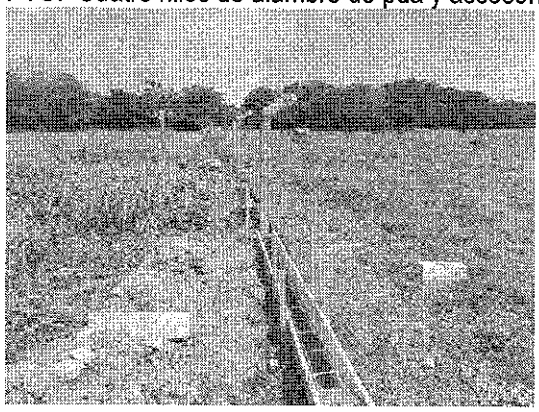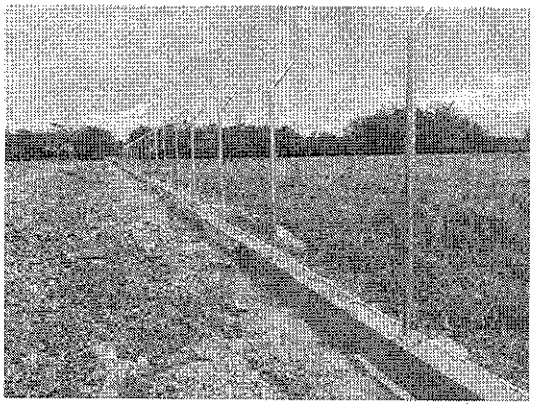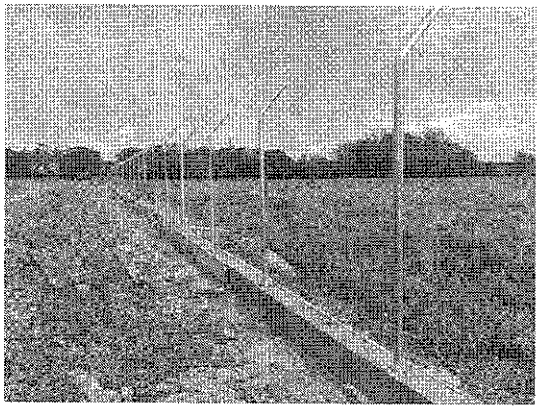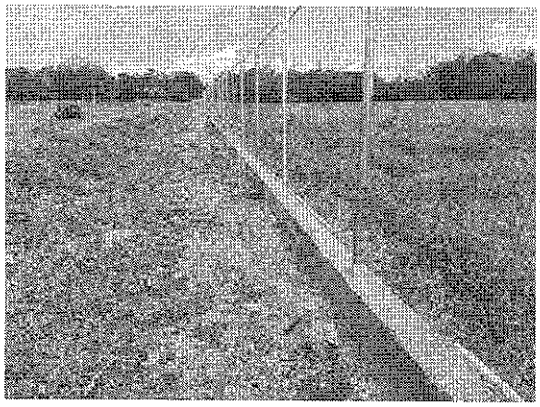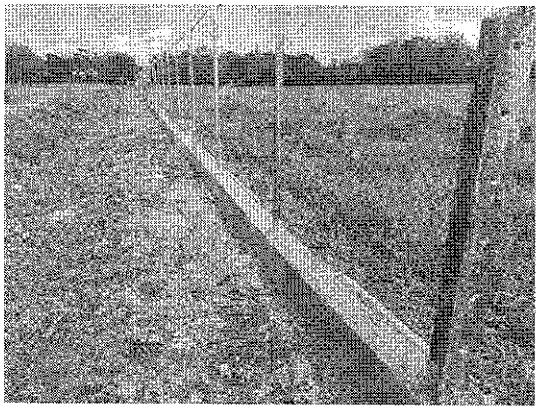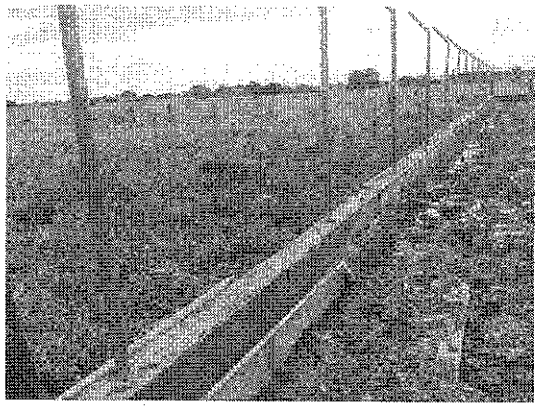





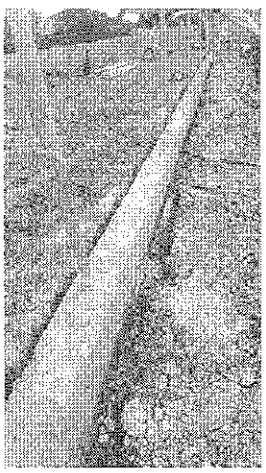

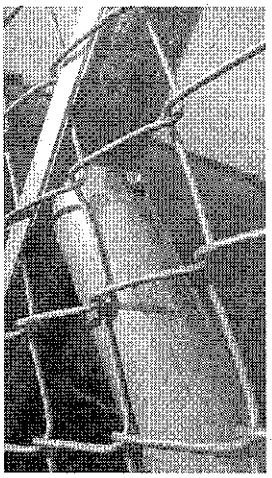

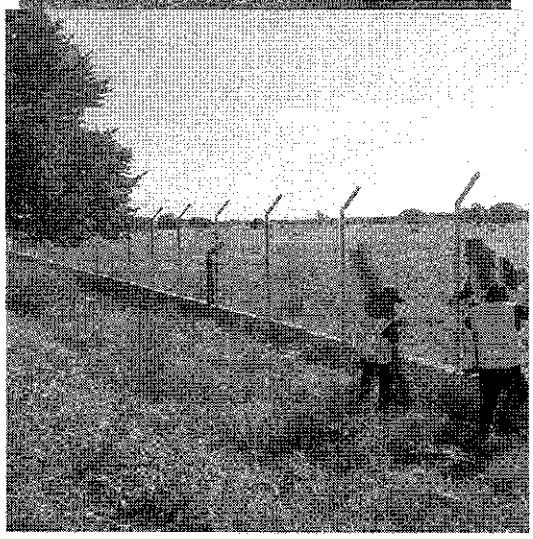


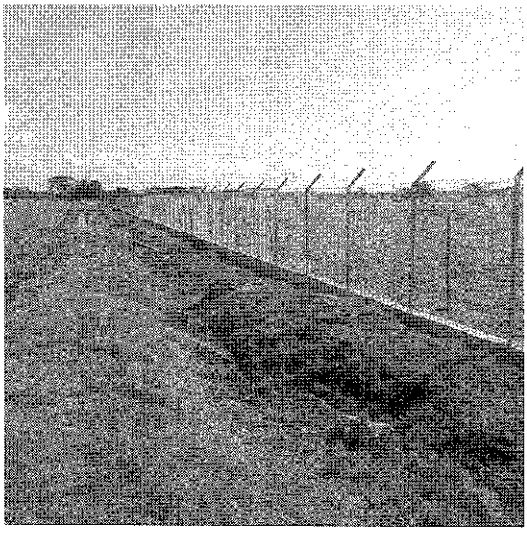

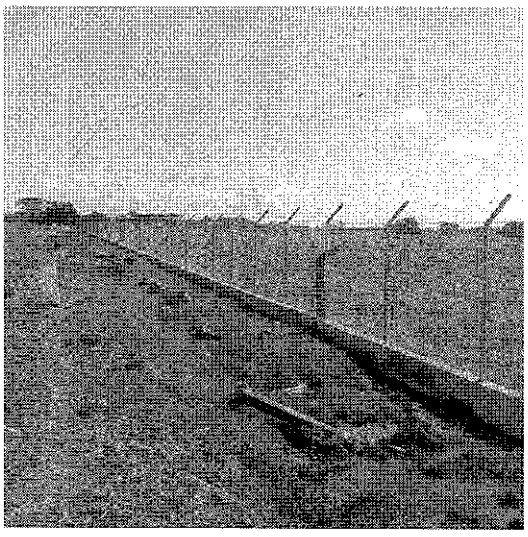



| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>AERONAUTICA CIVIL<br>Unidad Administrativa Especial | INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | FECHA<br>2018 (AAAA) \| 12 (MM) \| 31 (DD) |
|---|---|---|





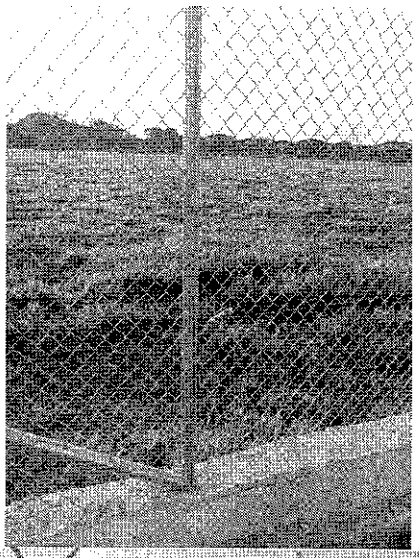





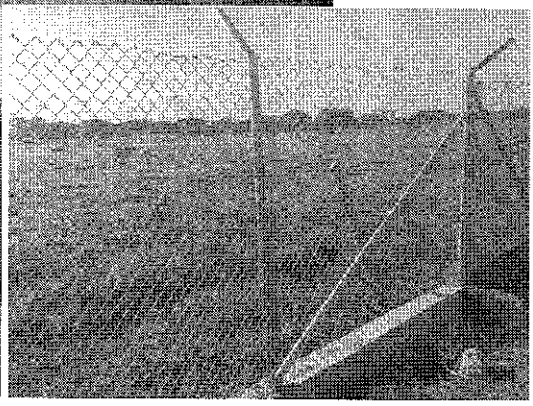


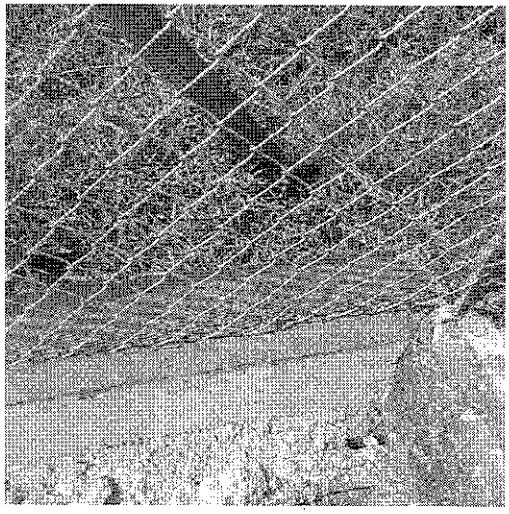


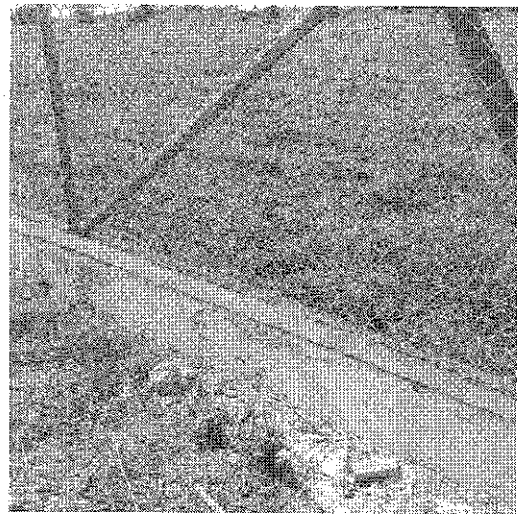

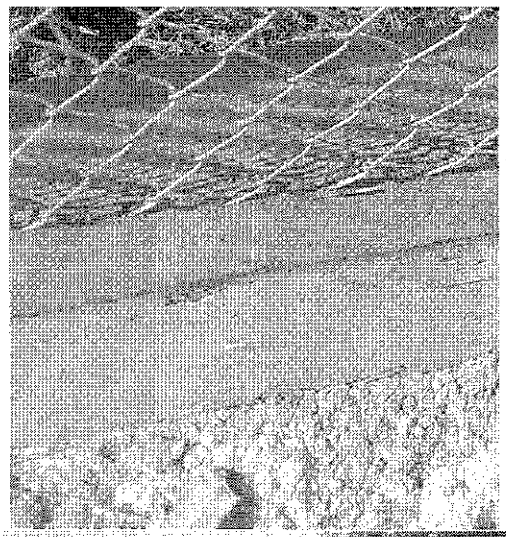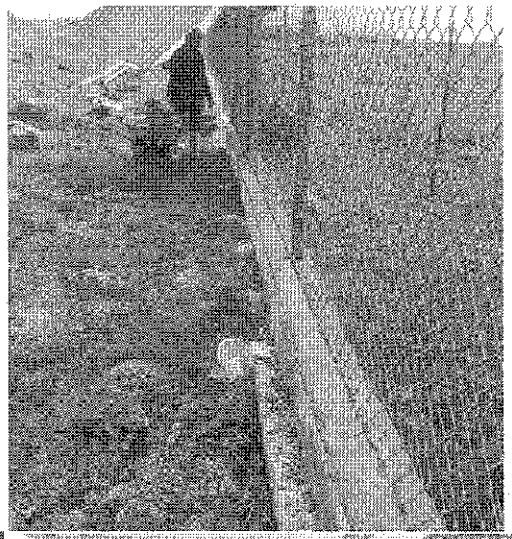







1,6. Mortero 1:4.

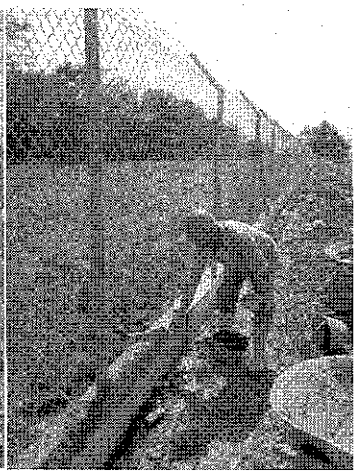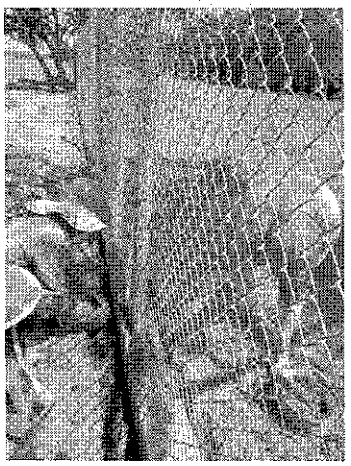


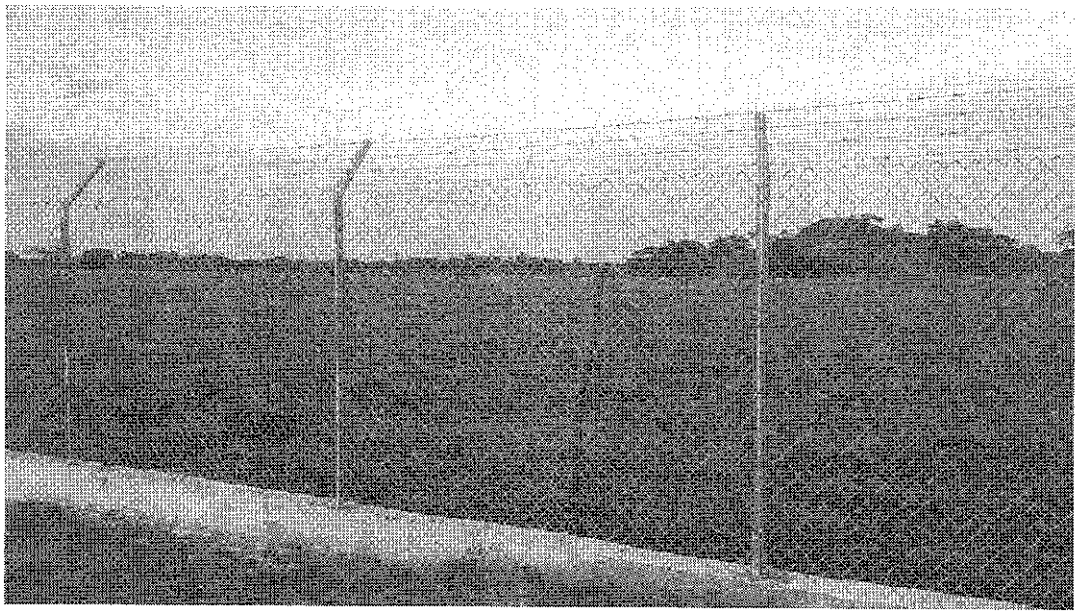


| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>AERONAUTICA CIVIL<br>Unidad Administrativa Especial | **INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** | **FECHA**<br>2018 (AAAA) \| 12 (MM) \| 31 (DD) |
|---|---|---|




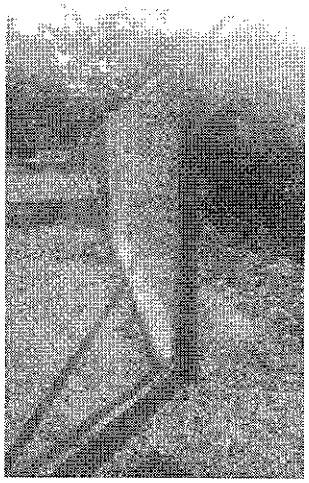


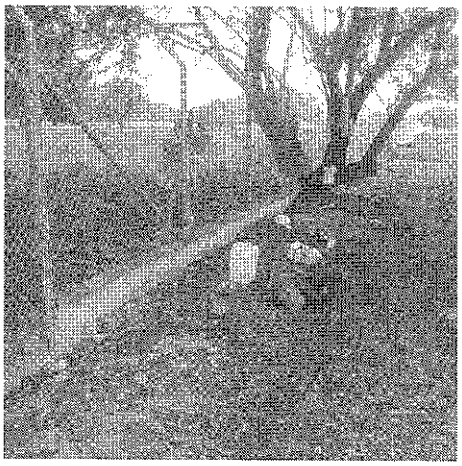



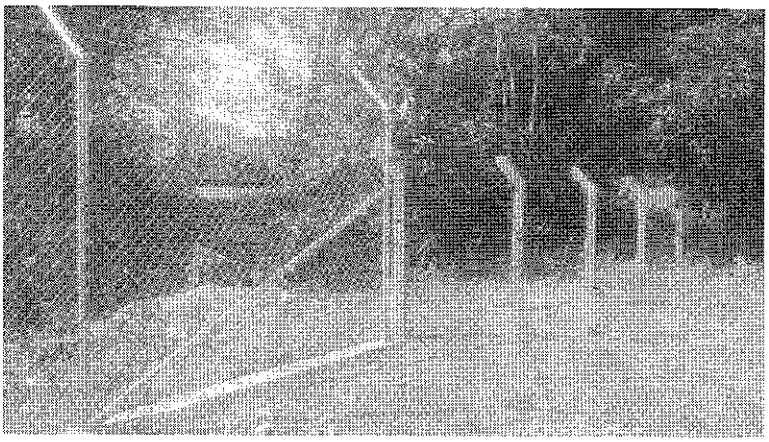

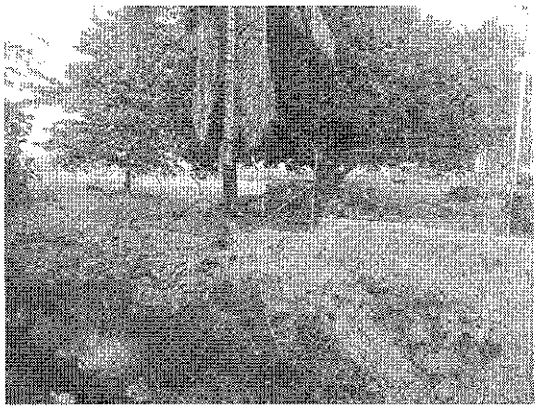

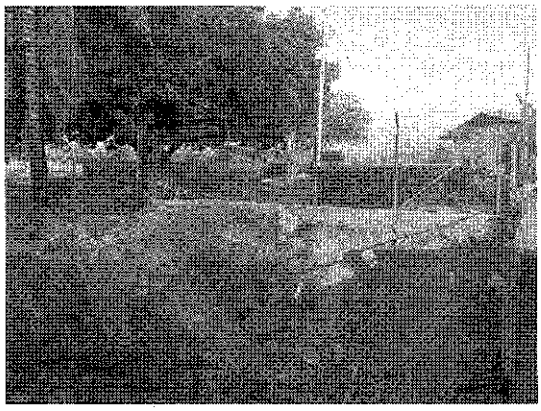

### 3.1.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

**3.1.2.1 AFILIACION DEL PERSONAL.**
**Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.**

**3.1.2.2 INDUCCION AEROCIVIL.**
**Asistieron a la inducción de la Aerocivil (todo el personal que labora en la obra).**

**3.1.2.3 DOTACION DEL PERSONAL.**
**Laboraron con la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.**

**3.1.2.4 SEÑALIZACION DE OBRA.**
**Realizaron la señalización de la obra, con cinta, manilas y líneas de vida, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo.**

**3.1.2.5 CAPACITACIONES AL PERSONAL.**
**Realizaron diferentes charlas al personal en temas relacionados con:**

- **Primeros auxilios.**
- **Manejo de residuos sólidos.**
- **Utilización de elementos de protección personal.**
- **Manejo de herramientas de trabajo.**
- **Trabajo en alturas.**
- **Prevención de accidentes.**
- **Realización de pausas activas.**

### 3.1.3 SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se realizó seguimiento a la programación entregada, verificando que se cumple actualmente con el cronograma previsto para el desarrollo de las diferentes actividades.

### 3.1.4 PERSONAL EN OBRA:

Contaron en obra con el siguiente personal:

- Director de Obra 1
- Residente de Obra 1
- Oficiales 1

- Ayudantes: 6

### 3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por **LA AEROCIVIL** que se relacionen con el objeto del contrato.
2. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión Calidad; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.
3. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental, y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
4. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar para que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.
5. Entregar los informes y documentos relacionados en la cláusula novena del presente contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor del mismo, en la Dirección Regional Antioquia de **LA AEROCIVIL**.
6. Conocer y aplicar las Políticas de Seguridad de la Información, definidas por **LA AEROCIVIL.**
7. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.
8. **El CONTRATISTA** debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, **LA AEROCIVIL** dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
9. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:
   a) Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
   b) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA AEROCIVIL.**
   c) Hacer entrega al Grupo de Salud Ocupacional del certificado del examen médico pre-ocupacional de conformidad con la legislación vigente.
   d) Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
   e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   f) Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por LA AEROCIVIL, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
   g) Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   h) Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.

10. Quedan sujetos al código de ética de **LA AEROCIVIL** especialmente en lo relacionado con las causales de conflicto de intereses.
11. Atender a los clientes internos y externos de **LA AEROCIVIL** de manera cordial, eficiente y oportuna.
12. Apoyar a **LA AEROCIVIL** en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y 200servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.

- El contratista ha cumplido con las obligaciones mencionadas anteriormente en el literal 3.2

### 3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo del mes de septiembre y octubre se entregan parcialmente los trabajos realizados de:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD EJECUTADA | CANTIDAD FALTANTE | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1. Desmonte, rocería y limpieza. | 1.200 ML | 0 ML | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,2. Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales). | 202.18 M3 | 0 M3 | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,3. Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo | 72.00 M3 | 0 M3 | 34 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,4. Cimiento concreto ciclopeo | 144.00 M3 | 0 M3 | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,5. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedetal concreto 3000 PSI | 18.36 M3 | 0 M3 | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,6. Mortero 1:4. | 1.200 ML | 0 ML | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| 1,8. Desmonte de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas | 1.200 ML | 0 ML | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| OE 1 Suministro e instalación de Cerramiento en tela verde para protección de ganado contra predio vecino H:1.50 m GLB 1,00. | 1 GLB | 0 GLB | 31 de diciembre de 2018 | SI | |
| OE 2 Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada C.10 sin recubrimiento de PVC. Incluye tuberia | 1.200 ML | 0 ML | 31 de diciembre de 2018 | SI | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios. | | | | | |
| | | | | | |

## 4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

A la fecha se recibió el contrato a satisfacción de acuerdo al cronograma establecido.

## 5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

### 5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO |
| 2 | Tipo de riesgo | NO APLICA |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | NO APLICA |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | NO APLICA |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | NO APLICA |
| **OBSERVACIONES:** | | |

### 5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

#### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

| ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE? | |
|---|---|
| SI | NO |
| N/A | |
| ¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST? | |
| SI | NO |
| N/A | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| N/A | N/A |

#### 5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| SI | NO |
| X | |
| FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION | |
| 18 de septiembre de 2018 | |

## 5.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**.

## 6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

## 6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| A. ACTAS PARCIALES OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTAS | VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES | % EJECUCION | AMORTIZACION | TOTAL A PAGAR | ACUMULADO | SALDO POR PAGAR | PERIDO DE FACTURACION |
| | | | | | | | | |
| Acta Recibo Parcial No.1 | $ 65.025.517,00 | $ 65.025.517,00 | 19.57% | 0.00 | $ 65.025.517,00,00 | $ 65.025.517,00,00 | $ 65.025.517,00 | Del 18 de septiembre al 26 de octubre de 2018 |
| Acta Recibo Parcial No.2 | $ 116.103.788,00 | $ 181.129.305,40 | 54.5 % | 0.00 | $ 116.103.788,00 | $ 181.129.305,40 | $ 116.103.788,00 | Del 27 de octubre al 56 de diciembre de 2018 |
| Acta Recibo Parcial No.3 | $ 79.843.946,00 | $ 260.973.252,00 | 78.54% | 0.00 | $ 79.843.946,00 | $ 260.973.252,00 | $ 79.843.946,00 | Del 6 al 14 de diciembre de 2018 |
| Acta Recibo No.4 y final | $ 71.291.638.40 | $ 332.264.889.40 | 100 % | 0.00 | $ 71.291.638.40 | $ 332.264.889.40 | $ 71.291.638.40 | Del 15 al 31 de diciembre de 2018 |

## 6.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

| REPÚBLICA DE COLOMBIA AERONAUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial | INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 12 | 31 |
| | | AAAA | MM | DD |

| ITEMS | % PREVISTO | % EJECUTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1,1 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.2 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.3 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.4 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.5 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.6 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| 1.7 | No se ejecuta | No se ejecuta | NO SE EJECUTA |
| 1.8 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| OE-1 | 100% | 100% | Cumpliendo |
| OE-2 | 100% | 100% | Cumpliendo |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**
CC 98.543.957
SUPERVISOR

# INFORME FINAL OBRA

***CONTRATO 18000982-H4***

***"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO ENE LE AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA"***

CONTRATANTE: **UNIDAD ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**

SUPERVISOR: **ING. ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.**

**FECHA INFORME: 31-12-2018**


CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S


# INFORME DE FINALIZACIÓN:

| | | | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | % Avance | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Desmonte, rocería y limpieza. | ML | 1200,00 | 1200,00 | 100,00% | Finalizado |
| 1,2 | Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales). | M3 | 202,18 | 202,18 | 100,00% | Finalizado |
| 1,3 | Viga de amarre concreto 3000PSI incluye refuerzo. | M3 | 72,00 | 72,00 | 100,00% | Finalizado |
| 1,4 | Cimiento concreto ciclopeo. | M3 | 144,00 | 144,00 | 100,00% | Finalizado |
| 1,5 | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedetal concreto 3000 PSI. | M3 | 18,36 | 18,36 | 100,00% | Finalizado |
| 1,6 | Mortero 1:4. | ML | 1200,00 | 1200,00 | 100,00% | Finalizado |
| 1,7 | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios. | ML | | 0,00 | | Cambio por ítem OE 2 |
| 1,8 | Desmonte de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas | ML | 1200,00 | 1200,00 | 100,00% | Finalizado |
| | **OBRA EXTRA:** | | | | | Finalizado |
| **OE 1** | Suministro e instalación de Cerramiento en tela verde para protección de ganado contra predio vecino H:1.50 m | GLB | 1,00 | 1,00 | 100,00% | Finalizado |
| **OE 2** | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada C:10 sin recubrimiento de PVC. Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios. | ML | 1200,00 | 1200,00 | 100,00% | Finalizado |


CONSTRUCTORA
POLIOBRAS
SAS


## *REGISTRO FOTOGRÁFICO*

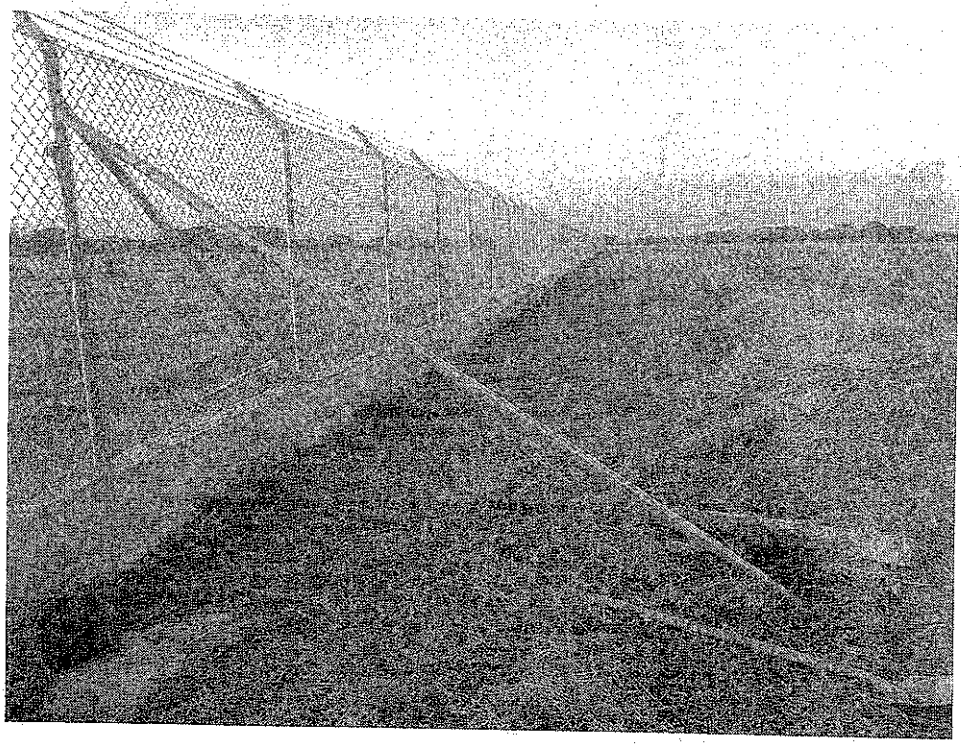

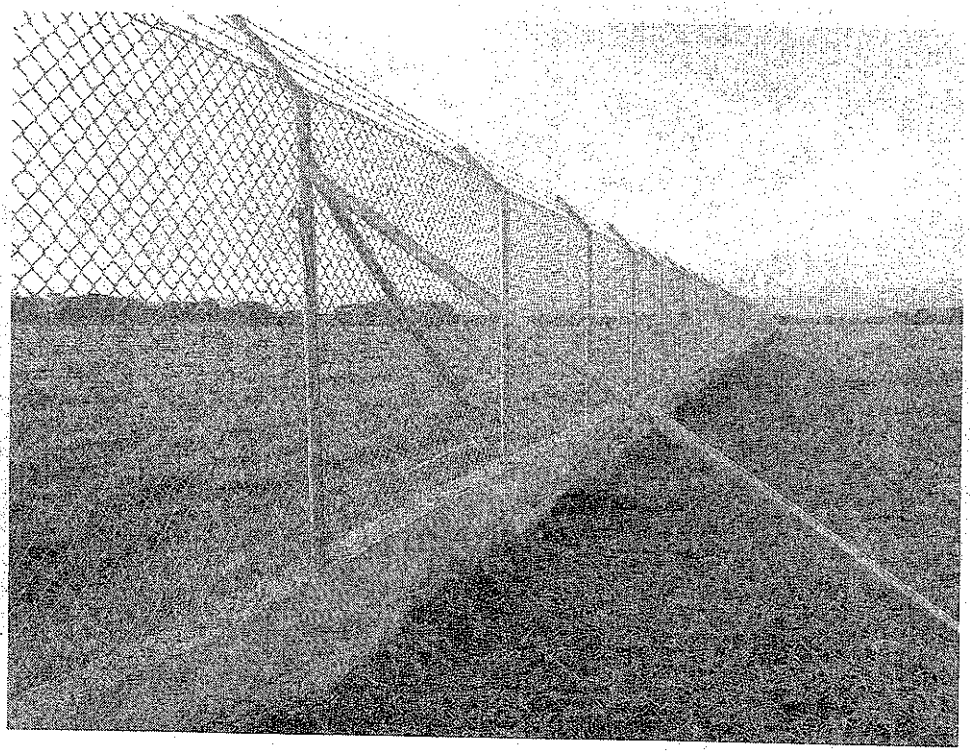


CONSTRUCTORA
POLIOBRAS
S.A.S.

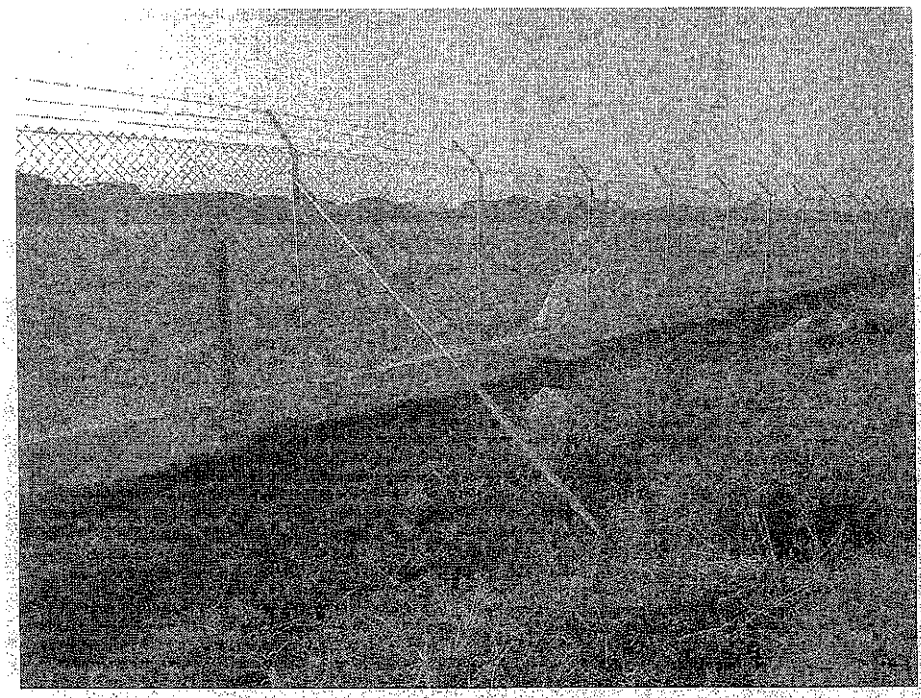

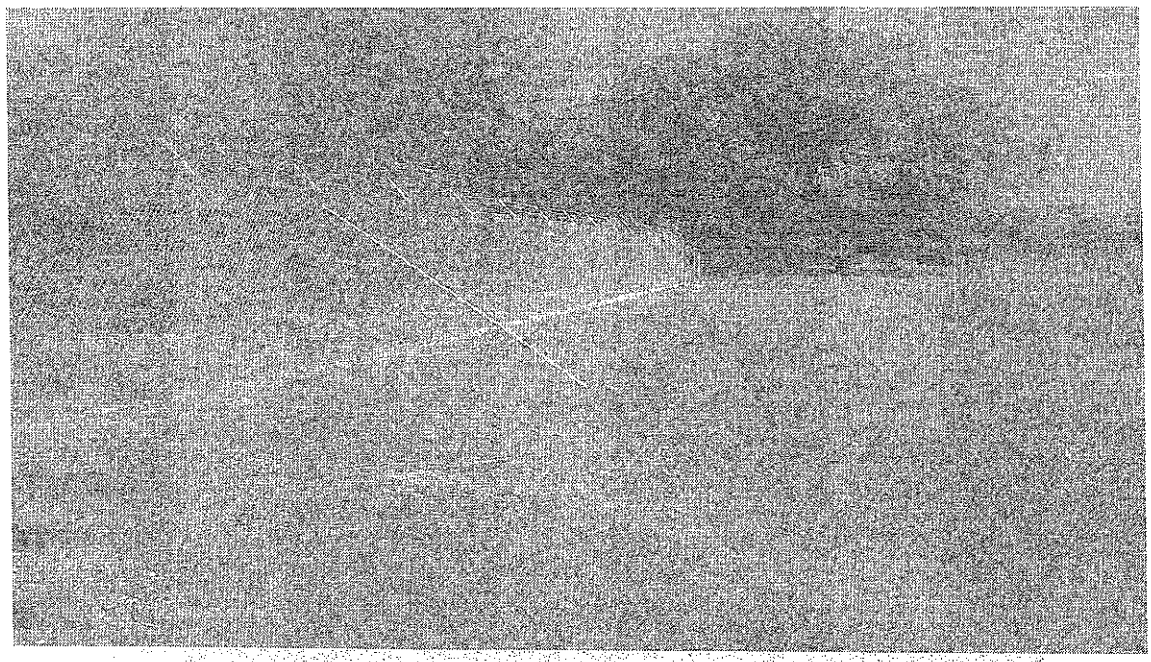

CONSTRUCTORA
POLIOBRAS
S.A.S



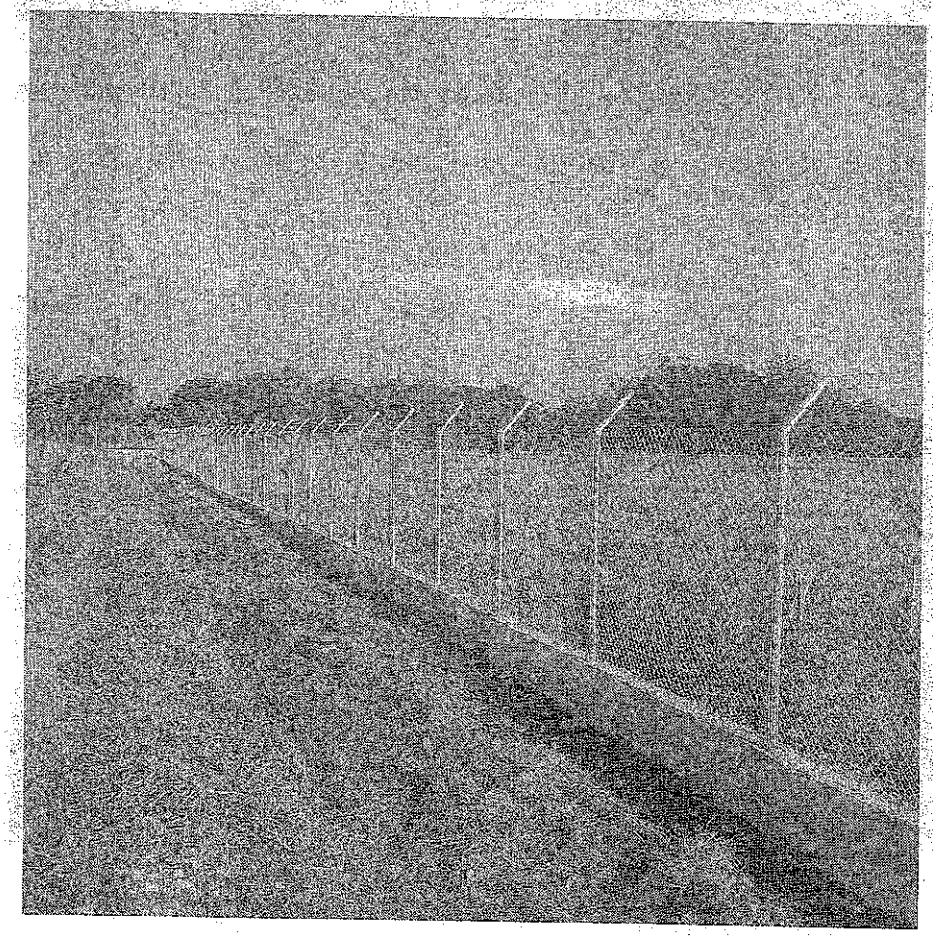

CONSTRUTORA
POLIOBRAS
S.A.

