aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CLAUDIA INES ACEVEDO ACEVEDO identificado(a) con CC 32711154 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$8,860,000	$1,417,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$8,860,000	$44,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$8,860,000	$44,300
ARL	COLMENA	30	0.522%	$8,860,000	$46,300
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$8,860,000	$354,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$8,860,000	$354,400

Este certificado se expide el día 2022-09-05 a las 10:57.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901607106	7	CONSORCIO CP 01	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 77B NO 57-103	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1588031659	9438463606	E	2022/08/02	2022/08/04	BANCOLOMBIA	2	$360,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vsc sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,466,667	$234,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667		$7,700		$0	$0		$359,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,466,667	$234,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667		$7,700		$0	$0		$359,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,466,667	$234,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667		$7,700		$0	$0		$359,800
1	CC	1065642052	SERRANO LISNEY X	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$58,700	CCF07	22	$1,466,667	$58,700	14-25	22	$1,466,667	0.522%	$7,700	22	$0	$0	SI	$359,800
Total		**Afiliados(1)**				$1,466,667	$234,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667	$58,700			$1,466,667		$7,700		$0	$0		$359,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901607106	7	CONSORCIO CP 01	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 77B NO 57-103	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1588031659	9438463606	E	2022/08/02	2022/08/04	BANCOLOMBIA	2	$360,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,700	$500	$0	$235,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$234,700	$500	$0	$235,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$100	$0	$7,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,700	$100	$0	$7,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,700	$200	$0	$58,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$58,700	$200	$0	$58,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,700	$200	$0	$58,900
TOTAL				1	$359,800	$1,000	$0	$360,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$3,150,000	$504,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,150,000	$219,300
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,150,000	$126,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,150,000	$126,000

Este certificado se expide el día 2022-09-05 a las 11:03.

ANEXO 6
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página 1 de 5

ACTA	No:	Fecha: 06-09-2022
CONVOCA:	INTERVENTORÍA.	
ASISTEN:	CONTRATISTAS - ENTIDAD - INTERVENTORÍA - TRANSITO.	
PROCESO/TEMA	20211800024217 DE 2021	
OBJETIVO		

AGENDA

SEGUIMIENTO DE OBRA.
% OBRA PROGRAMADO 63.01 %
% OBRA EJECUTADO 47.29 %
ATRASO 15.72% ($1.334.123.248)

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

* EL CONTRATISTA INFORMA QUE TERMINÓ EL PAVIMENTO EN EL PREDIO DE LA CRA. 11 ENTRE CALLES 17N Y 18 Y CORRECCIÓN DE UNOS METROS QUE SE FRESARON EN CRA 9.
* SE INFORMA QUE DURANTE LA INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS, SE HAN ENCONTRADO CAMARAS TAPADAS Y CÁMARAS CON TAPA SIN BROCAL. SE REALIZARÁ UN RECORRIDO, PARA HACER LLEGAR A LA ENTIDAD UNA RELACIÓN DETALLADA DE LOS PROBLEMAS OBSERVADOS. LOS CONTRATISTAS HAN DEJADO SEÑALIZADOS LOS SECTORES DE RIESGO PARA EVITAR ACCIDENTES, SIN EMBARGO SE HA OBSERVADO EL ROBO DE ESTOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. SE SOLICITA COLABORACIÓN A LA ENTIDAD PARA CITAR AL PERSONAL DEL RECORRIDO A VISITA DE CAMPO EL PRÓXIMO 8-09-2022 (JUEVES) A LAS 2 PM.
* LA ENTIDAD AUTORIZA LA INTERVENCIÓN EN LA VEREDA ORIENTAL, Y HA HECHO EL RETIRO JUNTA Y COLEGIO TAMPINAS. TAMBIEN AUTORIZA ENTRADA A LA SEÑALIZACIÓN LAS FERIAS. PENDIENTE TECHO
* DEL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN DE LOS SAUCES, SE REALIZARÁN OBRAS EN EL SECTOR DE LA CARRERA HACIA LA PARTE SUR. SE VISITARÁ LA VIA HACIA BELEN, PARA DECIDIR SU INTERVENCIÓN.
* SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DOS FRENTES DE OBRA INDEPENDIENTE. NO CUMPLIDO. SE REITERA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA,

06-09-2022

DE CUMPLIR CON LA CLAUSULA 9 NUMERAL 24, SOBRE LA INCLUSION DE PERSONAL INMEDIATO DE UN SEGUNDO FRENTE DE INTERVENCION, NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

* LA ENTIDAD INFORMA QUE MOVILIDAD FUTURA ESTÁ A CARGO DE LA INTERVENCION DE LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 7 Y 9, Y EN LA CRA. 3 ENTRE CALLES 15 Y 17, POR TAL RAZÓN, LAS OBRAS PROPIAS TODAS EN ESTOS SECTORES NO SERÁN EJECUTADAS POR INFRAESTRUCTURA A TRAVES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. SE ANEXA PLANCHA DE OBRAS A INTERVENIR POR MOVILIDAD FUTURA, SAS.
* LOS PRECIOS NO PREVISTOS QUE FUERON REVISADOS POR INTERVENTORIA Y ENVIADOS CON OBSERVACIONES AL CONTRATISTA, SERÁN ENTREGADOS POR ESTE ÚLTIMO, EL PRÓXIMO JUEVES 12-09-2022.
* LA INTERVENTORIA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE VIAS PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD. CUIDADOSOS DIENTES A LOS INCONVENIENTES DE LA ENTIDAD PARA SU INTERVENCIÓN.
* SE RECOMIENDA LIMPIEZA DE SUNIDEROS EN TRAMOS INTERVENIDOS.
* CONSULTA SOBRE DEFECTO DE ANDENES: SE HICIERON DEFECTOS EN LA CRA 11 ENTRE 17N Y 18N (2 ANDENES), EN VOLUNTARIA (ESCUELA SOCIAL COMUNAL), Y EN LA CALLE 10A ENTRE 2 Y 3 (EL CONTRATISTA ENVIARA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN), TAMBIEN CARRERA 3 CON CLL. 3N ESQUINA.
* SE HACE LA ANOTACIÓN QUE LOS DIAS 03 Y 06 DE SEPTIEMBRE NO HUBO PERSONAL ASISTIDO POR FALLAS TECNICAS EN LA PLANTA DE ASFALTO.

LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA, CONTAR CON UNA ALTERNATIVA PARA EL SUMINISTRO DE ASFALTO, POR ESTAR ATRASOS EN LAS OBRAS RELACIONADOS CON ESTE ASPECTO.

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA, REALIZAR EL PARCHE QUE QUEDO FALTANDO EN LA VIA AL BARRIO FRENTE AL DIAMANTE, DEBIDO A QUE PRESENTA DEFECTOS PARA PEATONES Y VEHICULOS. SE VERIFICARA JUEVES 09-09-2022.

06-04-2022

* EL CONTRATISTA CONSULTORÍA CON LA GERENCIA DEL PROYECTO, SOBRE LA VIABILIDAD DE REALIZAR UN DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL SECTOR DEL TERMINAL (BATMO 6C).
LA ENTIDAD RECOMIENDA QUE LA INTERVENTORÍA REALICE EL DISEÑO DEL PAVIMENTO, EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA NO CONSIDERE HACERLO.
* SE LEE EL ACTA CON LOS TEMAS AMBIENTALES, ELABORADA PREVIAMENTE POR LOS PROFESIONALES DE DICHA ÁREA.

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Version 03
		Página 4 de 5

06-09-2022

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
lo indicado en el acta	Responsable.	Indicado en el acta.

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 5 de 5

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

Para Constancia se firma en Popayán, a los 06 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2022 por quienes asistieron.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edwin Alejandro Ramirez	Apoyo tecnico	
Luis Fernando Tobar	Supervisor Interventoria	
Sirley Medina Plaza	Residente Ambiental	Sirley Medina
Laura Pilar Velasco	Residente SST	LAURA
Edwar A. Diaz J.	Residente SST-Interv.	Edwar A. Diaz
Jairo Gonzalez Gil	Residente Obra	Jairo Gonzalez Gil
Alejandra Arteaga	Contratista STTP	
RUBEN BERTO QUILINDO	RES INTERV.	
Pedro Manuel Aure.	RES. INTERVENT.	Pedro Aure.

ANEXO ACTA DE COMITÉ 06-09-2022

INTERVENCIONES PROYECTADAS EN REHABILITACIÓN VIAL POR MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

No.	Denominación y/o localización del tramo	Direcciones	Longitud (m)
1	Barrio El Cadillal	1. Calle 1N entre El Aldabón y la carrera 17 2. Carrera 15 entre calles 1N y 5	1126
2	Cárcel de mujeres (barrio Alfonso López)	Carrera 3 entre calles 13 y 17	240
3	Barrio El Dean	Calle 17 entre carreras 7 y 9	520
4	Colegio Don Bosco (barrio Alfonso López)	Carrera 8 entre calles 13 y 18	212
5	Gimnasio barrio Antonio Nariño	1. Carrera 12 entre calles 17N y 18N	264
6	Barrio La Esmeralda	Calzada secundaria occidental carrera 17 entre calles 8 y 11	310
7	Vía Lame - Las Guacas - San Isidro	Calle 74N entre carrera 1E y penitenciaría San Isidro	520

ANEXO ACTA DE COMITE 06-09-2022

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página: 1 de 2

COMITÉ INTEGRAL DE OBRA, TEMA AMBIENTAL.

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

REPORTE SEMANA 22 AL 28 DE AGOSTO 2022.

El día lunes 22 se realiza acompañamiento a personal BOAL a las cuadras habilitadas del barrio yambitara, donde se realiza inspección, limpieza y aseo, con personal de la obra.

El día martes 23 de agosto de 2022, la interventoría componente PIPMA, por medio de correo electrónico envia informe PIPMA mensual N°4, comprendido del 07 julio al 30 de julio a personal de la Alcaldía encargado.

El contratista da respuesta el día martes 23 a requerimiento enviado por interventoria el día sábado 20 de agosto solicitando más personal BOAL en la obra o realizar limpieza en conjunto una vez se acabe la jornada para liberar las vías ya realizadas, envía registro fotográfico como evidencia e informa que se solicitó a los directores la necesidad de más personal BOAL, lo cual será realizado.

En recorrido del día miércoles 24 de agosto se realizó la observación al contratista, sobre la falta de carpado de la volqueta placa SDL 070, al salir de la obra con material fresado a talleres Municipal, el contratista realiza su respectivo llamado de atención al supervisor de dicha actividad. De igual forma el personal que estaba realizando imprimación no portaba su respectivo tapabocas, donde se les pregunta personalmente y ellos responden que no los han dotado. Inmediatamente se informa a la profesional encargada. Se realiza charla al personal sobre manejo de residuos de obra.

El día jueves 25 de agosto de 2022, se realiza recorrido de las vías habilitadas del barrio yambitara, villa docente y los hoyos, revisando su limpieza, orden y aseo, con acompañamiento de profesional ambiental de contratista e BOAL.

El día viernes 26 de agosto se realiza reunión presupuesto PIPMA, contratista e interventoria.

REPORTE SEMANA 29 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022.

El día lunes 29 y miércoles 31 de agosto, se realiza capacitación a personal de la obra en diferentes temas entre ellos componente PIPMA.

El día miércoles 31 de agosto, se realiza envió solicitud de arreglo de andenes de la obra por medio de correo electronico al contratista.

El día jueves 01 de septiembre de 2022, se realizó visita en vias habilitadas, para verificación de orden, limpieza y aseo. De igual forma se requirió la limpieza de varios sectores en los cuales se encontraba material de fresado y asfalto. Se informa la necesidad de controlar el majo de la liga, ya que se evidencio el riego de esta sobre pavimento y sumideros.

El viernes 02 de septiembre del 2022, se realizó recorrido en conjunto con la profesional ambiental del contratista, donde se reiteró la observación de la incorrecta clasificación de residuos del punto ecológico en la obra. De igual forma, se realizó nuevamente el llamo de atención al personal que realiza la imprimación no portaba su respectivo tapabocas, donde se les pregunta personalmente y ellos responden que la dotación solo les sirve para un dia. Se requiere la limpieza del espacio público de la entrada a la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del Cauca.

Finalmente se evidencia que las volquetas que están saliendo de la obra (placa WFV 217) con material fresado no están siendo carpadas y esto podria causar alguna eventualidad al realizar su trasporte.

Sirlena Medina Plaza

Sirlena Medina
Apoyo ambiental
Contratista

Ángela Sarria
Apoyo ambiental
Interventoría

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 4

ACTA	No:	Fecha: 16-08-2022
CONVOCA:	INTERVENTORIA	
ASISTEN:	CONTRATISTA – ENTIDAD – INTERVENTORIA – TRANSITO.	
PROCESO/TEMA	20211800024217 DE 2021	
OBJETIVO		

AGENDA

SEGUIMIENTO DE OBRA.

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

- SE LEEN LOS TEMAS DEL AREA SOCIAL Y AMBIENTAL, CONSIGNADOS EN UN ACTA PREVIAMENTE ELABORADA POR LOS PROFESIONALES DE DICHAS AREAS. SE ANEXAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.
- SE CONSIDERA IMPORTANTE TENER UN CONTROL DETALLADO DE LOS DAÑOS EN LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA AL FINAL DEL CONTRATO TENER MUY CLARO EL CONTEO DE CUANTOS, DEPENDIENDO DEL RESPONSABLE DEL DAÑO. AL FINALIZAR EL MES, SE PROGRAMARÁ UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA EMPSA, PARA REVISAR LA PERTINENTE. ESTO SERA CADA MES.
- LA INTERVENTORIA INFORMA QUE SE REALIZÓ RECORRIDO EN LAS VIAS, REVISANDO PUNTOS DE DESVIO DE LAS OBRAS EN LA CRA 9 CON CLL 15N. ORDENANDO ATENDER A LAS INDICACIONES DE LA ENTIDAD PARA SU INTERVENCIÓN.
- SST: PENDIENTE ATENCION DEL CONTRATISTA, PARA EL PERSONAL CERCANO A PRADERA Y FLORIDA, DE IDONEIDAD CON EPTO, UNIFORMADOS Y PROTECTORES AUDITIVOS DE OBRA. EL PROFESIONAL SST DEL CONTRATISTA, HACER LA OBJETIVO DE ESTOS ELEMENTOS.
- RESPECTO AL SEGUNDO FRENTE DE INTERVENCIÓN, INCLUIDO EN UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO, SE INFORMA QUE NO HA SIDO INTERVENTORADO POR EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA DEL PRESENTE COMITÉ.

LA INTERVENTORIA DEJA CONSTANCIA, QUE ESTO AL REPRESENTANTE LEGAL DE

16-08-2022

CONTRATISTA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL AVANCE DE OBRA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO FRENTE DE INTERVENCIÓN, Y QUE NO CUMPLIÓ CON LA ASISTENCIA AL COMITÉ DE OBRA. LA INTERVENTORÍA REITERA LA SOLICITUD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y CON EL CRONOGRAMA DE OBRA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, Y LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA, LIGADO NECESARIAMENTE A UN SEGUNDO FRENTE ADICIONAL.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DISPONER EN OBRA DE CUADRILLAS DE MANO PARA LA PERFORACIÓN, BERCAT PARA EL PERSONAL Y MANTENER EN OBRA LA MAQUINA QUE HACE PARA LA ACTIVIDAD DE LA PILOTEADORA.
- SE HACE LA SOLICITUD DE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SUMIDEROS QUE SE ENCUENTREN COLMATADOS, EN LOS TRAMOS INTERVENIDOS.
- SE PROGRAMA PARA EL DIA DE MAÑANA 17-08-2022 A LAS 8:30 AM. VISITA CON EL OBJETO DE REVISIÓN DE NUEVOS TRAMOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO YAMBITARA Y VILLADOLFANTE.

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página: 3 de 4

16-05-2022

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
SE INFORME EN EL ACTA	CONTRATISTA	INMEDIATO

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 4 de 4

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

Para Constancia se firma en Popayán, a los 16 días del mes de Agosto del año 2022 por quienes asistieron.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Angela Sonia M	Apoy interventoria amb	
Ing Alejandro Rodriguez	Apoyo Interv.	
Jesus A Bermudez	Ing Apoyo AAPSA	
Alejandro Arteaga B	Contratista STTP	
Pedro Muñoz	RESID. INTERVENTORIA	
RUBEN DARIO QUILINDO	RES. INTERVENTORIA	
Sandra Liliana Pardo M	Prof. Social Interventoria	
Cristina Quilindo Arboleda	Residente Social	
Edward A. Diaz Jaramillo	Residente SST - Interv	
Laura Pilar Velasco	Residente SST	
Patricia Perez Acosta	Asesor Justicia	
Sistema Medico	Res. Ambiental	
Andres Alveiro C.	Dir obra. Contratista	
Karina Betancourt	Sec. Infraestructura	
Jaime Bautista Granada	Residente de Obra	

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 3

16-08-2022

Comité de obra 16 de Agosto 2022

Tema Ambiental, reporte semanal al 07 agosto 22

* El día lunes 1 de agosto 2022, por parte de la interventoría componente PIPMA, se da aprobación al informe PIPMA mensual N° 2, comprendido del 07 de mayo al 06 junio 2022, por medio de correo electrónico. Se realiza reunión con acompañamiento de las áreas sst, ambiental y social del contratista, donde se dan a conocer fechas de informes y los cortes.

* El día 02 de agosto 2022, el contratista envía informe PIPMA mensual N°3, por medio de correo electrónico, comprendido del 07 junio al 06 julio 2022, para revisión pa parte de interventoría.

* El día viernes 05 agosto 2022, la interventoría equipo PIPMA, por medio de correo electrónico envía observaciones al informe N° 3 pipma mensual. El contratista para el presente día realiza y envía la subsanación de las observaciones enviadas al informe mensual pipma N° 3

* Tema Ambiental, reporte semanal 08 al 14 agos/22

* El día lunes 08 agosto /2022, por parte de la interventoria componente PGIHA se da aprobacion al informe mensual N°3, comprendido 07junio al 06 julio/22, por medio de correo electrónic

* El día lunes 08 agosto 2022, se realiza recorrido de verificación ambiental en el sector barrio Isolano Nariño y sector boulevard donde se realiza la revisión de la instalacion de la señalizacion preventiva, manejo paleteros en puntos críticos, limpieza y aseo en la obra se informa al contratista la necesidad de utilizar los tapabocas, para las diferentes actividades de la obra, especialmente pavimentación y el personal q se realiza limpieza con sopladora.

El día 09 de agosto 2022, se solicita realizar recorrido con el personal BOA y ambiental del contratista, para realizar verificacion de limpieza orden, aseo y recoleccion de material sobrante, de igual forma se verifica en todos los sitios habilitados (Antonio nariño y boulevard) la necesidad

16-08-2022

de limpieza en algunos andenes los paredes, baldosas o cérales manchados con endrich asfáltico. Se realiza llamado de atención al personal técnico, informando la disponibilidad total del personal BOA cuando se requiera por la parte PIPMA.

* En recorrido del día 1 agosto, se evidencia que no se esta realizando correctamente la clasificación y manejo del Punto ecológico.
* El día viernes 12 agosto 2022, el contratista envia el informe N° 4, por medio correo electrónico Comprendido 07 julio al 31 julio 2022, para revisión por parte interventoria.
* Se solicita realizar tapa de madera tipo estibo para proteger sumideros en momento de pavimentación
* El día 11 agosto el contratista radica de forma físico a la interventoria los informes 1, 2 y 3 mensuales aprobados y el PMA con sus anexos

Sirlena Medina Plaza

Sirlena Medina
Apoyo Ambiental social

Angela Soma
Apoyo Amb interv.

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 1

16-08-2022

Acta Componente Social. Semana del 1 al 6 de Agosto /22

Durante la semana en mención se llevan a cabo las siguientes actividades inherentes al desarrollo del componente social:

se realiza acompañamiento en las actividades de parcheo en el sector de Ritmo 60, la profesional social del contratista continua realizando actividades de atención a la comunidad a fin de realizar la correspondiente resolución de inquietudes y solicitudes por parte de la comunidad adyacente a la AID.

Así mismo se realiza reunión del Equipo Pipma de Interventoría a fin de verificar información correspondiente al Informe N° 3.

El 5 de Agosto se lleva a cabo instalación de pasacalles informativos emitidos por la entidad contratante en los sectores de Santa Clara y colegio Champagnath.

Cristina Quilindo Arboleda.
Res social Ediviales a.
TP

Sandra Liliana Franco M
Profesional Social Interventoría
TP: 1071159110

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 2

16-05-2022

Acta Componente Social Semana del 8-14 de Agosto de 2022

Durante la semana en mención se llevan a cabo las siguientes actividades correspondientes al plan de gestion social.

Agosto 8 de 2022

* Revision de solicitud propietario de vivienda Santa clara, se da tramite a satisfaccion del propietario de la vivienda. Anden que presento daño en superficie.

* Se atiende solicitud de propietario de vivienda sector Antonio Nariño referente a daño en valvula ocasionado por las labores de parcheo. La propietaria informa que por parte del acueducto se le manifesto que le sera cobrado a los cinco propietarios que se conectan a dicha valvula. solicita este cobro no les sea realizado a ellos ya que el daño fue ocasionado por terceros.

* Se lleva a cabo recorrido a solicitud del Ingeniero Pedro Muñoz. de Interventoria contando con el acompañamiento de la parte tecnica y social del contratista y la profesional social de interventoria por posibles sectores a intervenir, queda pendiente aprobación de estos sectores. por parte del Ente contratante.

Agosto 9 de 2022:

* La Profesional social del contratista con el acompañamiento de la Profesional Social de Interventoria realizan recorrido por la Calle 26 Norte Sector Yambitara a fin

realizar levantamiento de registro fotografico de andenes y fachadas.

De igual forma se lleva a cabo socalización casa a casa de actividades a realizar se realiza la correspondiente entrega de volantes informativos

las profesionales social, Ambiental y SST llevan a cabo capacitación al personal de obra.

Agosto 10 / 2022

- Se realizan actividades de socalización casa a casa en la calle 26 Norte sector Satara, de igual forma se lleva a cabo el levantamiento de Registro fotografico de andenes y fachadas.

Agosto 11 / 2022

- Se realizan actividades de atención a la comunidad sector Yambitara, asi mismo se lleva a cabo acompañamiento a las actividades de parcheo

La Profesional social del contratista realiza acompañamiento y apoyo al equipo de prensa de la Alcaldia

Agosto 12 / 2022

- Elaboracion de Informe Pipma N° 4
- Acompañamiento actividades de parcheo sector Yambitara.

Cristina Dolinda Arboleda.
Cristina Dolinda Arboleda
Profesional social Edivial sa.
T P

Sandra Liliana Randa Feria.
Sandra Liliana Randa Feria
Profesional Social Interventoria.
TP 1011159419

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GMC 03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 4

ACTA	No:	Fecha: 23, 08, 2022
CONVOCA:	INTERVENTORÍA.	
ASISTEN:	CONTRATISTA – ENTIDAD – INTERVENTORÍA – TRÁNSITO.	
PROCESO/TEMA	CONTRATO 2021S000024217 DE 2021	
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DE OBRA.	

AGENDA

- ACTIVIDADES CONTRATADAS SECTOR TERMINAL: SE PROGRAMA PARA EL PRÓXIMO JUEVES 25-05-2022 REALIZAR APIQUES Y/O SONDEOS A MAYOR PROFUNDIDAD PARA ESTABLECER LA POSIBLE CAUSA DEL DETERIORO PRESENTADO QUE SE OBSERVA Y QUE SE DEBE CORREGIR.
  EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN COMPLETA EN EL SECTOR DE TERMINAL, PORQUE SE EXCLUYÓ EL SUELO NUEVAMENTE CONSOLIDADO QUE EXISTÍA EN EL SITIO. AL RESPECTO LA INTERVENTORÍA INFORMA, QUE PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN, LA ENTIDAD POR, LO TRES (3) APIQUES QUE EVIDENCIARON MALAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CON BASE EN ESA EXPLORACIÓN SE DECIDIÓ EL CAMBIO DE LA BASE GRANULAR.
- SE PROGRAMA TOMA DE MUESTRAS DE NÚCLEO ASFÁLTICAS DE MANERA CONJUNTA PARA EL PROXIMO MARTES 30-05-2022. SE ENTREGARÁ TAMBIÉN CUBO NUEVO PARA SER ENSAYADO POR LA ENTIDAD.
- DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN EN EL SECTOR DEL TERMINAL CALLE 4N, SE TENDRÁS MUESTRA DE LA BASE GRANULAR.

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

- LA INTERVENTORÍA SOLICITA DE MANERA OFICIAL AL CONTRATISTA, LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE NÚCLEO ASFÁLTICA, Y BASE GRANULAR DE LA FUENTE DE PÓBEDA, EN UN LABORATORIO EXTERNO, DIFERENTE AL DE LA PLANTA, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DE RESULTADOS, Y HACER LLEGAR INFORME DE ESTOS INTERESADOS A LA ALCALDÍA, PARA LA VERIFICACIÓN RESPECTIVA.
- LA INTERVENTORÍA REITERA LA SOLICITUD, DE CUMPLIR POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CLAUSULA DEL CONTRATO QUE INDICA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE OBRA INDEPENDIENTE. EL CONTRATISTA INFORMA QUE ESTÁ EN LA CONSECUCIÓN

DE LOS HABITANTES, PARA TENER ESTE SEGUNDO FRENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON FECHA DE CORTE 21-03-2022 SE TIENE:

% PROGRAMADO 54 %

% EJECUTADO 39.09 %

ATRASO 14.96 % ($ 1.270.011.512)

SE INFORMA QUE EL DIA DE AYER, SE REALIZO RECORRIDO PARA DEMARCACION DE AREAS DE INTERVENCION EN EL SECTOR DE INGENIERIA CIVIL, TULIAN, FACULTAD DE EDUCACION Y TODO JUNTO AL RIO MOLINO. SE INCLUYE LOS TODOS ALEDAÑOS AL RIO MOLINO CALLE 2N ENTRE 3 Y 4, CRA 4 ENTRE 3N Y 1N, Y UNA VIA PEATONAL CALLE 2N ENTRE CRA 3 Y 4.

EL CONTRATISTA PRESENTO EL DIA DE HOY, UN NUEVO DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS, VIGENTE DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2022.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA TERMINAR EL PARCHE JUNTO AL RESALTO QUE SE PRESENTO DAÑO EN LA CRA 11 ENTRE 17N Y 18N, Y CORREGIR UNOS HUECOS QUE SE PRESENTAN EN LA VIA DE CANAY. COMPROMISO PARA VERIFICAR PROXIMO MARTES 30-03-2022.

SE HACE LA RECOMENDACION AL CONTRATISTA, DEJAR UNA INTERVENCION A LA VIA EN EL BARRIO LA PAZ CRA 6 ENTRE CALLES 69N Y 70N, APROVECHANDO EL VERANO DE ESTE MES Y ANTES DEL INICIO DEL FENOMENO DE LA NIÑA PRONOSTICADO Y DENUNCIADO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

EN LA SEMANA ANTERIOR, SE REALIZO INTERVENCION EN TODO EL BARRIO LOS ALMACIGOS, QUE YA FUE TERMINADO. EN ESTA SEMANA SE TRABAJA EN EL BARRIO VILLA OCCIDENTE Y MONTEBERA.

SE LEE EL ACTA DEL AREA AMBIENTAL Y SOCIAL CON LOS TEMAS CORRESPONDIENTES Y SE ANEXAN LOS ACTAS ELABORADAS PREVIAMENTE. POR LOS PROFESIONALES DE DICHAS AREAS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
LO INDICADO EN EL ACTA		

23-03-2022

* SE INFORMO QUE HAY DOS (2) PANDEREROS UBICADOS EN LA CRA. 9 SECTOR CHAMPAGNAT, Y UNO (1) EN EL BARRIO SANTA CLARA.
* SE INFORMO AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSITO, QUE EN EL TRAMO DE LAS SEMANAS LAS OBRAS SE TRATARAN AL SECTOR DE INGENIERIA CIVIL, FACULTAD DE EDUCACION Y TODO FRENTE AL RIO MOLINO, PUES CONTAR CON EL APOYO DE ESTA ENTIDAD.

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GMC 03
	ACTA DE REUNION	Version 03
		Pagina 4 de 4

23-05-2022

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

Para Constancia se firma en Popayan, a los 23 dias del mes de 05 de 2022 por quienes asistieron,

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Viviana Pianda Yela	Profesional SC Interventoria	
RUGOBERTO QUILINDO	Res. Interventoria	
Luis Fernando Tobar	Supervision Interventoria	
Alejandro Arteaga B	Contratista STTP	
Mónica P Campo O.	Apoyo SDP - Infraestruct	
[illegible]	Residente de Obra	
Cristina Edilinda Arboleda	Res. Social	Cristina Edilinda Diboleda
[illegible]	Res. Ambiental	[illegible]
[illegible]	Resp. SST - Interv	[illegible]
Pedro Miguel Muñoz	RESID. INTERVENTORIA.	

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión 03
		Página 1 de 2

2-08-2022

Acta Componente social 16-20 de Agosto de 2022.

Las Profesionales Sociales de Interventoria y contratista realizan acompañamiento en actividades de Parcheo sector Los Hayos.

Se realizan actividades de Atencion a la comunidad tanto con los propietarios de las viviendas del AID como de los miembros de las Juntas de Accion comunal del sector.

Se realiza levantamiento de registros fotograficos de andenes, antejardines y fachadas en la Calle 26 13N con kra 4A.

Se lleva a cabo registros fotograficos de la fachada - anden Carrera 5B entre calle 25 - 26 y se realiza socializacion de las actividades a realizar.

El dia Miercoles 17 se atiende solicitud por daño en canal en vivienda sector Los Hayos.

La Profesional social del contratista lleva a cabo charla a operarios de obra.

El 18 de Agosto se realiza socializacion sobre la carrera 26 BN se lleva a cabo levantamiento de Registro Fotografico de entorno en la misma direccion y atencion a la comunidad frente a dudas de vias proximas a intervenir

19 de Agosto. se continua con el Registro Fotografico sobre calle 30 - 32 / 27 N y parque Villa Dorente Nueva Yambitara. y socializaciones a la comunidad de los cierres y la intervencion

20 de Agosto. Acompañamiento jornada de parcheo atencion a la comunidad, se atiende solicitud de usuario relacionada con destapar un tubo de canal

Cristina Julinda Arboleda.
Cristina Julinda Arboleda
Profesional social Contratista

Sandra Liliana Pianda Uribe
Profesional social Interventoria
TP 1071159110

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Version: 03
		Página 1 de 1

23-08-2022

23 DE AGOSTO DE 2022.

COMITÉ INTEGRAL DE OBRA, TEMA AMBIENTAL:

REPORTE SEMANA 15 AL 21 DE AGOSTO 2022.

El día martes 16 de agosto de 2022. la interventoria componente PIPMA. por medio de correo electrónico envía observaciones al informe PIPMA mensual N°4, comprendido del 07 julio al 30 de julio.

El dia miércoles 17 de agosto de 2022. se realizó visita a la obra, donde se evidencio nuevamente el mal manejo de los puntos ecológicos y la selección de sus elementos por parte de los trabajadores, de igual forma se evidencio que los trabajadores no tienen sus tapabocas de acuerdo a la actividad de cada uno.

El dia jueves 18 y viernes 19 de agosto se realizó recorrido de verificación orden, limpieza y aseo de vias rehabilitadas en el sector del barrio solara y hoyos. El recorrido se realizó en conjunto con el contratista y la BOAL.

El día jueves 18 de agosto de 2022. el contratista envía las subsanaciones del informe PIPMA mensual N°4 (v2), por medio de correo electrónico, comprendido del 07 julio al 31 de julio del 2022. para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.

El día jueves 18 de agosto del 2022. por parte de la interventoria componente PIPMA. se da aprobación al informe PIPMA mensual N°4 (v2), comprendido del 07 de julio al 30 de julio del 2022, por medio de correo electrónico.

El día sábado 20 de agosto. se realiza correo electrónico, solicitando más personal BOAL en la obra o realizar limpieza en conjunto una vez se acabe la jornada para liberar las vias ya realizadas. De igual forma se reitera la necesidad de elaborar tapas de madera para tapar los sumideros cuando se esté realizando la pavimentación.

Finalmente se realizan recorridos de verificación conjunta, evidenciando lo impuesto en el PIPMA.

Sirlena Medina
Apoyo ambiental Contratista

Ángela Sarria
Apoyo ambiental Interventoria

ANEXO 7
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

INP SERVICIOS SAS	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA ☐ ENVIADA ☒	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
INTERVENTOR:	INP SERVICIOS S.A.S.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO TOBAR

CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REFERENCIA /	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
8/08/2022	CINP-522-077-3190	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 16	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
10/08/2022	CINP-522-078-3216	AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR 15 DIAS	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
11/08/2022	CINP-522-079-3257	DOCUMENTOS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
11/08/2022	CINP-522-080-3258	OBSERVACIONES APUs NO PREVISTOS	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIÓNES Y VÍAS S.A.
12/08/2022	CINP-522-081-3270	SOLICITUD A CUMPLIMIENTO CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIÓNES Y VÍAS S.A.
12/08/2022	CINP-522-082-3271	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 17	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
16/08/2022	CINP-522-083-3296	IMFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
18/08/2022	CINP-522-084-3351	SOLICITUD A CUMPLIMIENTO CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIÓNES Y VÍAS S.A.
29/08/2022	CINP-522-085-3472	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 18 Y No. 19	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN
1/09/2022	CINP-522-085-3539	SOLICITUD ARREGLO DE ANDENES DAÑADOS	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIÓNES Y VÍAS S.A.
5/09/2022	CINP-522-086-3585	CARPADO DE VOLQUETAS	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIÓNES Y VÍAS S.A.
5/09/2022	CINP-522-087-3586	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20	INP SERVICIOS SAS	ALCALDIA DE POPAYAN

Firma:

Nombre: ANSELMO MARTINEZ A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 08 de agosto de 2022

CINP–522–077–3190

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el informe semanal de interventoría No 16 correspondiente al periodo del 25 al 31 de julio de 2022 del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Gerente de Proyectos

Anexo: Lo enunciado en un (1) archivo digital (4) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 10 de agosto de 2022

CINP–522–078–3216

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructura
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Damos alcance a nuestro comunicado CINP-522-073-3055 del 29 de julio del presente año, por medio del cual esta Interventoría considera viable avalar la solicitud de prórroga por quince (15) días presentada por el contratista EDIFICACIONES Y VÍAS S.A., toda vez que se ha justificado por la afectación de las lluvias presentadas durante los meses de abril, mayo, junio y julio generando atrasos en la ejecución normal de las obras del contrato.

Con el presente comunicado, esta interventoría solicita que de aprobarse por parte del municipio la prórroga solicitada por el contratista EDIFICACIONES Y VÍAS S.A., se apruebe así mismo una prórroga al contrato de interventoría **No 20221800011697 del 2022** por quince (15) días, con el fin de continuar con las actividades de supervisión y control del contrato de obra. Los costos generados por estos quince (15) días se han balanceado con los recursos de interventoría contractuales, por lo cual no se requiere de recursos adicionales.

Quedamos atentos a sus comentarios,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: AOD
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP–522–079–3257

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes los documentos relacionados a continuación los cuales corresponden al acta de costos de interventoría No 2 periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2022.

- Registro Presupuestal.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Contrato de Interventoría.
- Aprobación Contrato Secop II.
- Aprobación pólizas Secop II.
- Acta de inicio.
- Comprobante de Pago Estampilla Procultura.
- RUT.
- Certificado Paz y Salvo Seguridad Social.
- Acta de Costos de Interventoría No 2.
- Planillas Seguridad Social.
- Proforma de Factura.
- Certificación Bancaria.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Gerente de Proyectos

Anexo: Lo enunciado
Elaboró: AOD
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP–522–080–3258

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas.

Una vez revisados los APUs No Previstos, presentados por el Contratista mediante comunicado E-24217-045, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes, para que sean atendidas, y enviadas las correcciones, a la mayor brevedad posible:

34. NP1 Demolición Losas de Concreto:

- Completar el nombre del ítem a: Demolición losas de concreto espesor variable.
- Consideramos que el rendimiento de los equipos, compresor y retrocargador están muy bajos, incrementar a 4.0 en ambos casos.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

35. NP2 Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales incluye transporte:

- Corregir el valor de la herramienta menor, una vez se corrija el valor de la mano de obra.
- En la mano de obra, consideramos que debe haber un (1) oficial y un (1) ayudante.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

36. NP3 Subbase Granular Incluye Transporte:

- Corregir la palabra SUB BASE, por SUBBASE, en el nombre del ítem y en el capítulo de materiales.

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

- El precio de la subbase granular cotizada en la ciudad de Popayán, está a $58.000/m3, favor hacer las verificaciones y ajuste correspondiente. Se debe tener en cuenta, que el valor presentado en su APU de la subbase granular/m3, está más alto, que el valor de la base granular aprobado, el cual está vigente en el mercado.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

37. NP4 Mejoramiento de la subrasante con adición de material granulares:

- Corregir el nombre del ítem: Mejoramiento de la subrasante con adición de material granular Incluye Transporte.
- El precio del material de mejoramiento, cotizado en la ciudad de Popayán, está en $37.000/m3, favor hacer las verificaciones y ajuste correspondiente, indicando en el capítulo de materiales, las características del material propuesto, incluido el tamaño máximo.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

38. NP5 Disposición final de materiales provenientes de las excavaciones sin clasificar de la explanación de canales y demoliciones:

- Favor presentar la cotización con el valor de los derechos de disposición final de materiales, y ajustar el valor del costo directo a dicho valor. Puede estar cercano a los 4760, hacer las verificaciones correspondientes.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

39. NP6 Suministro e instalación de Geotextil Tejido T-2400 o Similar.

- Corregir el nombre del ítem: Suministro e instalación de Geotextil Tejido T-2400 o Similar Tejido.
- En el capítulo de materiales corregir el texto: Geotextil Tejido T-2400 o Similar Tejido.
- En la mano de obra, se considera suficiente dos (2) obreros, sin el oficial, y cambiar el rendimiento de los obreros de 230 a 240.
- Corregir el valor del precio unitario total, atendiendo las observaciones.

40. NP7 Suministro mezcla densa en caliente tipo MDC-19 suelta en planta.

- Por medio de comunicado CINP–522–075–3124 Rad. 04-08-2022, remitido al Contratista por parte de la Interventoría, se informa que no es procedente la aprobación de este precio unitario, por tratarse de un ítem de suministro de materiales.

41. NP8 Suministro de emulsión asfáltica CRL-1 en planta:

- Por medio de comunicado CINP–522–075–3124 Rad. 04-08-2022, remitido al Contratista por parte de la Interventoría, se informa que no es procedente la aprobación de este precio unitario, por tratarse de un ítem de suministro de materiales.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 12 de agosto de 2022

CINP–522–081–3270

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas,

De acuerdo con el seguimiento al estado de avance de las obras, realizado por la Interventoría con corte a la semana inmediatamente anterior (01 al 07 de agosto), se observa un atraso de 13.27%, correspondiente a un valor de $ 1.126.063.885.

Teniendo en cuenta el atraso citado anteriormente, y que, a la fecha del presente comunicado, el Contratista aún no ha implementado en obra los dos frentes de intervención independientes, la Interventoría reitera la solicitud expresada en diferentes comunicados y en comités de obra, de dar cumplimiento a la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, *Numeral 24) El Contratista deberá contar con mínimo dos (2) frentes de trabajo al tiempo con personal y maquinaria propios cada uno*, toda vez, que, sin este frente de obra adicional, es evidente que el Contratista no podrá dar cumplimiento a la ejecución del 100% de las obras del contrato, dentro de los plazos establecidos contractualmente.

Por otra parte, se reitera la solicitud de presentar un plan de contingencia que detalle los recursos de personal y equipos que dispondrá para agilizar las obras del contrato, de tal forma, que se pueda lograr el cumplimiento del cronograma establecido, involucrando claramente, los dos frentes de obra independientes.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 12 de agosto de 2022

CINP–522–082–3271

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el informe semanal de interventoría No 17 correspondiente al periodo del 1 al 7 de agosto de 2022, del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Gerente de Proyectos

Anexo: Lo enunciado en un (1) archivo digital (4) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 16 de agosto de 2022

CINP–522–083–3296

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca



REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Mensual de Interventoria No 3 correspondientes al periodo del 7 de junio al 6 de julio de 2022 correspondientes al contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Gerente de Proyectos

Anexo: Lo enunciado

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: Info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

impulsado por CamScanner

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 16 de agosto de 2022

CINP–522–083–3296

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Mensual de Interventoría No 3 correspondientes al periodo del 7 de junio al 6 de julio de 2022 correspondientes al contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Gerente de Proyectos

Anexo: Lo enunciado

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 18 de agosto de 2022

CINP–522–084–3351

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas,

Por medio de la presente, la Interventoría reitera la solicitud al Contratista, de cumplimiento a la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, Numeral 24) El Contratista deberá contar con mínimo dos (2) frentes de trabajo al tiempo con personal y maquinaria propios cada uno, expresada en diferentes y repetidas oportunidades, mediante comunicados dirigidos al Contratista y en comités de obra.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoría, al avance en el desarrollo de las obras del contrato con corte a la semana inmediatamente anterior, se observa un atraso de 14.76%, correspondiente a $ 1.252.333.892. Lo anterior evidencia la necesidad del segundo frente de obra simultáneo, a fin de poder dar cumplimiento oportuno a la totalidad de las obras del contrato, además de ser éste un requerimiento de tipo contractual, consignado en el contrato de la referencia.

La Interventoría deja constancia, que en comité de obra del pasado 02-08-2022, se hizo la citación al Representante Legal del Contratista, para tratar temas relacionados con el atraso en el avance de las obras del contrato, y lo concerniente al incumplimiento que se presenta de la cláusula citada anteriormente. De acuerdo con solicitud del Contratista, se pospuso la fecha de citación al Representante Legal, para el día 16-08-2022, fecha en la cual se realizó comité de obra, sin embargo, el Representante Legal, no cumplió con la asistencia a dicho comité.

Por otra parte, se le recuerda al Contratista, que no ha cumplido con la presentación de un

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

plan de contingencia que detalle los recursos de personal y equipos que dispondrá para agilizar las obras del contrato, involucrando claramente, los dos frentes de obra independientes, para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra, dentro de los plazos establecidos contractualmente.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoria

C.C. Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3206662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 29 de agosto de 2022

CINP–522–085–3472

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes los informes semanales de interventoría No 18 y No 19 correspondientes a los periodos del 8 al 14 de agosto y del 15 al 21 de agosto de 2022 respectivamente, del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría.

Anexo: Lo enunciado en dos (2) archivos digitales (8) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Popayán, 01 septiembre de 2022

CINP-522-085-3539

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

ASUNTO: Solicitud Arreglo de Andenes Dañados.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que debido a las actividades de parcheo en los sectores de los barrios Antonio Nariño, Yambitara y Esquina Carrera Segunda Facultad de Educación Universidad del Cauca, se generaron algunos daños en andenes los cuales aún se encuentran pendientes de reparación, se requiere la realización del proceso correspondiente para subsanar estos pendientes, así mismo se informa que el día lunes 5 de Septiembre a las 9 de la mañana se programa recorrido con la Profesional Social del Contratista a fin de realizar la correspondiente verificación de las reparaciones realizadas.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría.

Anexo: Registro fotográfico daños andenes.

CC: Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Anexo Registro Fotográfico.









Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 05 de septiembre de 2022

CINP–522–086–3585

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas,

De acuerdo con la normatividad vigente, incluida en el Programa de Implementación al Plan de Manejo Ambiental PIPMA, medidas de manejo, Componente D3 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE, se solicita realizar el correcto carpado de todas las volquetas que ingresan y salen de la obra, lo cual, a la fecha, no se está cumpliendo, pese a las continuas observaciones realizadas por parte de la interventoría tanto en el sitio de los trabajos como en los comités de obra.

Les requerimos tomar de la manera más pronta las acciones para corregir y mitigar dichas irregularidades. Es de aclarar que cualquier eventualidad o trámite asociado a esta falta, será entera responsabilidad del contratista.

Se anexa, registro fotográfico.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. -Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
-Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: APS
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

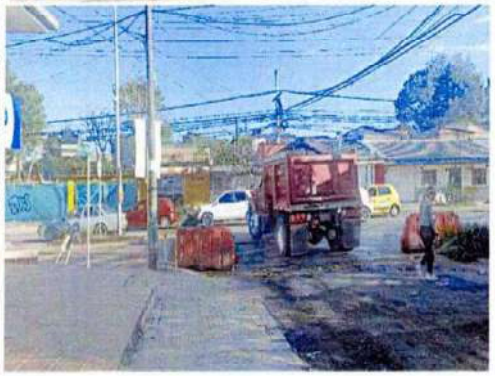
INP SERVICIOS SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 5 de septiembre de 2022

CINP–522–087–3586

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el informe semanal de interventoría No 20 correspondiente al periodo del 22 al 28 de agosto de 2022, del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría.

Anexo: Lo enunciado en un (1) archivo digital (4) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [X] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
INTERVENTOR:	INP SERVICIOS S.A.S.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO TOBAR

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	REFERENCIA /	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
23/08/2022	E-24217-052	ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
6/09/2022	E-24217-054	ENTREGA ENSAYOS MDC-19 AGOSTO 2022	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.

Firma:

Nombre: ANSELMO MARTINEZ A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-052

Bogotá, D.C., 23 de Agosto de 2022.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC.19

Respetado Ingeniero Martínez, por medio del presente comunicado, realizamos entrega del diseño de Mezcla Densa en Caliente MDC 19 de la planta de producción de mezcla asfáltica ubicada en la ciudad de Popayán, actualizado al mes de agosto de 2022 para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo archivo con diseño.

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Copia a la Alcaldía: Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo

Documentos anexos: Diseño de mezcla densa en caliente MDC.19 (1 archivo)

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-054

Bogotá, D.C., 06 de septiembre de 2022.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: Entrega ensayos MDC-19 agosto 2022.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los ensayos de mezcla asfáltica y agregados en frío correspondientes del mes de agosto de 2022.

Anexo ensayos de mezcla y agregados en frío

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Copia a la Alcaldía: Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo

Documentos anexos: Ensayos de laboratorio (2 carpetas)

ANEXO 8
INFORMES SEMANALES

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	INFORME	18
		FECHA	15/09/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	15 / 8	2022

Semana Número: 18 Del: 8 de agosto de 2022 Al: 14 de agosto de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 130 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,483%	49,500%	Obra Física Ejecutada (%)	2,905%	34,743%
Valor de la Obra programada:	$ 380.463.057,70	$ 4.200.923.581,39	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 254.193.051,00	2.946.568.989,37

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Contrato No:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor Inicial:	$ 8.486.769,110.00
Plazo Inicial:	Seis (6) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de octubre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No:	20221800011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 496.891.830,00
Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TECNICOS: Por solicitud de la Entidad y de acuerdo a reunión realizada en oficinas de la Secretaria de Tránsito el día 05-08-2022, se realizó recorrido para verificación del estado de las vías que posiblemente serán utilizadas en el PMT durante las obras que se ejecutarán en la Carrera 9 con Calle 18N que hacen parte de otro contrato de la Administración Municipal. Lo anterior, para realizar las adecuaciones correspondientes en las vías del PMT, estamos atentos a las indicaciones de la Entidad. Se terminan las actividades de fresado e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Carrera 10 entre Calles 16N y 18N. El acueducto realiza empalme en avanzada y válvula en la Carrera 11 Nte 12N-63. Previo a la intervención de obras en los barrios Yambitara y Villa Docente, los profesionales del área social realizan actividades de socialización de las obras que van ser ejecutadas en estos sectores. En la presente semana, se trabaja en el Barrio Villa Docente en la Calle 26N entre Carreras 4 y 4B, Calle 25AN entre Carreras 4 y 4B, Carrera 4A entre Calles 25 Bis Norte y 26N, Calle 25 Bis Norte entre Carreras 4 y 4A, Carrera 4B entre Calles 25AN y Calle 26BN, Calle 26BN entre Carreras 4 y 4B, realizando fresado, imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19, en las áreas donde se presentaba un elevado deterioro del pavimento.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 08 de agosto del 2022, por parte de la Interventoría componente PIPMA, se da aprobación al informe PIPMA mensual N°3, comprendido del 07 de junio al 06 de julio del 2022, por medio de correo electrónico.
El día lunes 08 de agosto del 2022, se realizó recorrido de verificación ambiental, en el sector Barrio Antonio Nariño y sector Boulevard, donde se revisó la instalación de la señalización preventiva, manejo de peleteros en puntos críticos, limpieza y aseo de la obra. Se informó al Contratista la necesidad de utilizar las lapiceras, para las diferentes actividades de la obra, especialmente preventivación y el personal que realiza limpieza con el soplador.
El día 09 de agosto de 2022, se solicitó realizar recorrido con el personal BOAL y ambiental contratista, para realizar verificación de limpieza, orden, aseo y recolección de materia sobrante, de igual forma se verifico en todas las vías habilitadas de los sectores Antonio Nariño y Boulevard, la necesidad de limpiar en algunas viviendas las paredes, baldosas y zócalos manchados con emulsión asfáltica. Se realiza llamado de atención para el personal técnico, informando la disposición total del personal BOAL cuando se requiera por parte del PIPMA.
En recorrido del día 11 de agosto, se evidencio, que no se esta realizando correctamente la clasificación y el manejo del punto ecológico. Se hizo la observación pertinente.
El día viernes 12 de agosto de 2022, el Contratista envía el informe PIPMA mensual N°4, por medio de correo electrónico, del periodo comprendido del 07 julio al 31 de julio del 2022, para la revisión por parte de la Interventoría.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No 18 comprendida del 8 al 14 de Agosto de 2022 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades. 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se realiza acompañamiento a la Profesional Social del Contratista, quien realiza actividades de socialización en cada una de las viviendas del sector a intervenir (Villa Docente), la actividad se realiza casa a casa de forma verbal y se realiza entrega del volante informativo aprobado por la Entidad Contratante; de forma permanente se continúan emitiendo comunicados por la emisora y por medio de las redes sociales de la Alcaldía, con el fin de que la comunidad en general se entere respecto de los lugares de intervención y cierres de vías, para que de esta forma tomen las vías alternas para su desplazamiento. 2. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: Se realiza acompañamiento a la Residente Social del Contratista, quien continúa realizando el registro fotográfico de fachadas y andenes de las viviendas residenciales contiguas al AID. Se presentó una solicitud de reparación de un anden, se dio el tramite pertinente a fin de que se lleve a cabo la correspondiente reparación. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: Tanto la Profesional Social del Contratista como de Interventoría, realizan acompañamiento en las labores de parcheo. La residente social del Contratista continúa al pendiente de las dudas, inquietudes o peticiones de las personas que transitan por los lugares en intervención, continúa realizando atención de forma personalizada a quienes requieren atención y orientación. Durante la semana correspondiente al presente informe, no se recibieron PQRS. Programa B4 Vinculación de Mano de Obra Local: El Contratista vincula la mano de obra tanto calificada como no calificada de acuerdo a la necesidad y actividades a realizar. La vinculación de mano de obra local, busca contribuir a la disminución de los niveles de desempleo en el Municipio.

ASPECTOS SST: Diariamente se verifica que toda la señalización del PMT se encuentre bien ubicada e instalada, y se contó con el apoyo de 2 personas para el manejo del tránsito de la zona de intervención. En el desarrollo de la semana, el Contratista realiza una actividad de capacitación de forma didáctica con el fin de mejorar las capacidades de trabajo del personal: dicha formación se hace en los ejes ambiental, social y SST. Hasta el momento, no se ha presentado ningún accidente laboral.

SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:

El comité de obra se programa para el día 16-08-2022.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 14,76%. Por medio de comunicado de la Interventoría No.CINPI–822–081–3270 Rad: 12-08-2022, se solicita al Contratista la implementación de dos frentes de obra independientes y se refiera la solicitud de presentar un plan de contingencia que detalle los recursos de personal y equipos que dispondrá para agilizar las obras del contrato, de tal forma, que se pueda lograr el cumplimiento del cronograma establecido, involucrando claramente, los dos frentes de obra independientes. Se realiza visita en obra de la Ing. Karina Belancourt Gómez, Secretaria de Infraestructura, con quien se define la totalidad de vías que serán intervenidas en los Barrios Yambitara y Villa Docente.

14,76%	ATRASO	equivalente a	$ 1.252.333.892

OBSERVACIONES

Las actividades de obra se desarrollan en horario diurno, iniciando trabajos a partir de las 5 am. Teniendo en cuenta la citación que realizó la Interventoría, el Representante Legal del Contratista en comité de obra realizado el día 02-08-2022, el Contratista solicitó vía whatsapp, aplazar la visita del Representante Legal para el comité de obra del próximo 16-08-2022. El Contratista informa que por problemas en la planta de asfalto, no hay suministro de mezcla asfáltica el día 09-08-2022. Las obras ejecutadas en el desarrollo del contrato, han mejorado considerablemente la movilidad vehicular en los sectores intervenidos, toda vez, que se han eliminado daños en el pavimento que dificultaban el tránsito de los vehículos. El día 11-08-2022, se recibe visita del Sr. Alcalde durante actividades de obra en el Barrio Villa Docente. El área de localización acumulada para intervenir es 47.160,32 m2.

INTERVENTORÍA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



Visita del Sr. Alcalde durante actividades de obra en el Barrio Villa Docente



Recorrido verificación de vias de PMT, para obras de la Carrera 9 con Calle 18N, según solicitud de la Entidad



Estado inicial pavimento deteriorado con fisuras y baches. Carrera 11 entre Calles 17N y 18N



Pavimento intervenido Carrera 11 entre Calles 17N y 18N



Estado inicial pavimento deteriorado con fisuramiento en piel de cocodrilo. Carrera 11 entre Calles 17N y 18N



Pavimento intervenido Carrera 11 entre Calles 17N y 18N

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado inicial pavimento con fisuras en piel de cocodrilo y hundimientos. Carrera 10 entre Calles 16N y 18N



Pavimento intervenido Carrera 10 entre Calles 16N y 18N



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Calle 26N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Calle 25 Bis Norte entre Carreras 4 y 4A Barrio Villa Docente



Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Calle 26AN entre Carreras 4A y 4B Barrio Villa Docente



Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Carrera 4B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Villa Docente

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Jornada de Socialización inicio de intervencion, atención de inquietudes de habitantes del sector de las obras y programación de actividades por parte del área social del Contratista con acompañamiento de la Interventoria.



Señalización instalada de acuerdo al PMT en los diferentes puntos de intervenidos.
Capacitación al personal en obra.



Recorrido verificación de limpieza de zonas verdes y áreas intervenidas. Orden, limpieza y aseo de la zona.
Conteo de señales dispuesto para el PMT.

	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	19
		FECHA	22/09/2022
		PAGINA	1 de 4

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	22	8	2022

Semana Número:	19	Del:	15 de agosto de 2022	Al:	21 de agosto de 2022
Suspensión No. 1:		Reinicio No. 1:			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	137 DIAS				
Nombre del Supervisor	ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,504%	54,004%	Obra Física Ejecutada (%)	4,296%	36,039%
Valor de la Obra programada:	$ 382.280.455,19	$ 4.503.200.036,59	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 364.605.635,80	3.313.194.525,17

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	
Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Interventor:**	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No	2021800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Contrato No	2022180001697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial	$ 8.464.780.110,00	Valor Inicial	$ 690.891.830,00
Plazo Inicial	Seis (6) meses	Plazo Inicial	Siete (7) meses
Fecha de Iniciacion	7 de abril de 2022	Fecha de Iniciación	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento	7 de octubre de 2022	Fecha de Vencimiento	7 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: Durante la presente semana, se realizan actividades de fresado de carpeta asfáltica, imprimación e instalación de capa de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19, en la Carrera 5B entre Calles 25N y 26BN, Calle 26N entre Carreras 5 y 6, Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 y Calle 26BN entre Carreras 5 y 6 en el Barrio Los Hoyos. De igual forma, se realizan estas actividades en la Calle 26DN entre Carreras 4 y 4A, Carrera 4B entre Calles 26CN y 26EN, en la Calle 27N entre Carreras 4 y 4B, y actividades de fresado de carpeta asfáltica en la Carrera 4B entre Calles 26EN y 30N, y en la Carrera 5 entre Calles 30N y 32N del Barrio Villa Docente y Yambitará. Los sectores intervenidos presentaban un elevado deterioro de la carpeta asfáltica, que dificultaba el tránsito de los vehículos. Recorrido en vías de los Barrios Villa Docente y Yambitará, con acompañamiento de personal de la empresa AAPSA, para verificación previa del estado de redes en los nuevos sectores que fueron priorizados por la Entidad en estos barrios.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día martes 16 de agosto de 2022, la Interventoría componente PIPMA, por medio de correo electrónico, envía observaciones al informe PIPMA mensual N°4, comprendido del 07 julio al 30 de julio.
El día miércoles 17 de agosto de 2022, se realizó visita a la obra, donde se evidenció nuevamente el mal manejo de los puntos ecológicos y la selección de sus elementos por parte de los trabajadores, de igual forma se evidenció que los trabajadores no tienen sus tapabocas de acuerdo a la actividad de cada uno. La interventoría hizo las observaciones pertinentes al Contratista.
El día jueves 18 y viernes 19 de agosto se realizó recorrido de verificación orden, limpieza y aseo de vías intervenidas en el sector del Barrio Solarte y Los Hoyos. El recorrido se realizó en conjunto con el contratista y personal BOAL.
El día jueves 18 de agosto de 2022, el Contratista envía las subsanaciones del informe PIPMA mensual N°4 (v2), por medio de correo electrónico, comprendido del 07 julio al 31 de julio del 2022, para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría.
El día jueves 18 de agosto del 2022, por parte de la Interventoría componente PIPMA, se da aprobación al informe PIPMA mensual N° 4 (v2), comprendido del 07 de julio al 30 de julio del 2022, por medio de correo electrónico.
El día sábado 20 de agosto, se realiza correo electrónico, solicitando personal BOAL en la obra o realizar limpieza en conjunto una vez se acabe la jornada para liberar las vías donde se realizaron trabajos. De igual forma, se reitera la necesidad de elaborar tapas de madera para tapar los sumideros cuando se esté realizando la pavimentación.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la semana No 19 del 15 al 21 de Agosto de 2022, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se realiza acompañamiento a la Profesional Social del Contratista, quien realiza actividades de socialización en cada uno de las viviendas del sector a intervenir (Yambitará, Los Hoyos, Villa Docente, Solarté), la actividad se realiza casa a casa de forma verbal y se realiza entrega del volante informativo aprobado por la Entidad Contratante, en las viviendas donde no se encuentran sus habitantes se realiza una segunda visita, si en la segunda visita aún no se encuentra ninguna persona, se deja el volante informativo. De forma permanente se continúan emitiendo comunicados por la emisora y por medio de las redes sociales de la Alcaldía, con el fin de que la comunidad en general se entere respecto de los lugares de intervención y cierres de vías, para que de esta forma tomen las vías alternas para su desplazamiento. 2. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: Se realiza acompañamiento a la Residente Social del Contratista, quien continúa realizando el inventariado del registro fotográfico de fachadas, andenes y antejardines de las viviendas residenciales contiguas al AID, se presenta una solicitud de reparación del borde de un anden, se realiza visita a la vivienda en compañía de la Secretaria de la Junta de Acción Comunal y se presenta la evidencia fotográfica del antes en la cual se ve el borde del anden fracturado y un tubo expuesto, no obstante, la Profesional Social del Contratista realiza el trámite perteniente a fin de que se lleve a cabo la correspondiente reparacion. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: Tanto la Profesional Social del Contratista como de Interventoría, realizan acompañamiento en las labores de parcheo. La residente social del Contratista continúa pendiente de las dudas, inquietudes o peticiones de las personas que transitan por los lugares en intervención, continúa realizando atención de forma personalizada a quienes requieren atención y orientación. Se realiza atención a miembros de la comunidad y de las Juntas de acción comunal que solicitan aclaración de inquietudes. Durante la semana correspondiente al presente informe, no se recibieron PQRS. Programa B4 Vinculación de Mano de Obra Local: El Contratista vincula la mano de obra tanto calificada como no calificada de acuerdo a la necesidad y actividades a realizar.

ASPECTOS SST: En el transcurso de la semana, el contratista hace entrega de elementos de protección personal a sus colaboradores, con el fin de que se proteja de forma directa la integridad física ante la exposición a los riesgos durante el desarrollo de las diferentes actividades de obra.
Se verificó la señalización en los tramos intervenidos, de acuerdo con el PMT aprobado, la cual es instalada con anterioridad al inicio de la jornada laboral, de tal forma, que se mínimice el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causado por la ejecución de la obra.
No ha ocurrido accidentes hasta la fecha.

SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:

Comite de obra 16-08-2022: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista, Interventoría y Secretaría de Tránsito. Se leen los temas del área social y ambiental consignados en un acta que se adjunta al comité. Se considera importante llevar un control detallado de los daños en redes de servicios públicos para el cruce de cuentas, se programará reunión para retomar este tema cada mes. Interventoría informe que se hizo recorrido en las vías posibles rutas de desvío para obras de la Cra. 9 con Calle 18N, quedando atento a las indicaciones de la Entidad para su intervención. Está pendiente atención del contratista de dotar de EPPs al personal cercano a la fresadora y finisher. El segundo frente de intervención no ha sido implementado, la Interventoría deja constancia que citó al Representante Legal a este comité para tratar temas relacionados con el atraso en las obras y la implementación del segundo frente de intervención, pero el Representante Legal no cumplió con la asistencia al comité. La Interventoría reitera la solicitud de cumplir con los compromisos contractuales y el cronograma dentro del plazo contractual, y la presentación del plan de contingencia ligado necesariamente a un segundo frente adicional. Se solicita al contratista disponer en obra de carrotanque de agua para la fresadora, bobcat para el fresado y mantener en obra la manilla para la actividad de imprimación. Se hace la solicitud de realizar mantenimiento a los sumideros que se encuentran colmatados en los tramos intervenidos. Se programa para el día 17-08-2022, visita con personal de acueducto para revisión de nuevos tramos priorizados en el Barrio Yambitará y Villa Docente.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 2021800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 2022180001697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución.
Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 14,96%. Por medio de comunicado de la interventoría No.GINP-522-064-3351 Rad 19-08-2022, la Interventoría reitera la solicitud al Contratista, de cumplimiento a la CLAUSULA 9: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, Numeral 2 f) El Contratista deberá contar con mínimo dos (2) frentes de trabajo al tiempo con personal y maquinaria propios cada uno, expresado en diferentes y repetidas oportunidades, mediante comunicados dirigidos al Contratista y en comités de obra.

14,96%	ATRASO	equivalente a	$ 1.270.011.511

OBSERVACIONES

Las actividades de obra se desarrollan en horario diurno, iniciando trabajos a partir de las 5 am. De acuerdo con lo programado, se realizó comité de obra el día 16-08-2022, fecha en la cual se citó al Representante Legal del Contratista, para tratar temas relacionados con el atraso en la ejecución de las obras del contrato, y la implementación de dos frentes de obra independientes, sin embargo, el Representante Legal Sr. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO, no cumplió a la citación realizada por la Interventoría. El área de localización acumulada para intervenir es 51.414,22 m2.

INTERVENTORIA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



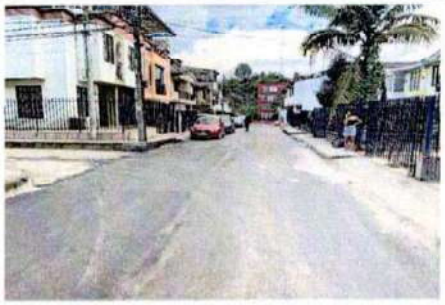
Comité de obra 16-08-2022 en oficinas de la Secretaria de Infraestructura. Asiste Entidad, Contratista, Interventoria y Secretaría de Tránsito.



Recorrido en vías de los Barrios Villa Docente y Yambitará, con acompañamiento de personal de la empresa AAPSA, para verificación previa del estado de redes



Estado inicial pavimento con baches. Calle 26 N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente



Pavimento intervenido Calle 26 N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente



Estado inicial pavimento deteriorado con presencia de baches. Calle 26 AN entre Carreras 4A y 4B



Pavimento intervenido Calle 26 AN entre Carreras 4A y 4B

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado inicial pavimento con piel de cocodrilo y baches. Carrera 5B entre Calles 26N y 26AN. B/. Los Hoyos



Pavimento intervenido Carrera 5B entre Calles 26N y 26AN. B/. Los Hoyos



Estado inicial pavimento deteriorado Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Barrio Los Hoyos



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Barrio Los Hoyos



Estado inicial pavimento deteriorado Carrera 5B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Los Hoyos



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Carrera 5B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Los Hoyos

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	19
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	22/08/2022
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	4 de 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL





Atención a la comunidad, miembros de Juntas de Accion Comunal y actividad de levantamiento de registro fotográfico de andenes, fachadas y antejardines





Uso adecuado de los elementos de protección personal, de acuerdo a las actividades realizadas en obra.
Instalación de señalización en los sectores intervenidos








Acompañamiento a comité de obra por parte del área ambiental, recorrido verificación de limpieza de sectores intervenidos.
Recorrido para identificación de áreas donde se debe realizar limpieza y verificación de canecas para disposición de basuras.

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	20
		FECHA	29/08/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	29	8	2022

Semana Numero: 20 Del: 22 de agosto de 2022 Al: 28 de agosto de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 144 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YIO MANTENIMIENTO YIO MEJORAMIENTO YIO CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,504%	58,508%	Obra Física Ejecutada (%)	4,028%	43,368%
Valor de la Obra programada:	$ 362.283.455,19	$ 4.965.486.491,76	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 367.302.460,10	$ 3.680.526.985,27

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YIO MANTENIMIENTO YIO MEJORAMIENTO YIO CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor inicial:	$ 8.466.780.110,00
Plazo Inicial	Seis (6) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de octubre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YIO MANTENIMIENTO YIO MEJORAMIENTO YIO CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20221800011697 DE MARZO DEL 2022
Valor inicial:	$ 496.891.830,00
Plazo Inicial	Siete (7) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: En la semana del presente informe, se realizó actividades de demarcación de áreas de intervención en vías priorizadas por la Entidad, ubicadas en la Carrera 2 entre el sector del Morro y la Calle 15N, Carrera 2A entre Calle 3N y Carrera 2 Sector Facultad de Educación, Calle 3N entre Carreras 2A y 4, Calle 2N entre Carreras 3 y 4, y Carrera 4 entre Calles 1N y 3N. Actividades de fresado de carpeta asfáltica, imprimación e instalación de capa de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19, en la Carrera 4A entre Calles 26DN - 26EN - 27N, Calle 26CN entre Carreras 4B y 5, Carrera 4B entre Calles 26DN y 30N, Carrera 5 entre Calles 30N y 34N, Calle 32N entre Carreras 5 y 6 en las calzadas norte y sur, se termino la Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN, Calle 30N entre Carreras 4A y 4B (parcial), Calle 31N entre Carreras 4A y 5 (parcial) en los Barrios Villa Docente y Yambitará, Calle 31N entre Carreras 5C y 6E del Barrio Alcanfor, Calle 2N entre Carreras 3 y 4, y Carrera 4 entre Calles 1N y 3N solo fresado. Se recibió visita de funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, para revisar previamente a la ejecución de obras, el estado de las redes existentes en el sector de las obras, dando su visto bueno.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 22-08-2022, se realiza acompañamiento el personal BOAL, a las cuadras habilitadas del Barrio Yambitará, donde se realiza inspección, limpieza y aseo, con personal de la obra.
El día martes 23 de agosto de 2022, la interventoria componente PIPMA, por medio de correo electrónico envía informe PIPMA mensual N°4, comprendido del 07 julio al 30 de julio a personal de la Alcaldía encargado.
El contratista da respuesta el día martes 23-08-2022, a requerimiento enviado por interventoria el día sábado 20 de agosto solicitando más personal BOAL en la obra o realizar limpieza en conjunto, una vez se acabe la jornada laboral para liberar las vías que fueron intervenidas, envía registro fotográfico como evidencia e informa que se solicita a los directores la necesidad de más personal BOAL, lo cual será realizado.
En recorrido del día miércoles 24-08-2022, se realizó la observación al contratista, sobre la falta de cargado de la volqueta placa SDL 070, al sitio de la obra con material fresado a talleres Municipal, el contratista realiza su respectivo llamado de atención al supervisor de dicha actividad. De igual forma, el personal que estaba realizando imprimacion no portaba su respectivo tapabocas, donde se les pregunta personalmente y ellos responden que no los han dotado. Inmediatamente se informa a la profesional encargada. Se realiza charla al personal sobre manejo de residuos de obra.
El día jueves 25 de agosto de 2022, se realiza recorrido de las vías habilitadas del Barrio Yambitará, Villa Docente y Los Hoyos, rematando su limpieza, orden y aseo, con acompañamiento del profesional ambiental de contratista y personal BOAL.
El día viernes 26 de agosto, se realiza reunión presupuesto PIPMA, contratista e interventoria.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 20 del 22 al 28 de Agosto de 2022 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Se realiza acompañamiento a la Profesional Social del Contratista, quien continúa llevando a cabo la socialización en las viviendas del área de influencia del proyecto en el sector a intervenir (Yambitará y Villa Docente), la socialización se realiza casa a casa de forma verbal, entregando el volante informativo aprobado por la Entidad Contratante, en las viviendas donde no se encuentran sus habitantes se realiza una segunda visita, si en la segunda visita aun no se encuentran sus habitantes se deja el volante informativo. Como parte de las socializaciones, se sugiere a los residentes cubrir sus andenes y antejardines a fin de evitar manchas por la aplicación de la emulsión que hace parte del proceso de parcheo, con el entendido de que el contratista realiza la actividad cubriendo estos espacios para evitar ensuciar las viviendas. De forma permanente, se continúan emitiendo comunicados por la emisora y por medio de las redes sociales de la Alcaldía, con el fin de que la comunidad en general se entere respecto de los lugares de intervencion y cierres de vías, para que de esta forma tomen las vías alternas para su desplazamiento. Durante la presente semana, se realizo la instalación de un pasacalles en el sector Yambitará - Villa Docente. 2. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: Se realiza acompañamiento a la Residente Social del Contratista, quien continúa realizando el levantamiento del registro fotográfico de fachadas, andenes y antejardines de las viviendas residenciales contiguas al AID, las solicitudes de reparaciones son atendidas por la profesional social del contratista quien las remite al profesional encargado para la programación de la correspondiente actividad, se solicita que antes de salir del sector deben quedar subsanadas todas y cada una de las solicitudes. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: Tanto la Profesional Social del Contratista como de Interventoria, realizan acompañamiento en las labores de parcheo. La residente social del Contratista continua al pendiente de las dudas, inquietudes o peticiones de las personas que transitan por los lugares en intervención, continúa realizando atencion de forma personalizada a quienes requieren atención y orientación. Se realiza atencion a miembros de la comunidad y de las Juntas de accion comunal que solicitan adoracion de inquietudes. Durante la semana correspondiente al presente informe, no se recibieron PQRS. Programa B4 Vinculación de Mano de Obra Local: El Contratista vinculo la mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo a la necesidad y actividades a realizar.

ASPECTOS SST: Dando continuidad a los procesos de fortalecimiento de la brigada de emergencias, el contratista instala la camilla de emergencias, que tiene como finalidad poder dar una atención inmediata ante una situación de emergencias y/o riesgos en el desarrollo de la obra.
Se continúa con el buen uso de los elementos de protección personal, por parte de los colaboradores del contratista.
Diariamente se verifica la instalación de la señalización con base en el PMT en los diferentes vías intervenidas.
Hasta el momento, no se han presentado accidentes.

SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:

Comité de obra 23-08-2022: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaria de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista, Interventoria y Secretaria de Tránsito. Se habla de realizar actividades correctivas en el sector del Terminal de Transporte, se programa realizar apiques y/o sondeos a mayor profundidad para establecer la causa del asentamiento prematuro que se observa y que se debe corregir. El contratista manifiesta que no estuvo de acuerdo con la intervención completa en el sector del Terminal, la Interventoria hace la claridad que previamente a la intervención, la Entidad realizó tres (3) apiques que evidenciaron malas condiciones de la estructura existente y con base en esa exploración recomendo el cambio de la base granular. Se programa toma de muestras de mezcla asfaltica de manera conjunta, para el día 30-08-2022. Durante los apiques en el sector del Terminal, se tomará muestras de la base granular. La interventoria solicita al contratista realizar laboratorios de mezcla asfáltica y base granular de Parmiga, en un laboratorio externo diferente al de la planta, para verificación de resultados. Se tomarán muestras para la Entidad. La Interventoria reitera la solicitud de cumplir por parte del contratista, la cláusula del contrato que indica la implementación de dos frentes de obra independientes. El contratista informa que está en la consecución de las maquinas, para tener este segundo frente en el mes de septiembre. Porcentaje programado 54%, porcentaje ejecutado 39,04%, atraso 14,96% ($ 1.270.011.512). Se informa que se realizó recorrido para demarcación de áreas de intervención en el sector de Ingeniería Civil, Tulcán, Facultad de Educación y vías junto al Río Molino que fueron autorizadas por la Entidad, Calle 2N entre Cra. 3 y 4, Calle 3N entre Cra. 3 y 4, y Carrera 4 entre Calles 1N y 3N. El contratista presento nuevo diseño de mezcla asfáltica MDC-19. Se solicita al contratista terminar perches pendientes, se recomienda al contratista agilizar intervención en vía de Barrio La Paz Cra. 6 entre Calles 65N y 70BN antes del periodo de lluvias. Se menciona que se terminaron obras en el Barrio Los Hoyos y que se trabaja en los Barrios Yambitará y Villa Docente. Se leen los temas del área social y ambiental, se informa sobre dos pasacalles instalados en sector Champagnat y Barrio Santa Clara. Se informa al representante de Tránsito, sobre los próximos tramos a intervenir en el sector de Ingeniería Civil, Facultad de Educacion y vias cercanas al Rio Molino.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoria No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de Inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 15,14%. En comité de obra del día 23-08-2022, la interventoria reitera la solicitud al contratista, de cumplir la cláusula del contrato que indica la implementación de dos frentes de obra independientes. Se realizaron actividades de demarcación de áreas de intervención en vías priorizadas, y se incluyeron nuevos tramos viales priorizados por la Entidad para ser intervenidos.

15,14%	ATRASO	equivalente a	$	1.284.962.507

OBSERVACIONES

Las actividades de obra se desarrollan en horario diurno, iniciando trabajos a partir de las 5 am. El día 25-08-2022, el Sr. Alcalde realiza reunión con la comunidad en el Barrio Yambitará, para dar a conocer sobre las obras del contrato ejecutados en los Barrios Yambitará, Los Hoyos y Villa Docente. Se realizó visita al sector del Terminal (Ritmo 60), para toma de muestras de laboratorio. El área de socialización acumulado para intervenir es 55.277 m2.

INTERVENTORÍA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ M.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



Comité de obra 23-08-2022 en oficinas de la Secretaría de Infraestructura. Asiste Entidad, Contratista, Interventoría y Secretaría de Tránsito.



Reunión del Sr. Alcalde con la comunidad, en el Barrio Yambitará, para dar a conocer obras ejecutadas en los Barrios Yambitará, Los Hoyos y Villa Docente.



Estado inicial fisuras en piel de cocodrilo y baches. Calle 27N entre Carreras 4 y 4B. Barrio Villa Docente



Pavimento intervenido Calle 27N entre Carreras 4 y 4B. Barrio Villa Docente



Estado inicial pavimento deteriorado. Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN. Barrio Villa Docente



Pavimento intervenido. Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN. Barrio Villa Docente

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



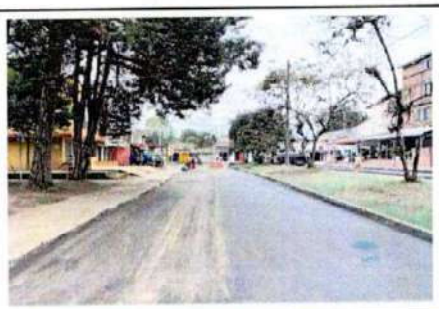
Pavimento intervenido Calle 26BN entre Carreras 4A y 4B. Barrio Villa Docente



Pavimento intervenido Carrera 4B entre Calles 26DN y 27N. Barrio Villa Docente



Pavimento intervenido Carrera 5 entre Calles 27N y 32N. Barrio Yambitará



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 Calle 32N entre Cra. 5 y 6 calzadas norte y sur. Barrio Yambitará



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 Calle 31N entre Carreras 6C y 6E del Barrio Alicante



Inspección redes de alcantarillado, personal de AAPSA, previo al inicio de obras. Cra. 4 entre Calles 1N y 3N

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	20
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	29/08/2022
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	4 de 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL





Actividad de levantamiento de registro fotográfico de fachadas y andenes, y atención a la comunidad y miembros de Juntas de Accion Comunal por parte de los profesionales sociales del Contratista y de la Interventoria. Instalación de Pasacalles Sector Yambitara - Villa Docente






Instalación de camilla de emergencias en la obra
Instalación adecuada de señalización de acuerdo al PMT
Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal por parte de los colaboradores del contraista








Requerimiento al contratista por carpado de volquetas. Orden, aseo y limpieza de la zona. Recorrido verificación de limpieza de obra en vias habilitadas. Limpieza con personal BOAL en vias intervenidas.

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	21
		FECHA	5/09/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — FECHA: 5 / 9 / 2022

Semana Numero: 21 Del: 29 de agosto de 2022 Al: 4 de septiembre de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 151 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,504%	63,013%	Obra Físico Ejecutada (%)	3,923%	47,290%
Valor de la Obra programada:	$ 382.283.455,19	$ 5.347.772.946,97	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 332.894.965,00	4.013.421.850,27

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor Inicial:	$ 8.486.789.110,00
Plazo Inicial	Seis (6) meses
Fecha de Iniciación	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de octubre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S
Contrato No.	20221800011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 406.891.530,00
Plazo Inicial	Siete (7) meses
Fecha de Iniciación	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento	7 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: En la presente semana, se termina la actividad de demarcación de áreas de intervención en vías priorizadas por la Entidad, ubicadas en la Carrera 2 entre el sector del Morro y la vía de acceso a Posgrados de Ingeniería Civil. Se realiza la imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en la Carrera 4 entre Calles 1N y 3N y se termina la instalación de mezcla asfáltica en la Calle 2N entre Carreras 3 y 4. Posteriormente, se efectúa el fresado de carpetas asfáltica que se encuentre en mal estado, transporte de material de fresado, imprimación y colocación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica en la Calle 3N entre Carrerra 2A, 3 y 4, Carrera 2A entre Calle 3N y Carrera 2 Sector Facultad de Educación, y Carrera 2 entre El Morro y la Calle 15N frente a las instalaciones de Tulcán y Facultad de Ingeniería Civil. Los sectores intervenidos presentaban un elevado deterioro del pavimento, especialmente las vías aledañas al Río Molino en donde se realiza el reemplazo total de la carpeta asfáltica, al igual que las vías frente a la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. Se realiza visita en nuevos sectores priorizados por la Entidad, ubicados en la intersección de la Calle 17 con Carrera 3BE del Barrio Los Sauces y la Autopista Carrera 17 entre Glorieta de la Chimenea y la Piedra Sur, como próximos tramos a intervenir.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 29 y miercoles 31 de agosto, se realiza capacitación al personal de la obra en diferentes temas, entre ellos componente PIPMA.
El día miércoles 31 de agosto, se realiza solicitud al contratista por medio de correo electrónico, de arreglo de andenes que fueron afectados durante las actividades de obra.
El día jueves 01 de septiembre de 2022, se realizó visita en vías habilitadas para verificación de orden, limpieza y aseo. De igual forma, se requirió la limpieza de varios sectores en los cuales se encontraba material de fresado y asfalto. Se informa la necesidad de controlar el manejo de la imprimación, debido a que se evidenció el riego de esta sobre pavimento y sumideros.
El viernes 02 de septiembre del 2022, se realizó recorrido en conjunto con la profesional ambiental del contratista, donde se retiró la observación de la incorrecta clasificación de residuos del punto ecológico en la obra. De igual forma, se realizó nuevamente el llamado de atención al personal que realiza la imprimación, toda vez que no portaba su respectivo tapabocas. Se les pregunta personalmente y ellos responden que la dotación solo les sirve para un día. Se requiere la limpieza del espacio público de la entrada a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del Cauca.
Finalmente, se evidencia que la volqueta que está saliendo de la obra (placa WFV 217) con material de fresado, no está siendo cargada y esto podría causar alguna eventualidad al realizar su trasporte. Al respecto, la interventoría solicitó el cargado de todas las volquetas que llegan y salen de la obra.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 21 del 29 de Agosto al 4 de Septiembre de 2022, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgacion e información a la Comunidad. Se realiza socialización en las viviendas del área de influencia del proyecto en los sectores a intervenir Antiguo Liceo y Facultad de Educacion Universidad del Cauca, la socialización se realiza de forma verbal casa a casa, en horario de cafeterías y fotocopiadoras, entregando adenás, el volante informativo aprobado por la Entidad Contratante. En las viviendas donde no se encuentran sus habitantes se realiza una segunda visita, si en la segunda visita aún no se encuentra a sus habitantes, se deja el volante informativo. Como parte de las socializaciones, se sugiere a los residentes cubrir sus andenes y antejardines a fin de evitar manchas por la aplicacion de la emulsion que hace parte del proceso de parcheo, con el entendido de que el contratista realiza la actividad cubriendo estos espacios. De forma permanente, se continúan emitiendo comunicados por la emisora y por medio de las redes sociales de la Alcaldía, con el fin de que la comunidad en general se entere respecto de los lugares de intervencion y cierres de vías, para que de esta forma tomen las vías alternas para su desplazamiento. 2. Programa B2 Restitucion de Bienes Afectados. Se realiza acompañamiento a la Residente Social del Contratista, quien continúa realizando el levantamiento del registro fotográfico de fachadas, andenes y antejardines de las viviendas residenciales contiguas al AID, se envía correo solicitando la subsanacion de las reparaciones pendientes en los Sectores Antonio Nariño (Reparacion de Anden), Yombalá (Reparacion de Anden), Los Hoyos (Reparacion de Cana), Antiguo Liceo (Reparacion de Andenes) y Empedrado (Reparacion de Anden), se programa recorrido con la Profesional Social del Contratista a fin de verificar las reparaciones para el dia martes 6 de Septiembre de 2022. Nuevamente se solicita al contratista, que antes de salir de los sectores en los cuales se realizan las intervenciones, deben quedar subsanadas todas y cada una de las solicitudes. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: Tanto la Profesional Social del Contratista como de Interventoria, realizan acompañamiento en las labores de parcheo. La residente social del Contratista continúa al pendiente de las dudas, inquietudes o peticiones de las personas que transiten por los lugares de intervencion, continua realizando atención de forma personalizada a quienes requieren atención y orientación. Se realiza atención a miembros de la comunidad y de las Juntas de accion comunal que solicitan aclaracion de inquietudes. Durante la semana correspondiente al presente informe, no se recibieron PQRS. Programa B4 Vinculación de Mano de Obra Local. El Contratista vincula la mano de obra tanto calificada como no calificada de acuerdo a la necesidad y actividades a realizar.

ASPECTOS SST: Durante la presente semana, diariamente se procede con la instalación de la señalización de acuerdo al PMT aprobado, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores y personal de obra.
El contratista por medio de su responsable de SST, al inicio de la jornada diaria da instrucciones generales sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y los cuidados que se deben tener con el entorno donde se ejecutan las actividades de obra.
El personal colaborador del contratista, hace buen uso de los elementos de protección personal, cuya función principal es proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.
Hasta el momento, no se han presentado accidentes laborales.

SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:

Comité de obra: Se reprograma comité de obra para el próximo 06-09-2022.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoria No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato del 15,72%. En comité de obra del dia 23-08-2022, la interventoría realiza la solicitud al contratista, de cumplir la ejecución del contrato que indica la implementación de dos frentes de obra independientes. Se realizaron actividades de demarcación de áreas de intervención en vías priorizadas, y se incluyeron nuevos tramos viales priorizados por la Entidad para ser intervenidos.

15,72%	ATRASO	equivalente a	$	1.334.351.097

OBSERVACIONES

Las actividades de obra se desarrollan en horario diurno, iniciando labores a partir de las 5 a.m. El día 31-08-2022, se recibe visita del Sr. Alcalde, durante actividades de obra realizadas en el sector de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. Atendiendo indicaciones de la Entidad, se realiza la identificación y demarcación de áreas de intervención en la intersección de la Calle 17 con Carrera 3BE del Barrio Los Sauces, donde se tiene programado realizar actividades de señalización, por parte de la Secretaría de Tránsito. El área de localización acumulado para intervenir es 56.295,78 m2.

INTERVENTORIA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



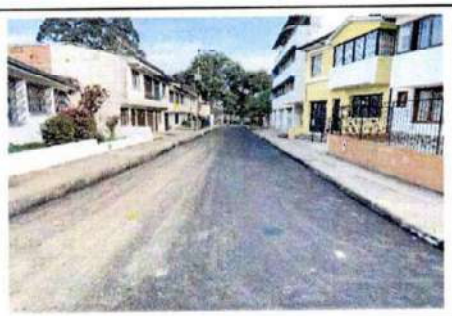
Visita del Sr. Alcalde el día 31-08-2022, durante actividades de obra realizadas en el sector de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca.



Reunión en obra sector Facultad de Educación, con Ingenieros de la Secretaria de Tránsito para revisión de PMT propuesto




Estado inicial pavimento totalmente deteriorado. Calle 2N entre Carreras 3 y 4



Pavimento intervenido Calle 2N entre Carreras 3 y 4 mediante instalación de carpeta asfáltica MDC-19



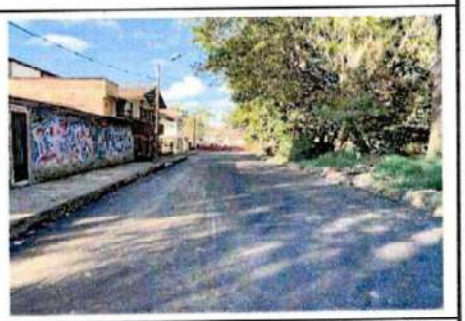Estado inicial pavimento deteriorado. Carrera 4 entre Calles 1N y 3N.



Pavimento intervenido. Carrera 4 entre Calles 1N y 3N.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado inicial pavimento deteriorado. Calle 3N entre Carreras 3 y 4



Pavimento intervenido Calle 3N entre Carreras 3 y 4, con instalación de carpeta asfáltica MDC-19



Estado inicial pavimento con fisuras en piel de cocodrilo y baches en la Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N



Pavimento intervenido Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N, con instalación de carpeta asfáltica MDC-19



Estado inicial pavimento con baches en la Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N Sector Facultad de Educación



Pavimento intervenido Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N, mediante instalación de mezcla asfáltica MDC-19

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL






Actividad de socializacion a la comunidad sector antiguo Liceo, realizada por las profesionales sociales del contratista e Interventoria. Levantamiento de registros fotográficos de fachadas y andenes sector antiguo Liceo y Facultad de Educacion Universidad del Cauca





Instalación adecuada de señalización de acuerdo al PMT
Charlas diarias al personal por la responsanble SST contratista
Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal por parte de los colaboradores del contraista






Verificación Actividades PIPMA, capacitación al personal de obra, limpieza y aseo de obra, medidas preventivas durante la actividad de aplicación de emulsión asfáltica para evitar ensuciar andenes y paredes

ANEXO 9
INFORMES PIPMA

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No. 05

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO No. 20221800011697 de marzo del 2022









POPAYÁN, SEPTIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVOS 6

1.1 OBJETIVO GENERAL 6

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 7

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 8

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS 8

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, D, E Y F 9

. 9

3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental 9

Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental 9

Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA) 10

3.2.2 COMPONENTE B – GESTIÓN SOCIAL 13

Programa B1: Divulgación e información a la comunidad. 13

Programa B2: Restitución de bienes afectados. 17

Programa B3: Atención y participación ciudadana 18

Programa B4. Vinculación de mano de obra. 20

Programa B5: Capacitación del personal de obra. 25

Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas 26

3.2.3. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción 26

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 27

Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte 27

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas 29

Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra 29

Programa D6: Manejo de aguas superficiales 32

Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos 32

Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido 33

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos 34
3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 35
Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo 35
Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción 40
3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico 41
Programa F2: Manejo de Tráfico 42

4. PRESUPUESTO PIPMA 43

LISTA DE TABLAS

Pág.

TABLA 1 DATOS BÁSICOS DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y DE OBRA.. 7
TABLA 2 PROFESIONALES IMPLEMENTACIÓN DE PIPMA 09
TABLA 3 CAPACITACIONES ÁREA AMBIENTAL 10
TABLA 4 SOCIALIZACIONES. 12
TABLA 5 RELACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO.....15
TABLA 6. PQRS.....18
TABLA 7. REPARACIONES 20
TABLA 8 PERSONAL EDIFICACIONES Y VÍAS SAS.....17
TABLA 9 SUB – CONTRATISTAS 19
TABLA 10. PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN 19
TABLA 9. RELACIONES PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO.....20
TABLA 10. PLAN DE CAPACITACIÓN MENSUAL..... 21
TABLA 11. MATERIALES Y ESCOMBROS GENERADOS..... .22
TABLA 12 LISTADO DE MAQUINARIA DE OBRA. 23
TABLA 13. VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS..... 26
TABLA 14 INDUCCIONES Y CAPACITACIONES..... 34
TABLA 15 ELEMENTOS PLAN DE EMERGENCIA..... 35

INTRODUCCIÓN

El Alcalde Juan Carlos López Castrillón como representante legal del Municipio de Popayán, mediante contrato N° 202218000242 del 2021 adjudico el proyecto MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021.

De acuerdo a lo anterior se realizó el proceso de licitación Pública para la ejecución de la interventoría cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021", el cual se adjudicó al contratista de Interventoría **INP SERVICIOS S.A.S**. el cual fue adjudicado al por medio del Contrato No. 20221800011697 de marzo del 2022 ,con un plazo de ejecución inicial meses (06) meses.

La contratación de la interventoría se realizó con el objeto de ejecutar la supervisión y seguimiento externo al contrato de obra, así como también para propender por un cumplimiento adecuado y oportuno de su respectivo objeto.

Para dar cumplimiento a los requisitos contractuales INP SERVICIOS SAS elaboro el presente informe de seguimiento y evaluación de la Gestión Socio-Ambiental desarrollada por el Contratista de Obra EDIFICACIONES Y VÍAS S.A durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022, verificando el cumplimiento de las obligaciones socio-ambientales durante el periodo mencionado anteriormente.

A continuación, se presenta toda la información sobre el seguimiento de la implementación del plan de manejo ambiental presentado por el contratista de obra en sus componentes ambiental, social, SST y manejo de tráfico.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar a la Alcaldía del Municipio de Popayán, el informe número 05 del seguimiento a la gestión socio ambiental desarrollada por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los resultados del seguimiento a las actividades socios ambientales desarrollados para minimizar, prevenir y compensar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras en los lugares intervenidos.

- Demostrar el seguimiento a las actividades de carácter ambiental, social y SST, implementadas para el cumplimiento del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambienta- PIPMA de este proyecto.

2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

En la Tabla No. 1 se presenta la información básica de los contratos de interventoría y de obra.

Tabla 1 Datos básicos de los contratos de interventoría y de obra.

CONTRATANTE:	Alcaldía Municipal de la Ciudad de Popayán.	
ENTIDADES	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No:	20221800011697 de marzo del 2022	20211800024217 de diciembre de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"
CONTRATISTA:	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S.
PLAZJECUCIÓN:	06 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO	06 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los sectores intervenidos en el periodo del informe

Hostal Casa Grande
Carera 9 A Carrera 11
Carrera 9 A Carrera 10
Calle 14 N A calle 15 N
Calle 16 N
Carrera12 A Carrera 1
Carrera 11 carrera 10
Calle 15 N
Carrera 10 y 11
Calle 16 N y 17 N
Calle 17 N Y 18 N
Calle 17 N A CALLE 17
Calle 16 N CALLE 17 N
Carrera 4 A Carrera 5
Carrera 4 A Carrera 4 B

Calle 25 B Calle 28
Carrera 4 a Carrera 5
Carrera 4 A Carrera 4 B
Calle 26 BN A Calle 26 CN
Calle 25 N A Calle 26 CN
Carrera 5 B A Carrera 6
Carrera 5 A Carrera 6
Calle 26 A N A Calle 26 BN
Carrera 5 A Carrera 4 B
Calle 26 C A Calle 26 D
Carrera 26 D A Calle 26 E

El desarrollo de las actividades constructivas que ejecutó la empresa Edificaciones y Vías SA, tiene como área de influencia directa las 9 comunas de la Ciudad de Popayán, en la que se encuentran los barrios, Antonio Nariño. Yambitara, Los Hoyos, Villa Docente y Barrio Antiguo Liceo.

3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Contratista entregó la versión No. 1 del informe de gestión socio ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022, por medio de correo electrónico el día 05 de septiembre, la interventoría envía observaciones el día 08 de septiembre, el contratista resuelve las observaciones y las entrega V2 el día 09 septiembre, la interventoría envía nuevamente observaciones del informe V2 al contratista, el contratista resuelve las observaciones y adjunta informe V3 el día martes 13 de septiembre de 2022, enviando aprobación por medio de correo electrónico el día miércoles 14 de septiembre.

En los siguientes ítems se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el marco de seguimiento de los componentes socio ambientales durante el período en cuestión.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS

A continuación, se relacionan las actividades generales ejecutadas en los Componentes Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y de Señalización como parte del seguimiento al PIPMA.

- Durante el periodo el realizó visitas diarias a los frentes de obra habilitados, donde se realizó el seguimiento e inspección al cumplimiento de las actividades socio ambientales desarrolladas por el contratista de obra.

- Se realizó recorridos diarios en conjunto con el personal del contratista en las áreas correspondientes al plan de manejo ambiental establecido para la ejecución de las actividades. Lo anterior con el objetivo de la verificación del cumplimiento de lo establecido en los temas ambientales, sociales y SST.
- Visitas de seguimiento e inspección semanal en conjunto con personal del contratista.
- Seguimiento al personal dispuesto en obra y su afiliación al sistema integral en salud.
- Revisión y seguimiento de PQRS que se generaron durante el periodo correspondiente al presente informe.
- Inspección de retiro de señalización.
- Revisión semanal de formatos implementados por el contratista de obra para el cumplimiento socio ambiental.
- Diligenciamiento de formatos de interventoría.
- Seguimiento a disposición de escombros, orden, aseo y limpieza de la obra.

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, D, E Y F

.

3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental

Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental

Para este periodo INP SERVICIOS SAS realizó el seguimiento, inspección, control y acompañamiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra dando cumplimiento a los programas que conforman el PIPMA.

Se verificó la vinculación de los profesionales del contratista encargados de ejecutar las actividades socio-ambientales de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones, para este periodo el contratista cumplió con la contratación total del personal según lo establecido contractualmente.

De igual forma hubo plena participación en comités de obra (2 de agosto, 16 de agosto y 23 de agosto 2022) mesas de trabajo y recorridos programados por parte de la Alcaldía de Popayán y contratista en los cuales se evaluó el avance de la gestión ambiental del proyecto, se expusieron observaciones, compromisos y recomendaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el PIPMA.

Tabla 2 Profesionales implementación de PIPMA

INTEGRANTES EQUIPO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SST		
NOMBRE	**CARGO**	**RESPONSABILIDAD**
Anderson Viveros	Director de obra.	Aprobación de recursos, coordinación, seguimiento y control a la ejecución del PIPMA.
Sirlena Medina Plaza	Residente Ambiental de Obra.	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental.
Cristina Quilindo Arboleda	Residente Social de Obra	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión social.
Claudet Guerrero Pacheco	Residente S.S. T	Apoyo en la ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental, ejecución de PSO y cumplimiento de la normatividad SST aplicable al proyecto.
Laura Pilar Velasco Vásquez.	Auxiliar S.S. T	Apoyo en la ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental, ejecución de PSO y cumplimiento de la normatividad SST aplicable al proyecto.

Fuente: Edificaciones y Vías SA

Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA)

A continuación, se enuncian las charlas y/o capacitaciones dadas al personal de obra durante este periodo

Tabla 3 Capacitaciones área ambiental

N°	TEMA	METODOLOGIA	LUGAR	FECHA	DIRIGIDO A	RESPONSABLE
SST						
1	Riesgo Psicosocial	Capacitación	Obra	9 de agosto del 2022	Todo el personal	**Área SST/Social**
2	Riesgo mecánico en el trabajo y su clasificación	Capacitación	Obra	25 de agosto del 2022	Todo el personal	**Área SST**
3	Socialización del MEDEVAC	Capacitación	Obra	30 de agosto 2022	Todo el personal	**Área SST**
AMBIENTAL						
1	Importancia de la biodiversidad	Capacitación	Obra	9 de agosto del 2022	Todo el personal	**Área Ambiental**

SOCIAL						
1	Valores humanos	Capacitación	Obra	9 de agosto del 2022	Todo el personal	**Área social**

De igual forma se realizaron las siguientes capacitaciones y charlas diarias con el personal del área SST:

FECHA	TEMA DE CHARLA	N° PERSONAS PROGRAMADAS	N° DE ASISTENTES	EMPRESA
01/8/2022	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
02/8/2022	Preservación de la Audición	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
03/8/2022	Reporte Oportuno de Actos y Condiciones Inseguras	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
04/8/2022	Seguridad con el uso de productos químicos	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
05/8/2022	Divulgación de la Política de alcohol, drogas y tabaco	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
06/8/2022	Identificación y control de riesgo en el trabajo	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
08/8/2022	Hábitos de vida saludable	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
09/8/2022	Cuidado de manos y pies	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.

10/8/2022	Higiene postural – Manejo de cargas	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
11/8/2022	Salud Publica: chikunguña	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
12/8/2022	Inspección de herramientas y equipos	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
13/8/2022	Orden y Aseo; Prevención de Accidentes	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
16/8/2022	Prevención de Enfermedades Respiratorias	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
17/8/2022	Manejo del estrés	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
18/8/2022	Reporte oportuno de accidentes e incidentes de trabajo	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
19/8/2022	Pausas Activas y Calistenia	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
20/8/2022	Importancia de las recomendaciones médicas laborales	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
21/8/2022	Análisis de trabajo seguro – ATS	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
22/8/2022	Mordeduras de animales	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.

23/8/2022	Trabajo en equipo	35	35	INGENIERÍA DE VÍAS.
24/8/2022	Importancia del Autocuidado	35	35	INGENIERIA DE VIAS
25/8/2022	Compañerismo y sana convivencia – Prevención del acoso	35	35	INGENIERIA DE VIAS
26/8/2022	Radiación solar y sus efectos en la salud	35	35	INGENIERIA DE VIAS
27/8/2022	Divulgación del procedimiento para tomas de pruebas de alcoholimetría	35	35	INGENIERIA DE VIAS
29/8/2022	Movilidad sostenible Uso seguro de la velocidad	35	35	INGENIERIA DE VIAS
30/8/2022	Identificación de riesgo en la via	35	35	INGENIERIA DE VIAS

3.2.2 Componente B – Gestión Social

Programa B1: Divulgación e información a la comunidad.

Durante este periodo se realiza acompañamiento a la Profesional Social del Contratista en las actividades de socialización de cierres viales y de inicio de labores operativas en los diferentes sectores donde se llevaron a cabo las intervenciones por obras de parcheo; de la siguiente manera:

Tabla 4. Socializaciones.

Socializaciones con la comunidad del AID				
No.	Fecha	Lugar	Descripción	Piezas entregadas
1	02/08/2022	Carrera 10N entre calle 16N-18N Antonio Nariño	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
2	04/08/2022	Carrera 11N entre calles 16N - 18N Antonio Nariño	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
3	09/08/2022	Carrera 5B entre Calles 25N y 26BN Calle 26N entre Carreras 5 y 6 Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Calle 26BN entre Carreras 5 y 6	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
4	10/08/2022	Calle 26N entre Carreras 4 y 4B Calle 26AN entre Carreras 4A y 4B Calle 26BN entre Carreras 4A y 4B Carrera 4A entre Calles 25 Bis Norte y 26N Calle 25 Bis Norte entre Carreras 4 y 4A Carrera 4B entre Calles 25 Bis Norte y 30N Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes

5	19-20/08/2022	Calle 26DN entre Carreras 4A y 4B Carrera 4A entre Calles 26DN y 26EN Carrera 4A entre Calles 26EN y 27N Calle 27N entre Carreras 4 y 4B Carrera 5B entre Calles 25N y 26BN Calle 26N entre Carreras 5 y 6 Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Calle 26BN entre Carreras 5 y 6	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
6	27-29/08/2022	Calle 2 entre carreras 3-4 Calle 3 entre carreras 3-4 Carrera 4 entre 2-3 Calle 3 N facultad de educación	Se realizó acompañamiento en actividad de socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes

Fuente: EDIFICACIONES Y VIAS SAS

Reuniones con Interventoría y Alcaldía:

No. 1. El día 02 de agosto del 2022. Asistencia al comité de obra en Secretaria de Infraestructura, en cuanto al área social, por parte del ente contratante se solicitó iniciar con la instalación de pasacalles, en los tramos donde ya se finalizó la intervención de mejoramiento vial; se proponen tres posibles puntos de ubicación en el menos tiempo posible.

No. 2. El día 16 de agosto del 2022 se realiza comité de obra. En dicha reunión se habla sobre el daño ocurrido el día 06/08/2022 en el barrio Antonio Nariño, a una válvula de agua que conecta (5) cinco redes domiciliarias. El tema se lleva a comité, toda vez que una de las propietarias manifestó que por parte del acueducto se le informaron que el costo de la reposición del elemento se efectuara a los propietarios de las viviendas. Situación que considera no es correcta ya que el daño se dio por razones ajenas a los responsables de las unidades sociales. El contratista expone que la responsabilidad debe ser acordada, por tanto, se solicitó enviar un oficio al acueducto para acordar cual será el proceder y que los moradores del sector se eximan de responsabilidades.

Por parte de la secretaria de infraestructura, se solicitó la implementación de stikers, con los logos de la alcaldía Municipal en los maletines que se ubican en los cierres viales.

No. 3. El día 22 de agosto del 2022. En el barrio Yambitara, sobre la calle 27n # 4 -17 en compañía del área técnica, las Profesionales Sociales del Contratista e Interventoría realizan visita a los predios, para atender la petición de dos de los residentes del sector, los cuales expresan no quieren que se realice la demolición de la parte del frente de la vía, la cual se encuentra en concreto rígido, ya que hace pocos meses realizaron el trabajo con recursos propios, buscando mitigar los empozamientos que se forman frente a sus viviendas. Una vez revisado el caso, se determina que se conservara, los dos propietarios firman acta en la cual se deja constancia de su solicitud y que los dos propietarios se encuentran de acuerdo.

No. 4. 23 de agosto de 2022, se lleva acabo el comité de obra semanal en secretaria de infraestructura; referente a las actividades del área social, se da cumplimiento a la instalación de los pasacalles, los cuales se ubicaron sobre la carrera 9, barrio Champagnat y en la carrera 11, sector Santa Clara. En cuanto a la petición de la secretaria en el comité anterior, se le explica que los stikers no pueden pegarse en los maletines ya que no son lisos y el espacio es reducido y no serían visibles.

No. 5. 22 de agosto de 2022. Por efectos de la intervención de la calle 1ra, barrio antiguo Liceo, contiguo al morro de Tulcán, por parte de tránsito Municipal se requirió un encuentro en el punto de obra, para verificar el cierre vial que se realizará, ya que es una vial de un alto impacto vehicular y se requiere del apoyo de la entidad, para darle un mejor manejo al tráfico y la movilidad en general.

Cartas Personalizadas

La Profesional Social del contratista radica oficio a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, de la siguiente manera:

- El día 23 de agosto del 2022 se radico oficio, mediante comunicado E-24217- 051 donde se solicita a la empresa se sirva determinar y revisar el valor de la válvula, (daño B/ Antonio Nariño) respecto a los usuarios, ya que una moradora del sector envió una petición expresando que le informan de un futuro cobro por dicha reposición. (ver anexo B1. cartas personalizadas)

Indicador de Cumplimiento

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	**% Volantes entregados**
FORMULA	$\frac{N° \text{ de volantes entregados}}{N° \text{ de volantes programados al mes}} \frac{149}{200} X1000 = \mathbf{74,5\%}$

Como complemento al programa de divulgación e información a la comunidad, se han realizado dos (2) jornadas de instalación de pasacalles;

- El día 05 de agosto del 2022, se realiza instalación en la carrera 11N barrio Santa Clara y sobre la carrera 9, sector Champagnat, se instala uno en cada calzada.

- El 25 de agosto del 2022, se realiza instalación de dos pasacalles en el barrio Yambitara, contiguo al parque y al salón comunal.

Programa B2: Restitución de bienes afectados.

Las Actas de vecindad son un instrumento utilizado con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, para evitar que éste sea imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Se elaboran en el área de influencia directa del contrato de obra. El acta es un instrumento que permite la participación ciudadana y va acompañado con registro fotográfico.

Para el momento, aún no se han intervenido tramos de rehabilitación vial completa, que requieran el levantamiento de acta de vecindad de inicio.

Las actas de vecindad de entorno se realizarán mediante registro fotográfico de fachadas y andenes de las viviendas colindantes, con el área de intervención, es una herramienta interna que proporcionará una evidencia previa del espacio externo y como soporte ante alguna posible reclamación, por alguno de los moradores del sector.

Actividades

- ✓ El proceso de registro fotográfico para actas de entorno empezó ejecutarse el día 20 del mes de mayo del 2022.

Tabla 5. Relación actas de vecindad y de entorno.

N	NOMBRE	DIRECCIÓN	N° FOLIOS	OBSERVACIONES
7	No cuenta con de Junta de Acción Comunal – estrato 4	Carrera 10 entre calle 8 -9 Vía Gaula	4	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.
8	No cuenta con de Junta de Acción Comunal – estrato 4	Carrera 11 entre calles 9N - 14N	5	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.
9	No cuenta con de Junta de Acción Comunal – estrato 4	Calle 11 entre carreras 9N -11N - Sector empaques del Cauca	4	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.
10	No se ha contactado al presidente de la JAC	Calle 9 entre carreras 5-6 Empedrado	4	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.

11	No se ha contactado al presidente de la JAC	Calle 9 entre carreras 2- 3- Empedrado	4	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.
12	No se ha contactado al presidente de la JAC	Calle 10 entre carreras 2-3 Empedrado	4	Se realizó levantamiento de acta de entorno, pendiente radicar a interventoría.
13	No se ha contactado al presidente de la JAC	Calle 4N Esq. Transversal 9N Sector ritmo 60		Se realizó levantamiento de tres actas de fachada de los establecimientos comerciales continuos al área de obra. Pendiente radicar a interventoría.

***Nota Aclaratoria:** Se* informa a la Profesional Social del Contratista, que luego de tratar el tema con el Ingeniero Residente se aprueba la entrega de las actas de entorno en físico, con la firma del contratista y la interventoría, toda vez que esta, se aprobó en documento PIPMA como un mecanismo de soporte interno. Lo anterior debido a que el trámite con juntas de acción comunal ha sido complejo, por el alcance de intervención dentro de los barrios al cual pretenden que se realice y el proyecto solo contempla las vías de mayor impacto y con un alto grado de deterioro. Así las cosas, la residente social de interventoría solicita se radiquen los documentos ya elaborados, en las áreas intervenidas, para su conocimiento y respectiva aprobación.

Programa B3: Atención y participación ciudadana

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2022, las Profesionales Sociales de Interventoría y Contratista realizan atención a la comunidad durante los acompañamientos a las jornadas de parcheo

Durante este periodo se recibieron (2) dos PQRS.

Tabla 6. PQRS

No.	Nombre	Descripción	Gestión	Tramite
2	Danyely Burbano Zuñiga	La señora Danyely Burbano Zuñiga, residente de la vivienda ubicada en carrera 5 # 25n -57 B/ los Hoyos, manifiesta se presentó un daño en la propiedad, a causa de las labores operativas de la maquinaria de obra. Afectando la canal de	**17/08/2022:** Se realiza acompañamiento rn visita al predio, para atender la petición de la señora en mención, evidenciando el daño al cual hace referencia, según indica, al momento de pasar el vibro compactador, por la altura del mismo, golpeo el canal, causando una perforación en la parte media y hundimiento de la estructura en él borde. La Profesional Social del	**Abierta**

		aguas lluvias. Solicita el contratista de obra se haga responsable por los daños causados.	Contratista procede a diligenciar el formato de PQRS y notifica a la propietaria de la vivienda que se harán los trámites pertinentes con la entidad y que y se dará respuesta en el menor tiempo posible. **27/08/2022:** La Profesional Social del Contratista después de consultar el correctivo a seguir con el director de obra, refiere que llevaran un maestro, con conocimiento en estructuras metálicas para que determine, si la pieza puede arreglarse o debe ser remplazada en su totalidad. **30/08/2022:** La Profesional Social del Contratista por medio de comunicación telefónica notifica a la responsable de la unidad social, que se programa visita al predio en los próximos días.	
3	Yuliana Santiago Carrera 4B # 23N - 02	La propietaria de la vivienda, acude a la profesional social del contratista, para indicarle sobre un daño que se generó en su andén, al momento que pasa la maquinaria realizando los cortes, de igual forma expresa que el andén del salón comunal también se dañó en el borde. Requiere sea reparado, ya que, en su momento, personal de la obra le indico que en el transcurso del proceso se le realizaría la reparación.	**27/08/2022:** La Profesional Social del Contratista recibe la queja por parte de la señora en mención y le informa que será atendida en el trascurso de las labores constructivas.	**Abierta**

***Nota Aclaratoria: durante** las labores constructivas en el barrio Antonio Nariño y Yambitara, se presentaron algunos daños a pisos de anden, los propietarios realizaron la solicitud de reparación, sin presentarlo como PQRS; la Profesional Social del Contratista las incluye en el listado de reparaciones solicita al área técnica disposición de personal para dicha actividad.

Tabla 7. Reparaciones pendientes.

Responsable de la unidad social	Dirección	Afectación
Diana María Mosquera	Carrera 11 N # 17N-63	Hundimiento de la estructura del andén.
Reinel Mosquera	Carrera 10 A # 2-75	Desportilla miento en borde sardinel.
	Calle 3N # 2-23	Fractura de sardinel-piragua desajustada
	Carrera 9N # 6-81	Desportilla miento en borde sardinel.

Ver anexo: B3.1 Consolidado atención al Ciudadano

Indicadores de Cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PQR	
INDICADOR	**% PQR:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ pqr\ cerradas}{N°\ de\ pqr\ total}\ \frac{1}{3}\ X100\ \ 33.3\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUEJAS	
INDICADOR	**% QUEJAS:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ quejas\ atendidas}{N°\ de\ quejas\ interpuestas}\ \frac{0}{0}\ X100\ \ = 0\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO RECLAMOS	
INDICADOR	**% RECLAMOS:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ reclamos\ atendidos}{N°\ de\ reclamos\ interpuestos}\ \frac{0}{0}\ X100\ \ = 0\%$

Programa B4. Vinculación de mano de obra.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2022, la Profesional Social del Contratista reporta vinculación de 41 personas al proyecto, (40) cuarenta hacen parte de la nómina del contratista y (1) uno de la empresa subcontratista,

Tabla 8. Personal Edificaciones y Vías SAS

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR JAVIER CAICEDO	76314250	PROFESIONAL DE APOYO	POPAYAN	
2	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CLAUDED PACHECO GUERRERO	52494521	RESIDENTE SST	BOGOTA	
3	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON	15816639	DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN	3158940704
4	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME OSWALDO PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN	3162546425
5	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SIRLENA MEDINA PLAZA	1061713662	PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	POPAYAN	3164983492
6	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LIZETH CRISTINA QUILINDO ARBOLEDA	1061747020	RESIDENTE SOCIAL	TIMBIO	3146427734
7	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LAURA PILAR VELAZCO	34329960	AUXILIAR SST	POPAYAN	3233659189
8	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	10295742	INSPECTOR DE OBRA	POPAYAN	3184638095
9	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDINSON ANDRES QUIÑONES AGREDO	1061699008	INSPECTOR DE OBRA	POPAYAN	3116747974
10	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ELDER LENIN CUENE ALCALO	1064431522	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3157677724
11	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS HERNANDEZ OREJUELA	1061742623	CONTROLADOR DE TRAFICO	ROSAS	
12	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EMILIO CHILITO MACIAS	1061797781	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223
13	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ARLEX NARVAEZ ARBOLEDA	1007700113	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	3226610314
14	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	1061016999	OPERARIO FINISHER	ROSAS	
15	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	1002954050	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3188330947
16	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1061701342	OFICIOS VARIOS	TIMBIO	
17	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIRO TALAGA ZEMATATE	76150449	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3145377367
18	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON FABIAN OBANDO BOLAÑOS	1003163614	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3003590230
19	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1079409048	BOAL	POPAYAN	

20	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALBERTO OBANDO CABRERA	1061599352	BOAL	ROSAS	3006735447
21	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	1061601364	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3147708448
22	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDUARDO VARGAS RENGIFO	1061598700	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3142675841
23	EDIFICACIONES Y VIAS SA	MAURICIO MERA ARMERO	1081592066	OFICIOS VARIOS	ROSAS	3202968104
24	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JESUS ANDRES LLANTEN	10291656	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	POPAYAN	3136868194
25	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OMAR ALEJANDRO AGREDO HURTADO	1061598911	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	3206298224
26	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILSON YAMIT PALENCIA VASQUEZ	15674487	OPERADOR FRESADORA	CARMEN DE BOLIVAR	3182836481
27	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1061780010	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	3117751203
28	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	1058788777	OFICIOS VARIOS	LA VEGA	
29	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO SECUE BOYOCUE	1067521620	OFICIAL	POPAYAN	3162536954
30	EDIFICACIONES Y VIAS SA	FABIAN ANDRES AGREDO POLINDARA	1061737458	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
31	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN PABLO QUIÑONEZ ESPINOSA	1004709684	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN	
32	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE ROELFI GONZALES MINA	94429021	OPERADOR VOLQUETA DOBLE	CALI - VALLE	3148121700
33	EDIFICACIONES Y VIAS SA	HERNANDO CHILITO CASTILLO	1061986498	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223
34	EDIFICACIONES Y VIAS SA	NELSON AGUILERA	77080823	OPERARIO FINISHER	POPAYAN	
35	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BREYNER ANDRES AGUILERA	1065915543	AYUDANTE FINISHER	POPAYAN	
36	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR AMILCAR PUENAYAN PIARPUEZAN	87514871	OFICIOS VARIOS	POPAYAN	
37	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DIEGO LEITON	4612402	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE	POPAYAN	
38	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER BEDOYA	1061600993	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE	POPAYAN	
39	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CESAR ANDRES MONTENEGRO	1061718568	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE	POPAYAN	31366774296

40	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE HERMES SALAZAR CAMACHO	10293621	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE	POPAYAN	3103668891

Tabla 9. Sub – Contratistas

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	VOLVOS DEL SUR	LUIS EDUARDO BURBANO MUÑOZ	1002791943	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3107130862

Tabla 10. Porcentaje de contratación

PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2022							
CARGO	Categoría		Procedencia		Genero		Cantidad Total
	MOC	MONC	De la Región	Externo	FEM	MASC	
Director de obra	1	0	1	0	0	1	1
Profesional de apoyo	1	0	1	0	0	1	1
Residente de obra	1	0	1	0	0	1	1
Inspector de obra	2	0	2	0	0	2	2
Residente Social	1	0	1	0	1	0	1
Profesional de apoyo ambiental	1	0	1	0	1	0	1
Residente SST	1	0		1	1	0	1
Auxiliar SST	1	0	1	0	1	0	1
BOAL		2	2	0	0	2	2
Oficios Varios		13	13	0	0	13	13
Oficial		1	1		0	1	1
Conductores		6	6		0	6	6

Controladores de trafico		3	3			3	**3**	
Ayudante finisher		1	1			1	**1**	
Operadores	6		5	1	0	6	**6**	
TOTALES	**15**	**26**	**39**	**2**	**4**	**37**	**41**	
PORCENTAJE %	**37%**	**63%**	**95%**	**5%**	**10%**	**90%**	**100%**	

La Profesional Social del Contratista reporta un total de 41 trabajadores activos discriminados de la siguiente manera:

- Personal calificado: 15 personas
- Personal no calificado: 26 personas
- Personal del área de influencia directa: 39 personas
- Personal foráneo: 2 personas
- Personal femenino: 4 personas
- Personal masculino: 37 personas

Tabla 11. Relaciones planillas de pago de seguridad social mes de JUNIO

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	1047756242	Edificaciones y Vías SAS	35	$ 28.333.750
2	1047746199	Edificaciones y Vías SAS	3	$ 1.790.000
3	1047744583	Edificaciones y Vías SAS	1	$ 632.300
4	1047756242	Edificaciones y Vías SAS	1	$ 520.200
5	Certificado de aportes	Volvos del sur	1	$ 328.500
6	1047746199	Edificaciones y Vías SAS	1	$ 536.300
7	1047744583	Edificaciones y Vías SAS	1	$ 521.300
TOTAL				**32.662.350**

Indicadores de Cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra agosto
FORMULA	$\frac{N° \text{ de trabajadores vinculados con cumplimiento de requerimientos de ley}}{N° \text{ de trabajadores requeridos}} \frac{41}{41} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra
FORMULA	$\frac{N° \text{ de mujeres contratradas}}{N° \text{ total de trabajadores contratados}} \frac{4}{41} X\ 100 = 9{,}75\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Generación de empleo agosto
FORMULA	$\frac{N°\ de\ empleos\ generados\ en\ la\ zona\ de\ influencia\ directa}{N°\ de\ empleos\ generados\ por\ le\ proyecto}\ \frac{39}{41} X\ 100 = 95.12\%$
INDICADOR	% Generación de empleo agosto
FORMULA	$\frac{N°\ de\ empleos\ mano\ de\ obra\ no\ calificada}{N°\ total\ de\ empleados\ requeridos}\ \frac{26}{41} X\ 100 = 63.41\%$
INDICADOR	% Generación de empleo agosto
FORMULA	$\frac{N°\ de\ empleos\ mano\ de\ obra\ calificada}{N°\ total\ de\ empleados\ requeridos}\ \frac{15}{41} X\ 100 = 36.58\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
CONTRATISTA	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social agosto:
FORMULA	$\frac{N°\ de\ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ de\ trabajadores\ contratados}\ \frac{41}{41} X100 = 100\%$

Programa B5: Capacitación del personal de obra.

Durante este periodo la Profesional Social del Contratista realizó la capacitación del área social descritas en la siguiente actividad, de acuerdo al plan de capacitaciones mensual.

Tabla 12. Plan de capacitación mensual

Fecha	Tema	Metodología	Asistentes
09/08/2022	Valores humanos	Conversatorio participativo	38

Indicadores de Cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FORMULA	$\frac{N°\ de\ trabajadores\ capacitados}{N°\ de\ trabajadores\ contratados}\ \frac{38}{40} X100 = 95\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Formación:**
FORMULA	$\frac{N° \text{ de capacitaciones realizados}}{N° \text{ de capacitaciones programados}} \frac{1}{1} X100 = \mathbf{100\%}$

Nota Aclaratoria: Se mencionan 40 trabajadores en el indicador, ya que el colaborador del sub contratista (volvos del sur) No se programó para este periodo.

Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas

3.2.3. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción

En los lugares de obra se adelantaron actividades de demolición de carpeta existente y posterior recolección de escombros, los frentes de obra intervenidos en este periodo son Sector Barrio Antonio Nariño, Yambitara, Los Hoyos, Villa Docente y Antiguo Ulloa.

El manejo de escombros se realizó, reciclando directamente el material fresado (RAP) con el equipo a la volqueta e inmediatamente es trasladado a los talleres del municipio de Popayán y por orden de secretaria de infraestructura se lleva material a Casa de la moneda, se entregó un total de 1.143 m³ Ver ficha F-04-GA-1. Disposición de escombros.

En este periodo no se generó ningún material diferente al RAP, en los frentes de obra.

En el periodo del informe por directriz de la secretaria de infraestructura se enviaron 188 m3 a la casa de la moneda.

Tabla 13. Materiales y escombros generados

PERIODO	RCD LA LAJITA(m³)	RAP TALLERES MUNICIPALES (m³)	RAP REUTILIZADO EN OBRA (m³)	CASA DE LA MONEDA (m³)	TOTAL (m³)
7 de abril al 6 de mayo del 2022	0	0	0		0
7 de mayo al 6 de junio del 2022	0	780	0		780
7 de junio al 6 de julio del 2022	0	1.255	0		1.255
7 de julio al 31 de julio 2022	30	946			976

1 al 31 de agosto del 2022	0	955	0	188	1.143
TOTAL	**30**	**3.966**	**0**	**188**	**4.154**

Indicadores de cumplimiento.

A continuación, se muestra el indicador de seguimiento y monitoreo de periodo del presente informe:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Volumen de disposición**
FORMULA	$\frac{Vol.de\ escombros\ entregados\ al\ SIT\ adecuadamente\ (m3)}{Vol.de\ escombros\ totales\ generados\ (m3)} \frac{1143}{1143} x\ 100 = 100\%$

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción

En el periodo del informe no se almacenaron materiales de construcción, esta etapa precontractual se utilizó para identificar los proveedores de materiales, se identificaron las plantas de asfalto de la empresa Ingeniería de Vías SAS: Las plantas de producción de mezcla asfáltica Galíndez y Popayán.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Protección de materiales almacenados**
FORMULA	$\frac{Vol.de\ de\ material\ protegido\ \left(\frac{m3}{día}\right)}{Vol.de\ de\ material\ almacenado\ \left(\frac{m3}{día}\right)} \frac{N/A}{N/A} X\ 100 = N/A$

Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte

En el periodo del informe se realizaron siete (07) mantenimientos a maquinaria y equipos.

Se contó con cinco (5) volquetas para el transporte de fresado y de mezcla asfáltica y un carro tanque de agua las cuales cuentas con todos los documentos vigentes.

En recorridos de obra se evidencio la falta de carpado de las diferentes volquetas encargadas de llevar el material de fresado, lo cual se dio a conocer al contratista inmediatamente y se dejó escrito por medio de informes semanales presentados a la entidad y comités de obra semanales.

Tabla 14 Listado de Maquinaria de obra.

No.	EQUIPO	REFERENCIA/ PLACA	CANTIDAD	MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Terminadora de Asfalto	F2500CS DYNAPAC	1		Equipo mayor
2	Vibro compactador de Neumático	HAMM	1		
3	Vibro compactador de Rodillo Cilindro	HAMM HD +90VO	1		
4	Fresadora	WIRTGEN MOD W100	1	19 de agosto 2022 22 de agosto 2022 27 agosto 2022 30 agosto 2022	
5	Luminaria	N/A	1		Equipo menor
6	Volqueta Sencilla	SDL 070	1		Vehículos de transporte pesado
7	Volqueta doble troque	WFV 217	1	9 agosto 2022 22 de agoto 2022 30 de agosto 2022	
8	Volqueta doble troque	ETT575	1		
9	Volqueta doble troque	WLL417	1		
10	Volqueta doble troque	SMB727	1		
11	Vehículo Tipo Turbo (Marmita)	WLL595	1		Turbo

Fuente. EDIFICACIONES Y VIAS S.A

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de mantenimiento**

FORMULA	$\frac{\text{No de mantenimientos: No de mantenimientos realizados } \frac{07}{07}}{\text{Número de mantenimientos programados}} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% de Certificación Técnico mecánica y de gases vigente**
FORMULA	$\frac{\text{No de certific Tecnomecánica y de gases vigente: No de vehoculos con certifi Tecnic } \frac{6}{6}}{\text{Numero total de vehículos}} X\ 100 = 100\%$

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas

En la obra no se manejan aguas residuales ya que el servicio de baño se alquila con viviendas cercanas al sector, cuyas sanitarias están conectadas a la red de alcantarillado de la ciudad.

Durante el periodo del presente informe, No se generaron residuos peligrosos.

En obra solo se almacenan sustancias químicas correspondientes a las usadas en la herramienta menor (Gasolina). Ver Formato F-11-GA-1, lista de chequeo productos químicos.

Por parte de la interventoría equipo PIPMA, se realizaron diferentes observaciones con respecto a el manejo y almacenamiento de la liga y gasolina, ya que en varias ocasiones se evidencio que, por parte del personal de la obra, no estaban adecuando dichos materiales ocasionando riegos en sectores, lo cual con las lluvias se presenta lavado de estos y caen directamente alcantarillados.

Registro de cumplimiento.

Formato F-11-GA-1 lista de chequeo de productos químicos.

Indicador de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Residuos peligrosos**
FORMULA	$\frac{\text{Cantidad de residuos peligrosos generados } \frac{N/A}{N/A}}{\text{Cantidad de residuos dispuestos en empresa autorizada}} X\ 100\% = N/A$

Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra

Se realiza recorridos con el contratista en las vías habilitadas de la obra, revisando cada sector para verificar la limpieza de estos y/o realizar observación si se requiere. En el mes de agosto, se verifico los barrios, yambitara, Antiguo liceo, los hoyos y Antonio Nariño.

El día 20 de agosto se envió requerimiento solicitud jornada de limpieza al finalizar la jornada laboral por medio de correo electrónico al contratista describiendo lo siguiente: Como es de su conocimiento se ha realizado la rehabilitación de varias vías sector barrio los hoyos y sotará, evidenciado emulsión asfáltica en andenes a pesar de utilizar la lona de protección, por lo tanto, se solicita realizar su respectiva limpieza.

Por otra parte, el personal BOAL de la obra está compuesto por dos trabajadores, los cuales realizan la limpieza de las vías habilitadas y obra vigente, de acuerdo al rendimiento de la expansión de la mezcla por la finisher, la limpieza de las vías se ve un poco atrasada, por lo tanto, se solicita si es posible realizar jornada de limpieza por parte de todos los trabajadores al finalizar la jornada laboral, ayudando a solventar lo solicitado.

Finalmente se reitera la necesidad de realizar tapas de protección a sumideros al momento de realizar la pavimentación como medida preventiva, para la limpieza de residuos de carpeta en estos.

El contratista cuenta con una (1) BOAL -Brigada de Orden Limpieza y Aseo, las cuales tienen las siguientes funciones y está conformado de la siguiente manera:

- Instalación, verificación y reposición del cerramiento del proyecto.
- Limpieza de los frentes de trabajo habilitados.
- Instalación, verificación y reposición de los senderos de los frentes de obra del proyecto.
- Adecuación y limpieza del campamento de la obra.
- Limpieza de sumideros.
- Instalación y verificación de la señalización vertical del PMT.
- Mantenimiento de la señalización en obra (Arreglo de colombinas, cintas, maletines y señales móviles).

Nombre	Identificación
Jhon Alberto Obando Cabrera	1061599352
Carlos Andrés Velasco	1079409048

La brigada BOAL, al igual que el personal de obra realiza el ingreso a obra a partir de las 6:00 A.M, se revisan los elementos de protección personal y de ser necesario se realiza el cambio (monogafas, guantes, tapa oídos, tapa bocas), se dan instrucciones acerca de las actividades de tipo urgente, se realiza la retroalimentación acerca de algún suceso en la obra o de relaciones interpersonales, de igual forma diariamente los residentes encargados ambiental y SST comparten temas del documento PIPMA para las charlas de cinco minutos y a las 6.30 p.m. se disponen a dar inicio a las actividades regulares en la obra. Al finalizar la jornada 4:00 p.m., la brigada organiza las herramientas utilizadas en el día y manifiestan las diligencias que por la dinámica de la obra requieren algún tipo de tratamiento especial para dar prioridad al día siguiente.

Para la disposición de residuos, se instalaron un (1) puntos ecológicos, los cuales constan de cuatro (3) canecas metálicas, rotuladas y debidamente protegidas contra la acción del agua.

Se realiza verificación del punto ecológico, siempre que se realiza recorrido y muchas ocasiones se verifico la incorrecta clasificación de los desechos, informando al contratista, sin presentar mejoría en el tema.

Los residuos sólidos son recopilados diariamente y con apoyo de las rutas que transitan por el sector para la recolección y disposición final de residuos ordinarios, se hace la entrega a la empresa URBASER esta empresa no entrega un soporte de evacuación de los residuos, los datos calculados hacen referencia al volumen aproximado generado por una bolsa de 65 cm de ancho x 90 cm de largo. Por lo general durante el periodo, la empresa URBASER se encontró realizando la recolección los días lunes, miércoles y viernes.

Tabla 15. Volumen de residuos sólidos

SEMANA		DÍAS HÁBILES DE RECOLECCIÓN	N° BOLSAS ENTREGADAS POR DÍA DE RECOL.	N° BOLSAS TOTAL	PESO APROX C/U KG	PESO TOTAL KG
1	1 al 7 de agosto del 2022	3	1	3	3	9
2	8 de agosto del 2022	3	1	3	3	9
3	9 de agosto al 15 de agosto 2022	3	1	3	3	9
4	Del 16 al 22 de agosto del 2022	3	1	3	3	9
5	Del 23 al 31 de agosto 2022	3	1	3	3	9
TOTAL, PESO DE BASURA SUELTA (Kg)						**45**
TOTAL, VOLUMEN DE BASURA SUELTA (m^3)						1.68

Es de resaltar que el volumen de residuos sólidos generados en obra es mínimo, los pocos residuos generados corresponden a los empaques desechables de la comida del personal y el residuo de cinta de demarcación.

Indicadores de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Generación de residuos peligrosos**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ peligrosos\ dispuestos\ 0}{Volumen\ residuos\ peligrosos\ generados\ 0} X\ 100 = \%$

INDICADOR	**% de Generación de residuos ordinarios**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ ordinarios\ dispuestos\ 45\ kg}{Volumen\ residuos\ ordinarios\ generados\ 45\ kg} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% de Generación de residuos de papel, cartón y plástico**
FORMULA	$\frac{Volumen\ de\ residuos\ ordinarios\ dispuestos\ 0}{Volumen\ de\ residuos\ ordinarios\ generados\ 0} X\ 100 = NA\%$
INDICADOR	**% Brigadas realizadas**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ de\ papel\ y\ carton\ dispuestos\ 0Kg}{Volumen\ residuos\ de\ papel\ y\ carton\ generados\ 0\ Kg} X\ 100 = 100\%$

Programa D6: Manejo de aguas superficiales

En el periodo del informe se pagaron el servicio de agua cruda para abastecimiento de la maquinaria y equipo.

El material de construcción no se cubrió en obra, ya que se utilizan inmediatamente.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Sumideros protegidos**
FORMULA	$\frac{N°.\ de\ facturas\ pagadas\ 1}{N°\ de\ facturas\ emitidas\ 1} X\ 100 = 100\%$

Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos

Se verifico el material producto de excavaciones y demoliciones RAP (Reciclado Asfaltico de Pavimento) el cual se transportó en las volquetas del contratista; que cuentan con sus respectivas carpas para evitar la dispersión de materiales cuando se encuentran en movimiento; las cueles están aprobadas para su labor y tienen el análisis pre-operacional al inicio de cada jornada laboral.

Cerca de la finalización de cada jornada de trabajo se inspeccionan áreas donde se requiere señalización de excavaciones y/o zonas de riesgo, esta actividad es implementada en compañía del residente SST, ambiental y con apoyo del personal de la BOAL, del contratista.

Durante la jornada laboral se verifico las áreas aíslan de trabajo (Excavaciones) con las señales del PMT, maletines, colombinas, cinta de señalización y conos viales. En general las áreas de excavación en el frente habilitado se encontraron acondicionadas para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra como la instalación de señalización preventiva para evitar accidentes.

Al finalizar las jornadas laborales, las áreas y frentes de trabajo se dejan debidamente, transitables y se retira la señalización preventiva y la BOAL se encarga diariamente de dejar las zonas de trabajo acondicionadas y seguras para el personal que transita por las zonas aledañas.

Se verifico que no hubo la necesidad de realizar ningún acopio de material, el RAP, ya que se evacua inmediatamente de obra.

La excavaciones realizadas y señalizadas en el periodo del informe fueron las siguientes:

- Santa Clara
- Barrio Yambitara
- Recamara en Barrio Antiguo Liceo

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de excavaciones señalizadas**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ excavaciones\ señalizadas}{N°\ de\ excavaciones\ existentes}\frac{3}{3} X\ 100 = 100\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Material de excavación acondicionado**
FORMULA	$\frac{No.\ de\ acopios\ de\ material\ acondicionado}{No.\ de\ acopios\ establecidos}\frac{NA}{NA} X\ 100 = NA$

Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido

En el periodo del informe no se realizó el monitoreo de ruido.

En recorridos de obra se evidencio la falta de carpado de las diferentes volquetas encargadas de llevar el material de fresado, lo cual se dio a conocer al contratista inmediatamente y se dejó escrito por medio de informes semanales presentados a la entidad y comités de obra semanales.

Se realizó una charla con los conductores de Volqueta donde se les socializaron las medidas para control de emisiones (Ver Anexo COMPONENTE A, Capacitaciones), como lo fueron el carpado obligatorio en el momento de transporte de material, revisión diaria de las condiciones de los vehículos, y se les entregó un memorando con la anterior información que debe cumplirse obligatoriamente como medida contractual presentada en el PIPMA aprobado

Indicador de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Revisiones tecno mecánicas**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ revisiones\ tecnomecanicas}{N°\ de\ Vehiculos}\frac{6}{6} X\ 100 = 100\%$

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos

En el periodo del informe no se presentaron daños a las redes de servicios públicos.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Suspensiones**
FORMULA	$\frac{N°\ suspensiones\ servicios\ públicos\ presentados}{N°\ suspensiones\ de\ servicios\ públicos\ programadas}\frac{0}{0} X\ 100 = NA$
INDICADOR	**% de Suspensiones de servicio de acueducto**
FORMULA	$\frac{N°\ suspensiones\ de\ servicio\ acueducto\ presentados}{N°\ suspensiones\ de\ servicio\ acueducto\ programadas}\frac{0}{0} X\ 100 = NA$

3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Por parte de la interventoría para este componente se realiza el seguimiento en los temas de seguridad y salud en el trabajo que corresponde con la normativa a aplicar por parte del contratista, además de verificar los lineamientos planteados en el PIPMA para garantizar las salud y seguridad de los colaboradores que desempeñan labores propias del contrato de obra.

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo

En el periodo ingresaron **05** trabajadores, se verifica que todo el personal relacionado cuente con sus exámenes de ingreso, inducciones y afiliaciones a la seguridad social. Ver Anexo componente E.

A continuación, se relacionan los trabajadores vinculados al proyecto durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2022.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO
1	EDGAR AMILCAR PUENAYAN PIARPUEZAN	87514871	OFICIOS VARIOS	26/08/2022
2	JHON ALEXANDER BEDOYA	1061600993	CONDUCTOR DT	01/08/2022
3	CESAR ABDRES MONTENEGRO	1061718568	CONDUCTOR DT	01/08/2022
4	HERMES SALAZAR	10293621	CONDUCTOR DT	01/08/2022
5	DIEGO LEITON	4612402	CONDUCTOR DT	01/08/2022

En el periodo del informe hay 6 trabajadores retirados del proyecto - periodo del 07 de julio al 31 de julio de 2022.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA RETIRO
1	BAYRON ESTIVEN ZAPATA TORRES	1005160386	CONDUCTOR CARROTANQUE	01/08/2022
2	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	1061697400	CONDUCTOR DT	01/08/2022

Registro de accidentes morbilidad y ausentismo: para este periodo el contratista, no reporto accidentes laborales.

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

- Personal que ingresa: 5
- Personal retirado: 2
- Personal activo: 41

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Índice de frecuencia: I.F**
FORMULA	$\frac{Número\ de\ casos\ reportados\ x\ 240.000}{Número\ de\ horas\ hombre\ trabajados} \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Índice de Severidad:**
FORMULA	$\frac{N°\ días\ perdidos\ o\ cargados\ por\ AT\ en\ el\ período\ x\ 240.000}{Número\ de\ horas\ hombre\ trabajados} \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas-hombre trabajadas durante el mismo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Índice Medio de Días Perdidos por Lesiones:**
FORMULA	$\frac{No\ de\ dias\ perdidos\ o\ cargados\ por\ causa\ de\ lesiones\ en\ un\ periodo}{Total\ de\ casos\ con\ tirmpo\ perdido} = 0$
DEFINICIÓN	El índice medio de días perdidos por lesiones se define como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos puede ser aplicado para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad profesional

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Índice de Lesión Incapacitante (ILI):**
FORMULA	$\frac{Indice\ de\ frecuencia\ X\ Severidad}{1000} \frac{0}{1000} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades profesionales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Incidencia (IT):**
FORMULA	$\frac{(No\ de\ accidentes + No\ de\ incidentes)\ X\ K}{No\ Total\ de\ trabvajadores\ expuestos}\ \frac{0}{41} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Ausentismo (AT) – Accidente de Trabajo:**
FORMULA	$\frac{No\ de\ horas\ perdidas\ por\ AT\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas}\ \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por accidente de trabajo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Incidencia Especifica (EP):**
FORMULA	$\frac{Casos\ nuevos\ que\ presentan\ patologia\ por\ expocicion\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas\ total\ expuestas\ al\ riesgo}\ \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Ausentismo (EP) – Enfermedad Profesional:**
FORMULA	$\frac{Número\ de\ horas\ perdidas\ por\ enfermedad\ profesional\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas}\ \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por enfermedad profesional.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Ausentismo (EC) – Enfermedad Común:**

FORMULA	$\frac{N° \text{ de horas perdidas por enfermedad comun } X\ K}{\text{No de horas trabajadas}} \frac{0}{13280} X100 = \mathbf{0}$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad común

Reunión del COPASST: Ingeniería **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015 donde se realizan las reuniones correspondientes a cada mes durante la ejecución del proyecto, en la cual se presenta la gestión del área SST, socialización de la accidentalidad y ausentismo, indicadores, inspecciones y capacitaciones.

El contratista para el mes de agosto no se adjunta acta de reunión del COPASST.

Afiliaciones al sistema de seguridad social Durante el periodo y como parte del seguimiento de interventoría se realizó la verificación de las afiliaciones del personal que ejecuta labores, comprobando que el contratista tuvo para este periodo a **41** colaboradores afiliados al sistema de seguridad social.

Exámenes médicos para este periodo el contratista reporto en el informe copia de **05** exámenes médicos.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N° \text{ de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{No de trabajadores contratados}} \frac{41}{41} X100 = \mathbf{100\%}$

Inducción y Capacitación: Durante este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** realizó la inducción al personal que ingresó al proyecto. El cual se detalla a continuación:

05 colaboradores del contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A**

La inducción tiene una duración de 1 hora donde se explican los siguientes temas: Política SISOMA, COPASST, Plan de Emergencia y Brigadistas, Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo, examen de ingreso, notificación del riesgo, inducción al cargo, uso de EPP.

el objeto de garantizar el cumplimiento del plan de capacitaciones y dar las instrucciones conforme a la normativa colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo se dan las capacitaciones en los temas establecidos y se brindan las charlas de seguridad. A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en el área de SST durante el periodo.

Tabla 16. Inducciones y capacitaciones

No.	Fecha	Tema
1	09/08/2022	CAPACITACION RIESGO PSICOSOCIAL
2	25/08/22	CAPACITACION RIESGO MECANICO EN EL TRABAJAO Y SU CLASIFICACION
3	31/08/2022	SOCIALIZACION MEDEVAC" PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS

FUENTE: EDIFICACIONES Y VIAS S.A

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitaciones SST
FORMULA	$\frac{\textit{No de eventos de capacitacion realizados}\ 3}{\textit{Numero de eventos programados}\ 3} X\ 100 = \mathbf{100\%}$
	%Trabajadores presentes en capacitaciones
FORMULA	$\frac{\text{Promedio de trabajadores presentes en capaciatciones}\ 38}{\text{Numero total de trabajadores en obra}\ 41}$ X 100 $= \mathbf{92,6\%}$

Elementos de protección personal y dotación: Durante el periodo el contratista entrega y reposición de elementos de protección personal, está pendiente la entrega de copas auditivas y respiradores para el personal que acompañan los equipos.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% EPP
FORMULA	$\frac{\textit{Numero de trabajadores dotados con EPP}\ 38}{\textit{Numero de trabajadaores contratados}\ 41} X\ 100 = \mathbf{92\%}$

Notificación de riesgos: Para este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** realizó la notificación de riesgos a **05** colaboradores que ingresaron a realizar labores propias del contrato de obra.

Actividades de alto riesgo: Durante este periodo no se desarrollaron actividades de alto **riesgo.**

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista realiza diferentes inspecciones en el lugar de trabajo ya que se considera una actividad preventiva que se incluye las técnicas generales de seguridad previas al accidente analíticas debido a que su objetivo es el de detectar las conductas y las acciones que pueden resultar peligrosas.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% EPP**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ \text{inspecciones planeadas}\quad 6}{Numero\ de\ \text{inspecciones ejecutadas}\quad 6} X\ 100 = \mathbf{100\%}$

Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción

Plan de emergencias y contingencias.

Se reitera el requerimiento al contratista de instalar el botiquín en el frente de obra y poder disponer de los elementos necesarios para tratar pequeñas heridas, dolencias leves.. A continuación, se presenta la información correspondiente a los elementos con los que cuenta el contratista para la atención de emergencias.

Tabla 17. Elementos plan de emergencia

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	0	PAC
Camilla rígida	1	PAC
Extintores Multipropósito	1	FRESADORA FINISHER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO
Kits anti derrames	0	

Brigada de emergencias: El contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A**, durante este periodo tiene vigente la brigada unificada de emergencias. la cual está conformada de la siguiente manera:

RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA			
NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	TELEFONO
ANDRES QUIÑONEZ.	1061699008	INSPECTOR DE OBRA.	3116747974.

ANYELO SANCHEZ.	10295742	INSPECTOR DE OBRA.	3184638095.
LAURA PILAR VELASCO VASQUEZ	34329960	RESIDENTE SST.	3105373819.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacidad de respuesta**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ emergencias\ atendidas\ oportunamente}{Numero\ de\ emergencias\ presentadas}\frac{0}{0} X\ 100 = N.A.$
INDICADOR	**% de simulacros realizados**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ simulacros\ efectuados}{Numero\ de\ simulacros\ programados} X\ 100 = N.A$

3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico

Se realiza seguimiento a los estándares en materia de seguridad vial, verificando la implementación de señalización que cumple con los requerimientos de las normas nacionales del ministerio de transporte, INVIAS y secretaria de tránsito municipal de Popayán. En el presente componente la interventoría realizo las siguientes actividades:

- En el periodo del informe se elaboró el PMT y se presentó a la alcaldía para su respectiva aprobación, aprobado mediante Resolución No 202215000337084 del 12 de abril del 2022.
- Seguimiento a la implementación de medidas estipuladas den el plan de manejo ambiental referente al componente F.
- Inspección de frentes de obra y verificación de actividades de señalización para garantizar la seguridad del peatón.
- Verificación de desvíos, senderos peatonales, excavaciones señalizadas y disposición de personal para manejo de tráfico.
- Elaboración de requerimientos de acuerdo al seguimiento en la materia.

Para el periodo del presente informe el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con tres (4) personas para regulación de tráfico para el manejo de las actividades en obra, estas personas están ubicadas en:

- Verificación de instalación de señalización requerida en el PMT aprobado para el desarrollo de las obras del contrato.
- Seguimiento a la implementación de medidas estipuladas den el plan de manejo ambiental referente al componente F.

- Inspección de frentes de obra y verificación de actividades de señalización para garantizar la seguridad del peatón.
- Verificación de desvíos y disposición de personal para manejo de tráfico.
- Elaboración de requerimientos de acuerdo al seguimiento en la materia.

Señalización nocturna: En el presente mes las labores nocturnas que se desarrollaron fueron mínimas, y cuando se requirió se utilizó las exploradoras instaladas en cada equipo.

Programa F2: Manejo de Tráfico

Para este periodo el contratista cuenta con el plan de manejo de tráfico aprobado por la secretaria de tránsito mediante Resolución 20221500001894 del 18 de enero de 2022, lo cual permitió iniciar con la intervención de los sectores mencionados en la fase I del contrato de obra.

Para el periodo del presente informe el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con cuatro a seis (4 - 6) personas para regulación de tráfico y manejo de movilidad en obra, estas personas están ubicadas en las diferentes intersecciones intervenidas con sus respectivas elementos preventivos e informativos.

Señales instaladas en obra: Para el periodo el contratista continuó con las señales requeridas preventivas de obra. El contratista utilizo delineadores tubulares, barricadas metálicas y maletines plásticos de acuerdo a la norma de manual de señalización vial del instituto nacional de vías – INVIAS, para la canalización de tráfico en los sectores donde se requirió de esta actividad. Para este periodo se instalaron 85 señales verticales requeridas para intervenir los diferentes sectores de la ciudad.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de N° de señales utilizadas fase I etapa I**
FORMULA	$\frac{N° \text{ de señales preventivas puestas en obra}}{N° \text{ de señales exigidas en el Plan de Manejo de Tráfico}} \frac{88}{90} X\ 100 = 97\%$

SEGUIMIENTO COVID-19

Durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto NO se presentaron caso relacionados con COVID- 19.

4. PRESUPUESTO PIPMA

El contrato 202218000242 del 2021 que tiene como objeto MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021., cuenta con un presupuesto para el desarrollo de las actividades Socio-Ambientales descritas en el programa de implementación del plan de manejo ambiental - PIPMA de $ 131.647.040,00 pesos, dispuesto de la siguiente manera:

- Presupuesto PMA: $ 80.085.076,00
- Presupuesto PMT: $ 51.561.964,00

Hasta la fecha del presente informe no se tiene aprobadas actas PIPMA.

ANEXO10
BITÁCORA DE OBRA


DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 2022.

ESTADO DEL TIEMPO SECO:

SE INTERVIENE SOBRE LA CRA 10 ENTRE 16NY 18N CON LABORES DE FRESADO y SUMINISTRO DE 4 VIAJES DE 15M³ DE MDC-19.

Jaime Bonilla Bel
Residente de Obra

Ruperto Quiñones C.



LUNES 8 DE AGOSTO DE 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

SE CONTINUA INTERVENCIÓN SOBRE CRA 10 NORTE, SE SUMINISTRA MEZCLA MDC 19. SE LIBERA CON CONTROL DE TEMPERATURA A 130°C. y SE INTERVIENE CON PAVIMENTO CN CLL 17 NORTE CON CRA 9. FRESADO CN CRA 11. ENTRE CALLES 17N y 18N y CRA 11 ENTRE CALLES 16N y 18N

EL ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN REALIZA EL ARREGLO DE LA VALVULA QUE SE AVERIÓ FRENTE A LA NOMENCLATURA 17-63.

EL CONTRATISTA TRASLADA TODO SU EQUIPO AL BARRIO y ANDAMIARÁ POR LOGISTICA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SE DEJA SEÑALIZADO POR PARTE DEL CONTRATISTA. LA REPARACIÓN y EL ESPACIO DONDE INTERVINO EL ACUEDUCTO y EL AREA DONDE APARECIÓ UNA SOCAVACION POR DEBAJO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD.

Los arreglos por parte de parches no están realizados, los

impulsado por CamScanner

terminaremos previo que las empresas de acueducto y alcantarillado terminen de realizar los respectivos arreglos. Ya en el resto de la calzada de acueducto presentaron socavación, se comunica que las redes siguen estan superficiales no a la profundidad adecuada y que se van afectadas se remite a las empresas que den celeridad a los procesos de los arreglos

Jaime Oswaldo Ll
Residente de Obra

MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022
SE INICIAN LABORES EN YANDITARÁ, CON UN RECORRIDO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS PREVIAMENTE EN VISITA DE RECORRIDO.
SE VERIFICA SEÑALIZACIÓN DEL ENTORNO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
EN EL COMPONENTE AMBIENTAL SE RECORREN LAS CALLES YA INTERVENIDAS PARA VERIFICAR ASEO GENERAL (SECTOR Carrera 11 calle 17 y 18N)
EL CONTRATISTA REALIZA CHARLA MENSUAL POR PARTE DEL ÁREA SSSO, AMBIENTAL Y SOCIAL SEGÚN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PIGRA
EL CONTRATISTA REALIZÓ SOCIALIZACION EN EL SECTOR. PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN YANDITARÁ
ESTADO DEL TIEMPO SECO

Jaime Oswaldo Ll
Residente de Obra

Miguel Angel Quiñonez C.

impulsado por CamScanner

MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
EL CONTRATISTA INICIA SUS ACTIVIDADES DE OBRA EN CLL 26 ENTRE CRAS 4A Y 4B. CON FRESADO
SE RECIBE VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING KALINA BETANCOURT QUIEN ADICIONÓ OTRAS ÁREAS PARA INTERVENIR COMO CRA 4A CON CLL 26BN Y UN TRAMO DE B/ VILLA DOCENTE.
EL CONTRATISTA REALIZA CON UNA CUADRILLA REPARACION QUE SE HABIA SOLICITADO EN LA CRA 9 CON CLL 4 FRENTE A NEGOCIO DE BOÑUELOS.
LA INTERVENTORÍA VERIFICA CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA LA CUAL LLEGA A 150°C Y SE UBICA A 130°C. PARA SU COMPACTACIÓN, TAMBIEN HAY ACTIVIDAD DE FRESA. DO EN LA CLL 26AN ENTRE CRA 4A Y 4B.
INFORMACIÓN DE VIAS PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS POR PARTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CALLE 26 AN., CLL 26BN (DAÑOS PUNTUALES) EN CRA 4A ENTRE 26BN - 26CN (REVISAR REDES)
CLL 26 DN HASTA 4A04 A CRA 4B (VER REDES)
CRA 4A ENTRE 26 EN - 27N INTERVENCIÓN COMPLETA
CLL 27N ENTRE 4B Y 4-23 INTERVENCION COMPLETA, CL 30N ENTRE 4B Y 4-110 - 4-113. BACHE PUNTUAL CON CRA 4B, CLL 3RN ENTRE 4B HASTA 4-108 COMPLETO, VIA DE LOS DOLARDOS CLL 25 BIS (BACHE PUNTUAL EN EL CENTRO DE LA VIA., CRA 4B (ATRAS DEL PARQUE ENTRE CL 26 BIS Y 26N

Jaime Arvelo Ch
Residente de Obra

Trujoberto Jiménez C.
RES. INTERV.

impulsado por CamScanner

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022.
ESTADO DEL TIEMPO SECO.
ACTIVIDADES:
SE LLEVA VISITA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE, JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN QUIEN VERIFICA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN LA COMUNA #3 DE POPAYÁN
SE CONTINUAN LABORES DE FRESADO EN LA CARRERA 4. ENTRE CLL 25B y 26 N
SE REALIZA IMPRIMACIÓN EN CLL 26N ENTRE CRA 4 y 4B EN UN AREA PENDIENTE POR PAVIMENTO QUE NO SE HIZO EN LA JORNADA ANTERIOR
SE CONTINUA FRESADO EN LA CLL 25AN ENTRE CRA 4 BARRIO BOTALA
SE REPORTA AL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UNA CÁMARA EN MAL ESTADO EN LA CLL 23AN ENTRE CRAS 4 y 4B.
SE INSTALA VALLA MOVIL #9 EN CLL 26N ENTRE CRA 4 y 4B.

Residente de Obra

impulsado por CamScanner

VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO SECO => LLUVIAS EN HORAS DE LA NOCHE

ACTIVIDAD: SE REALIZO IMPRIMACIÓN EN LA CLL 26 N ENTRE CARRERA 4 Y CRA 4B.

FRESADO EN CLL 25AN ENTRE CRA 4 Y 4B. SOBRE LA INSTALACION MEZCLA MDC 19 CLL 26N ENTRE CRA 4 Y 4B CRA 4B ENTRE CLL 25AN Y 26N, CRA 4B ENTRE CLL 25AN Y CLL 26N, CLL 25AN FRENTE A (4A27) CLL 26AN ENTRE 4 Y 4B

AL PASO DE MAQUINARIA SE DEJA COPLO UNA ACOMETIDA, DAÑO QUE SE REPORTÓ A ACUEDUCTO DE INMEDIATO.

SE RECIBE VISITA POR PARTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA QUIEN VERIFICA AVANCE DE LAS OBRAS.

En este sector se encontrado las redes de acueducto a una profundidad no mayor de 40 cm, los daños en los puntos donde las instalaciones estan superficiales o que se presenten atrasos directamente el avance de la obra, adicional es reportado y toca arreglar el sitio posterior a la instalación de la mezcla. Sugerimos que no ser arreglos puntuales por dar prioridad para poder tener un acabado continuo, gracias por la atención y lo que podemos arreglar

Jaime Oswaldo Ch
Residente de Obra

Ing. Jefferson Quintero C.
Res. Interventoría

impulsado por CamScanner

SABADO 15 DE AGOSTO DE 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 INSPECTOR, 8 OPERARIOS BOMBAS, 4 CONDUCTORES VOLQUETAS, (18) OFICIOS VARIOS.

Y

EQUIPOS: 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR LLANTAS, 1 COMPACTADOR DE CILINDRO, 5 VOLQUETAS, 2 NPR, 1 RETROEXCAVADORA.

ACTIVIDADES: INSTALACION DE MEZCLA MDC 19 SOBRE CL 26AN ENTRE CRA 4A Y 4B, CLL 26 BN ENTRE 4A-4B, CARRERA 4B ENTRE 26 AN.

Ing. Oswaldo [illegible]
Residente de Obra

Ingeniero Quintero C
Res Interventoria

MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022

PERSONAL: 1 ING. DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES, 9 OPERARIOS, 1 AMBIENTAL, 1 SISO, 1 SOCIAL, 15 OFICIOS VARIOS, 2 VIGILANTES

EQUIPOS: 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE LLANTA, 1 COMPACTADOR RODILLO, 1 VIBROMITA, 2 NPR, 6 VOLQUETAS, 1 VEHICULO TRANSPORTE, 1 CARRO TANQUE COMBUSTIBLE.

ESTADO DEL TIEMPO SECO.

ACTIVIDADES:

SE REALIZA FRESADO EN CARRERA 4A ENTRE 26 AN Y 26 CN, EN CRA 5B CON 25N

DEMARCACION VIA CRA 5A ENTRE 25 N Y 26 AN

impulsado por CamScanner

INTERVENCION CALLE 26 ENTRE 5B y 6, CARRERA 4 ENTRE 26BN y 26CN
PAVIMENTO CRA 4A ENTRE CL 26BN y 26CN.
NOTA (EN ESTA CALLE EL SUMIDERO EXISTENTE YA ESTABA TAPADO O COLMATADO)
PAVIMENTO CRA 4 CON CL 26BN, PAVIMENTO CALLE 26BN CON 4A, PAVIMENTO CRA 5B ENTRE 25N y 26N, FRESADO CRA 5B ENTRE 26N y 27N, FRESADO CL 26N y CRA 5 y 5B PAVIMENTO CL 26N ENTRE 5B y 6, EN ESTA CALLE LA INTERVENTORIA REPORTA DAÑO A UNA CANAL METALICA, SE INFORMA A LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Residente de Obra

Residente Interventoria

MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022

PERSONAL 1 ING RESIDENTE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA 2 INSPECTORES, 1 RES SOCIAL, 1 RES AMBIENTAL, 1 SISO, 9 OPERARIOS, 18 OFICIOS VARIOS 2 VIGILANTES

EQUIPOS: 1 FRESADORA, 1 FINISHER 1 COMPACTADOR MANTA 1 COMPACTADOR RODILLO, 2 MPR, 6 VOLQUETAS, 1 VEHICULO TRANSPORTE, 1 MARMITA,

ESTADO DEL TIEMPO: SECO - LLUVIA FUERTE 2 HORAS

ACTIVIDADES: FRESADO EN CL 26N ENTRE 5B y 6

impulsado por CamScanner

FRESADO CRA 5A CON CLL 26N, FRESADO CLL 26 AN CON CRA 5A, FRESADO CARRERA 26AN ENTRE 5A y 5.
PAVIMENTO CRA 5 ENTRE CLL 26N y 26AN
PAVIMENTO CLL 26N ENTRE 5D y CRA 6.
(PENDIENTE DESDE AYER).
SE INFORMA A LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO UN DAÑO EN ACOMETIDA EN CALLE 26DN 4AG3 VILLA DOCENTE, QUIENES REALIZAN EL ARREGLO.
LA INTERVENTORIA VERIFICA UN SUMIDERO Y UNA CAMARA INICIAL EN CLL 25B CON 4B. QUE NO ERA VISIBLE y POR PASO VEHICU. TAL SE AFECTO LA TAPA, SE REPORTA AL ÁREA DE ALCANTARILLADO PARA SU INSTALACIÓN, EL CONTRATISTA REALIZA LA LIMPIEZA DEL MATERIAL. SE INSTALAN 8 VIAJES DE MEZCLA FRESADO 5 VIAJES DE 15M3 y 2 VIAJES DE 6M3

Residente de Obra — Ing. Roberto Quintero C. RES. INTERVENTORIA

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022.

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES 10 OFICIALES CAMIRO, 1 SISO, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL. (78) OFICIOS VARIOS, 2 VIGILANTES.

EQUIPO: 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE PLANTAS, 1 COMPACTADOR DE RODILLO, 1 MAQUITA 2 NPR, 1 RANA, HTA MENOR, 1 SOPLADOR, 4 VOLQUETAS MEZCLA, 2 VOLQUETAS PARA FRESADO.
ESTADO DEL TIEMPO: 1 LLUVIOSA 1 HORA

ACTIVIDADES:

impulsado por CamScanner

FRESADO EN CALLE 26AN ENTRE CRA 5 y CRA 6
FRESADO CALLERA 5A ENTRE 26AN y 26BN
PAVIMENTO CARPETA(A) 26AN ENTRE (5A-26) y (5A 10)
PAVIMINTO CARRERA 5B CON 26AN
PAVIMENTO C// 26 BN ENTRE 5 y 6
FRESADO CALLE 26 BN CR 4 y 4A PAVIMENTO UN TRAMO C//26BN.
EL ACUEDUCTO HACE PRESENCIA PARA ARREGLO DEL DAÑO DE LA ACOMETIDA CRA 5B CON 26AN
EL COMPONENTE AMBIENTAL ATIENDE LABORES DE ASEO EN ÁREAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATISTA; LA INTERVENTORIA ACOMPAÑA AL CONTRATISTA EN LABOR SOCIAL EN EL VECINDARIO. EL AA. DE POPAYAN SUMINISTRA TAPA DE SUMIDERO y CANASTA PARA REPARACIÓN EN SUMIDERO NO VISIBLES.
AL FINALIZAR LA JORNADA SE INSTALAN 8 VIAJES DE MEZCLA MDC 19

Jairo Bustillo C.
Residente de Obra

Eugenio Quintero C.

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022
PERSONAL 1 ING. RESIDENTE, 1 SISO, 1 AMBIENTAL 1 SOCIAL, 2 INSPECTORES, 10 OPERARIOS EQUIPOS (18) OFICIOS VARIOS, 2 VIGILANTES).

EQUIPO, 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE PLANTA 1 COMPACTADOR DE RODILLO, 1 MAQUITA, 2 VOLQUETA 1 RANA, HTA MENOR, 1 SOPLADOR 4 VOLQUETAS MEZCLA 2 VOLQUETAS FRESADO.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO

impulsado por CamScanner

ACTIVIDADES:
FRESADO: CARRERA 4B ENTRE CALLES 26DN y 26EN
PAVIMENTO CII 26DN NOMENCLATURA 4-43 VILLA PORCENTA 1/4
EN EL PROCESO DE FRESADO SE ENCUENTRA UNA SUMIDERO OCULTO EN CII 26 ON CON CRA 4. ESQUINA
INICIO FRESADO CRA 5, CRA 4B, INTERVENCIÓN
FRESADO CII 27N CON CRA 4 y (4B) 4A
SE INSTALA PAVIMENTO CN CII 2C BN CON 26CN CRA 4, SE SOLICITA AL CONTRATISTA VERIFICAR CAPICTA POR POSIBLE DAÑO DE AGUA EN ESQUINA CRA 5 CON 26 FRENTE A PUNTO. LA INTERVENTORIA LO REPORTA AL ACUEDUCTO.
EN ESTA JORNADA SE HICIERON: 8 VIAJES DE FRESADO y 6 VIAJES DE MEZCLA MDC 09.

Jaime Rivaldo Gil
Residente de obra

Ruyberto Quiñones C.

SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022

PERSONAL: 1 ING. RESIDENTE DE OBRA. 1 DIRECTOR 1 SOCIAL, 1 SISO, 1 AMBIENTAL 2 INSPECTORES. 9 OPERARIOS DE EQUIPOS; (18) OFICIOS VARIOS 2 VIGILANTES.

EQUIPO: 1 FRESADORA. 1 FINISHER 1 CARROTANQUE COMBUSTIBLE, 2 VOLQUETAS FRESADO, 4 VOLQUETAS PARA MEZCLA 1 RANA 1 SOPLADOR 1 COMPACTADOR LLANTAS 1 COMPACTADOR RODILLO

ESTADO DEL TIEMPO: SECO;

ACTIVIDADES:
FRESADO EN CII 27N ENTRE 4 y 4B

impulsado por CamScanner

FRESADO CARRERA 4B ENTRE 26DN Y 25N.
AL FINALIZAR LA CRA 27N, NO SE INTERVIENE PORQUE NO HAY ESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. Y HAY UNA REJA DE PISO QUE AL PASO DE LA MAQUINARIA SE PUEDE AFECTAR.
EL CONTRATISTA HACE DEMARCACIÓN DE LA MAQUINARIA.
SE INICIA INSTALACIÓN DE MEZCLA SOBRE LA CLL 27N CON CRA 4A, SE ALISTA SUPERFICIE SOBRE CRA 4B DESDE 27N HASTA 30N SE DEJARÁ UNAS HOJAS PARA QUE PENETRE LA LECA.

Jaime Heraldo Ad
Residente de Obra

Augusto Quintero C

LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022.
LIMPIEZA DE BORDES DE CRA 5 ENTRE 27N Y CLL 32N
EL CONTRATISTA REALIZA DEMOLICIÓN SOBRE CLL 26CN ENTRE CRA 4B Y 5.
SE REALIZÓ CONJUNTAMENTE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA LA MARCACIÓN EN SECTOR CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNICAUCA Y FACULTAD DE EDUCACIÓN, PLUMILLAS A INTERVENIR.
SE REALIZÓ FRESADO EN UN ÁREA SOBRE CRA 4B JUNTO A REDUCTOR DE VELOCIDAD.
NO HUBO SUMINISTRO DE MEZCLA MDC-19.
INFORMÓ EL CONTRATISTA.
SE REALIZÓ DEMOLICIÓN CON ROTOMARTILLO DE SUPERFICIE CLL 27N ENTRE CRA 4A Y 4B.

Jaime Heraldo Ad
Residente de Obra

Augusto Quintero C
RES. INTERVENTORÍA.

impulsado por CamScanner

MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022.

PERSONAL 1 RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SISO, 10 OPERARIOS MAD. PESADO, (98) OFICIOS VARIOS 2 VIGILANTES

EQUIPO 1 FINISHER, 1 RETROEXCAVADORA, 1 COMPACTADOR LLANTAS 1 COMPACTADOR DE RODILLO; 1 CARRO TANQUE PARA COMBUSTIBLE, 2 AIRE, 2 VIBRO. TAS FRESADO 4 VOLQUETAS PARA MEZCLA.

ESTADO DEL TIEMPO SECO

ACTIVIDADES

LABORES DE FRESADO EN CARRERA 4A CON CALLE 27N FRESADO CARRERA 4N ENTRE 26AN Y 26 EN INSTALACION DE PAVIMENTO. SOBRE CARRERA 5 CON CL 32 HACIA EL SUR

SOBRE LA CALLE 30N LA SUPERVISION DEL CONTRATO AUTORIZA LA INTERVENCION EN 3 SECTORES A BORDE DE VIA MEJORANDO LOS HUECOS Y CHARCOS POR EL MAL ESTADO DE LA VIA

EL ACUEDUCTO REALIZA EL ARREGLO DE SUMIDERO EN LA CRA 5B CON CL 26 A. SE INSTALAN 6 VIAJES DE MEZCLA Y RETIRO 3 FRESADO

Se solicita tener presente que al realizar la excavación del pavimento se dejen las áreas claramente y con un criterio confinado, para evitar postprocesos o retrocesos de las actividades que se encuentren programadas previa a la demarcación conforme realizada

Jairo Ricardo Pol
Residente de Obra

Augusto Quiñones C

MIERCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO SECO

impulsado por CamScanner

PERSONAL 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 10 OPERARIOS CALIFICADOS. (1 E) OFICIOS VARIOS

EQUIPO: 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE LLANTAS, 1 COMPACTADOR DE CILINDRO, 2 VOLQUETAS PARA FRESADO, 4 VOLQUETAS MEZCLA, 1 CARGUE TANQUE COMBUSTIBLE, 2 NPR, 1 MARMITA, 1 RANA, 1 SOPLADOR. HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES:

FRESADO EN CL 27CN ENTRE CRA 4B Y 6TA
PAVIMENTO SOBRE CL 26CN. ENTRE 4B Y 5.
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA PROGRAMAR LA REPARACIÓN DEL ANDEN EN LA CALLE 26AN # 4A14 BARRIO VILLA DOCENTE, PROPIEDAD DEL SEÑOR ÁNGELO OVIEDA (TEL 320 960.3639) ANDEN QUE SE VIÓ AFECTADA POR TRANSITO DE UNA VOLQUETA DE EQUIPO DE OBRA.
JUEGO DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR EN CALLE 32N, LA INTERVENTORÍA INFORMA AL CONTRATISTA QUE LAS ACTIVIDADES SE HARÁN HASTA LA CASA 4-108 FINALIZANDO ANDÉN. SE HABLÓ CON LA COMUNIDAD Y SE LES EXPLICÓ LA ORDEN DADA POR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
PAVIMENTACIÓN EN CL 26CN ENTRE 4B Y 5
PAVIMENTACIÓN CARRERA 4A ENTRE 26D Y 29
FRESADO EN CL 32N HASTA NOMENCLATURA 4-108
SE TERMINA FRESADO Y SE IMPRIMA LA CL 32N INGRESO AL BARRIO YAMBITARÁ
SE ARREGLAN POR PARTE DEL CONTRATISTA UN HUECO FINALIZANDO CL 27N, PAVIMENTO CL 30N ARREGLO DESNIVEL FRENTE A CL 30N # 4-104
SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS HDC 19 PARA LABORATORIO EN CL 32 ENTRE 4b y CRA 6 (CITEC)

impulsado por CamScanner

EL CONTRATISTA HACE UN RECORRIDO NUEVAMENTE EN LA CII 30N, MANIFIESTA QUE PRESENTA DETERIORADA Y EN PÉSIMAS CONDICIONES, QUE SOLO SE INTERVENDRÁ, SE HARÁ INTERVENCIÓN UNICAMENTE DONDE LO INDIQUE INTERVENTORÍA PERO EL CONTRATISTA SUGIERE HACER UNA INTERVENCIÓN TOTAL DE LA CUADRA PORQUE ESTA DETERIORADA

EL CONTRATISTA REALIZA LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. EN CUNETAS Y ANDEN.

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO. CON MEZCLA MDC 19 SOBRE LA CII 32N CARRIL DERECHO EN SENTIDO DEL TRANSITO

ADICIONAL EN LA CII 29N SE HABIA SOLICITADO LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO DE UNA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, LA CUAL HOY FUE CONSTRUIDA CON MEZCLA ASFALTICA MDC 19 FRENTE A LA CASA 2-54. B/ VILLA DEL CENTE

Nota

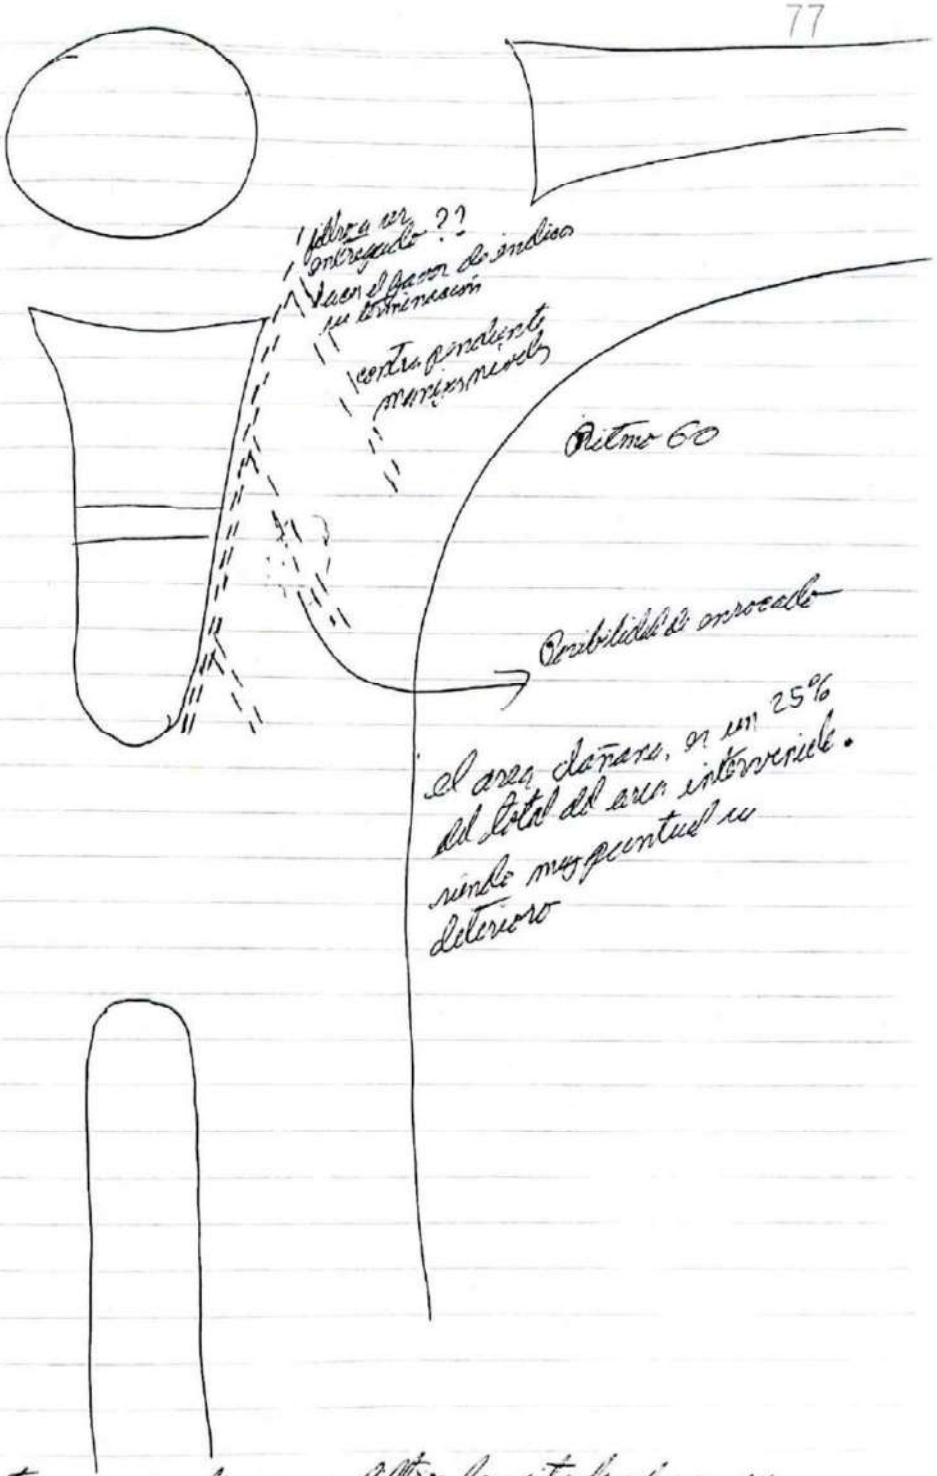
Con relación a la intervención del area en la calle 11N con Avenida 9 segun oficio 60.

En comité el pasado martes por parte del contratista que en dicha intervención hasta el último momento solicitamos no realizar la intervención como se estaba indicando, si no simplemente picar y en el sitio mas deteriorado realizar una excavación puntual y reinstalación con parcho para no dañar el suelo previamente consolidado como se encontrado, y seguimos unicamente las instrucciones impartidas por interventoría.

Despues de realizar la intervención como la sugirieron vemos afectado un area parcial del area intervenida mas no todo lo intervenido presenta este fenomeno que esto fue reflejado sobre la carpeta asfaltica.

posterior de realizar las actividades indicadas y liberadas por interventoría, se observa un daño que esta reflejado en la carpeta. Sugerimos que adicional a la solucion tecnica

impulsado por CamScanner



Los plantines se realizo en golpe longitudinal con su respectivo orgino de pescado para ayudar a la solucion del problema.

Jaime Oswaldo PH
Residente de Obra

impulsado por CamScanner

En el Sector en mensión Calle 4N con transversal 9 - Sector Terminal de transportes frente a Ritmo sobre la calzada Izquierda, se tiene programado Un apique a una profundidad de 1,5 mts con el fin de verificar Niveles freaticos, adicionalmente se realizara CBR y toma de muestras de base Granular (se tomara muestra para Contratista, Interventoria y Supervision)
Una vez obtenidos los resultados y analizados por los especialistas La Interventoria acatara la Solución previa Socialización en Comite Tecnico con la Supervisión.

Rugabelo Chuchuca

JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022

PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 1 RES. AMBIENTAL, 1 RES. SISO 10 OPERARIOS MAQUINARIA (9) OFICIOS VARIOS

EQUIPO: 1 FRESADORA, 1 COMPACTADOR DE LLANTA, 1 COMPACTADOR RODILLO, 2 NPR, 1 FINISHER, 1 PALA, 1 SOPLADOR, 1 VEHICULO DE TRANSPORTE
ESTADO DEL TIEMPO SECO. volqueta de mezcla

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON LA INTERVENCIÓN DE LA CLL 32N CON IMPRIMACIÓN Y POSTERIOR PAVIMENTACIÓN EN CLL 32N ENTRE CLL 4 Y 4B.
SE INTERVIENE LA CR 32 NORTE. ACCESO HACIA B/ Y AMBITOSA EN AMBOS SENTIDOS.
SE INICIA FRESADO EN LA CRA 5 ENTRE CLLES 33 y 34

impulsado por CamScanner

EL CONTRATISTA REALIZA LA INSTALACIÓN DE PANCARTAS. DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA.

SE HACE RECORRIDO CON COMISIÓN DE INGENIEROS SUPERVISORES DE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SEC. ILDAURA BETANCOURT. INSPECCIONANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS

Y FINALIZANDO LA JORNADA SE ATIENDE VISITA DEL SEÑOR ALCALDE DE POPAYAN JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN.

EL CONTRATISTA TERMINA LABORES PARA LA COMUNA 3 PARA MAÑANA.

LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA VISITAN EL SECTOR DE ACCESO A GLORIETA TERMINAL CON EL ESPECIALISTA ING. HUGO DAZA DEL LABORATORIO CITEC ASESOR INTERVENTORIA, QUIENES REALIZAN UN APIQUE Y POSTERIOR TOMA DE UNA MUESTRA DE SUELO, EN EL LUGAR DONDE SE EVIDENCIA DAÑO EN LA CARPETA.

Pat. Se organiza y genaliza el pando en la carrera 10 entre calle 17N a 18N donde se presento la excavación, y se interviene con mezcla en caliente en los bordes y se le extiende mezcla a un lado para ayudar a la estabilidad en el CII 18N

Jaime Oviedo Ad
Residente de Obra

Cinyaberto Chalimbo C.
Res. Interventoria

impulsado por CamScanner

VIERNES 26 DE AGOSTO. 2022
ESTADO DEL TIEMPO SECO
ACTIVIDAD:
SE REALIZA INICIO DE LABORES CON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING. KARINA BETANCOURT. EN LA CARRERA 3 N. ENTRE CLL 6 - 6C y CLL 6D SE DETERMINA EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN PARCIAL, SE REALIZAN EN ESTE SECTOR LAS ACTIVIDADES DE FRESADO, IMPRIMACIÓN y PAVIMENTO CON MEZCLA MDC-19. DE ESTA SE TOMA MUCOTREO PARA LABORATORIO DE INTERVENTORIA. Barrio Alicante

Presidente de Obra
Encargado Residente

SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2022
ESTADO DEL TIEMPO - SECO.

ACTIVIDAD:
SE TRASLADA MAQUINARIA EN CAMA BAJA HASTA EL BARRIO EL LICEO, PARA INICIAR LABORES EN. CLL 2 ENTRE CRA 2 y 3. ENCONTRANDO UN SUMIDERO TAPADO EN LA ESQUINA DE LA CLL 2 CON CRA 4; SE INFORMA AL ING. JESUS BERMUDEZ QUIENES ADELANTAN VISITA AL SITIO y DETERMINAN QUE REDES ESTAN HABILITADAS.
PAVIMENTO EN LA CLL 2N ENTRE 3 y 4.
y SE INICIA FRESADO SOBRE CARRIL 4 EN DIRECCIÓN A CLL 3N

Residente de Obra
RES. INTERV.

impulsado por CamScanner

Jairo Quintero Ch
Residente de Obra

JUNES 29 DE AGOSTO DE 2022.

PERSONAL: JING. RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES (10.) OPERARIOS MAG. PESADA, (19) OFICIOS VARIOS. JRESIDENTE SOCIAL, JRES. AMBIENTAL. JRES. SISO 2 VIGILANTES

EQUIPOS: J FRESADORA, (2 VOLQUETA FRESADO. 1 FINISHER, 2 NPR, J COMPACTADOR LLANTAS. J COMPACTADOR DE RODILLO, 4 VOLQUETAS 15 M3 PARA TRANSPORTE DE MEZCLA, J RANA, J SOPLADOR. J MARMITA

ESTADO DEL TIEMPO. SECO. MAÑANA.

SE CONTINUA LABORES DE FRESADO EN CALLE 3N ENTRE CRA 3 Y 4. DE ACUERDO A LA MARCACIÓN HECHA POR LA INTERVENTORÍA.

Jairo Quintero Ch
Residente de Obra

Ingeniero Quintero C.
RES. INTERV.

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022.

PERSONAL: JING. RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTORES JRES. SISO, JRES. AMBIENTA JRES SOCIAL (20) OPERARIOS MAQUINARIA (19) OFICIOS VARIOS 2 VIGILANTES

EQUIPO: J FRESADORA, 1 FINISHER, J CARRO TANQUE COMBUSTIBLE, 1 FINISHER 2 NPR, 4 VOLQUETAS MEZCLA. 2 VOLQUETA PARA FRESADO. J COMPACTADOR DE LLANTA, J COMPACTADOR DE RODILLO.

impulsado por CamScanner

J RANA J SOPLADOR.

ESTADO DEL TIEMPO SECO.

ACTIVIDADES,

SE HACE REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA DE LOS CIERRES PMT ACORDANDO CON EL CONTRATISTA QUE HABRÁ TRASTORNOS EN EL FLUJO, AL MOMENTO DE INTERVENIR LA INTERSECCIÓN.

Nota
El contratista solicita a la interventoría, unificar criterio en la selección de las áreas a intervenir y marcadas conjuntamente. Dado que en varias ocasiones se ha presentado que la grúadora ha retirado lo marcado y se debe llevar a determinar mas areas, lo cual genera retrocesos y mayor tiempo de ejecución en lo programado.
Deiner Oswaldo Gil
Residente de Obra

El contratista informa que debido las condiciones viales y de flujo vehicular, en la zona de la Carrera 2 vía mosquera - Tulcan y barrio antiguo Peaje se requiere el cierre total de las vías en uno de los dos sentidos de flujo vehicular para evitar posibles accidentes de Transito debido a la geometría vial existente
Deiner Oswaldo Gil
Residente de Obra

FRESADO y PAVIMENTO EN LA cll 3 N. y CIA 2A EN LA cll 3N SE ENCONTRÓ UNA CAJA EN MAL ESTADO SE INFORMA AL ACUEDUCTO DIVISION ALCANTARILLADO QUIENES PROGRAMARON INSPECCIÓN.
Deiner Oswaldo Gil
Residente de Obra

Edgardo Chamorro C
RES. INTERVENTORIA

impulsado por CamScanner

MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE, 1 ING. RESIDENTE, 1 RES. SOCIAL 2 INSPECTORES
1 SISO, 1 AMBIENTAL, 10 OFICIALES 30 OFICIALES VARIOS.

EQUIPO: 1 INGENIERO, 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIAR COMISIONADOR
DE OBRAS, DE ACUERDO A CANTIDADES MEZCLA
2 VOLQUETAS TRABAJO. 1 MAQUINA 1 SOPLADOR,
UNA HORA
ESTADO DEL TIEMPO SECO

ACTIVIDADES SE TRABAJA CALLE 3N ENTRE T y 2A y
CRA 2A ENTRE CALLE 1N y 3N SE REALIZA TRAMADO
EN ESTA AREA y SE PAVIMENTA HASTA ENTRADA UNIVERSIDAD
PMT: Inicialmente para intervención del Sector de
Tulcan entre Calles 1N y 10N Sobre con la Carrera 2da
Vía el Morro, se realizo el Cierre vial en
la esquina Carrera 2 con Calle 1N; En las Horas que
estuvo Cerrada esta vía no hubo intervención por
lo que fue necesario aperturar el transito hacia
las 11:00 am en Coordinación de Transito Municipal.
La Interventoria Recomienda realizar el Cierre vial
estrictamente donde sea necesario y en el momento
de realizar la Intervención.

EN HORAS DE LA TARDE SE RECIBE VISITA DEL
SEÑOR ALCALDE y COMITE DE SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICAR AVANCE
EN CAMPO DE LAS OBRAS. ACOMPAÑA SECRETARIA
DE TRANSITO.

Residente Obra — Residente Ejec.

Nota: El cual fue a dejar constancia verbal para dar aviso del
diligenciamiento del diario anterior (ausencia de mi firma del sabado
para radicar el diligenciamiento de los mismos. El Contratista hasta un dia
en contra vía sus observaciones

impulsado por CamScanner

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERSONAL 1 ING RESIDENTE OBRA, 2 INSPECTORES DE OBRA, 1 RES. SISO, 10 OPERARIOS MAQUINARIA (14) OFICIOS VARIOS, 2 VIGILANTES

EQUIPO 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE LLANTA, UN COMPACTADOR DE RODILLO, 1 MANEMIX 2 NPL, 1 CARROTANQUE PARA COMBUSTIBLE, 2 VOLQUETAS PARA CARGUE DE FRESADO. 1 RANA, 1 SOPLADOR, 1 CARRO TRANSPORTE 4 VOLQUETAS DE MEZCLA

ACTIVIDAD

ESTADO DEL TIEMPO SECO MAÑANA; Tarde lluvias Moderadas 4:00pm

EN OBRA SE INICIA FRESADO EN CRA 2A. HACIA CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CALZADA IZQUIERDA.

LOS CIERRE DE ACUERDO A PMT SE INICIAN A PARTIR DE LAS 9:00AM Y EL TRÁNSITO FLUYE ORDENADAMENTE

SE PAVIMENTA EN LA CRA 2A ENTRE CALLE 3N Y 10N FACULTAD DE EDUCACIÓN CON 70cm ESPESOR (AJT)

SE CONTINUAN LABORES DE FRESADO EN CRA 2 FRENTE AL CENTRO D. U. Y SE PROCEDE A HUMEDECER, EXTENDER Y COMPACTAR LA MEZCLA NDE 14 LA CUAL TIENE UNA TEMPERATURA DE 146°C.

CONTINÚA LABOR DE FRESADO SOBRE CRA 2 VIA. HACIA EL MORRO; EN LA UBICACIÓN DE LA MÁQUINA FRESADORA SE AFECTÓ UN CABLE DE ENERGÍA BAJA TENSIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA COMUNICAN A CEO. Y LA EMPRESA INTERVIENE INMEDIATAMENTE, RENOVIENDO LA NORMALIDAD EN EL SERVICIO RESTABLECIDO.

LAS LABORES SE EXTIENDEN HACIA LA PARTE

impulsado por CamScanner

BAJA DEL MORRO HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO POR SECTORES

Jaime Arnaldo Ali
Residente de Obra

Ruyberto Quiñonez C.
RES. INTERVENT.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERSONAL: 1 ING. RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES SRES. SISO. 1 RES SOCIAL, 1 RES. AMBIENTAL, 10 OPERARIOS DE MÁQUINA, 19 OFICIOS VARIOS, 2 VIGILANTES

EQUIPO: 1 FRESADORA, 1 FINISHER, 1 COMPACTADOR DE RODILLO, 1 COMPACTADOR LLANTAS, 1 MARMITA 2 NPR, 1 CARROTANQUE COMBUSTIBLE, 2 VOLQUETAS FRESADO, 4 VOLQUETAS MEZCLA
ESTADO DEL TIEMPO: SECO.

ACTIVIDADES: FRESADO SOBRE CRA 2 DESDE IN. HACIA 3 NORTE, PAVIMENTO: RIEGO DE LIGA, EXTENSIÓN DE MEZCLA MDC19, COMPACTACIÓN Y SELLADO DESDE INICIO YEE HACIA EL MORRO Y CRA 2. HACIA PUENTE PEATONAL UNICANCA.
TEMPERATURA DE LA MEZCLA 145°C. (Descarga)

Jaime Arnaldo Ali
Residente Obra

Ruyberto Quiñonez C.
Res. Inter.

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERSONAL: 1 ING. RES. DE OBRA, 2 INSPECTORES, 1 RES SISO. 1 RES SOCIAL 1. RES. AMBIENTAL, 19 OFICIOS VARIOS. 2 VIGILANTES.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
ACTIVIDAD: SE REALIZA ASEO GENERAL DE OBRA EN SECTOR DE TULCAN, LICEO y MORRO. MAQUINARIA EN SECTOR NA ORIENTE

Jaime Arnaldo Ali
Residente de Obra

Ruyberto Quiñonez C
Res. Inter.

impulsado por CamScanner

DOMINGO 4 DE SEPT. DE 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA
Jaime Osvaldo Ali
Residente de Obra
Rogelio Quintero C.
RES. INTERV.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
PERSONAL: 1 INGENIERO RESIDENTE 2 INSPECTORES, 10 OPERARIOS
19 OFICIOS VARIOS 2 VIGILANTES
SE REALIZO RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL ING. FERNANDO TOBAR, SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN LA VIA VEHICULAR ORIENTE CRA 6E, EN LA CUAL SE DETERMINO INTERVENCION DE SITIOS CRITICOS, BUSCANDO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO.
INCLUYE INTERSECCION CALLE 16 CON CRA. 6AE. Y
CALLE 16 ENTRE 1E y 1? (VIA TOTAL).
REGULO ALVAREZ
RESID. INTERVENT.
Jaime Osvaldo
Encargado Obrero
Residente Obra
ESTADO DEL TIEMPO
EQUIPOS: 1 FINISHER, 1 FRESADORA, 1 COMPACTADOR LLANTA
1 COMPACTADOR RODILLO, 2 NPR, 2 VOLQUETA FRESADO
4 VOLQUETA MEZCLA, 1 PLANA, 1 SUPLADORA, 1 BARREDORA
1 RETRO MENOR
ACTIVIDADES:
INTERVENCION SOBRE CL 17. ENTRE 5E y CL 16E.
FRESADO, IMPRIMACION y PAVIMENTO MDC 19.
SE TOMA MUESTRA A 140°C POR PARTE DE INTERVENTORIA AL INICIO DE LA INTERVENCION EN COSTADO LADO POSTERIOR PUESTO DE SALUD

Nota
El anterior sabado 03 de septiembre en compañía con interventoria, supervición del contrato y contratista se les solicito realizar la adecuada instalación de brocales de alcantarillo donde fueramos a realizar las intervenciones para realizar una protección adecuada a las tapas de alcantarillado que hay en el sector.
Despues de la auscultación del pavimento observamos que

impulsado por CamScanner

El exterior de la vía en general es en general, se encuentra deteriorado por los puntos donde hay desprendimiento de mezcla o asfalto existentes y se deja el lado donde el asfalto se encuentra firme, que de acuerdo, cabezas hacia la superficie durante se encuentra rodando el exterior de la vía y al cambiar las rigideces se van a crear más los daños en el sector.

Jairo Osvaldo Ríos M
Residente Obra

El contratista solicita a la entidad contratante realizar la adecuada reposición de los bordillos con sus lágrimas ya que sin este elemento quedarían sueltos, lo que podría ocasionar el hundimiento de la tapa y causar un posible accidente

Jairo Osvaldo Ríos
Residente de Obra

El contratista solicita a la entidad contratante realizar limpieza de los sumideros donde se realiza la intervención del proyecto

Jairo Osvaldo Ríos M
Residente de Obra

- Interventoría pondrá en Comité Técnico el día de mañana martes 06 de Septiembre de 2022, el tema de la reposición de bordillos de alcantarillas y mantenimiento de Sumideros.
* Los Sumideros son repotenciados directamente por la Interventoría a la entidad Contratante.
* El presente Contrato No Incluye limpieza de Sumideros.

Jairo Osvaldo Ríos M
Residente Obra

Reynaldo Quiñones C
Res. Interv.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PERSONAL: 1 ING. RESIDENTE DE OBRA, 2 INSPECTORES, 10 OPERARIOS MAQUINAS, 10 OFICIOS VARIOS. 2 VIGILANTES, 1 RES. SOCIAL 1 RES SISO

impulsado por CamScanner

MAQUINARIA: 1 FINISHER, 1 FRESADORA, 1 COMPACTA-
DOR DE RODILLO 1 COMPACTADOR DE RUEDAS-
2 VOLQUETAS PARA FRESADO, 2 VOLQUETAS MEZCLA
1 NPR TRANSPORTE, 1 SOPLADOR, 1 RANA,
HERRAMIENTA MENOR 1 CARRO DE TRANSPORTE.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO

ACTIVIDADES:
SE INICIA ACTIVIDAD DE FRESADO SOBRE
CARRERA 38E. ENTRE LIMITE DE BODEGA
ARCHARPO y LA ESQUINA DE LA CASA.
16-41 ENTRE BARRIOS BERLIN y LA
FLORESTA, y SE HACE UN CORTE EN LA
CALLE 17c. EN ZONAL.
EL CONTRATISTA INFORMA QUE NO HABRÁ SUMINIS-
TRO DE MEZCLA HASTA EL PORQUE LA PLANTA
PRODUCTORA ESTÁ VARADA.
SE ORGANIZA EL PERSONAL y SE REALIZA ASEO
y REPARACIONES PENDIENTES EN SECTORES
YA INTERVENIDOS.
EN HORAS DE LA TARDE CONTRATISTA E INTERVEN-
TORIA ASISTE A COMITÉ EN SECRETARIA DE INFRA.
ESTRUCTURA.

Jairo Arnulfo Ortiz
Residente Obra

Ruyberto Quintero C.
RES. INTERV.

impulsado por CamScanner

ANEXO 11
REGISTRO FOTOGRÁFICO

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.: 20211600024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211600024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 1		FOTO No. 2	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Villa Docente	**UBICACIÓN:**	Carrera 9 con Calle 18N
COMENTARIOS:	Visita del Sr. Alcalde durante actividades de obra	**COMENTARIOS:**	Recorrido verificación de vias de PMT
FOTO No. 3		**FOTO No. 4**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 11 entre Calles 17N y 18N	**UBICACIÓN:**	Carrera 11 entre Calles 17N y 18N
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado con fisuras y baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido
FOTO No. 5		**FOTO No. 6**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 11 entre Calles 17N y 18N	**UBICACIÓN:**	Carrera 11 entre Calles 17N y 18N
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado con fisuramiento en piel de cocodrilo	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 7



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 10 entre Calles 16N y 18N
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con fisuras en piel de cocodrilo y hundimientos

FOTO No. 8



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 10 entre Calles 16N y 18N
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido

FOTO No. 9



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 10



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 25 Bis Norte entre Carreras 4 y 4A Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 11



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26AN entre Carreras 4A y 4B Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19

FOTO No. 12



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

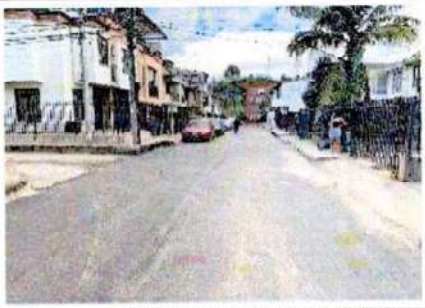
FOTO No. 13		FOTO No. 14	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26 N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente	**UBICACIÓN:**	Calle 26 N entre Carreras 4 y 4B Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido

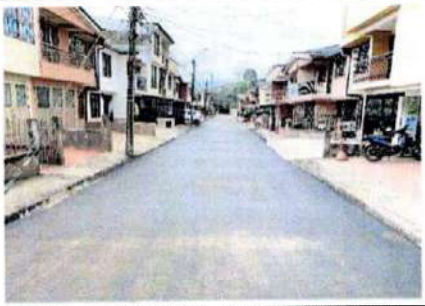
FOTO No. 15		FOTO No. 16	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:		**UBICACIÓN:**	
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado con presencia de baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido

FOTO No. 17		FOTO No. 18	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5B entre Calles 26N y 26AN. B/. Los Hoyos	**UBICACIÓN:**	Carrera 5B entre Calles 26N y 26AN. B/. Los Hoyos
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con piel de cocodrilo y baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 19		FOTO No. 20	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Barrio Los Hoyos	UBICACIÓN:	Calle 26AN entre Carreras 5 y 6 Barrio Los Hoyos
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

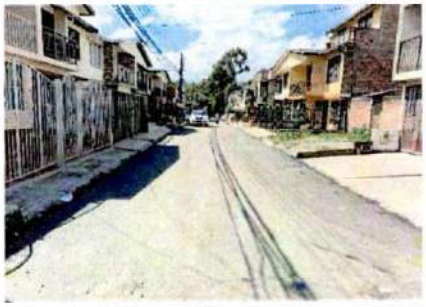
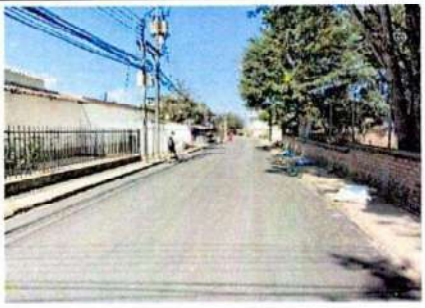
FOTO No. 21		FOTO No. 22	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Los Hoyos	UBICACIÓN:	Carrera 5B entre Calles 26AN y 26BN Barrio Los Hoyos
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 23		FOTO No. 24	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 27N entre Carreras 4 y 4B. Barrio Villa Docente	UBICACIÓN:	Calle 27N entre Carreras 4 y 4B. Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Estado inicial fisuras en piel de cocodrilo y baches	COMENTARIOS:	avimento intervenido

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA TECNICA

FOTO No. 25		FOTO No. 26	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN. Barrio Villa Docente	UBICACIÓN:	Carrera 4A entre Calles 26BN y 26CN. Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado	COMENTARIOS:	Pavimento intervenido
FOTO No. 27		FOTO No. 28	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26BN entre Carreras 4A y 4B. Barrio Villa Docente	UBICACIÓN:	Carrera 4B entre Calles 26DN y 27N. Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido	COMENTARIOS:	Pavimento intervenido
FOTO No. 29		FOTO No. 30	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre Calles 27N y 32N. Barrio Yambitará	UBICACIÓN:	Calle 32N entre Cra. 5 y 6 calzadas norte y sur. Barrio Yambitará
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA TECNICA

FOTO No. 31



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 2N entre Carreras 3 y 4
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento totalmente deteriorado

FOTO No. 32




FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 2N entre Carreras 3 y 4
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido, mediante instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 33



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4 entre Calles 1N y 3N. B/Tulcan
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado

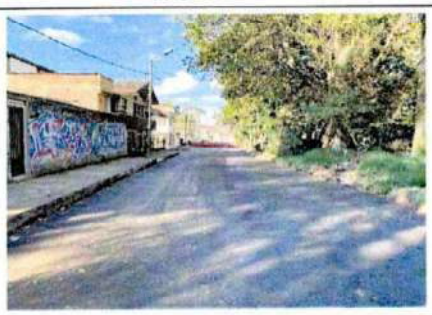FOTO No. 34



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4 entre Calles 1N y 3N. B/Tulcan
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido.

FOTO No. 35



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 3N entre Carreras 3 y 4, Tulcan
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento deteriorado.

FOTO No. 36



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 3N entre Carreras 3 y 4, B/ Tulcan
COMENTARIOS:	Pavimento intervenido, con instalación de carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	**INP SERVICIOS SAS** FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 37		FOTO No. 38	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N	**UBICACIÓN:**	Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con fisuras en piel de cocodrilo y baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido , con instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 39		FOTO No. 40	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N Sector Facultad de Educación	**UBICACIÓN:**	Carrera 2A entre Carrera 2 y Calle 3N Sector Facultad de Educación
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido , con instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 41		FOTO No. 42	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2 entre call10N y 15N Tulcan	**UBICACIÓN:**	Carrera 2 entre call10N y 15N Tulcan
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con baches	**COMENTARIOS:**	Pavimento intervenido , instalación de carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 1



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26N con carrera 4 Villa Docente
COMENTARIOS:	Señalización instalada de acuerdo al PMT

FOTO No. 2



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26N con carrera 4 Villa Docente
COMENTARIOS:	Señalización instalada de acuerdo al PMT

FOTO No. 3



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 con calle 34N Yambitara
COMENTARIOS:	Capacitación al personal en obra

FOTO No. 4



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 11 calle 17N y 18N
COMENTARIOS:	Verificación de limpieza áreas intervenidas

FOTO No. 5



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 11 calle 17N y 18N
COMENTARIOS:	Verificación de limpieza áreas intervenidas

FOTO No. 6



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26AN carrera 4
COMENTARIOS:	Disposición de señalización preventiva

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 7



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Jornada de Socialización inicio de intervención

FOTO No. 8



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	atención de inquietudes de habitantes del sector de las obras

FOTO No. 9



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Oficinas de la Secretaria de Infraestructura
COMENTARIOS:	Comité de obra 16-08-2022 . Asiste Entidad, Contratista, Interventoria y Secretaria de Transito

FOTO No. 10



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrios Villa Docente y Yambitará,
COMENTARIOS:	Recorrido en vias con acompañamiento de personal de la empresa AAPSA, para verificación previa del estado de redes.

FOTO No. 11



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Atención a la comunidad, miembros de Juntas de Acción Comunal

FOTO No. 12



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	actividad de levantamiento de registro fotográfico de andenes, fachadas y antejardines

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 13		**FOTO No. 14**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Yambitara	**UBICACIÓN:**	Barrio Yambitara
COMENTARIOS:	Uso adecuado de los **elementos** de protección personal	**COMENTARIOS:**	Uso adecuado de los elementos de protección personal
FOTO No. 15		**FOTO No. 16**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Oficina de Infraestructura	**UBICACIÓN:**	Barrio Villa Docente
COMENTARIOS:	Acompañamiento a **comité de obra** por parte del área ambiental	**COMENTARIOS:**	Limpieza de sectores intervenidos
FOTO No. 17		**FOTO No. 18**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 26BN entre carreras 4A y 4B	**UBICACIÓN:**	Calle 26BN entre carreras 4A y 4B
COMENTARIOS:	Jornada de aseo - Anden Sucio	**COMENTARIOS:**	Jornada de Aseo - Anden Limpio

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 19



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Oficinas de la Secretaría de Infraestructura
COMENTARIOS:	Comité de obra 23-08-2022 , Asiste Entidad, Contratista, Interventoría y Secretaría de Tránsito.

FOTO No. 20



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Parque Yambitará
COMENTARIOS:	Reunión Alcalde con la comunidad, para dar a conocer obras ejecutadas en los Barrios Yambitará, Los Hoyos y Villa Docente.

FOTO No. 21



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 31N entre Carreras 6C y 6E del Barrio Alicante
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19, visita director de interventoría

FOTO No. 22



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Cra. 4 entre Calles 1N y 3N
COMENTARIOS:	Inspección redes de alcantarillado, personal de AAPSA, previo al inicio de obras

FOTO No. 23



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio Yambitará
COMENTARIOS:	Levantamiento de registro fotográfico de fachadas y andenes

FOTO No. 24



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 Calle 32N
COMENTARIOS:	Instalación de Pasacalles Sector Yambitara - Villa Docente

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 25



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 con calle 30N
COMENTARIOS:	Camilla de emergencias en la obra

FOTO No. 26



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B calle 27N
COMENTARIOS:	Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal por parte de los colaboradores del contratista

FOTO No. 27



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B calle 32N
COMENTARIOS:	Requerimiento al contratista por carpado de volquetas

FOTO No. 28



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B calle 32N
COMENTARIOS:	Verificación de Sitio de disposición de residuos

FOTO No. 29



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B con calle 27N
COMENTARIOS:	Orden, aseo y limpieza de la zona

FOTO No. 30



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 4B con calle 27N
COMENTARIOS:	Limpieza con personal BOAL en vías intervenidas.

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 31



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2 entre calles 1N y 10N Tulcán
COMENTARIOS:	Verificación Actividades PIPMA,

FOTO No. 32



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 3N entre calles 2A y 3 Tulcán
COMENTARIOS:	Capacitación al personal de obra

FOTO No. 33



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2 Intersección con calle 2A
COMENTARIOS:	medidas preventivas durante la actividad de aplicación de emulsión asfáltica para evitar ensuciar andenes y paredes

FOTO No. 34



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Tulcán - Antiguo Liceo
COMENTARIOS:	Actividad de socialización a la comunidad

FOTO No. 35



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector antiguo Liceo y Facultad de Educación Universidad del Cauca
COMENTARIOS:	Levantamiento de registros fotográficos de fachadas y andenes

FOTO No. 36



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector antiguo Liceo y Facultad de Educación Universidad del Cauca
COMENTARIOS:	Levantamiento de registros fotográficos de fachadas y andenes

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 37



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2 con calle 1N
COMENTARIOS:	Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal

FOTO No. 38



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	carrera 2A entre calle 3N e intersección con calle 2 Tulcán
COMENTARIOS:	Instalación adecuada de señalización de acuerdo al PMT

FOTO No. 39



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 2 con calle 1ON
COMENTARIOS:	Acopio y disposición de herramientas menores y señales preventivas

FOTO No. 40



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Tulcán - Antiguo Liceo
COMENTARIOS:	Actividad de socialización a la comunidad

FOTO No. 41



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	sector de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca.
COMENTARIOS:	Visita del Sr. Alcalde el día 31-08-2022, durante actividades de obra realizadas

FOTO No. 42



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Facultad de Educación,
COMENTARIOS:	Reunión en obra s con Ingenieros de la Secretaria de Tránsito para revisión de PMT propuesto
