MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES — ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 de 03 de octubre de 2022

LAPSO del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	008-ARC-CBNL04-2022
CONTRATISTA	:	CM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 ABRIL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 de noviembre de 2022
VALOR INICIAL	:	$ 60.789.523.51
ADICIÓN (S)	:	$ 30.369.296,6
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 91.152.820.01
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TK Pérez Castelblanco Daniela, Ingeniera Electricista de la Base Naval ARC "San Andrés"
SUPERVISOR INICIAL	:	TK Pérez Castelblanco Daniela, ingeniera Electricista
SUPERVISOR FINAL	:	TK Pérez Castelblanco Daniela, ingeniera Electricista

En la ciudad de San Andrés, a los tres (03) días del mes de octubre de 2022 en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 008-ARC-CBNL04-2022 suscrito con la empresa CM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.146.512.-5, representada legalmente por Carlos Andrés Medina Gómez y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICION ANEXO TECNICO-ECONOMICO Y ADICION PRESUPUESTAL	07-03-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II	Suministro, transporte e instalación de bomba tipo lapicero Caudal 36m3/Hora, Altura de cabeza 42m salida en 3" para bombeo de agua salada en planta de Desalinización ARC San Andrés	$15.375.000,00
ADICION ANEXO TECNICO-ECONOMICO, PRORROGA Y ADICION PRESUPUESTAL	29-03-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II	Suministro e instalación de bujías absolutas de 20" 5 micras absolutas. Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	$ 3.604.496,50
ADICION ANEXO TECNICO, ECONOMICO Y ADICION PRESUPUESTAL	27-07-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II	Suministro transporte e instalación de software existente para panel HMI Rear panel, Harmony STU, Module, dark grey, width 118 mm, depth 40.1 mm HMIS5T correspondiente al sistema de desalinización BNL04. Incluye: Suministro de Panel HMI, inspección técnica de panel existente, programación de HMI + Modulo puesta en marcha con pruebas funcionales	$ 11.389.800,00
PRORROGA	20-09-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – LOTES I Y II	Prorroga al contrato hasta el 30 de Noviembre de 2022	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 91.152.820.01	COP		N/A	N/A	$ 91.152.820.01

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 96-44-101169688 DE FECHA 07-03-2022** **SEGUROS DEL ESTADO** **03-08-2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		04-02-2022	12/01/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		04-02-2022	12/09/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		04-02-2022	12/09/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		04-02-2022	12/09/2023
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$60.789.523.51	4622	11-03-2022	57008322	15-03-2022	$17.614.647,87	$60.789.523.51	19%
PARCIAL	2022	$76.158.523,51	6822	07-04-2022	92047922	11-04-2022	$19.753.225,59	$38.790.650,05	49.7%
PARCIAL	2022	$79.763.020,01	9422	11-05-2022	126974922	13-05-2022	$13.363.113,60	$29.032.032,95	63.54%
PARCIAL	2022	$79.763.020,01	12122	15-06-2022	167816622	15-06-2022	$3.604.496.50	$25.427.536,45	68%
PARCIAL	2022	$91.152.820.01	16522	06-07-2022	202857822	06-07-2022	$5.221.080.99	$31.596.255.46	65%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
A la fecha el contratista no presenta incumplimiento	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte,	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo

				contrario obviar)	No. valor y fecha)	Valor y fecha)			contrario obviar)
008-ARC-CBNL04-2022	2022	No. 3222 06-01-2022-	79.848.996.84	N/A	N/A	N/A	No. 2922 04-02-2022	$60.783.523.51	N/A
008-ARC-CBNL04-2022	2022	No. 3222 06-01-2022-	79.848.996.84	N/A	N/A	N/A	No. 2922 04-02-2022	$76.158.523,51	N/A
008-ARC-CBNL04-2022	2022	No. 3222 06-01-2022-	79.848.996.84	N/A	N/A	N/A	No. 2922 04-02-2022	$79.763.020,01	N/A
008-ARC-CBNL04-2022	2022	No. 3222 06-01-2022-	91.152.820.01	N/A	N/A	N/A	No. 2922 04-02-2022	91.152.820.01	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2022	SERVICIO – MANTENIMIENTO	$17.614.647,87	235 02-03-2022	$11.724.582,61	001 05-03-2022	$17.614.647,87	5002840570 05-03-2022	$17.614.647,87	PAGADO
				234 02-03-2022	$ 5.890.065,26					
2	2022	SERVICIO – MANTENIMIENTO	$19.753.225,59	243 01-04-2022	$ 4.378.225,59	002 03-04-2022	$19.753.225,59	5002848308 03-04-2022	$19.753.225,59	PAGADO
				244 01-04-2022	$15.375.000,00					
3	2022	SERVICIO – MANTENIMIENTO	$13.363.113,60	254 03-05-2022	$13.363.113,60	003-02-05-2022	$13.363.113,60	5002869622 02-05-2022	$13.363.113,60	PAGADO
4	2022	SERVICIO – MANTENIMIENTO	$3.604.496,5	267-31-05-2022	$3.604.496,50	004-01-06-2022	$3.604.496,50	5002890326-01-06-2022	$3.604.496,50	PAGADO
5	2022	SERVICIO – MANTENIMIENTO	$5.221.080.99	279 - 29-06-2022	$5.221.080.99	005-05-07-2022	$5.221.080.99	5002911766 01-07-2022	$5.221.080.99	PAGADO

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	Parcial	19%	$17.614.647,87
2	Parcial	49.7%	$19.753.225,59
3	Parcial	63.54%	$13.363.113,60
4	Parcial	68%	$3.604.496,5
5	Parcia	65%	$5.221.080.99

OBSERVACIONES:

Durante los días 10 y 11 de septiembre el contratista procede realizar las actividades contractuales pendientes las cuales corresponden al suministro, instalación y puesta en servicio de los equipos variador de velocidad y Display en la planta desalinizadora de la Base Naval ARC San Andrés. El día 11 de septiembre durante la configuración, programación y enlace de los equipos (variador –display) la planta desalinizadora se asegura por una posible sobre corriente y/o sobretensión dirigida al PLC (Controlador Lógico Programable) el cual tiene la función de controlar a través del display todos los equipos secundarios de la planta desalinizadora, lo anterior obedece a la ausencia de protecciones contra sobre corrientes y sobretensiones (DPS), dispositivos contemplados en el contrato 048-ARC-CBNL04-2022.

La salida de servicio del PLC (Controlador Lógico Programable) impide la continuación de las actividades de sincronización, programación y enlace de los equipos suministrados, por lo que se requiere realizar la intervención y ejecución del contrato 048-ARC-CBNL04-2022. El cual tiene como objeto "mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y/o electrónico de las plantas desalinizadoras del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

Es común que durante los mantenimientos preventivos y correctivos que se le realizan a la infraestructura y equipos, aparezcan actividades adicionales que no pudieron preverse y que deben ser corregidas de inmediato; ya que usualmente y en especial los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos, son dependientes el uno del otro y requieren de un correcto monitoreo y operación. La exposición a distintos fenómenos naturales y ambientes, así como a la salinidad del ambiente, disminuyen la vida útil de los equipos de manera acelerada; por lo que, con el fin de determinar novedades de manera más precisa, se requeriría del despiece de cada uno de los componentes de los equipos y el reemplazo de los mismos, pasado cierto tiempo sin contemplar especificaciones técnicas.

Para prevenir otro tipo de afectaciones y/o fallas en los equipos pertenecientes a la planta desalinizadora, se requiere de la ejecución previa e inmediata al sistema eléctrico, electrónico y demás componentes relacionados a este, estas actividades se encuentran contempladas a través del contrato 048-ARC-CBNL04-2022., con el fin de mitigar futuros riesgo proveniente a la ausencia de componentes en correcto estado de operación, reparaciones y/o mantenimientos correctivos requeridos

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

LOTE I

Pendiente culminación de actividades de mantenimiento tales como:

ACTIVIDAD	CANTIDADES
PLANTA DESALINIZADORA EGSAI - SKID DESALINIZADORA POR OSMOSIS INVERSA	
Suministro e instalación de visor de flujo de bomba de alta, consistente en desmonte, reemplazo de la existente puesta en prueba y funcionamiento de visor. Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1

A la fecha el lote I se encuentra en un 99% de ejecución de actividades.

LOTE II.

Estos equipos fueron entregados el 11 de septiembre a la sra TF Forero Juliana, Jefe del Departamento de Servicios Generales, pendiente la realización de los mantenimientos correctivos a los tableros para proceder a instalar.

ACTIVIDAD	CANTIDADES
PLANTA DESALINIZADORA EGSAI - SKID DESALINIZADORA POR OSMOSIS INVERSA	
Suministro e instalación de variador de velocidad ATV212-45KW-60HP-480V-3PH-CME-IP21A, de iguales caracteristicas al existente, consistente en desmonte de equipo existente, instalación de variador provisional, pruebas, puesta en marcha y funcionamiento del equipo provisional y nuevo VDV REF:ATV212HD45N4, configuración a sistema eléctrico y electrónico, arranque y seguimiento tras instalación del sistema, Incluye: cableado, acoples, conexiones eléctricas y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1
Suministro transporte e instalación de software existente para panel HMI Rear panel, Harmony STU, Module, dark grey, width 118 mm, depth 40.1 mm HMIS5T correspondiente al sistema de desalinización BNL04. Incluye: Suministro de Panel HMI, inspección técnica de panel existente, programación de HMI + Modulo puesta en marcha con pruebas funcionales.	1

A la fecha el lote II se encuentra en un 50% de ejecución de actividades.

11. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CM INGENIERIA Y CONSULTORIA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que cumple.

En tratandose de las obligaciones parafiscales, conforme evidencia el oficio expedido el 01 de septiembre 2022, suscrito por el señor Carlos Andrés Medina Gómez Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción y han dado cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



Figura 1, 2 y 3. Pruebas de variador nuevo.

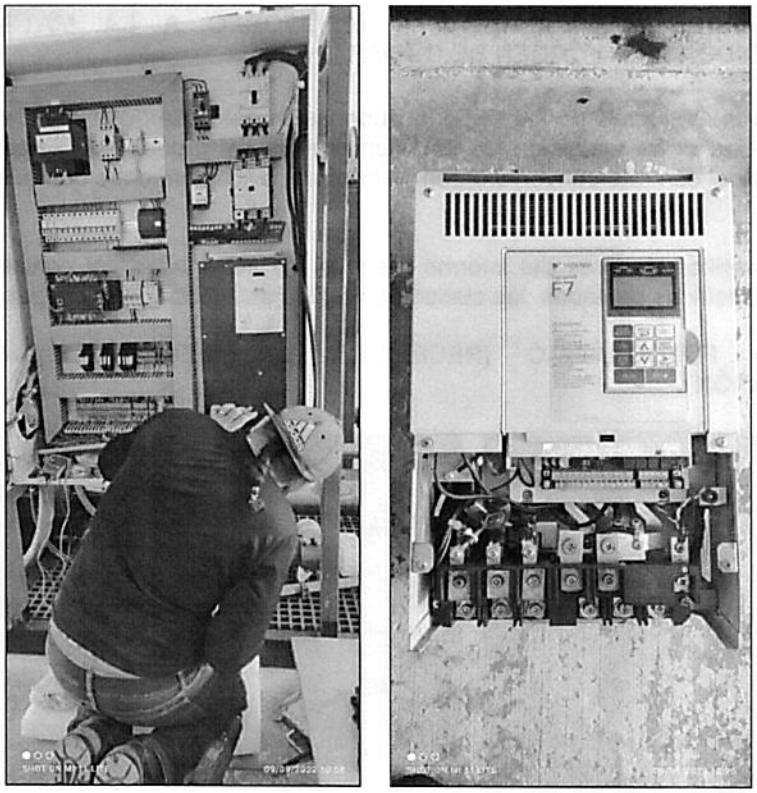


Figura 4 y 5 Desmonte de variador provisional.

Durante el presente mes no se ha recepcionado material, bienes o servicios.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Orden de Pago No. 57008322 de fecha 15-03-2022 por $17.614.647,87 (01) folios.
- Entrada al Almacén No.5002840570 de fecha 05-03-22 por $17.614.647,87 (01) folios.
- Oficio de fecha _____N/A_____, suscrito por _____N/A_____ (N/A) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

- Orden de Pago No. 92047922 de fecha 07-04-2022 por $19.753.225,58 (01) folios.
- Entrada al Almacén No.5002848308 de fecha 03-04-22 por $19.753.225,58 (01) folios.
- Oficio de fecha _____N/A_____, suscrito por _____N/A_____ (N/A) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

- Orden de Pago No. 126974922 de fecha 13-05-2022 por $13.363.113,60 (01) folios.
- Entrada al Almacén No.5002869622 de fecha 02-05-22 por $13.363.113,60 (01) folios.
- Oficio de fecha _____N/A_____, suscrito por _____N/A_____ (N/A) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)
-
- Orden de Pago No. 167816622 de fecha 15-06-2022 por $ 3.604.496,50 (01) folios.

- Entrada al Almacén No. 5002890326- de fecha 01-06-22 por $ 3.604.496,50 (01) folios.
- Oficio de fecha _____N/A_____, suscrito por _____N/A_____ (N/A) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

- Orden de Pago No. 202857822 de fecha 06-07-2022 por $ 5,221,080.99 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5002911766- de fecha 01-07-22 por $ 5,221,080.99 (01) folios.
- Oficio de fecha _____N/A_____, suscrito por _____N/A_____ (N/A) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (N/A)
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique). (N/A)
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 08-02-2022 Termino 30-11-2022.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 65%

Atentamente,

Firma
TK Pérez Castelblanco Daniela
C.C. 1010211303 de Bogotá
Base Naval ARC "San Andrés"
3213393440
daniela.perez@armada.mil.co
