CIVIDEPORTES®	**INFORME DE OBRA I Y FINAL**	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS


CONTRATO No. 410- 2022

INFORME ADECUACIÓN CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA

"ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021."

PERIODO EVALUADO:

01 JUNIO 2022 AL 30 DE AGOSTO 2022

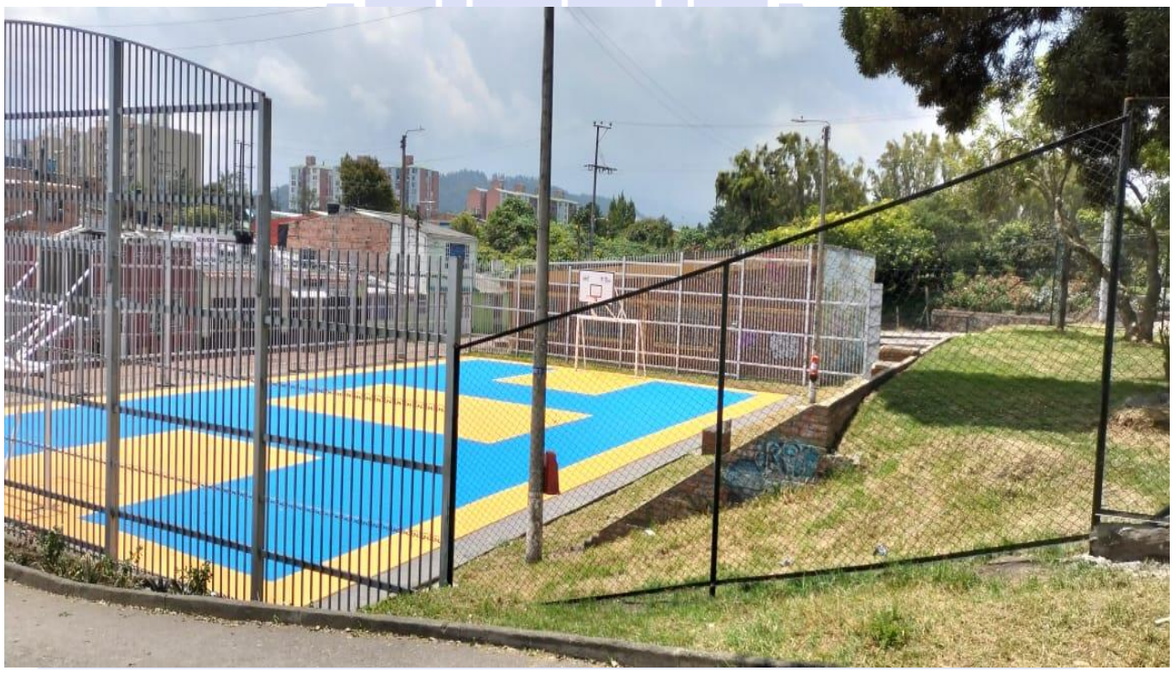

Fotografía 1. CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA

CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION.

2 RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Resumen ejecutivo del contrato de obra

3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Localización y ubicación

3.2 Características del Proyecto

4 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE OBRA Y CONTROL FINANCIERO

4.1 Resumen General de Avance de Obra control de Programación

5 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO.

5.1 Personal en la ejecución del Contrato de Obra

6. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

6.1 Actividades de Seguridad y salud en el trabajo Gestión de Calidad y SISO.

6.2 Atención Al Ciudadano

6.3 Accidentalidad laboral

6.4 Atención Al Ciudadano

6.5 Evidencias y Registro fotográfico:

6.6 Conclusión

7. CONDICIONES LEGALES

7.1 Pólizas del contrato de obra (relacionar sus fechas)

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. COPIA DE LA BITACORA DEL PERIODO.

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

1. INTRODUCCION

En el siguiente informe se presenta la información del proyecto "**ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021"**, y la ejecución del proyecto, adicionalmente se muestra la parte administrativa y económica del mismo.

Se ha encargado a la firma constructora CIVIDEPORTES S.A.S. Para La ejecución de la obra para la CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA, en EL Municipio de FACATATIVA Cundinamarca con los siguientes Ítems: 1) EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M, 2) RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE, 3) IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER, 4) PISO MODULAR SISTEMA SPORT, 5) MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL, 6) SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR, 7) CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") Y 8) CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA.

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

2. RESUMEN EJECUTIVO.

2. DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación 30/08/2022 **Período del informe: Desde** 1/06/2022 **hasta** 30/08/2022		
Nombre Director de Obra: ALVARO GABRIEL AREVALO **Nombre Residente de Obra:** OLIVERIO GOMEZ RIOS		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No. 410-2022	**Contratista: CIVIDEPORTES S.A.S**	
Entidad Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA **Objeto: "ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021"**		
Valor Inicial $ 243.571.457,00 **Adición: 000.00** **Valor Total: $ 243.571.457,00**	**Valor Ejecutado** **$ 243.571.457,00**	**Ejecución financiera (100%)**
Fecha de Iniciación 01/06/2022 **Plazo Inicial** 3 MESES **Fecha de Terminación** 01/09/2022		


CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
NUMERO	**ITEM**	**Actividades realizadas**	**% Ejecución**
1	**1**	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	**100%**
2	**2**	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	**100%**
3	**3**	IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER	**100%**
4	**4**	PISO MODULAR SISTEMA SPORT	**100%**
5	**5**	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	**100%**
6	**6**	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	**100%**
7	**NP1**	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	**100%**
8	**NP2**	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	**100%**

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACION Y UBICACIÓN: El proyecto de adecuación para la a cancha sintética está ubicado en el Municipio de Facatativá Cundinamarca, en el Barrio los PENSILVANIA.

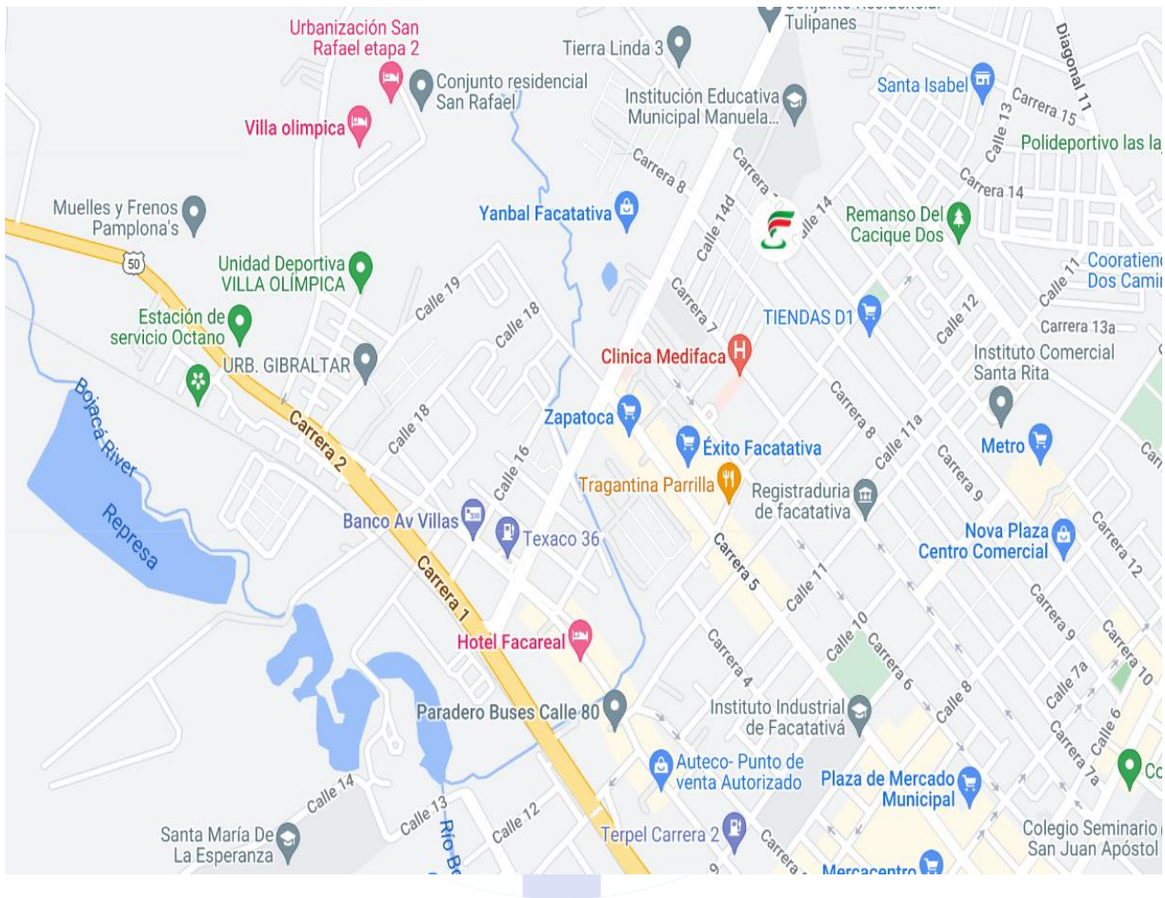

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

COORDENADAS CANCHA SINTETICA PENSILVANIA

N: 4.821714

O:-74.35684

3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

La Alcaldía Municipal de Factitiva invierte para la adecuación de un escenario deportivo para el disfrute de todos sus habitantes y deportistas, mediante una cancha sintética.

La cancha sintética tendrá una adecuación total de espacio debido al deterioro en el escenario (cancha), mediante la instalación de un Piso modular sistema sport para campos deportivos y un cerramiento en malla eslabonada c. 10 inc. ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2"), dados en concreto cada poste.

El escenario contaran con tecnologías innovadoras que aportan al cuidado del medio ambiente y el mejor desarrollo de actividades físicas para deportistas, en pro de competencias de alto rendimiento.

4. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE OBRA Y CONTROL FINANCIERO

4.1 RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Tenemos un avance programado 100% y el avance ejecutado es de 100%

5. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO.

5.1 Personal en la ejecución del Contrato de Obra

NOMBRES	No CC	CARGO
LUIS HERNANDO CHITIVA PARRA	80417382	SOLDADOR
ÁLDEMAR CORCHUELO HERNANDEZ	1073598161	AUX SOLDADURA
JHON MARIO RIOS OSORIO	80015788	OFICIAL DE OBRA
ESNEIDER MOTTA ORTIZ	1109416758	AYUDANTE DE OBRA
JOSE FRANCISCO GARAVITO CASTELLANOS	1002403967	AYUDANTE DE OBRA
HAIDER LEONARDO CASTAÑEDA FORERO	1192735141	AYUDANTE DE OBRA
CRHISTIAN CAMILO CETINA ARIAS	1051955232	AUX SOLDADOR
MARCO ANTONIO ROMERO MUÑOZ	12561543	AYUDANDE DE OBRA
JUAN SEGUNDO BRAVO JIMENEZ	12563498	AYUDANDE DE OBRA
MARLON CAMILO GOMEZ MARTINEZ	1000126656	AUX SOLDADOR
JOVANA FERNANDA LOPEZ GALLO	35529324	SISO

CIVIDEPORTES® CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

6. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

6.1 Actividades de Seguridad y salud en el trabajo Gestión de Calidad y SISO

- Se realizó entrega de Elementos de Protección Personal
- Se realizó entrega de carnet
- Se realizó pausas activas
- Se realizó seguimiento de orden y aseo en el sitio de trabajo
- Se realizó seguimiento al uso adecuado de EPP
- Se realizó charlas personalizadas en manejo adecuado de herramientas
- Se realizó delimitación de áreas con cinta de seguridad
- Se realizó encerramiento con poli sombra

6.2 Principales Logros

- ✓ Ejecución plan de capacitación en SST.

Civideportes cuenta con el plan de capacitación en SST para el cumplimiento misional de la entidad.

Durante la vigencia 2022, periodo junio - agosto de 2022, se realizaron una (1) charla personalizada acordes con el Sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, contando con la participación de los operarios de la Civideportes.

- ✓ Cumplimiento normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

Civideportes aplica en cada uno de sus procesos la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de garantizar bienestar y seguridad a sus trabajadores.

- ✓ Se Incentivó y creó conciencia en los trabajadores sobre la identificación y prevención de los riesgos a los que están expuestos en el desarrollo de sus labores.

Es importante que cada trabajador conozca a que riesgos está expuesto y la forma de prevenirlos, adquiriendo conciencia de autocuidado.


6.3. Accidentalidad laboral durante el periodo de ejecución 2022

TRABAJADOR	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	OBSERVACIONES
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NO SE PRESENTARON ACCIDENTES PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN**


6.4 Atención Al Ciudadano

Durante el periodo de ejecución, no se recepcionaron quejas los ciudadanos del barrio PENSILVANIA.


6.5 Evidencias y Registro fotográfico:

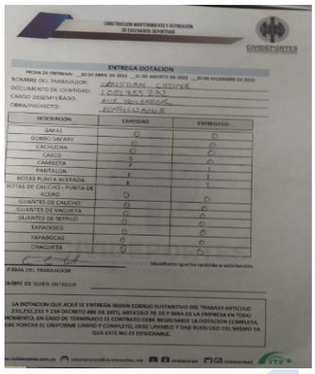

ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE CARNETS



PAUSAS ACTIVAS



ENTREGA DE EPP



ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO

	
ENCERRAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO	**DELIMITA CIÓN DE ÁREA DE TRABAJO**

6.6 Conclusión

Civideportes consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del desarrollo económico y social, ha determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el objeto de gestionar y controlar sus peligros, que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial y la legislación en seguridad y salud en el trabajo vigente.

De tal manera, la empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la salud de las personas. Con la implementación del Sistema de Gestión busca mejorar sus resultados económicos y alcanzar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar un alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, obtendrá factores que conduzcan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

7. CONDICIONES LEGALES

7.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA (RELACIONAR SUS FECHAS POLIZAS

NUMERO DE POLIZA	AMPAROS	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
37-44-101038870	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 24.357.145,70
37-44-101038870	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	19/07/2022	01/06/2022	01/10/2025	$ 12.178.572,85
37-44-101038870	ESTABIIDAD Y CALIDAD DE OBRA	19/07/2022	01/09/2022	01/09/2027	$ 48.714.291,40
37-44-101038870	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 48.714.291,40
37-40-101023026	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 200.000.000,00

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

- EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M Y RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE




- IMPRIMACION CON BASE RESURFACER








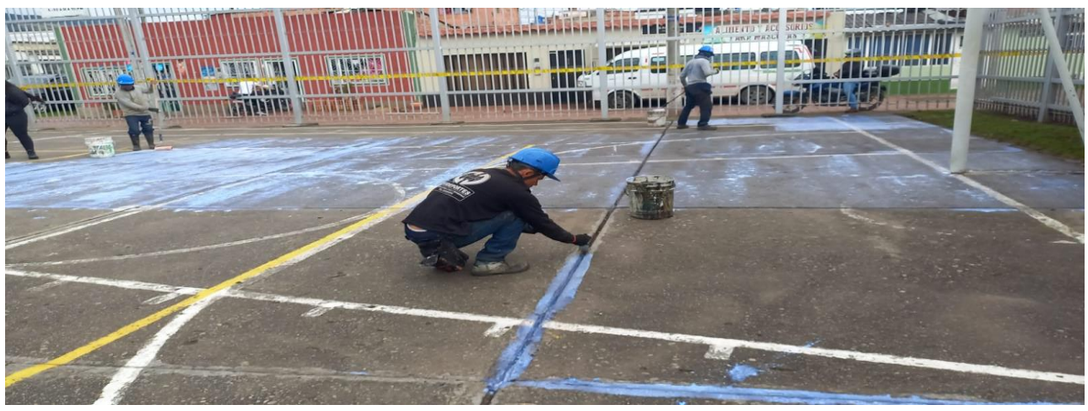




- PISO MODULAR SISTEMA SPORT

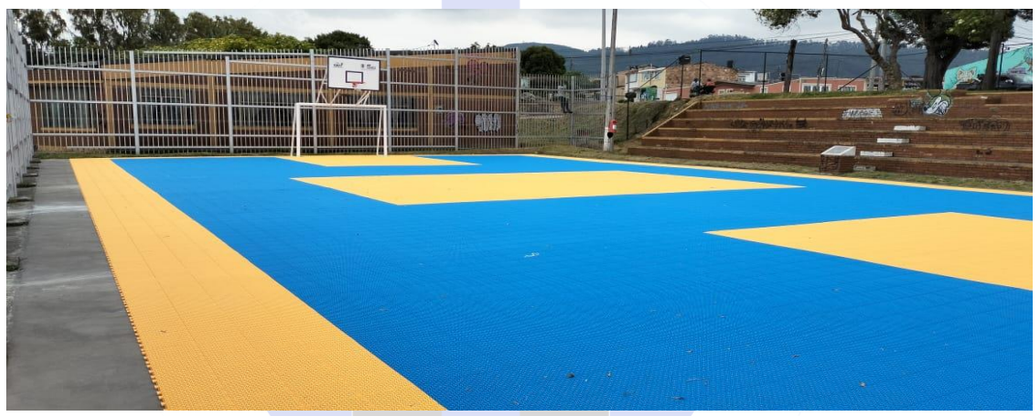



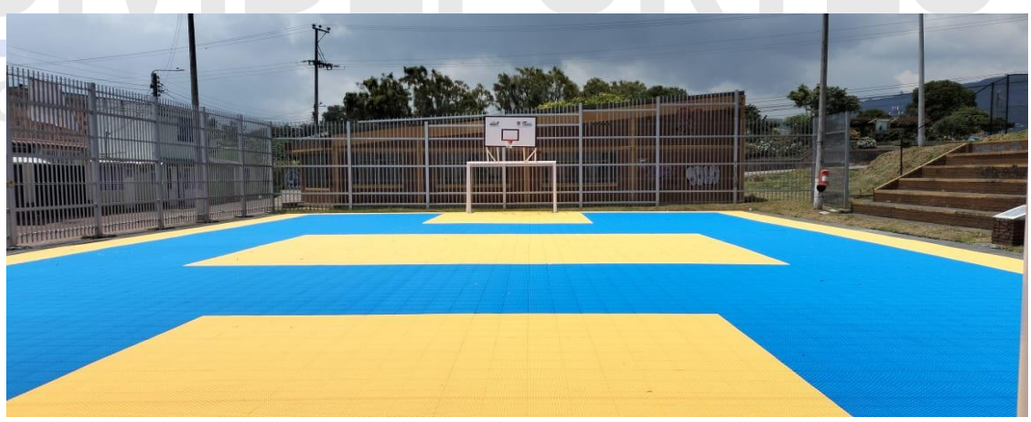

- MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL



- SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR





- CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")



CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS



- CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA



ESTE INFORME ES PRESENTADO POR:

DIRECTOR DE OBRA: ALVARO GABRIEL AREVALO

RESIDENTE DE OBRA: OLIVERIO GOMEZ RIOS

CIVIDEPORTES® CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS
