
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin
1		**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE**			**160 días**	**mar 10/05/22**	**vie 11/11/22**
2		**DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS**			**30 días**	**mar 10/05/2**	**lun 13/06/22**
3		Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GL	1	30 días	mar 10/05/22	lun 13/06/22
4		**EJECUCION DE OBRA**			**128 día**	**jue 16/06/22**	**vie 11/11/22**
5		**ITEMS CONTRACTUALES**			**128 día**	**jue 16/06/22**	**vie 11/11/22**
6		Localizacion y replanteo	M2	2231,18	80 días	jue 16/06/22	vie 16/09/22
7		Demolición de pavimento existente	M2	1719,68	80 días	sáb 25/06/22	lun 26/09/22
8		Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1048,3	80 días	mar 5/07/22	mié 5/10/22
9		Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	26,82	4 días	mié 3/08/22	sáb 6/08/22
10		Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	446,23	25 días	mié 12/10/22	mié 9/11/22
11		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8804,00	25 días	mié 12/10/2	mié 9/11/22
12		Corte de Pavimento	ML	1020,63	26 días	mié 12/10/2	jue 10/11/22
13		Sellado de Juntas	ML	1020,63	26 días	mié 12/10/2	jue 10/11/22
14		Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	946	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22
15		Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	420	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22
16		Retiro de Escombros	M3	1452,05	80 días	mar 5/07/22	mié 5/10/22
17		**ITEMS NO PREVISTOS**			**30 días**	**sáb 8/10/22**	**vie 11/11/22**
18		Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y distanciadores.	ML	526	25 días	mié 12/10/22	mié 9/11/22
19		Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	3	16 días	lun 17/10/22	jue 3/11/22
20		Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	152	20 días	sáb 8/10/22	lun 31/10/22
21		Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND.	131	20 días	sáb 8/10/22	lun 31/10/22
22		Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado 6"	ML	61	20 días	sáb 8/10/22	lun 31/10/22
23		Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado 6"	UND.	49	20 días	sáb 8/10/22	lun 31/10/22
24		Reparación de andenes en tableta de gres	M2	38	24 días	sáb 15/10/22	vie 11/11/22
25		Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	334,68	20 días	lun 10/10/22	mar 1/11/22
26		Instalacion de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	132,5	25 días	vie 14/10/22	vie 11/11/22
27		Demolición manual de sardinel existente	ML	362,58	10 días	sáb 8/10/22	mié 19/10/2
28		Base estabilizada con cemento al 6%	M3	310,78	20 días	mar 11/10/2	mié 2/11/22
29		Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2231,18	8 días	sáb 8/10/22	lun 17/10/22
30		excavacion manual	M3	137,47	20 días	sáb 8/10/22	lun 31/10/22
31		Conformacion de la subrasante	M2	2231,18	8 días	sáb 8/10/22	lun 17/10/22
32		Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	UND.	189	20 días	jue 13/10/22	vie 4/11/22
33		Fin de Obra			1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22
34		**ANEXOS**			**128 día**	**jue 16/06/22**	**vie 11/11/22**
35		COMPONENTE AMBIENTAL	GL	1	128 día	jue 16/06/22	vie 11/11/22
36		COMPONENTE SST	GL	1	128 día	jue 16/06/22	vie 11/11/22
37		COMPONENTE SIG	GL	1	128 día	jue 16/06/22	vie 11/11/22

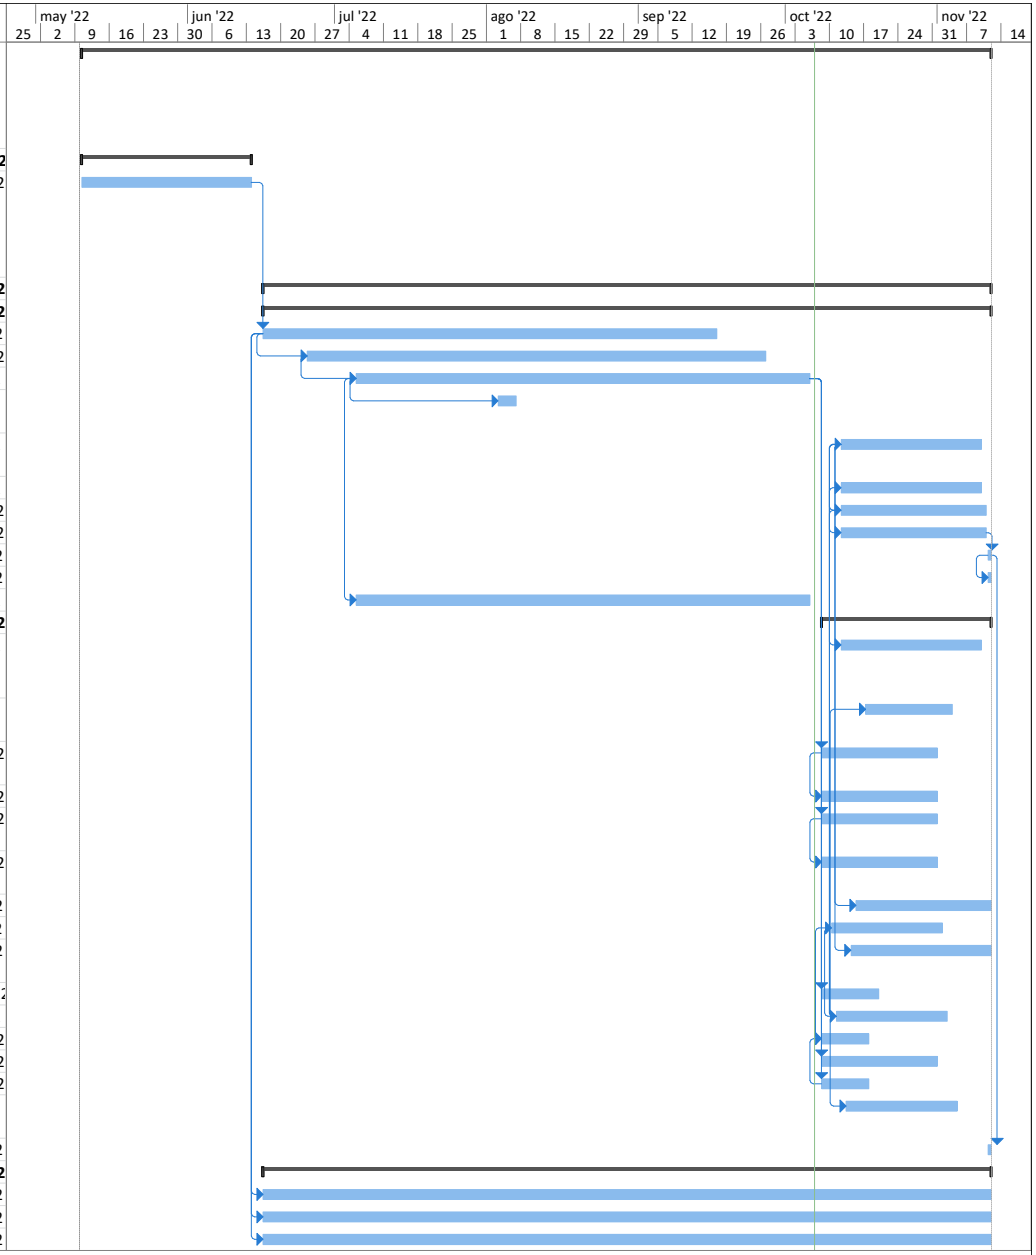

Proyecto: programacion ANDREA
Fecha: vie 7/10/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
R/L NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
INTERVENTORÍA

UT. MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HECTOR DAVID VILLABONA G.
Contratista de obra
