MUNICIPIO DE SIMITI

DISPAC S.A. E.S.P.

INFORME DE INVTERVENTORIA No 003

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-097-2022

PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



CONTRATISTA
CONSORCIO LINEA VERDE
NIT. 901.603.415-1

INTERVENTOR
HCR INGENIEROS SAS
NIT. 900.602.753-6

SIMITI – 2022

CONTENIDO

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
1.1. TIPO DE CONTRATO 6
1.2. CUADRO DE IDENTIFICACION Y RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
1.3. CUADRO DE IDENTIFICACION Y RESUMEN DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA 7
1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 8
1.6. FINANCIACIÓN 8
1.7. RELACION DE PERSONAL UTILIZADO 9
1.7.1. INTERVENTORIA HCR INGENIEROS 9
1.7.2. CONSORCIO LINEA VERDE 9
2. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION, POLIZAS 9
2.1. POLIZAS PRINCIPALES INTERVENTORIA 9
2.2. POLIZAS PRINCIPALES CONTRATISTA 10
3. DESARROLLO DEL CONTRATO 10
3.1. CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y CONTROL DE PAGOS INTERVENTORIA 10
3.2. CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y CONTROL DE PAGOS CONTRATISTA 11
3.3. RELACION DE ACTAS DE LA INTEVENTORIA 11
3.4. RELACION DE ACTAS DE OBRA 11
4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 11
4.1. SS INTERVENTORIA 11
4.2. SS CONTRATISTA 12
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.1. ACTIVIDADES TECNICAS 13
5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 26
5.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS 27
5.4. PRUEBAS Y ENSAYOS 27
5.5. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 27
5.6. DIFICULTADES PRESENTADAS 27
6. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 28
6.1. CURVA DE AVANCE DE OBRA 29
7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 31
8. REUNIONES DEL CONTRATISTA 31
8.1. COMITES DE OBRA 31
8.2. REUNION DE SEGUIMIENTO 31
8.3. VISITAS TECNICAS 31
8.4. SOCIALIZACION DEL PROYECTO 31
9. CRUCE DE CORRESPONDENCIA 31

9.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 31
9.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 32
10. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES. 34
10.1. CONCLUSIONES 34
10.2. RECOMENDACIONES 35

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 RESUMEN CONTRATO INTERVENTORÍA 6
Tabla 2 RESUMEN CONTRATO CONTRATISTA 7
Tabla 3 ALCANCE DEL PROYECTO 8
Tabla 4 ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO 8
Tabla 5 PERSONAL EN OBRA DE INTERVENTORÍA 9
Tabla 6 PERSONAL MÍNIMO EN OBRA DEL CONTRATISTA 9
Tabla 7 PÓLIZAS PRINCIPALES DE LA INTERVENTORÍA 10
Tabla 8 PÓLIZAS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA 10
Tabla 9 CUADRO BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DG-097-2022 11
Tabla 10 CUADRO BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DG-098-2022 11
Tabla 11 ACTAS DE LA INTERVENTORÍA DG-097-2022 11
Tabla 12 ACTAS DEL CONTRATISTA DG-098-2022 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 13 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA 12
Tabla 14 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 12
Tabla 15 INFORME DIARIO No 44 28
Tabla 16 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 32
Tabla 17 CORRESPONDENCIA ENVIADA 34

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 MUNICIPIO DE SIMITI 8
Ilustración 2 CURVA S DEL CONTRATO DG-097-2022 29
Ilustración 3 ESTADO DEL PROGRAMA DE OBRA 30

INTRODUCCIÓN

Este informe es una relación ejecutiva de las actividades constructivas realizadas por la empresa HCR INGENIEROS SAS en cumplimiento del Contrato SPAO-DG-038-2022, cuyo objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR CODIGO BPIN 20201301010463, EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 056 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021" en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2022

El objeto del presente informe de Interventoría es plasmar las actividades realizadas conjuntamente, con la empresa constructora de los procesos de socialización del proyecto y el de verificación y validación de las trecientas ochenta y cinco (385) viviendas a intervenir del municipio de SIMITI al igual que el avance de obra adelantado en el periodo del presente informe.

Durante el periodo referenciado, la Interventoría adelantó:

- El acompañamiento a las actividades de socialización trecientas ochenta y cinco (385) viviendas en las cuales se van a instalar los sistemas solares fotovoltaicos individuales.
- La verificación y validación de las especificaciones técnicas de acuerdo con los requerimientos técnicos precontractuales del proyecto, a los equipos y materiales a utilizar en el proyecto Considerando que la firma contratista, como empresa especializada disponen en bodega.
- Los procesos de seguimiento y supervisión se adelantan a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, legales, socio-ambientales, de aseguramiento de la calidad y seguridad industrial, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos , el pliego de condiciones y demás documentos que originaron la realización del contrato; para lo cual la empresa HCR Ingenieros SAS cuenta con el personal idóneo, equipos y herramientas y demás accesorios ofertados para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

Para la ejecución de los proyectos, el Municipio de Simití como ente ejecutor, adelantó:

El proceso de licitación pública para la ejecución de las obras, suscribiendo el contrato DG-098-2022, con la firma CONSORCIO LINEA VERDE con NIT. 901.603.415-1, quien tiene como representante legal a JOHANNY ESTELA CASTRO GONZALEZ.

El proceso de concurso de méritos para el adelanto de la interventoría, suscribiendo el contrato de interventoría DG-097-2022, con la firma HCR INGENIEROS SAS con Nit 900.602.753-6, quien tiene como representante legal a CARLOS AUGUSTO REYES MORALES.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. TIPO DE CONTRATO

El tipo de contrato es de interventoría al contrato DG-098-2022 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR CODIGO BPIN 20201301010463, EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 056 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021" transporte e instalacion de los materiales e insumos requeridos para cumplir con cada uno de las actividades acordadas contractualmente y las cuales se cancelaran por el sistema de cantidades unitarias ejecutadas.

1.2. CUADRO DE IDENTIFICACION Y RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	DG-097-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR CODIGO BPIN 20201301010463, EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 056 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROCESO DE SELECCIÓN:	SPAO-DG-038-2022
VALOR INICIAL:	$ 362.132.800,00
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	HCR INGENIEROS SAS Nit. 900.602.753-6
	Representante legal: CARLOS AUGUSTO REYES MORALES Cedula No 91.080.211Expedida en San Gil
SUPERVISOR:	ING LEONARDO LOPERA
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS	No 52-45-101006179 DE CUMPLIMIENTO
	No 52-40-101006559 DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NÚMERO Y FECHA DE RP - 2021	No 7000000052 Expedición 07/07/2022
OFICINA GESTORA:	DISPAC S.A. E.S.P.

Tabla 1 RESUMEN CONTRATO INTERVENTORÍA

A. MINUTA
B. RP
C. ACTA DE INICIO
D. ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS

1.3. CUADRO DE IDENTIFICACION Y RESUMEN DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA

CONTRATO No.:	DG-098-2022
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR CODIGO BPIN 20201301010463, EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 056 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROCESO DE SELECCIÓN:	SPO-DG-018-2022
VALOR INICIAL:	$ 6.835.158.706,00
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO LINEA VERDE NIT. 901.603.415-1
	Representante legal: JOHANNY ESTELA CASTRO GONZALEZ Cedula No 45.527.656 Expedida en Cartagena
INTERVENTOR	HCR INGENERIOS SAS Nit.900.602.753-6
	Representante legal: CARLOS AUGUSTO REYES MORALES Cedula No 91.080.211 Expedida en San Gil
SUPERVISOR:	LEONARDO LOPERA
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS	No 75-45-101048349 DE CUMPLIMIENTO
	No 75-40-101045340 DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NÚMERO Y FECHA DE RP - 2021	No 3222 Expedición 07/07/2022
OFICINA GESTORA:	DISPAC S.A. E.S.P.

Tabla 2 RESUMEN CONTRATO CONTRATISTA

E. MINUTA
F. RP
G. ACTA DE INICIO
H. ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS

1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se localiza dentro de las subzonas Directos Río Magdalena – Brazo Morales – Río Boque – NSS código 2320-01 y que estas áreas no cuentan con Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA formulado. Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional Del Sur De Bolívar también certificó que el área donde se encuentra localizado el proyecto no afecta Áreas protegidas o de Manejo Especial Regional – SINAP



Ilustración 1 MUNICIPIO DE SIMITI

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR TOTAL
1.1	Trámite completo por beneficiario aprobado	Und	385	$ 13.606.930,00
2.1	Instalar 2 paneles fotovoltaicos de 370W 24VDC	Und	385	$ 451.574.970,00
2.2	Instalar el banco de baterías (25.6 VDC, 120Ah, 3650 ciclos a DOD 90%)	Und	385	$ 1.579.119.850,00
2.3	Instalar el inversor con regulador incluido DC/AC 1KW 24VDC-120VAC - 50A MPPT	Und	385	$ 708.548.610,00
2.4	Instalar la estructura de soporte para paneles.	Und	385	$ 657.301.645,00
2.5	Instalar el gabinete para equipos y baterías	Und	385	$ 351.079.190,00
2.6	Instalar los cables, protecciones e interconexiones para regulador, batería, inversor y paneles	Und	385	$ 400.096.235,00
2.7	Instalar el sistema de puesta a tierra	Und	385	$ 211.570.975,00
3.1	Instalar acometida interna viviendas + sistema de medida y recaudo	Und	385	$ 721.167.755,00

Tabla 3 ALCANCE DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO	**$ 5.094.066.159,00**
ADMINISTRACION, UTILIDAD E IMPREVISTOS	$ 1.715.622.217,00
CERTIFICACIÓN RETIE	**$ 25.470.330,00**
COSTO OBRA CIVIL	**$ 6.835.158.706,00**

Tabla 4 ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO

1.6. FINANCIACIÓN

La financiación del proyecto es por el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y REGALIDAS DEL MUNICIPIO DE SIMITI

1.7. RELACION DE PERSONAL UTILIZADO

1.7.1. INTERVENTORIA HCR INGENIEROS

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HERNAN REYES PAREDES	1	24316533
PROFESIONAL HSEQ	GUILLERMO DIAZ ORTIZ	1	24316533
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA LILIANA CARMARGO DIAZ	1	24318436
RESIDENTE DE OBRA	PEDRO JAVIER OJEDA CAICEDO	1	24316533
AUXILIAR DE INGENIERA	LAURA ROCIO ARDILA AMAYA	1	24319504

Tabla 5 PERSONAL EN OBRA DE INTERVENTORÍA

1.7.2. CONSORCIO LINEA VERDE

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ	1	9439690611
RESIDENTE DE OBRA	YAMIT JOSE SANTIZ PALENCIA	1	61268666
SUPERVISOR DE TERRENO	ROBET ALBERTO LEAL ARZUZA	1	9439690611
COORDINADOR HSEQ	JAIRO DANIEL MEJIA MENDOZA	1	9439690611
PROFESIONAL SOCIAL	LEYDI VIVIANA GOMEZ PARAMO	1	9439690611
INGENIERA AMBIENTAL	KEIRY LAURA MOVILLA SALAZAR	1	9439690611
INGENIERO CIVIL	MIGUEL ADOLFO DE LA PEÑAN TRIANA	1	9439690611
APOYO A REPLAMTEO	ROGER JOSE PLAZA MEZA	1	9439690611
APOYO A REPLAMTEO	JOSE DOMINGO BANDANA BANDANA	1	9439690611

Tabla 6 PERSONAL MÍNIMO EN OBRA DEL CONTRATISTA

2. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION, POLIZAS

2.1. POLIZAS PRINCIPALES INTERVENTORIA

En el siguiente cuadro se relaciona las garantías exigidas contractualmente según la cláusula I con los amparos de acuerdo con lo estipulado por la minuta contractual

			VIGENCIA

No DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
52-45-101006179	CUMPLIMIENTO	$ 72.426.560,00	5/07/2022	5/05/2024
52-45-101006179	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 91.293.983,00	5/07/2022	5/09/2023
52-45-101006179	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 36.213.280,00	5/07/2022	5/05/2026
52-45-101006179	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 36.213.280,00	5/07/2022	5/08/2023
52-40-101006559	RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	$ 200.000.000,00	5/07/2022	5/05/2025

Tabla 7 PÓLIZAS PRINCIPALES DE LA INTERVENTORÍA

Pólizas aprobadas por supervisor del contrato Leonardo Lopera

2.2. POLIZAS PRINCIPALES CONTRATISTA

No DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
75-45-101048349	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$1.723.149.253,61	01/07/2022	01/05/2024
75-45-101048349	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.367.031.741,20	01/07/2022	01/01/2024
75-45-101048349	PRESTACIONES SOCIALES	$683.515.870,60	01/07/2022	01/01/2026
75-45-101048349	CALIDAD DEL SERVICIO	$683.515.870,60	01/07/2022	01/01/2026
75-45-101048349	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$1.367.031.741,20	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
75-45-101048349	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.367.031.741,20	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
75-40-101045340	RESPONSABILIDAD CIVIL	$500.000.000,00	01/07/2022	01/01/2025

Tabla 8 PÓLIZAS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA

Pólizas aprobadas por la interventoría HCR INGENIEROS SAS

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y CONTROL DE PAGOS INTERVENTORIA

CUADRO DE DESARROLLO Y CONTROL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-097-2022

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR
Valor inicial del contrato de obra	18/07/2021	$362.132.800,00	
Valor Pendiente por ejecutar			$362.132.800,00
Sumas iguales		**$362.132.800,00**	**$362.132.800,00**

Tabla 9 CUADRO BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DG-097-2022

3.2. CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y CONTROL DE PAGOS CONTRATISTA

CUADRO DE DESARROLLO Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA DG-098-2022			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR**	**VALOR**
Valor inicial del contrato de obra	18/07/2021	$6.835.158.706,00	
Valor Pendiente por ejecutar			$6.835.158.706,00
Sumas iguales		**$6.835.158.706,00**	**$6.835.158.706,00**

Tabla 10 CUADRO BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DG-098-2022

3.3. RELACION DE ACTAS

ACTA	FECHA	OBSERVACION
Acta de comité de seguimiento	08/09/2022	
Acta de comité de seguimiento	14/09/2022	
Acta de comité de seguimiento	22/09/2022	6929992

Tabla 11 ACTAS DE COMITÉ

I. ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.1. SS INTERVENTORIA

APORTE	DETALLES	ACUMULADO		
SALUD	PERIODO DE COTIZACION			2022-09
	FECHA DE PAGO	2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15
	No DE PLANILLA	24316533	24318436	24319504
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$1.061.100	90.000	54.000
	VALOR COTIZADO	$1.061.100	90.000	54.000
	EPS	NUEVA EPS – SALUD TOTAL – SALUDCOOP – SALUD MIA EPS – SANITAS – EPS SURA – ADRES		
PENSION	PERIODO DE COTIZACION			2022-08
	FECHA DE PAGO	2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15
	No DE PLANILLA	24316533	24318436	24319504
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$3.723.200	360.000	216.000
	VALOR COTIZADO	$3.723.200	360.000	216.000
	FP	PORVENIR – COLFONDOS – PROTECCION- SKANDIA - COLPENSIONES		
	PERIODO DE COTIZACION			2022-09

APORTE	DETALLES	ACUMULADO		
RIESGOS LABORALES	FECHA DE PAGO	2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15
	No DE PLANILLA	24316533	24318436	24319504
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$1.846.300	156.600	94.000
	VALOR COTIZADO	$1.846.300	156.600	94.000
	ARL			SURA
PARAFISCALES	SENA			
	I.C.B. F			
	CAJA DE COMPENSACION -CAJASAN			CAJASAN

Tabla 12 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

J PLANILLAS DE SS INTERVENTORÍA

4.2. SS CONTRATISTA

APORTE	DETALLES	ACUMULADO	
SALUD	PERIODO DE COTIZACION		2022-10
	FECHA DE PAGO	2022/09/27	02/09/2022
	No DE PLANILLA	9439690611	61268666
	INGRESO BASE DE COTIZACION	360.000	58.000
	VALOR COTIZADO	360.000	58.000
	EPS		Mutual ser – SURA – Nueva EPS – Saludtotal – Sanitas EPS
PENSION	PERIODO DE COTIZACION		2022-09
	FECHA DE PAGO	2022/09/27	02/09/2022
	No DE PLANILLA	9439690611	61268666
	INGRESO BASE DE COTIZACION	1.440.000	232.000
	VALOR COTIZADO	1.440.000	232.000
	FP		Colfondos – Colpensiones – pensiones de Antioquia – porvenir – protección
RIESGOS LABORALES	PERIODO DE COTIZACION		2022-10
	FECHA DE PAGO	2022/09/27	02/09/2022
	No DE PLANILLA	9439690611	61268666
	INGRESO BASE DE COTIZACION	626.400	7.600
	VALOR COTIZADO	626.400	7.600
	ARL	SURA	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA		Exonerado
	I.C.B. F		Exonerado
	CAJA DE COMPENSACION -CAJASAN		Comfenalco Cartagena

Tabla 13 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

K PLANILLAS DE SS CONTRATISTA

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1. ACTIVIDADES TECNICAS

En el periodo del presente informe se continuó ejecutando el ítem de replanteo, este ítem es el que nos va a dar la pauta pata verificar que los 385 beneficiarios de la instalacion del sistema fotovoltaico seleccionados por DISPAC en el contrato primigenio cumplan con las directrices dadas por el ente contratante (1.Ser una vivienda habitada. 2. No estar en una zona de interconexión. 3. No estar en zona de alto riesgo o en zona de parques nacionales), de no cumplirse las directrices mencionadas el usuario perdería el beneficio.
Asi mismo verificar los posibles nuevos beneficiarios del proyecto que cumplan con lo estipulado por el ente contratante

- **SEPTIEMBRE 01**

Se realizo el replanteo en las veredas Tamocondo Bajo y Diego López del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 6 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
366	TAMOCONDO BAJO	3.985.632	HECTOR RIVERA SANABRIA	CUMPLE	
367	TAMOCONDO BAJO	5.603.084	JAIRO SALAZAR PEREZ	CUMPLE	
368	TAMOCONDO BAJO	7.977.062	PEDRO ANAYA GARCIA	CUMPLE	
369	TAMOCONDO BAJO	91.107.783	MIGUEL SANABRIA ALVAREZ	CUMPLE	
370	TAMOCONDO BAJO	1.050.919.050	JOSELIN RIVERA SABABRIA	CUMPLE	
93	DIEGO LOPEZ	45.620.213	MARIA DE LA CRUZ LOZANO DE LEON	CUMPLE	VENDIO EL PREDIO A LA SEÑORA SOL MARIA SANCHEZ MUÑOZ

- **SEPTIEMBRE 02**

Se realizo el replanteo en la vereda La Cascada Alegre del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 8 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
188	LA CASCADA	3.949.233	ANTONIO MARIA CABARCAS SERPA	CUMPLE	
189	LA CASCADA	3.984.305	GERARDO MORERA GUZMAN	CUMPLE	

190	LA CASCADA	3.985.413	LUIS FERNANDO NAVARRO RODELO	CUMPLE	
192	LA CASCADA	8.829.466	LUIS ANGEL MORALES ARANGO	CUMPLE PARCIALMENTE	EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A CONSTRUIR LA VIVIENDA PARA 30 SEPTIEMBRE DEBIDO A UN INCENDIO EN LA VIVIENDA
193	LA CASCADA	12.459.314	GABRIEL JAIME GOMEZ	CUMPLE	
194	LA CASCADA	13.567.293	WILIAN ARANGO ARIZA	CUMPLE	
195	LA CASCADA	18.928.868	JOSE DEL CARMEN URQUIJO CORONEL	CUMPLE	EL BENEFICIARIO SOLITA LA INSTALACION DEL SERVICIO EN OTRO PREDIO DEBIDO A LA FALTA DE AGUA SE VISITA EL SEGUNDO PREDIO EL CUAL CUMPLE CON LOS PARAMETROS DEL DISPAC
197	LA CASCADA	1.096.201.047	JOSE DUBAN PEREZ ARANGO	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 03**

Se realizo el replanteo en la vereda Hondilla Baja del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 4 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
--	HONDILLA BAJA	12.578.663	SABAS MANUEL PEÑA CAÑIZARES	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	HONDILLA BAJA	1.002.276.648	YADIRA PEÑA LLORENTE	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	HONDILLA BAJA	730.022.875	ARIEL DE LA ROSA CARDENAS	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	HONDILLA BAJA	7.224.640	ORLANDO CASTAÑEDA	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 05**

Se realizo el replanteo en las veredas La Cascada, Monterrey, Tigui Bajo y Los Kawi del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 6 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
191	LA CASCADA	5.842.423	JESUS ANTONIO CASTRO LANCHEROS	CUMPLE	
196	LA CASCADA	91.352.441	REINEL PARDO SALAZAR	CUMPLE	
248	MONTERREY	8.829.013	EUCLIDES ACEVEDO ESCOBAR	NO CUMPLE	PREDIO NO HABITADO
373	TIGUI BAJO	98.484.485	EUSEBIO ANTONIO USME JIMENES	CUMPLE	
--	LA CASCADA	16.111.097	RODRIGO PADILLA BOHORQUEZ	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	LOS KAWI	23.148.435	AIDA ESTHER PEREZ LEON	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 06**

Se realizo el replanteo en las veredas Diego López y Tigui Bajo del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 13 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
91	DIEGO LOPEZ	25.126.447	MARIA MARGOTH GONZALEZ MARTINEZ	CUMPLE	
92	DIEGO LOPEZ	43.474.197	NORALBA GUZMAN USME	CUMPLE	
94	DIEGO LOPEZ	1.095.908.663	HELDER OSWALDO GUZMAN USME	CUMPLE	
374	TIGUI BAJO	91.324.428	DAIMAR PADILLA MEJIA	CUMPLE	
375	TIGUI BAJO	27.966.451	EFIGENIA DIAZ ARIZA	CUMPLE	
376	TIGUI BAJO	91.275.206	ARNHOOLKG ARNULFO GELVEZ DÍAZ	CUMPLE	
377	TIGUI BAJO	3.985.475	JOSE GREGORIO MANCIPE ARANGO	CUMPLE	
378	TIGUI BAJO	23.151.014	SORAIDA LONDOÑÓ	CUMPLE	
379	TIGUI BAJO	10.178.468	JOSE RAMIREZ	CUMPLE	
380	TIGUI BAJO	91.513.346	FAVER JARAMILLO	CUMPLE	

382	TIGUI BAJO	7.977.141	JORGE GILDARDO GONZALES GARCIA	CUMPLE	EL BENEFICIARIO LE VENDIO EL PREDIO A LA SEÑORA ROSALBA CIRO
383	TIGUI BAJO	23.151.673	CARMEN EMILIA CIRO MARTINES	CUMPLE	
385	TIGUI BAJO	16.113.411	OMAR PADILLA PEÑUELA	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 07**

Se realizo el replanteo en las veredas Cargadero y Juncal del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 7 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
62	CARGADERO	3.984.423	ALVARO PINTO VELANDIA	CUMPLE	
63	CARGADERO	3.985.214	GERARDO PINTO VELANDIA	CUMPLE	
181	JUNCAL	3.981.496	ALVARO RUIZ PINTO	CUMPLE	
182	JUNCAL	3.983.501	JOSE DE LOS SANTOS SURMAY GUALDRON	CUMPLE	
183	JUNCAL	3.983.623	HECTOR ESPARZA JAIMES	CUMPLE	
184	JUNCAL	3.984.806	LUIS EMILIO ESPARZA JAIMEZ	CUMPLE	
186	JUNCAL	45.621.215	MARTA AZUCENA REY REY	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 08**

Se realizo el replanteo en las veredas Campo Alegre y Inanea Alta del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 7 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
50	CAMPO ALEGRE	6.806.903	JORGE GRAJALES LLANEZ	CUMPLE	
54	CAMPO ALEGRE	2.763.666	CARLOS JULIO PAYARES	CUMPLE	
56	CAMPO ALEGRE	1.756.125	RITO A GALAN CAÑIZARES	CUMPLE	
60	CAMPO ALEGRE	73.022.035	JIME PINO CAICEDO	CUMPLE	

176	INANEA ALTA	5.714.770	VIRGILIO DAZA CAICEDO	CUMPLE	
177	INANEA ALTA	45.622.315	CLARA ISABEL RUIZ CUBIDES	CUMPLE	
178	INANEA ALTA	60.087.735	PABLO ANTONIO CORTES BALERO	CUMPLE PARCIALMENTE	

- **SEPTIEMBRE 09**

Se realizo el replanteo en las veredas Quebrahona y Rio Inanea del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 2 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
298	QUEBRAHONA	23.151.318	ESPERANZA SANABRIA ALVAREZ	CUMPLE	
304	RIO INANEA	19.674.519	LUIS ANTONIO PEREZ MALDONADO	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 11**

Se realizo el replanteo en la vereda Pallares del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 2 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
--	PALLARES	1.098.820	CAROLINA PALLARES SARMIENTO	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 12**

Se realizo el replanteo en las veredas Babilonia, Jordán y Santa Inés del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 22 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
7	BABILONIA	3.985.295	JUAN GOMEZ CORSO	CUMPLE	
8	BABILONIA	7.922.020	JOSE LEONARDO GARCIA HOLGUIN	CUMPLE	
179	JORDAN	1.080.394	PEDRON ENRIQUE PINZON BELTRAN	CUMPLE	
180	JORDAN	7.922.185	JAIME ALVARO VACCA FRANCO	CUMPLE	

339	SANTA INES	7.925.913	HERNAN DARIO BOHORQUES ESPITIA	CUMPLE	
342	SANTA INES	11.052.425	JAVIER DOMINGO GUERRERO FERNANDEZ	CUMPLE	
343	SANTA INES	12.457.867	PLINIO TARAZONA HERNANDEZ	NO CUMPLE	PREDIO ABANDONADO NO HABITADO
344	SANTA INES	19.875.057	PEDRO GOMEZ CORZO	CUMPLE	
345	SANTA INES	23.148.699	MARLENY BOHORQUEZ SANDOVAL	CUMPLE	
346	SANTA INES	23.156.750	MARIA TRANSITO GUEVARA DE OJEDA	CUMPLE	
347	SANTA INES	30.883.037	CARIDAD SANDOVAL ROJAS	CUMPLE	
348	SANTA INES	45.621.014	DIOSELINA HERRERA ALARCON	CUMPLE	
349	SANTA INES	45.622.084	FLOR ESTHER TORRES FIGUEROA	CUMPLE	
350	SANTA INES	77.179.948	ALIRIO QUIROGA SANDOVAL	CUMPLE	
351	SANTA INES	88.282.500	DANIEL AREVALO TELLEZ	CUMPLE	
--	SANTA INES	3.985.291	JHON CARLOS TORRES FIGUEROA	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 13**

Se realizo el replanteo en las veredas Centro Poblado, Cerro Azul, Hondilla, La Cabaña, San Emilio y Santa Inés del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 19 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
81	Centro Poblado	18.923.493	JOSE EUSEBIO LAITON DONOSO	CUMPLE	
82	Centro Poblado	23.629.345	BLANCA LILIA BUITRAGO NOVOA	CUMPLE	
85	Centro Poblado	45.775.287	MIRIAM GARCIA DAZA	CUMPLE	
86	Centro Poblado	1.019.067.523	NORBEI ALEANDRO ROJAS BUITRAGO	CUMPLE	
88	CERRO AZUL	73.022.359	MANUEL PEÑA LLORENTE	CUMPLE	

89	CERRO AZUL	73.022.367	JOSE MERCEDES ROA PINZON	CUMPLE	
90	CERRO AZUL	1.049.018.561	YIN YORLAY ROJAS GUTIERREZ	CUMPLE	
142	HONDILLA	4.132.824	YONY JAIRO VERGARA ROJAS	CUMPLE	
187	LA CABAÑA	4.131.823	RAFAELINO ROJAS GORDILLO	CUMPLE	
319	SAN EMILIO	3.985.360	FABIO HAIMAN CUCUNUBA VACA	CUMPLE	
322	SAN EMILIO	23.147.178	HERMINDA VACA De CUCUNUBA	NO CUMPLE	
325	SAN EMILIO	1.049.019.723	ELIO EDWIN URIBE GAMEZ	CUMPLE	
326	SAN EMILIO	1.050.922.500	JENNIFER ARRIETA MONDRAGON	CUMPLE	
336	SANTA INES	4.055.133	HECTOR MANUEL LEON AGUILAR	CUMPLE	
337	SANTA INES	4.055.546	GUSTAVO EMIRO VELASQUEZ SIERRA	CUMPLE	
338	SANTA INES	7.924.822	LEONARDO BOHORQUES ESPITIA	CUMPLE	
340	SANTA INES	7.926.256	JOSE ALBEIRO PARADA TORO	CUMPLE	
341	SANTA INES	9.620.114	EDGAR ESTEBAN ROJAS ROJAS	CUMPLE	
--	SANTA INES	1.049.024.713	WILLIAN ALEXANDER PABON OSORIO	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 14**

Se realizo el replanteo en las veredas Centro Poblado, Nueva Esperanza y San Emilio del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 6 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
77	Centro Poblado	4.147.705	CARLOS ARTURO ROA GAMBA	CUMPLE	ADECUO EL PREDIO PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO
78	Centro Poblado	7.334.237	DESIDERIO MARTINEZ FRANCO	CUMPLE	
80	Centro Poblado	17.303.426	OTONIEL ROJAS GORDILLO	CUMPLE	

84	Centro Poblado	44.153.992	VILMA EUGENIA VEGA CERVANTES	CUMPLE	ADECUO EL PREDIO PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO
279	NUEVA ESPERANZA	45.775.260	MARTHA YANETH BOHORQUES ROA	CUMPLE	PREDIO PERTENECE A LA VEREDA CERRO AZUL
320	SAN EMILIO	4.047.211	JAIRO AGUSTIN VALLEJO CALDERON	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 15**

Se realizo el replanteo en las veredas Centro Poblado, Nueva Esperanza y San Emilio del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 13 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
79	Centro Poblado	7.926.425	ARNULFO HERNANDEZ HERNANDEZ	CUMPLE	PREDIO PERTENECE A LA VEREDA NUEVO HORIZONTE
280	NUEVO HORIZONTE	7.923.621	JOSE MIGUEL MORA DAZA	CUMPLE	
282	NUEVO HORIZONTE	7.924.463	JORGE ALONSO VARGAS MENDEZ	CUMPLE	
283	NUEVO HORIZONTE	7.924.553	JOSE LIDER HERNANDEZ HERNANDEZ	CUMPLE	
284	NUEVO HORIZONTE	7.925.668	PEDRO NEL HERNANDEZ HERNANDEZ	CUMPLE	
285	NUEVO HORIZONTE	12.710.523	ALFONSO RAFAEL MOLINA	CUMPLE	
286	NUEVO HORIZONTE	23.148.097	TERESITA DE JESUS CARTAGENA GUARIN	CUMPLE	
287	NUEVO HORIZONTE	49.553.574	TERESA DE JESUS AGUDELO HENAO	CUMPLE	
288	NUEVO HORIZONTE	52.167.414	MARIA EUGENIA RAMIREZ SICUA	CUMPLE	
289	NUEVO HORIZONTE	73.020.596	CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ	CUMPLE	
290	NUEVO HORIZONTE	73.021.585	JOSE ALONSO RUIZ	CUMPLE	
291	NUEVO HORIZONTE	73.022.493	ALFONSO MOLINA FLOREZ	CUMPLE	

292	NUEVO HORIZONTE	1.002.386.956	LUIS FERNANDO HERNANDEZ PEÑA	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 16**

Se realizo el replanteo en las veredas Babilonia, Nuevo Horizonte y San Isidro del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 6 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
9	BABILONIA	7.924.162	ALIRIO MENDOZA SOLER	CUMPLE	
281	NUEVO HORIZONTE	7.923.827	VICTOR MANUEL PULIDO GONZALES	CUMPLE	
293	NUEVO HORIZONTE	1.050.924.376	DIEGO HERNANDO GARCIA CARTAGENA	CUMPLE	EL BENEFICIARIO VENDIO EL PREDIO AL SEÑOR RENE BARRERA LINARES
327	SAN ISIDRO	19.875.042	PABLO ENRIQUE ESPITIA SANABRIA	CUMPLE	PREDIO PERTENECE A LA VEREDA CENTRO POBLADO

- **SEPTIEMBRE 17**

Se realizo el replanteo en la vereda San Emilio del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 4 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
321	SAN EMILIO	7.923.408	JOSE DE LA CRUZ CACERES	CUMPLE	
323	SAN EMILIO	73.022.398	WILFREDO BARRERA LINARES	CUMPLE	EL BENEFICIARIO VENDIO EL PREDIO A LA SEÑORA ELBA LUZ QUINTERO NAVARRO
324	SAN EMILIO	91.532.283	ARBEY BARRERO VERGARA	CUMPLE	
--	SAN EMILIO	63.552.627	RUTH MARICELA VERGARA DAZA	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 20**

Se realizo el replanteo en las veredas Animas Altas, Boque Bajo, El Piñal, Las Trampas, Popal, Sinaí y Tigui Bajo del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 10 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
4	ANIMAS ALTAS	7.922.450	LUIS MIGUEL RAMIREZ URREGO	CUMPLE	
45	BOQUE BAJO	3.982.849	LEVIS ENRIQUE LOPEZ GUZMAN	CUMPLE	
46	BOQUE BAJO	7.982.162	CARLOS RAUL LOPEZ GUZMAN	CUMPLE	
47	BOQUE BAJO	23.148.168	MYRIAM ROSA LOPEZ GUZMAN	CUMPLE	
97	EL PIÑAL	3.985.020	JAIRO HERRERA VERGARA	CUMPLE	SE REALIZO SEGUNDA VISITA
231	LAS TRAMPAS	23.151.408	YINETH GALVIZ GUEVARA	CUMPLE	SE REALIZO SEGUNDA VISITA
294	PIÑAL	1.065.892.267	JHINETH CARDENA MESTRA	NO CUMPLE	SE REALIZO SEGUNDA VISITA RENUNCIA AL SERVICIO
297	POPAL	32.005.790	RUBYS MARIA CHOPERANA MONTES	CUMPLE	POR MOTIVO DE SEGURIDAD LA BENEFICIARIA SE TRANSLADO A OTRO PREDIO DONDE RECIDE
364	SINAI	1.050.918.803	MARIA I ANAYA PADILLA	NO CUMPLE	PREDIO ABANDONADO NO HABITADO
381	TIGUI BAJO	1.104.124.323	FERNANDO ANTONIO GARCIA HERRERA	CUMPLE	
--	SINAI	7.982.181	TIMOTEO MESTRA PADILLA	POSIBLE NUEVO USUARIO	

- **SEPTIEMBRE 21**

Se realizo el replanteo en las veredas Garzal, Nueva Esperanza, San Luis y Las Trampas del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 6 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION

139	GARZAL	1.050.918.243	JORGE LUIS ROMERO VERGARA	CUMPLE	POR MOTIVO DE SEGURIDAD EL BENEFICIARIO SE TRANSLADO A OTRO PREDIO DONDE RECIDE
278	NUEVA ESPERANZA	3.984.140	JOSE MANUEL MENCO ARANGO	CUMPLE	PREDIO PERTENECE A LA VEREDA GARZAL
232	LAS TRAMPAS	1.050.923.056	YEISON ENRRIQUE RINCON BLANCO	NO CUMPLE	NO HAY VIVIENDA EN LUGAR DE COORDENADAS
332	SAN LUIS	7.982.092	EVER ENRRIQUE ROMERO AGUA	CUMPLE	
334	SAN LUIS	9.692.729	LUIS EDUARDO MORALES BALDOVINO	NO CUMPLE	NO HAY VIVIENDA EN LUGAR DE COORDENADAS
335	SAN LUIS	3.985.081	ALEXANDER RIVERA GELVEZ	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 23**

Se realizo el replanteo en las veredas Rio Amarillo Alto y Tigui Alto del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 7 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
299	RIO AMARILLO ALTO	3.984.004	WILSON WILLIAM SALINAS CHIVATA	CUMPLE	
300	RIO AMARILLO BAJO	7.923.525	JOSE DARIO SIABATO	CUMPLE	
301	RIO AMARILLO BAJO	7.925.967	ELIOVAR DE JESUS HERRERA PATIÑO	CUMPLE	
302	RIO AMARILLO BAJO	18.928.519	WILIAN MONTENEGRO SANCHEZ	CUMPLE	
303	RIO AMARILLO BAJO	45.621.643	ALEGRIA RAMIREZ	CUMPLE	LA BENEFICIARIA FALLECIO EL SERVICIO PASA AL SEÑOR JOHN WILSON RAMIREZ
371	TIGUI ALTO	5.444.430	LUIS BOANERGE CUELLAR AREVALO	CUMPLE	
372	TIGUI ALTO	5.528.707	CARLOS MORENO JEREZ	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 26**

Se realizo el replanteo en la vereda Carolina del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 7 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
64	CAROLINA	5.721.894	JESUS MONCADA JAIMES	CUMPLE	
65	CAROLINA	5.725.787	JORGE ANTONIO ARIAS CIFUENTES	CUMPLE	
68	CAROLINA	13.921.112	NEPOMUCENO LEON	CUMPLE	
69	CAROLINA	18.858.381	JADER SEGUNDO CHAVEZ RIVERA	CUMPLE	
71	CAROLINA	32.008.327	MARISELA ISABEL ACOSTA RUIZ	CUMPLE	
72	CAROLINA	42.206.120	JULIA RUIZ De ACOSTA	CUMPLE	
73	CAROLINA	91.494.198	JUAN CARLOS JAIMES BAUTISTA	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 27**

Se realizo el replanteo en las veredas Carolina y La Maya del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 5 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
66	CAROLINA	7.922.263	LUIS ANGEL MOSQUERA BARRERA	CUMPLE	
74	CAROLINA	1.005.679.877	LUIS EDUARDO ARRIETA MEDINA	NO CUMPLE	PREDIO NO HABITADO EL BENEFICIARIO FALLECIO
75	CAROLINA	1.098.626.830	CESAR ALFREDO MONCADA BAUTISTA	CUMPLE	
70	CAROLINA	23.151.926	FANNY JAIMES BAUTISTA	CUMPLE	
206	LA MAYA	7.922.033	JOSE SALVADOR TORRES PARRA	NO CUMPLE	PREDIO NO HABITADO EL BENEFICIARIO FALLECIO

- **SEPTIEMBRE 28**

Se realizo el replanteo en las veredas Mira Flores y San Blas del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 4 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
245	MIRA FLORES	5.687.384	LUIS EDUARDO FORERO SERRANO	CUMPLE	
246	MIRA FLORES	12.588.459	JULIO CESAR ESCORCIA RAMOS	CUMPLE	
247	MIRA FLORES	63.531.889	YAMILET VERA JAIMEZ	CUMPLE	
318	SAN BLAS	91.492.886	JOSE ANTONIO ALFONSO AGUILAR	CUMPLE	

- **SEPTIEMBRE 29**

Se realizo el replanteo en las veredas Muriba, Maya, Diego López y San Luis del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 4 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
250	MURIBA	3.985.575	JHON DANILO MATEUS	CUMPLE	
253	MURIBA	7.922.277	PEDRO JOSE VALDERRAMA	CUMPLE	
275	MURIBA	1.192.916.414	CARLOS ALBERTO HOYOS ZULETA	CUMPLE	
276	MURIBA	10.077.890.694	ANA MONICA SIFUENTE	NO CUMPLE	PREDIO NO HABITADO HACE TRES MESES

- **SEPTIEMBRE 30**

Se realizo el replanteo en la vereda Muriba del municipio de Simití, verificando el cumplimiento de las directrices dadas por DISPAC, producto de las 4 visitas realizadas se obtuvo lo siguiente:

NUMERO DE USUARIO	VEREDA	CEDULA DE CIUDADANIA	BENEFICIARIO	CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES	OBSERVACION
--	MURIBA	8.828.917	JOHN JAIRO PEREZ LEON	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	MAYA	13.571.161	WILLIAN BOTELLO GLAVEZ	POSIBLE NUEVO USUARIO	
--	DIEGO LOPEZ	3.984.414	EDILBERTO ENRIQUE ESTRADA	POSIBLE NUEVO USUARIO	

--	SAN LUIS	2.763.930	FRANCISCO MANUEL MEZA APARICIO	POSIBLE NUEVO USUARIO	

Teniendo en cuenta lo anterior y a los recorridos realizados durante el periodo del presente informe podemos concluir que se han visitado 442 usuarios de los cuales 352 cumplen las directrices dadas por DISPAC, 28 cumplen parcialmente y adquirieron el compromiso de subsanar la observación realizada para poder acceder al beneficio y 33 no cumplen por lo cual no se les instalara el sistema fotovoltaico asi mismo se presentan 29 usuarios nuevos que posiblemente podrán acceder al beneficio mencionado

L. BITACORA DE OBRA
M. REGISTRO FOTOGRAFICO

5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Se suscribieron las Actas de Inicio de los Contratos DG-098-2022 y DG-097-2022.
- Se solicitó al contratista CONSORCIO LINEA VERDE la documentación del personal mínimo
- Trámite de aprobación de la póliza ante la Administración Municipal.
- Se reviso la documentación precontractual y contractual de las 385 viviendas a intervenir con el fin de verificar en campo el estado de estas.
- Se solicitó al contratista CONSORCIO LINEA VERDE la documentación requerida para el trámite de desembolso del anticipo.
- Se le solicito al contratista CONSORCIO LINEA VERDE los diseños estructurales de los cambios solicitados en la reunión del 14 de septiembre del 2022
- Se le solicito al contratista de obra las fichas técnicas de los materiales a utilizar
- Se lleva control de la correspondencia enviada y recibida que hace relación a este contrato.
- Se organizó en AZ'S la documentación que se ha generado durante este periodo que hace relación al contrato del contratista de obra e interventoría.
- La interventoría realizó el informe técnico y HSEQ y contable No 3.
- El interventor sirvió de enlace y medio de comunicación entre los interesados del proyecto, utilizando, el canal de comunicación entre la secretaría de infraestructura con los diferentes operadores de redes del sector, informando a los mismos el alcance del proyecto, con el objetivo de que éstos tomen las actuaciones requeridas según el avance de obra proyectado, sin afectar la continuidad del servicio a la comunidad del sector.

5.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A la fecha de emisión de este informe, el contratista no ha presentado el flujo de inversión que garanticen los materiales de la obra

5.4. PRUEBAS Y ENSAYOS

NA

5.5. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

En el periodo del siguiente informe no se han presentado cambios técnicos y/o modificaciones,

5.6. DIFICULTADES PRESENTADAS

NA

6. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

INDICADORES DE AVANCE DEL CONTRATO

Cap.	Descripción	Valor Inicial	% Inicial	Valor Real	% Real	% Prog.	% Ejecutado	% Atraso
1	Trámite completo por beneficiario aprobado	13.606.930,00	0,27%	13.606.930,00	0,267%	0,2671%	0,2630%	0,0042%
2	Instalar 2 paneles fotovoltaicos de 370W 24VDC	451.574.970,00	8,86%	451.574.970,00	8,865%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3	Instalar el banco de baterias (25.6 VDC, 120Ah, 3650 ciclos a DOD 90%)	1.579.119.850,00	31,00%	1.579.119.850,00	30,999%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4	Instalar el inversor con regulador incluido DC/AC 1KW 24VDC-120VAC - 50A MPPT	708.548.610,00	13,91%	708.548.610,00	13,909%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5	Instalar la estructura de soporte para paneles.	657.301.645,00	12,90%	657.301.645,00	12,903%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6	Instalar el gabinete para equipos y baterías	351.079.190,00	6,89%	351.079.190,00	6,892%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7	Instalar los cables, protecciones e interconexiones para regulador, batería, inversor y paneles	400.096.235,00	7,85%	400.096.235,00	7,854%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8	Instalar el sistema de puesta a tierra	211.570.975,00	4,15%	211.570.975,00	4,153%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	Instalar acometida interna viviendas + sistema de medida y recaudo	721.167.755,00	14,16%	721.167.755,00	14,157%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
COSTOS	TOTALES	$ 5.094.066.159,00	100%	$ 5.094.066.159,00	100%	0,2671%	0,2630%	0,0042%
	AUI	$ 1.715.622.217,00		$ 1.715.622.217,00				
	CERTIFICACION RETIE	$ 25.470.330,00	Diferencia	$ 25.470.330,00	VALORES	PROG.	EJEC.	DIFERENCIA
	TOTALES	$ 6.835.158.706,00	0	$ 6.835.158.706,00		18.257.620,37	17.973.086,02	284.534,34

Tabla 14 INFORME DIARIO No 74

Al cierre del periodo, el porcentaje programado es de 0,2671% y se ejecutó el 0,2630% de las condiciones actualizadas teniendo un adelanto del **0,0042%.** La ejecución de los ítems se encuentra detalladamente en las conclusiones.

6.1. CURVA DE AVANCE DE OBRA

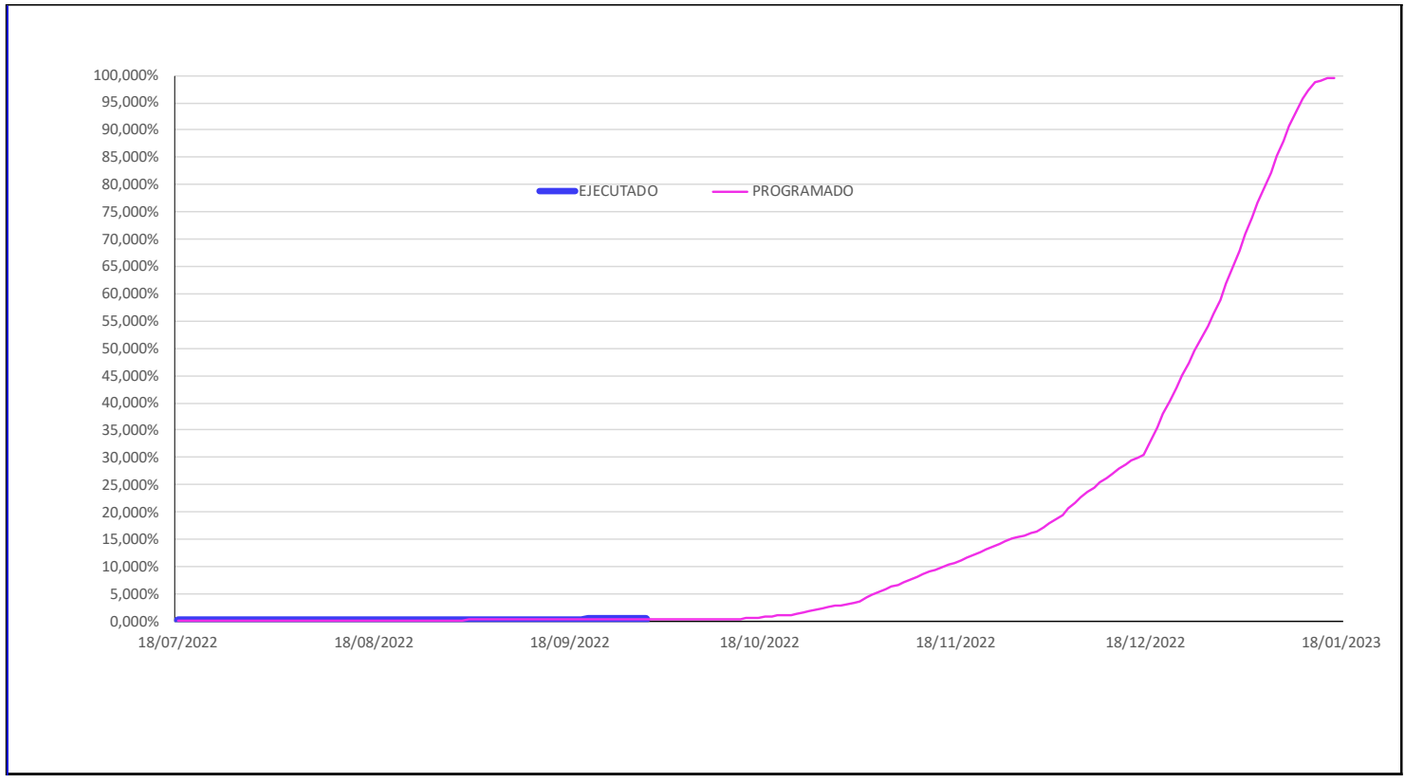


Ilustración 2 CURVA S DEL CONTRATO DG-097-2022

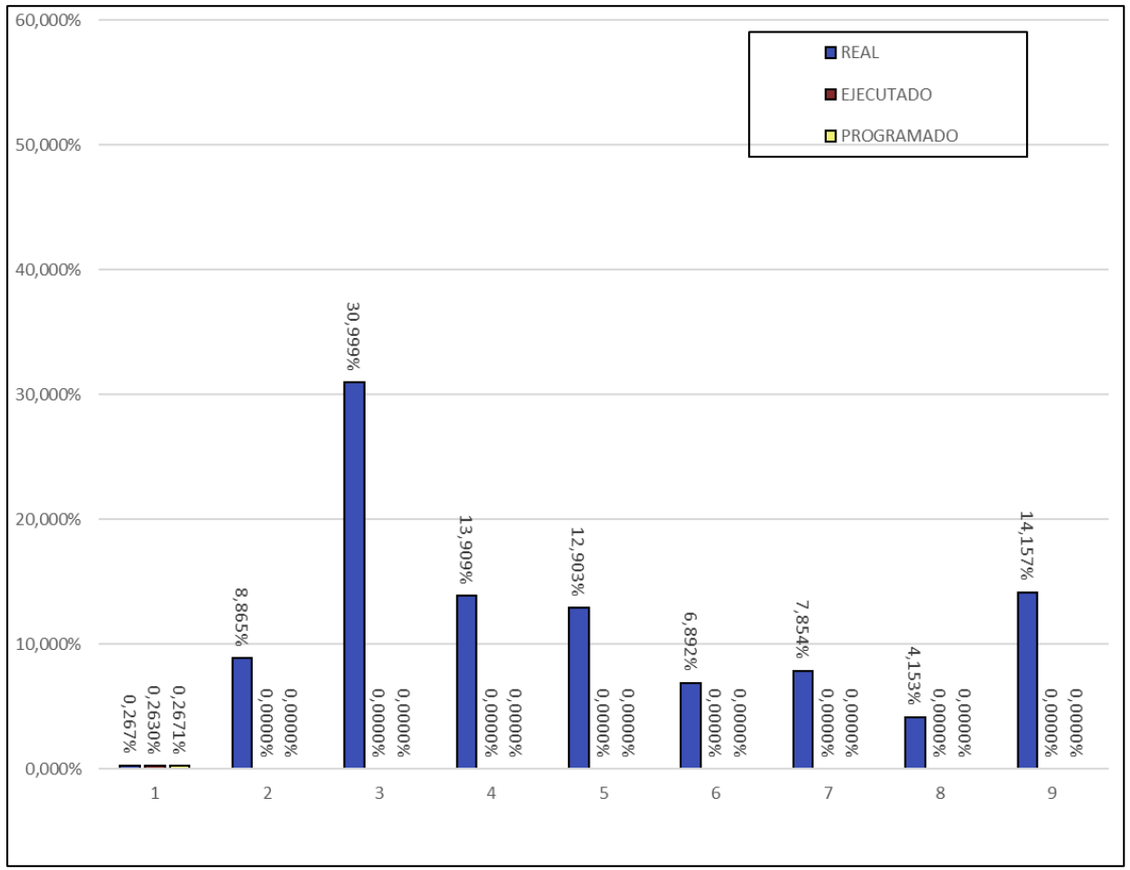


Ilustración 3 ESTADO DEL PROGRAMA DE OBRA

7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo en el periodo del informe No 3 en general fue soleado

8. REUNIONES DEL CONTRATISTA

8.1. COMITES DE OBRA

- Se realizó comité de seguimiento el día 08 de septiembre del 2022 a través de video llamada con la aplicación Meet Google
- Se realizó comité de seguimiento el día 14 de agosto del 2022 en las instalaciones de HCR INGENIEROS SAS entre contratista e interventoría
- Se realizó comité de seguimiento el día 22 de septiembre del 2022 a través de video llamada con la aplicación Meet Google

8.2. REUNION DE SEGUIMIENTO

NA

8.3. VISITAS TECNICAS

NA

8.4. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

NA

9. CRUCE DE CORRESPONDENCIA

9.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RECIBIDA		
FECHA	**ASUNTO**	**REMITENTE /DESTINATARIO**
05/09/2022	SOLICITUD DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
05/09/2022	CUADRILLA ADICIONAL REPLANTEO	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
06/09/2022	INFORME DE OBRA No 2 AGOSTO	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
06/09/2022	SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE COMITE DE SEGUIMIENTO	Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
07/09/2022	DOCUMENTACIÓN EQUIPO MÍNIMO	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
08/09/2022	PRODUCTOS	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
08/09/2022	PRODUCTOS 2	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales

09/09/2022	PRODUCTOS 3 MAS INTEGRACION	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
09/09/2022	PRODUCTOS 2 INTEGRACIÓN CERTIFICADO	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
12/09/2022	CERTIFICADOS DE AFILIACION - TRABAJADOR SOCIAL	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
12/09/2022	CERTIFICADO OCUPACIONAL	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
13/09/2022	CERTIFICADO DE BATERIAS	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
13/09/2022	BREAKERS	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
13/09/2022	DATOS AUXILIAR INTERVENTORIA	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
15/09/2022	CONECTORES MC4 DOBLE	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
15/09/2022	REVISIÓN Y APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO	Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
15/09/2022	ACTAS DE COMITÉS QUINCENALES	Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
16/09/2022	OBSERVACIÓN VALLA DE INFORMACIÓN	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
19/09/2022	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
20/09/2022	SOLICITUD DE APLAZAMIENTO COMITE DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera Ing. Carlos Augusto Reyes Morales
22/09/2022	FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS	CONSORCIO LINEA VERDE Ing. Carlos Augusto Reyes Morales

Tabla 15 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

9.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

ENVIADA		
FECHA	**ASUNTO**	**REMITENTE /DESTINATARIO**
31/08/2022	SOLICITUD DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
01/09/2022	INCUMPLIMIENTO AL COMPROMISO REALIZADO EN EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
01/09/2022	SOLICITUD DE PLAN DE COMPRA DE MATERIALES O INSUMOS NACIONALES	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera

01/09/2022	DOCUMENTOS REQUERIDOS TRAMITE DE ANTICIPO	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
03/09/2022	INFORME PERIODO DE AGOSTO DE 2022	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
05/09/2022	INFORME DE INTERVENTORIA No 2	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
08/09/2022	DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES TÉCNICAS	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
12/09/2022	RESPUESTA A SU CORREO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUYO ASUNTO ES “PRODUCTOS (1)”	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
12/09/2022	RESPUESTA A SU CORREO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUYO ASUNTO ES “PRODUCTOS 2”	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
12/09/2022	RESPUESTA A SU CORREO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUYO ASUNTO ES “PRODUCTOS 3 MAS INTEGRACION”	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
12/09/2022	RESPUESTA A SU CORREO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUYO ASUNTO ES “PRODUCTOS 2 INTEGRACIÓN CERTIFICADO”	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
13/09/2022	CERTIFICADO DE BATERIAS	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
14/09/2022	ACTA DE REUNIÓN	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
15/09/2022	REVISIÓN Y APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
15/09/2022	OBSERVACIÓN VALLA DE INFORMACIÓN	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
19/09/2022	REVISIÓN Y APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
19/09/2022	ACTAS DE COMITÉS QUINCENALES	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
19/09/2022	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN DE EQUIPOS	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
20/09/2022	SOLICITUD DE APLAZAMIENTO COMITE DE SEGUIMIENTO	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera

21/09/2022	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
23/09/2022	ACTAS DE COMITÉS QUINCENALES	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
26/09/2022	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN DE EQUIPOS	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera
26/09/2022	FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS	Ing. Carlos Augusto Reyes Morales CONSORCIO LINEA VERDE Supervisor de Apoyo: Leonardo Lopera

Tabla 16 CORRESPONDENCIA ENVIADA

N. CORRESPONDENCIA

10. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.

10.1. CONCLUSIONES

- Se realizaron observaciones en reuniones, visitas y comunicaciones escritas en las cuales se solicitaban documentos pendientes, reuniones y mejoras en los aspectos técnicos en obra por parte de la interventoría al contratista de obra, cumpliendo así con los requisitos establecidos por el contratante para la ejecución de la obra

- A la fecha el contratista presenta un atraso de 0,0042% de acuerdo con el PDT presentado por el contratista, este atraso se ve reflejado en el capítulo 1 Trámite completo por beneficiario aprobado respecto al PDT entregado por el CONSORCIO LINEA VERDE.

- Se han visitado 442 usuarios de los cuales 352 cumplen las directrices dadas por DISPAC, 28 cumplen parcialmente y adquirieron el compromiso de subsanar la observación realizada para poder acceder al beneficio y 33 no cumplen por lo cual no se les instalara el sistema fotovoltaico asi mismo se presentan 29 usuarios nuevos que posiblemente podrán acceder al beneficio mencionado.

- Se solicitó al contratista CONSORCIO LINEA VERDE la documentación requerida para el trámite de desembolso del anticipo.

- Se le solicito al contratista de obra las fichas técnicas de los materiales a utilizar

- En reiteradas ocasiones se le solicitó al contratista CONSORCIO LINEA VERDE, la documentación requerida para la de subsanación de los documentos de carácter administrativo, de seguridad y salud en el trabajo, requeridos en diferentes oportunidades por la interventoría en cumplimiento de nuestras funciones.

- Se verifica el cumplimiento en los aportes y pagos de seguridad social de acuerdo con el riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores

- Se valida la información remitida por parte del contratista para el ingreso de personal nuevo, así como de nueva maquinaria necesaria durante el proceso constructivo



- Se solicito a la parte social dela empresa DISPAC revisar lo referente a los planes de trabajo con niños y madres cabeza de hogar; en el primer caso las viviendas queda muy lejanas una de otra y se generaría un foco riesgo el tener que trasladar a los niños de una vereda a otra, por este motivo se solicitó en comité de obra a la empresa Dispac que este plan se desarrolle solo en una vereda y que sea en una escuela para minimizar el riesgo de hacerse responsables de la integridad de los niños, el segundo punto las personas que ocupan los predios beneficiados no son madres cabeza de hogar por este motivo se solicita se revise este plan y se generen las directrices correspondientes.

- Se solicito al contratista una reunión virtual para tomar los casos de bodega, cargue y descargue del material e insumos a usar en las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos.

10.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la CONSORCIO LINEA VERDE tomar las actuaciones administrativas y decisiones de ingeniería que procuren un avance ágil, eficiente y seguro de la obra.

Informe elaborado y revisado por:

Proyectó: Ing. Pedro Ojeda Residente de Interventoría	**Firmas:** 
Revisó: Ing. Hernán Reyes Paredes Director de Interventoría	
Aprobó: Ing. Carlos A. Reyes Morales. Representante Legal Interventoría	
