ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-022-3289	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.723751,-72.928503	**Dirección**	CAlle 19 crr 17			**Barrio**	Benjamin Herrera
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	4710

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

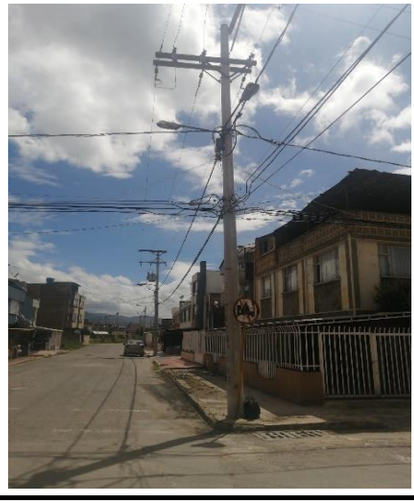
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-022-3442	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.723751,-72.928503	**Dirección**	CAlle 19 crr 17			**Barrio**	Benjamin Herrera
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-1050	**Nodo:**	4710

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3432	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.694210,-72.955593	**Dirección**	Clle 17sur entre crr 17 y 18			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4637

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3433	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.694064,-72.955268	**Dirección**	Clle17 sur entre crr 17 y 18			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4637

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3434	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.693919,-72.955022	**Dirección**	Clle17 sur entre crr 17 y 18			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4637

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3435	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.692039,-72.951414	**Dirección**	Clle17 sur entre crr14 y 15			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4637

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

igs ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3436	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.691930,-72.951213	**Dirección**	Clle17 sur entre crr 14 y 15			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4637

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3437	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.689890,-72.947275	**Dirección**	Clle17 sur n 11-56			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4607B

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-035-3438	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.689879,-72.947155	**Dirección**	Clle17 sur n 11-38			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-1050	**Nodo:**	4607B

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

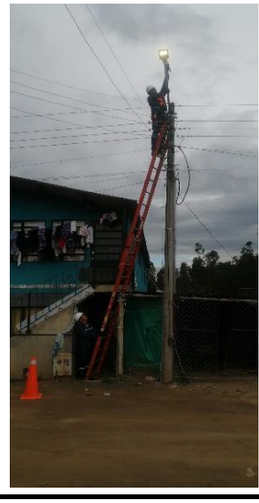
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-095-3439	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.684977,-72.954852	**Dirección**	Cll25 sur N 12 - 54			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:**	4614

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	13/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

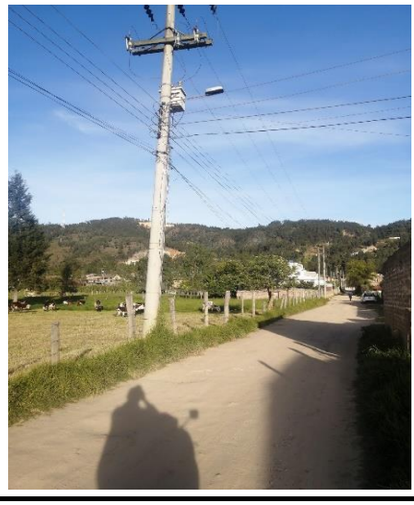
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-095-3440	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.684319,-72.954089	**Dirección**	Cll25 sur 12 - 45			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-1050	**Nodo:**	4614

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	13/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-095-3441	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.683737,-72.953345	**Dirección**	Cll25 sur N 11-88			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:**	4614

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	13/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3443	**Número de luminaria Anterior**	69			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757602,-72.907024	**Dirección**	Cll57 N 12a - 23			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

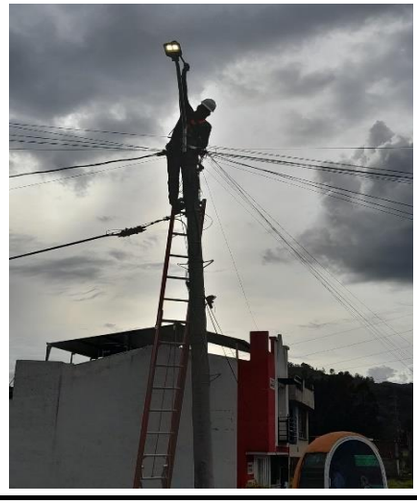
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3444	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757486,-72.906906	**Dirección**	Cll57 con 12 a			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	38	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

igs ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

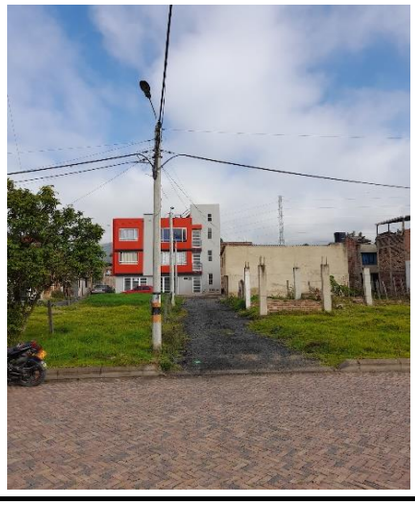
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3445	**Número de luminaria Anterior**	65			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757249,-72.907146	**Dirección**	Carrera 12A#56D-05			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	30	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3446	**Número de luminaria Anterior**	64			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757111,-72.907300	**Dirección**	Cra 12bis#56C-13			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	30	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

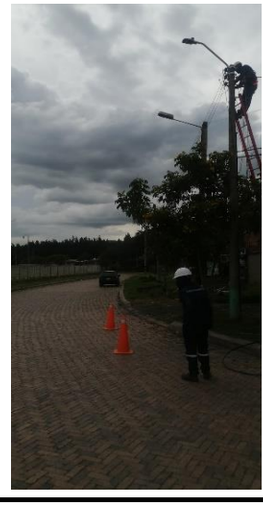
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3447	**Número de luminaria Anterior**	63			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757060,-72.907449	**Dirección**	Cll56 con Crr12 bis			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	30	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3448	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.757394,-72.908057	**Dirección**	Cra12D-56B#14			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5691

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

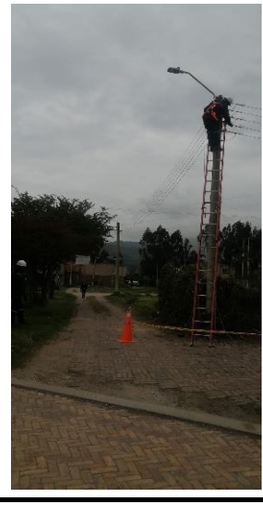
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3449	**Número de luminaria Anterior**	50			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757392,-72.908299	**Dirección**	Crr12 d con 56			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

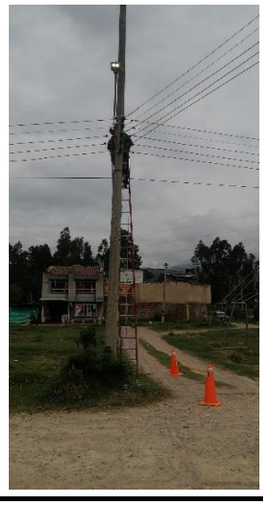
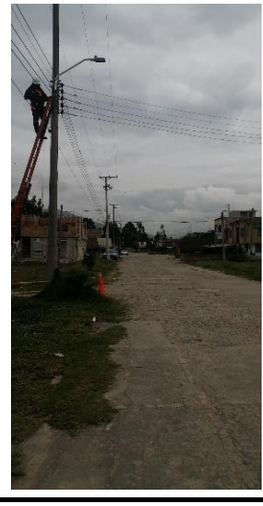
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3450	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757595,-72.908608	**Dirección**	Crr12a con 56a			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

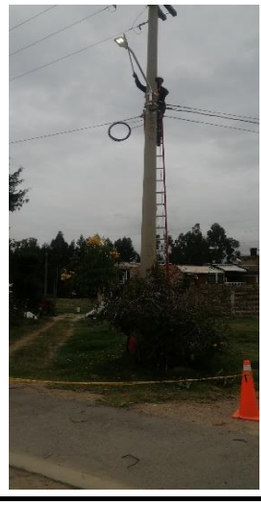
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3451	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.757279,-72.908859	**Dirección**	Calle56A#12-22			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	30	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

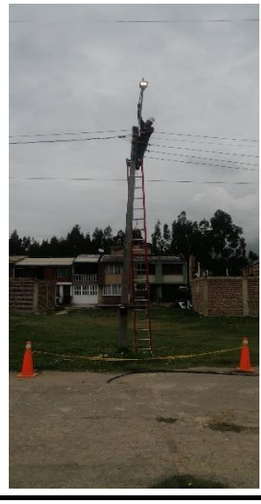
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3452	**Número de luminaria Anterior**	8125			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.757419,-72.908707	**Dirección**	Crr12a entre 56 y 56a			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3453	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.757195,-72.909613	**Dirección**	Calle 56-12E			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-1050	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	15	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-009-3454	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.757201,-72.910021	**Dirección**	Diagonal 56 con 13			**Barrio**	Gustavo Jimenez
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:**	4539A

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

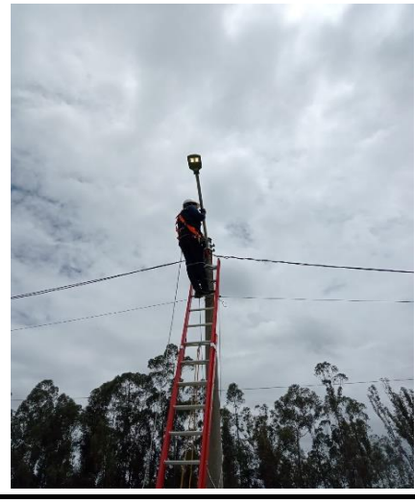
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-095-3487	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.689021,-72.951282	**Dirección**	Carrera 15 # 21 Sur-41			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4661

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	10	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-095-3488	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.688796,-72.951411	**Dirección**	Carrera 15 # 21 Sur-69			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4661

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	30	Mts de Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

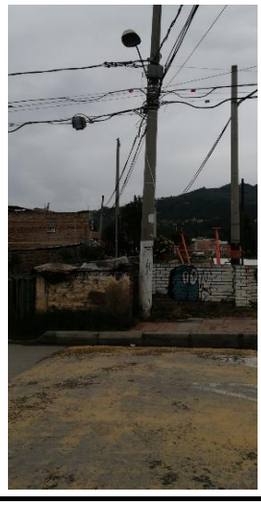
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3460	**Número de luminaria Anterior**		3187		**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.724576,-72.928809	**Dirección**	Trans 16 N 20-07			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3461	**Número de luminaria Anterior**	3186			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.724849,-72.929283	**Dirección**	Diagonal 16#17-19			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3462	**Número de luminaria Anterior**	3182			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725095,-72.928909	**Dirección**	Diagonal 16#20-48			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	14/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3463	**Número de luminaria Anterior**	3180			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725335,-72.929026	**Dirección**	Transversal 16#20-106			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-1050	**Nodo:** 4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

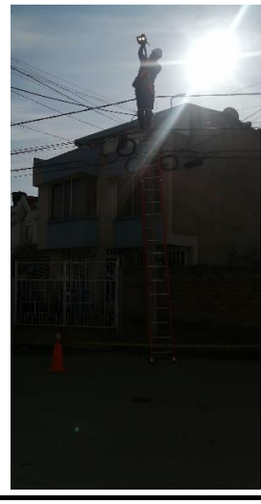
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3464	**Número de luminaria Anterior**	3179			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725645,-72.928894	**Dirección**	Diagonal 16#70-64			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

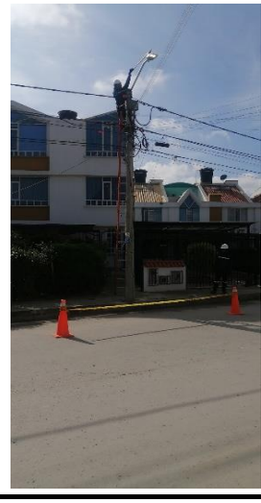
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3465	**Número de luminaria Anterior**	3178			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725906,-72.928808	**Dirección**	Diagonal 16#20-86			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

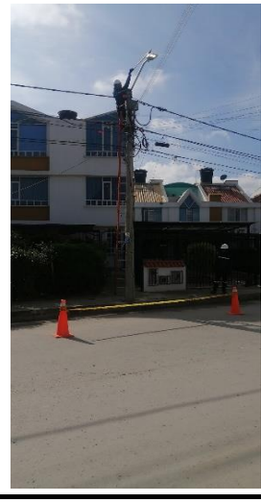
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3466	**Número de luminaria Anterior**	3177			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.726221,-72.928853	**Dirección**	Diagonal 16#20a-119			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

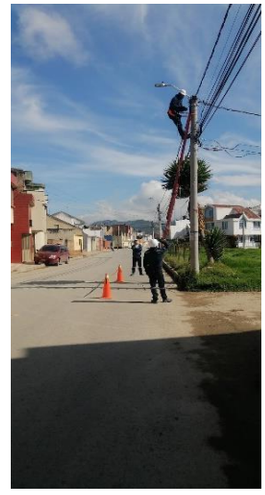
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3467	**Número de luminaria Anterior**	3173			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.726508,-72.928810	**Dirección**	Diagonal 16#20-123			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3468	**Número de luminaria Anterior**	3172			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.726803,-72.928801	**Dirección**	Diagonal 16#19-30			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3469	**Número de luminaria Anterior**	3171			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727038,-72.928816	**Dirección**	Diagonal 16#19-33			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

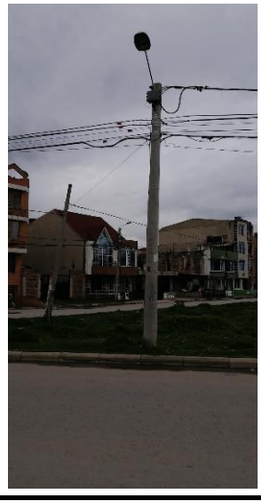
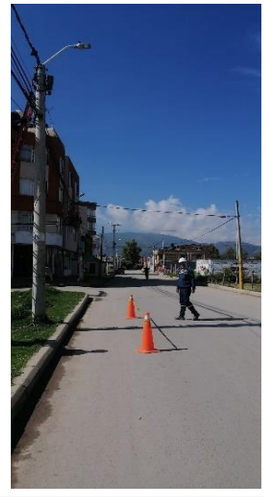
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3470	**Número de luminaria Anterior**	3170			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727291,-72.928718	**Dirección**	Diagonal 16#19-36			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-1050	**Nodo:** 4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3471	**Número de luminaria Anterior**	2911			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727520,-72.928904	**Dirección**	Trans 16 N 19 - 36			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5475

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

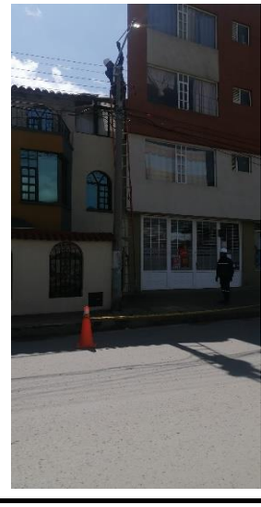
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3472	**Número de luminaria Anterior**	3169			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727663,-72.928902	**Dirección**	Trans 16 N 22 - 05			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

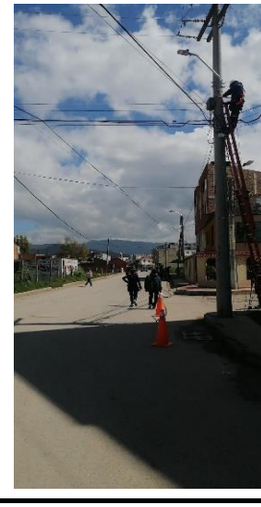
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3473	**Número de luminaria Anterior**	3168			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727964,-72.928953	**Dirección**	Trans 16 entre Crr20 y clle 22			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-1050	**Nodo:** 4713

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3474	**Número de luminaria Anterior**	2774			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.727964,-72.928953	**Dirección**	Tran16 N 20-07			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3475	**Número de luminaria Anterior**	2773			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.728416,-72.929089	**Dirección**	Trans 16 N 20-53			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:** 5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3476	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.728638,-72.929110	**Dirección**	Trans 16 N 20-61			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:** 5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3477	**Número de luminaria Anterior**	2771			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.728791,-72.929165	**Dirección**	Trans 16 N 20 - 90			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-1050	**Nodo:** 5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	15/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3478	**Número de luminaria Anterior**	2770			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.729123,-72.929331	**Dirección**	Trans 16 N 20a - 78			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:** 5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

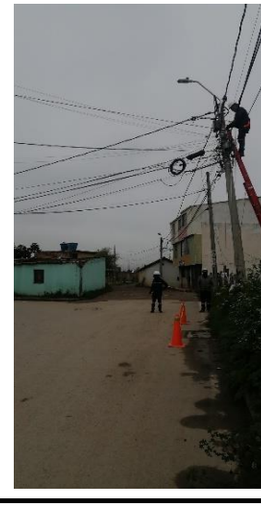
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3479	**Número de luminaria Anterior**	2769			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.729447,-72.929534	**Dirección**	Trans 16 con crr 21			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

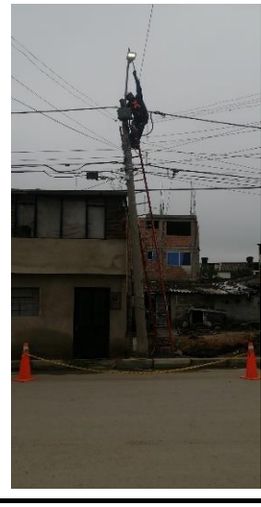
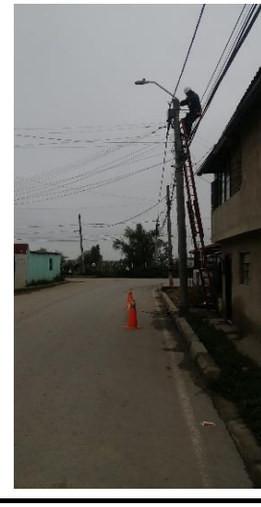
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3480	**Número de luminaria Anterior**	2768			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.729629,-72.929483	**Dirección**	Crr21 N 16 - 20			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

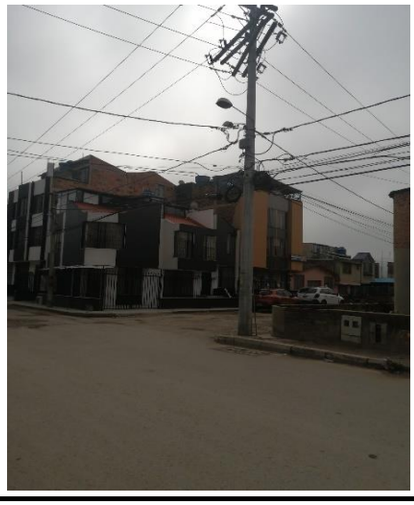
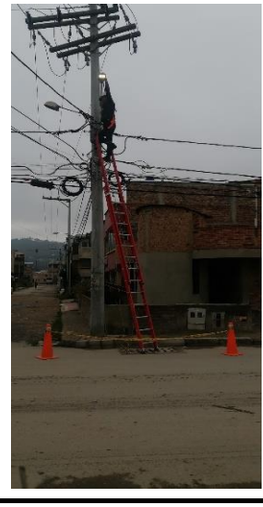
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3481	**Número de luminaria Anterior**	2776			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.729838,-72.929259	**Dirección**	Crr21 con cll24			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3482	**Número de luminaria Anterior**	2781			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.730064,-72.929079	**Dirección**	Crr21 N 24-12			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3483	**Número de luminaria Anterior**	2782			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.730262,-72.928947	**Dirección**	Crr21 N 24 - 58			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3484	**Número de luminaria Anterior**	2783			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.730386,-72.928762	**Dirección**	Crr21 N 24-68			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3485	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.730573,-72.928720	**Dirección**	Crr21 N 24 - 80			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

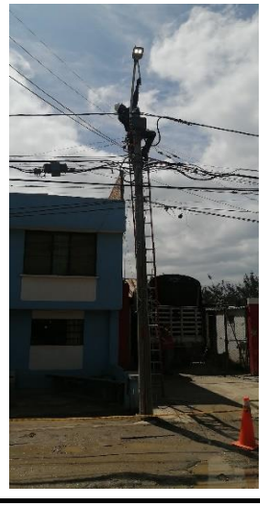
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-162-3486	**Número de luminaria Anterior**	2784			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.730700,-72.928603	**Dirección**	Crr21 N 25 - 50			**Barrio**	Jorge Eliecer Gaitán
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5471

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3501	**Número de luminaria Anterior**	664			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.753364,-72.910305	**Dirección**	Calle 53 con crr12			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

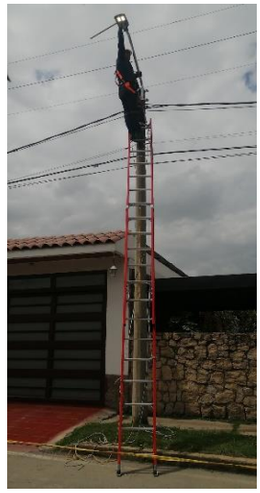
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3502	**Número de luminaria Anterior**	660			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.753483,-72.910484	**Dirección**	Cll54 entre 12 y 12a			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3503	**Número de luminaria Anterior**	656			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.753662,-72.910667	**Dirección**	Cll54 con crr12a			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

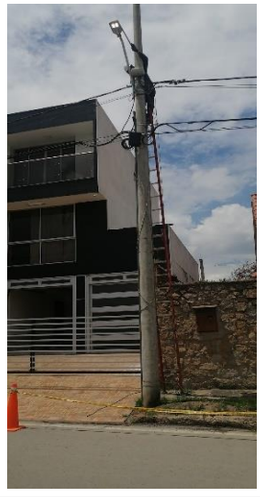
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3504	**Número de luminaria Anterior**	654			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.753858,-72.910863	**Dirección**	Cll54 N 12a-19			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

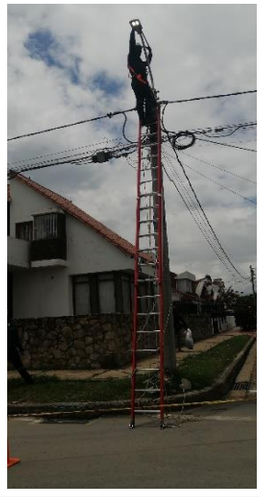
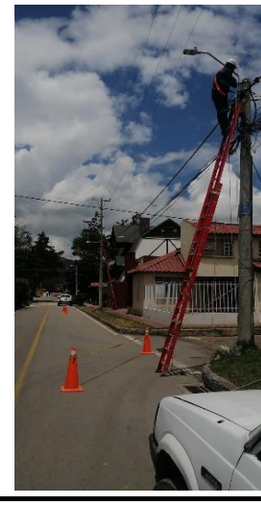
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3505	**Número de luminaria Anterior**	652			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.754029,-72.911088	**Dirección**	Cll54 con crr 12b			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

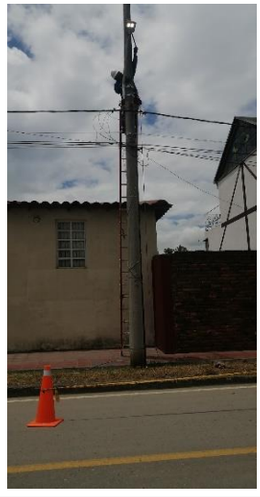
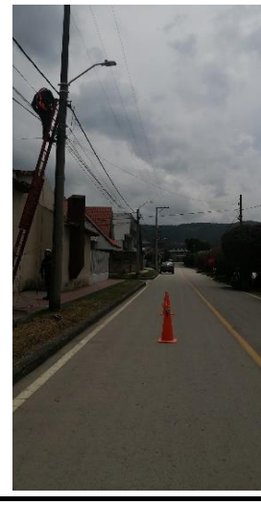
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3506	**Número de luminaria Anterior**	647			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.754170,-72.911218	**Dirección**	Cll54 N 12b-27			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

i g s ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

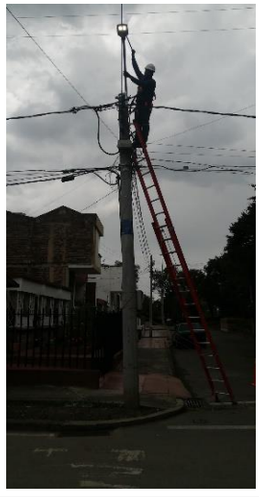
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3507	**Número de luminaria Anterior**	644			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.754359,-72.911434	**Dirección**	Cll54 con crr 12c			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

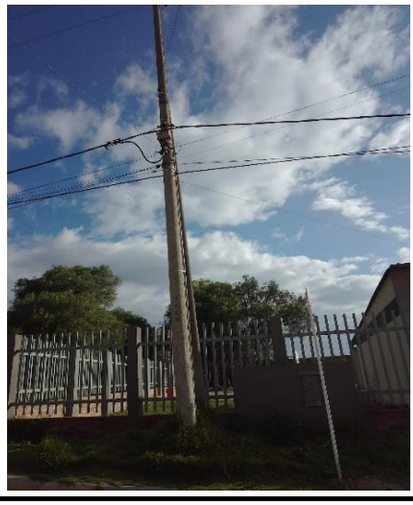
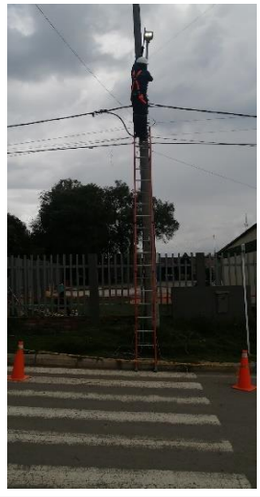
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3508	**Número de luminaria Anterior**	640			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.754643,-72.911716	**Dirección**	Cll54 entre 12ç y 13			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3509	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.754839,-72.911905	**Dirección**	Cll54 entre crrs 12c y 13			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

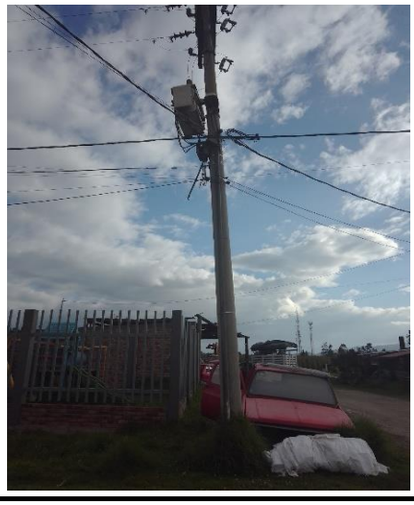
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-163-3510	**Número de luminaria Anterior**	636			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.754961,-72.912042	**Dirección**	Cll54 con crr13			**Barrio**	Alvaro Gonzalez Santana
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	5671

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-166-3455	**Número de luminaria Anterior**	7436			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.7201092, -72.9413106	**Dirección**	Calle 8a #26-41			**Barrio**	Valdéz Tavera
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	Decorativo	**Nodo:**	4765

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-168-3500	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.702073,-72.936724	**Dirección**	Crr10 con cll2b			**Barrio**	Villita
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	5104

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-171-3457	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714241,-72.946382	**Dirección**	Call. 2B # 28-27			**Barrio**	San Andresito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4796

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-171-3458	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714311,-72.946527	**Dirección**	Calle 2bis # 29			**Barrio**	San Andresito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4796

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

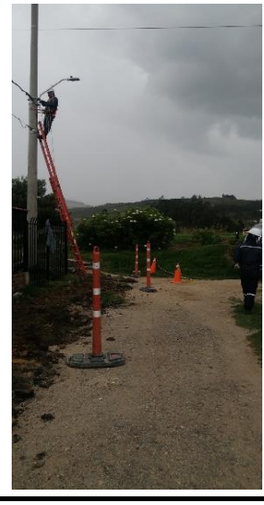
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-171-3459	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.713949,-72.946731	**Dirección**	Crr29 con 2a			**Barrio**	San Andresito
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-1050	**Nodo:**	4795

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-171-3499	**Número de luminaria Anterior**	Sin Número			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714591,-72.946387	**Dirección**	Crr29 con 2b			**Barrio**	San Andresito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4796

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	19/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3489	**Número de luminaria Anterior**	3335			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.724620,-72.923476	**Dirección**	Calle 22 11bis - 02			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5254

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3490	**Número de luminaria Anterior**	3336			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.724835,-72.923304	**Dirección**	Kr 11bis 1 # 22 - 33			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-1050	**Nodo:** 5254

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3491	**Número de luminaria Anterior**	3337			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725097,-72.923147	**Dirección**	Kr 11bis 1 # 22 - 60			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5254

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3492	**Número de luminaria Anterior**	3338			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725230,-72.923026	**Dirección**	Kr 11bis 1 # 22 - 79			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5254

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3493	**Número de luminaria Anterior**	3295			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725403,-72.923116	**Dirección**	Calle 23 # 11bis - 13			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4699

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3494	**Número de luminaria Anterior**	3294			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725519,-72.923403	**Dirección**	Calle 23 11A - 02			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4699

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3495	**Número de luminaria Anterior**	3293			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725448,-72.923421	**Dirección**	Kr 11A # 22 - 63			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8M-510	**Nodo:**	4699

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3496	**Número de luminaria Anterior**	3341			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.724826,-72.923629	**Dirección**	Kr 11 bis A con calle 23			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-1050	**Nodo:**	5254

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3497	**Número de luminaria Anterior**	3340			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725044,-72.923550	**Dirección**	Kr 11 2bis # 22 - 29			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4699

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

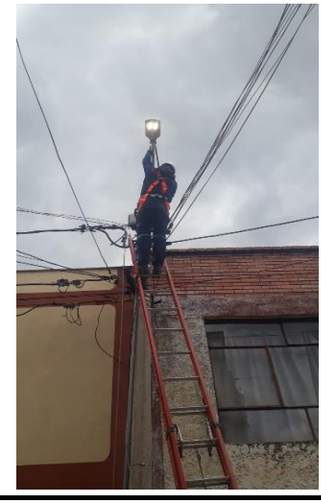
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-176-3498	**Número de luminaria Anterior**	3339			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.725212, -72.923406	**Dirección**	Kr 11 2bis # 22 - 51			**Barrio**	Laguito
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8M-510	**Nodo:**	4699

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70 w Sodio	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	17/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

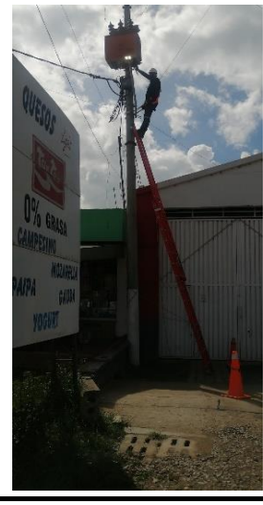
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-178-3456	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.682907,-72.952895	**Dirección**	Kr 11 #25 - 54 sur			**Barrio**	Venecia
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4612

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Sin Luminaria	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	20/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	Mts	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

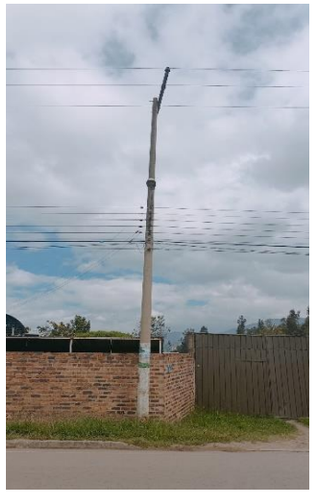
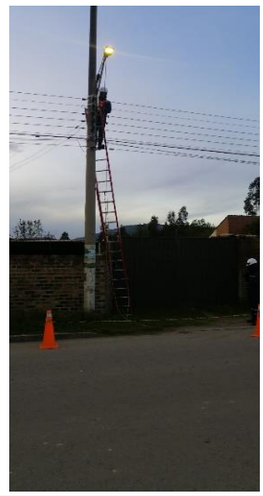
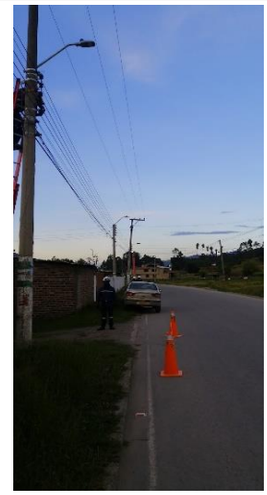
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3533	**Número de luminaria Anterior**	1418			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.743241,-72.903090	**Dirección**	Carrera 10A # 50-61			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

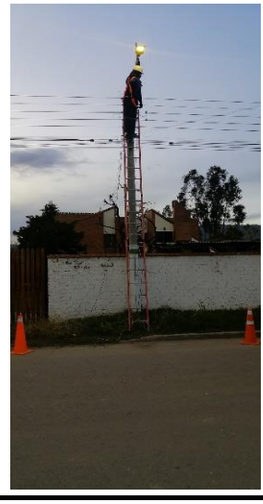
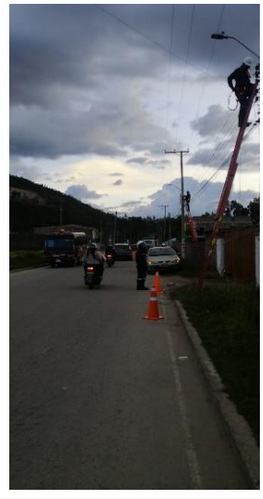
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3534	**Número de luminaria Anterior**	1417			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.743399,-72.902918	**Dirección**	Carrera 10A # 50 -61			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:**	8m-510	**Nodo:** 5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

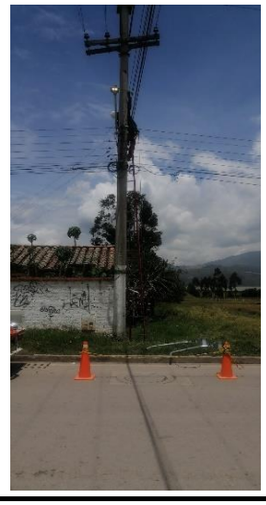
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3535	**Número de luminaria Anterior**	1416			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.743538,-72.902810	**Dirección**	Carrera 10 A # 50 - 63			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3536	**Número de luminaria Anterior**	1640			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.743852,-72.902591	**Dirección**	Carrera 10A # 51-53			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3537	**Número de luminaria Anterior**	1641			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.744118,-72.902452	**Dirección**	Carrera 10A # 51 - 65			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

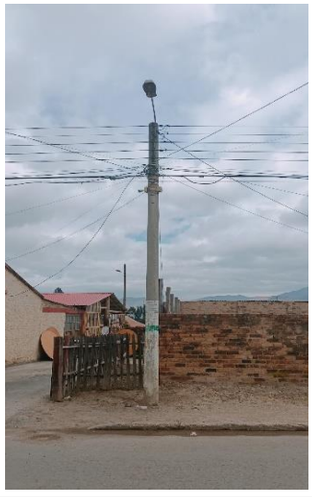
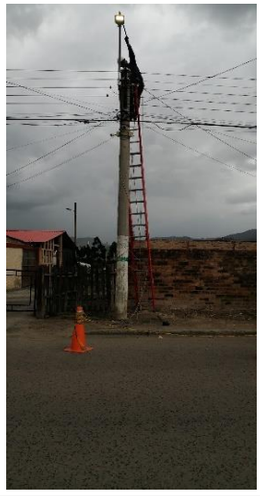
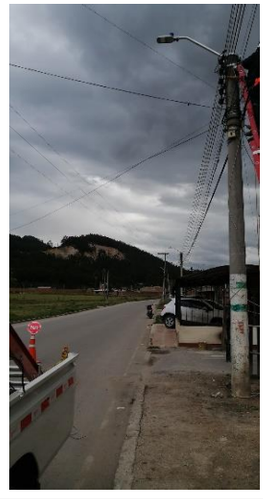
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3538	**Número de luminaria Anterior**	1642			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.744344,-72.902229	**Dirección**	Carrera 10A # 53-50			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-1050	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

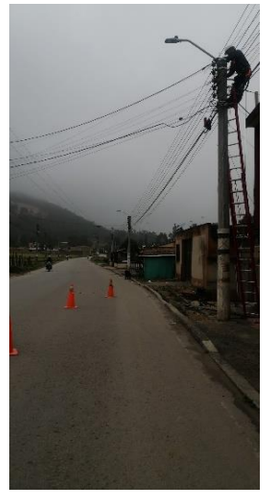
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3539	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.744591,-72.902135	**Dirección**	Carrera 10A # 53-25			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-1050	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3540	**Número de luminaria Anterior**	1644			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.744833,-72.901932	**Dirección**	Carrera 10A # 53 - 25			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3541	**Número de luminaria Anterior**	1645			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.745043,-72.901789	**Dirección**	Carrera 10 A # 53-25			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3542	**Número de luminaria Anterior**	1646			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.745168,-72.901588	**Dirección**	Carrera 10A CON CALLE 54			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-147-3543	**Número de luminaria Anterior**	1647			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.745484,-72.901334	**Dirección**	Carrera 10 A # 54 - 03			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-1050	**Nodo:**	5626

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

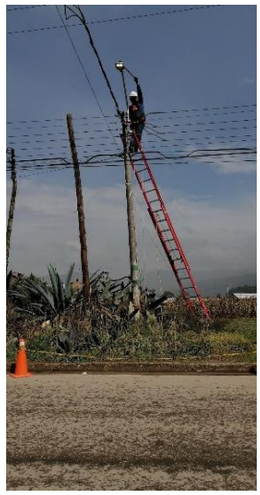
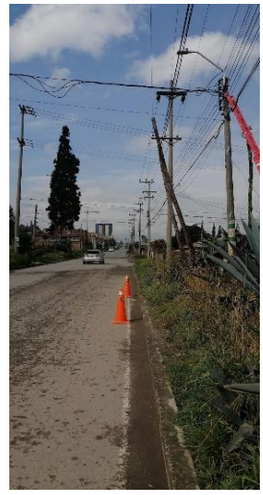
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3511	**Número de luminaria Anterior**	1463			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740119,-72.907724	**Dirección**	Carrera 10A # 46 - 65			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

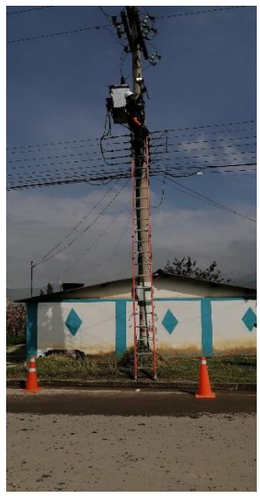
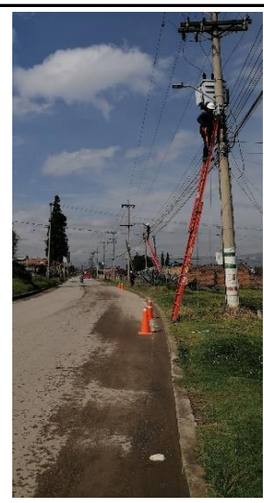
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3512	**Número de luminaria Anterior**	1462			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740269,-72.907502	**Dirección**	Carrera 10A # 46 - 65			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

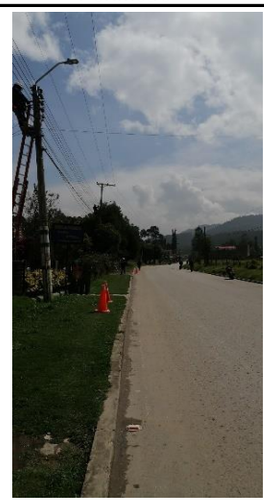
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3513	**Número de luminaria Anterior**	14617			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740357,-72.907238	**Dirección**	Carrera 10A # 46 - 89			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3514	**Número de luminaria Anterior**	1460			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740568,-72.906980	**Dirección**	Carrera 10A # 46 - 129			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

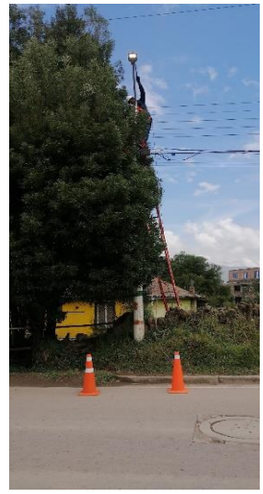
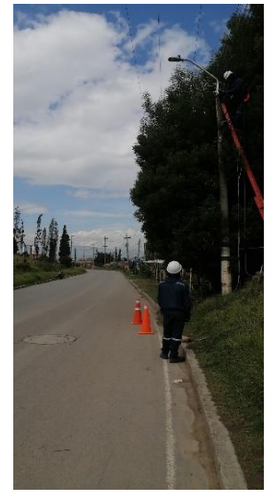
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3515	**Número de luminaria Anterior**	1459			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740670,-72.906784	**Dirección**	Carrera 10a # 46-129			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

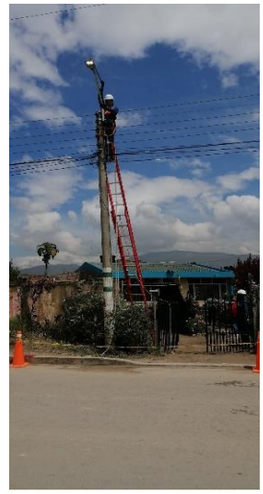
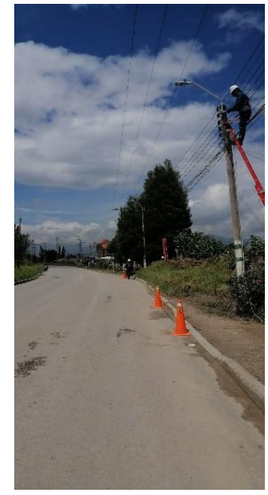
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3516	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740731,-72.906583	**Dirección**	Carrera 10A # 46A - 85			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

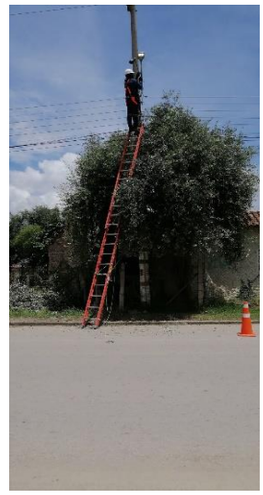
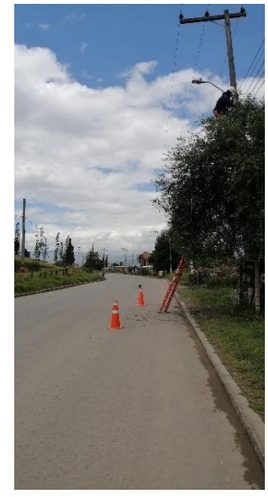
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3517	**Número de luminaria Anterior**	1457			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740818,-72.906499	**Dirección**	Carrera 10a #46 -193			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5619

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

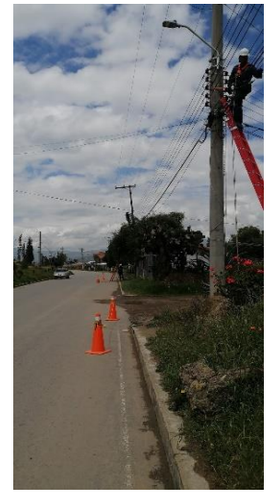
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3518	**Número de luminaria Anterior**	1456			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.740896,-72.906106	**Dirección**	Carrera 10A # 47 - 05			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3519	**Número de luminaria Anterior**	1442			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741001,-72.905873	**Dirección**	Carrera 10a#47-07			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

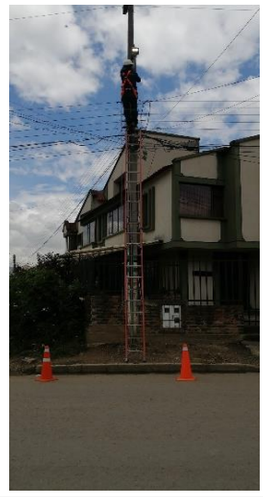
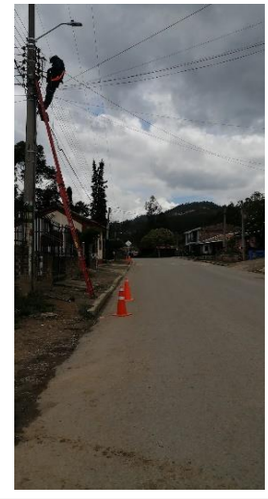
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3520	**Número de luminaria Anterior**	1441			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741037,-72.905548	**Dirección**	Carrera 10A # 48 - 07			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

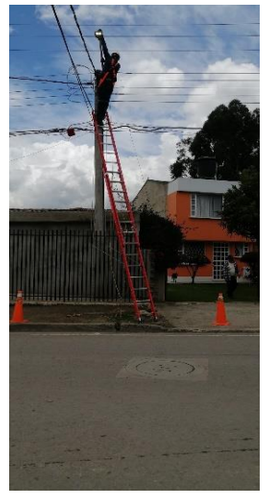
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3521	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741175,-72.905234	**Dirección**	Carrera 10A # 48 - 50			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-1050	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3522	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741347,-72.905103	**Dirección**	Carrera 10A # 48 - 76			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3523	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741357,-72904879	**Dirección**	Carrera 10 A # 48-42			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

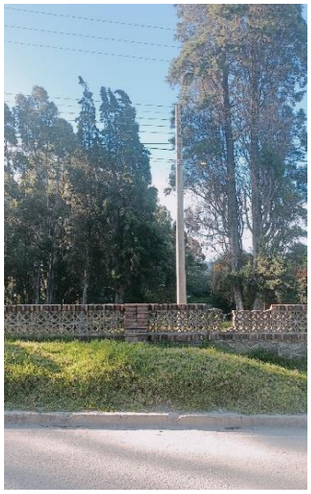
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3524	**Número de luminaria Anterior**	1434			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741562,-72.904602	**Dirección**	Carrera 10a# 48-22			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

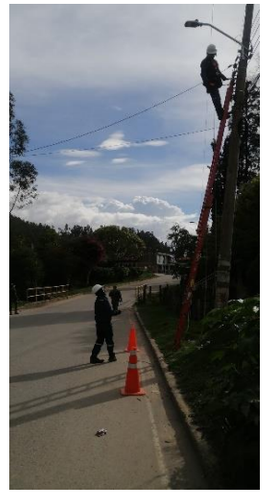
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3525	**Número de luminaria Anterior**	1433			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741751,-72.904382	**Dirección**	Carrera 10 a # 48 - 112			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3526	**Número de luminaria Anterior**	1432			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.741962,-72.904188	**Dirección**	Carrera 10 A #48-121			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

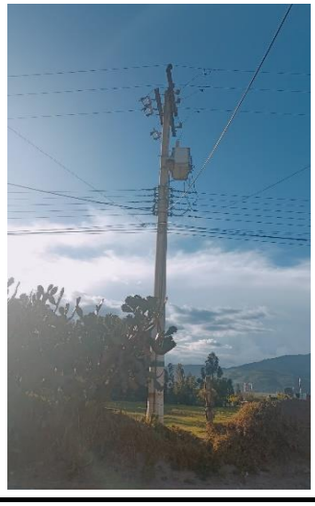
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3527	**Número de luminaria Anterior**	1431			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.742136,-72.903973	**Dirección**	Carrera 10a # 48-142			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

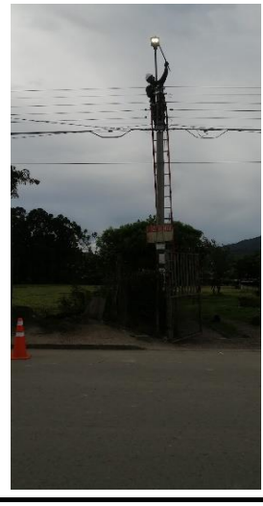
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3528	**Número de luminaria Anterior**	1430			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.742340,-72.903846	**Dirección**	Carrera 10a#48a-57			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	27/09/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

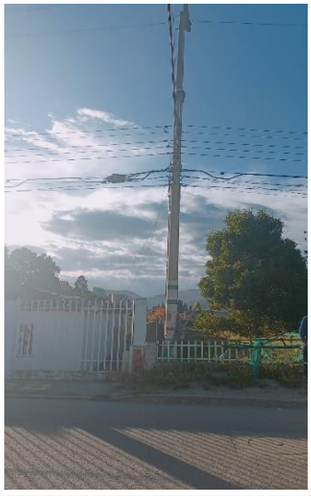
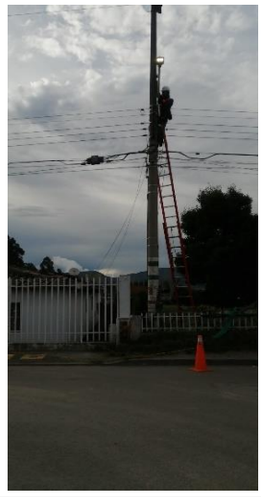
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3529	**Número de luminaria Anterior**	1422			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.742499,-72.903630	**Dirección**	Carrera 10a#50-06			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3530	**Número de luminaria Anterior**	1421			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.742725,-72.903471	**Dirección**	Carrera 10 a# 50 - 28			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3531	**Número de luminaria Anterior**	1420			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.742842,-72.903270	**Dirección**	Carrera 10a#50-11			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-510	**Nodo:** 5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

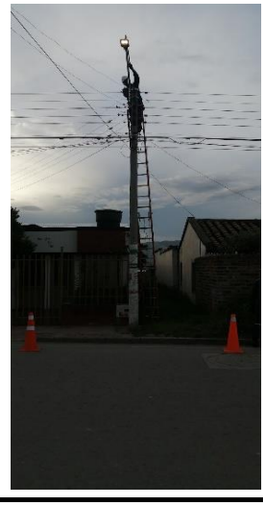
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-174-3532	**Número de luminaria Anterior**	2419			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.743072,-72.903196	**Dirección**	Carrera 10A # 50 - 35			**Barrio**	Juan José Rondón
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	5620

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23570	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

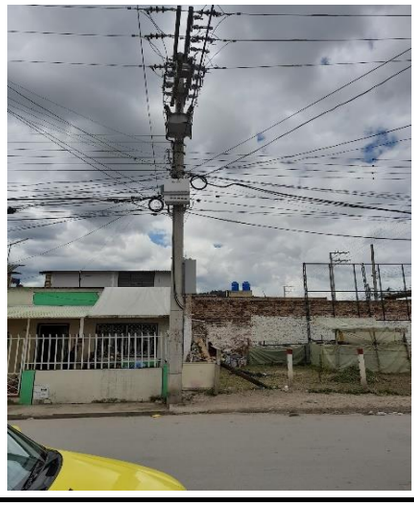
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3544	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización Complementaria
Coordenadas	5.717867,-72.942419	**Dirección**	Cra26 #6A-43			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	12m-1050	**Nodo:**	4171

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	Ninguna	**Brazo y herrajes:**	No cuenta con brazo a retirar No cuenta con herrajes

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3545	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.717747,-72.942596	**Dirección**	Crr26 N 6a -15			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4171

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	150w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3546	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.717475,-72.942664	**Dirección**	Carrera 26 calle 6			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4171

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	150w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

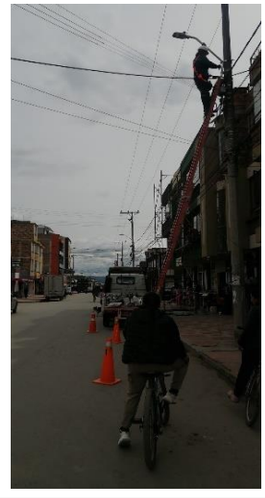
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3547	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.717373,-72.942856	**Dirección**	Crr26 N 6-29			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4773

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3548	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.717026,-72.942948	**Dirección**	Carrera26#5-41			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4773

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

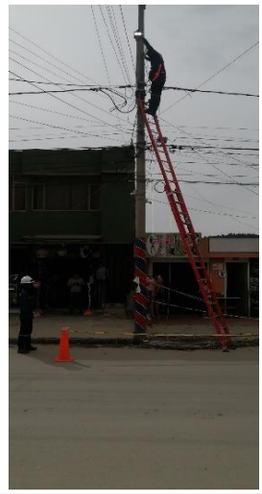
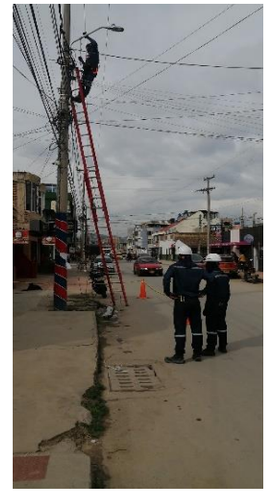
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3549	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716862,-72.943112	**Dirección**	Crr26 N 5b - 17			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

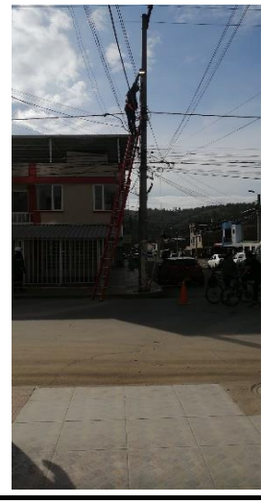
ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3550	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716653,-72.943206	**Dirección**	Cra26 # 3A24			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico		
Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

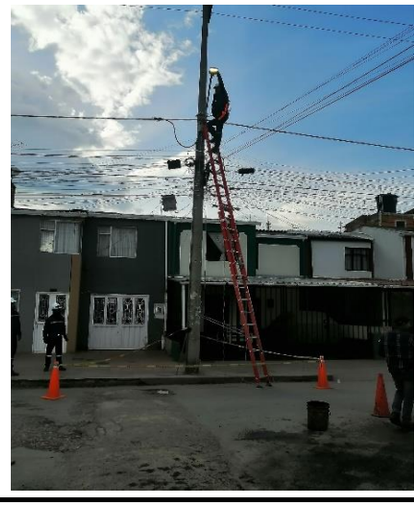
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3551	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716390,-72.943395	**Dirección**	Crr26 N 5 -09			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	1/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

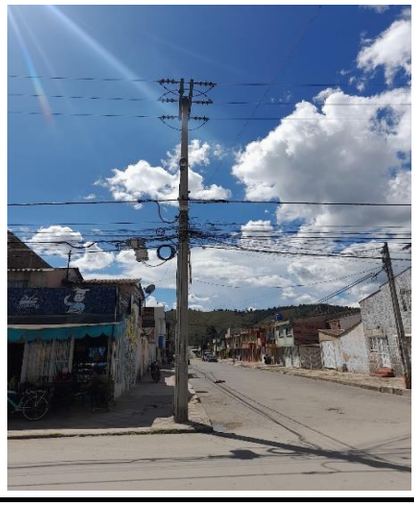
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3552	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716220,-72.943466	**Dirección**	Cra26#4A41			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12m-1050	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

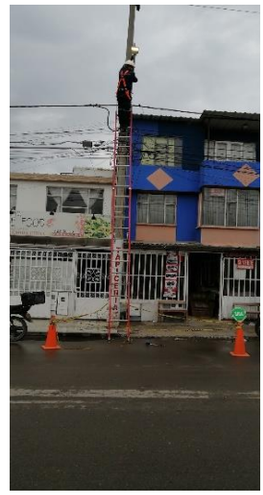
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3553	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716031,-72.943620	**Dirección**	Crr26 N 4a - 17			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

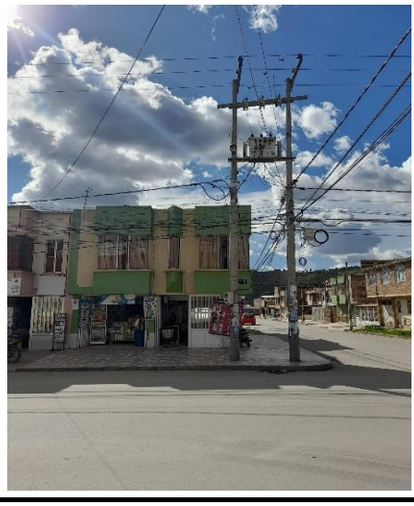
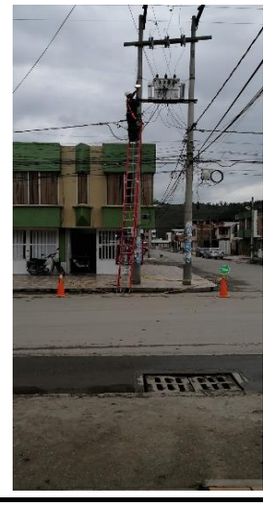
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3554	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716220,-72.943466	**Dirección**	Carrera 26calle 5			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

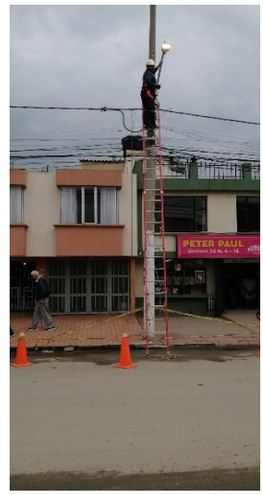
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3555	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.715557,-72.943890	**Dirección**	Crr26 N 4 -15			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

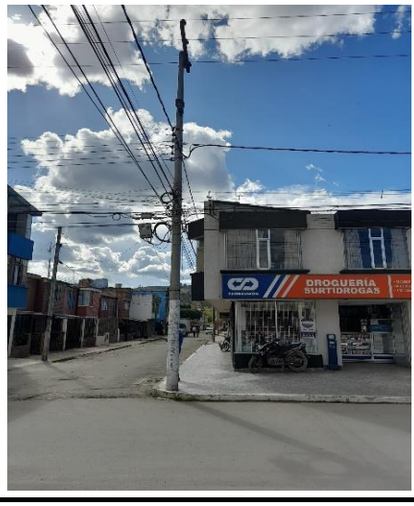
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3556	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.716220,-72.943466	**Dirección**	Cra26#4-03			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito	Aérea	**Tipo de Poste:** 12M-510	**Nodo:**	4774

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

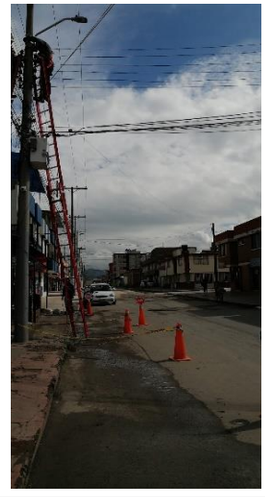
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3557	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.715105,-72.944143	**Dirección**	Crr26 N 3 - 75			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-510	**Nodo:**	4776

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	150w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

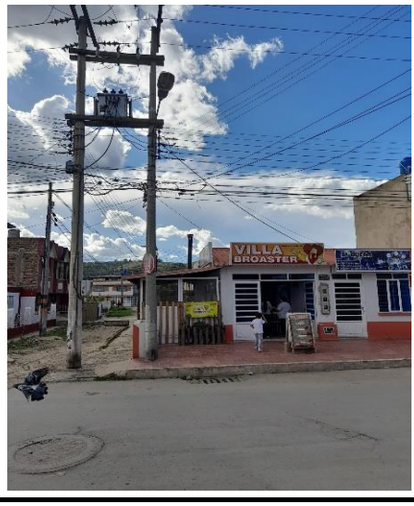
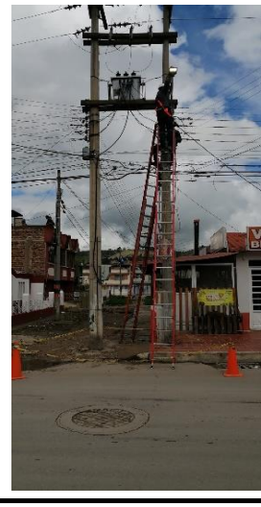
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3558	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714887,-72.944231	**Dirección**	Cra 26#2G-05			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	12M-510	**Nodo:**	4776

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	250w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

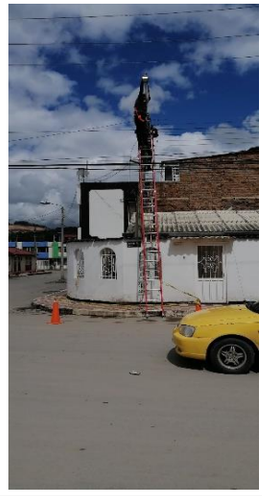
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3559	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714651,-72.944417	**Dirección**	Crr26 N 2e - 05			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	EBSA	**Tipología de RED:**	Circuito Aérea	**Tipo de Poste:**	8m-510	**Nodo:**	4776

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	150w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	0	No instalada	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila

ingenieria	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE EJECUCIÓN	Código: F-IGS- 82 Versión: 2 Fecha Formato: 08/09/2022

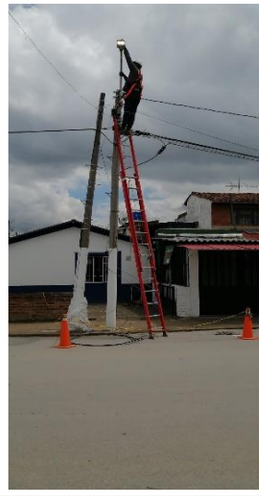
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQR'S CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20220477

Código de Identificación:	477-173-3560	**Número de luminaria Anterior**	0			**Tipo de Instalación**	Modernización
Coordenadas	5.714497,-72.944461	**Dirección**	Crr26 con 2e			**Barrio**	Magdalena
Propietario de la RED	Municipio	**Tipología de RED:**	RED	Aérea	**Tipo de Poste:** 8m-510	**Nodo:**	4780

Luminaria y herrajes retirados			
Tipo de Luminaria:	70w NA	**Brazo y herrajes:**	Brazo retirado en regular estado Cinta Bandit cortada para retirar la luminaria

Datos de Instalación					
Luminaria Instalada:	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW DIM 7PIN	**Código de Referencia:**	P23572	**Fecha de Instalación**	3/10/2022
Tipo de Brazo:	KIT DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**Descripción:**	Brazo luminaria 1½ x 1.50 mts con collarin 140 mm,galvanizado en Caliente, tipo codensa		
Postería Instalada:	Ninguno	**RED Adicional:**	35	Cable triplex 2x2 AAC +2 AAAC aislado Nexans/Procables	

Registro Fotográfico

Antes	Luminaria en Funcionamiento	Perímetro
		

Esta memoria fue realizada con el seguimiento en campo y autorización de la firma Interventora Esmeralda Ávila Salamanca.

Elaboró: Ing. Residente IGS
Ing. Anderson Yair Zambrano

Aprobó: Ing. Residente Interventoría EAS
Ing. Frank Archila
