Barranquilla, 06 de julio 2022

Ingeniero:
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción
Supervisor del Contrato


ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 05 DE JUNIO 2022 Y 04 DE JULIO 2022.

Respetado Ingeniero:

Durante el período relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales N° 202201613, estas son:

Obligación Contractual	Producto
Apoyo a la Supervisión	Realizar recorridos y revisión junto con el contratista e interventoría, revisar y aprobar diseños y actas de obra para el contrato adjudicado para el Proyecto de diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las Instituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Departamento del Atlántico. Las intervenciones que con llevan la realización del contrato.

Cordialmente,



Firma: _____

Nombre del Contratista: Luis Carlos Enciso C
Documento de Identificación: CC 79.857.341
Dirección: Cra 50 No 80-273 apto 112A
Correo Electrónico: Luiscar76@gmail.com
Teléfono Celular: 317-4343945

Estado de general de adecuaciones y mantenimientos al 04 de julio de los puestos de salud:

Al momento hay terminados 26 unidades.
En ejecución de obras 15 unidades.
Próximas entregas: 4 unidades.

	Zona Centro/Rio /Mar	Municipio	Valor inversion Contractual INFRAES +DSEÑO	Fecha de inicio	terminación programado	% Ejecutado	% Programado
OBRA NUEVA	P.S. Cascajal	S.Larga	$ 2.454.640.073,92	12-08-2.021	11/07/2022	89,0%	98,0%
	p.s. Sibarco	Baranoa	$ 1.920.492.276,09	10-12-2.021	3/10/2022	60,0%	70,00%
	P.S. Las Tablas	Repelon	$ 1.938.302.672,43	9/02/2022	27/10/2022	27,0%	32,00%
	P.S. Santa Cruz	Luruaco	$ 1.960.874.067,10	9/02/2022	11/11/2022	19,0%	30,00%
	P.S. Cien Pesos	Repelon	$ 1.920.176.693,20	9/03/2022	9/11/2022	23,0%	27,00%
	P.S. San Juan de Tocagua	Luruaco	$ 1.622.130.820,22	9/03/2022	8/09/2022	17,0%	29,00%
	P.S. Palmar de candelaria	Luruaco	$ 967.671.338,00	4/05/2022	5/01/2023	13,0%	12,00%
	Hospital Palmar de Varela	Palmar de varela	$ 3.986.588.920,00	23/03/2022	23/12/2022	4,5%	2,00%
	Molineros	Sabanalarga	$ 968.649.889,65	15/06/2022	15/12/2022	4,5%	2,40%
	CHORRERA	Juan de Acosta	$ 1.794.111.347,00	23/06/2022	22/12/2022	0,5%	0,50%
	PITAL DE MEGUA	Baranoa	$ 979.335.673,12	23/06/2022	22/02/2023	0,5%	0,50%
AMPLIACION	Hospital de Repelon	Repelon	$ 6.275.707.835,32	10-08-2.021	25/10/2022	70,0%	66,00%
	Hospital de Suan	Suan	$ 4.271.348.925,00	9/02/2022	29/03/2023	19,50%	26,00%
	ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS	Santo Tomas	$ 4.708.257.212,30	44727	14/07/2023	1,0%	0,37%
OBRA NUEVA	Hospital Juan Dominguez Romero	Soledad	$ 93.732.173.400,00	22-04-2.022	30/06/2023	52,55%	48,15%

Obras entregadas:

NUMERO	INSTITUCION		INTERVENCION	FECHA DE INICIO	FECHA ENTREGA	AVANCE FISICO EJECUTADO
1	P.s. Péndales	$ 1.767.003.664,40	OBRA NUEVA	8-03-2.021	18/06/2022	99%
2	P.S. Burrusco	$ 1.524.343.750,80	OBRA NUEVA	13-05-2.021	24/06/2022	99%
3	Ese Hospital Usiacuri	$ 1.304.447.654,00	ADECUACIÓN	29-12-2.020	20/05/2022	99%
5	PS Compuertas	$ 306.051.673,58	ADECUACIÓN	15-09-2.021	22/06/2022	95%
	p.s. pital de Carlin (pitalito)	$ 1.814.720.308,70	OBRA NUEVA	16-06-2.021	22/06/2022	100%
6	P.S Leña	$ 1.935.940.472,00	OBRA NUEVA	24-06-2.021	14/06/2022	100%
7	p.s. Carreto	$ 1.899.608.473,00	OBRA NUEVA	15-04-2.021	14/06/2022	100%
8	PDS JUARUCO	$ 322.909.807,00	ADECUACIÓN	27-11-20	11-02-21	100%
9	PDS EL MORRO	$ 418.144.590,37	ADECUACIÓN	27-11-20	11-02-21	100%
10	PDS GALLEGO	$ 352.980.771,00	ADECUACIÓN	20-11-20	10-03-21	100%
11	PDS LA PEÑA	$ 229.360.790,12	ADECUACIÓN	20-11-20	10-03-21	100%
12	PDS CEMINSA	$ 494.421.540,00	ADECUACIÓN	30-11-20	19-03-21	100%
13	PDS CENTRO DE DESARROLLO VECINAL	$ 499.824.761,00	ADECUACIÓN	30-11-20	19-03-21	100%
14	PDS CAMPECHE	$ 391.717.908,00	ADECUACIÓN	29-11-20	25-03-21	100%
15	PDS BOHORQUEZ	$ 329.809.923,30	ADECUACIÓN	14-01-21	30-04-21	100%
16	PDS ALGODONAL	$ 630.050.922,77	ADECUACIÓN	18-01-21	30-04-21	100%
17	PS SANTAVERONICA	$ 295.853.908,00	ADECUACIÓN	13-04-2.021	30-05-2.021	100%
18	PS CUATRO BOCAS	$ 396.710.134,48	ADECUACIÓN	10-03-2.021	9-06-2.021	100%
19	PDS HIBACHARO	$ 603.521.159,80	ADECUACIÓN	19-12-20	27-05-21	100%
20	PS SAN MARTIN	$ 537.443.428,00	ADECUACIÓN	16-03-2.021	20-08-2.021	100%
21	PS LA BONGA	$ 417.240.930,60	ADECUACIÓN	16-03-2.021	20-08-2.021	100%
22	PS SANTA LUCIA	$ 2.050.576.985,60	ADECUACIÓN	18-01-2.021	07-09-2.021	100%
23	PS JUAN DE ACOSTA	$ 1.245.489.147,00	ADECUACIÓN	17-05-2.021	15/11/2021	100%
24	PS TUBARA	$ 1.043.608.092,00	ADECUACIÓN	28-11-2.020	9/11/2021	100%
25	P.S. ARROYO NEGRO	$ 598.675.231,00	ADECUACIÓN	5-04-2.021	6/12/2021	100%
26	P.S . VILLA ROSA	$ 458.704.912,00	ADECUACIÓN	5-04-2.021	6/12/2021	100%
27	HOSPITAL DE CANDELARIA	$ 995.856.743,00	ADECUACIÓN	25-05-2.021	6/12/2021	100%
28	PS .ROTINET	$ 399.374.586,00	ADECUACIÓN	21-07-2.021	26/01/2022	100%
29	PS. PUERTO GIRALDO	$ 431.847.256,53	ADECUACIÓN	04-08-2.021	27/01/2022	100%
30	PS ARROYO DE PIEDRA	$ 266.512.682,80	ADECUACIÓN	14-01-2.021	10/04/2021	100%
31	P.s. MARTILLO	$ 1.794.823.709,00	OBRA NUEVA	24-02-2.021	29/04/2022	100%
32	P.s. RETIRADA	$ 1.553.424.522,00	OBRA NUEVA	24-02-2.021	29/04/2022	100%

Se realizó y presentó a la Gobernadora del Atlántico en recorrido de visita al proyecto Hospital de media complejidad Juan Domínguez Romero de soledad, los avances significativos del proyecto:

DATOS CONTRACTUALES:


Fecha de Inicio de Actividades (Acta de Inicio):	01 de marzo de 2021.
Fecha Prevista de Terminación:	23 de mayo de 2023.
Valor Inicial:	$ 58.053.081.024
Valor Adición:	$ 35.679.092.376
Valor Actual:	$ 93.732.173.400 [1]

AVANCE DE PROYECTO:

- AVANCE GENERAL PROGRAMADO (04/07/2022): **48,15%**
- AVANCE GENERAL REAL EJECUTADO (04/07/2022): **52.55%**

AVANCES DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS:

- Cimentación: 100%
- Estructura: 100%
- Mampostería Interior: 96%
- Mampostería Fachada: 70%
- Pañetes: 82%
- Estructura Metálica de Cubierta: 94%
- Pisos: 50%
- Redes Hidrosanitarias: 80%
- Redes Eléctricas: 48%
- Canal de Aguas Lluvias: 99%

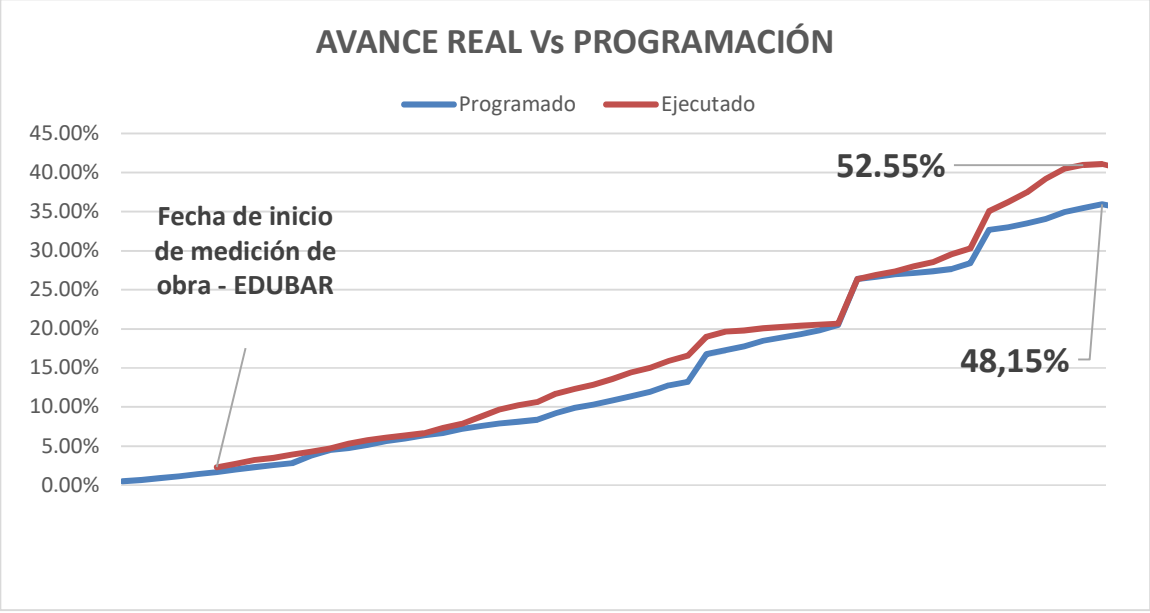




Entrega e inauguración de los puestos de salud de Carreto, Pitalito y Leña.




PITALITO
Atlántico para la Gente


LENA
CANDELARIA

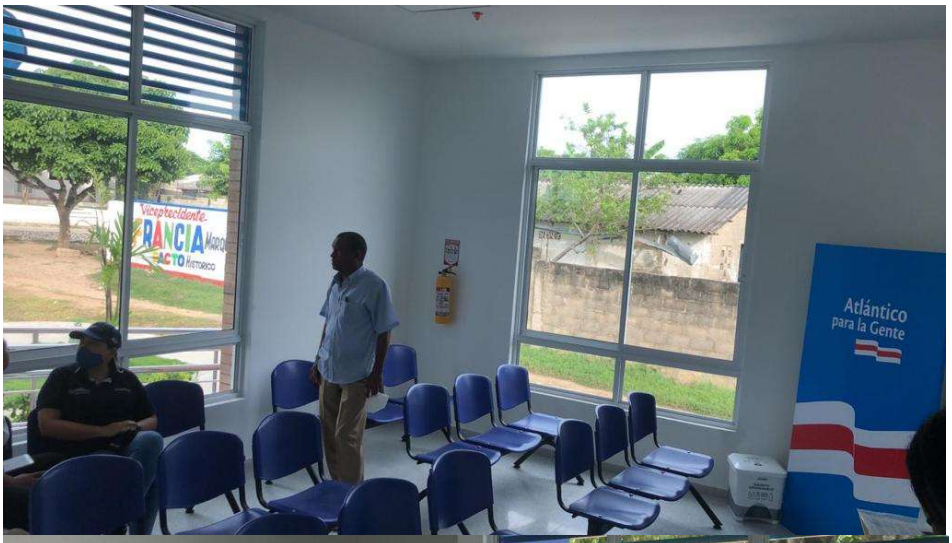
Vicepresidente
RANCIA MARQ
ACTO Histórico
Atlántico
para la Gente



