INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

ADECUACIÓN CANCHA SINTETICA

BARRIO LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 402 de 2022

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

ICCU No. 674 DE 2021

MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SEPTIEMBRE DE 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONVENIO ICCU No:	674 DE 2021
VALOR CONVENIO:	$ 127.597.302.oo
CONTRATO No:	402 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
CONTRATISTA:	CIVIDEPORTES SAS,
OBJETO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 127.597.302.oo
ACTA DE INICIO	01/06/2022
PLAZO	TRES (03) MESES
ACTA DE TERMINACION	01/09/2022

Mediante el presente documento se detallan los pormenores de las actividades llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del objeto del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 674 DE 2021.

Se firmó acta de inicio del contrato con fecha 1 de Junio de 2022, una vez formalizado el acta de inicio del contrato se empieza la ejecución de actividades en terreno, la etapa de ejecución de la obra se realiza sin necesidad realizar modificaciones al contrato de obra en tiempo o adición presupuestal.

AVANCE FÍSICO – FINANCIERO


El avance físico ejecutado a corte de 1 de septiembre de 2022 es del 100%, según lo correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, lo cual se resume en el siguiente cuadro:

	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
NUMERO	**ITEM**	**Actividades realizadas**	**% Ejecución**
1	1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	**100%**
2	2	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	**100%**
3	3	IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER	**100%**
4	4	SISTEMA MEMBRANA POLIPROPILENO	**100%**
5	6	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	**100%**
6	7	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	**100%**
7	8	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	**100%**


De acuerdo con las condiciones iníciales del Contrato de Obra Pública N° 402 de 2022, las cantidades se ejecutaron en su totalidad sin observaciones al momento de terminación de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CANCHA SINTETICA BARRIO MONARCAS

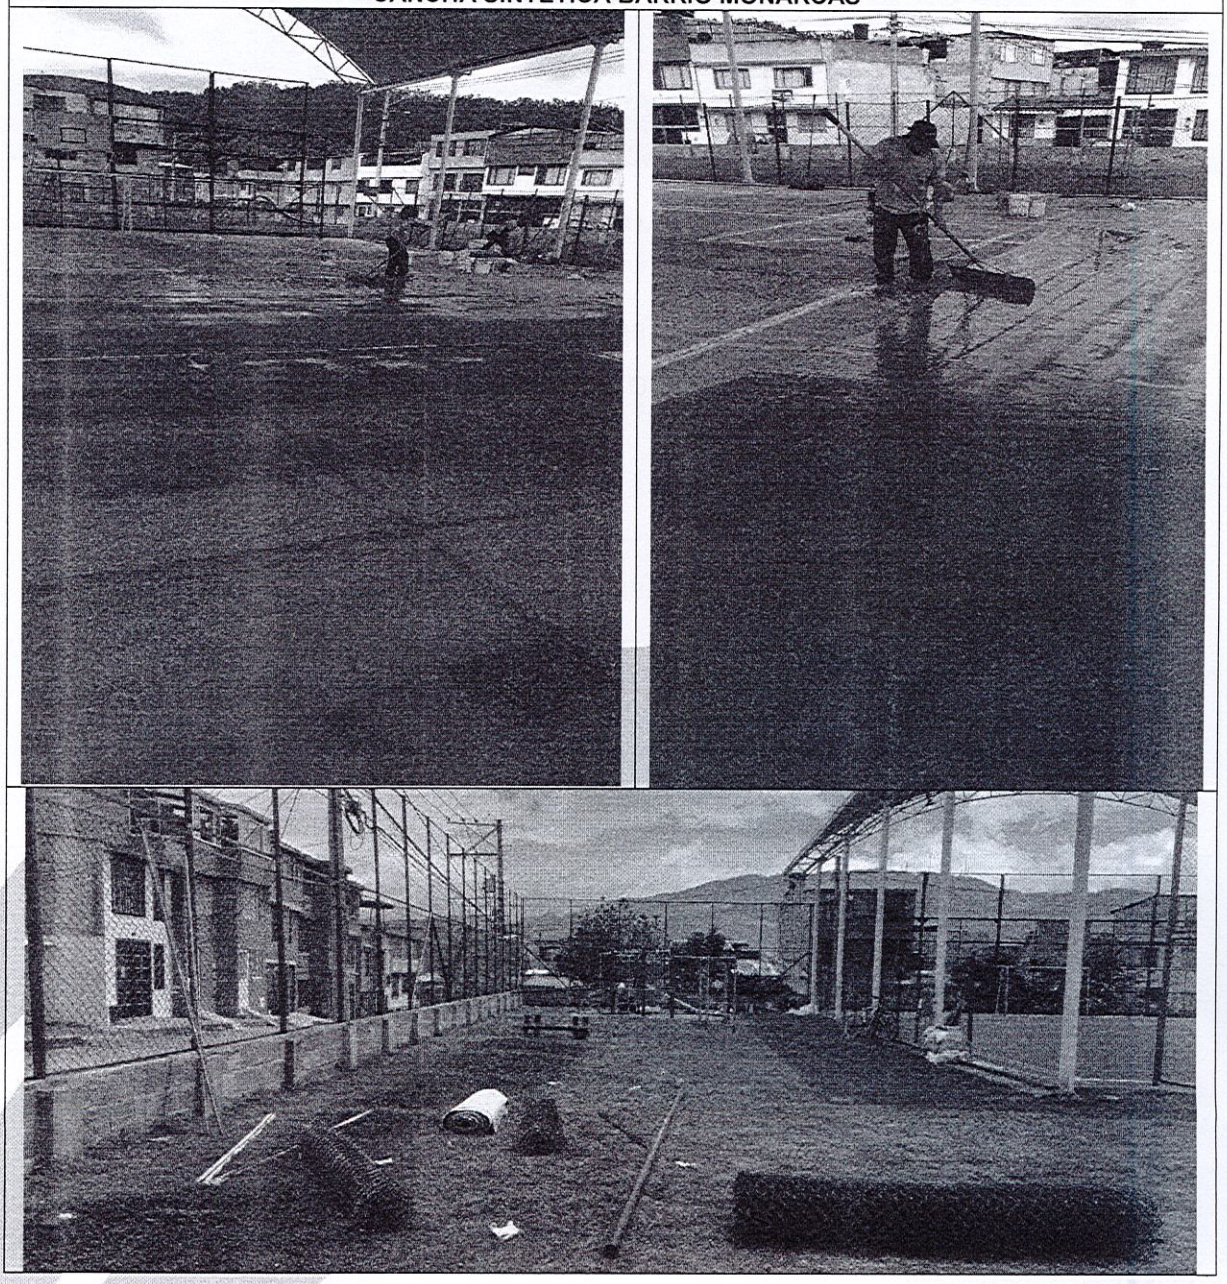

CODIGO: GAD-FR-07
VERSIÓN: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

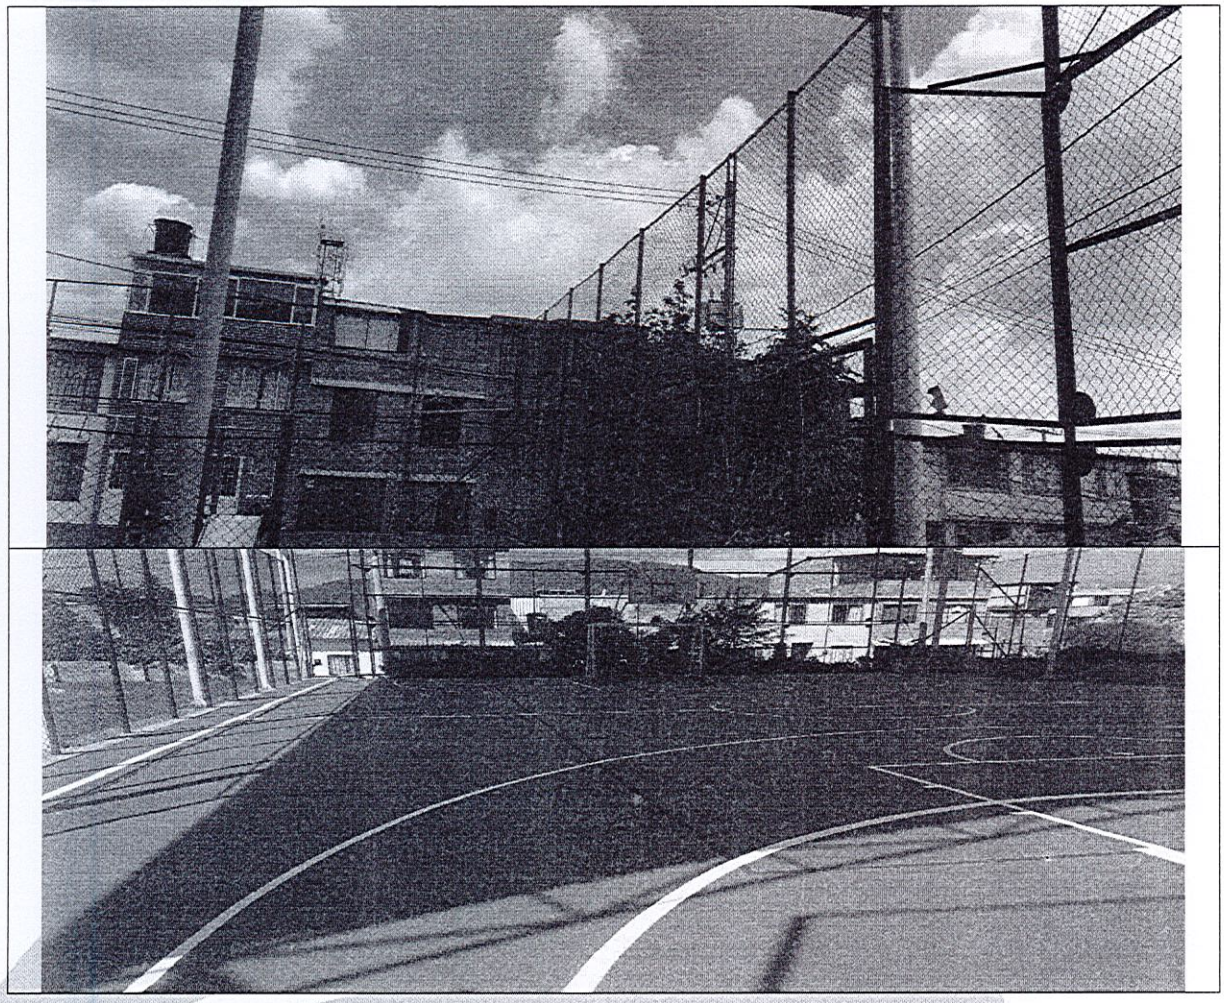

Ing. Frank Sebastián Sáenz Dávila
Director operativo, Secretaria de Obras Publicas

Proyecto: Ing. Agustín Quintero – PU SOP

CODIGO: GAD-FR-07
VERSIÓN: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO
