CIVIDEPORTES®	**INFORME DE OBRA I Y FINAL**	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONTRATO No. 402- 2022

INFORME ADECUACIÓN CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS

"ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 674 DE 2021."

PERIODO EVALUADO:

01 JUNIO 2022 AL 30 DE AGOSTO 2022



Fotografía 1. CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION.

2 RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Resumen ejecutivo del contrato de obra

3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Localización y ubicación

3.2 Características del Proyecto

4 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE OBRA Y CONTROL FINANCIERO

4.1 Resumen General de Avance de Obra control de Programación

5 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO.

5.1 Personal en la ejecución del Contrato de Obra

6. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

6.1 Actividades de Seguridad y salud en el trabajo Gestión de Calidad y SISO.

6.2 Atención Al Ciudadano

6.3 Accidentalidad laboral

6.4 Atención Al Ciudadano

6.5 Evidencias y Registro fotográfico:

6.6 Conclusión

7. CONDICIONES LEGALES

7.1 Pólizas del contrato de obra (relacionar sus fechas)

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. COPIA DE LA BITACORA DEL PERIODO.

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

1. INTRODUCCION

En el siguiente informe se presenta la información del proyecto "**ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 674 DE 2021."**y la ejecución del proyecto, adicionalmente se muestra la parte administrativa y económica del mismo.

Se ha encargado a la firma constructora CIVIDEPORTES S.A.S. Para La ejecución de la obra para la CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA, en EL Municipio de FACATATIVA Cundinamarca con los siguientes Ítems: 1) EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M, 2) RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE, 3) IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER, 4) SISTEMA MEMBRANA POLIPROPILENO, 5) CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2"), 6) MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL Y 7) SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

2. RESUMEN EJECUTIVO.

2. DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación 30/08/2022 **Período del informe: Desde** 1/06/2022 **hasta** 30/08/2022		
Nombre Director de Obra: ALVARO GABRIEL AREVALO **Nombre Residente de Obra:** OLIVERIO GOMEZ RIOS		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No. 402-2022	**Contratista: CIVIDEPORTES S.A.S**	
Entidad Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA **Objeto: "ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 674 DE 2021."**		
Valor Inicial $ 127.597.302,00 **Adición: 000.00** **Valor Total: $ 127.597.302,00**	**Valor Ejecutado** **$ 127.597.302,00**	**Ejecución financiera (100%)**
Fecha de Iniciación 01/06/2022 **Plazo Inicial** 3 MESES **Fecha de Terminación** 01/09/2022		


CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
NUMERO	**ITEM**	**Actividades realizadas**	**% Ejecución**
1	**1**	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	**100%**
2	**2**	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	**100%**
3	**3**	IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER	**100%**
4	**4**	SISTEMA MEMBRANA POLIPROPILENO	**100%**
5	**6**	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	**100%**
6	**7**	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	**100%**
7	**8**	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	**100%**

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACION Y UBICACIÓN: El proyecto de adecuación para la a cancha sintética está ubicado en el Municipio de Facatativá Cundinamarca, en el Barrio Las Lajas

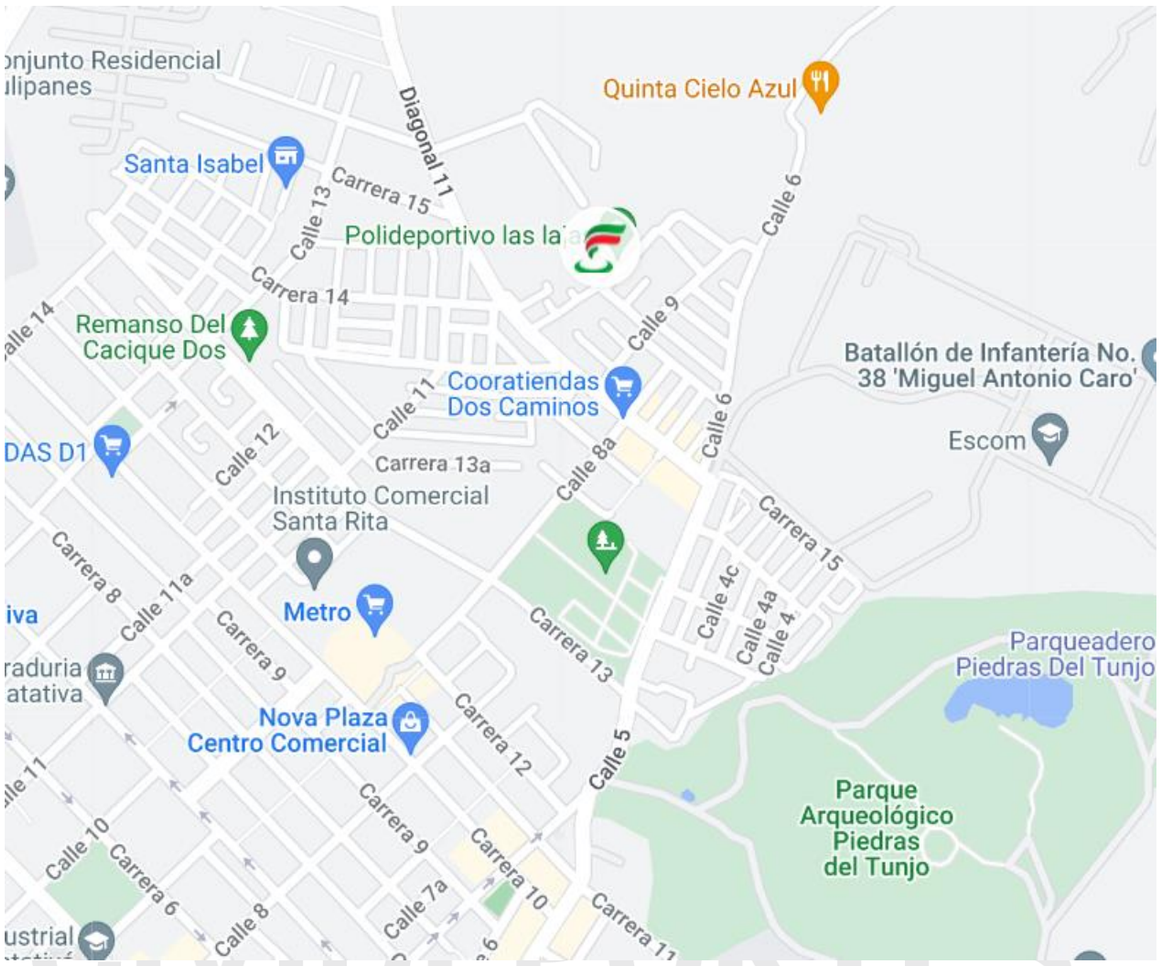

CIVIDEPORTES
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

COORDENADAS CANCHA SINTETICA LAS LAJAS

N: 4.8230224552076715

O: -74.34950156802228

3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

La Alcaldía Municipal de Factitiva invierte para la adecuación de un escenario deportivo para el disfrute de todos sus habitantes y deportistas, mediante una cancha sintética.

La cancha sintética tendrá una adecuación total de espacio debido al deterioro en el escenario (cancha), mediante la instalación de un sistema membrana polipropileno para campos deportivos y un cerramiento malla eslabonada c. 10 incluye ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2").

El escenario contaran con tecnologías innovadoras que aportan al cuidado del medio ambiente y el mejor desarrollo de actividades físicas para deportistas, en pro de competencias de alto rendimiento.

4. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE OBRA Y CONTROL FINANCIERO

4.1 RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Tenemos un avance programado 100% y el avance ejecutado es de 100%

5. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO.

5.1 Personal en la ejecución del Contrato de Obra

NOMBRES	No CC	CARGO
LUIS HERNANDO CHITIVA PARRA	80417382	SOLDADOR
ÁLDEMAR CORCHUELO HERNANDEZ	1073598161	AUX SOLDADURA
JHON MARIO RIOS OSORIO	80015788	OFICIAL DE OBRA
ESNEIDER MOTTA ORTIZ	1000126656	AYUDANTE DE OBRA
JOSE FRANCISCO GARAVITO CASTELLANOS	1002403967	AYUDANTE DE OBRA
HAIDER LEONARDO CASTAÑEDA FORERO	1192735141	AYUDANTE DE OBRA
MARCO ANTÓNIO ROMERO MUÑOZ	12561543	AYUDANTE DE OBRA
JUAN SEGUNDO BRAVO JIMÉNEZ	12563498	AYUDANTE DE OBRA
CHRISTIAN CAMILO CETINA ARIAS	1051955232	AYUDANTE DE OBRA
MARLON CAMILO GOMEZ	1000126656	AYUDANTE DE OBRA
JOVANA FERNANDA LOPEZ GALLO	35529324	SISO

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

6. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

6.1 Actividades de Seguridad y salud en el trabajo Gestión de Calidad y SISO

- Se realizó entrega de Elementos de Protección Personal
- Se realizó pausas activas
- Se realizó seguimiento de orden y aseo en el sitio de trabajo
- Se realizó seguimiento al uso adecuado de EPP
- Se realizó delimitación de áreas con cinta de seguridad

6.2 Principales Logros

Civideportes cuenta con el plan de capacitación en SST para el cumplimiento misional de la entidad.

Durante la vigencia 2022, periodo junio - agosto de 2022, se realizó una (1) charla personalizada acordes con el Sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, contando con la participación de los operarios de la Civideportes.

- ✓ Cumplimiento normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

Civideportes aplica en cada uno de sus procesos la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de garantizar bienestar y seguridad a sus trabajadores.

- ✓ Se Incentivó y creó conciencia en los trabajadores sobre la identificación y prevención de los riesgos a los que están expuestos en el desarrollo de sus labores.

Es importante que cada trabajador conozca a que riesgos está expuesto y la forma de prevenirlos, adquiriendo conciencia de autocuidado.

6.3. Accidentalidad laboral durante el periodo de ejecución 2022

TRABAJADOR	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	OBSERVACIONES
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NO SE PRESENTARON ACCIDENTES PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN**

6.4 Atención Al Ciudadano

Durante el periodo de ejecución, no se recepcionaron quejas los ciudadanos del barrio Las lajas.

6.5 Evidencias y Registro fotográfico:

 **ENTREGA DE EPP**	 **ENTREGA DE EPP**
 **PAUSAS ACTIVAS**	 **PAUSAS ACTIVAS**
 **ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO**	 **ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO**

6.6 Conclusión

Civideportes consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del desarrollo económico y social, ha determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el objeto de gestionar y controlar sus peligros, que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial y la legislación en seguridad y salud en el trabajo vigente.

De tal manera, la empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la salud de las personas. Con la implementación del Sistema de Gestión busca mejorar sus resultados económicos y alcanzar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar un alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, obtendrá factores que conduzcan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.

7. CONDICIONES LEGALES

7.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA (RELACIONAR SUS FECHAS POLIZAS

NUMERO DE POLIZA	AMPAROS	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
37-44-101038862	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 12.759.730,20
37-44-101038862	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/07/2022	01/06/2022	01/10/2025	$ 6.379.865,10
37-44-101038862	ESTABIIDAD Y CALIDAD DE OBRA	18/07/2022	01/09/2022	01/09/2027	$ 25.519.460,40
37-44-101038862	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 25.519.460,40
37-40-101023020	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/07/2022	01/06/2022	03/04/2023	$ 200.000.000,00


CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS

REGISTRO FOTOGRAFICO


- EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M- RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE




- IMPRIMACION CON BASE RESURFACER

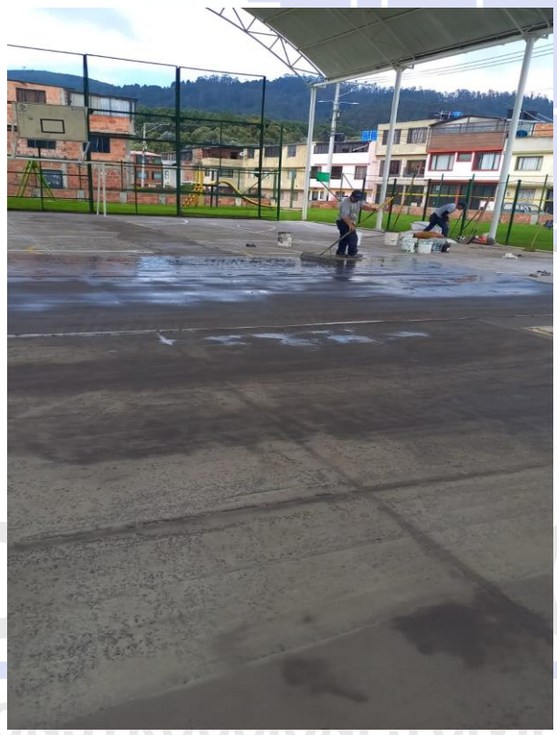


- SISTEMA MEMBRANA POLIPROPILENO

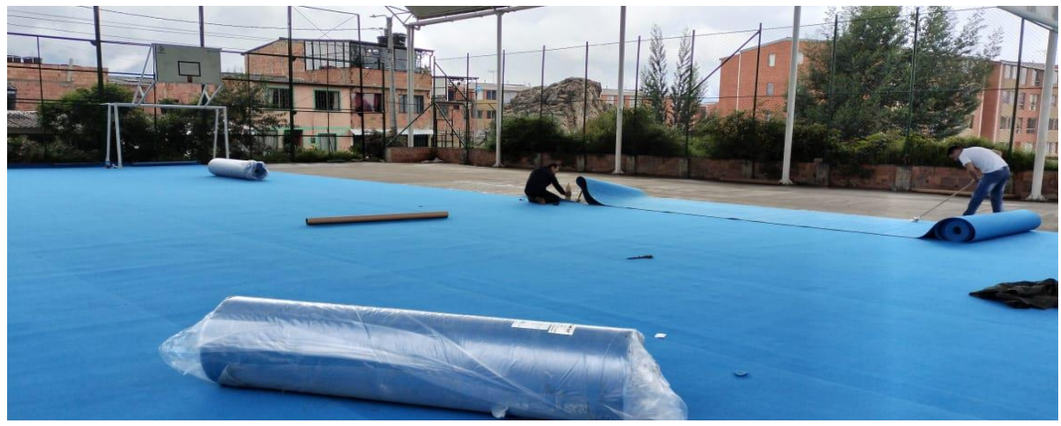








- CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")

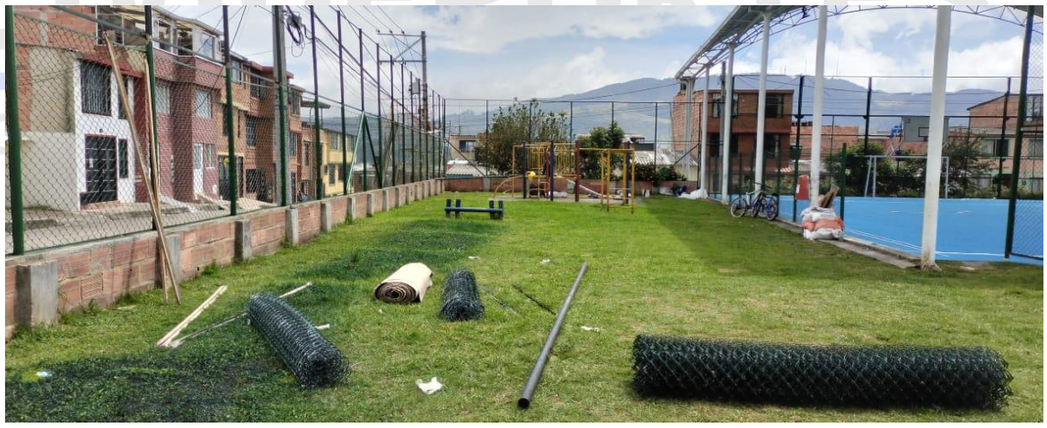



- MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL Y SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR





ESTE INFORME ES PRESENTADO POR:

DIRECTOR DE OBRA: ALVARO GABRIEL AREVALO

RESIDENTE DE OBRA: OLIVERIO GOMEZ RIOS

CIVIDEPORTES®
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS
