INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 de 03 DE OCTUBRE 2022

LAPSO del 03/09/2022 al 03/10/2022

CONTRATO	:	073-ARC-CBNL02-2022
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VENTURA
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 de noviembre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/a
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ARQUITECTO.
SUPERVISOR INICIAL	:	ENDER LEAL RODRIGUEZ
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Buenaventura, Base Naval ARC "Málaga", a los tres (03) días del mes de octubre de Dos Mil Veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO 073-ARC-CBNL02-2022_suscrito con la empresa consorcio ventura empresa. NIT. 901.550.907-2, representada legalmente por la sr. María José herrera guzmán y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICION EN VALOR	N/A	ADICION EN VALOR	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO.	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)	N/A	N/A	$ 619.929.221,50

---

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 21-44-101388547 DE FECHA 21-07-2022 No. 21-40-101192284 DE FECHA 21-07-2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. 26/07/2022

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		26/07/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		26/07/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		26/07/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		26/07/2022	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI		26/07/2022	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$205.858.125	93222	2022-09-20	304908722	2022-09-27	$ 46.985.897,00	$414.071.096,50	33%
			93122	2022-09-20	304993422	2022-09-27	$ 158.872.228,00		

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA	2022	5822 DEL 08 DE ENERO DE 2022	$ 619.929.221,50	N/A	N/A	N/A	No. 58422 de fecha 26 de JULIO del 2022	$ 619.929.221,50	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONE
			Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
2022	OBRA	**619.929.221,50**	6/09/2022 CVE-10 NC-7 19/09/2022	$24.384.311,05 $-1.05	01 19/09/2022	$414.071.096,50	19/09/2022 5002957933	$196.331.589	N/A
			6/09/2022 CVE-11 NC-5 19/09/2022	$54.623.974.77 $-0.77			19/09/2022 5002957944	$9.526.536	
			6/09/2022 CVE-12 NC-8 19/09/2022	$5.923.421,06 $-0.06					
			6/09/2022 CVE-13 NC-6 19/09/2022	$9.249.242.03 $-0.03					
			6/09/2022 CVE-14 NC-4 19/09/2022	$94.999.012.40 $-0.04					
			6/09/2022 CVE-15 ND-1 19/09/2022	$16.678.165.55 $0.45					

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se adjunta formato de memoria de cálculos relacionando los ítems contractuales entregados y recibidos a satisfacción

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AVANCE:

CAMARA DE OFICIALES

2,8	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS									
2.8.1	Suministro e instalacion de TUBERIA COBRE L 1/2" para gas propano Se utilizará tubería rígida y accesorios cobre extremo liso. Incluye accesorios abrazaderas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	12,00	41.903,81	$	502.845,76	0,00	$-	0,00	$-
2.8.2	Ejecución de losa maciza de contrapiso en concreto reforzado de (1,60 m * 1 m) E= 0,15 m, sobre una base de relleno B-200 de 18 cm	M2	1,20	349.821,98	$	419.786,38	2,08	$727.630	2,08	$727.630
2.8.3	Muro en bloque N° 4 estriado, e= 0,10 cm incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	13,20	66.593,38	$	879.032,61	9,13	$607.731	9,13	$607.731
2.8.4	Columnetas en concreto sección 12x15 cm o menor, para confinamiento de muros F'C= 3000 PSI incluye anclajes perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y fleyes cada 0,2 m	M3	1,92	808.144,89	$	1.551.638,16	0,31	$252.141	0,31	$252.141
2.8.5	viguetas en concreto sección 12X20 cm o menor, F'C= 3000 PSI, para confinamiento de la mampostería en bloque hueco. Incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye [illegible]	M3	0,11	831.622,25	$	91.478,45	0,09	$74.846	0,09	$74.846
2.8.6	Dintel en concreto de 3000PSI. Dimensiones 0.20X0.15m. Estas vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos, pueden hacerse prefabricadas o fundidas en sitio	M3	0,03	745.476,25	$	22.364,29	0,03	$22.364	0,03	$22.364
2.8.7	Aplicación de Pañete impermeabilizado proporción 1:3, e=1,5 cm Incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad	M2	26,40	46.124,12	$	1.217.676,77	15,24	$702.932	15,24	$702.932
2.8.8	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura sobre pañete	M2	17,50	29.407,49	$	514.631,13	0,00	$-	0,00	$-
2.8.9	Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de F'C=3500 PSI, h=15 cm, incluye refuerzo en acero de 60.000Psi herramientas y materiales necesarios para su correcta ejecución y	M2	1,44	792.711,57	$	1.141.504,66	1,60	$1.268.339	1,60	$1.268.339

2,12	PASARELAS			0,00		0,00	$-		0,00	$-
2.12.1	Desmonte de cubierta en láminas de policarbonato alveolar altura de la cubierta 2.1 m incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	0,00	39.640,25	$	-	68,95	$2.733.195	68,95	$2.733.195
2.12.2	Suministro e instalacion de cubierta de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con ancho útil de 2.10m. Deberá ser instalado sobre una estructura metálica en forma de arco. Debe ser instalado con conectores de policarbonato, perfiles en U y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalada a una altura máxima de 2,1 mt. Incluye caballetes, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial requerida para la	M2	85,00	181.591,28	$	15.435.258,58	68,95	$12.520.719	68,95	$12.520.719
					COSTOS DIRECTOS	$	103.188.068,25		$ 18.909.896		$ 18.909.896
				ADMINISTRACIÓN	21%	$	21.669.494,33		$ 3.971.078		$ 3.971.078
				IMPREVISTOS	2%	$	2.063.761,36		$ 378.198		$ 378.198
				UTILIDAD	5%	$	5.159.403,41		$ 945.495		$ 945.495
				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	980.286,65		$ 179.644		$ 179.644
					VALOR TOTAL	$	133.061.014,00		$ 24.384.311		$ 24.384.311

MIRADOR YUBARTA

PROYECTO	MIRADOR YUBARTA									
CUIDAD	BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA									
ITEM										
2.14	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
2.14.1	Desmonte y retiro de carpa tipo membrana , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	108	$ 41.202,29	$ 4.449.847,49	100,00	$4.120.229	100,00	$4.120.229
2.14.2	Suministro e instalacion de membrana impermeable PES-PVC (fibra Poliéster recubierto en PVC) de 5 aristas. Deberá contar con un acabado superficial en base a PVDF o a Tio2 (Dióxido de Titanio), el cual permite una mayor duración del color blanco en el tiempo. La confección de la membrana se hará por medio de Electrofrecuencia, con un ancho mínimo de sellado de 40mm. Los bolsillos de borde serán ejecutados con membrana y selladosa través de Electrofrecuencia	M2	108	$ 360.110,86	$ 38.891.972,38	100,00	$36.011.086	100,00	$36.011.086
2.14.3	Suministro e instalacion de guaya de acero inoxidable de 3/8", incluye prensacables de trabajo pesado de 3/8"	M	20	$ 54.041,88	$ 1.080.837,69	20,00	$1.080.838	20,00	$1.080.838
2.14.4	Suministro e instalacion de guaya de acero inoxidable de 3/8", incluye prensacables de trabajo pesado de 1/2"	M	20	$ 73.975,18	$ 1.479.503,67	20,00	$1.479.504	20,00	$1.479.504
				COSTOS DIRECTOS	$ 45.902.161,23		$ 42.691.656		$ 42.691.656
				ADMINISTRACIÓN 21%	$ 9.639.453,86		$ 8.965.248		$ 8.965.248
				IMPREVISTOS 1%	$ 459.021,61		$ 426.917		$ 426.917
				UTILIDAD 5%	$ 2.295.108,06		$ 2.134.583		$ 2.134.583
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 436.070,53		$ 405.571		$ 405.571
				VALOR TOTAL	$ 58.731.815,30		$ 54.623.974		$ 54.623.974

VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02

PROYECTO	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02								
CUIDAD	Bahia Malaga, Buenaventura								
2,17	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
2.17.1	Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 100 cm x 40 cm, 1 fija y 1 corredera incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventanería averiada	UN	9,00	$ 272.322,40	$ 2.450.901,60	9,00	$ 2.450.901,60	9,00	$ 2.450.901,60
2.17.2	Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 400 cm x 40 cm, 1 fija de 2 m y 2 correderas de 1 m cada una. Incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventanería averiada	UN	2,00	$ 1.089.289,60	$ 2.178.579,20	2,00	$ 2.178.579,20	2,00	$ 2.178.579,20
				COSTOS DIRECTOS	$ 4.629.480,80		$ 4.629.480,80		$ 4.629.480,80
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 925.896,16		$ 925.896,16		$ 925.896,16
				IMPREVISTOS 2%	$ 92.589,62		$ 92.589,62		$ 92.589,62
				UTILIDAD 5%	$ 231.474,04		$ 231.474,04		$ 231.474,04
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 43.980,07		$ 43.980,07		$ 43.980,07
				VALOR TOTAL	$ 5.923.420,68		$ 5.923.420,68		$ 5.923.420,68

RED HIDRÁULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA

PROYECTO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA									
CUIDAD	Bahia Málaga, Buenaventura									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
2,2	PRELIMINARES								
2.21.1	Localización, trazado y replanteo topográfico	ML	46,80	$ 11.908,32	$ 557.309,29	44,20	$ 526.348	44,2	$ 526.348
2.21.2	Excavación manual en material comun ancho 0,7 m profundidad no mayor a 1,5 m (Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes)	M3	49,14	$ 63.960,69	$ 3.143.028,44	15,06	$ 963.248	15,06	$ 963.248
2.21.3	Desmonte del codo existente, incluye reparación tramo tubería hidráulica PVC presión 6" que pueda verse afectada por el retiro del accesorio	UN	1,00	$ 75.357,32	$ 75.357,32	1,00	$ 75.357	1	$ 75.357
2,22	INSTALACIONES HIDRAULICAS			$ 0,00		0,00	$ -	0	$ -
2.22.1	Suministro e instalación de Tee 6" PVC presión C000	UN	1,00	$ 263.285,45	$ 263.285,45	1,00	$ 263.285	1	$ 263.285
2.22.2	Suministro e instalación de reducción PVC presión 6" a 3"	UN	1,00	$ 186.997,79	$ 186.997,79	2,00	$ 373.995	2	$ 373.995
2.22.3	Suministro e instalación de Base en arena para encamado de tubería, espesor mínimo 10 cm	ML	46,80	$ 44.656,19	$ 2.089.909,49	44,20	$ 1.973.803	44,2	$ 1.973.803
2.22.4	Suministro e instalacion de Tubería pvc unión mecánica diámetro 3" rde 21 incluye accesorios (uniones, codos, tee, tapón, collar derivación, etc)	ML	46,80	$ 39.167,20	$ 1.833.024,82	44,20	$ 1.731.190	44,2	$ 1.731.190
2.22.5	Relleno compactado a maquina con material de sitio según criterio de la interventoria	M3	49,14	$ 96.522,50	$ 4.743.115,46	10,61	$ 1.024.104	10,61	$ 1.024.104
2.22.6	Suministro e instalación válvula bola 3" en bronce (incluye bridas, empaques, tornillería y todos las herramientas y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UN	2,00	$ 241.403,92	$ 482.807,83	1,00	$ 241.404	1	$ 241.404
				COSTOS DIRECTOS	$ 13.374.835,90		$ 7.172.735		$ 7.172.735
				ADMINISTRACIÓN 21%	$ 2.808.715,54		$ 1.506.274		$ 1.506.274
				IMPREVISTOS 2%	$ 267.496,72		$ 143.455		$ 143.455
				UTILIDAD 5%	$ 668.741,79		$ 358.637		$ 358.637
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 127.060,94		$ 68.141		$ 68.141
				VALOR TOTAL	$ 17.246.850,89		$ 9.249.242		$ 9.249.242

MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA

PROYECTO	MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA								
CUIDAD	JUANCHACO - BUENAVENTURA								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
	COMPAÑIA DE SEGURIDAD								
2,30	PRELIMINARES								
2.30.1	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y	M2	477,05	$ 41.876,07	$ 19.976.977,21	473,6	$ 19.832.505	473,6	$ 19.832.505
2,31	CUBIERTA			$ 0,00			$ -		$ -
2.31.1	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (incluye tornilleria larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)	M2	477,05	$ 108.429,10	$ 51.726.103,35	473,6	$ 51.352.023	473,6	$ 51.352.023
2.31.2	Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte topquality Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless Incluye tornilleria y sellado de la misma	ML	52,00	$ 67.207,35	$ 3.494.782,18	37	$ 2.486.672	37	$ 2.486.672
2.31.3	Ejecución de flanches o solapas en lámina galvanizada calibre 26 para evitar el ingreso de agua lluvia por los orificios de la estructura de soporte de la carpa. Incluye sellado con cinta sika multeseal o similar de mejores especificaciones y acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico ref 110070 (incluye catalizador ref 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintetico base aceite Pintulux color verde esmeralda	ML	8,00	$ 55.803,60	$ 446.428,77	0	$ -	0	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 75.644.291,51		$ 73.671.200		$ 73.671.200
				ADMINISTRACIÓN 21%	$ 15.885.301,22		$ 15.470.952		$ 15.470.952
				IMPREVISTOS 2%	$ 1.512.885,83		$ 1.473.424		$ 1.473.424
				UTILIDAD 5%	$ 3.782.214,58		$ 3.683.560		$ 3.683.560
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 718.620,77		$ 699.876		$ 699.876
				VALOR TOTAL	$ 97.543.313,90		$ 94.999.012		$ 94.999.012

COLEGIO NAVAL

COLEGIO NAVAL BNL02
Bahia Malaga, Buenaventura

PROYECTO CUIDAD										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO		CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
	CUBIERTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO									
2,32	CUBIERTA									
2.32.1	Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135 mm x 159,8 mm x 95mm, incluye tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes y todos los elementos equipos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de la actividad retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	121,30	$ 101.227	$ 12.278.827,05	102	$	10.325.147	102	$ 10.325.147
2.32.2	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 4 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 90 mt2 de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico o PVC, unión esquina exterior- interior, incluye amarres, limpiador, lubricante silicona para canales y bajantes, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes, montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a estructura, disposición de residuos en sitio adecuado,y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación	ML	40,00	$ 95.414	$ 3.816.566,15	28,4	$	2.709.762	28,4	$ 2.709.762
				COSTOS DIRECTOS	$ 59.497.646,12		$	13.034.909		$ 13.034.909
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 11.899.529,22		$	2.606.982		$ 2.606.982
				IMPREVISTOS 2%	$ 1.189.952,92		$	260.698		$ 260.698
				UTILIDAD 5%	$ 2.974.882,31		$	651.745		$ 651.745
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 565.227,64		$	123.832		$ 123.832
				VALOR TOTAL	$ 76.127.238,21		$	16.678.166		$ 16.678.166
				COSTO TOTAL LOTE2:	$ 619.929.221,50		$	205.858.126		$ 205.858.126

OBSERVACIONES:

Se anexa la siguiente documentación:

1. Documentos entregables semana 06 (Acta de reunión, Informe semanal de obra, bitacora)
2. Documentos entregables semana 07 (Informe semanal de obra, informe semanal SST, bitácora)
3. Documentos entregables semana 08 (informe semanal de obra, bitácora)
4. Documentos entregables semana 09 (Informe semanal de obra, informe semanal SST, bitacora)

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- **Acorde a cronograma**

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CONSORCIO VENTURA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección

Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en el pago de sus aportes

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 03 de octubre de 2022, suscrito por el Revisor Fiscal de la empresa CONSORCIO VENTURA. en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos de septiembre del 2022, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato 073-ARC-CBNL02-2022, evidenciándose que Existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio_cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).
N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:
N/A

15. REPORTE FINAL:
N/A

Atentamente,

ENDER LEAL RODRIGUEZ
Representante Legal
Firma UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020
Contrato No. 072-ARC-CBNL02-2022

U.T Gecointeg 2020

Buenaventura, Valle del Cauca - 09 de septiembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. SOLICITUD DE APORTES PARAFISCALES
2. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
3. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
4. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
5. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
6. FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
7. FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CUPO PAC

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- SOLICITUD DE APORTES PARAFISCALES:


De acuerdo al contrato N° 073-ARC-CBNL02-2022 la base solicitad planilla de pagos y aportes parafiscales por parte del contratista
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

2- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento van por encima del valor proyectado, llevando un 6.78%
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA
NO. PROCESO	066-ARC-CBNL02-2022
NO. CONTRATO	073-ARC-CBNL02-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
SUPERVISOR	INTERVENTOR GEOINTEC
GERENTE DE PROYECTO	CC BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMAN
FECHA DE INICIO CONTRATO	27/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN POR ADICIÓN	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO	VIGENCIA 2022 $ 619.929.221,50
VALOR ADICIONES	VIGENCIA 2022 N/A

%	02/09/2022	09/09/2022	% AVANCE SEMANAL
% PROGRAMADO	0,89%	0,73%	1,91%
% EJECUTADO	2,82%	3,96%	6,78 %
% Δ	1,93%	3,23%	5,16%

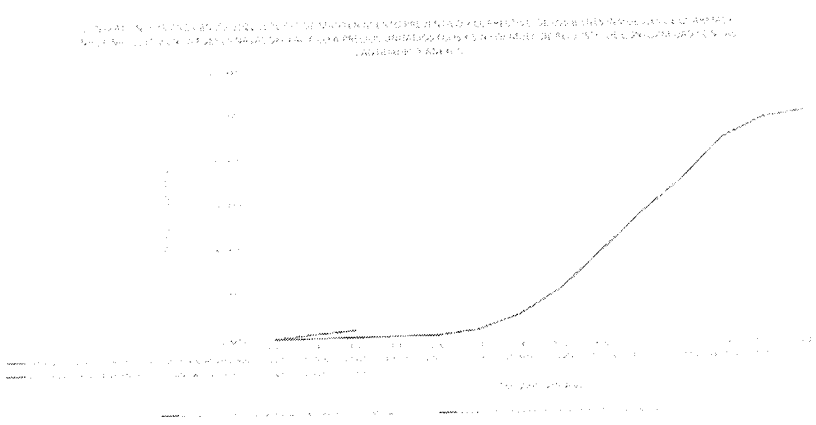

SE CONSTITUYÓ RESERVA?	NO
MONTO TOTAL	$ 0
FACTURADO A FECHA	$ 0
PENDIENTE POR FACTURAR	$ 619.929.221,50

INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 41,67 de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas

OBJETO	INTERVENTORIA JURIDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA
	080-ARC-CBNL02-2022
	072-ARC-CBNL02-2022
	UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020
	TK ANDRES MAURICIO ORTIZ - TK. HENRY ESCOBAR BLANCO
	MY PEDRO ESPITA GOMEZ
	CC BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMAN
	06/07/2022
	06/07/2022
	15/12/2022
	N/A
	VIGENCIA 2022 $282.351.799,80
	VIGENCIA 2022 N/A

%	04/09/2022	11/09/2022	% AVANCE SEMANAL
% PROGRAMADO	37,50%	41,67%	4,17 %
% EJECUTADO	37,50%	41,67%	4,17%
% Δ	0 %	0 %	0 %

SE CONSTITUYÓ RESERVA?	NO
MONTO TOTAL	$ 0
FACTURADO A FECHA	$ 0
PENDIENTE POR FACTURAR	$282.351.799,80

3- REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo (se adjunta soporte en PDF por el contratista)

PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 **SUPERVISOR:** ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA


CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

INFORMACIÓN	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/09/2022
ACTIVIDADES - GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento


VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	EJECUTIVO (A) DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO	x		06/08/2022	AS12 GINA MARCELA HERRERA CÓRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"
INFORME DE SUPERVISIÓN	x		06/08/2022	

PORCENTAJE DE AVANCE - EN PAGOS



PORCENTAJE DE AVANCE - RECEPCION BIENES O SERVICIOS



Protegemos el azul de la bandera

4- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:


De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura solicitud de una bitácora de obra en físico sobre las actividades de obra por día que se estén ejecutado la cual será revisada y se le dará visto bueno y después firmado, esta bitácora de obra llevará sus respectivas especificaciones, nombre de actividad, ítem y una descripción

También se pedirá un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)


5- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana, la cual se le hace seguimiento en porcentajes de ejecución
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

RED HIDRÁULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS 81.3% DE AVANCE DE EJECUCIÓN

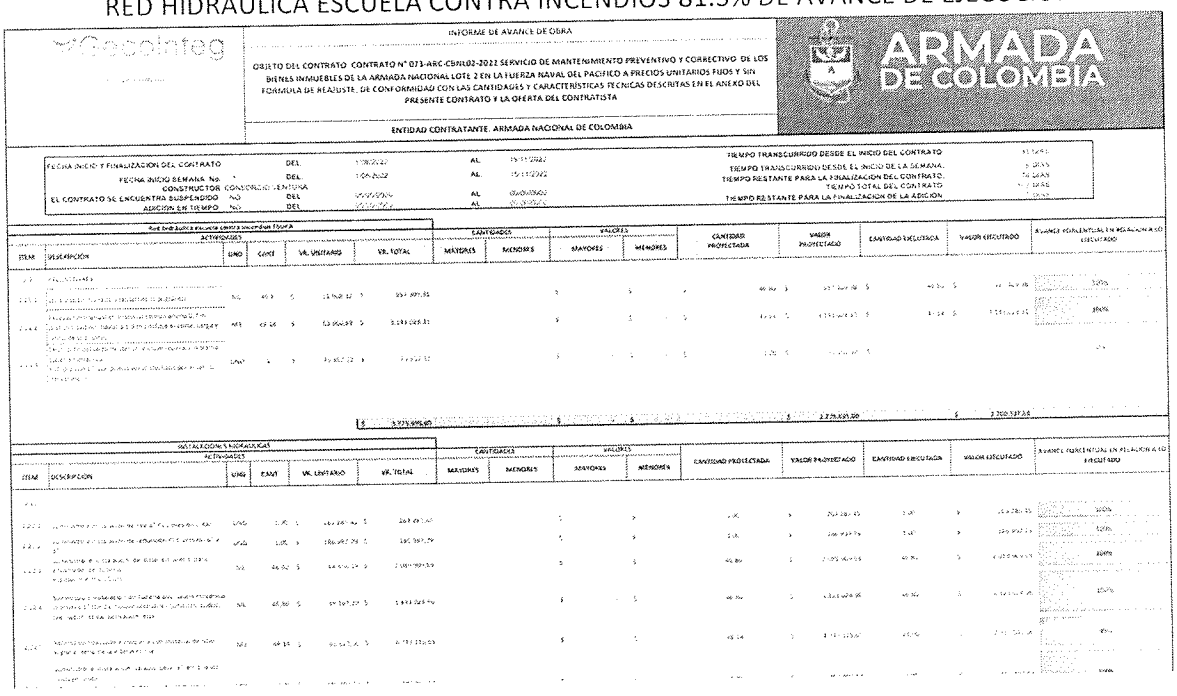

CAMOF 3.96% DE AVANCE DE EJECUCIÓN

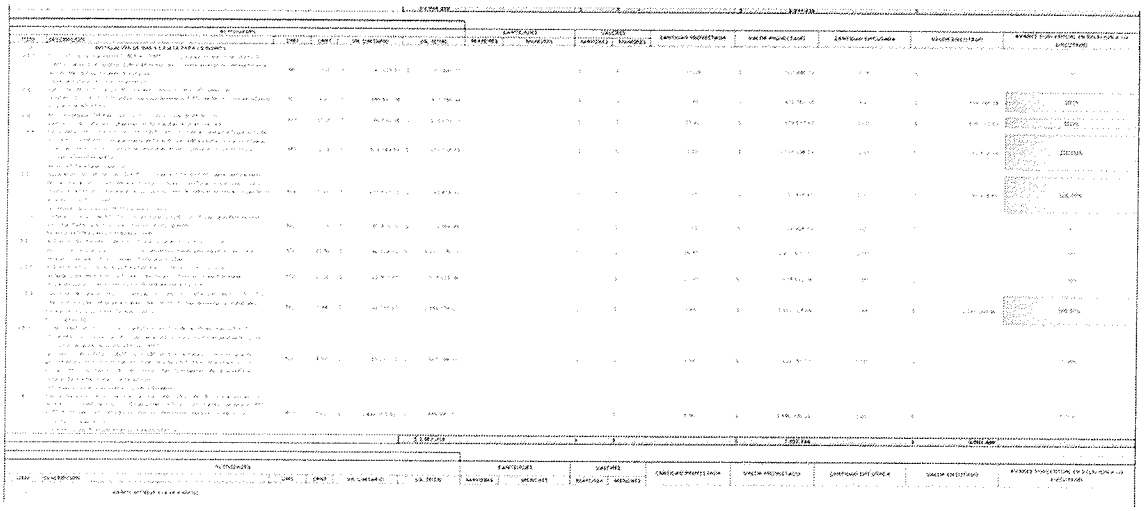

6- FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

Se adjunta archivo en pdf con sus respectivas firmas por parte del contratista y de interventoría

ARMADA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ARMADA NACIONAL	
	Proceso: Telemática	**Autoridad:** JOLA
Código: TELM-FT-027-JOLA-V02	**Rige a partir de:** 22/02/2018	Página 1 de 4


Para desarrollar el CONTRATO No. 072-ARC-CBNL02-2022 de fecha TREINTA (30) de junio de 2022, con la firma **UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO**

Entre los suscritos, de una parte, la Armada Nacional – BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", quien actúa a través de su representante legal o delegado, y por la otra, la empresa **UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020**, sociedad comercial domiciliada en CALLE 7 N° 25B – 04- Tuluá – Valle del Cauca, representada por ENDER LEAL RODRÍGUEZ representante legal, mayor de edad, identificado con C.C. No 94.152.401, expedida en Tuluá – Valle, han celebrado el presente **ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**:

CONSIDERANDO:

7- FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CUPO PAC :

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo de Excel
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos para el Presupuesto General la Nación con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago. ingresos y gastos

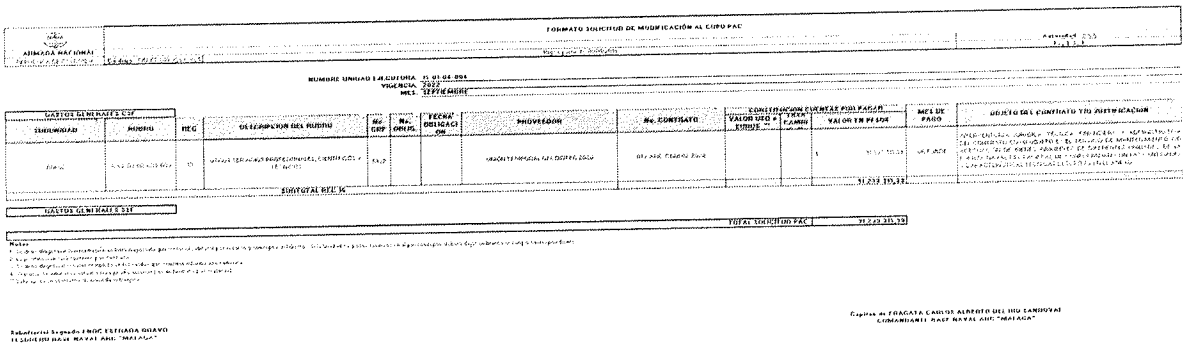

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CUPO PAC

ARMADA NACIONAL

NUMBRE UNIDAD EJECUTORA 31 01 04 004
VIGENCIA 2022
MES SEPTIEMBRE

GASTOS GENERALES SIIF													
SUBUNIDAD	RUBRO	REC	DESCRIPCION DEL RUBRO	No. CDP	No. ORUG.	FECHA OBLIGACION	PROVEEDOR	No. CONTRATO	CONFIRMACION EVENTAS POR PAGAR VALOR SIIF + / RESTA / SUMA		VALOR TRIMESTRE	MES DE PAGO	OBJETO DEL CONTRATO Y/O JUSTIFICACION
[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL RTE 10											$1.233.333,33		
GASTOS GENERALES SIIF													
TOTAL SOLICITUD PAC											$1.233.333,33		

Nota:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

Teniente de Fragata CARLOS ALBERTO DEL RIO SANDOVAL
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "MALAGA"

Subteniente Segundo ENOC ESTRADA OSAVO
ASISTENTE BASE NAVAL ARC "MALAGA"

ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN		
	Documento Institucional		**Autoridad:** JPLAN
	Código: ARC-FT-001-JPLAN-V08	**Rige a partir de**: 26/04/2021	**Página:** 1 de 3

ACTA No. 04 Comité de interventoría

FECHA: viernes 09 SEPT de 2022 **HORA INICIO:** 1400R **HORA TERMINO:** 14:30R

DEPENDENCIA: Oficina de Arquitectura e Ingeniería BN2

LÍDER DE LA REUNIÓN: yolian David lopez arias

PARTICIPAN:

DEPENDENCIA	GRADO	NOMBRE	FIRMA
OIARQ	TK	ANDRES ORTIZ ACOSTA (Supervisor del Contrato)	
CONTRATISTA		MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN (Rep. Consorcioventura)	
CONTRATISTA		LUIS HERRERA GUZMÁN (Residente obra Consorcioventura)	
CONTRATISTA		DANELLY RODRÍGUEZ (SISO)	
INTERVENTORÍA		ENDER LEAL RODRÍGUEZ (Rep.UT Gecointeg 2020)	
INTERVENTORÍA		YOLIAN LÓPEZ (Residente Interventoría)	
INTERVENTORÍA		GLADYS VALLECILLA (Residente Interventoría)	

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

REUNIÓN PRELIMINAR PARA EL INICIO DE LA OBRA E INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Una vez abordados todos los temas y compromisos, las partes acuerdan dar cumplimiento a todo lo pactado en lapresente reunión, en las fechas establecidas.

Se enfatiza en el apoyo de las partes interesadas para el correcto desarrollo de la obra y su culminación a felizTermino

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Se abordan los siguientes temas con relación a la ejecución del contrato, así:

1. El Alcance del contrato. (TK ORTIZ – Supervisor), se efectúa una descripción amplia de los sitios a intervenir, se realiza una charla con relación al área de trabajo y ubicación correspondiente a las actividades que se desarrollaran de los mantenimientos, así como mecanismos de acceso a la unidad, transporte de personal y material.

2. Presentación del cronograma de contrato. (CONSORCIO VENTURA – UT Gecointeg 2020), se presenta por parte del Contrista Programación de Obra, la cual ya había sido solicitada, el interventor hace énfasis en el ajuste de las fechas de inicio y terminación de actividades, así como la ruta crítica de la programación, con ocasión al proceso de compra y transporte de material, el CONSORCIO VENTURA indica la necesidad e iniciar por las cubiertas de GANPA, se programa para la próxima semana visita a los sitios de trabajo, previa entrega de estudios de seguridad y tramites de ingreso a la Unidad Militar.

3. Puntos de control del contrato. (TK ORTIZ - UT Gecointeg 2020) El Supervisor enfatiza en la entrega oportuna de los reportes diarios de actividades ejecutadas, así como el informe semanal de avance de obra y el informe de seguridad y salud en el trabajo SST, los cuales son insumos vitales para la elaboración de las actas parciales mensuales e informes de supervisión, y así poder llevar un adecuado control de la obra.

4. Criterios de aceptación del contrato. (TK ORTIZ - UT Gecointeg 2020), como requisito se debe evaluar la entrega de factura electrónica, la cual debe llevar los VoBo, tanto de la interventoría como de la supervisión. Los mismos recalcan que no se hacen responsables por entregas parciales de documentos o incompletos que puedan retrasar el trámite de pago.

5. Instructivos de trabajo. (UT Gecointeg 2020). En relación a este punto, se enfatiza que como criterio principal para el desarrollo de las actividades se deben consultar las especificaciones técnicas constructivas de la obra, las cuales hacen parte integral del contrato, adicional de normas internacionales y nacionales cuando se presenten dudas en la ejecución.

6. Competencia de los trabajadores. (UT Gecointeg 2020). El contratista efectuará la entrega de los documentos de los profesionales a laborar en la obra, dando estricto cumplimiento en los perfiles requeridos, así como en su experiencia.

7. Riesgos del contrato. (TK ORTIZ - UT Gecointeg 2020). Los riegos actuales están asociados al COVID-19 por su riesgo de contacto lo que llevaría a una posible suspensión de actividades y atraso de la obra, por ello se enfatiza en seguimiento estricto del protocolo de bioseguridad a entregar por el contratista

8. Comunicaciones. (CONSORCIO VENTURA - UT Gecointeg 2020). Como medios de comunicación se aclara que serían entonces los medios oficiales el correo electrónico a través de oficios y el celular y WhatsApp como medios informales.

4. TAREAS A REALIZAR:	RESPONSABLE	PLAZO
Solicitud de certificados curso en alturas obreros	Consorcio ventura	15-sept-2022
Solicitud de certificados curso de coordinador en alturas siso	Consorcio ventura	15-sept-2022
Implementación de herramientas a delimitar zona de trabajo (colombinas)	Consorcio ventura	12-sept-2022

Autentica,

Teniente de Corbeta, ANDRES MAURICIO ORTIZ ACOSTA
Supervisor Contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022


INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	RED CONTRA INCENDIOS Y CAMARA DE OFICIALES	Código	
		Version	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA	05/09/2022 AL 9/09/22
CONTRATO No	073 -ARC-CRNL02-2022
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR	U.T. GECOINTEG 2020
LOCALIZACION DE LA OBRA	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA	15 NOVIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO	CAMARA DE OFICIALES, RED CONTRAINCENDIOS, COLEGIO NAVAL


ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022


5 de SEPTIEMBRE DE 2022




6 DE SEPTIEMBRE DE 2022




7 DE SEPTIEMBRE DE 2022



8 DE SEPTIEMBRE DE 2022



9 DE SEPTIEMBRE DE 2022



PROCESO DE EJECUCION:Se realiza El armado e instalacion del acero en columnetas, con dos varillas de 1/2" y de flejes uns S cada 15 cm, se levantan muros en mamposteria por los tres lados , se funden las columnetas se arma parrilla para la losa de cubierta la cual se funde en concreto de 3000 psi. Se monta el buje de 3x2"en red contraincendios..Se realiza cerramiento para poder intervenir las canales del colegio naval Se instalala cubierta en policarbonato en pasarella de oficiales,instalacion de canales en el colegio.

REALIZO	REVISO Y APROBO
Nombre y firma Ing Residente de Obra	Nombre y firma ARQ Residente de Interventoria
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	JOLIAN DAVID LOPEZ ARIAS

Buenaventura, Valle del Cauca - 16 de septiembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA


De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
5. ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA CIVIL
6. MEMORIA DE CÁLCULO Y CUANTÍAS


REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento van por encima del valor proyectado 3.22%, llevando un 16.44% de ejecución real (se adjunta soporte en PDF por el contratista)

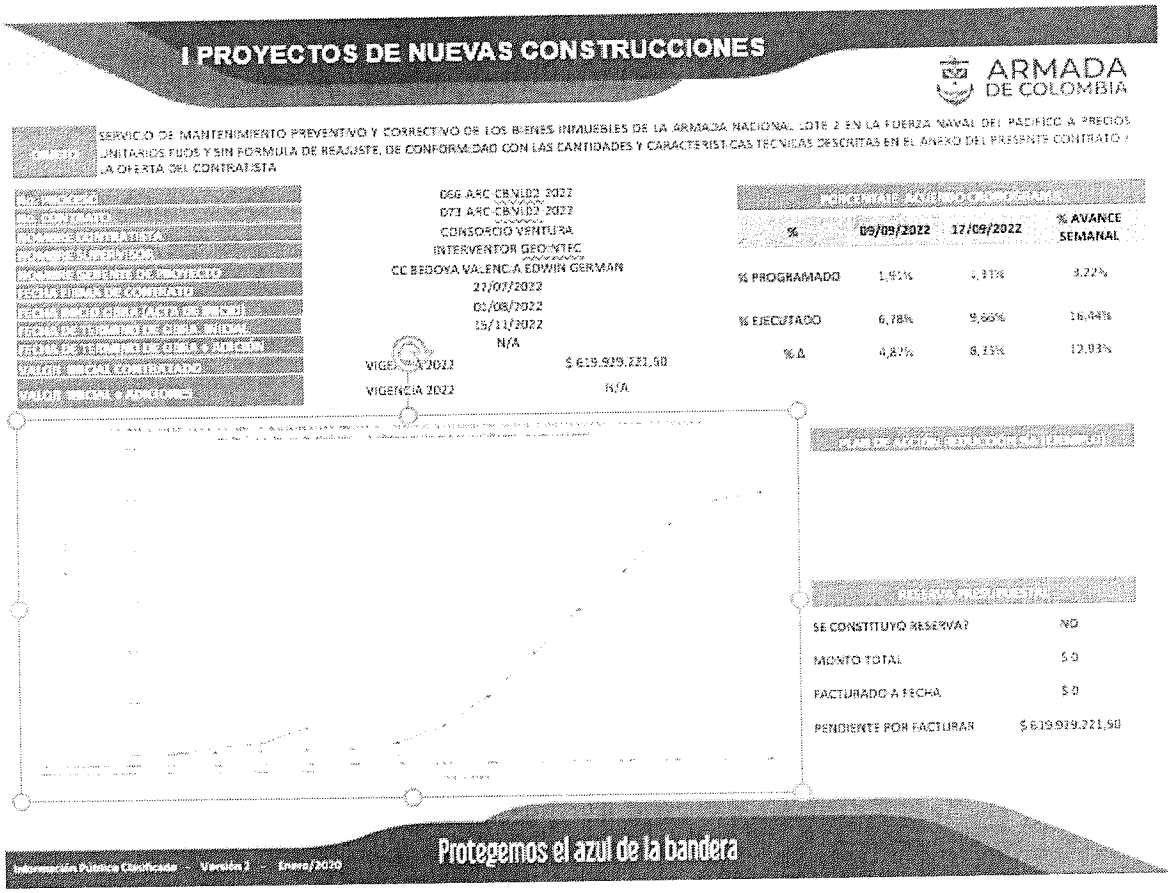

INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 45,83 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas

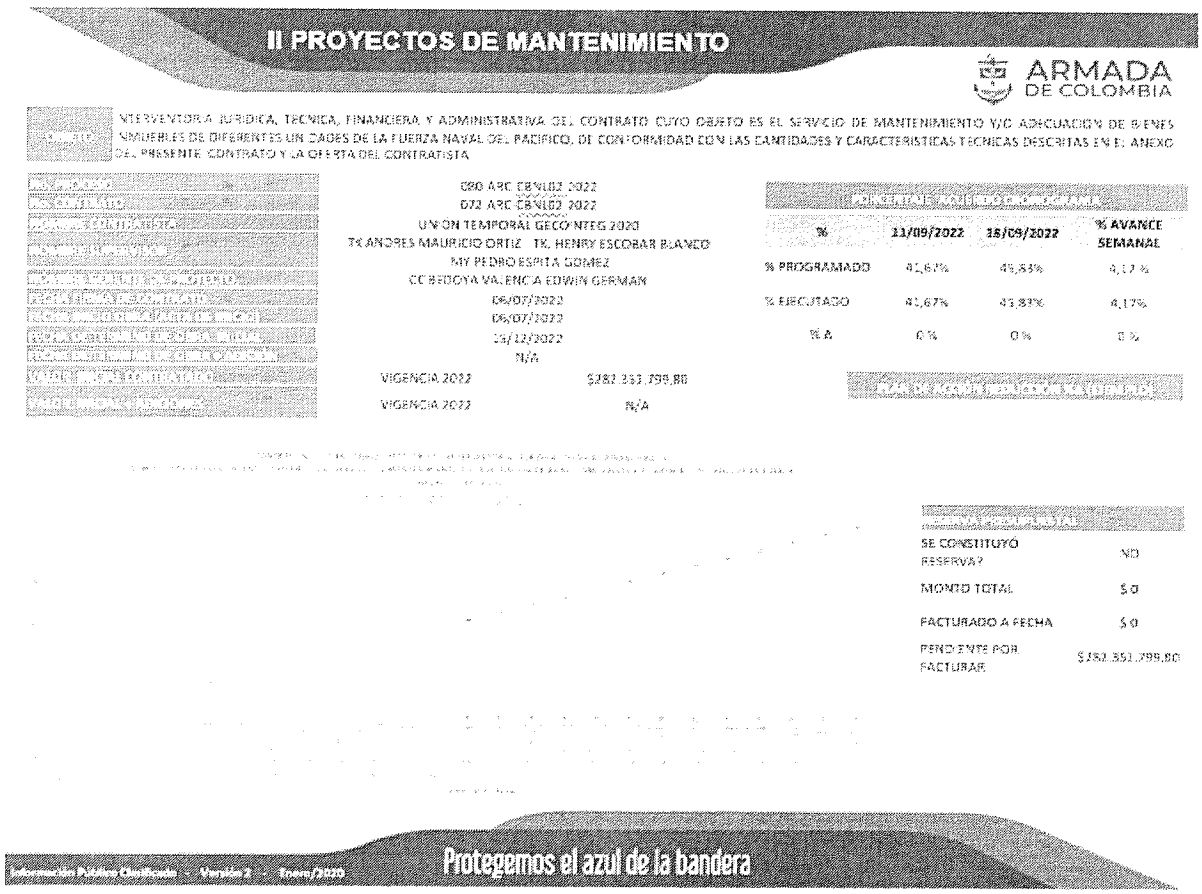

2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo (se adjunta soporte en PDF por el contratista)



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

4- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana, la cual se le hace seguimiento en porcentajes de ejecución (se adjunta soporte en PDF por el contratista)

- RED HIDRÁULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS **100%** DE AVANCE DE EJECUCIÓN
- CAMOF **3.96%** DE AVANCE DE EJECUCIÓN
- COLEGIO NAVAL **20.41%** DE AVANCE DE EJECUCIÓN
- GRUPO AERO NAVAL DEL PACIFICO GANPA **46%** DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5- ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA CIVIL

Se adjunta archivo en pdf con sus respectivos soportes por parte de interventoría relacionando acta de corte parcial soportando los valores en cuantía correspondientes al porcentaje de avance ejecutado real hasta la fecha

Acta de recepción parcial del contratista

COMPONENTE	RUBRO	REC - SIT	ASIGNACIÓN LOTE 2	ACTA 001	SALDO
GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-02-005-004	10 CSF	$ 97.543.313,90	$ 94.999.012	$ 2.544.301,90
COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA	A-02-02-02-005-004	16 SSF	$ 76.127.238,21	$ 16.678.166	$ 59.449.072,21
BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-02-005-004	10 CSF	$ 100.939.343,83	$ 54.623.974	$ 46.315.369,83
BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-02-005-004	16 SSF	$ 237.914.319,00	$ 30.307.731	$ 207.606.588,00
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACÍFICO	A-02-02-02-005-004	10 CSF	$ 90.158.155,67	$ 0	$ 90.158.155,67
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-02-005-004	10 CSF	$ 17.246.850,89	$ 9.249.242	$ 7.997.608,89
TOTAL			$ 619.929.221,50	$205.858.125	$ 414.071.096,50

6- MEMORIA DE CÁLCULO Y CUANTÍAS

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se relaciona las cantidades propuestas por la base ARC Málaga comparadas con actividades de obra ejecutadas, la cual se le hace su respectiva memoria de cálculo por ítem

2,8	**INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS**									
2.8.1	Suministro e instalacion de TUBERIA COBRE L ½" para gas propano. Se utilizará tubería rígida y accesorios cobre extremo liso. Incluye accesorios abrazaderas y demás elementos necesarios para su	ML	12,00	41.903,81	$ 502.845,75	0,00	$-	0,00	$-
2.8.2	Ejecución de losa maciza de contrapiso en concreto reforzado de (1,60 m * 1 m) E= 0,15 m, sobre una base de relleno B-200 de 18 cm.	M2	1,20	343.821,98	$ 419.786,38	2,08	$727.630	2,08	$727.630
2.8.3	Muro en bloque N° 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	13,20	66.593,38	$ 879.032,61	9,13	$607.731	9,13	$607.731
2.8.4	Columnetas en concreto sección 12x15 cm o menor, para confinamiento de muros F'C= 3000 PSI incluye anclajes perforacion y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero	M3	1,92	808.144,99	$ 1.551.638,18	0,31	$252.141	0,31	$252.141
2.8.5	vigueta en concreto sección 12X20 cm o menor, F'C= 3000 PSI, para confinamiento de la mamposteria en bloque hueco incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye	M3	0,11	831.622,25	$ 91.478,45	0,09	$74.846	0,09	$74.846
2.8.6	Dintel en concreto de 3000PSI Dimensiones 0.20X0.15m. Estas vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos, pueden	M3	0,03	745.476,25	$ 22.364,29	0,03	$22.364	0,03	$22.364
2.8.7	Aplicación de Pañete impermeabilizado proporción 1:3, e=1,5 cm. Incluye filos,dilataciones, aditivos, herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la	M2	26,40	46.124,12	$ 1.217.676,77	15,24	$702.932	15,24	$702.932
2.8.8	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y	M2	17,50	29.407,49	$ 514.631,13	0,00	$-	0,00	$-
2.8.9	Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de F'C= 3500 PSI, h=15 cm, incluye refuerzo en acero de 60.000Psi herramientas y materiales necesarios para su	M2	1,44	792.711,57	$ 1.141.504,66	1,60	$1.268.339	1,60	$1.268.339


Cantidades propuestas por la base

Cantidades ejecutadas reales

MEMORIA DE CALCULOS

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	5	22	OBRA	ARC MALAGA		CORTE No.		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 825-ARC-CPNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO							
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		NIT	901558387-2	No. CONTRATO	825 ARC-CPNL02-2022			
INTERVENTORI	UT GECOINTEG 202		NIT		No. CONTRATO	72 ARC-CPNL02-2022			
CAPITULO	Red hidrosanitaria general muelle Inmediaciones PSNPA	ITEM	2.24.1 Localización, trazado y replanteo topográficos				UNIDAD	ML	



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidrosanitaria general muelle Inmediaciones PSNPA	3,8	1		1,000	3,80000
	1,4			1,0	1,40000
	42			1	42,00000

ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

CONSORCIO
VENTURA

INFORME SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Elaboró:

Esp. Danelly Rodríguez González

Profesional en Seguridad & SST

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Consorcio Ventura

Contrato de Obra No. 073-ARC-CBNL02-2022.

Buenaventura, Málaga – 15 de septiembre de 2022

I. OBJETIVOS

Objetivo General de la semana del, 12 al l15 de septiembre

Velar por la seguridad y salud de los trabajadores que se encuentran en el proceso de intervención de los frentes adjudicados en el Contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el fin de garantizar que las actividades que realizan están sujetas a las condiciones físicas, mentales y psíquicas de cada uno del personal contratado para la realización de estas intervenciones, realizando mejora continua de las actividades desarrolladas en la semana inmediatamente anterior.

Objetivos Específicos

- Velar por culminar en un porcentaje alto, las actividades que se iniciaron en la semana inmediatamente anterior.
- Continuar con la fomentación de conciencia en los trabajadores sobre el **AUTOCUIDADO** para que la realización de sus tareas diarias se maneje en forma segura.

II. ALCANCE

El alcance de este informe es para *apoyar la planificación y ejecución* de las actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la Armada Nacional, LOTE 2 en la Fuerza Naval del Pacifico, a precios unitarios fijos y sin fórmula de reajuste, de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas, en el contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el cual se pretende evidenciar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigilando y realizando el seguimiento que garantice el cumplimiento de este, junto con la implementación de todas las medidas previstas en el PAPSO, y prevenir posibles contagios por COVID-19, protegiendo la salud de los trabajadores y el entorno.

III. INTRODUCCION

En la presente semana, se evidencian actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra 073-ARC-CBNL02-2022, durante el período del, 12 al 15 de septiembre de 2022, y se adjuntan los documentos correspondientes a las actividades desarrolladas.

Que, dentro de las actividades a realizar en la presente semana están:

MES	N. TRABAJADORES	H.H.T	N. ATS	N. CHARLAS DE SEGURIAD	N. PAUSAS ACTIVAS	N. INPECCIONES HERRAMIENTAS	N. INSPECCIONES BOTIQUIN	N. INSPECCION OBRA	N. INSPECCION EXTINTOR	N. SEÑALIZACIONES EN OBRA
AGOSTO	8	1.920	6	6	6	3	1	1	1	3
SEPTIEMBRE	9	772	0	14	14	0	1	1	0	2
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DICCIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMEDIO	*17*	*2.692*	6	20	20	3	2	2	1	5

1. "Ingreso a la Base Militar ARC-Málaga. En cumplimiento con los Protocolos de Bioseguridad" para evitar contagio COVID-19 u otras enfermedades de tipo viral, se continúa con el mismo procedimiento para ingresar a las instalaciones de la ARC-Bahía Málaga.

Cada día, compuesto por un horario de trabajo laboral de (8 horas), desde las 07:00 a las 17:00 horas, incluida la hora del almuerzo y los tiempos de descanso; el personal contratado inicia sus actividades de la siguiente manera:

1.1. Ingreso a la base militar ARC-Málaga.
1.2. Pasa por los protocolos de seguridad establecidos por la entidad contratante.
1.3. Lavado de manos (gel antibacterial)
1.4. Registro para ingreso a la base militar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS



2. Capacitación – 5 minutos de la semana.

Después de realizar los protocolos de ingreso correspondiente, el personal es dirigido a las áreas de trabajo a intervenir, según indicaciones del ingeniero residente y el maestro de obra previamente. Ubicados allí, se procede a realizar capacitación de mínimo 5 minutos, donde se informa al personal sobre los riesgos y peligros que pueden ocurrir en la zona de trabajo a intervenir en ese día, realizando los análisis de trabajo seguro correspondientes a la actividad que se va a realizar – día.

Las actividades de pausas activas se realizan al inicio y/o al final de la capacitación, dependiendo del día.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PAUSAS ACTIVAS



Dentro de los temas tratados en las charlas de esta semana del, 12 al 15 de septiembre, fueron:

09-sept.-2022. Conductas seguras en el trabajo
12-sept.-2022. Peligros y Riesgos... Afectaciones
13-sept.-2022. La importancia de saber Escuchar para mitigar riesgos
14-sept.-2022. -- *No Hubo actividades por este día. Motivo: Fuertes lluvias*
15-sept.-2022. Accidente de Trabajo
16-sept.-2022. Conductas de Seguridad y responsabilidades

3. Inspecciones

Se realiza inspección de Orden y Aseo en cada uno de los frentes intervenidos. Inspección a herramientas y maquinaria a utilizar durante el día. Inspección de Peligros en el área o zona de trabajo. Inspección de Botiquín.

4. Actividades De Seguridad y Salud en la Obra

4.1. Dentro de las actividades de seguridad y salud, se encuentran, Registro en evidencia fotográfica de condiciones y actos inseguros, los cuales son identificados durante el paso por cada uno de los frentes, recordando la forma segura de realizar la tarea.

4.2. Realizar Inspección de las áreas de trabajo, con el fin de realizar el cerramiento correspondiente en el sitio a intervenir, a fin de mitigar que un tercero pueda ingresar al sitio de intervención y/o lastimarse con algún objeto que cause daño.
Como los cerramientos que se están generando son temporales, se aclara que todos los días, el personal realiza cerramiento antes de iniciar sus tareas y terminando las mismas, retiran el cerramiento para evitar inconvenientes con la base militar o que algún tercero pueda enredarse y ocasionarse un accidente.

4.3. Se realiza revisión e inspección del orden y el aseo que se deja en los frentes intervenidos. ARC-Málaga dispone de sitios de reciclaje, donde sólo debe ser depositada la basura que es generada durante el día. Los trabajadores del Consorcio Ventura que se encuentran ejecutando actividades de obra civil, son capacitados a diario para que puedan hacer uso de esos contenedores, responsables de la generación de basuras y/u otros residuos, depositándolos en el lugar adecuado.

4.3.1. Continuar con la preparación de un examen de conocimientos para presentar a los trabajadores, y cerciorarme que han entendido la responsabilidad del Autocuidado, el cómo identificar peligros y riesgos en cualquier área de sus vidas.

4.3.2. Revisión y verificación que el personal con cuenta con novedades de afiliación al sgsss y apoyar en el proceso de corrección en caso de encontrar novedades relevantes.


4.3.3. Realizar los documentos de ingreso correspondiente para que la semana siguiente, del 19 al 24 de septiembre, pueda ingresar a la base militar de málaga, los profesionales que se encuentran diseñando la membrana de yubarta; así mismo, autorización para el subcontratista que realizará tareas de ornamentación y el Director de Proyectos del Consorcio Ventura.


CONSORCIO
VENTURA

4.3.4. Se realiza la terminación del curso de Coordinador de TSA, informando la novedad a la interventoria y adjuntando el correspondiente certificado. Ello, con el fin de estar pendiente de las actividades de alturas que se vayan a realizar en el transcurso de las obras; así mismo, se envía el soporte del curso de alturas de las dos personas autorizadas para realizar la actividad.

4.3.5. Estar pendiente de actividades en el Colegio Naval, para mitigar riesgos de caída, corte u obstrucción orgánica en los trabajadores.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION EN SITIO

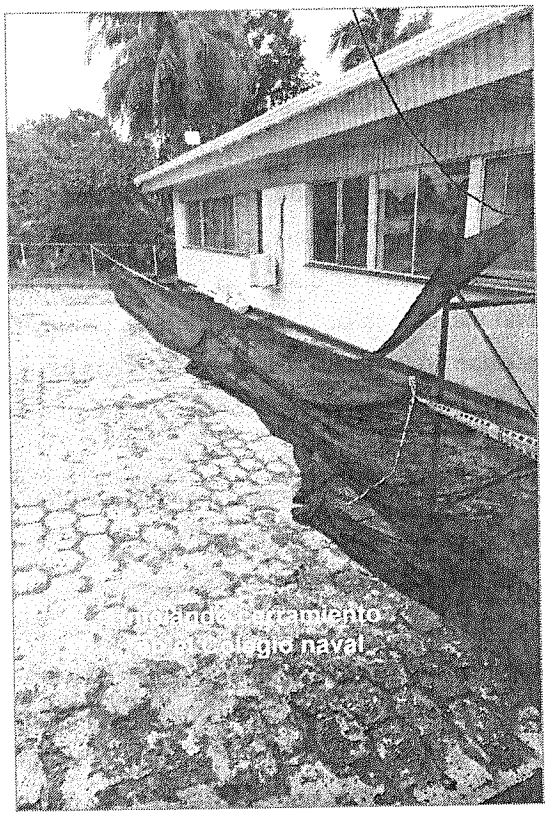

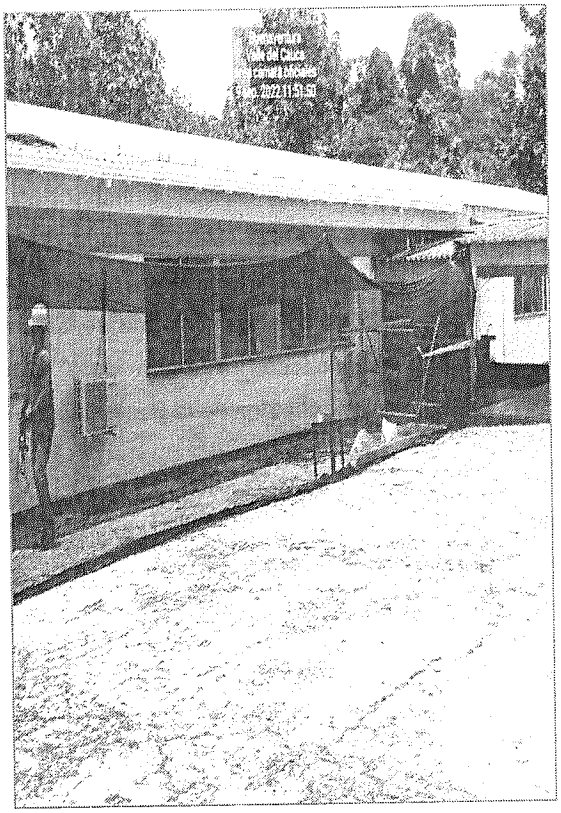

CONSORCIO
VENTURA



Realizando actividades en el Colegio Naval







CONSORCIO
VENTURA

SEÑALIZACION DE OBRA



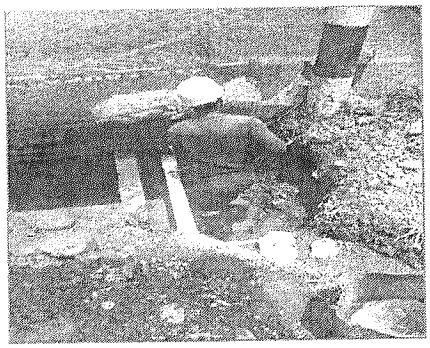



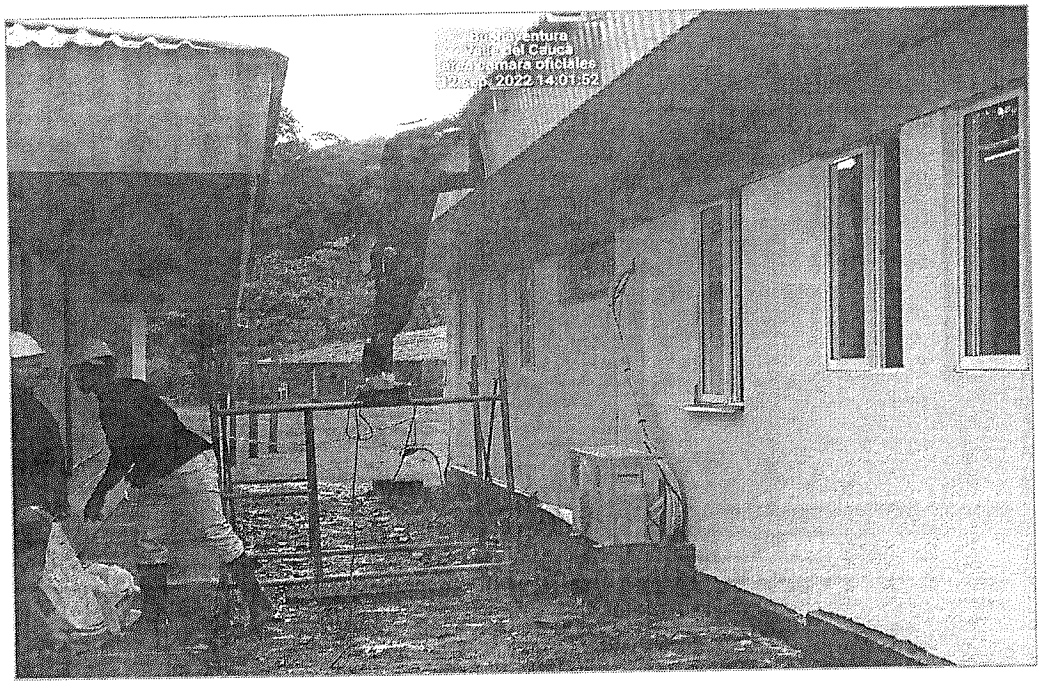

CONSORCIO
VENTURA

CERTIFICADO DE COORDINADOR ALTURAS.

D.E.M.A. ALTURAS SAS.
NIT 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N° 0680 DE 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SF2021220000000023404

DEMA ALTURAS S.A.S

TSA - 33294

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURA
NIVEL
COORDINADOR

CON UNA DURACIÓN DE 80 HORAS

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

EL SEÑOR (A)

CLAUDIA DANELY RODRIGUEZ GONZALEZ

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
52440227

EMPRESA CONSORCIO VENTURA
NIT 901550907
REPRESENTANTE LEGAL MARIA JOSE HERRERA
ARL POSITIVA

FECHA DE INICIO: 05/09/2022 FECHA FINALIZACION: 12/09/2022
EXPEDIDO EN BOGOTA D.C. - COLOMBIA
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2022

JOSE DIER ZARATE SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DEMA ALTURAS S.A.S

VICTOR ALFONSO AGRAY PARRA
RESOLUCION S.O 2921 DE 14/03/2013

A&E

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ORGANISMO CERTIFICADOR: BUREAU VERITAS
CODIGO DE ACREDITACION: 09-CPR-068 CODIGO DE CERTIFICACION CO21.01744
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL NUMERO 27067

F-PS-010
VERSIÓN 05

CR 68C N° 77 - 61
LAS FERIAS BOGOTA - COLOMBIA

A&E OCUPACIONALES

CERTIFICA QUE

JAIME ARTURO NARVAEZ MUÑOZ

Identificado con: Cedula Ciudadania

No. 79346480

TRABAJADOR AUTORIZADO

NIVEL

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 32 HORAS

CONSORCIO VENTURA

901550907

MARIA HERRERA

ARL POSITIVA

2022-08-27 / 2022-08-30
Bogotá
Fecha de la Realización de la Capacitación

ALEJANDRO ZAPATA MONTERO
1040240
Licencia en SST empresa
Licencia SST No 1172 de 20/08/2021
Representante Legal

ALEJANDRO ZAPATA MONTERO
1040240
Licencia en SST
27/09/2016
Entrenador de Alturas

2022-08-30
Bogotá
Fecha de la Expedición del certificado

Código
AXE-901115

La autenticidad de este documento se puede verificar http://www.ayeocupacionales.com -servicios@ayeocupacionales.com
CEL. 3184332511 - Ciudad de Bogotá



CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

F.P.S.010
VERSIÓN 05

ORGANISMO CERTIFICADOR BUREAU VERITAS
CODIGO DE ACREDITACION 09-CPR-008 CODIGO DE CERTIFICACION CO21.01744
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL NUMERO 27067

CR 68C N° 77 - 61
LAS FERIAS BOGOTA - COLOMBIA

A&E OCUPACIONALES

CONSORCIO VENTURA

CERTIFICA QUE

CARLOS YAMITH LOPEZ CRUZ

901550907

ARL POSITIVA

Identificado con: Cedula Ciudadania

No. 8057363

MARIA HERRERA

TRABAJADOR AUTORIZADO

NIVEL

2022-08-27 / 2022-08-30

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE

32 HORAS

2022-08-30

Bogotá
Fecha de la Realización de la Capacitación

ALEJANDRO ZAPATA MONTERO
1042690
Licencia en SST empresa
Licencia SST No 11712 de 20/09/2021
Representante Legal

ALEJANDRO ZAPATA MONTERO
1042690
Licencia en SST
27/09/2018
Entrenador de Alturas

Bogotá
Fecha de la Expedición del certificado

Codigo
A&E-30018

La autenticidad de este documento se puede verificar http://www.ayeocupacionales.com -servicios@ayeocupacionales.com
CEL. 3184332513 - Ciudad de Bogotá

5. **DEFINICIONES:**

SEGURIDAD: Es la exposición física, mental y/o psicosocial de una persona. La Seguridad es netamente personal y se mide de acuerdo al estado emocional del individuo.

SALUD EN EL TRABAJO: Es el estado físico, mental y psicosocial en la cual se encuentra una persona para realizar una actividad determinada.

SISTEMA: Es un proceso lógico y por etapas, con el fin transformar una materia en un producto terminado.

GESTIÓN: Son los trámites, actividades, tareas y/o acciones que se desarrollan para cumplir un objetivo establecido.

Por ende, El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un proceso lógico y por etapas, cuyo objetivo es garantizar la Seguridad (Exposición) y la Salud (Estado) de la (s) persona (s) que se encuentra (n) expuesta (s) en una determinada actividad, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la labor o tarea realizada y la cual puede causar una perturbación física o mental, de manera parcial o total a sus funciones netamente humanas.

RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un evento con severidad de lesión o daño y/o enfermedad.

PELIGRO: Es la fuente, situación o acto, acción o condición con potencial de daño, lesión o enfermedad causada a una persona, o una combinación de estos.

PREVENCIÓN: Es el acto y/o condición de seguridad, dispuesto a mitigar el riesgo de un evento fortuito, el cual se antepone con un análisis y valoración in situ, para identificar los peligros que puedan ser causa de un accidente o enfermedad laboral
Análisis de trabajos: Es el estudio previo de una persona, que va a realizar una tarea; área o lugar donde se va a ejecutar una actividad específica, a fin de mitigar riesgos a esta.

DILIGENCIAMIENTO DE ATS EN OBRA: Se instruye a los trabajadores de cómo se realizan los análisis de peligros de las actividades a realizar, con el fin de ayudarles a identificar los peligros y riesgos de las tareas que realizan y ayudarles a tener criterios para el autocuidado.

MANEJO DE CARGAS: Tanto hombres como mujeres estamos dispuestos y somos capaces de cargar cierto peso en nuestra vida. La norma colombiana indica que, el hombre mayor de 18 años puede cargar un máximo de 25 kilos y la mujer mayor de 18 años, un máximo de 20 kilos; cuando se pasa de este peso, lo recomendable es utilizar ayudas mecánicas como: carros, montacargas, otros. Es de anotar que menores de 18 años, (jóvenes), no

MOTIVACIÓN Y RIESGO PSICOSOCIAL. Escuchar a los trabajadores sobre sus estados de ánimo, sobre la manera como ingresa a realizar sus actividades y como salen, es prudente hacerlo como profesionales en seguridad y salud, dado a que las motivaciones con las que ingresan los trabajadores, hace que el objetivo que se tiene en obra se cumpla o no. Al personal se le recalca el trabajo en equipo, la interacción y el compromiso que tiene cada uno con sus compañeros de trabajo para realizar una actividad con óptimo desempeño.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte. (Decreto 1072/2015).

ESCUCHAR: Es atender y comprender lo que otra persona dice, a fin de evitar omisión del mensaje y mitigar el riesgo de un accidente en la tarea que se va a realizar. El saber escuchar con atención, nos ayuda con el autocuidado y permite que el trabajador esté más concentrado en la tarea que está realizando.

TABAQUISMO, ALCOHOL Y DROGAS: El uso de sustancias adictivas, el tabaquismo y el alcohol, son vicios peligrosos que, si no se saben controlar, son la causa raíz de enfermedades profesionales, invalidez y puede llevar a la persona hasta la muerte. La política de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo que crea la empresa Consorcio Ventura, es con el fin de mitigar aquellos episodios de vulnerabilidad que existen en los trabajadores, que no les permite concentrarse en las tareas que realizan; sumado a esto, el estrés y la ansiedad, ayudan a que el trabajador opte por comportamientos bruscos y no controlados.
Es por eso que, para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, manejar este tipo de eventos y capacitaciones a nuestros trabajadores, nos da la confianza y certeza que, contamos con equipos de trabajo altamente eficientes y capaces de controlar sus emociones y concentrarse en la labor que están realizando con responsabilidad y seguridad.

CONSORCIO
VENTURA


ATS. ¿Por qué realizar un ATS antes de iniciar actividades?
Los ATS, son registros documentados donde se expone el paso a paso la realización de una actividad. El término ATS significa "Análisis de Trabajo Seguro". Esto quiere decir que, si analizamos los peligros expuestos en el área de trabajo donde vamos a realizar nuestras actividades, estamos mitigando riesgos de accidentarnos.

La importancia de realizar un ATS antes de iniciar una actividad, es la de verificar que peligros podemos encontrar y como los podemos solventar.

6. HORAS HOMBRE

Registro horas de trabajo - hombre

0 = Equivalente a **DÍAS NO TRABAJADOS**
1 = Equivalentes a **DÍAS TRABAJADOS.**
UN DÍA trabajado corresponde a 8 HORAS LABORALES, adicionalmente, el trabajador cuenta con una (1) hora para almuerzo, espacios de descanso de 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde."




B	C	D	AW	AX	AY	AZ	BA	BD	BE
			Septiembre 2022						
Documento ID	Apellidos	Nombres	vr	lu	mt	mc	jv	vr	sab
			9	12	13	14	15	16	17
1151444702	CAMACHO TENORIO	JOSÉ EINER	0	0	0	0	0	1	
1111764406	CONRADO RIASCOS	LUÍS HERNANDO	1	1	1	0	1	1	
8057363	LÓPEZ CRUZ	CARLOS YAMITH	1	1	1	0	1	1	
16485473	LÓPEZ GUAITOTO	MANUEL ANTONIO	0	1	1	0	1	1	
1028187112	MOSQUERA ASPRILLA	ALBERTO	0	1	1	0	1	1	
79346480	NARVÁEZ	JAIME ARTURO	1	1	1	0	1	1	
1193580410	QUIÑONES TORRES	KEVIN	1	1	1	0	1	1	
6174773	RIASCOS WAITOTO	DARIO	0	1	1	0	0	1	
79774751	TORRES SEGURA	WILSON	0	1	1	0	1	1	
			4	8	8	0	7	9	0


Nota. Como podemos ver el pasado miércoles, 14 de septiembre, no hubo jornada laboral, debido a las altas lluvias que se generaron ese día, tanto en el corregimiento de Juanchaco como en Bahía Málaga. Por consiguiente, por asuntos de seguridad, se suspendieron actividades ese día.

7. MEDEVAC

Aunque las fuertes lluvias que se están presentando tanto en Bahía Málaga como en Juanchaco, no han retrasado del todo la actividad, si se están tomando medidas para otras actividades más álgidas que se programan sobre ellas.

Reporte del clima:

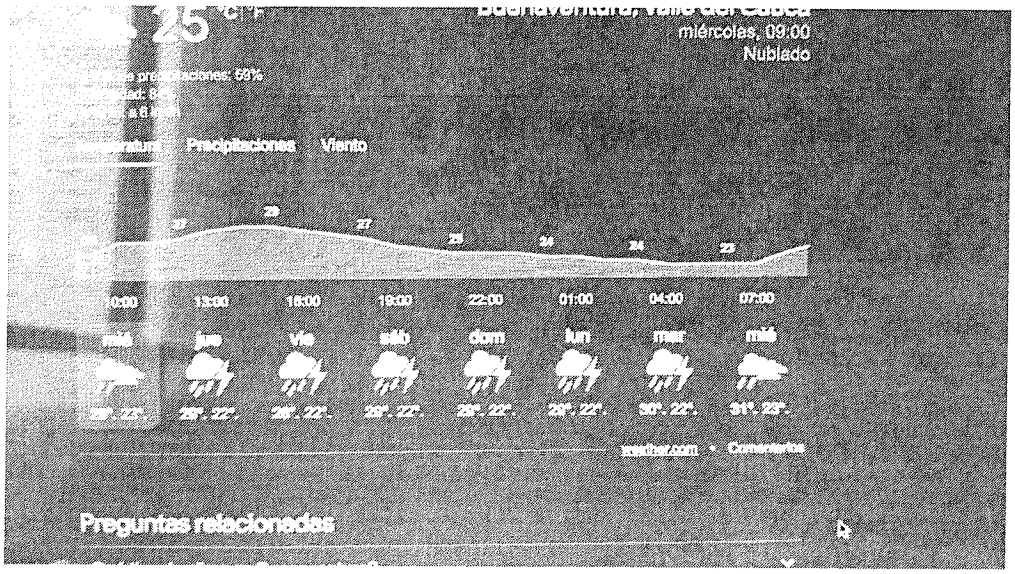

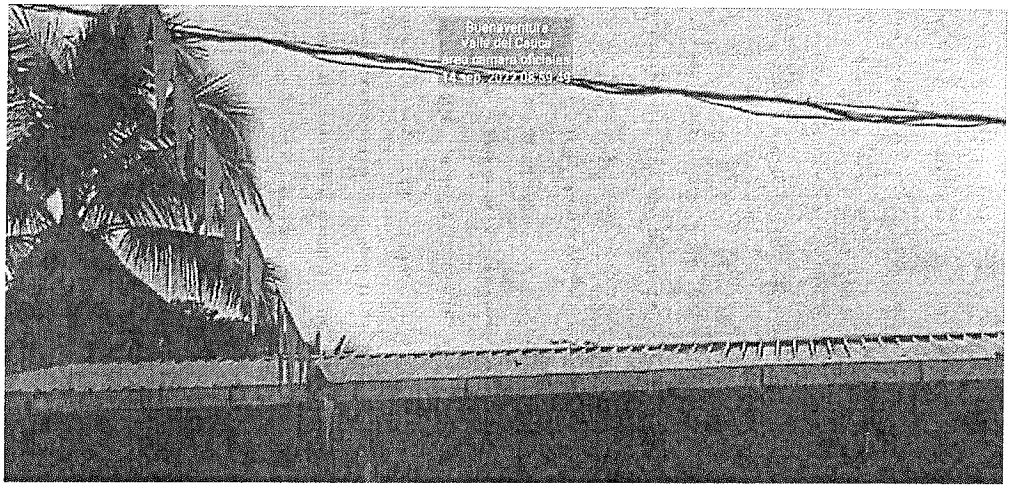

Nota. Fuerte lluvia en Juanchaco, el pasado 14 de septiembre, día en que se suspenden actividades. La lluvia inicia desde las 07:00 horas y para a las 14:00 horas

8. ACCIDENTES LABORALES PRESENTADOS EN LA SEMANA

Ninguno. No se reportan accidentes o incidentes en el sitio de trabajo.

9. REPORTE FURAT
Ninguno. No se realiza reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) por causa de accidente y/o enfermedad laboral.

10. **Investigación accidente laboral**
No Aplica

11. **Incapacidad médica**
Durante la semana del 12 al 15 de septiembre, sólo se reporta un (1) trabajador en enfermo (No se tiene registro del mismo aún, dado a que el trabajador reporta por medio verbal que no asistirá a su jornada laboral). Tan pronto reciba la incapacidad, estaré allegando la información reporte correspondiente.

12. LECCIONES APRENDIDAS EN EL SITIO DE TRABAJO

En todo trabajo, atender instrucciones es un poco álgido, dado a las costumbres, cultura y comportamientos adquiridos durante la vida (niñez, adolescencia, juventud, adultez).

Aprender a convivir, a distribuir tareas, a liderar procesos, y convertir actos inseguros en Actos Seguros, no es tarea fácil; pero sí, un "Reto" bastante interesante de investigación, en el cual con sólo poder analizar el comportamiento de la persona en su única tarea de disponerse para realizar una actividad determinada; ver como se autogeneran daños orgánicos y funcionales.

¿Cómo la Convivencia afecta las relaciones interpersonales y son causa raíz de la generación de peligros en una empresa u obra?

La Acción tomada durante la semana fue, llevar a términos tolerables las situaciones de incomodidad, zozobra, fatiga que puede tener una persona cuando no se le ha sido o se le es bien tratada. Los antecedentes familiares, sociales, culturales y de supervivencia, son motivo y razón para sentir al trabajador con disposición y/o alteración en el momento de realizar una tarea.

La Lección Aprendida de esta semana fue: **"Cuidar de los pensamientos diarios y tratar de sobrellevar conductas asertivas, es no dejarse afectar psicológicamente por las adversidades del momento. La asertividad con la que vives el día a día, es la energía que se requiere para continuar el camino y cumplir los objetivos planteados".**

13. RELACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCION APLICADAS EN CAMPO

- **INSPECCION DE BOTIQUIN**
  Se realiza inspección al botiquín de primeros auxilios, para atención inmediata en caso de presentarse alguna lesión breve o malestar general por parte del trabajador.

- **INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES.**
  Se verifica a diario que los trabajadores mantengan sus herramientas en un estado aceptable para su utilización, los cuales también pueden causar algún tipo de daño funcional o perturbación severa. Las herramientas se lavan a diario terminadas sus labores y se rectifica su estado en el momento de utilizarlas.

- **ORDEN Y LIMPIEZA**

Recordatorio diario. Por medio del área de Seguridad y Salud en el trabajo se les mantiene recordando todos los días, que el sitio de trabajo debe quedar limpio, que el plástico producido por botellas de agua, gaseosas, jugos u otras bebidas no alcohólicas, deben ser depositadas en los contenedores dispuestos para tales elementos reciclables. Que los papeles que se generen producto de su estancia en la base militar, deben ser arrojados a las canecas de basura, que los papeles, plásticos o paquetes que se generen, se reciclan y/o se depositan en los lugares adecuados. (este ítem no cambia)

14. MEDIDAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Cada día comienza con:

1. Lavado de manos al ingresar a las instalaciones de la Base Militar Naval Pacífico ARC-Málaga
2. Direccionamiento al área de trabajo
3. Actividades de capacitación y pausas activas
4. Ejecución de actividades
5. Lavado de manos antes y después de ingerir alimentos
6. Lavado de manos al terminar la jornada laboral.


El uso de mascarilla (tapaboca desechable), cubriendo nariz y boca, manipulando el elemento desde los cauchos a fin de no contaminar la mascarilla. Que, el uso de mascarilla es estrictamente obligatorio en los siguientes casos: **1)**. Cuando el trabajador se encuentre con síntomas de gripe, tos, carraspea, sea leve o no. **2)**. Cuando el trabajador se encuentre realizando actividades en ambientes cerrados, cuando el sitio o espacio donde va a realizar sus tareas sea un espacio húmedo y no respirable de manera tolerable. **3)**. Si el trabajador se encuentra realizando actividades en ambientes cerrados y con bastante gente. (Protocolos que continúan día tras día, hasta el momento no cambian porque no se ha llegado a un evento diferente)

15. LIMPIEZA: COMO SE DEJA EL LUGAR DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL

Presentación del orden en los lugares de intervención de la presente semana, de como dejaron el lugar antes de salir cada día de la jornada laboral.

Este informe se expide a los nueve (16) días del mes de septiembre de 2022, para dar seguimiento y cumplimiento a las actividades realizadas del contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, en la presente semana, del, 12 al 16 de septiembre.

Firma,



Esp. Claudia Danelly Rodriguez González
Administrado en Seguridad & Salud Ocupacional
Residente en SST, licencia Res. No. 7052/2015
Consorcio Ventura.

CONSORCIO
VENTURA

OBSERVACIONES SOBRE HALLAZGOS EN EL INFORME SST.

Buenaventura - Valle,16

de septiembre de 2022

Señora
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO
VENTURA Bogotá D.C.

Asunto: Observaciones de hallazgos en entregables **(Informes de SST)** de Interventoría al contrato de mantenimiento de Bienes inmuebles de la Armada Nacional en el Pacífico Colombiano **# 073-ARC-CBNL02-2022**

Respetada señora, dando cumplimiento al contrato **072-ARC-CBNL02-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO**, me permito notificar que el día de hoy **16/09/2022** fue entregado a la interventoría el informe de **SST** por parte de ustedes, muy puntuales de hecho, pero el mismo., no contiene los requerimientos solicitados en temas de prevención en SST, como son las imágenes ilustrativas de cada una de las acciones aplicadas en el desarrollo de la obra con los trabajadores.


Como se relaciona a continuación.

FALTÓ POR RELACIONAR EN EL INFORME:

- ***Registro fotográfico de charlas de seguridad.***
- ***Registro fotográfico de orden y aseo en sitio.***
- ***Registro fotográfico de inspección de extintor.***
- ***Registro fotográfico de botiquín.***
- ***Registro fotográfico de lavado y desinfección de manos.***

Cabe resaltar que es de vital importancia realizar las entregas de estos informes para hacer seguimiento de las medidas de seguridad y prevención que se están impartiendo o aplicando en campo para el bienestar de los trabajadores, con el fin u objeto de preservar su integridad física, social y mental, y a su vez prevenir enfermedades laborales y accidentes e incidentes de trabajo, y poder llevar un control y seguimiento de estas medidas ejecutadas con el personal., y a la ves poder reportarle al cliente para su tranquilidad que se cumple con la aplicación del **SG-SST-MA.**

Atentamente,



Gladys Vallecilla Tenorio
Residente de SST Interventoría UT gecointeg 2020
gvallecilla@mis
ena.edu.co
3175893129

Buenaventura - Valle, 14 de

septiembre de 2022

Señora
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA Bogotá D.C.

Asunto: Oficio 04 SST. Observaciones de estudio de seguridad y aportes de SS de Interventoría al contrato de mantenimiento de Bienes inmuebles de la Armada Nacional en el Pacífico Colombiano # 073-ARC-CBNL02-2022

Respetada señora, dando cumplimiento al contrato 072-ARC-CBNL02-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, se le notifica que luego de la revisión de los oficios 014 y 015, de los documentos entregados vía correo, cabe denotar lo siguiente:

ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Los mismos se encuentran con los siguientes estados.

Carlos Yamith López Cruz	Aprobado
Jaime Arturo Narváez Muñoz	NO REGISTRA DOCUMENTOS DE INGRESO(Estudio de seguridad, arl, eps, afp, ccf, antecedentes disciplinarios y copia de C.C.
John Alexander Hernández Posso	Aprobado
Édison molina Rentería	La seguridad social aportada se encuentra vencida desde hace 2 dias.
Luis Hernando Díaz Victoria	Aprobado

Se le pide solventar la documentación faltante para revisión y aprobación de los mismos si es el caso.

Atentamente,



Gladys Vallecilla Tenorio.

Residente de SST Interventoría UT gecointeg 2020.

gvallecilla@misena.edu.co


INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	RED CONTRA INCENDIOS Y CAMARA DE OFICIALES, COLEGIO NAVAL	Código	
		Versión	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA	12/09/2022 AL 16/09/22
CONTRATO tin	073 -ARC-CBNL02-2022
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR	U.T. GECONTEG 2020
LOCALIZACION DE LA OBRA	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA	15 NOVIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO	CAMARA DE OFICIALES, RED CONTRAINCENDIOS, COLEGIO NAVAL

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022


12 de SEPTIEMBRE DE 2022





DIA UNO FOTOS



13 DE SEPTIEMBRE DE 2022








14 DE SEPTIEMBRE DE 2022


POR MALA CURA EN JUAN CHACO NO PUDO ZARPE POR LO CONSIGUIENTE EL TRABAJO ENTA LOGISTICA DE LA CUBIERTA EN CAMPA


FOTOS




15 DE SEPTIEMBRE DE 2022







16 DE SEPTIEMBRE DE 2022



PROCESO DE EJECUCION Se realiza el revoque de la caseta d e gas por todas las caras y se realiza afinado. Continuacion d e instalacion de la canal amazonica en colegio Naval, se adopta unas platinas con el fin de sostener la canal.En red contraincendios se realiza una excavacion de 2 metros con el fin de conectar el tubo madre al tubo de 3 pulgadas, se instala la valvula de 3", una TEE, 2 universales, instalacion d e un tubo de 3" vertical y 1.40 metros horizontal, SE toman medidas de bajos de oficiales, instalacion de bajantes en colegio naval, se realiza prueba de presion hidraulica en tuberia de 3", Suministro e instalacion de

REALIZO	REVISO Y APROBO
Nombre y firma Ing. Residente de Obra	Nombre y firma ARQ Residente de Interventoria
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YOLIAN DAVID LOPEZ ARIAS

U.T Gecointeg 2020

Buenaventura, Valle del Cauca - 24 de septiembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA


De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento van por encima del valor proyectado 4.82%, llevando un 34,7% de ejecución real
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

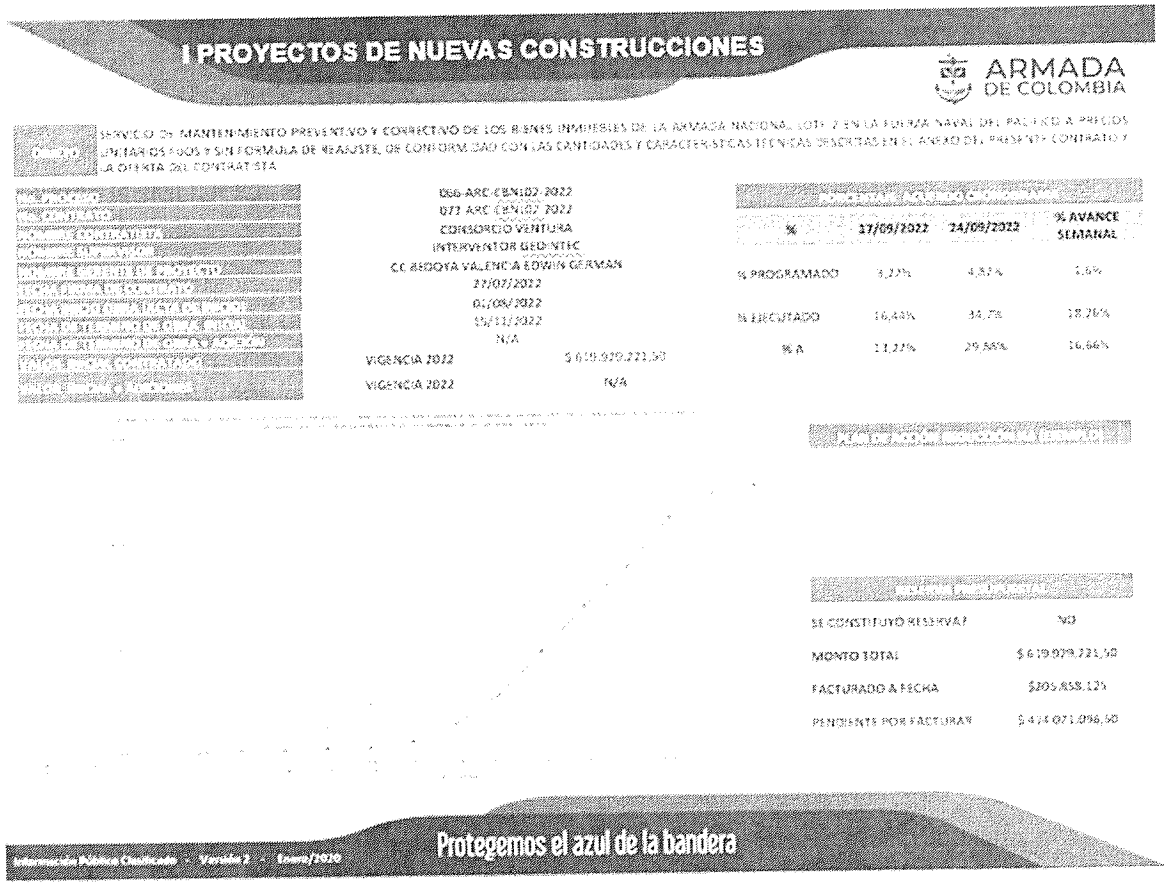


INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 50 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

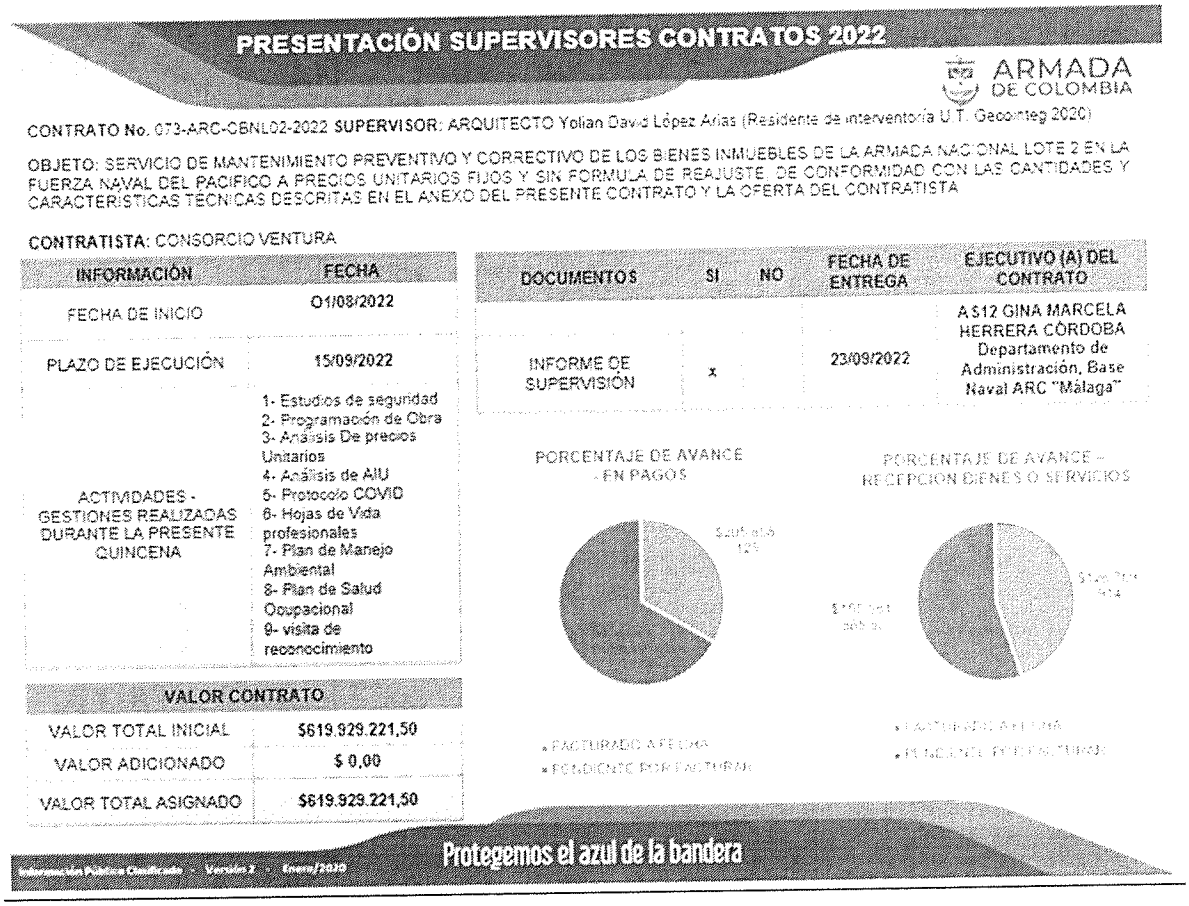

PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 SUPERVISOR: ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

INFORMACIÓN	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/09/2022
ACTIVIDADES - GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento

VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	EJECUTIVO (A) DEL CONTRATO
INFORME DE SUPERVISIÓN	x		23/09/2022	A S12 GINA MARCELA HERRERA CÒRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"

PORCENTAJE DE AVANCE - EN PAGOS

PORCENTAJE DE AVANCE – RECEPCION BIENES O SERVICIOS

Protegemos el azul de la bandera

3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

4- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana, la cual se le hace seguimiento en porcentajes de ejecución
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

1. RED HIDRÁULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS 100% DE AVANCE DE EJECUCIÓN
2. CAMOF 19,02% DE AVANCE DE EJECUCIÓN
3. COLEGIO NAVAL 20.95% DE AVANCE DE EJECUCIÓN

4. GRUPO AERO NAVAL DEL PACIFICO GANPA 97% DE AVANCE DE EJECUCIÓN
5. VENTANERIA COMPAÑÍA CIA 100% DE AVANCE DE EJECUCIÓN
6. MIRADOR YUBARTA 93% DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (INCLUSIÓN ACTIVIDADES ANEXO TÉCNICO) GRUPO FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACIFICO

El Grupo Fuerzas Especiales Navales del Pacifico solicita realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a baños en las instalaciones de alojamientos acuerdo inspecciones realizadas en el presente año por parte de la armada nacional, se generó la necesidad de adecuar y dejar en funcionamiento estas instalaciones.

Por lo anterior, y atendiendo lo manifestado por la inspección de la armada nacional se hace necesario incluir el aumento solo de cantidades de actividades técnicas al contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el fin de desarrollar adecuación de los baños, con una adición de $ 43.722.468,84 (cuarenta y tres millones setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos) de acuerdo a siguiente tabla:

PROYECTO	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP				
CUIDAD	BAHIA MALAGA - BUENAVENTURA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.23	PRELIMINARES				
2.23.1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (sanitarios)	UN	6,00	$ 35.361,44	$ 212.168,66
2.23.3	Demolicion de columnetas seccion (0.2 x 0.2) incluye retiro punto hidráulico ducha	UN	5,00	$ 97.968,71	$ 489.843,56
2.23.10	Demolición de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m	M2	55,20	$ 14.489,52	$ 799.821,30
2.24	MAMPOSTERIA Y PAÑETE			$ 0,00	
2.24.1	Muro en bloque N° 4 estriado, e= 0,10 cm incluye (grafil de 5 mm suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	10,75	$ 126.719,17	$ 1.362.231,07
2.24.5	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad	M2	15,75	$ 28.567,58	$ 449.939,43

"Protegemos el Azul de la Bandera
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 66 62 24 horas
Carrera XX No. XX-XX - Commutador XXXXXXX Ext. XXXX Bogotá, Colombia"

ARC-FT-001 AVGAR-V14

2.25	INSTALACIONES HIDRAULICAS			$ 0.00		
2.25.3	Punto hidraulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección	UN	8.00	$ 85 465.01	$	683 [illegible]
2.25.4	Punto hidraulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección	UN	5.00	$ 134 484.75	$	672 [illegible]
2.26	INSTALACIONES SANITARIAS			$ 0.00		
2.27	RED DE RE VENTILACIÓN			$ 0.00		
2.28	ACABADOS			$ 0.00		
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para muros dimensiones mínimas 30 x 30 cm nuevo ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán cenefas de aluminio o plásticas acuerdo a diseño	M2	15.10	$ 82 947.78	$	1 252 [illegible]
2.28.5	Suministro e instalación de cabinas para ducha en panel fenólico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	UN	14.00	$ 1 248 739.79	$	17 482 356.90
2.28.8	Suministro e instalación de divisiones para cmbiri en aluro modulable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujeción y anclaje segun planos de detalle	UN	6.00	$ 578 174.33	$	3 469 045.98
2.28.10	Suministro e instalación de lavamanos tipo Nova Ref. 07361 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	5.00	$ 377 702.57	$	1 888 512.85
2.28.11	Suministro e instalación de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	6.00	$ 614 642.95	$	3 687 857.69
2.28.12	Suministro e instalación grifería para ducha, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc. boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	8.00	$ 202 118.37	$	1 616 [illegible]
2.29	INSTALACIONES ELECTRICAS			$ 0.00		
				COSTOS DIRECTOS	$	34 171 527.04
				ADMINISTRACIÓN 20%	$	6 834 305.41
				IMPREVISTOS 2%	$	683 430.54
				UTILIDAD 5%	$	1 708 576.35
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$	324 629.51
				VALOR TOTAL	$	43 722 468.84


ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	GAMPA, RED CONTRA INCENDIOS, COLEGIO NAVAL	Código	
		Version	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA	19/09/2022 AL 23/09/22		
CONTRATO No	073 -ARC-CBNL02-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 FN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE. DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR	U.T. GECONTEG 2020		
LOCALIZACION DE LA OBRA	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO	CAMARA DE OFICIALES, RED CONTRAINCENDIOS, COLEGIO NAVAL, GAMPA		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022


19 de SEPTIEMBRE DE 2022




20 DE SEPTIEMBRE DE 2022




21 DE SEPTIEMBRE DE 2022



22 DE SEPTIEMBRE DE 2022



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Esta semana se ejecutaron las siguientes actividades:Colegio naval terminacion de instalar la canal en PVC trapezoidal amazonica con sus respectivas bajantes, Red contraincendios, terminacion de rrelleno compactado. Oficiales: Continuacion de puesta de la cubierta de Policarbonato en la pasarella de Oficiales . Inicio de intervencion en la Cocina con la demolicion de muros internos. Compania de seguridad, Intalacion de ventanas de 4 m y un metro respectivamente. GAMPA: Continuacion de instalacion de cubierta, en este frente el contratista manifiesta que las correas que sostienen la cubierta presenta un alto deterioro, y grado de oxidacion por consiguiente el contratista CONSORCIO VENTURA no se hace responsable por los accidentes que pueda ocacionar dicha estructuara, y recomienda a la entidad contratante, reemplazar de manera urgente dichas correas con el fin de evitar futuros accidentes en el alojamiento.

REALIZO	REVISO Y APROBO
Nombre y firma Ing Residente de Obra	Nombre y firma ARO Residente de Interventoria
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YOLIMA DAVID LOPEZ ARIAS

U.T Gecointeg 2020

Buenaventura, Valle del Cauca - 30 de septiembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA


De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento van por encima del valor proyectado 4.82%, llevando un 34,7% de ejecución real
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

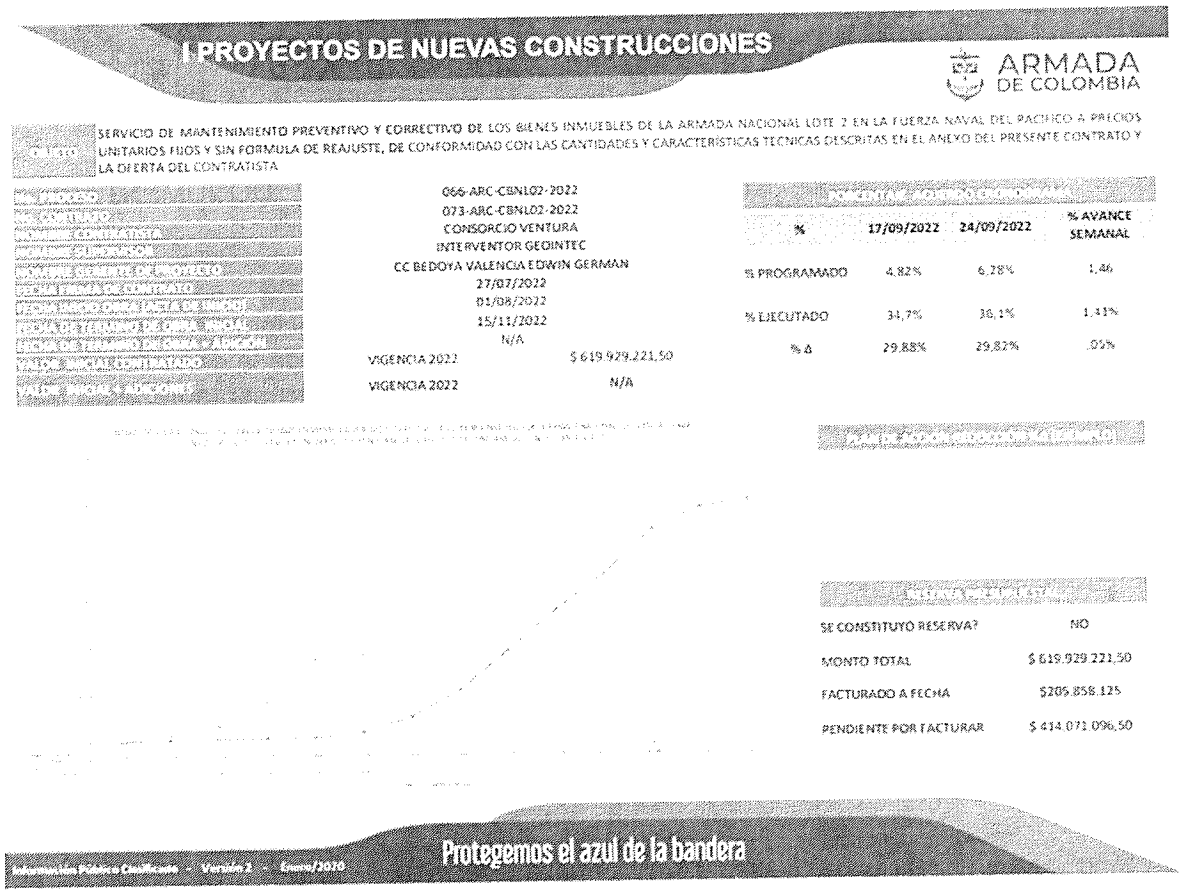


INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 50 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

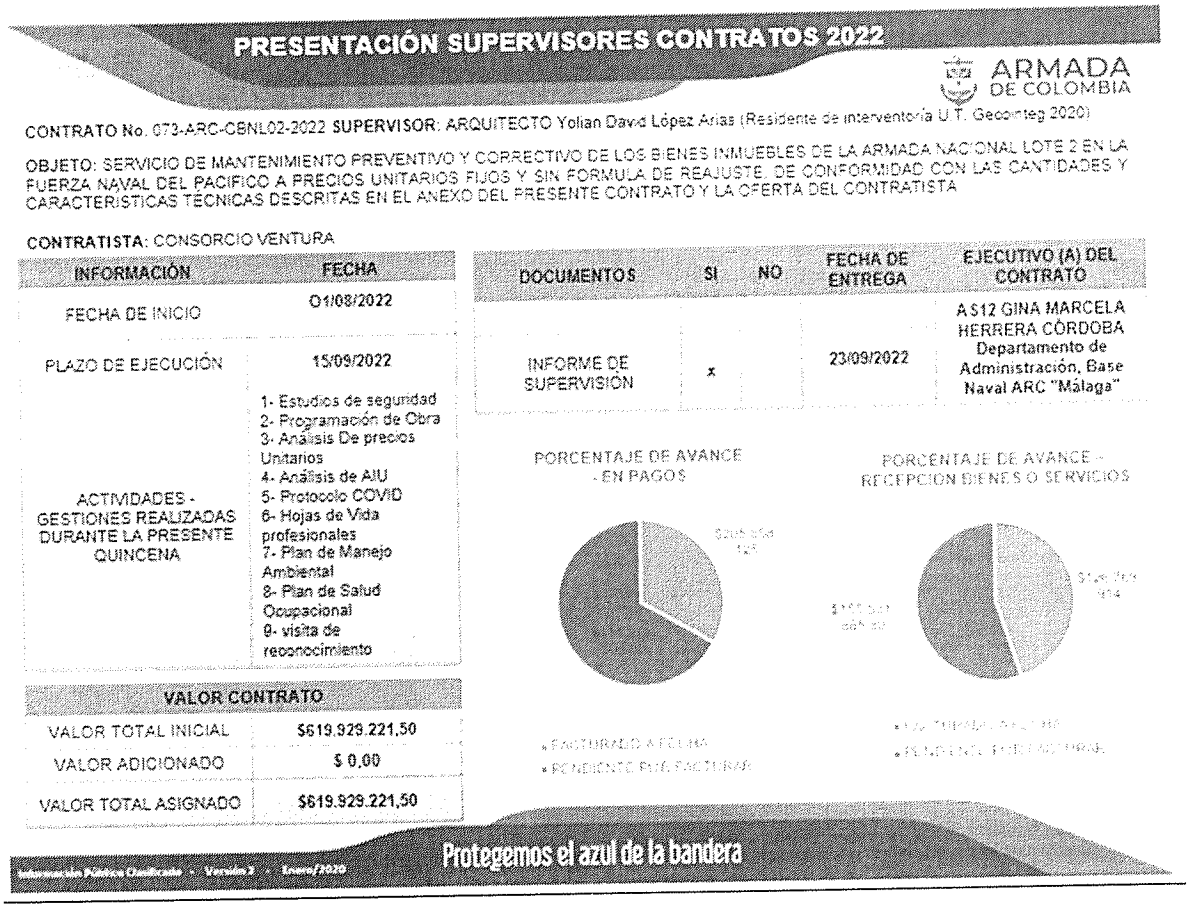

PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 SUPERVISOR: ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

INFORMACIÓN	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/09/2022
ACTIVIDADES - GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento

VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	EJECUTIVO (A) DEL CONTRATO
INFORME DE SUPERVISIÓN	x		23/09/2022	AS12 GINA MARCELA HERRERA CÓRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"

PORCENTAJE DE AVANCE - EN PAGOS

PORCENTAJE DE AVANCE - RECEPCION BIENES O SERVICIOS

Protegemos el azul de la bandera

3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

4- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana, la cual se le hace seguimiento en porcentajes de ejecución

FRENTE	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE PROYECTADO	PORCENTAGE EJECUTADO	CUANTIA COSTOS ACUMULADO	PORCENTAGE INDIVIDUAL
EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	0,0%		
CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	5,49%	$ 26.470.109,54	25,65%
CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,00%		
MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	8,85%	$ 42.691.656,20	93%
SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	0,00%		
VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100%
CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	0,00%		
BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES	$ 51.968.993,39	10,77%	0,00%		
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	2,77%	$ 13.374.836,38	100%
MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	0,00%		
MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97%
COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	2,75%	$ 13.277.172,73	20,95%
		100%	36,1%	$ 174.114.456,12	
TOTAL ACUMULADO	$ 482.312.664,18	100%	36,1%		

5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (INCLUSIÓN ACTIVIDADES ANEXO TÉCNICO) GRUPO FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACIFICO

El Grupo Fuerzas Especiales Navales del Pacifico solicita realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a baños en las instalaciones de alojamientos acuerdo inspecciones realizadas en el presente año por parte de la armada nacional, se generó la necesidad de adecuar y dejar en funcionamiento estas instalaciones.

Por lo anterior, y atendiendo lo manifestado por la inspección de la armada nacional se hace necesario incluir el aumento solo de cantidades de actividades técnicas al contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el fin de desarrollar adecuación de los baños, con una adición de $ 43.722.468,84 (cuarenta y tres millones setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos) de acuerdo a siguiente tabla:

PROYECTO	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP				
CUIDAD	BAHIA MÁLAGA - BUENAVENTURA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,23	PRELIMINARES				
2.23.1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (sanitarios)	UN	6,00	$ 35.361,44	$ 212.168,66
2.23.3	Demolición de columnetas sección (0.2 x 0.2) incluye retiro punto hidráulico ducha	UN	5,00	$ 97.968,71	$ 489.843,56
2.23.10	Demolición de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m	M2	55,20	$ 14.489,52	$ 799.821,30
2,24	MAMPOSTERIA Y PAÑETE			$ 0,00	
2.24.1	Muro en bloque Nº 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	10,75	$ 126.719,17	$ 1.362.231,07
2.24.5	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm Incluye fibs, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad	M2	15,75	$ 28.567,58	$ 449.939,43

2.25	INSTALACIONES HIDRAULICAS			$ 0.00		
2.25.3	Punto hidraulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección	UN	8.00	$ 98.483,01	$	787.864,11
2.25.4	Punto hidraulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección	UN	5.00	$ 134.484,75	$	672.423,77
2.26	INSTALACIONES SANITARIAS			$ 0.00		
2.27	RED DE RE VENTILACIÓN			$ 0.00		
2.28	ACABADOS			$ 0.00		
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en ceramico para muros dimensiones minimas 30 x 30 cm incluye ALFAJISTO, o PEGACOR, o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalaran guarneres de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	15.10	$ 82.947,78	$	1.252.511,48
2.28.5	Suministro e instalación de cabinas para ducha en panel fenolitico color a convenir incluye puerta con cerradura para baño segun localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	UN	14.00	$ 1.248.739,78	$	17.482.356,95
2.28.6	Suministro e instalación de divisiones para cenit en acero inoxidable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujecion y anclaje segun planos de detalle	UN	6.00	$ 578.174,33	$	3.469.045,98
2.28.10	Suministro e instalación de lavamanos tipo Nova Ref. 07361 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	5.00	$ 377.702,57	$	1.888.512,86
2.28.11	Suministro e instalación de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	6.00	$ 614.642,95	$	3.687.857,69
2.28.12	Suministro e instalación grifería para ducha, incluye accesorios de conexion a red hidraulica existente, ext. boquilla, silicona, disposicion de residuos sobrantes en sitio adecuado incluye todos los elementos equipos y obra civil necesaria para su correcto funcionamiento e instalación	UN	8.00	$ 202.118,17	$	1.616.945,37
2.29	INSTALACIONES ELECTRICAS			$ 0.00		
				COSTOS DIRECTOS	$	34.121.527,04
				ADMINISTRACIÓN	20%	$ 6.824.305,41
				IMPREVISTOS	2%	$ 682.430,54
				UTILIDAD	5%	$ 1.706.076,35
				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 324.074,51
				VALOR TOTAL	$	43.722.464,84

JUSTIFICACIÓN TECNICA ADICIÓN FUERZA NAVAL DEL PACIFICO

Se evidencia el deterioro de la canales de aguas lluvias, bajantes y demás elementos que componen toda su estructura las cuales y atendiendo las actuales condiciones climáticas se han visto afectadas en una mayor proporción generando afectación de la funcionalidad de este sistema, intensificando humedades y filtraciones de agua dentro de las oficinas, situación por la cual y atendiendo la problemática descrita anteriormente, es necesario la intervención de este sistema con el fin de mejorar las condiciones, como también minimizar el deterioro de los componentes estructurales del techo, cabe resaltar que la base NAVAL ARC MALAGA tiene un presupuesto de $15.000.000 para dicha actividad de obra a ejecutar.

A continuación, se relaciona las actividades necesarias para realizar los mantenimientos pertinentes, los cuales no se encuentra dentro del anexo a del contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022, así:

PROYECTO	COMANDO FUERZA NAVAL DEL PACIFICO				
CUIDAD	Bahia Malaga, Buenaventura				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.32	CUBIERTA				
2.32.1	Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135 mm x 159,8 mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes y todos los elementos equipos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de la actividad retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	98,00	101.226,00	$ 9.920.148,00
2.32.2	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 90 mt2 de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotean, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico o PVC, unión esquina exterior-interior, incluye	ML	17,50	95.414,15	$ 1.669.747,63

	amarres, limpiador, lubricante silicona para canales y bajantes, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes, montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a estructura, disposición de residuos en sitio adecuado,y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.				
COSTOS DIRECTOS					$ 11.589.895,63
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 2.433.878,08
IMPREVISTOS				2%	$ 231.797,91
UTILIDAD				5%	$ 579.494,78
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 110.104,01
VALOR TOTAL					$ 14.945.170,41

ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

Buenaventura - Valle, 01 octubre

de 2022

Señora
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA Bogotá.
D.C.

Asunto: Oficio 07 **SST,** Incumplimiento de entregables (informe mensual de SST) y Observación sobre hallazgos del informe semanal contrato de mantenimiento de Bienes inmuebles de la Armada Nacional en el Pacífico Colombiano # 073-ARC-CBNL02-2022.

Respetada señora, dando cumplimiento al contrato 072-ARC-CBNL02-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, se le notifica al contratista por este medio el incumplimiento en la entrega del informe mensual de SST, el cual se debió entregar por parte de ustedes a la interventoría el día 30/09/2022 a medio día, a hoy 01/10/2022 no se recepciona el mismo en la base de datos de la interventoría. Por tal motivo se le invita a tener cumplimiento con los entregables SST en las fechas pactadas y dar consecución u observancia al contrato.

Por otro lado, el informe semanal se entregó a destiempo, se entiende que en la zona se presentó apagón (Interrupción de la luz eléctrica) y por ende el incumplimiento en los entregables, misma que se reestableció horas después, por el cual se recibe el entregables semanal, pero en revisión del mismo se encontraron hallazgos a mejorar dentro de las redacción y medidas de prevención aplicadas con el personal en obra.

A continuación, se hace una breve descripción de los mismos.

I. OBJETIVOS

Objetivo General de la semana del, 19 al 24 de septiembre


Velar por la seguridad y salud de los trabajadores que se encuentran en el proceso de intervención de los frentes adjudicados en el Contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el fin de garantizar que las actividades que realizan están sujetas a las condiciones físicas, mentales y psíquicas de cada uno del personal contratado para la realización de estas intervenciones, así como contribuir en la mejora continua de las actividades desarrolladas en la semana inmediatamente anterior.

En este informe se debe relacionar la semana 26 al 30 septiembre, no del 19 al 24 como lo muestra el círculo rojo.


Dentro de los temas tratados en las charlas de esta semana del, 19 al 23 de septiembre. fueron:

26-sept.-2022. Prohibiciones en la obra
27-sept.-2022. Responsabilidades en la obra
28-sept.-2022. Condiciones inseguras en las obras.
29-sept.-2022. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer caso en las obras?
30-sept.-2022. Consecuencias en las actividades Rutinarias.

Aquí se debe relacionar la semana del 26 al 30 de septiembre, se debe tener más minuciosidad en el momento de la actualización, elaboración o revisión del informe.

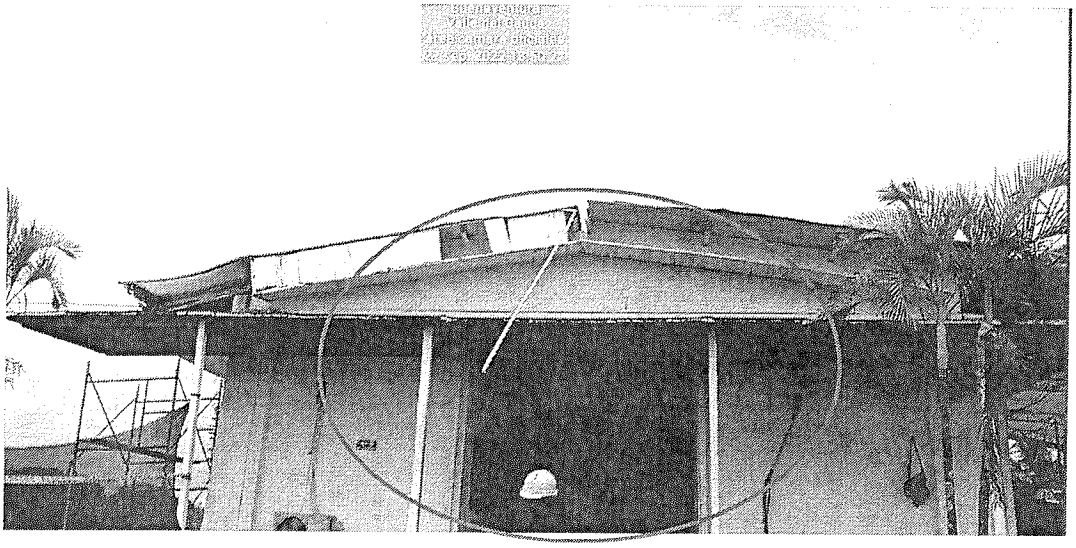

Riesgo de caída de objetos al trabajador. La residente SST debe hacer un análisis de los riesgos existentes en la zona de trabajo a intervenir antes de dar aperturas a las actividades, esto con el objeto de prevenir accidentes laborales. Se pide corregir el hallazgo y entregar evidencias de las medidas tomas en cuanto a mejoras.

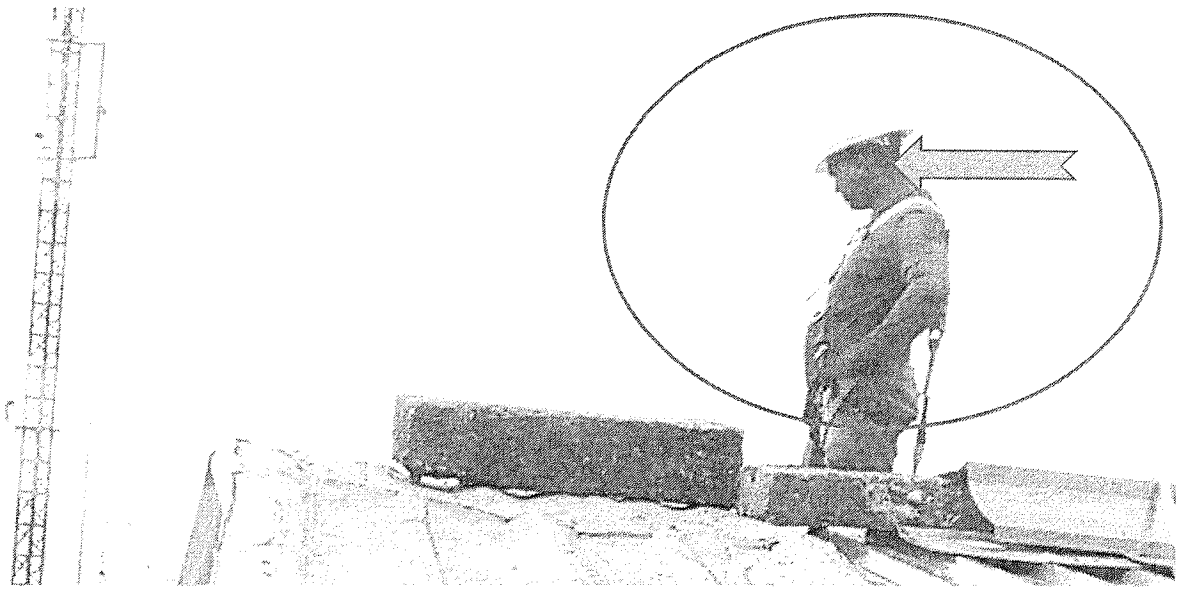

Trabajador realizando trabajos en alturas sin barbuquejo. La norma Resolución 1409 de 2012, revocada por la resolución 4272 del 2021 nos manifiesta que todo trabajo a realizar en una superficie que supere los 2.0 metros se considera trabajo en alturas, y que para ello se debe contar con una serie de elementos (equipo de trabajo para alturas) los cuales deben cumplir algunas características. A continuación, se describen los elementos o epp para trabajos en alturas.

- Arnés cuerpo entero certificado.
- Eslingas en y doble Y certificadas.
- Eslingas de posicionamiento certificada de acuerdo a actividad.
- Casco de seguridad certificado clase E tipo 1 con barbuquejo.
- Guantes antideslizantes.
- Botas de seguridad industriales con punteras.
- Gafas de seguridad antiespumante claras y oscuras.

Según se evidencia en la imagen círculo rojo, el trabajador se encuentra realizando sus actividades de alturas sin barbuquejo, lo que le genera al trabajador un acto inseguro, pues en el momento de un accidente el mismo no le brindara la protección en la cabeza ya que no cuenta con el barbuquejo para sostener y mantener su estabilidad en la cabeza del trabajador.

Se solicita y se exige que la residente SST responsable de las medidas de seguridad y prevención de ese personal, tome las acciones correspondientes para evitar accidentes laborales futuros suspensiones de actividades, por permitir y autorizar un trabajo en alturas sin los debidos elementos que se necesitan para tal fin.

Este informe se expide a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2022, para dar seguimiento y cumplimiento a las actividades realizadas del contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022. en la presente semana, del 19 al 23 de septiembre de 2022.

Firma.

Esp. Claudia Danelly Rodriguez González
Administrado en Seguridad & Salud Ocupacional
Residente en SST. licencia Res. No. 7052/2015
Consorcio Ventura

Se le pide a la residente prestar más atención al momento de la redacción del informe y actualización del mismo, puesto que se están relacionando fechas erróneas en el informe de esta semana.

NOTA: se esperan las correcciones sobre estos hallazgos a más tardar el día lunes 03/10/2022, con evidencias fotográficas adjuntas.

Atentamente,

Gladys Vallecilla Tenorio.

Residente de SST Interventoria UT gecointeg 2020.

gvallecilla@misena.edu.co


INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	GAMPA, CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD	Código	
		Versión	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA	26/09/2022 AL 30/09/22
CONTRATO No.	073 -ARC-CBNL02-2022
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR	U.T. GECONTEG 2020
LOCALIZACION DE LA OBRA	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA	15 NOVIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD


ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


26 de SEPTIEMBRE DE 2022




27 DE SEPTIEMBRE DE 2022




28 DE SEPTIEMBRE DE 2022



29 DE SEPTIEMBRE DE 2022



30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Esta semana se ejecutaron las siguientes actividades:. Camara de Oficiales: Terminacion de puesta de la cubierta de Policarbonato en la pasarella de Oficiales . Continuacion de intervencion en la Cocina con la demolicion de muros internos, demolicion de enchape, suspension de puntos hidraulicos, electricos, y de desague, retiro de tuberia, demolicion de columnetas y viguetas en concreto. Compania de seguridad, Desmonte de aparatos existentes. GAMPA. Continuacion de instalacion de cubierta, en este frente el contratista manifiesta que por motivos de climatologia y de falla en el fluido electrico , los dias miercoles y viernes d e esta semana no s e pudo laborar, solo falta un dia de trabajo y terminar de aplicar sikaflex y unos detalles en cubierta

REALIZO

Nombre y firma Ing
Residente de Obra

LUIS DOMINGO
HERRERA GUZMAN

REVISO Y APROBO


Nombre y firma ARQ
Residente de Interventoria


YOJAN DAVID LOPEZ ARIAS

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	2.8.2 Ejecución de losa maciza de contrapiso en concreto reforzado de (1,60 m * 1 m) E= 0,15 m, sobre una base de relleno B-200 de 18 cm. incluye refuerzo en acero de 60.000Psi	UNIDAD	m2

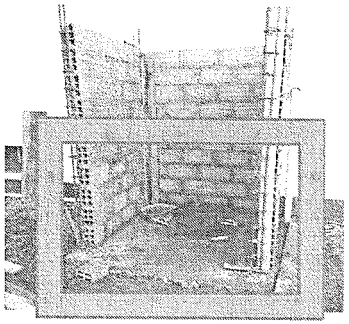



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,3	1,6		2,080	2,08
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					2,08
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					2,08

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	2.8.3Muro en bloque Nº 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	UNIDAD	m2

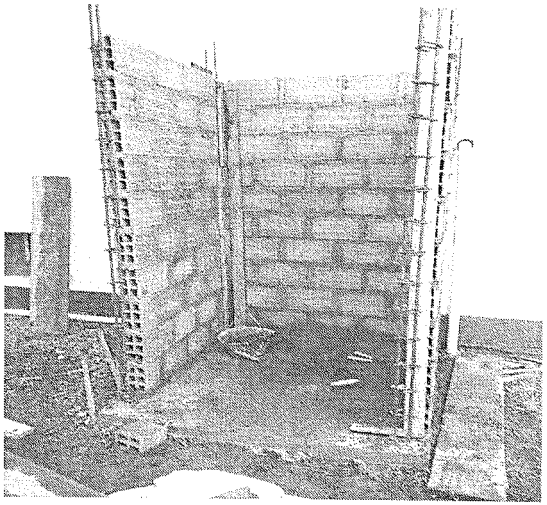

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,16		2,6	1,000	3,02
	1,175		2,6	2,0	6,11
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					9,13
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					9,126

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

Ing. Ender Leal rodriguez
representante legal
gecointeg

Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz


FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	**2.8.4.Columnetas en concreto sección 12x15 cm o menor, para confinamiento de muros F'C= 3000 PSI incluye anclajes perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m**	UNIDAD	m3





COLUMNETA

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	0,2	0,15	2,6	4,000	0,31200
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

TOTAL	0,31
ACUMULADO	0
TOTAL PRESENTE ACTA	0,31

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria
ing. Engel Leal
rodriguez
representante
legal
gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	2.8.5Viguetas en concreto sección 12X20 cm o menor, F'C= 3000 PSI, para confinamiento de la mampostería en bloque hueco Incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m	UNIDAD	m3

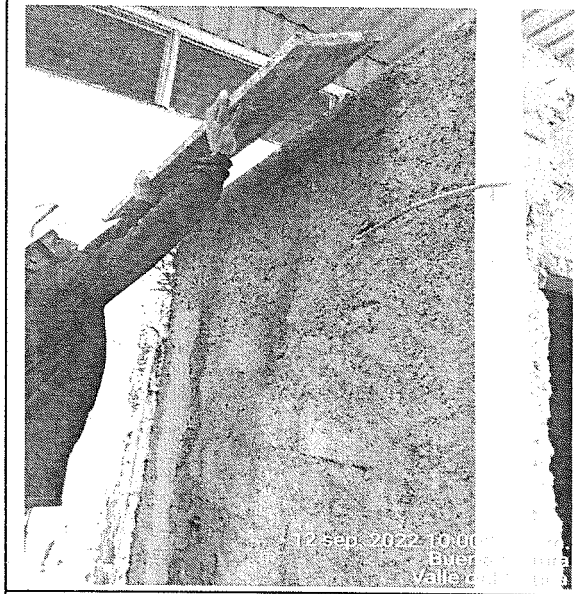

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,175	0,15	0,12	2,000	0,04230
	1,38	0,15	0,12	2,000	0,04968
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					0,092
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					0,09

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA


Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	**2.8.6.Dintel en concreto de 3000PSI. Dimensiones 0.20X0.15m. Estas vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos, pueden hacerse prefabricadas o fundidas en sitio**	UNIDAD	m3

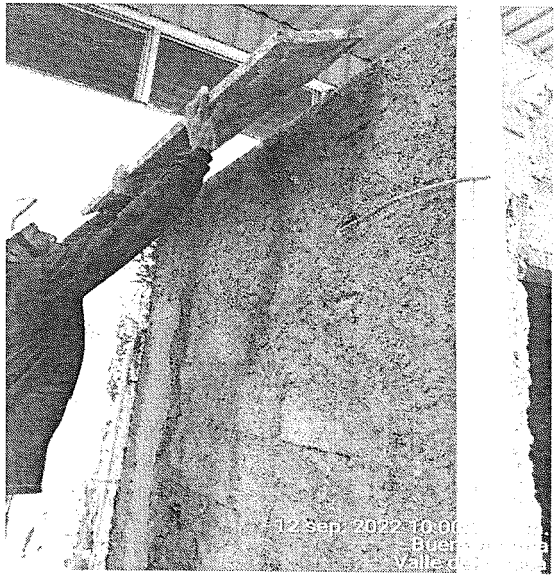

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,01	0,15	0,2	1,000	0,03030
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

TOTAL	0,030
ACUMULADO	0
TOTAL PRESENTE ACTA	0,03

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz
Arq. Maria Jose Herrera Guzman		

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	**2.8.7.Aplicación de Pañete impermeabilizado proporción 1:3, e=1,5 cm Incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.**	UNIDAD	m2

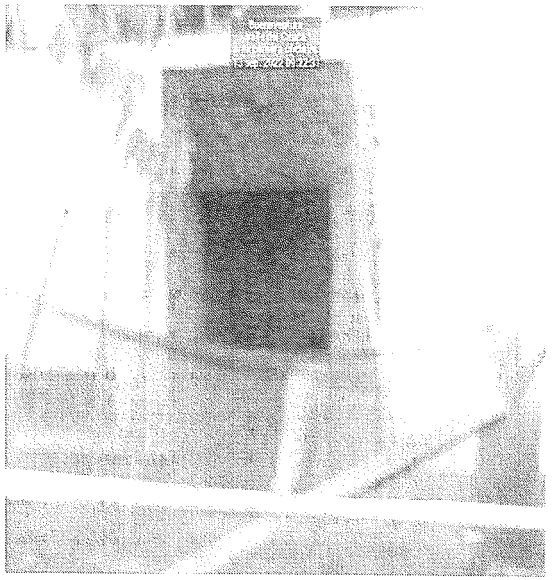

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,16	2,6		1,000	3,01600
	1,175	2,6		4,0	12,22000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					15,24
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					15,24

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS	ITEM	2.8.9. Ejecucion d eplacas macizas aereas en concreto reforzado de fC 3500 psi h+15 cm incluye acero d erefuerzo en acero de 60.000 psi herramientas y materiales necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento	UNIDAD	m2



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
caseta de gas	1,6	1		1,000	1,60000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					1,60
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					1,60

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria
Ing. Ender Leal
rodriguez
representante legal
gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	PASARELA OFICIALES	ITEM	2.12.1Desmonte de cubierta en laminas de policarbonato alveolar altura de la cubierta 2.1 m. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la	UNIDAD	m2

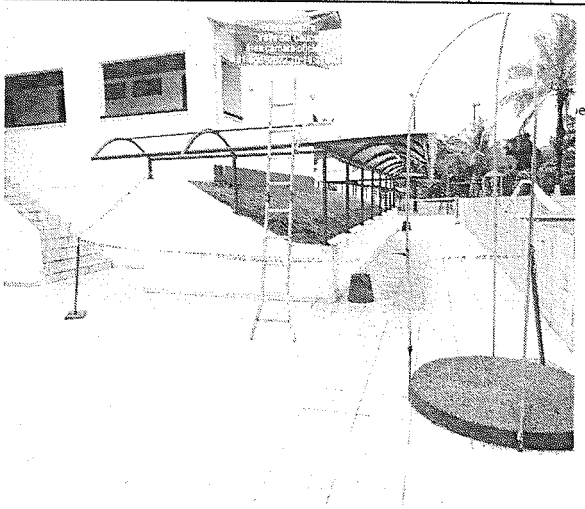

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
PASARELA	35	1,97		1,000	68,95000
					0,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					68,95
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					68,95

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	PASARELA OFICIALES	ITEM	2.12.2.Suministro e instalación de cubierta de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con ancho útil de 2.10m. Deberá ser instalado sobre una estructura metálica en forma de arco. Debe ser instalado con conectores de policarbonato, perfiles en U y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalada a una altura máxima de 2.1 mt	UNIDAD	m2

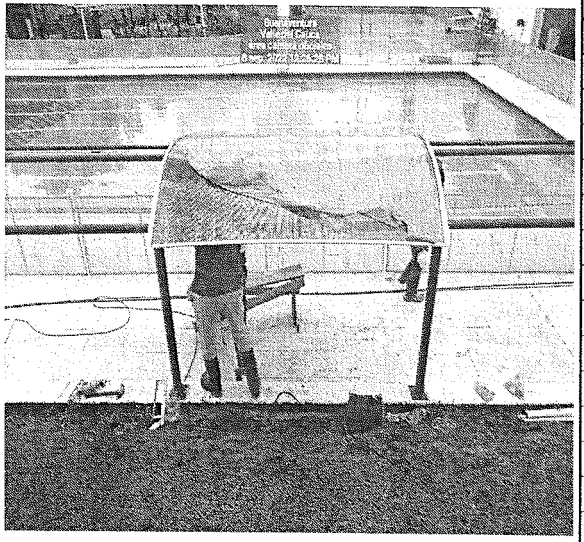

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
PASARELA	35	1,97		1,000	68,95000
					0,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					68,95
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					68,95

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA		NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	COLEGIO NAVAL		2..32.2.Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 4 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 90 mt2 de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotean, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico o PVC, unión esquina exterior-interior, incluye amarres.	UNIDAD	ML



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
COLEGIO NAVAL	3,55	1		8,000	28,40
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					28,40
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					28,40

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

rodriguez
representante
legal
gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA		NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	COLEGIO NAVAL		2.32.1Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC almazonas PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135 mm x 159,8 mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms	UNIDAD	ML

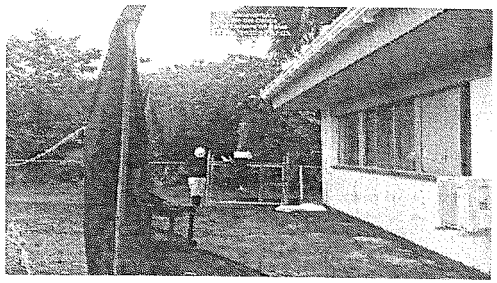

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
COLEGIO NAVAL	45	1		2,000	90,00
	12			1,0	12,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					102,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					102,00

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz
Arq. Maria Jose Herrera Guzman		

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA		**2.31.2Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte topquality Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.**	UNIDAD	ML

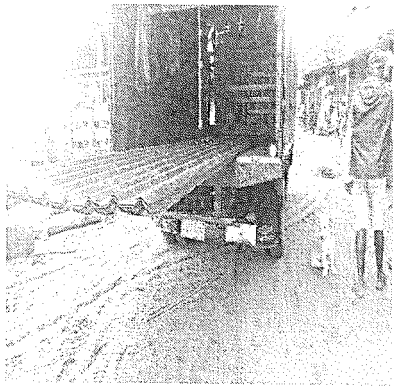

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	37	1		1,000	37,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					37,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					37,00

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA


Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA		2.51.13Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)	UNIDAD	M2

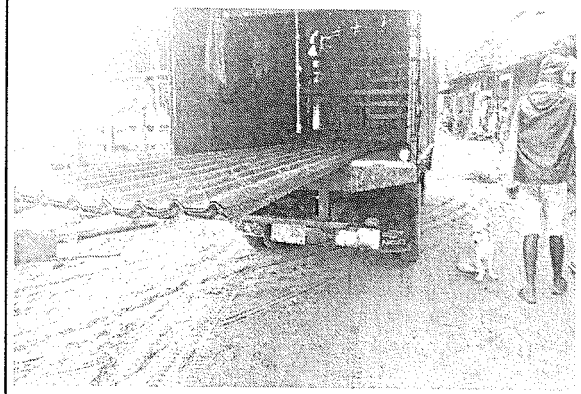



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	37	12,8		1,000	473,60
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					473,60
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					473,60

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA


Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA		**2.30.1.Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada**	UNIDAD	M2

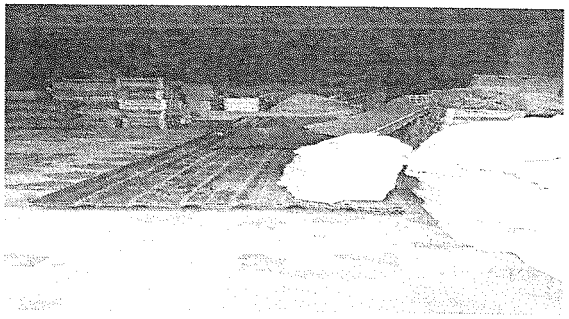



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	37	12,8		1,000	473,60
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					473,60
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					473,60

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.6.Suministro e instalación válvula bola 3" en bronce (incluye bridas, empaques, tornillería y todos las herramientas y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UNIDAD	UND

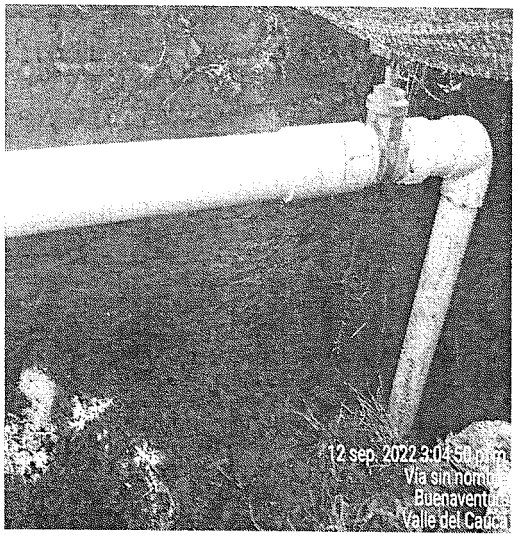

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA				1,000	1,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

TOTAL	1,00
ACUMULADO	0
TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.5Relleno compactado a maquina con material de sitio según criterio de la interventoría	UNIDAD	M3

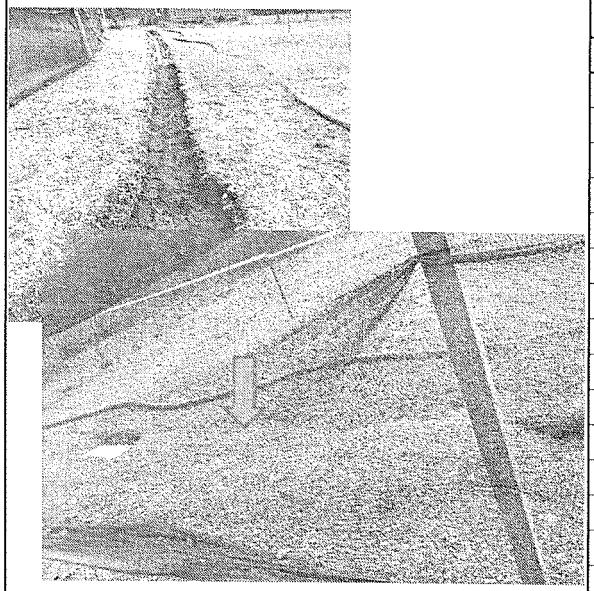

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	44,2	0,6	0,4	1,000	10,61
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

TOTAL	10,61
ACUMULADO	0
TOTAL PRESENTE ACTA	10,61

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

Ing. Ender Leal
rodriguez
representante legal
gecointeg

Vo.Bo. Supervisor


Tk.Andres Ortiz


FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.4.Suministro e instalacion de Tubería pvc unión mecánica diámetro 3" rde 21 incluye accesorios (uniones, codos, tee, tapón, collar derivación, etc)	UNIDAD	ML

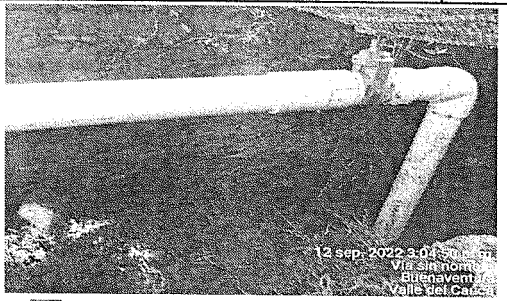

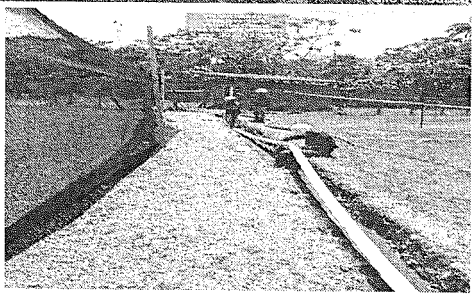

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	0	0	0	44,200	44,20000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					44,20
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					44,20

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

Ing. Ender Leal rodriguez
representante legal
gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.23.Suministro e instalación de Base en arena para encamado de tubería, espesor mínimo 10 cm	UNIDAD	ML

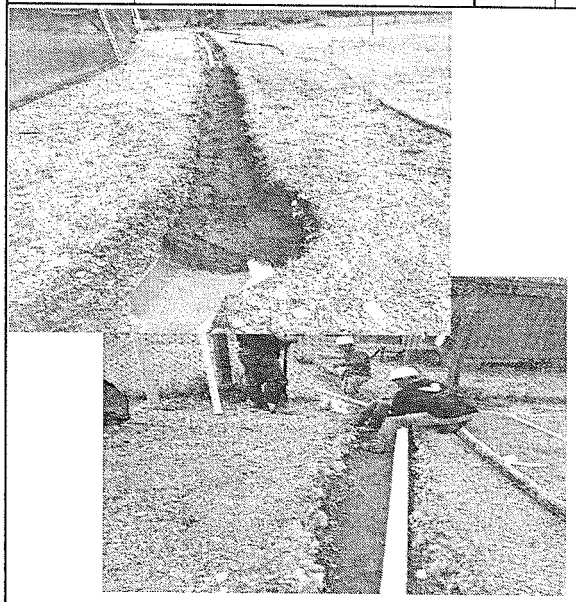

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	0	0	0	44,200	44,20000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					44,20
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					44,20

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

Ing. Ender Leal rodriguez
representante legal
gecointeg

Vo.Bo. Supervisor


Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.2Suministro e instalación de reducción PVC presión 6" a 3"	UNIDAD	UND

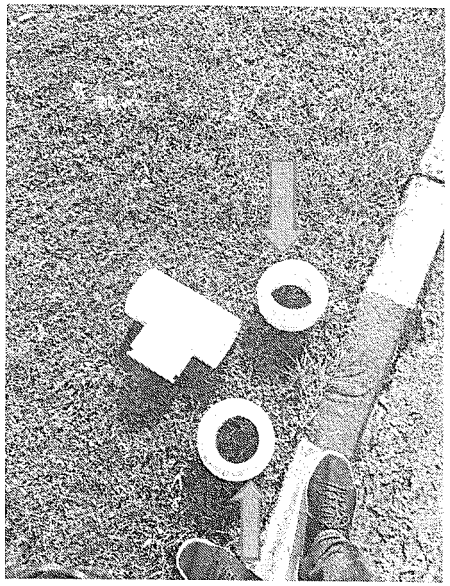

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidraulica escuela contra incendios FSUPA	0	0	0	2,000	2,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					2,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					2,00

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria
ing. Ender Leal
rodriguez
representante legal
gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.22.1.Suministro e instalacion de TEE 6" PVC PRESION C900	UNIDAD	UND

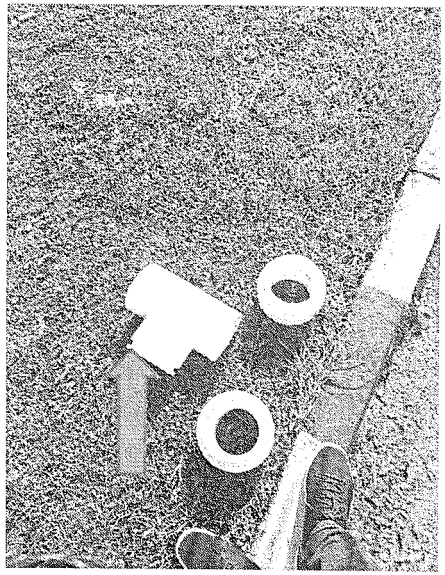

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	0	0	0	1,000	1,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					1,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					1,00

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA


Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.21.3.Desmonte del codo existente, incluye reparación tramo tubería hidráulica	UNIDAD	UND

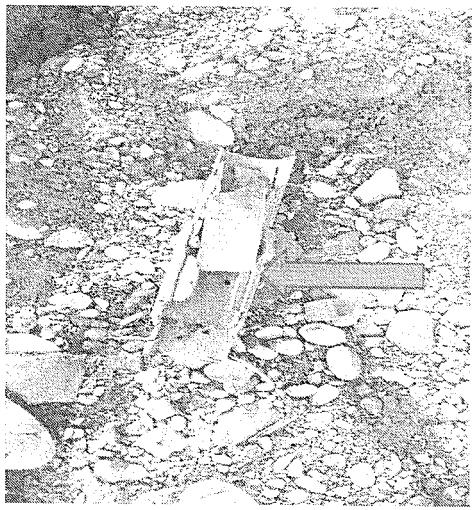

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	0	0	0	1,000	1,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					1,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					1,00

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista

Representante legal

Arq. Maria Jose Herrera Guzman

Vo.Bo. Interventoria

Ing. Lider Leal

rodriguez

representante legal

gecointeg


Vo.Bo. Supervisor

Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.21.2Excavación manual en material común ancho 0,7 m profundidad no mayor a 1,5 m (Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes)	UNIDAD	M3

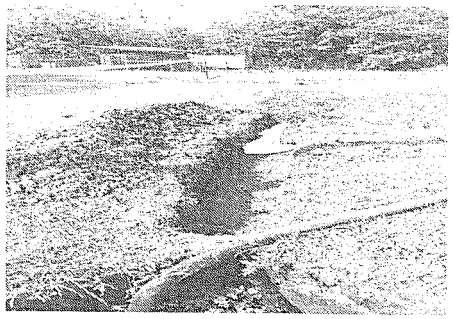



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	44,2	0,6	0,5	1,000	13,26000
	1	1	1,8	1,0	1,80000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					15,06
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					15,06

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022

CAPITULO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	ITEM	2.21.1Localización trazado y replanteo topográfico	UNIDAD	ML



FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA	0,8	0		1,000	0,80000
	1,4			1,0	1,40000
	42			1	42,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					44,20
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					44,20

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista Representante legal Arq. María Jose Herrera Guzman	Vo.Bo. Interventoria Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Vo.Bo. Supervisor Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	ITEM	2.17.2Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 400 cm x 40 cm, 1 fija de 2 m y 2 correderas de 1 m cada una. Incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventanería	UNIDAD	UND

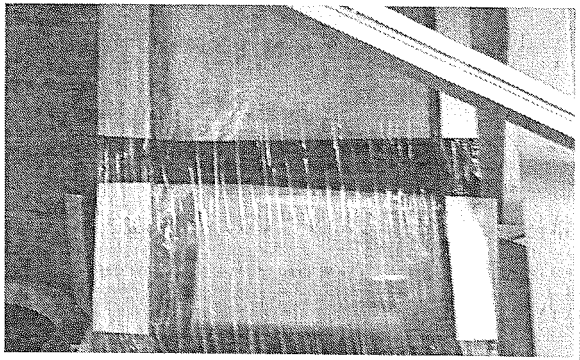

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
COMPANIA DE SEGURIDAD	1	1		2,000	2,00000
					0,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

TOTAL	2,00
ACUMULADO	0
TOTAL PRESENTE ACTA	2,00

OBSERVACIONES:


PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal Arq. Maria Jose Herrera Guzman	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	6	9	22	OBRA	ARC MALAGA	CORTE No.	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2	No. CONTRATO	073 ARC -CBNL02-2022
INTERVENTORIA	UT GECOINTEG 202	NIT		No. CONTRATO	72 ARC -CBNL02-2022
CAPITULO	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	ITEM	**2.17.1.Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 100 cm x 40 cm, 1 fija y 1 corredera incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventanería averiada**	UNIDAD	UND

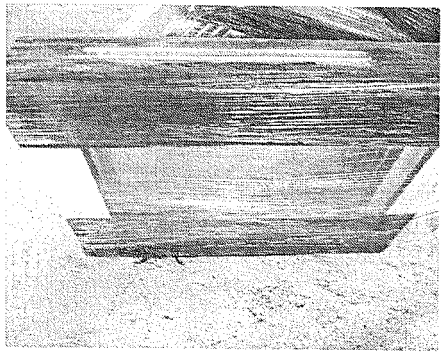

FRENTE DE OBRA:

Localización	Largo	Ancho	Altura	Cantidad	Subtotal
COMPANIA DE SEGURIDAD	1	1		9,000	9,00000
					0,00000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL					9,00
ACUMULADO					0
TOTAL PRESENTE ACTA					9,00

OBSERVACIONES:

PLANO ANEXO O MEMORIA GRAFICA

Vo.Bo. Contratista	Vo.Bo. Interventoria	Vo.Bo. Supervisor
Representante legal	Ing. Ender Leal rodriguez representante legal gecointeg	Tk.Andres Ortiz
Arq. Maria Jose Herrera Guzman		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 C B 0 0 1 E C 4 9 F 4 B 2 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3195231 de TABIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 54824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.195.231**

BELTRAN HERNANDEZ


APELLIDOS

LUIS FRANCISCO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAR-1963**

TABIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1981 TABIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1527100-00181091-M-0003195231-20090926 0016586018A 1 30824997

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
61655953	07/09/2022				33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	N	12/09/2022	61786689	$324.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	321.000				321.000	10	3.000	324.000			3.210	324.000	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	321.000	324.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	321.000	324.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c.		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
61655953	07/09/2022	N	12/09/2022	61786689	EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08				$324.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030599348	PEÑA SALAMANCA CAMILO ANDRES	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
2	CC	80859302	CARDOZO CASTRO HECTOR ELIECER	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSC34	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
3	CC	1193580410	QUIÑONEZ TORRES KEVIN	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC62	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
4	CC	79715006	RODRIGUEZ TRIANA RULBER	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
5	CC	80363662	CASTRO LEYVA JAIME	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
6	CC	1087132524	LUNA CORTES CESAR ALI	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
7	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
8	CC	79814717	PEÑA CONSUEGRA JOSE MARTIN	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
9	CC	79346480	NARVAEZ MUÑOZ JAIME ARTURO	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
10	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
11	CC	1120503752	RONCANCIO MOSQUERA FABIAN	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
12	CC	1000033791	GONZALEZ AMAYA HAENZZ LEONARDO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
13	CC	1111764406	CONRADO RIASCOS LUIS HERNANDO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
14	CC	4196911	FLORIAN FORERO LUIS EVELIO	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
15	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
16	CC	16485473	LOPEZ GUAITOTO MANUEL ANTONIO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
17	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
18	CC	5174773	RIASCOS WAITOTO DARIO	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
19	CC	1026187112	MOSQUERA ASPRILLA ALBERTO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC62	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
20	CC	1120499797	RONCANCIO MOSQUERA EDWIN RICARDO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
21	CC	19100952	ROJAS JESUS ANTONIO	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
22	CC	91288459	PEREZ PULIDO IVAN ELISEO	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
23	CC	80253529	ROJAS ACERO RONAL GILDARDO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
24	CC	79900840	PARDO HERNANDEZ HERNAN	1	0			N	X																231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
25	CC	80422034	PEÑA CONSUEGRA JOSE MIGUEL	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
26	CC	80471876	HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO	1	0			N	X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS001	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
27	CC	52440227	RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA DANELLY	1	0			N	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS001	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
28	CC	1151444702	CAMACHO TENORIO JOSE EINER	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
29	CC	8057363	LOPEZ CRUZ CARLOS YAMITH	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
30	CC	79774751	TORRES SEGURA WILSON	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
31	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
32	CC	79837895	RODRIGUEZ TRIANA JOSE MAURICIO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
33	CC	80128293	YARA LUNA LUIS	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
