
DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
0		**DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30**	**388,63 días**	**lun**	**lun**	**1%**	**$**	**0 horas**
1		**ACTIVIDADES PRECONSTRUCCION**	**35 días**	**sáb 06/08/22**	**mié 14/09/22**	**0%**	**547.120,00**	**0 horas**
7		**LIBERACIONES, DESMONTES Y**	**126,25 días**	**jue 09/06/22**	**vie 28/10/22**	**44%**	**$**	**0 horas**
8		**ACABADO DE CUBIERTA- TERRAZAS**	**15 días**	**lun 11/07/22**	**mié 27/07/22**	**45%**	**$**	**0 horas**
9		LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA	10 días	lun 11/07/22	jue 21/07/22	52%	868.000,00	0 horas
10		DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN	15 días	lun 11/07/22	mié 27/07/22	47%	373.703,00	0 horas
11		DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN	15 días	lun 11/07/22	mié 27/07/22	0%	565.526,00	0 horas
12		DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TE	10 días	lun 11/07/22	jue 21/07/22	52%	496.092,00	0 horas
13		LIBERACIÓN DE CANALES Y BAJANTES	11 días	lun 11/07/22	vie 22/07/22	100%	778.075,00	0 horas
14		LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y EI	15 días	lun 11/07/22	mié 27/07/22	43%	772.725,00	0 horas
15		DESMONTE DE TEJA TRASLUCIDA EN (	15 días	lun 11/07/22	mié 27/07/22	40%	529.212,00	0 horas
16		**ESTRUCTURAS EN CUBIERTA**	**90 días**	**lun 20/06/22**	**mié 28/09/22**	**10%**	**386.160,00**	**0 horas**
18		**ESTRUCTURA CUBIERTA (TIRANTES)**	**60 días**	**sáb 06/08/22**	**mié 12/10/22**	**33%**	**$**	**0 horas**
19		DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL D	30 días	sáb 06/08/22	jue 08/09/22	0%	170.071,00	0 horas
20		DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTC	30 días	sáb 06/08/22	jue 08/09/22	0%	562.984,00	0 horas
21		DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTC	30 días	lun 29/08/22	vie 30/09/22	100%	388.160,00	0 horas
22		**ENTRECUBIERTA**	**90 días**	**lun 20/06/22**	**mié 28/09/22**	**100%**	**149.291,00**	**0 horas**
23		LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIE	90 días	lun 20/06/22	mié 28/09/22	100%	149.291,00	0 horas
24		**PAÑETE CIELO RASO pisos 1 y 2**	**46 días**	**mar 21/06/22**	**mié 10/08/22**	**19%**	**263.898,00**	**0 horas**
25		DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRY'	20 días	mar 21/06/22	mié 13/07/22	100%	563.372,00	0 horas

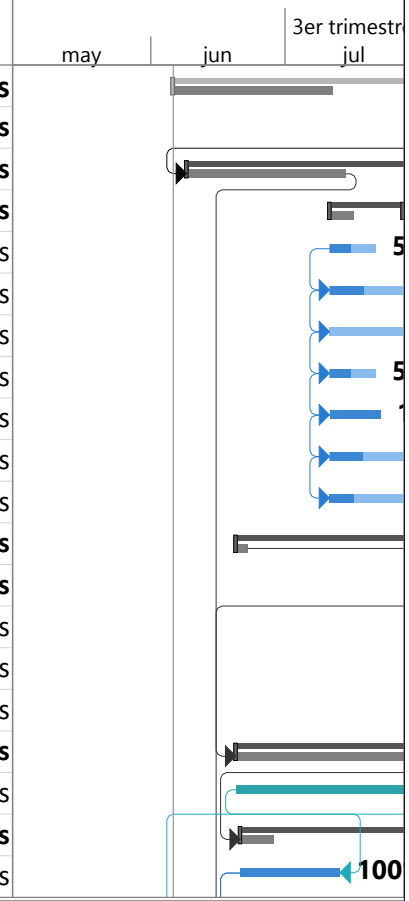

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
26		DESMONTE PARCIAL DE PAÑETES (13	10 días	mar 21/06/22	vie 01/07/22	4%	456.244,00	0 horas
27		DESMONTE DE CORNISAS EN VESTÍBU	15 días	mar 21/06/22	jue 07/07/22	0%	220.974,00	0 horas
28		LIBERACIÓN DE PLACAS EN CONCRET	30 días	jue 07/07/22	mié 10/08/22	0%	357.715,00	0 horas
29		DESMONTE ENCHAPES EN CIELORRAS	30 días	jue 07/07/22	mié 10/08/22	0%	565.593,00	0 horas
30		**PISOS Y ENTREPISOS (1 Y 2 PISO)**	**69 días**	**lun 13/06/22**	**lun 29/08/22**	**39%**	**$**	**0 horas**
31		LIBERACIÓN DE PISOS EN TABLETA DE	10 días	lun 13/06/22	jue 23/06/22	100%	567.860,00	0 horas
32		LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POI	10 días	jue 23/06/22	mar 05/07/22	100%	831.499,00	0 horas
33		LIBERACIÓN DE PISOS EN MADERA M	10 días	mié 29/06/22	sáb 09/07/22	0%	411.439,00	0 horas
34		LIBERACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DI	9 días	lun 11/07/22	mié 20/07/22	61%	487.247,00	0 horas
35		LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PL	9 días	vie 15/07/22	mar 26/07/22	85%	122.628,00	0 horas
36		LIBERACIÓN DE MORTEROS SOBRE PL	9 días	lun 01/08/22	mié 10/08/22	0%	217.263,00	0 horas
37		LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEI	9 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22	100%	722.647,00	0 horas
38		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONCRETO	9 días	vie 29/07/22	lun 08/08/22	0%	104.788,00	0 horas
39		LIBERACIÓN DE MADERA TIPO LISTÓN	9 días	mié 03/08/22	sáb 13/08/22	3%	999.655,00	0 horas
40		LIBERACIÓN DE PLACA EN CASETÓN D	9 días	mar 09/08/22	vie 19/08/22	0%	426.300,00	0 horas
41		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPIS	8 días	mar 09/08/22	jue 18/08/22	14%	562.942,00	0 horas
42		LIBERACIÓN DE VIGAS RECIAS DE MAI	7 días	jue 18/08/22	jue 25/08/22	11%	592.822,00	0 horas
43		LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTI	9 días	jue 18/08/22	lun 29/08/22	12%	518.248,00	0 horas
44		**MUROS FACHADA EXTERIOR 1 Y 2**	**71,63 días**	**jue 09/06/22**	**sáb 27/08/22**	**5%**	**$**	**0 horas**
45		LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUE	18 días	jue 09/06/22	mié 29/06/22	16%	300.670,00	0 horas

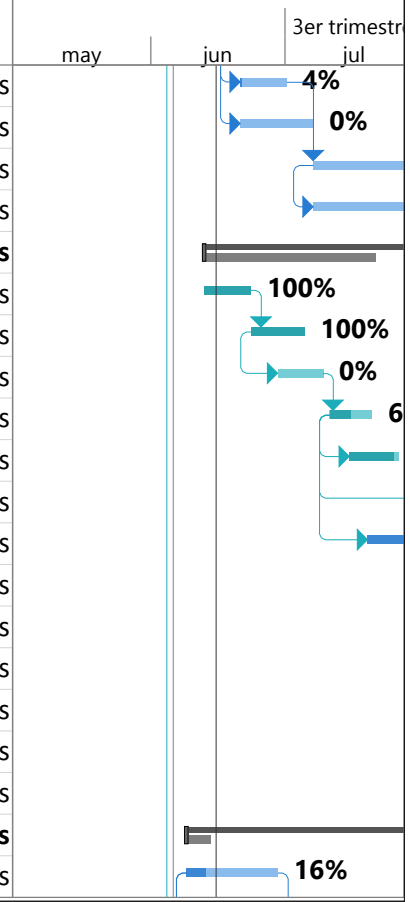

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
46		LIBERACIÓN DE PINTURAS CON AMPC	10 días	mié 29/06/22	lun 11/07/22	0%	922.455,00	0 horas
47		LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SE(	10 días	vie 05/08/22	mié 17/08/22	0%	726.474,00	0 horas
48		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE [	10 días	mié 17/08/22	sáb 27/08/22	0%	893.119,00	0 horas
49		LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICC	10 días	mar 14/06/22	sáb 25/06/22	2%	502.371,00	0 horas
50		LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENT	10 días	vie 22/07/22	mar 02/08/22	13%	255.158,00	0 horas
51		LIBERACIÓN DE PINTURAS VINILO POI	20 días	mié 03/08/22	jue 25/08/22	0%	214.296,00	0 horas
52		**MUROS DIVISORIOS 1 Y 2 PISO**	**90 días**	**lun 13/06/22**	**mié 21/09/22**	**70%**	**498.430,00**	**0 horas**
53		LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SE(	15 días	lun 13/06/22	mié 29/06/22	48%	562.398,00	0 horas
54		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE [	15 días	mié 29/06/22	vie 15/07/22	0%	435.684,00	0 horas
55		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE [	15 días	vie 15/07/22	mar 02/08/22	100%	560.327,00	0 horas
56		LIBERACIÓN DE MUROS EN SISTEMA I	15 días	mar 02/08/22	jue 18/08/22	100%	241.721,00	0 horas
57		DESMONTE DE ENCHAPES EN MADER	30 días	jue 18/08/22	mié 21/09/22	100%	005.038,00	0 horas
58		LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENT	10 días	jue 18/08/22	mar 30/08/22	100%	375.984,00	0 horas
59		LIBERACIÓN DE PINTURAS VINILO POI	10 días	jue 18/08/22	mar 30/08/22	0%	317.278,00	0 horas
60			**60,63 días**	**mar 21/06/22**	**vie 26/08/22**	**33%**	**330.392,00**	**0 horas**
61		LIBERACIÓN DE COLUMNAS EN LADRI	30,63 días	mar 21/06/22	lun 25/07/22	1%	937.912,00	0 horas
62		LIBERACIÓN DE ESCALONES EN BUSCA	30 días	mar 21/06/22	sáb 23/07/22	0%	842.278,00	0 horas
63		LIBERACIÓN DE ESCALERA (E-4) EN PA	30 días	lun 25/07/22	vie 26/08/22	100%	550.202,00	0 horas
64		**SUB BASES Y CIMENTACIONES**	**38 días**	**vie 26/08/22**	**sáb 08/10/22**	**66%**	**$**	**0 horas**
65		LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEI	30 días	vie 26/08/22	jue 29/09/22	100%	527.768,00	0 horas

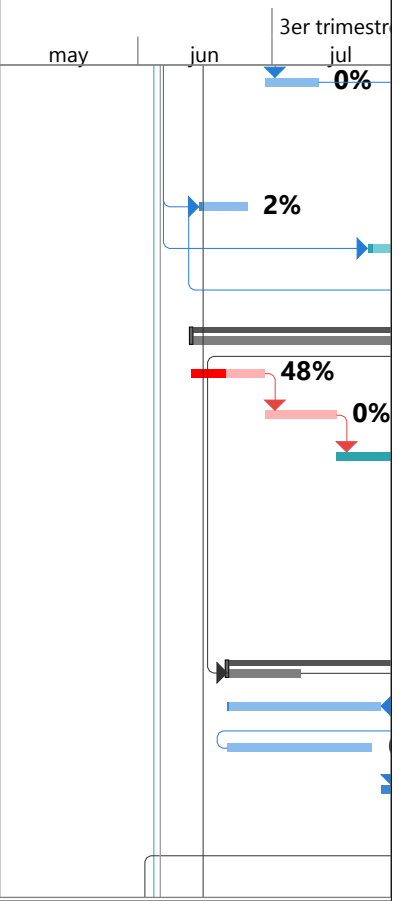

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
66		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONCRETO	30 días	lun 05/09/22	sáb 08/10/22	86%	500.193,00	0 horas
67		LIBERACIÓN DE CONTRAPISO PARA AI	25 días	lun 05/09/22	lun 03/10/22	0%	395.044,00	0 horas
68		**CIMIENTOS**	**90 días**	**mié 08/06/22**	**vie 16/09/22**	**0%**	**962.485,00**	**0 horas**
71		**PUERTAS Y VENTANAS 2 Y 1ER PISO**	**25,63 días**	**vie 10/06/22**	**vie 08/07/22**	**46%**	**$**	**0 horas**
72		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MAD	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	86%	201.292,00	0 horas
73		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MAD	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	43%	419.012,00	0 horas
74		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN META	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	0%	21.375,00	0 horas
75		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN META	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	83%	320.671,00	0 horas
76		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN META	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	100%	64.125,00	0 horas
77		LIBERACIÓN DE MALLAS Y ELEMENTO	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	100%	512.468,00	0 horas
78		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN META	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	0%	183.059,00	0 horas
79		DESMONTE DE DIVISIONES METALICA	20 días	vie 10/06/22	sáb 02/07/22	0%	359.091,00	0 horas
80		**SISTEMAS REDES ELÉCTRICAS Y DE**	**45 días**	**vie 10/06/22**	**sáb 30/07/22**	**100%**	**$**	**0 horas**
81		LIBERACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, RI	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	100%	652.732,00	0 horas
82		LIBERACIÓN SISTEMA CCTV Y VOZ Y D	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	100%	610.647,00	0 horas
83		**SISTEMA REDES HIDRÁULICAS,**	**114,38 días**	**lun 13/06/22**	**mar**	**70%**	**$**	**0 horas**
84		LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y I	30 días	lun 13/06/22	vie 15/07/22	100%	18.974,00	0 horas
85		LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS,	30 días	mié 14/09/22	mar 18/10/22	100%	691.548,00	0 horas
86		DESMONTE DE APARATOS SANITARIO	30 días	mié 14/09/22	mar 18/10/22	9%	616.170,00	0 horas
87		**DEMOLICIONES**	**45 días**	**vie 10/06/22**	**sáb 30/07/22**	**32%**	**969.988,00**	**0 horas**

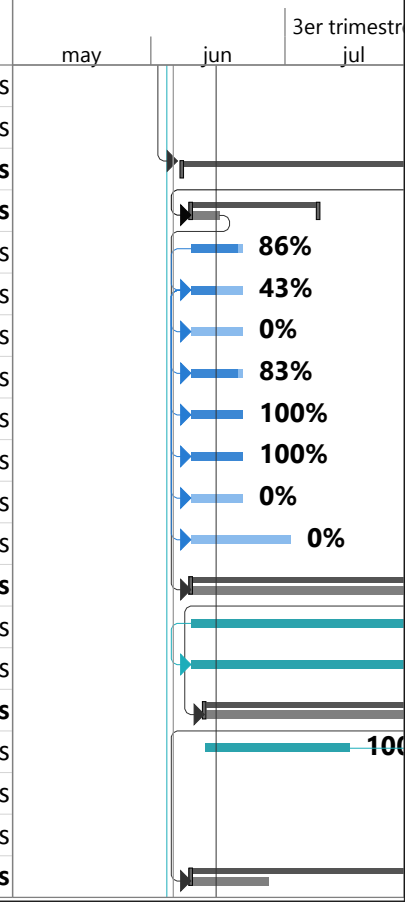

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
88		REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	16%	195.570,00	0 horas
89		DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	86%	398.152,00	0 horas
90		CORTE DE CONCRETO (PISO EXISTENT	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	88%	455.113,00	0 horas
91		ESCARIFICACIÓN Y LIMPIEZA PARA GE	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	0%	135.346,00	0 horas
92		DEMOLICIÓN CONTROLADA DE CONC	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	0%	350.989,00	0 horas
93		DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILL	45 días	vie 10/06/22	sáb 30/07/22	2%	434.818,00	0 horas
94		**EQUIPOS Y FORMALETAS**	**273,25 días**	**lun 20/06/22**	**jue 20/04/23**	**1%**	**468.423,00**	**0 horas**
95		**SOPORTES ESTRUCTURALES**	**73 días**	**mar 05/07/22**	**sáb 24/09/22**	**7%**	**204.949,00**	**0 horas**
96		APUNTALAMIENTO DE MUROS,	33 días	mar 05/07/22	mié 10/08/22	10%	$	0 horas
97		APUNTALAMIENTO DE MUROS,	20 días	jue 11/08/22	vie 02/09/22	10%	$	0 horas
98		APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE	20 días	vie 02/09/22	sáb 24/09/22	0%	$	0 horas
99		**VARIOS**	**180 días**	**sáb 24/09/22**	**vie 14/04/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
102		**CIMENTACIONES**	**237,5 días**	**lun 20/06/22**	**sáb 11/03/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
132		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**312,5 días**	**lun 04/07/22**	**lun 19/06/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
177		**ESTRUCTURA METALICA**	**129,5 días**	**lun 05/09/22**	**jue 26/01/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
193		**ESTRUCTURAS DE MADERA**	**90 días**	**lun 04/07/22**	**mié 12/10/22**	**0%**	**$**	**0 horas**
211		**MAMPOSTERIAS**	**221,25 días**	**lun 24/10/22**	**mié 28/06/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
212		**MAMPOSTERIA EN CONCRETO**	**150,63 días**	**lun 28/11/22**	**sáb 13/05/23**	**0%**	**097.754,00**	**0 horas**
218		**MAMPOSTERIA EN LADRILLO**	**170 días**	**lun 14/11/22**	**mar 23/05/23**	**0%**	**317.069,00**	**0 horas**
224		**ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA**	**190 días**	**lun 28/11/22**	**mié 28/06/23**	**0%**	**239.934,00**	**0 horas**

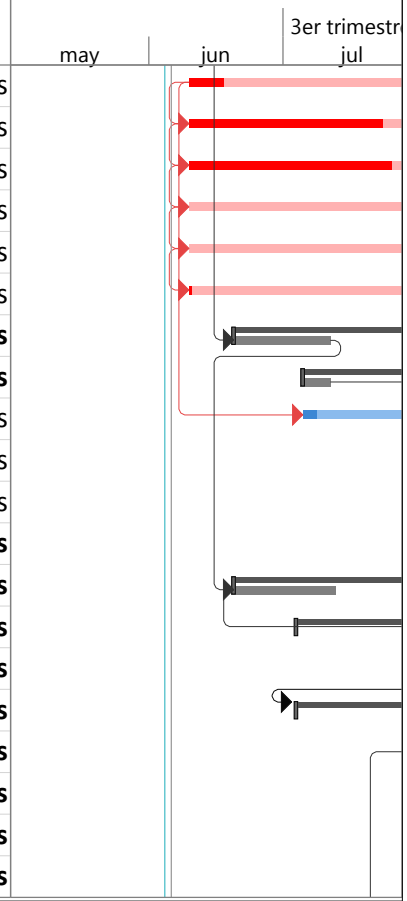

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
234		**PREFABRICADOS Y OTROS**	**140,88 días**	**lun 02/01/23**	**mié 07/06/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
247		**PISOS**	**150 días**	**lun 05/12/22**	**sáb 20/05/23**	**0%**	**944.606,00**	**0 horas**
294		**PAÑETES**	**130 días**	**lun 05/12/22**	**vie 28/04/23**	**0%**	**976.337,00**	**0 horas**
310		**CIELO RASOS, DIVISIONES Y**	**60 días**	**mié 01/02/23**	**sáb 08/04/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
327		**ENCHAPES -ACABADOS**	**110 días**	**lun 23/01/23**	**jue 25/05/23**	**0%**	**700.203,00**	**0 horas**
336		**CARPINTERÍA MADERA**	**140,88 días**	**lun 02/01/23**	**mié 07/06/23**	**0%**	**582.407,00**	**0 horas**
346		**CARPINTERÍA METALICA**	**110 días**	**mié 15/02/23**	**sáb 17/06/23**	**0%**	**781.240,00**	**0 horas**
395		**CUBIERTAS**	**230 días**	**mié 28/09/22**	**lun 12/06/23**	**0%**	**363.561,00**	**0 horas**
419		**PINTURAS**	**177 días**	**lun 05/12/22**	**mar 20/06/23**	**0%**	**281.511,00**	**0 horas**
425		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**71,38 días**	**mar**	**jue 20/07/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
448		**CERRADURAS Y VIDRIOS**	**191 días**	**lun 05/12/22**	**jue 06/07/23**	**0%**	**473.457,00**	**0 horas**
468		**EQUIPOS Y DOTACIONES**	**120 días**	**sáb 01/04/23**	**lun 14/08/23**	**0%**	**047.534,00**	**0 horas**
498		**OBRAS EXTERIORES**	**88,63 días**	**lun 01/05/23**	**lun 07/08/23**	**0%**	**432.827,00**	**0 horas**
503		**INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y**	**330 días**	**lun 25/07/22**	**vie 28/07/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
766		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED**	**319,88 días**	**lun 01/08/22**	**lun 24/07/23**	**0%**	**$**	**0 horas**
1053		**ASEO GENERAL DE OBRA**	**385,25 días**	**jue 09/06/22**	**lun 14/08/23**	**7%**	**539.416,00**	**0 horas**
1054		**GENERAL Y FINAL**	**19,88 días**	**vie 03/02/23**	**vie 24/02/23**	**7%**	**539.416,00**	**0 horas**
1055		ASEO FINAL DE OBRA	16 días	vie 03/02/23	mar 21/02/23	0%	224.274,00	0 horas
1056		ASEO GENERAL DE OBRA MENSUAL	16 días	vie 03/02/23	mar 21/02/23	14%	415.142,00	0 horas
1057						0%	$ 0,00	0 horas

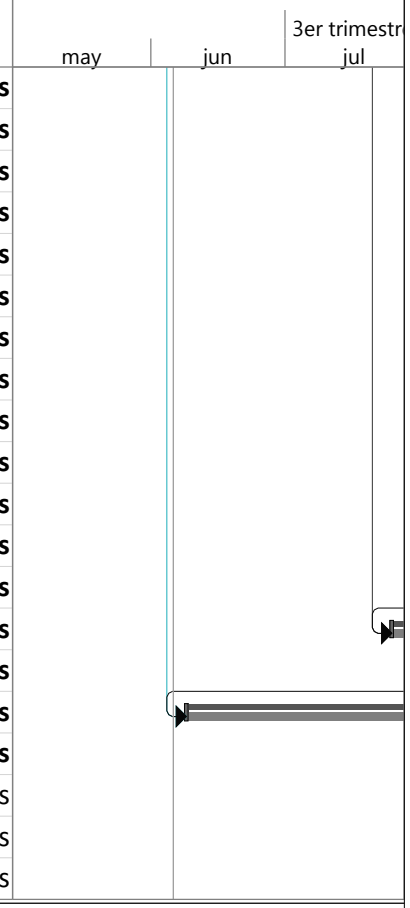


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

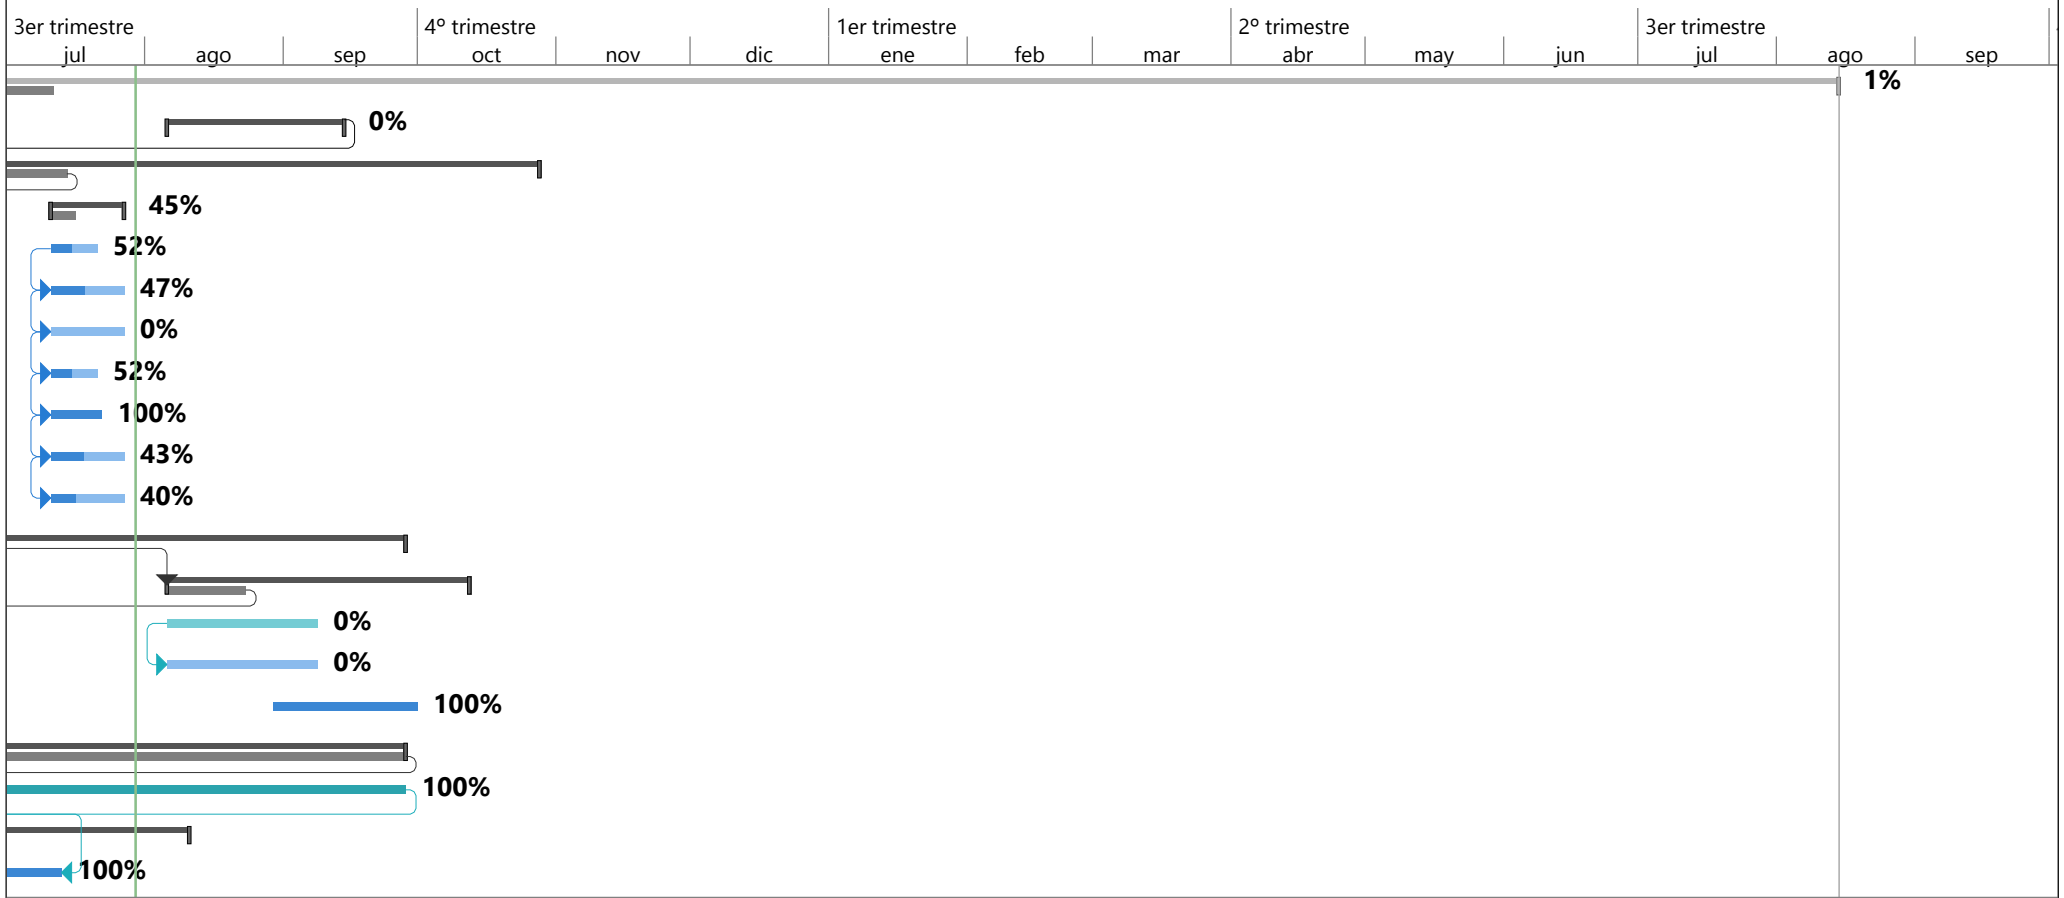


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

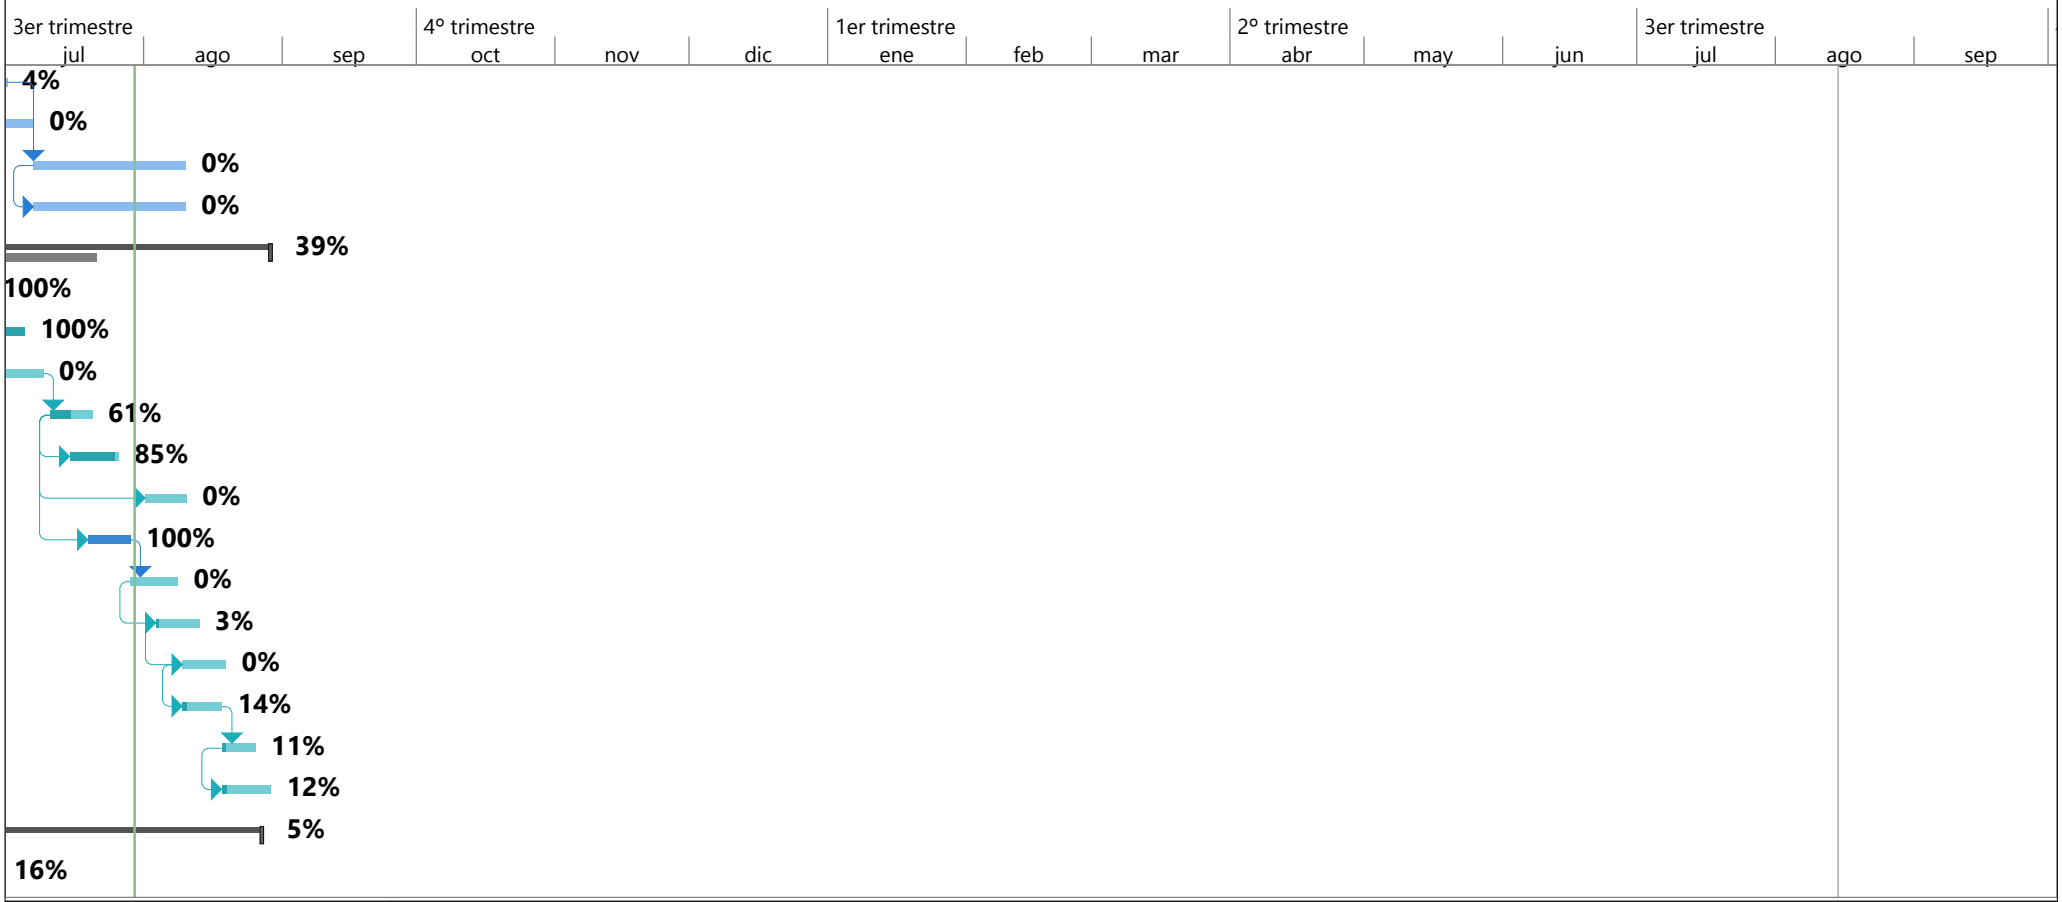


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

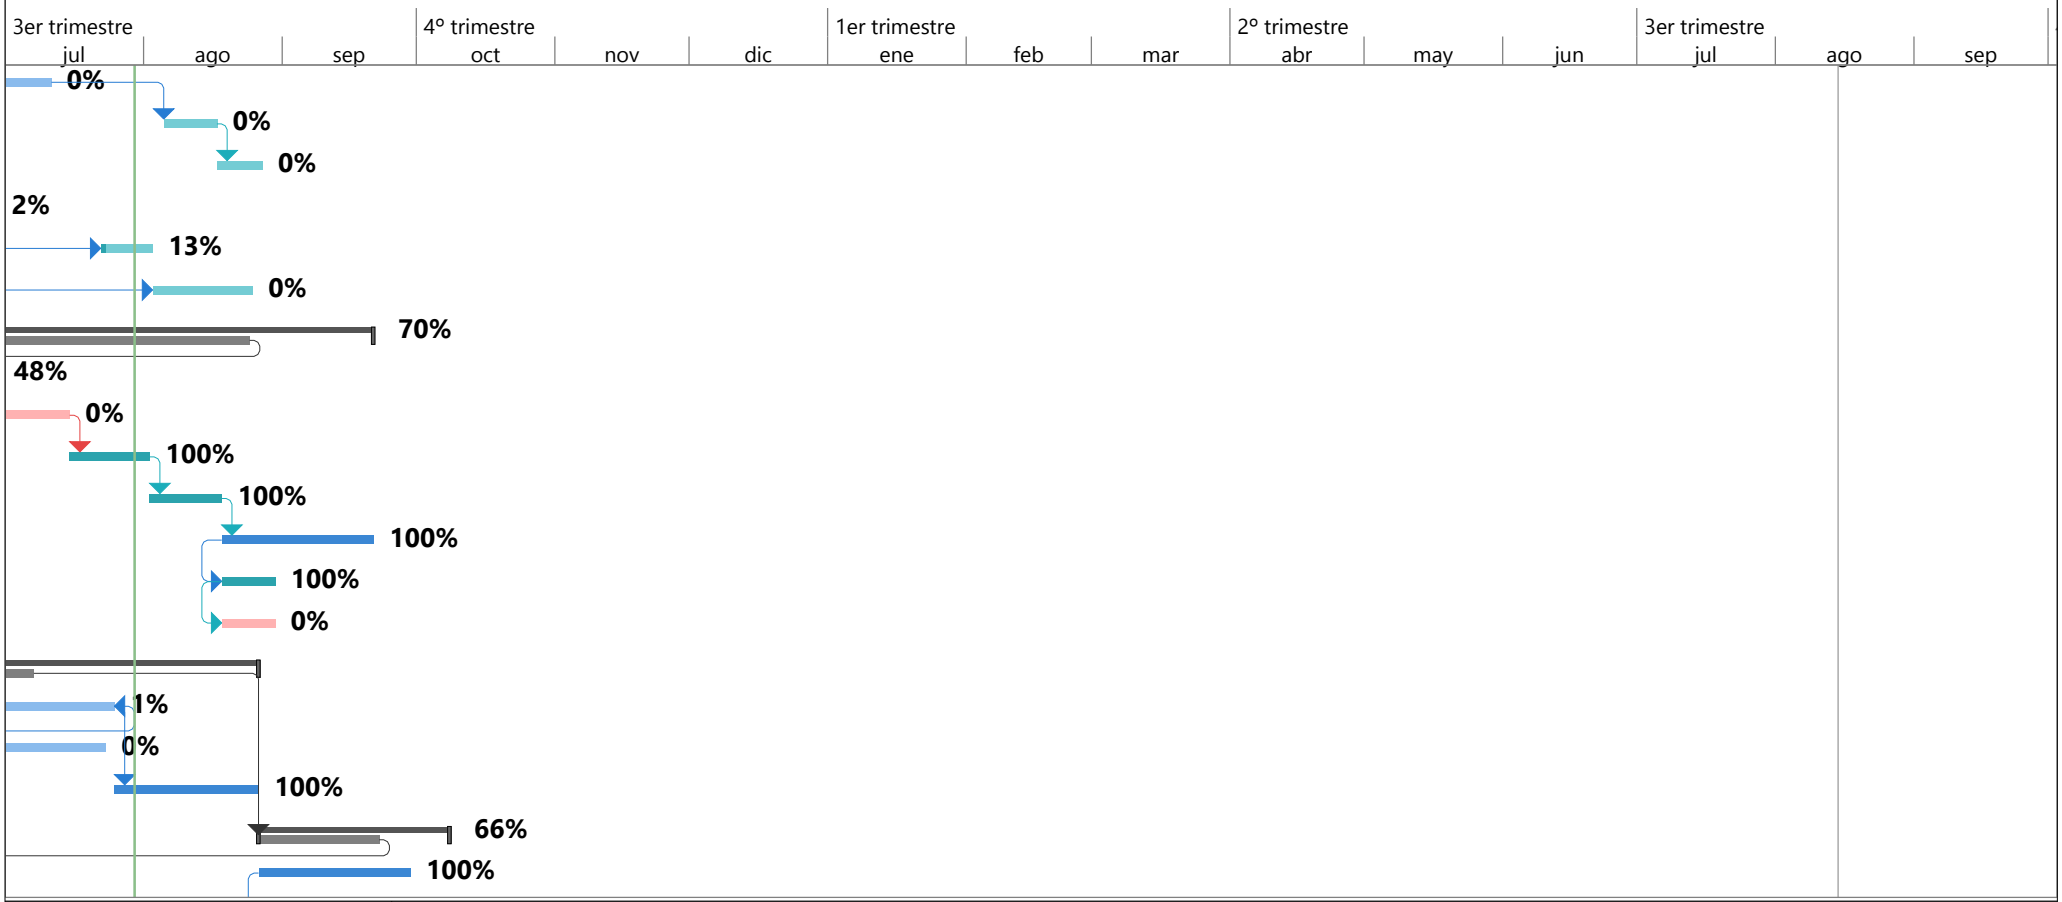


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

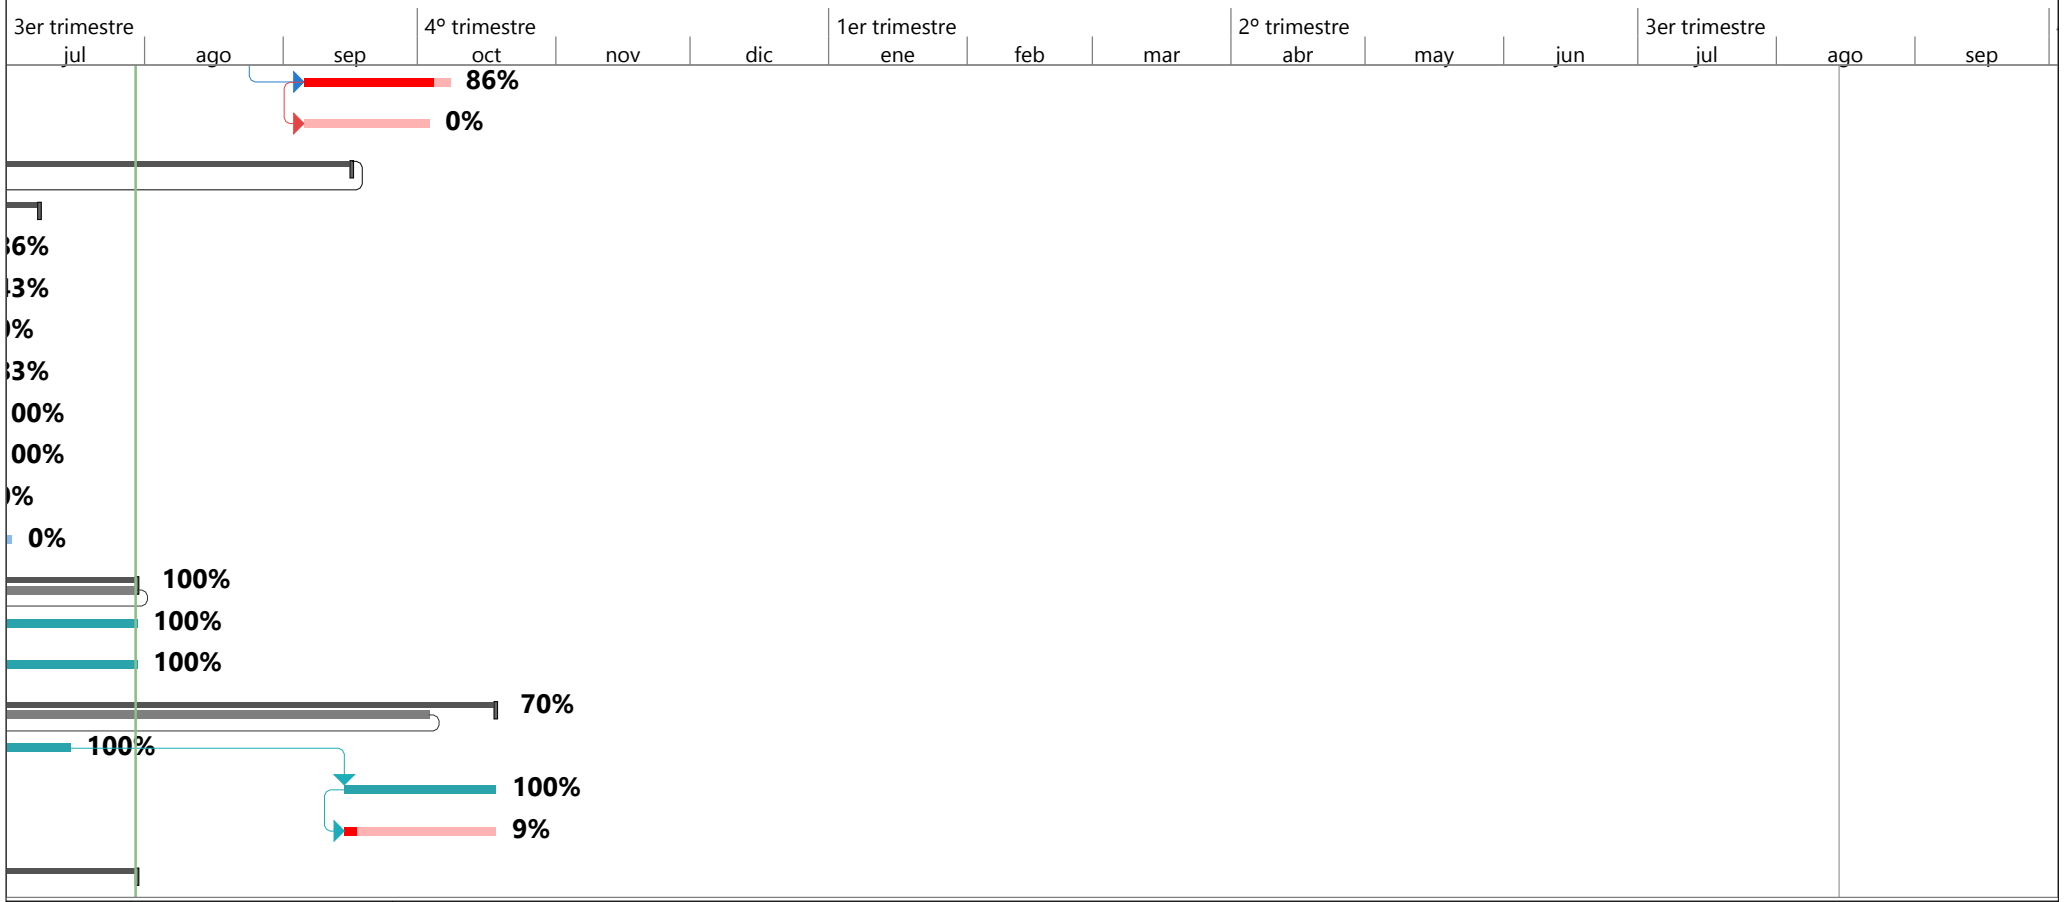


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

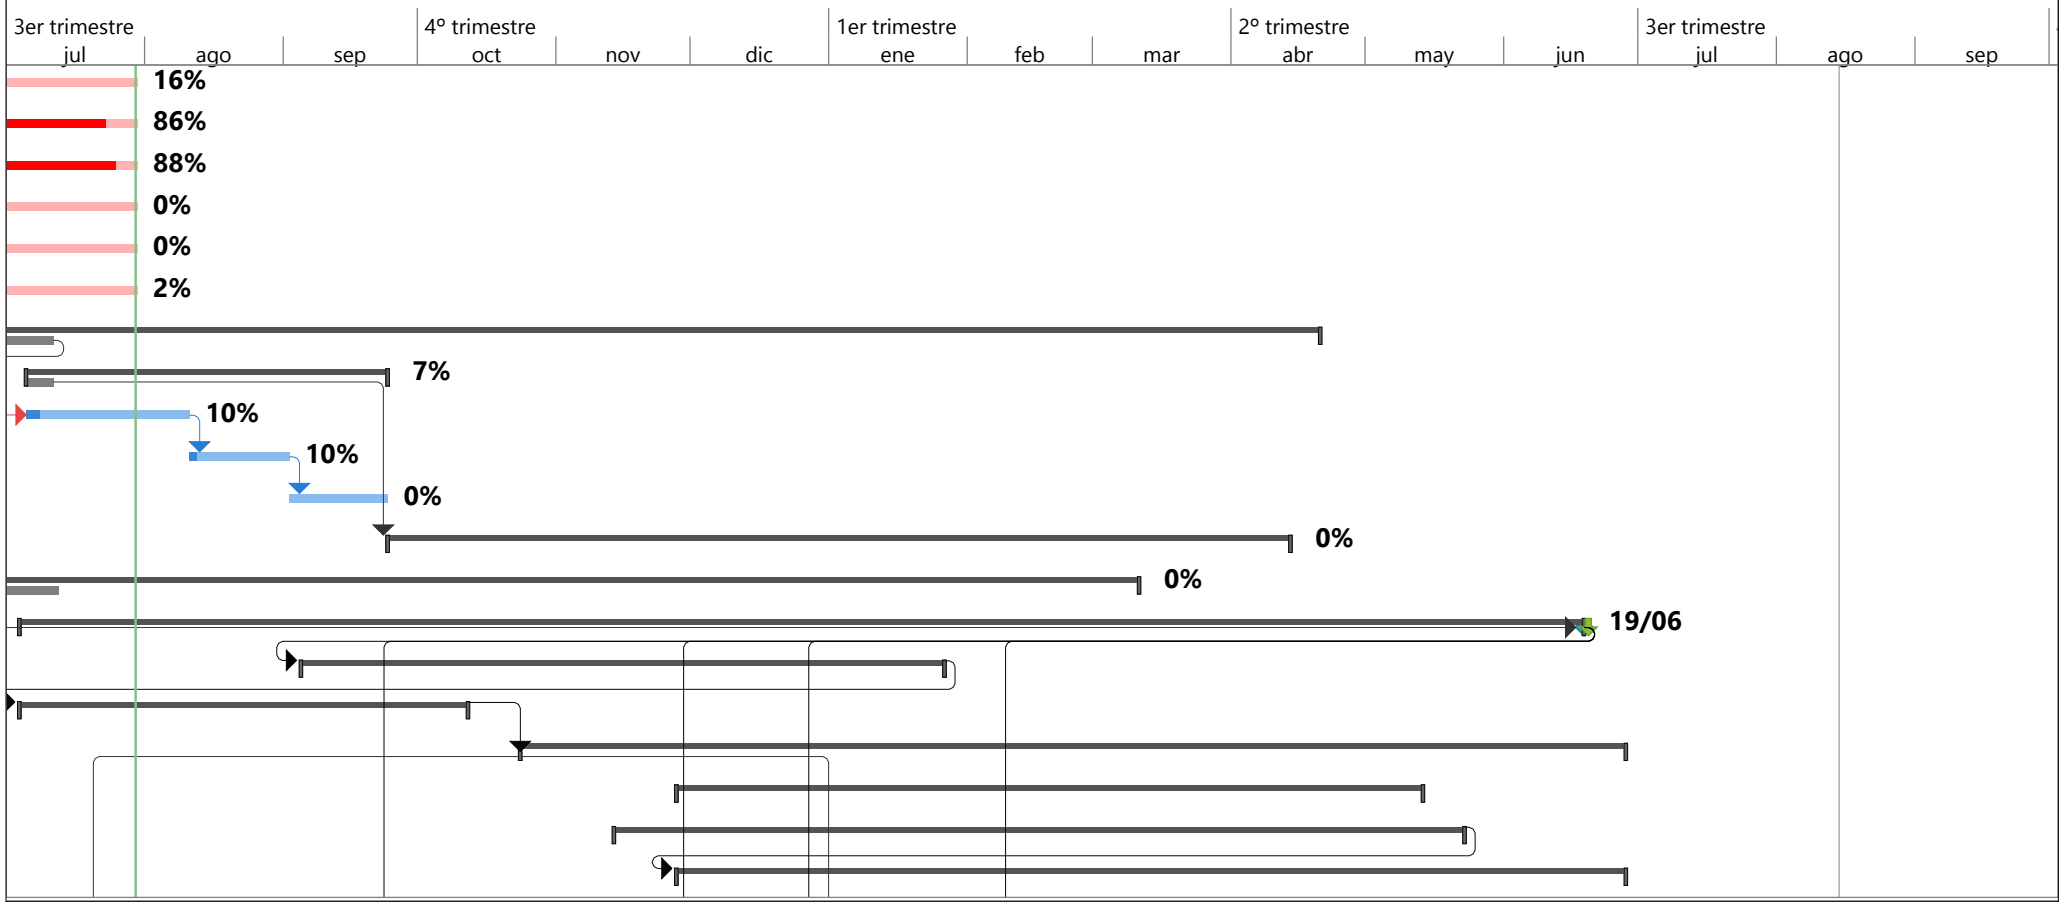

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

DIAGRAMA GANTT SEGUIMIENTO AL 30 DE JULIO

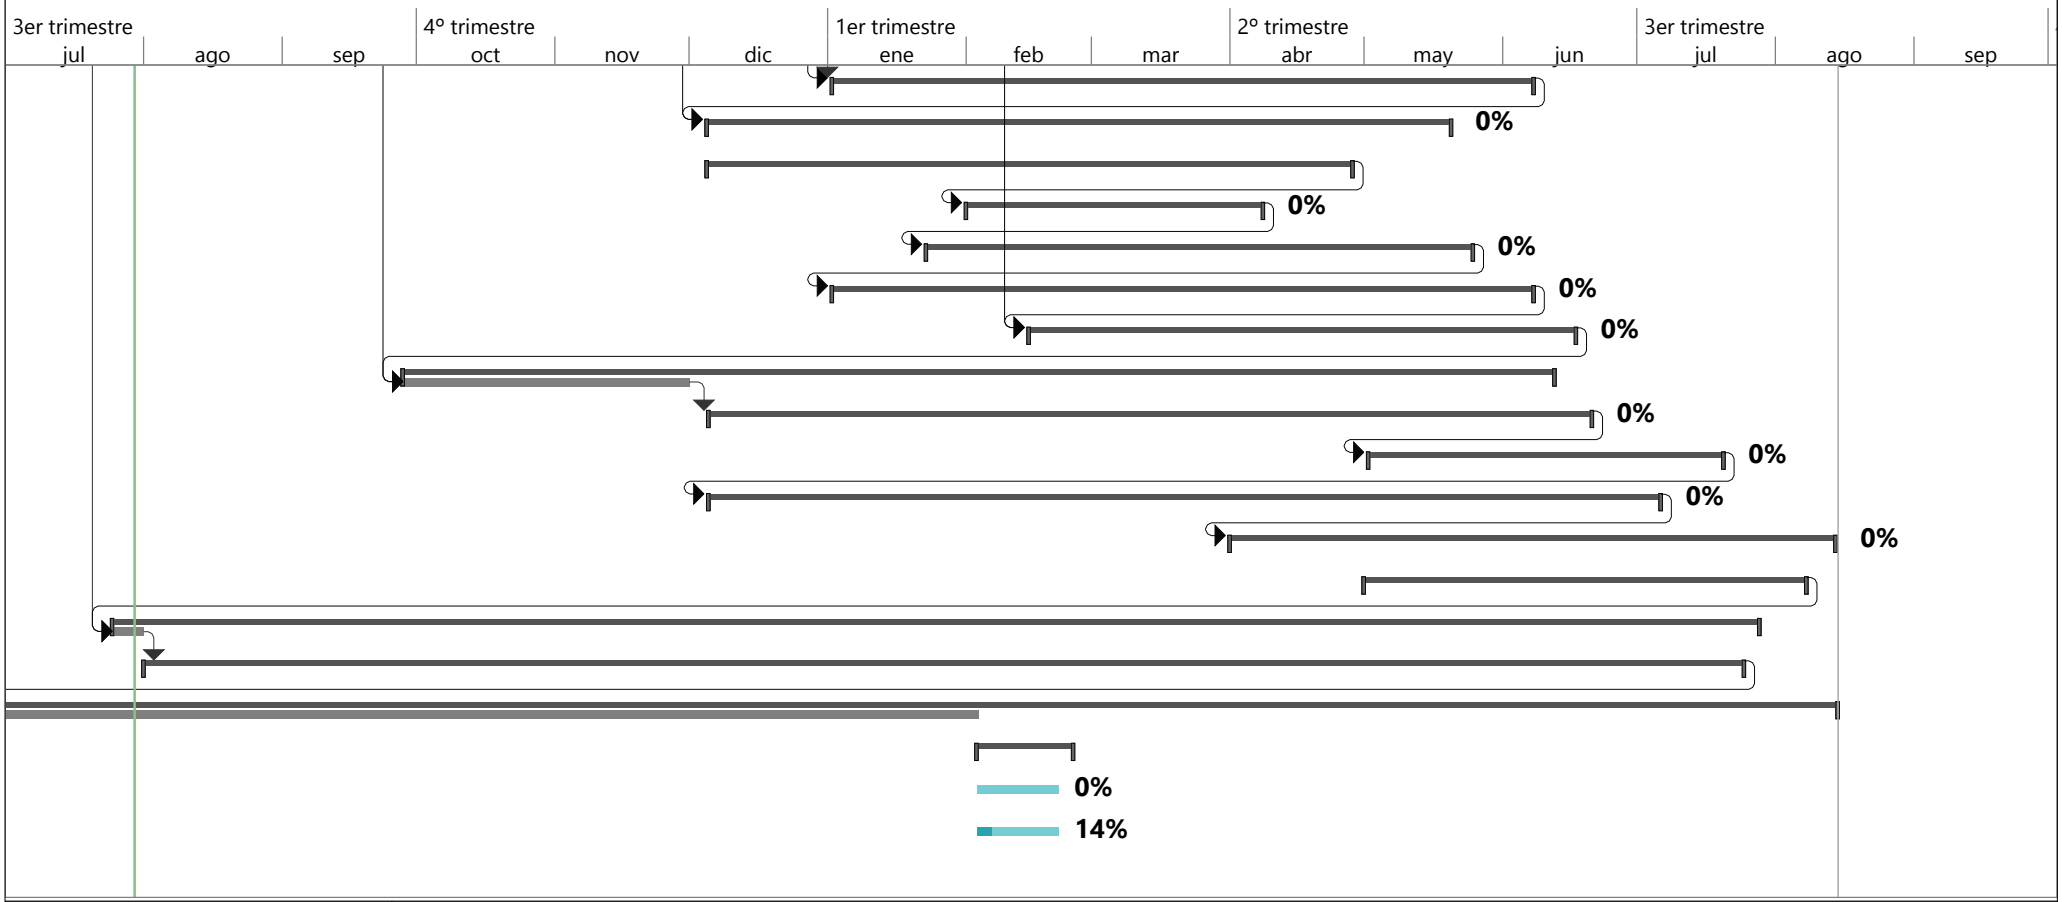

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
