ACTA DE REUNION

ACTA No: 08

FECHA: 19 de julio de 2022

LUGAR: Colegio San Francisco de Asis

HORA INIC: _____ **HORA TERM:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION:

Comité de Seguimiento de Obra

2. ASISTENTES:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Firma
Freddy Peña	Interventoria	
Cristy Gabriel Gonzalez. R.	Interventoria	
Camilo Armando Rodriguez. C.	Interventoria	
Segundisalvo Pardo	Cons. IS	
Ineth D. Vélez R.	Consorcio IS	
Jeyson Camilo Bogotá	consorcio IS	
Ramiro Forero	Consorcio IS	
JERONEY FONSECA L.	INTERVENTORIA.	
Catherine Castañeda G.	EEC	
Edgar Alfonso Aragon	Interventoria	
Oscar Cienfuegos Torres	Consorcio IS	
Sergio Andrés Ortiz Buitrago	Cons IS	
Germán Niño	Consorcio IS	
Claudia P. Niño	Consorcio IS	
CLAUDIA HERNANDEZ	CONSULTORIA	

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA:

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLE	ESTADO
Acta firmada, Entrega predio	EDU	En proceso
Valla Informativa	Contratista	
Sobre cubierta		

5. TEMAS A TRATAR:

- Valla Informativa: El Contratista manifiesta que ya se hizo el pago y se cuenta con todos los documentos para Radicación

Se va realizar la consulta con SED para saber el proceso de radicación y quien lo radicaria.

- Sobre Cubierta: El Contratista manifiesta que se va ajustar el diseño entregado, para poder garantizar un mejor servicio del mismo.

- Visita Especialistas Obra e Interventoria: El Contratista solicita que por parte de la (~~Interventoria~~) consultoria se de una respuesta puntual con respecto a la excavación del tanque de almacenamiento.

Por lo tanto se informa que el dia de hoy se hara una visita por parte del geotechista de obra para revisar este tema.

- Avance: Se tiene un programado 0,57%
  Ejecutado 1,93%

La Interventoria manifiesta que a la fecha se tiene un atraso en las actividades correspondientes al reforzamiento del area de conservación y continua pendiente la claridad (~~respecto~~) por parte del Consultor respecto a los temas del recalce de la cimentación.

- Valla Imagen: Esta pendiente el arte de la valla por parte de SED

- Actas de Vecindad: Se informa que se recibieron las actas de vecindad y se encuentran en revisión y firma de la Interventoria.

- Reunión de Socialización: Se informa que se programo reunion el 22/07/22 a las 10:00AM con el Comite Vecdor.

- Observaciones SST: la Interventoria hace las siguientes recomendaciones:

- Punto de encuentro: Se recomienda hacer la socialización de los puntos con los trabajadores
- Señalización zonas de demolición.
- Señalización preventiva esta OK

- Mejorar la caracterización del personal de Obra
- Identificación punto ecologico
- El PMT se encuentra instalado correctamente.

En este orden de ideas, el Contratista atendera las observaciones dentro del informe mensual

- Estabilizacion tanque de almacenamiento

El Contratista manifiesta que de acuerdo a la entrega y respuesta dada por la Consultoria, no se puede aplicar en el proyecto debido a las dimensiones del tanque.

Por lo tanto, el Contratista propone, hacer la estabilizacion con un entibado metalico el cual debe de garantizar el 20% del incado de los micropilotes acompañado de un anillo de cierre. y liberaderos.

Se anexo propuesta del Contratista.

Asi mismo, Se Solicita a la Consultoria una visita del geotecnista de la Consutoria.

Se programó reunion entre Geotechnistas de Consultoria y Obra el dia 21 de julio de 2022 a las 9am

- Aclaraciones Observaciones Arquitectonicas

1. Alero de acceso: la Consultoria informa que esta pendiente el detalle y se atendera la observación.

2. Estructura Madera modulos 1 y 2: Se dio traslado al especialista estructural de Consultoria


3. Refuerzo Seccion cielo raso: Se dio traslado al especialista estructural de Consultoria

- Sistema de Madera: desde el punto de vista de Conservación la propuesta de reutilización de las maderas de la Cubierta y Certificarlas para Utilización, El la Consultoria Sugiere revisar la posibilidad de utilizar madera laminada
- Diferencia de ~~Alturas~~ Niveles en el arranque de la escalera: la Consultoria socializa que es necesario mantener a 1,26 las zonas de acceso y puerta y manejar un pendientado al 1,30
- Puertos y Ventanas: la consultoria aclara que los diferenciados en la nomenclatura corresponde a nuevo y Originales.


  la Consultoria revisara el Concepto respecto a la PPGO y VN 51
- Detalle Cimentación rampas: la consultoria informa que dara traslado al especialista estructural.

Plano detalle de entibado

Corte Detalle de entibado

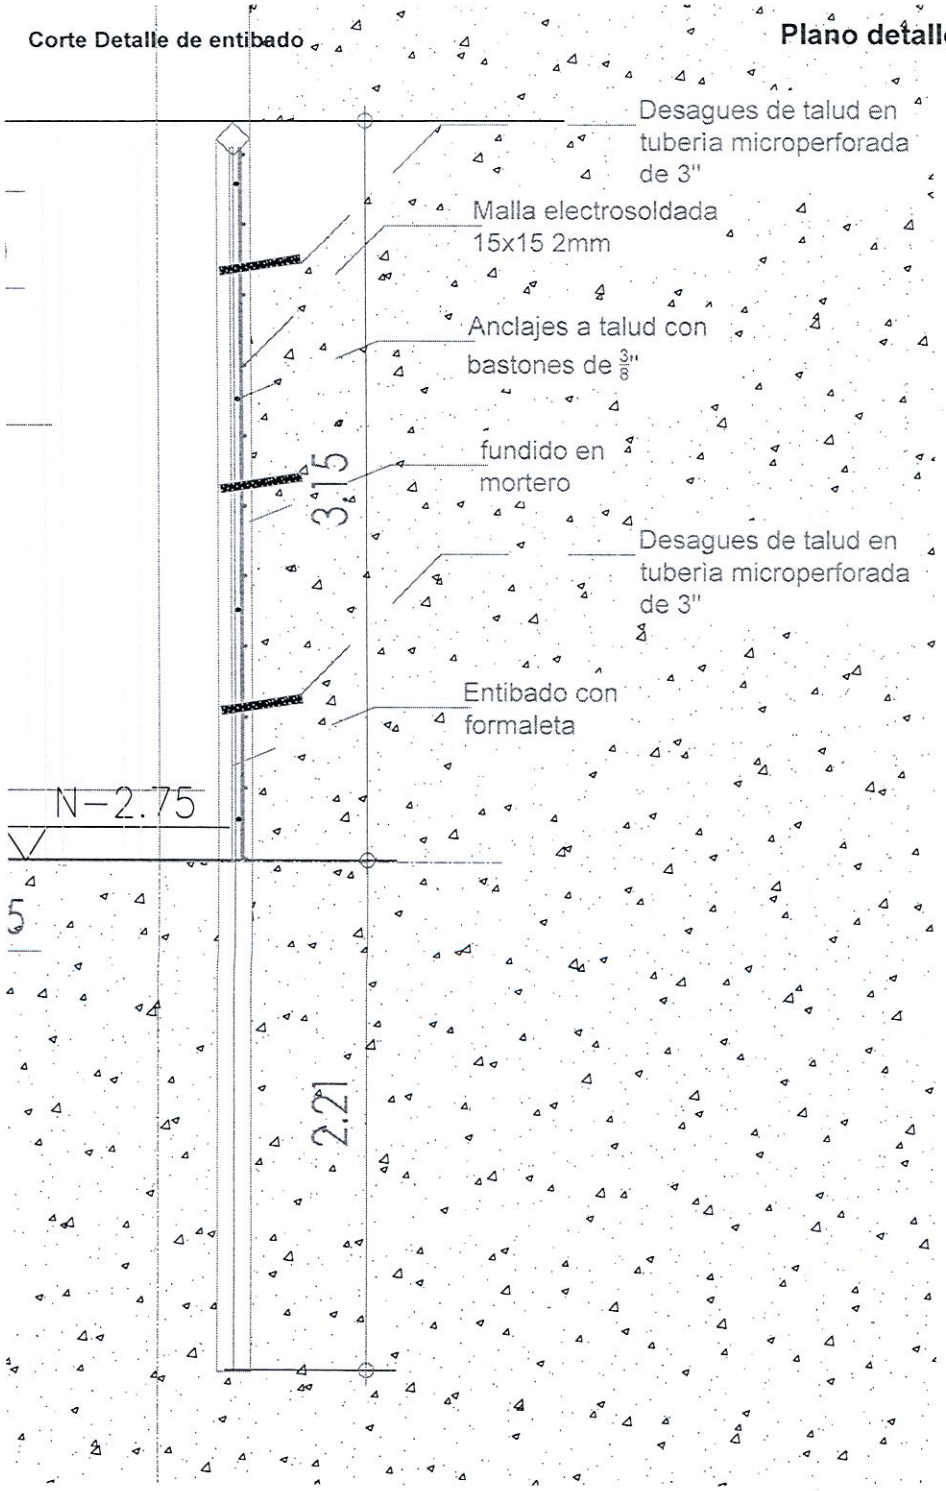

Planta

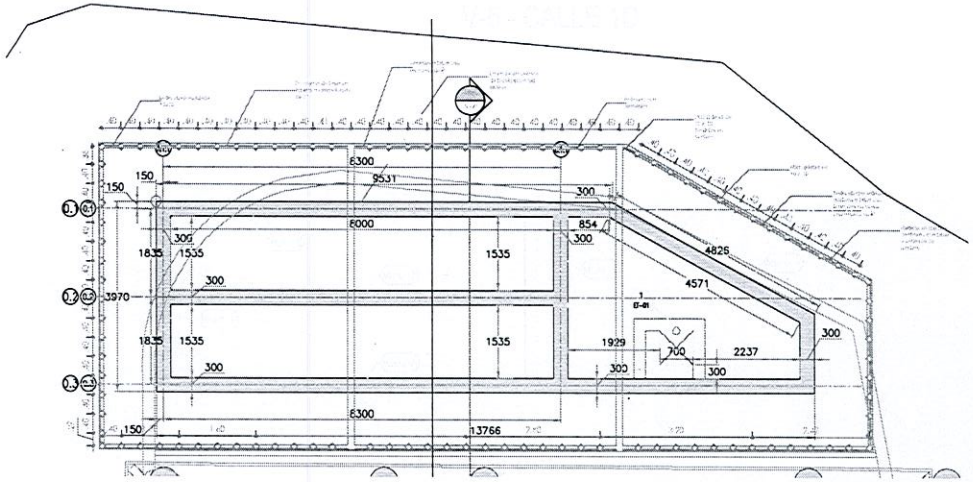

Corte A- A'

