GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	3	**DEL**	**27/06/2022**	**AL**	**03/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Julio Catherine Castañeda Garzón		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO IS**	**Interventor**	**GAVINCO**
Contrato No.	**136 DE 2022**	**Contrato No.**	**137 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	20/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	20/05/2022
Valor Inicial	$ 12.523.809.986,00	**Valor Inicial**	$ 862.887.407,00
Plazo Inicial	14 MESES	**Plazo Inicial**	14 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	08 DE JUNIO 2022	**Fecha de Iniciación**	8 de junio de 2022
Fecha de Terminación*	07 DE AGOSTO DE 2023	**Fecha de Terminación**	07 DE AGOSTO DE 2023
No póliza contrato de obra	10182	**No póliza contrato de interventoría**	3344266-1
Fecha aprobación	24/06/2022	**Fecha aprobación**	14/06/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2022 - 27/01/2024	$ 2.504.761.997,20	CALIDAD DE SERVICIO	07/08/2023 - 07/08/ 2028	$ 172.577.481,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2022 - 27/07/2023	$ 2.504.761.997,20	CUMPLIMIENTO CONTRATO	08/06/2022 - 07/02/2024	$ 172.577.481,40
SALARIOS,PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2022 - 27/01/2026	$ 1.252.380.998,60	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	08/06/2022 - 07/08/2026	$ 86.288.741,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	27/07/2023 - 27/07/2028	$ 3.130.952.496,50			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance ACUM	Descripción de la Actividad
2.1.1	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 352.732,25	$ 9.775,86	51,71%	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA REPOSICIÓN PARCIAL (3P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2.1.2	SECTOR 4 CUBIERTA	13/06/2022		$ 1.200.419,20	-$ 63.543,48	46,31%	DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO POR DESMONTE DE VOLUMEN ARQUITECTÓNICO
2.1.4	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 693.116,90	$ 19.209,51	51,71%	DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TEJA DE BARRO (ARGAMASAS EN CAL Y BARRO Y/O CEMENTO Y ARENA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE ESTERILLA DE GUADUA Y/O MADERAS O
2.3.3	SECTOR 3, 4 Y 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 918.653,10	$ 5.851.229,44	200,09%	DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (TABLAS BURRAS, ALFARDAS, PARES, CORREAS, TIRANTES Y COMPONENTES DEL CONJUNTO EN CUBIERTAS)
2.5.1	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 4.786.176,00	$ 19.441.612,80	226,67%	DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (14P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.6.2	PRIMER PISO SECTOR 1	21/06/2022		$ 670.370,40	$ 896.722,40	108,53%	LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POR EL ALTO DETERIORO EN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (20P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN.
2.6.5	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 1.282.801,60	$ 7.428.080,63	268,06%	LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PUESTOS EN PISOS O ENCHAPES QUE ALTERA EL LENGUAJE ORIGINAL (23P,) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2,6,11	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ 34.241,20	13,26%	LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO H. 1 A 20 CMS, PARA ADECUACION A UN MISMO NIVEL LOS ESPACIOS
2.6.13	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ 15.014,22	11,90%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PLANCHÓN DE MADERA. (31P), INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN
2.7.1	SECTORES 1 Y 2	28/06/2022		$ 16.075.895,50	$ 2.504.243,00	7,79%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUESTOS A LAS SUPERFICIES ORIGINALES (32P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.5	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.570.566,00	$ -	1,76%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS SOBREPUESTOS EN MUROS BAJOS (36P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2.8.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.632.044,00	$ 324.240,01	29,73%	LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2.8.3	PRIMER PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ -	$ 1.740.984,00	302,82%	LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ESCORIA DE ACUERDO CON SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ESTRUCTURAL (40P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.4	PRIMER PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022	24/06/2022	$ -	-$ 320.458,53	127,81%	LIBERACIÓN DE MUROS EN SISTEMA LIVIANO DE LA ZONA DE PORTERIA (40A), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.5	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	13/06/2022		$ -	$ 297.594,64	491,81%	DESMONTE DE ENCHAPES EN MADERA SOBRE MUROS (41P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2,10,1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 134.097,60	$ 395.069,52	10,80%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (45P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	3	**DEL**	**27/06/2022**	**AL**	**03/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Julio Catherine Castañeda Garzón		

2.12.2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	13/06/2022		$ 4.786.176,00	$ 4.786.176,00	10,00%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS+ MARCO) (51P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2,12,4	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 842.943,00	$ 697.608,00	82,76%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) (53P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2,12,5	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 65.865,00	$ -	533,33%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (VENTANAS) PARA REINTEGRACIÓN (56P)(57P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
2,13,1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 3.273.301,00	$ 3.273.301,00	100,00%	LIBERACIÓN DE REDES ELECTRICAS QUE POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2,13,2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 2.681.486,00	$ 2.681.486,00	100,00%	LIBERACIÓN SISTEMA CCTV Y VOZ Y DATOS (62P), EN EDIFICIO EXISTENTE, INCLUYE ALMACENAMIENTO E INVENTARIO DE ENTREGA A ENTE GESTOR
2,14,1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 980.351,50	$ 980.351,50	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2,1,4,2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 355.156,50	$ 355.156,50	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, POR REDES PARÁSITAS, DÉFICIT DE ESTAS Y EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (64P) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.3	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	08/06/2022		$ 55.059,52	$ -	8,70%	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (65P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.15.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 195.370,82	$ 195.423,45	15,91%	REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS LADRILLO PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.15.2	SECTORES 3, 4 Y 5	21/06/2022		$ 10.620.407,20	$ 1.924.899,60	1,81%	DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SECTORES 4 Y 5. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE DESMONTE DE MUROS, ENTREPISOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES,
24.1.2	TODOS LOS SECTORES	21/06/2022		$ 1.620.704,46	$ 1.621.353,00	7,14%	ASEO GENERAL DE OBRA

NOTA : LOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TABLA SUPERIOR SE ENCUENTRAN SIN EL AIU

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
	$ 4.076.201,00	$ 16.304.804,00		$ 60.391.134,00	$ 157.321.971,27
	0,03%	**0,13%**		**0,51%**	**1,26%**

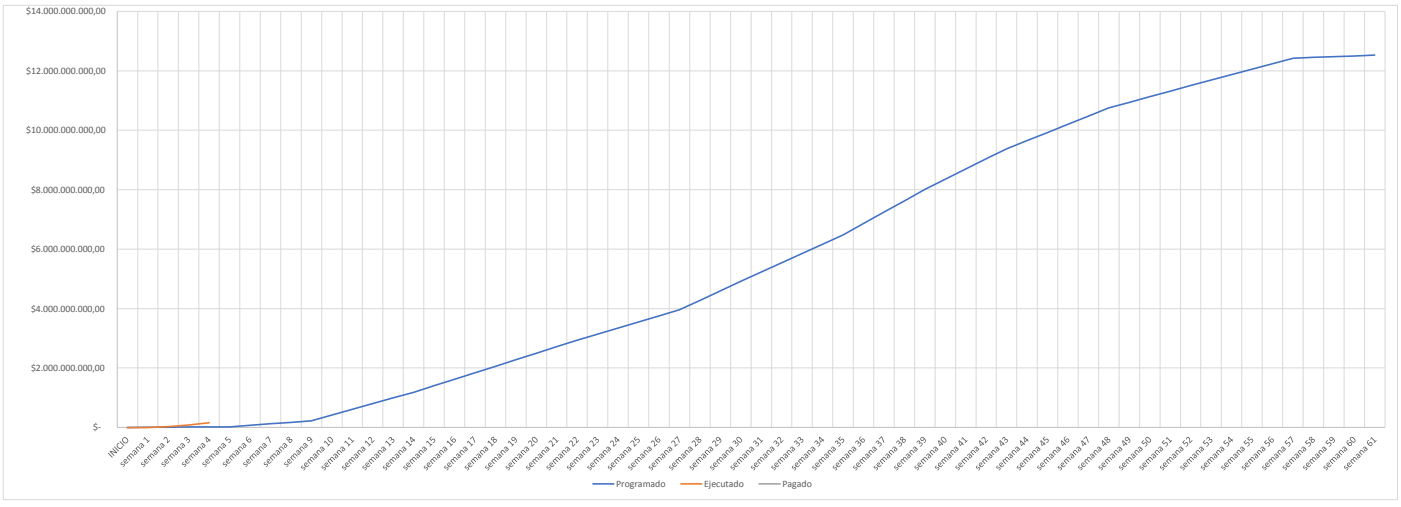

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
2,8,1	**13/06/2022**	**21/06/2022**	**0**	**9**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2,8,3	**15/07/2022**	**28/06/2022**	**0**	**5**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.9.1	**21/06/2022**	**SIN INICIO**	**0**	**0**	**0**	ESTA ACTIVIDAD SE INICIA LA SIGUINTE SEMANA
2.13.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	**0**	**0**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.13.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	**0**	**0**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.14.1	**13/06/2022**	**28/06/2022**	**9**	**0**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	**0**	**3**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	**0**	**0**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.6	**20/06/2022**	**20/06/2022**	**0**	**0**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
3.1.1	**12/07/2022**	**28/06/2022**	**8**	**3**	**0**	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	3	**DEL**	**27/06/2022**	**AL**	**03/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Julio Catherine Castañeda Garzón		

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Se realizó comité de obra programado el día 28 de junio de 2022 en los cuales se trataron los siguientes temas: Se acuerda para la próxima semana la visita técnica por parte de la consultoría entidad, entidad como profesionales contratista e Interventoría para la revisión de los temas estructurales de cimentación en el área de conservación, acordar visita del acueducto y codensa para las redes provisionales, actas de vecindad, informe preliminar por parte del contratista, PMT aprobado, valla informativa, cerramiento perimetral y aislamiento entre los módulos de conservación y los módulos nuevos, manejo del anticipo y la sobrecubierta.

* Mediante la comunicación GA-COLSFA-014-22 del día 24 de junio de 2022 radicado ERU N°. E2022003831, se procedió a dar traslado del requerimiento del Consorcio IS para la gestión en la obtención de los planos aprobados y sellados por la Empresa de Servicio Público de gas domiciliario VANTI, que fueron elaborados por la consultoría de los diseños del Colegio San Francisco de Asís, debido a que estos no se encuentran en la entrega de los diseños remitidos por la Entidad.

* El día 28 de junio de 2022 con carta GA-COLSFA-011-22 radicado N°. E2022003856 una vez realizada la revisión de la documentación inicial entregada por el Consorcio IS, se remitió a la ERU debidamente aprobados lo siguiente:
1. Hojas de vida de la plantilla mínima.
2. Presupuesto, APU´s y listado de insumos.
3. AIU desagregado
4. Plan detallado de inversión del anticipo (Flujo de inversión anticipo).
5. Programación de obra
6. Estrategia y plan para el levantamiento de las actas de vecindad.
7. Programa de suministros de insumos detallado, Programa de suministro equipos y Flujo de inversión.
8. Plan de calidad
9. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
10. Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD)
11. Informe de procedimiento de demolición y limpieza.
12. Programa de gestión SST.
12.1.Protocolo de bioseguridad.
12.2. Programa de seguridad industrial.
12.3.Programa de salud ocupacional.
12.4.Plan de riesgos.
13. Plan de gestión social
14. PMT (Plan de manejo de trafico)

* El día 30 de junio de 2022 con la carta GA-COLSFA-018-22 radicado ERU N° E2022003894 se remitió aprobado por Interventoría la solicitud de desembolso del anticipo del contrato de obra a favor del Consorcio IS.

Al corte de la presente semana no se ha realizado facturación en los contratos de Interventoría y Obra.

Aspecto Técnico

En la presente semana el Contratista de Obra realizó actividades de desmonte de los elementos estructurales sector 4 y 5, se continua con el desmonte de elementos de madera zona de conservación, se continua con la demolición de enchapes de pisos, se inició demolición de enchapes de muros, se continua con la demolición de muros de mampostería, se continua con la liberación de alistados de pisos, se continua con la demolición de placas de concreto, se continua con la demolición de muros y apuntalamiento de cerchas en sector 1, se continua con el retiro de elemento de ventanearía metálica, se continua con el retiro de elemento de puertas metálicas y en madera, se inició desmonte de redes eléctricas y sanitarias sector, 1 y 2, se inició actividades de cerramiento, se inició demolición sector 3, el contratista realizo revisión topográfica para el replanteo de ejes.

Aspecto SST-Ambiental

Para la presente semana se mantiene el PIN Ambiental No 21559, no se ha realizado disposición de RCD en la semana comprendida del 27 de Junio al 3 de Julio de 2022, se realizó aprobación del SGSST del contratista, se realizó el envío de la documentos de la maquina Equipo Retro Ref. Hitachi ZX200, operada por Luis Enrique Vargas Arias CC. 80414492 con certificado de operador expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Aspecto Social

Se realizó revisión al informe mensual social N° 1 del contratista en su versión 2, periodo del informe comprendido entre el 8 de junio al 30 de junio de 2022, se emiten observaciones mediante correo electrónico.

Se realizó acompañamiento y verificación a la actividad realizada por el área técnica y social del contratista para el levantamiento de actas de vecindad en su segunda visita, a los predios que se encuentran ubicados en el área de influencia directa del Colegio San Francisco de Asís.

Se reporta aprobación del Plan de Gestión Social el día 30 de junio de 2022 por la profesional Social Carolina Social Muñoz de la - DCCEE SED.

Se realizó revisión y aprobación al acta de reunión de inicio con la comunidad, la cual se llevó a cabo el día 16 de junio de 2022.

Se realiza revisión y aprobación al volante informativo para PMT Plan de Manejo de tráfico Calle 1 C Bis Carrera 19 Bis- Calla 1 C Bis Carrera 19 y Carrera 19 Calle 1 C.

Se realizó seguimiento y verificación a la entrega del volante informativo de PMT el cual fue distribuido por la residente social del contratista a los habitantes ubicados en el área de influencia directa al colegio San Francisco de Asís.

Aspecto PMT

El PMT fue aprobado el día jueves 23 de junio del 2022 por parte de la Secretaria de Movilidad COI No. 25, el cual se encuentra implementando.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
Colegio San Francisco de asís	COI No. 25	24/06/2022	23/06/2023	N/A	N/A	N/A

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
28/06/2022	TARDE	0,4
29/06/2022	MAÑANA	1
29/06/2022	TARDE	1



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	3	**DEL**	**27/06/2022**	**AL**	**03/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Julio Catherine Castañeda Garzón		

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuarán con las demoliciones de muros de mampostería, desmonte de pisos de madera y enchapes, desmonte de ventaneria y puertas existentes, excavaciones para verificación de niveles de zapatas en el sector 1 del piso 1, verificación de cortes en los sectores de conservación y demolición total, demolición total del sector 3 y 4, liberación de mortero de pega en pisos en el sector 1 del piso 2, labores del cerramiento perimetral y retiro de escombros.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato avanza de acuerdo a actividades programadas de obra como son actividades de desmontes, demoliciones y liberaciones de elementos, ya se inició actividades de demoliciones en el sector 3, se han realizado los comités de obras programados para verificación de compromisos y temas técnico presentados durante la semana. Se encuentra por aprobación y tramite el anticipo y el corte de obra No. 1. La obra se encuentra en un avance programado del 0,13% y ejecutado del 1,26%, lo cual nos da un avance del 1,13%.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ING FREDY PEÑA	ING MAURICIO JUNCO	ING EDGAR ARAGON
RESIDENTE INTERVENTORIA	CORDINADOR PROYECTO	DIRECTOR DE OBRA
Vobo.	Vobo.	Vobo.
