GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	5	**DEL**	**11/07/2022**	**AL**	**17/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	39 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO IS**	**Interventor**	**GAVINCO**
Contrato No.	**136 DE 2022**	**Contrato No.**	**137 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	20/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	20/05/2022
Valor Inicial	$ 12.523.809.986,00	**Valor Inicial**	$ 862.887.407,00
Plazo Inicial	14 MESES	**Plazo Inicial**	14 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	08 DE JUNIO 2022	**Fecha de Iniciación**	8 de junio de 2022
Fecha de Terminación*	07 DE AGOSTO DE 2023	**Fecha de Terminación**	7 de agosto de 2023
No póliza contrato de obra	10182	**No póliza contrato de interventoría**	3344266-1
Fecha aprobación	24/06/2022	**Fecha aprobación**	14/06/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2022 - 27/01/2024	$ 2.504.761.997,20	CALIDAD DE SERVICIO	07/08/2023 - 07/08/ 2028	$ 172.577.481,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2022 - 27/07/2023	$ 2.504.761.997,20	CUMPLIMIENTO CONTRATO	08/06/2022 - 07/02/2024	$ 172.577.481,40
SALARIOS,PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2022 - 27/01/2026	$ 1.252.380.998,60	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	08/06/2022 - 07/08/2026	$ 86.288.741,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	27/07/2023 - 27/07/2028	$ 3.130.952.496,50			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance ACUM	Descripción de la Actividad
2.1.1	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 2.116.393,50	$ -	51,71%	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA REPOSICIÓN PARCIAL (3P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.2	SECTOR 4 CUBIERTA	13/06/2022		$ 6.482.263,68	$ -	46,92%	DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO POR DESMONTE DE VOLUMEN ARQUITECTÓNICO (1P), INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.4	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 5.544.935,20	$ -	51,71%	DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TEJA DE BARRO (ARGAMASAS EN CAL Y BARRO Y/O CEMENTO Y ARENA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE ESTERILLA DE GUADUA Y/O MADERAS EN HILERAS (4P)
2.1.7	SECTOR 5 CUBIERTA	05/07/2022		$ 705.024,00	$ -	41,83%	DESMONTE DE TEJA TRASLUCIDA EN CORREDORES INCLUYE LA ESTRUCTURA METALICA QUÉ LO SOPORTA (7P)
2.4.1	SECTOR 1	11/07/2022		$ 2.056.162,64	$ 6.423.637,50	87,47%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIELORRASOS EN ENTRECUBIERTAS (12P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.5.1	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 11.965.440,00	$ 9.943.603,20	309,77%	DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (14P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.5.2	SECTOR 1	11/07/2022		$ 6.631.819,00	$ 224.365,68	3,38%	DESMONTE PARCIAL DE PAÑETES (13P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.1	SECTOR 1	11/07/2022		$ 5.719.165,00	$ 5.797.939,16	101,38%	LIBERACIÓN DE PISOS EN TABLETA DE GRES (19P)
2.6.2	SECTOR 1	21/06/2022		$ 1.117.284,00	$ -	108,53%	LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POR EL ALTO DETERIORO EN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (20P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓ.. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.4	SECTOR 1	05/07/2022		$ 7.510.811,44	$ 3.535.989,00	35,79%	LIBERACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO (22P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.6.5	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 1.282.801,60	-$ 3.447.752,00	160,56%	LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PUESTOS EN PISOS O ENCHAPES QUE ALTERA EL LENGUAJE ORIGINAL (23P,) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.7	SECTOR 1	01/07/2022		$ -	$ 721.799,82	102,70%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (25P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.11	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ -	13,70%	LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO H. 1 A 20 CMS, PARA ADECUACION A UN MISMO NIVEL LOS ESPACIOS (27P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.13	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ -	11,90%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PLANCHÓN DE MADERA. (31P), INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.7.1	SECTOR 1	28/06/2022		$ 32.151.791,00	$ 867.241,20	10,49%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUESTOS A LAS SUPERFICIES ORIGINALES (32P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.5	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.570.566,00	$ -	1,76%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS SOBREPUESTOS EN MUROS BAJOS (36P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.6	SECTOR 1	11/07/2022		$ -	$ 1.341.170,18	12,73%	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (37P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.632.044,00	$ -	44,39%	LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.3	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ -	$ -	302,82%	LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ESCORIA DE ACUERDO CON SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ESTRUCTURAL (40P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.6	SECTOR 1	11/07/2022		$ -	$ 756.100,00	21,81%	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (42P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN) INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	5	**DEL**	**11/07/2022**	**AL**	**17/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	39 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

2.10.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 134.097,60	$ 2.211.210,00	43,78%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (45P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.2	SECTOR 1 Y 2	13/06/2022		$ 1.457.484,00	$ 34.702,00	2,38%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS+ MARCO) (51P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.4	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 842.943,00	$ -	82,76%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) (53P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.5	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 65.865,00	$ 109.775,00	700,00%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (VENTANAS) PARA REINTEGRACIÓN (56P)(57P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE ALMACENAMIENTO.
2.14.1	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 1.960.703,00	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.2	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 426.187,80	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, POR REDES PARÁSITAS, DÉFICIT DE ESTAS Y EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (64P) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.3	SECTOR 1 Y 2	08/06/2022		$ 126.573,60	$ -	8,70%	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (65P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.15.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 957.820,50	$ -	15,91%	REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS LADRILLO PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.15.2	SECTORES 3, 4 Y 5	21/06/2022		$ 82.839.176,16	$ 23.618.400,00	27,76%	DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SECTORES 4 Y 5. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE DESMONTE DE MUROS, ENTREPISOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES, RETIRO DE MATERIALES, ACOPIO,TRASLADO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS
2.15.3	SECTOR 1 Y 2	11/07/2022		$ 1.966.910,40	$ 691.151,25	27,41%	CORTE DE CONCRETO (PISO EXISTENTE) CON SIERRA DE DISCO DIAMANTADO PROFUNDIDAD APROXIMADA 30 mm
24.1.2	TODOS LOS SECTORES	21/06/2022		$ 3.177.851,88	$ -	7,14%	ASEO GENERAL DE OBRA

NOTA : LOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TABLA SUPERIOR SE ENCUENTRAN SIN EL AIU

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
	$ 50.663.497,00	$ 71.044.502,00		$ 66.609.002,75	$ 241.252.340,00
	0,40%	**0,57%**		**0,53%**	**1,93%**

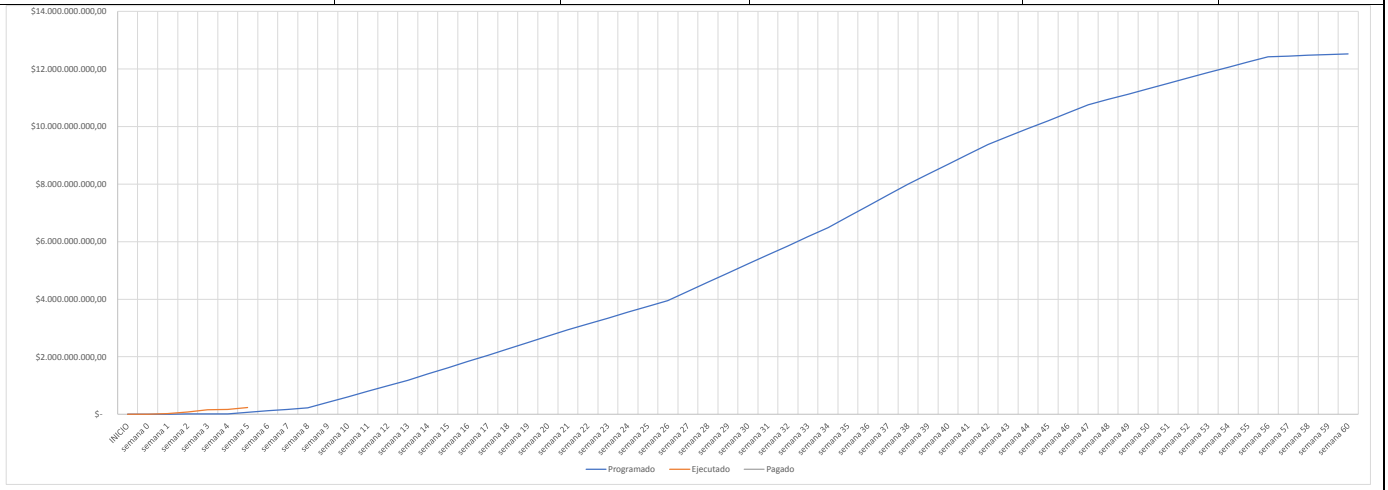

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
2,8,1	**13/06/2022**	**21/06/2022**	0	26	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.9.1	**21/06/2022**		0	0	16	ACTIVIDAD SIN INICIAR
2.13.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	19	8	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.13.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	19	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.14.1	**13/06/2022**	**28/06/2022**	0	19	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	19	8	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	19	6	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.4	**15/06/2022**	**07/07/2022**	0	10	12	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.5	**15/06/2022**	**12/07/2022**	0	5	12	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.6	**20/06/2022**	**20/06/2022**	0	27	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
3.1.1	**12/07/2022**	**28/06/2022**	8	19	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

* Se realizó comité de seguimiento de obra programado el día 12 de julio de 2022, en donde se trató los siguientes temas: avance de obra, atraso actividades, acta de entrega del predio, valla informativa, cerramiento de obra, tramite de acta parcial No 1 de obra, diseños de sobrecubierta, iniciación de actividad de sobrecubierta, aspectos técnicos, inicio de replanteo por parte de la topografía, señalización de la obra de acuerdo al PMT, valla y pendones informativos y actividades ejecutadas en la semana.

* El día 11 de julio de 2022 la interventoría con carta GA-COLSFA-023-22 radicado ERU No. E2022004306 remitió aprobado a la entidad el acta de recibo parcial de obra No. 01 del periodo comprendido entre el 08 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	5	**DEL**	**11/07/2022**	**AL**	**17/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	39 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

* Con carta GA-COLSFA-024-22 del día 11 de julio de 2022, esta interventoría realizó observaciones al Consorcio IS, en cuanto al componente en Seguridad y Salud en el Trabajo en señalización preventiva de obra, planos de riesgos y zona de encuentro y en el área ambiental se requirió la implementación de mallas en los sumideros y la identificación y señalización de RCD.

* El día 13 de julio de 2022 esta interventoría con carta GA-COLSFA-026-22 radicado ERU No. E2022004361, procedió dar traslado a la Entidad contratante la comunicación ISERU-0026 del Consorcio IS, con la cual solicitó aclaraciones y observaciones en los diseños entregados en el componente Estructural.

*El día 14 de julio de 2022 mediante correo electrónico se realizó observaciones al Consorcio IS sobre la valla informativa en su contenido y formatos diligenciados que se deben presentar a la Secretaria Distrital de Ambiente para su instalación en obra.

* Con carta GA-COLSFA-028-22 del día 15 de julio de 2022 radicado ERU N°. E2022004372, se realizó la radicación de la solicitud de cambio en el cargo de Abogado de Interventoría y se realizó la postulación de una hoja de vida de un profesional que cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

* Al corte de la presente semana no se ha realizado facturación en los contratos de Interventoría y Obra.

Aspecto Técnico

* En la presente semana el Contratista de Obra finalizó el cerramiento perimetral y continuó con la actividad de demolición total en sectores 3, 4 y 5, desmonte de redes eléctricas, trasiego y clasificación de madera desmontada de estructura en sectores 3, 4 y 5, finalización en la liberación de piso en baldosa de cemento decorado, continuó con el desmonte de entramado de madera para cielo raso en el sector 1 del segundo piso, desmonte de ventanas en el sector 1 y 2, desmonte de puertas en el sector 1 y 2, liberación de escalera ubicada en el patio, se inició con los cortes mediante pulidora en pañetes, liberación de enchape de piso en el segundo nivel, demolición de materas en el segundo piso, se inició con la liberación de pañete, liberación de enchape en fachadas y se liberó el cielo raso en esterilla del piso 1.

Aspecto SST-Ambiental

*** Componente Ambiental.** Para la presente semana la interventoría radicó la carta a la entidad por medio de oficio No GA-COLSFA-025-22. El contratista de obra ha realizado la disposición de materiales no peligrosos, tales como chatarra el día 11/07/2022; posteriormente, se finalizó el cerramiento total de obra y se realizaron las actividades de instalación de puertas para la entrada y salida de volquetas. Se continúan realizando actividades de recolección y organización en el patio de los RCD´s generados según su clasificación.
*** Componente SST.** Se realizó las verificaciones en obra tales como preoperacionales, inspecciones, charlas, capacitaciones, permisos de trabajo y demás actividades encaminadas a la seguridad y salud en el trabajo, posterior a esto se realiza seguimiento al oficio No GA-COLSFA-024-22 en cumplimento a los lineamientos establecidos en obra, posterior a esto se han venido ejecutando actividades de señalización y demarcación de áreas con el fin de evitar posibles accidentes e incidentes.

Aspecto Social

Se realizo revisión y verificación instalación aviso Punto de Atención a la Comunidad (PAC) ubicado en la zona de ingreso al colegio San Francisco de Asís Calle 1 C Bis N° 19-79

Se realizó revisión y verificación al Buzón de sugerencias instalado por el área social del contratista en el primer piso ubicado en la portería del colegio San Francisco de Asís.

Se realizó comité social de seguimiento al cumplimiento de las actividades que ejecuta el contratista para el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión Social con la profesional social del contratista y la interventoría.

Se realizó acompañamiento al contratista en la elaboración del acta de vecindad del colegio Menorah ubicado en la Carrera 19 A N° 1C 64.

La interventoría realizo solicitud al contratista el volante de convocatoria para Comité de Participación con el fin de realizar su respectiva revisión.

Se realizó verificación en la instalación de los puntos Satélite instalados por el contratista en los siguientes puntos informativos: Estación Terpel Calle 1 C Bis N° 18-34, Local 3 - Carrera 19 N° 1-34/36, Anyull-Autos Kr 19 N° 1-48, Colegio Menorah Carrera 19 A N° 1-48.

La interventoría realizo solicitud al contratista envío de presentación formato power point para comité de participación con el fin de realizar su respectiva revisión.

Se solicita al contratista radicar a la interventoría las actas de vecindad realizadas en el área de influencia directa de la intervención, la residente social del contratista informa que realizara la entrega el próximo viernes 15 de julio de 2022.

La interventoría informa que el área social del contratista programó comité de participación ciudadana para el próximo viernes 22 de julio de 2022 lugar de reunión Colegio Menorah Biblioteca Hora 10: 00 am.

Aspecto PMT

* En la presente semana el Contratista de Obra realizó actividades de cerramiento perimetral instalación de parales en madera, intalacion de señalizacion preventiva según el PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
Colegio San Francisco de asís	COI No. 25	24/06/2022	23/06/2023	N/A	N/A	N/A

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
11/07/2022	MAÑANA	1
13/07/2022	MAÑANA	2



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuarán con demoliciones de muros de mampostería, desmonte de pisos en enchapes, desmonte de ventaneria y puertas existentes, excavaciones para verificación de niveles de zapatas en el sector 1 del piso 1, verificación de cortes en los sectores de conservación y demolición total, demolición total del sector 3, 4 y 5, liberación de mortero de pega en pisos, sector 1 y 2, primer y segundo piso 2, retiro de escombros.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato avanza de acuerdo a las actividades programadas de obra evidenciando un porcentaje de avance de adelanto del 1,36%, ya que según el cronograma se tiene un programado del 0,57% y un ejecutado de 1,93%, en las actividades de desmontes, demoliciones y liberaciones de elementos y del inicio de actividades de demoliciones en el sector 3 y 4. Se han realizado los comités de seguimiento de obra en la fecha programada en donde se verificaron los compromisos adquiridos y se trataron temas técnico presentados durante la semana. Se evidencia atraso en actividades de reforzamiento estructural zona 1 y 2.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ING FREDY PEÑA	ING MAURICIO JUNCO	ING EDGAR ARAGON
RESIDENTE INTERVENTORIA	CORDINADOR PROYECTO	DIRECTOR DE OBRA
Vobo.	Vobo.	Vobo.
