
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME MENSUAL No. 1 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

ORIGINAL

MONTERIA, SEPTIEMBRE DE 2.022

Firma	
Nombre	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Cargo	Representante Legal y Director de Interventoría
	Aprobó

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL No. 1 DE INTERVENTORÍA
PERIODO AGOSTO 09 DE 2022 – AGOSTO 31 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

ORIGINAL

MONTERIA, SEPTIEMBRE DE 2.022

TABLA DE CONTENIDO

Introducción. 7

1. Generalidades del proyecto 9
   1.1. Localización del proyecto 9
   1.2. Alcance de los trabajos. 11
   1.3. Estado inicial de las obras. 11
   1.4. Características técnicas del proyecto. 12
2. Información general del contrato de obra. 13
   2.1. Información general del contrato de obra. 13
   2.2. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto 13
   2.3. Relación del equipo de trabajo de obra. 14
   2.4. Cuadro estado pólizas 15
   2.5. Entrega documentos previos a la iniciación de la obra. 16
   2.6. Discriminación de actividades y del valor total de las obras. 16
3. Informe técnico del contrato de obra. 20
   3.1. Actividades programadas para el periodo reportado 20
   3.2. Actividades ejecutadas para el periodo reportado 21
   3.3. Porcentaje de ejecución de obra (programado vs ejecutado por actividad). 22
   3.4. Actividades pendientes de inicio o atrasadas. 23
   3.5. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato 24
   3.6. Resumen de Control de calidad. 25
   3.7. Informe semanal de interventoría. 25
   3.8. Resultado ensayos de laboratorio 26
   3.9. Registro fotográfico. 26
4. Informe financiero 26
   4.1. Discriminación costos del contrato de obra 26
   4.2. Seguimiento al programa de inversiones 27
   4.3. Control del Anticipo 27
5. Informe administrativo 28
   5.1. Relación de Actas de obra del periodo reportado y anteriores 28

5.2. Relación de la correspondencia generada entre el contratista y la interventoría, incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 28
5.3. Estado de predios – actas de vecindad. 28
5.4. Control del personal. 28
5.5. Control pago de aportes parafiscales 29
5.6. Control de maquinaria y equipo 29
5.7. Registro del estado del tiempo. 30
5.8. Control plan de manejo ambiental 30
5.8.1. Actividades ambientales: 30
5.8.2. Licencias Ambientales y de explotación de Canteras: 30
5.8.3. Licencia Zona de Botaderos o Escombreras: 30
5.8.4. Licencia de tala de arboles 31
5.8.5. Seguimiento del plan de gestión social de la obra 31
5.8.6. Limpieza zonas de trabajo 31
5.9. Control de salud ocupacional 31
5.9.1. Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social 32
5.9.2. Incapacidades 32
5.9.3. Seguridad industrial 32
5.9.4. Capacitaciones 32
5.9.5. Dotación y elementos de seguridad industrial 32
5.9.6. Señalización 32
5.9.7. Actividades de aseguramiento de la calidad 33
5.9.8. Plan de manejo de transito 33
5.10. Relación de planos de obra, estudios y diseños. 35
6. Contrato de interventoría 36
6.1. Información general contrato de interventoría. 36
6.2. Cronología del contrato de interventoría 36
6.3. Cuadro estado pólizas 38
6.4. Información financiera del contrato. 39
6.5. Control del Equipo de trabajo de la interventoría. 39

6.6. Relación de Actas de interventoría del periodo reportado y anteriores 39
6.7. Comités de obras. 39
6.8. Control de seguridad social personal interventoría. 40
6.9. Informe ejecutivo director 40
7. Conclusiones y recomendaciones. 40
7.1. Observaciones 40
7.2. Recomendaciones. 41
7.3. Resultado ensayos de laboratorio 41
7.4. Control de calidad materiales 42
8. ANEXOS 43

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 01	ACTAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA	44
ANEXO 02	FORMATOS CONTROL DE OBRA	52
ANEXO 03	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	57
ANEXO 04	ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO	64
ANEXO 05	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO	74
ANEXO 06	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA	85
ANEXO 07	PROGRAMA DE INVERSIONES	87
ANEXO 08	SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA	91
ANEXO 09	INFORME EJECUTIVO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	97
ANEXO 10	REGISTRO FOTOGRÁFICO	101
ANEXO 11	CORRESPONDENCIA ENVIADA	104
ANEXO 12	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	177
ANEXO 13	COPIA LIBRO DE OBRA	236
ANEXO 14	LICENCIA DE CANTERA Y BOTADERO, PERMISO DE TALA	255
ANEXO 15	INFORME MENSUAL SOCIAL	294
ANEXO 16	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	341

Introducción.

El Municipio de Montería dentro de su estructura cuenta con la Secretaría de Infraestructura, encargada de liderar la política de infraestructura en el Municipio a través de promover la realización de obras de interés para el desarrollo de la economía y la población Monteriana; propende por el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura vial Municipal y demás obras físicas plasmadas en el Plan de Mejoramiento de la malla vial en la ciudad de Montería.

Teniendo en cuenta que la infraestructura vial comunica toda la ciudad y sus corregimientos, permitiendo el comercio de bienes y servicios con calidad y oportunidad, y que la falta de intervención pertinente afectaría la movilidad y atención prioritaria que requiere la población vulnerable, se hace necesario la intervención del Municipio de Montería a través del proyecto denominado " MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA",

El proyecto consiste en el mejoramiento de las vías en los barrios Alfonso López Y Los Araujos mediante la construcción pavimento rígido en concreto hidráulico y obras de drenaje tipo cuneta con tapa.

En este proyecto se incluyó como uno de los puntos más críticos en la zona urbana, llegando así a sectores que durante mucho tiempo estuvieron abandonados sin ningún tipo mantenimiento.

La malla vial comprende un aspecto fundamental para el crecimiento y desarrollo de una ciudad.

Dentro de los programas que viene desarrollando la Administración Municipal para dar cumplimiento al Plan de desarrollo, se encuentran, aquellos que buscan dar soluciones a las necesidades de las diferentes comunidades tanto de la zona urbana como de la zona rural.

Por lo anterior, se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos del municipio, el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA",

Con este proyecto se busca intervenir, las vías de los barrios Alfonso López y los Araujos que actualmente presentan dificultad en la movilidad, debido al mal estado de estas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, por el alto deterioro de la superficie de rodadura.

Bibliografía: Estudios del sector y Estudios previos del MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El Presente documento contiene el Informe **MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1**, de actividades correspondientes al desarrollo del contrato de obra LP – SPM – 008-2022, suscrito entre EL MUNICIPIO DE MONTERIA y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.

Este informe presenta la descripción de los diferentes aspectos concernientes al estado físico, financiero y el programa de trabajo del contrato de obra, en el período comprendido desde el nueve (09) de agosto de 2022, hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2022.


1. Generalidades del proyecto.


1.1. Localización del proyecto





VIA CARRERA 8E SUR – ALFONZO LOPEZ.

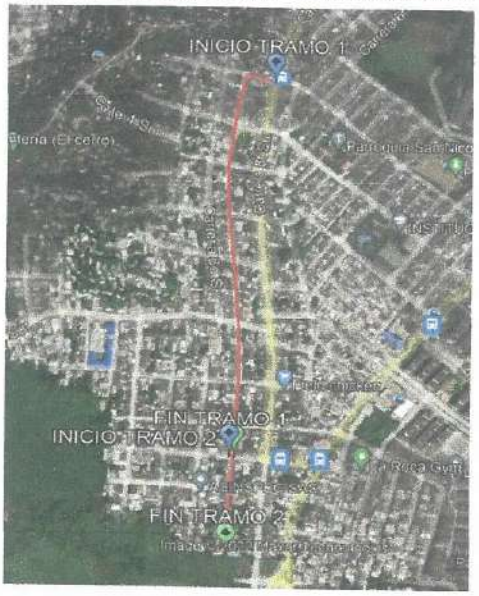

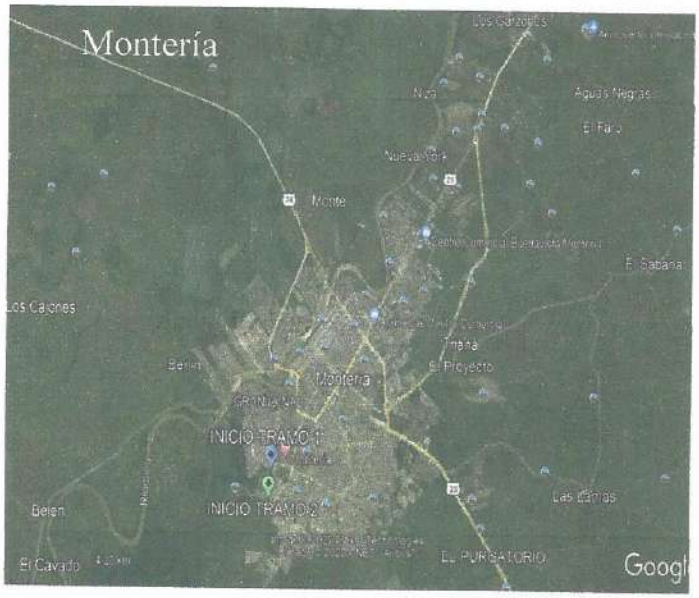

Montería: Municipio colombiano, capital del departamento de Córdoba. Está ubicado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, se encuentra a orillas del río Sinú, por lo que es conocida como la "Perla del Sinú". Es considerada la capital ganadera de Colombia;5 anualmente celebra la feria de la Ganadería durante el mes de junio. Es un importante centro comercial y universitario, reconocida como una de las ciudades colombianas con mayor crecimiento y desarrollo en los últimos años y por impulsar el desarrollo sostenible.

La ciudad es la capital de Córdoba desde 1952,7 cuando este territorio se separó del departamento de Bolívar. Es el centro administrativo, cultural, económico y político de la región cordobesa, siendo sede de certámenes turísticos y festividades, Junto con los municipios de Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Carlos conforman el Área metropolitana de Montería.

Límites del municipio: limita por el norte con los municipios de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; por el sur con los municipios de Tierralta y Valencia, por el este con los municipios de San Carlos y Planeta Rica, y por el oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Valencia y San Carlos.

División política: Su Cabecera Municipal o área urbana está dividida en 207 barrios, agrupados en 9 comunas.

El área rural del municipio de Montería se divide en 29 corregimientos, agrupada dependiendo en Unidades de Planeamiento Zonal

Geografía: La topografía de Montería es básicamente plana, con algunas elevaciones de menor importancia. La parte occidental de la ciudad está surcada por la serranía de Las Palomas. Al norte limita con el municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas.

La ciudad está surcada por numerosos caños y riachuelos, la principal fuente hídrica de Montería la constituye el río Sinú.

Sostenibilidad ambiental: Montería durante los últimos años ha recibido menciones y premios por su capacidad de ser una ciudad sostenible en materia ambiental. En 2014 fue seleccionada por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, para ser parte del proyecto Ciudades Sostenibles por lograr dar a conocer su gran desarrollo y crecimiento natural. En 2014 fue seleccionada por World Wide Fund for Nature (WWF), como la Ciudad Sostenible Del Planeta, por lograr reducir el consumo y uso de la electricidad, creando motocicletas eléctricas y otros artefactos innovadores. En 2016 y por tercer año consecutivo, Montería ganó el título de Capital Nacional de la Hora del Planeta, otorgado por la WWF, la cual reconoce a la capital de departamento de Córdoba como un modelo para la acción climática; Montería tiene planes de reducir sus emisiones un 20% con inversiones en infraestructuras, el transporte sostenible y la reducción del consumo de energía.15 Además fue elegida entre las 10 ciudades más sostenibles del planeta en La Conferencia Mundial Hábitat III, realizada en Quito, en octubre del 2016; a nivel latinoamericano solo se encuentran Montería y Quito entre estas diez

Bibliografía: https://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa

1.2. Alcance de los trabajos.

La alcaldía de Montería a fin de mejorar las condiciones de la red vial urbana realiza proceso Licitatorio y se adjudica el Contrato de Obra No. LP – SPM – 008-2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

El proyecto comprende la ejecución de las obras de PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, en los sectores:

1. Calle 2 Sur, Entre Carreras 8F Sur y 8E Sur
2. Carrera 8E Sur, Entre Calles 2 Sur y 9 Sur

1.3. Estado inicial de las obras.

VÍA CARRERA 8F SUR: vía ubicada en el municipio de Montería, tiene una capa de rodadura en terreno natural en regular estado, esto hace necesario la intervención de la vía para garantizar la comodidad en el tránsito de vehículos sin que los mismos sufran algún deterioro significativo y mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector, la vía presenta diferentes anchos los cuales varían entre 7,90 m y 8.40 m,

los cuales cumplen con las condiciones establecidas para el proyectos, la vía presenta sistema de drenaje deficiente, cunetas tapadas en mal estado, los drenajes se encuentran colmatados y requieren cambio

Las vías para intervenir en los barrios Alfonso López y los Araujos actualmente presentan dificultad en la movilidad y bajo servicio todo esto debido al mal estado que presentan estas vías.

Actualmente el drenaje superficial es deficiente y construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando congestión vial, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano y deteriorando la imagen favorable del municipio

Bibliografía: Estudios del sector y estudios previos del "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

1.4. Características técnicas del proyecto.

Una vez evaluadas las condiciones de la vía y las necesidades observadas, se acuerda conjuntamente Entidad Contratante, interventoría y Contratista de Obra, inicialmente ejecutar la intervención de los siguientes sectores:

Vía Cra 8E Sur, entre calle 2 y calle 9:

TRAMO 1. PR0+000 – PR0+645, Longitud de intervención proyectada: 645.00m

TRAMO 2. PR0+645 – PR0+798, Longitud de intervención proyectada: 153.00m

LONGITUD TOTAL APROXIMADA= 798 MTS

Las obras para ejecutar darán cumplimiento a los Términos de referencia y/o Pliegos de Condiciones en lo referente a los Estudios y Diseños efectuados por la entidad Contratante donde se estipulan los Ítems a ser construidos.

En todos los casos, los trabajos a ejecutar se definirán en coordinación con la interventoría y la entidad Contratante correspondiente, y mediante la utilización por parte del contratista del equipo apropiado y todas las medidas de seguridad, tanto para el personal que ejecuta las actividades, como para los usuarios de la vía.

2. Información general del contrato de obra.

2.1. Información general del contrato de obra.

PROCESO LICITATORIO No.	LP – SPM – 008-2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP – SPM – 008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR INICIAL:	$ 2´680.932.314,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	09 de agosto de 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	08 de diciembre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
INTERVENTOR:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
SUPERVISOR CONTRATO:	ING. GERMAN QUINTERO
NIT CONTRATISTA:	901609836-4
ANTICIPO (20%)	N/A
MUNICIPIO:	MONTERIA – CORDOBA.
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA.

2.2. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto

Durante el presenten período se evaluó el alcance del contrato de acuerdo con el presupuesto contractual en cada uno de los tramos a intervenir y las actividades establecidas contractualmente, de acuerdo con las correcciones y/o aclaraciones indicadas por parte de la entidad contratante de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento.

Se hace necesario ajustar las cantidades a ser ejecutadas, teniendo en cuenta las condiciones reales de la vía a ser intervenida.

Teniendo como base el Diseño estructural aprobado se ajustan cantidades de obra y presupuesto, a fin de determinar el alcance contractual.

Se determina realizar actividades de construcción de la estructura de pavimento hidráulico de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños presentados por la alcaldía de Montería

Se ajusta Programa de Inversión y programa de trabajo de acuerdo con fecha de inicio agosto 09 de 2022.

2.3. Relación del equipo de trabajo de obra.

La interventoría solicito a la firma Contratista mantener en campo en desarrollo del Contrato, el siguiente Equipo y Maquinaria mínimo, según pliego de condiciones:

No.	EQUIPO Y/O MAQUINARIA	CANTIDAD
1	RETROCARGADORA DE LLANTAS	1
2	MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR	1
3	VIBROCOMPACTADOR 6 TON	1
4	REGLA VIBRATORIA	1
5	VIBRADOR DE CONCRETO	1
6	PISTOLA DE CALAFATEO	1
7	RIELES METÁLICOS	60
8	COMPRESOR	1
9	FUMIGADORA AGRÍCOLA	1
10	MEZCLADORA 1 ½ BULTO	1
11	GRÚA CANASTA	1
12	GRÚA HINCAR POSTE	1
13	MOTOSIERRA	1
14	COMPACTADOR SALTARÍN (CANGURO)	1
15	COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	1
16	VEHÍCULO DELINEADOR	1
17	MOTOBOMBA 3"	1
18	EQUIPO PINTURA (COMPRESOR)	1
19	EQUIPO DE SOLDADURA	1
20	TALADRO ½", PULIDORA Y LIJADORA	1
21	CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP	1
22	RETROEXCAVADORA DE ORUGA 155 HP;	1
23	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE AGUA	1
24	CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRÁULICO	1

No.	EQUIPO Y/O MAQUINARIA	CANTIDAD
25	EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE 6"	1
26	FORMALETA TAPAS	1

Se presenta por parte de la firma contratista los documentos de los siguientes equipos:

Un Retroexcavadora de oruga

Un Vibrocompactador 4.5 ton

Un Retrocargadora de llantas

Tres volquetas

En el Anexo No.2 se adjunta el Formato control diario del equipo del contratista en obra.

2.4. Cuadro estado pólizas

PÓLIZAS INICIALES

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Póliza Responsabilidad Civil No. CRC-100002734.

Póliza Cumplimiento No. CRC-100008907.

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$268.093.231,40	DESDE 2022/07/07 – HASTA 2023/05/07
	PRESTACIONES SOCIALES	$536.186.462,80	DESDE 2022/07/07 – HASTA 2025/11/07
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$804.279.624,20	DESDE 2022/07/07 – HASTA 2027/11/07
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$400'000.000,00	DESDE 2022/07/07 – HASTA 2022/11/07

PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Póliza Responsabilidad Civil No. CRC-100002734.

Póliza Cumplimiento No. CRC-100008907.

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$268.093.231,40	DESDE 2022/08/09 – HASTA 2023/06/09
	PRESTACIONES SOCIALES	$536.186.462,80	DESDE 2022/08/09 – HASTA 2025/12/09
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$804.279.624,20	DESDE 2022/12/09 – HASTA 2027/12/09
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$400´000.000,00	DESDE 2022/08/09 – HASTA 2022/12/09

Se adjunta en el Anexo No.8 formato de control de pólizas

2.5. Entrega documentos previos a la iniciación de la obra.

Se requirió en el transcurso del periodo a la firma contratista de obra para que hiciera entrega de los documentos contractuales exigidos por interventoría los cuales son obligatorios por el pliego de condiciones definitivos:

- Hojas de vida del personal profesional
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Programa de obra, complementario a este programa se debe presentar flujo de caja o inversión por semanas
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Plan de calidad

2.6. Discriminación de actividades y del valor total de las obras.

Las obras del proyecto inicialmente están distribuidas de la siguiente manera:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00		PRELIMINARES				
1,01	201,8	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731,66	$10.708,00	$7.834.615,00
1,02		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	675,59	$28.237,00	$19.076.635,00

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,03	201,8	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419,21	$24.909,00	$10.442.102,00
1,04	201,8	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50,31	$155.430,00	$7.819.683,00
1,05		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	706,89	$20.895,00	$14.770.467,00
1,06	210,8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3584,30	$10.448,00	$37.448.766,00
1,07		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5578,55	$19.178,00	$106.985.432,00
1,08	201.8	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	25,00	$309.685,00	$7.742.125,00
1,09	201.9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	10,00	$418.679,00	$4.186.790,00
1.10		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	350,00	$99.008,00	$34.652.800,00
		$250.959.415,00				
2,00		**SUBRASANTE Y SUBBASE**				
2,01	320,8	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	2182,00	$138.813,00	$302.889.966,00
2,02	320,8	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.143,45	$130.362,00	$149.062.429,00
2,03	231,8	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5.493,02	$12.707,00	$69.799.805,00
		$521.752.200,00				
3,00		**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**				
3,01	500,8	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983,81	$932.607,00	$917.508.093,00
3,02		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	9,00	$392.957,00	$3.536.613,00
3,03	672,8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.267,60	$96.998,00	$122.954.665,00
3,04	640,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11.111,00	$9.017,00	$100.187.887,00
		$1.144.187.258,00				
4,00		**SEÑALIZACION**				
4,01	710,8	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8,00	$430.203,00	$3.441.624,00
4,02	710,8	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	2,00	$719.437,00	$1.438.874,00
4,03	700,8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271,00	$136.981,00	$37.121.851,00
4,04	700,8	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2.394,60	$15.057,00	$36.055.492,00
4,05	700,8	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	18,00	$382.155,00	$6.878.790,00
		$84.936.631,00				

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,00		CUNETAS Y SUMIDEROS				
5,01		EXCAVACION MANUAL	M3	53,82	$31.844,00	$1.713.844,00
5,02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69,95	$19.178,00	$1.341.501,00
5,03	231,8	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127,21	$12.707,00	$1.616.457,00
5,04		RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10,76	$91.310,00	$982.496,00
5,05		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15,66	$76.373,00	$1.196.001,00
5,06	640,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1.358,29	$9.017,00	$12.247.701,00
5,07	671,8	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	17,81	$891.854,00	$15.705.549,00
5,08	671,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO	M	97,85	$1.106.741,00	$108.294.607,00
		$143.098.156,00				
6,00		ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				
6,01		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	1.267,60	$43.489,00	$55.126.656,00
6,02		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	1.267,60	$35.019,00	$44.390.084,00
6,03		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	765,52	$101.273,00	$77.526.507,00
6,04		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	42,00	$851.597,00	$35.767.074,00
6,05		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR. EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	3,00	$1.184.095,00	$3.552.285,00
6,06		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	90,00	$230.668,00	$20.760.120,00
		$237.122.726,00				
7,00		OTRAS ACTIVIDADES				
7,01	600,8	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	151,20	$53.418,00	$8.076.802,00
7,02		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	89,00	$78.950,00	$7.026.550,00

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,03	231,8	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	89,00	$298.312,00	$26.549.768,00
		$41.653.120,00				
8,00		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**				
8,01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400,00	$4.649	$1.859.600,00
8,02		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$4.218.128	$8.436.256,00
8,03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$983.296	$1.966.592,00
8,04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$3.586.229	$3.586.229,00
8,05		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	160,00	$82.894	$13.263.040,00
8,06		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	350,00	$167.403	$58.591.050,00
8,07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	1,00	$5.548.628	$5.548.628,00
8,08		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	1,00	$2.053.782	$2.053.782,00
		$95.305.177,00				
9,00		**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**				
9,01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	450,00	$2.821	$1.269.450,00
9,02		SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$2.697.903	$35.072.739,00
9,03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$489.434	$6.362.642,00
9,04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	UND.	14,00	$718.882	$10.064.348,00
9,05		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSADA	UND.	1,00	$1.644.076	$1.644.076,00
9,06		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	UND.	1,00	$1.455.080	$1.455.080,00
9,07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$947.935	$947.935,00
9,08		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	9,00	$1.956.472	$17.608.248,00
		$74.424.518,00				
10,00		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V**				
10,01		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V., INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	1,00	$8.072.446	$8.072.446,00
		$8.072.446,00				

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11,00		ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V				
11,01		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	43,00	$57.975	$2.492.925,00
11,02		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	UND.	3,00	$916.762	$2.750.286,00
11,03		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	10,00	$723.270	$7.232.700,00
		$12.475.911,00				
SUBTOTAL OBRAS						$2.613.987.558
		IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de tráfico)				$42.330.163,00
		PAPSO				$20.577.216,00
		TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (NO MODIFICAR)				$4.037.377,00
		VALOR TOTAL OBRAS				$2.680.932.314

3. Informe técnico del contrato de obra.

3.1. Actividades programadas para el periodo reportado

Actividad	Programado
• Demolición de bordillos de concreto	100%
• Corte de piso en tablón y plantilla de concreto e= 0.10m/0.15m con cortadora	100%
• Demolición de pisos y andenes de concreto	65%
• Demolición de estructuras	55%
• Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en subrasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro	59%
• Excavación en material común de la explanación y canales	61%
• Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre	38%
• Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raíz)	26%
• Remoción de especies vegetales (tala de árboles alturas entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raíz)	14%
• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar)	62%

- Acero de refuerzo fy = 420 mpa 42%
- Señal vertical de transito con lamina Retroreflectiva de 60cm x 60cm 100%
- Señal vertical de transito con doble lamina Retroreflectiva de 60cm x 60cm 100%
- Reparación de domiciliarias del acueducto. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. 19%
- Reubicación típica medidores de gas red domiciliaria. 31%
- Localización y replanteo de redes de media tensión. 100%
- Suministro, instalación e hincado de poste en concreto de (12 m - 1050 Kgf). 13%
- Suministro de materiales y construcción de cimentación cilíndrica con concreto de 3000 psi a poste en concreto de (12 m - 1050 Kgf). 13%
- Suministro e instalación de elementos eléctricos para armado en fin de línea compacta con disposición central bifásico a 13.2 kv, e incluye: puesta a tierra en cinta de acero inoxidable. 13%
- Suministro, riego, anclaje y tensionado de red para mt bifásica aérea en cable desnudo de aluminio acsr - no. 1/0 Awg. 13%
- Suministro, riego, anclaje y tensionado de red para mt bifásico aérea en cable aislado de aluminio ecológico - no. 1/0 Awg. 13%
- Suministro e instalación de elementos eléctricos para retenida mt en poste de 12m a poste de 9m 13%
- Instalación en caliente de elementos eléctricos para seccionador bifásico a 13.2 kv. 13%

3.2. Actividades ejecutadas para el periodo reportado

A continuación, se describen las actividades realizadas por el Contratista, durante el periodo comprendido entre el 09 de agosto de 2022 al 31 de agosto del 2022, en los diferentes ítems que hacen parte del proyecto objeto del presente contrato:

- Socialización del proyecto el día 08 de agosto del 2022
- Trabajos con las comisiones de topografía correspondientes a la nivelación y secciones, y evaluación de avance físico de los corredores a intervenir.

- Localización y Replanteo, 100% en todos los tramos
  TRAMO 1. PR0+000 – PR0+645, Longitud de intervención proyectada: 645.00m
  TRAMO 2. PR0+645 – PR0+798, Longitud de intervención proyectada: 153.00m
  Para un total de 798 mts de longitud de vía a intervenir
- Excavaciones PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 al PR0+120
- Instalación de geotextil del PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+070 al PR0+120
- Suministro e Instalación de Rajón del PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+070 al PR0+120
- Demolición de bordillos PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 al PR0+120
- Reparación de tuberías para suministro de agua y domiciliarias para

3.3. Porcentaje de ejecución de obra (programado vs ejecutado por actividad).

Teniendo como base la reprogramación y flujo de inversión presentado por la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, para el mes uno cuyo periodo va desde el 09 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022 se observa:

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO
Demolición De Bordillos De Concreto	100%	4,92%
Demolición De Estructuras	55%	4,91%
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	61%	11,87%
Mejoramiento De La Subrasante Con Adición De Materiales (Tipo Piedra Rajón O Similar)	62%	2,97%
Geotextil Para Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares	0%	10,49%

En el **Anexo No. 07**, se adjunta programación de Obra aprobada

3.4. Actividades pendientes de inicio o atrasadas.

Teniendo como base la reprogramación y flujo de inversión presentado por la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA, para el mes uno cuyo periodo va desde el 09 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022 se observa que las actividades atrasadas son:

- Corte De Piso En Tablón Y Plantilla De Concreto E= 0.10m/0.15m Con Cortadora
- Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto
- Excavaciones Mecánicas Con Excavadora Para Fallos En Sub Rasante. Profundidad > 50 Cm. No Incluye Retiro
- Cargue Y Retiro De Material Sobrante, Con Acarreo Libre
- Remoción De Especies Vegetales (Tala De Árboles Altura Menor O Igual H= 5 M Incluye Transporte De Residuos, Incluye Extracción De Raíz)
- Remoción De Especies Vegetales (Tala De Árboles Alturas Entre H= 5.1m A 10m Incluye Transporte De Residuos, Incluye Extracción De Raíz)
- Acero De Refuerzo Fy = 420 Mpa
- Señal Vertical De Transito Con Lamina Retroreflectiva De 60cm X 60cm
- Señal Vertical De Transito Con Doble Lamina Retroreflectiva De 60cm X 60cm
- Reparación De Domiciliarias Del Acueducto. Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación.
- Reubicación Típica Medidores De Gas Red Domiciliaria.
- Localización Y Replanteo De Redes De Media Tensión.
- Suministro, Instalación E Hincado De Poste En Concreto De (12 M - 1050 Kgf).

- Suministro De Materiales Y Construcción De Cimentación Cilíndrica Con Concreto De 3000 Psi A Poste En Concreto De (12 M - 1050 Kgf).
- Suministro E Instalación De Elementos Eléctricos Para Armado En Fin De Línea Compacta Con Disposición Central Bifásico A 13.2 Kv., E Incluye: Puesta A Tierra En Cinta De Acero Inoxidable.
- Suministro, Riego, Anclaje Y Tensionado De Red Para Mt Bifásica Aérea En Cable Desnudo De Aluminio Acsr - No. 1/0 Awg.
- Suministro, Riego, Anclaje Y Tensionado De Red Para Mt Bifásica Aérea En Cable Aislado De Aluminio Ecológico - No. 1/0 Awg.
- Suministro E Instalación De Elementos Eléctricos Para Retenida Mt En Poste De 12m A Poste De 9m
- Instalación En Caliente De Elementos Eléctricos Para Seccionador Bifásico A 13.2 Kv.

3.5. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato.

Se observa para el presente informe las dificultades presentadas a la hora de realizar actividades como son:

- Presentación tardía de documentos contractuales y hojas de vida del personal a laborar en el proyecto.
- Falta disponibilidad de recursos y personal para el inicio de obra.
- El contratista no dispone de equipo mínimo en obra, se le requirió al contratista para que mantuviera en obra el equipo mínimo, ver **anexo No.2**. control de equipos

- El contratista no dispone de materiales de subbase granular y rajón suficientes para mejorar el terreno donde se realiza excavación haciendo que los tiempos de reacción sean tardíos
- A la fecha no se dispone de permiso para tala de árboles, la entidad contratante se encuentra realizando la gestión
- Lluvias en la región al inicio del proyecto.

3.6. Resumen de Control de calidad.

Dando cumplimiento a las funciones de la Interventoría, se ha realizado el acompañamiento y seguimiento administrativo del desarrollo de las obras. Los controles establecidos y realizados en el presente periodo a este aparte se describen como sigue:

1. Diligenciamiento de Libro de obra. Se registra a diario en la bitácora de obra lo acontecido en todas las jornadas de trabajo del periodo, respecto a aspectos técnicos, administrativos y socioambientales relevantes. Se adjunta en **Anexo No.13** al presente informe copia de ella.
2. Verificación de Afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado, la cual se ha entregado oportunamente, y para este informe se presentan adjunta en **Anexo No.6** al presente informe copia de ellos.
3. Elaboración de informes semanales de Interventoría, del control de avance de la obra expuestos en comités técnicos. Se adjunta en **Anexo No.3** al presente informe copia de ellos.
4. Se ha realizado seguimiento fotográfico al avance de las obras llevando un registro del estado inicial de las vías y durante la ejecución de las obras. Se adjunta en **Anexo No.10**
5. Realización de comités de obra para seguimiento al contrato de obra. Se adjunta en **Anexo No.4** al presente informe copia de ellos.

3.7. Informe semanal de interventoría.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, en su calidad de Interventor del Contrato No.CMA-SPM-007-2022, presentó a consideración de la Secretaria de Infraestructura de Montería, informes semanales durante el periodo comprendido entre el 09 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022, tal y como se detalla a continuación:

Informe Semanal No	Periodo Informe	Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato
1	09 de agosto al 14 de agosto del 2022	6 días
2	15 de agosto al 21 de agosto del 2022	13 días
3	22 de agosto al 28 de agosto del 2022	20 días
4	29 de agosto al 04 de septiembre del 2022	27 días

En el **Anexo No. 03** se adjunta el Formato informes semanales de interventoría.

3.8. Resultado ensayos de laboratorio.

La interventoría ha efectuado los requerimientos a la firma contratista a fin de que se presentes los ensayos exigidos en las Especificaciones Técnicas INVIAS-2013, de la totalidad de materiales a ser utilizados en desarrollo del Contrato. A la fecha se presenta por parte de la firma contratista los resultados de los ensayos solicitados. Se adjunta formato de seguimiento en **Anexo No.5** al presente informe (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS).

3.9. Registro fotográfico.

En el **Anexo No.10** se adjunta el registro Fotográfico de la vía, para cada uno de los tramos intervenidos.

4. Informe financiero

4.1. Discriminación costos del contrato de obra

Dentro de las actividades de supervisión de la Interventoría, se realizan los controles necesarios que garanticen el adecuado manejo de los recursos asignados al contrato, tanto en la ejecución de obra como en el manejo del anticipo concedido al Contratista.

Los aspectos más relevantes de dicho control se muestran a continuación:

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.680.932.314,00	

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR ANTICIPO	N/A	$0.00
VALOR ACUMULADO FACTURADO (IVA INCLUIDO)		$0.00
SALDO POR PAGAR A LA FECHA		$ 2.680.932.314,00

En el **Anexo No. 02** se adjunta Información financiera del contrato de obra

4.2. Seguimiento al programa de inversiones

Teniendo como base la reprogramación y flujo de inversión presentado por la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, se observa:

Descripción	Programada ($)	Programada (%)	Ejecutada ($)	Ejecutada (%)	Diferencia $
Inversión MES 1	$ 370.757.265,20	14,18%	$ 21.530.383,30	0,82%	$ 349.226.881,90
Inversión MES 2	$ 1.101.595.189	42,14%			
Inversión MES 3	$ 2.047.177.459	78,32%			
Inversión MES 4	$ 2.613.987.559	100,00%			

Se aprueba por parte de la entidad Contratante:

- Orden de inicio de la interventoría: 09 de agosto del 2022.
- Fecha terminación de la interventoría: 08 de diciembre de 2022.
- Orden de inicio del contratista de obra: 09 de agosto del 2022.
- Fecha terminación de obra inicial: 08 de diciembre de 2022.

Se aprueba programación de obra No.1 en fecha agosto 09 de 2022

Para el **MES 1**, se obtiene una inversión del 0,82% ($ 21.530.383,30), inferior a la programada en -13,36% ($ 349.226.881,90).

En el **Anexo No. 07**, se adjunta Reprogramación de Obra aprobada.

En el **Anexo No. 02** se adjunta Información financiera del contrato de obra

4.3. Control del Anticipo

Para este contrato no se otorgó anticipo de obra

5. Informe administrativo

5.1. Relación de Actas de obra del periodo reportado y anteriores

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	Agosto 09 De 2022	Se Imparte Orden De Inicio
Acta De Socialización Del Proyecto	Agosto 08 De 2022	Centro Educativo La Luz Del Saber – Cra 8e #5 -15 Brr. Alfonso López
Acta De Aprobación De Personal No.1	Agosto 09 De 2022	Se Aprueba Personal En Obra
Acta De Aprobación De Programación De Obra	Agosto 09 De 2022	Se Aprueba Programación De Obra No.1
Acta De Fuentes De Material	Agosto 09 De 2022	Se Realiza Aprobación De Fuentes De Material

5.2. Relación de la correspondencia generada entre el contratista y la interventoría, incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

En el **Anexo No.11** se adjunta la relación correspondencia enviada en desarrollo del Contrato.

En el **Anexo No.12** se adjunta la relación correspondencia recibida en desarrollo del Contrato.

5.3. Estado de predios – actas de vecindad.

La firma contratista elabora Actas de vecindad y aprobación de intervención de predios en los sectores a ser intervenidos para construcción de pavimentos y espacio público. Se adjunta en el **Anexo No.15** se adjunta informe social de interventoría

5.4. Control del personal.

El contratista presento para el desarrollo del contrato de obra el siguiente personal:

No.	Nombre	Cargo
1	Jorge Carrascal Pérez	Director De Obras
2	Rodolfo Urriaga	Ing. Residente De Obra
3	Alexander Berrocal Arteaga	Especialista En Vías
4	Simón Peña Mendoza	Ingeniero Eléctrico
5	Diana Palacios Mosquera	Ing. Especialista Ambiental

No.	Nombre	Cargo
6	Nini Johana Ropero Daza	Trabajadora Social
7	Luis Guillermo Álvarez	Profesional Sisoma
8	Mateo De Jesús Seba Fernández	Inspector De Obra
9	Jimmy López Lara	Mensajero
10	María Camila Caballero	Secretaria

En el **Anexo No. 1** se adjunta acta de aprobación del personal del contratista.

En el **Anexo No. 2** se adjunta el Formato control diario del personal del contratista.

5.5. Control pago de aportes parafiscales

La firma Contratista a fin de dar cumplimiento a los compromisos de índole legal, presenta las afiliaciones a la seguridad social de la totalidad del personal que labora en la ejecución de las obras

En el **Anexo No.6** se adjunta el Formato control de revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales del contratista de obra.

5.6. Control de maquinaria y equipo

A la fecha la firma Contratista en desarrollo del Contrato, presentó en campo el equipo mínimo requerido en la propuesta:

EQUIPO	MARCA	CANTIDAD EN OBRA
EXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	1
RETROEXCAVADORA LLANTAS	CATERPILLAR	1
MINICARGADOR CON PALA	BOBCAT	1
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	1
VOLQUETA	DODGE	1
VOLQUETA	INTERNATIONAL	1
VOLQUETA	FORD	1

En el **Anexo No.2** se adjunta el Formato control diario del equipo del contratista.

5.7. Registro del estado del tiempo.

En el **Anexo No.2,** se adjunta el Formato reporte estado del tiempo.

5.8. Control plan de manejo ambiental

5.8.1. Actividades ambientales:

Para este proyecto Se presenta por parte de la firma Contratista Programa Ambiental a implementar para el desarrollo del Contrato.

Se presentan actividades de excavación, remoción, cargue y disposición final del material.

5.8.2. Licencias Ambientales y de explotación de Canteras:

Se presenta por parte de la firma Contratista las Licencias ambientales y permisos de explotación de las canteras proveedoras de las materias primas para la colocación en campo de material Granular.

Se instala material de subbase granular de la cantera Chicoral la cual cumple con las especificaciones Invias 2013.

En el siguiente cuadro se presenta la relación de las canteras proveedoras:

CANTERA	PROPIETARIO	RESOLUCION AMBIENTAL	LICENCIA EXPLOTACIÓN	MATERIALES
CHICORAL	ROSA MARIA GANEM BECHARA C.C 51.914.889	RES. 2-6499 DEL 19 SEP 2019	GAJ-091	MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRAVAS, ARENAS PARA RELLENO, PIEDRA RAJON, SUBBASE

5.8.3. Licencia Zona de Botaderos o Escombreras:

Teniendo en cuenta que no existe en la zona Botaderos autorizados por la entidad ambiental competente, la firma Contratista informa mediante certificación enviada vía e-mail que los materiales productos de excavación como arenas, lodos, materiales vegetales y/o materiales reciclables pueden ser dispuestos para el relleno del lote de aproximadamente 1 hectárea, ubicado en la Mz E Lotes del 1 al 30 en el barrio los Roble - Etapa 4, propiedad del señor JUAN IGNACIO

PUPO GARCIA con cedula de ciudadanía N° 78.696.113 de Montería. Se adjunta a este informe la certificación de disposición final de materiales de excavación Se adjunta en el **Anexo No.14.**

5.8.4. Licencia de tala de arboles

Teniendo en cuenta que se evidencia la necesidad de talar 35 unidades de árboles durante el desarrollo del proyecto, la entidad gestiona ante la Corporación de los Valles del Sinú (CVS) permiso de tala de árboles, a la fecha se encuentra a la espera de la resolución de aprobación de este permiso

5.8.5. Seguimiento del plan de gestión social de la obra

Se realiza en fecha 08 de agosto del 2022. Reunión de socialización del proyecto, con la comunidad de los barrios Alfonso López y los Araujos, donde se informó a la comunidad de obras a ser realizadas sobre la vía Calle 2 Sur Entre Carreras 8f Sur y 8e Sur y La Carrera 8f Sur Entre Calles 2 Sur Y Calle 9 Sur

Se adjunta en el **Anexo No.15.** informe actividades sociales

5.9. Control de salud ocupacional

Se presenta por parte de la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, el plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el cual se implementará en el desarrollo del Contrato. Se presenta informe de interventoría en el **Anexo No.16**

5.9.1. Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social

Se verifica el Pago de afiliaciones a la Seguridad Social de la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato de Obra No. LP – SPM – 008-2022

En el **Anexo No. 06**, se presentan relación de personal y afiliación a sistema de salud, Arl, pensión y caja de compensación.

5.9.2. Incapacidades

Durante este mes en el desarrollo del contrato de obra no se genera incapacidades.

5.9.3. Seguridad industrial

Durante este mes en el desarrollo del contrato de obra se genera informe de SG-SST, Se presenta informe de interventoría en el **Anexo No.16**

5.9.4. Capacitaciones

Durante este mes en el desarrollo del contrato de obra se genera informe de SG-SST, en el **Anexo No.16**

5.9.5. Dotación y elementos de seguridad industrial

Durante este mes en el desarrollo del contrato de obra se genera informe de SG-SST, en el **Anexo No.16**

5.9.6. Señalización

Se presenta por parte de la firma contratista Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte del municipio de montería, el cual es aprobado.

Se realiza señalización en obra de acuerdo con esquemas de señalización presentados en plan de manejo de tránsito.

5.9.7. Actividades de aseguramiento de la calidad

Esta actividad hace referencia al cumplimiento de Especificaciones técnicas, Normas de Seguridad y Control documental, específicamente en lo relacionado con:

- Control de calidad de materiales
- Control de equipos de construcción requeridos
- Control de laboratorios
- Registro de Control de Inspección y Ensayos de los procesos constructivos
- Calidad e idoneidad del personal
- Seguridad industrial
- Señalización

- Control de pólizas
- Control de cumplimiento del programa de trabajo

Como soporte de estas actividades, se anexan:

• Ensayos de laboratorio, junto con sus resultados, con ello se controla la calidad de los materiales y de los procesos constructivos en desarrollo de las obras.

• Se cuenta en campo con el equipo y maquinaria necesaria para el buen desarrollo de la obra.

• Referente a la seguridad industrial, el personal en obra cuenta con la correspondiente dotación.

• Respecto a la señalización se da cumplimiento a la instalación de elementos requeridos para informar oportunamente a los conductores y/o peatones que transitan por el sector, dándose cumplimiento a lo requerido.

5.9.8. Plan de manejo de transito

Se presenta por parte de la firma contratista Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte del municipio de montería.

La secretaria de tránsito y transporte municipal de la ciudad de montería, se dio aprobación a este mediante oficio No. STTM 1454 del 2022 de fecha 08 de agosto del 2022.

Esta aprobación se da por un término de 30 días contados a partir del 02 de agosto del 2022

Esta aprobación se da siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

- Previo visto bueno de la secretaria de Planeación Municipal
- El contratista NO debe realizar actividades de manejo de escombros, cargue y descargue, con vehículos en horas pico
- Abstenerse de generar circulación de vehículos pesados por las zonas de influencia en horas pico.
- Todos los vehículos de carga que ingresen o salgan de la obra deberán tener lonas protectoras que impidan la caída de material particulado hacia las vías u otros vehículos, la constructora se hará responsable del aseo del aseo y limpieza de las vías donde queden desechos de materiales que caigan desde los vehículos donde son transportados.

- Con respecto al tránsito de vehículos pesados se deberá tener en cuenta el vigente decreto de cargue y descargue de la ciudad.
- Las zonas de cargue y descargue se ubicarán dentro del cerramiento provisional.
- El contratista deberá colocar y mantener la señalización de obra, así como los pasacalles informativos durante la ejecución de proyecto y retirarla una vez terminada la obra. esta señalización deberá ser clara y de fácil interpretación, que les facilite a los actores viales la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura de acuerdo con cada etapa de cierre.
- La valla debe contener de forma clara quien es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la entidad, número de teléfono ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado.
- La señalización de tránsito peatonal debe colocarse antes de iniciar la obra, definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el transito que se estima. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.00 m, además se debe implementar mallas protectoras de posibles caídas de escombros. Es importante colocar la señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados.
- Cada 60m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos
- El contratista debe tener reguladores de tránsito permanentes con sus respectivos uniformes reflectivos y elementos luminosos de control de tránsito, con el objeto de orientar el transito mientras permanezca la vía parcialmente cerrada, así como de ofrecer rutas alternas de tránsito mediante la instalación de pasacalles informativos de acuerdo con cada etapa de cierre.
- El contratista deberá realizar mantenimiento y riego regular a las rutas alternas, dispuestas como desvíos de cada etapa de cierre dispuestas en el plan de manejo de tránsito.
- El contratista deberá publicar en medios de comunicación los cierres y desvíos de cada etapa de cierre, días antes de colocar los cerramientos
- El contratista deberá socializar la obra, lo cierres viales y los desvíos de cada etapa con la comunidad afectada antes de empezar los trabajos.
- El contratista deberá cumplir cabalmente lo que se presenta y se aprueba en el plan de manejo de tránsito.
- El contratista será el único responsable de la prevención, seguridad y señalización vial perteneciente en el lugar y lo alrededores mencionados de acuerdo con la normatividad legal vigente.

- El constructor deberá dotar con los dispositivos de seguridad vial (reductores de velocidad plástico pernada: especialmente las zonas escolares, zonas de recreación y los puntos críticos de accidentalidad) y señalización preventiva y reglamentaria a todas aquellas vías propias de su proyecto y que hagan parte de su zona de influencia.
- Se deberá solicitar ante esta dependencia la respectiva revisión de la señalización de transito vertical, horizontal y dispositivos de regulación de velocidad, con el fin de evaluar asignación de sentidos únicos vehiculares, antes de la entrega definitiva de la obra. Esta señalización debe cumplir con los lineamientos especificaciones técnicas del Manual de Señalización Vial 2015, que para la señalización vertical se deberá instalar papel reflectivo tipo 4 con laminado para protección de color

Se presenta por parte de la firma contratista nuevo plan de manejo de tránsito ajustado para aprobación por parte del municipio de montería por un término de 4 meses, a la fecha se encuentra a la espera de aprobación.

En el **Anexo No.1.** se adjunta acta de aprobación inicial

5.10. Relación de planos de obra, estudios y diseños.

Los estudios y diseños para el desarrollo del Contrato No. LP – SPM – 008-2022, fueron adelantados por un equipo de consultoría contratado por la alcaldía de Montería.

Las especificaciones técnicas del presente contrato reposan además en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y se apoyan en las especificaciones técnicas de Invias 2013.

Vía Carrera 8E:

TRAMO 1: PR0+000 AL PR0+645

Espesor Pavimento: Espesor = 0,20 metros.
Ancho = 6,00 mts.
Espacio Público: Ancho = 1,20 mts.

TRAMO 2: PR0+645 AL PR0+798

Espesor Pavimento: Espesor = 0,20 metros.
Ancho = 5,50 mts.
Espacio Público: Ancho = 1,20 mts.

SUBBASE GRANULAR: 0,20 metros.

6. Contrato de interventoría

6.1. Información general contrato de interventoría.

CONTRATO NO.:	CMA-SPM-007-2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL:	$215.493.346 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISOR:	ING. GERMÁN QUINTERO
NIT:	901254479-2
ANTICIPO	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE DICIEMBRE DE 2022.
MUNICIPIO:	MONTERÍA - CÓRDOBA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE MONTERIA, CORDOBA

6.2. Cronología del contrato de interventoría

Periodo 1 Interventoría: 09 al 31 de agosto del 2022:

Se imparte orden de inicio del Contrato de interventoría No. CMA-SPM-007-2022, en fecha agosto 09 de 2022. Teniendo en cuenta que los Diseños ya están realizados y presentados por la secretaría de infraestructura del municipio de Montería, se aprueba Orden de Inicio al Contrato de Obra No. LP – SPM – 008-2022 a la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA en fecha agosto 09 de 2022.

Para el presente periodo, en cumplimiento a las actividades preliminares de la Interventoría realizó la verificación y aclaración al alcance de los estudios y diseños remitidos por parte de la entidad contratante,

apoyándose la firma interventora bajo la idoneidad de los profesionales especialistas en el área de vías y pavimentos. Igualmente se llevó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales del proyecto.

Acompañamiento, a los distintos comités técnicos de obra celebrados por parte de la entidad contratante dirigidas por el supervisor del proyecto en representación de la secretaria de infraestructura del municipio de Montería.

Con respecto a verificación de especificaciones, ensayos de laboratorio, control de calidad, cuantificación, recibo de cantidades, verificación de procesos constructivos, aprobación del programa de trabajo y seguimiento de este, la Interventoría ha realizado en el presente período:

1. Revisión y chequeo de resultados de laboratorio de material granular de relleno con Sub base granular y Rajón.
2. Seguimiento detallado de cumplimiento de Diseños, en lo referente a espesores de estructuras aprobadas y calidad de materiales utilizados dando cumplimiento a las indicaciones de los diseños entregados por la secretaria de infraestructura.
3. Control topográfico, verificando cumplimiento de diseños geométricos aprobados
4. Seguimiento diario y reporte semanal del programa de trabajo.
5. Registro diario en bitácora de obra y soporte fotográfico del avance de la obra.
6. Acompañamiento a entidad contratante ante las solicitudes de los contratistas.

Algunas de las actividades relevantes realizadas por la Interventoría en el presente periodo fueron:

1. Control de requisitos seguridad industrial personal que labora en obra. Verificación diaria del uso de los elementos de seguridad.
2. Control de cantidades de obra ejecutadas hasta la fecha. Se realiza balances de obra constantes de acuerdo las modificaciones que surgen del proyecto.
3. Realización de comités técnicos, con el fin de dar solución a los inconvenientes que se presentan durante la ejecución de las diferentes actividades. Los temas tratados, los compromisos adquiridos por las partes y las conclusiones obtenidas se consignaron en las respectivas actas de comité y de reunión, cuyas copias se anexan.
4. Acompañamiento topográfico. La Interventoría ha dispuesto de los recursos técnicos de forma amplia y suficiente para el acompañamiento en las actividades de localización y replanteo del proyecto.

5. Seguimiento de las actividades de obra y registro diario de las mismas en formatos de seguimiento.

6. Verificación de las condiciones mínimas tanto técnicas, como ambientales para la construcción y ejecución de las diferentes actividades.

7. Control de la cantidad y calidad de los materiales y equipos suministrados a la obra, para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato.

6.3. Cuadro estado pólizas

POLIZAS INICIALES

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza No. 96-44-101173501 - 2

N.° DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
96-44-101173501	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2022	08/05/2023	$21,549,334.60
	CALIDAD DEL SERVICIO	07/11/2022	07/11/2027	$21,549,334.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/07/2022	07/11/2025	$21,549,334.60

POLIZAS CON ACTA DE INICIO

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza No. 96-44-101173501 - 7

N.° DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
96-44-101173501	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/08/2022	09/06/2023	$21,549,334.60
	CALIDAD DEL SERVICIO	09/12/2022	10/12/2027	$21,549,334.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/08/2022	10/12/2025	$21,549,334.60

6.4. Información financiera del contrato.

En este periodo No se tramitan Acta de Costos de Interventoría

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 215.493.346.00	
VALOR ACUMULADO FACTURADO A LA FECHA (IVA INCLUIDO)		$ 0.00
SALDO A LA FECHA		$ 215.493.346.00

6.5. Control del Equipo de trabajo de la interventoría.

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Equipo de topografía (Nivel de precisión)	1
Equipo de topografía (Estación total electrónica)	1
Computador	3
Impresora	1
Internet	1
Vehículo automotor	1
Oficina en sitio de Obra	1

6.6. Relación de Actas de interventoría del periodo reportado y anteriores

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	AGOSTO 09 DEL 2022	SE IMPARTE ORDEN DE INICIO DE INTERVENTORIA

6.7. Comités de obras.

Durante el periodo comprendido del 09 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022, se realizaron los Comités Técnicos:

COMITÉ No.1: Fecha: 08 de agosto del 2022.

TEMAS TRATADOS: alcance del contrato, avance de obra, inconvenientes presentados, personal de obra e interventoría, varios.

COMITÉ No.2: Fecha: 12 de agosto del 2022.

TEMAS TRATADOS: avance del contrato de obras, aspectos legales del contrato, requerimientos documentales.

COMITÉ No.3: Fecha: 23 de agosto del 2022.

TEMAS TRATADOS: avance del contrato de obras, aspectos legales del contrato, requerimientos documentales.

En el **Anexo No. 4** se adjunta el Formato copias de las actas de comité de seguimiento del periodo.

Asistentes:

Ing. Elsa María Rueda Landinez – Interventoría.

Ing. Elkin Rojas Anaya – Interventoría.

Ing. Jorge Carrascal Pérez – Contratista.

Ing. Juan Ignacio Pupo – Contratista.

Ing. Mario Torres – Supervisor apoyo al contrato de interventoría de la Secretaria de infraestructura.

6.8. Control de seguridad social personal interventoría.

La firma ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ, efectúa los respectivos pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales, correspondientes al personal que labora en el contrato.

6.9. Informe ejecutivo director

En el **Anexo No.9** se adjunta el Informe Ejecutivo del Director de Interventoría

7. Conclusiones y recomendaciones.

7.1. Observaciones

1. Se hace necesario verificar el alcance de los diseños presentados por la secretaria de infraestructura del municipio de Montería, dado el objeto del contrato de obra No. LP – SPM – 008-2022.
2. Se hace necesario verificar en campo el trazado del diseño presentado por la entidad contratante
3. Se hace necesario verificar las casas afectadas por el paso del espacio público por ellas, toda vez que algunas de estas viviendas están fuera de la línea del paramento.
4. Se realizan actividades de verificación de cantidades de obra a ser ejecutadas en la vía a construir a fin de determinar el alcance del contrato.
5. Se aprueba programación No.1 de obra teniendo en cuenta la solicitud realizada por la firma contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.

6. Se requiere a la firma Contratista incrementar recursos de personal, equipo y suministro de materiales, en desarrollo del Contrato a fin de dar cumplimiento al Programa de Inversión del Contrato

7.2. Recomendaciones.

La Interventoría ha formulado al Contratista de obra, las siguientes recomendaciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo del proyecto.

1. Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la construcción de las obras, dando cumplimientos a Especificaciones Técnicas Norma INVIAS 2013.
2. Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato
3. Garantizar la señalización en la vía a intervenir enmarcada en el PMT aprobado por la entidad contratante.
4. Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente.

7.3. Resultado ensayos de laboratorio.

La firma CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, para el desarrollo del Contrato de Obra No. LP – SPM – 008-2022, presento ensayos de la cantera que utiliza para materiales granulares.

La firma contratista realiza los ensayos de materiales granulares con la Firma Laboratorios JORGE LUIS GALLEGO SILVA (J.G.S).

Se deben presentar ensayos de Laboratorio para los siguientes materiales:

- Material de Rajón (INVIAS-2013).
- Material Sub Base Granular Clase C (INVIAS-2013).
- Losetas y bordillos prefabricados
- Concretos

En el Anexo No. 05, Se describen los ensayos de calidad/laboratorio que la firma Contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA presenta en desarrollo del Contrato No. LP – SPM – 008-2022.

7.4. Control de calidad materiales

La interventoría efectúa los controles requeridos en desarrollo del Contrato de Obra, evaluando La totalidad de materiales utilizados e instalados en todos los aspectos de verificación, de acuerdo con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas INVIAS-2013

8. ANEXOS

ANEXO 01

ACTAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA representado por JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PEOS M/L ($ 2,680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA FINAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	09 DE AGOSTO DE 2022

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los nueve (09) días del mes de agosto del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, el Interventor de la Obra **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS** Representado por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ** y el Contratista **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Representado por **JUAN IGNACIO PUPO GARCIA** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SPM-008-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto, deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las Vallas de tal forma que se aseguré siempre su legibilidad.

4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 09 días del mes de agosto de 2022

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
CONTRATISTA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTOR

GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

Elaboró: MATP – Prof. Univ. SIM

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	ACTA DE APROBACION DE PERSONAL DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

ACTA No. 01

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la Interventoría revisó las hojas de vida del personal del contratista de obra, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato No. LP – SPM – 008-2022, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CARGO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JORGE CARRASCAL PÉREZ	1.069.468.639	60%
ING. RESIDENTE DE OBRA	RODOLFO URRIAGA	6.889.639	100%
ESPECIALISTA EN VÍAS	ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	11.000.193	30%
ING. ELÉCTRICO	LISANDRO MIRANDA VASCONEZ	78029536	30%
INSPECTOR DE OBRA	MATEO DE JESÚS SEBA FERNÁNDEZ	1.067.947.461	100%
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	DIANA PALACIO MOSQUERA	1.067.886.516	30%
TRABAJADORA SOCIAL	NINÍ JOHANNA ROPERO DAZA	49.606.740	100%
PROFESIONAL SISOMA	LUIS GUILLERMO ÁLVAREZ	1.064.985.371	100%
MENSAJERO	JIMMY LÓPEZ LARA	1.067.926.673	100%
SECRETARIA	MARÍA CAMILA CABALLERO	1.003.002.882	100%

La Firma Contratista deberá contar con el personal propuesto en la dedicación requerida en los Pliegos de Condiciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

EMR.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

Jorge Carrascal P.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
Anexos: HOJAS DE VIDA SOPORTE.

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE FUENTES DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO**

ACTA No. 02

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la Interventoría revisó los Documentos soporte de las Licencias Ambientales y Permisos de Explotación de las Fuentes de materiales granulares a ser utilizados en desarrollo de las obras, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato No. LP – SPM – 008-2022, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CANTERA	PROPIETARIO	RESOLUCION AMBIENTAL	LICENCIA EXPLOTACIÓN	MATERIALES
CHICORAL	ROSA MARIA GANEM BECHARA C.C 51.914.889	RES. 2-6499 DEL 19 SEP 2019	GAJ-091	MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRAVAS, ARENAS PARA RELLENO, PIEDRA RAJON, SUBBASE

La Firma Contratista deberá dar garantizar el uso exclusivo de las fuentes de materiales aprobados mediante la presente Acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

EMR.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

Jorge Carrascal P.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA

Anexos: RESOLUCION INGEOMINAS – RESOLUCION AMBIENTAL

049

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE PROGRAMACION DE OBRA**

ACTA No. 03

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, solicita mediante comunicado LP-SPM-008-2022-016, solicita aprobación de programación inicial y flujo de caja para el desarrollo del contrato de obra

La firma interventora ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, considera viable la aprobación de la programación inicial y flujo de caja inicial, dejando constancia que la totalidad de las obras serán ejecutadas dentro del plazo contractual del Contrato LP – SPM – 008-2022 y no será causal de reclamación alguna por parte del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA

Anexos: Comunicado LP-SPM-008-2022-016
Programación de obra Inicial

050

Alcaldía de Montería
Secretaría de Tránsito y Transporte

Montería, 08 de agosto de 2022

OFICIO N° STTM- [illegible]1454-2022

Señor:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
consorciopavimentosmonteria@gmail.com
Carrera 2 # 31- 48
Teléfono: 6047826058
Celular: 3135168224
Ciudad: Montería – Córdoba.

Cordial saludo:

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal como organismo gubernamental está comprometida con la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos; tenemos la responsabilidad de velar por la aplicación y el cumplimiento de las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Transporte (Ley 769 de 2002).

En atención a lo solicitado por usted, con radicado **No.1560** del 13 de julio de 2022, me permito manifestarle que dentro de los objetivos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal están los de garantizar la movilidad, seguridad y efectivo control sobre el tránsito y el transporte en la ciudad.

Por medio de la presente nos permitimos aprobar el Plan de Manejo de Tránsito del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA" durante treinta (30) días a partir del 02 de agosto de 2022, así:

Intervenciones	BARRIO	Tramo	Tipo de cierre	No. Paleteros
1	Los Araujos	Carrera 8E entre las calles 9 y 7	total	2
2	Los Araujos	Carrera 8E entre calle 7 y calle 6C y 5	total	2
3	Alfonso Lopez	Carrera 8E entre calle 5 y calle 2	total	2

Lo anterior bajo las siguientes condiciones:

- Previo visto bueno de la Secretaría de Planeación Municipal.
- El contratista NO debe realizar actividades de manejo de escombros, cargue y descargue, con vehículos en horas pico.
- Abstenerse de generar circulación de vehículos pesados por la zona de influencia en horas pico.
- Todos los vehículos de carga que ingresen o salgan de la obra deberán tener lonas protectoras que impidan la caída de material particulado hacia las vías u otros vehículos, la constructora se hará

Alcaldía de Montería
Secretaría de Tránsito y Transporte

responsable del aseo y limpieza de las vías donde queden desechos de materiales que caigan desde los vehículos donde son transportados.

- Con respecto al tránsito de vehículos pesados se deberá tener en cuenta el vigente decreto de cargue y descargue de la ciudad.
- Las zonas de cargue y descargue se ubicarán dentro del cerramiento provisional.
- El contratista deberá colocar y mantener la señalización de obra, así como los pasacalles informativos durante la ejecución del proyecto y retirarla una vez terminada la obra. Esta señalización deberá ser clara y de fácil interpretación, que les facilite a los actores viales la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura, de acuerdo con cada etapa de cierre.
- La valla debe contener de forma clara quien es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la entidad, número de teléfono ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado.
- La señalización de tránsito peatonal debe colocarse antes de iniciar la obra, definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el tránsito que se estima. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 m, además se deben implementar mallas protectoras de posibles caídas de escombros. Es importante colocar la señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados. Cada 60m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos.
- El contratista debe tener reguladores de tránsito permanente con sus respectivos uniformes reflectivos y elementos luminosos de control del tránsito, con el objeto de orientar el tránsito mientras permanezca la vía parcialmente cerrada, así mismo ofrecer rutas alternas de tránsito mediante la instalación de pasacalles informativos de acuerdo con cada etapa de cierre.
- El contratista deberá realizar mantenimiento y riego regular a las rutas alternas, dispuestas como desvíos de cada etapa de cierre dispuestas en el plan de manejo de tránsito.
- El contratista deberá publicar en medios de comunicación los cierres y los desvíos de cada etapa de cierre, días antes de colocar los cerramientos.

- El contratista deberá socializar la obra, los cierres viales y los desvíos de cada etapa con la comunidad afectada antes de empezar los trabajos.
- El contratista deberá cumplir cabalmente lo que se presenta y se aprueba en el plan de manejo de tránsito.
- El contratista será el único responsable de la prevención, seguridad y señalización vial pertinente en el lugar y los alrededores mencionados de acuerdo con la normatividad legal vigente.
- El constructor deberá dotar con dispositivos de seguridad vial (reductores de velocidad plástico pernado: Especialmente las Zonas escolares, Zonas de Recreación y los puntos críticos de accidentalidad), y señalización preventiva y reglamentaria a todas aquellas vías propias de su proyecto y que hagan parte de su zona de influencia.
- Se deberá solicitar ante esta dependencia la respectiva revisión de la señalización de tránsito vertical, horizontal y dispositivos de regulación de velocidad, con el fin de evaluar asignación de sentidos únicos vehiculares, antes de la entrega definitiva de la obra. Esta señalización debe cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas del Manual de Señalización vial 2015, que para la señalización vertical se deberá instalar papel retroreflectivo tipo 4 con laminado para protección de color.

Atentamente,

JULIO ELIECER LORA HERNÁNDEZ
Secretario de Tránsito y Transporte Municipal

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MONTERÍA

Proyectó: Diana Fuentes Viggiani
Revisó: Juan Valencia – Ingeniero Contratista STT

Gobierno de la GENTE

ANEXO 02

FORMATOS DE CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

PAG	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	31	AGOS	2022

CONTRATO No: **LP – SPM – 008-2022** CONTRATISTA: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** MES: AGOSTO **DE 2022**

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Básico	Valor AIU	Valor Total	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
VR. CONTRATO OBRA		$1.965.404.179,00	$648.583.379,00	$2.613.987.558,00			$2.680.932.314,00		$2.680.932.314,00	
IMPLEMENTACION PGIO				$42.330.163,00						
IMPLEMENTACION PAPSO				$20.577.216,00						
TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA				$4.037.377,00						
TOTALES		$1.965.404.179,00	$648.583.379,00	$2.680.932.314,00	$0,00	$0,00	$2.680.932.314,00	$0,00	$2.680.932.314,00	

Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA

Residente de interventoría

052

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.679-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE	CARGO / OFICIO	PERIODO:					DESDE:			01 AGOSTO DE 2022												HASTA			31 AGOSTO DE 2022						
		AÑO: 2022								MES:												AGOSTO										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
RODOLFO URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
DIANA PALACIO MOSQUERA	ING ESPECIALISTA AMBIENTAL								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
MARIA CAMILA CABALLERO	SECRETARIA								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR								X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
NINI JHOANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL								X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
ALEJANDRO TAMAYO	AUXILIAR SISO																		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
ESTEBAN FIGUEROA SALAS	ING. AUXILIAR DE OBRA									X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
MATEO DE JESUS SEBÁ FERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA								X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO																		X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X
ERICK PLAZA ARDINES	CADENERO								X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X
JHONATAN LEON MARTINEZ	AYUDANTE																X						X	X	X	X	X	X		X	X	X
JULIAN HERNANDEZ FLOREZ	AYUDANTE																															
EDER LUIS BLANCO TABORDA	AYUDANTE																									X	X			X	X	X
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	AYUDANTE																X						X	X	X	X	X	X		X	X	X
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	OFICIO VARIOS																						X	X	X	X	X	X		X	X	X
RAFAEL DARIO PASTRANA PASTRANA	OPERADOR EXCAVADORA																						X	X	X	X	X	X		X	X	X
CARMELO ENRIQUE LLORENTE GALVAN	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA																															X

Interventor: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Contrato No: CMA-SPM-007-2022

Contrato No: LP – SPM – 008-2022

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Firma Elkin Rojas Anaya.

Nombre: **ELKIN ROJAS ANAYA**

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

054

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.354.479-2

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL EQUIPO DEL CONTRATISTA - MENSUAL

Código:	
Versión:	
Fecha de aprobación:	

FECHA 31 (Día) AGO (Mes) 20022 (Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP – SPM – 008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERÍODO DEL INFORME: AGOSTO DE 2022 **INTERVENTORÍA:** ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

O: OPERANDO R: REPARACION X: FUERA DE LA OBRA D:DISPONIBLES

EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPAC	PLACA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI
EXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	2009		312D								D	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	D		D	O	O	O	O	O		O	O	O
RETROEXCAVADORA LLANTAS	CATERPILLAR	2010		416E																															O
MINICARGADOR CON PALA	BOBCAT	2012		S185																							D	R	R	R	R		R	R	R
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	2003	5 TON	CA121D																														O	O
VOLQUETA	DODGE	1980		TMA176								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLQUETA	INTERNATIONAL	1971	5 TON	UIJ991								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	O	X	X
VOLQUETA	FORD	1956	6 TON	UIB319								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	O	X	X

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2	**ALCALDIA DE MONTERIA** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** **CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

FECHA 31 (Día) AGO (Mes) 2022 (Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP – SPM – 008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERÍODO DEL INFORME: AGOSTO DE 2022 **INTERVENTORÍA:** ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco								24	24	22	24	22	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	19	24	24	24	22	24	19	557
Lluvias moderadas								0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	11
Lluvias intensas								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	8
Total	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

ANEXO 03

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

058

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 14 (Día) | 8 (Mes) | 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	1	Del:	9/08/2022	Al:	14/08/2022
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:					6
Nombre de los Supervisores:			GERMAN QUINTERO MENDOZA		

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	798,00

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se reciben al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	0,00%	0,00%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ 0	$ -
Valor de Interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor Interventoría.	$ 11.971.852,56	Ejecución física a la fecha presenta desfase en 0%	5,56%
			Ejecución física programada	5,56%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 006-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de inicio	9/08/2022	Fecha de inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VIA	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR (m)	798,00	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

ESTADO	
	BUENO
	REGULAR
	MALO

PROGRAMADO


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
	0

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PERSONAL DE LA ZONA	0	LABORANDO	0	TOTAL INTERVENTORIA	0

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 0
SEMANA 2		$ -
SEMANA 3		$ 137.650.728
SEMANA 4		$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.903.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

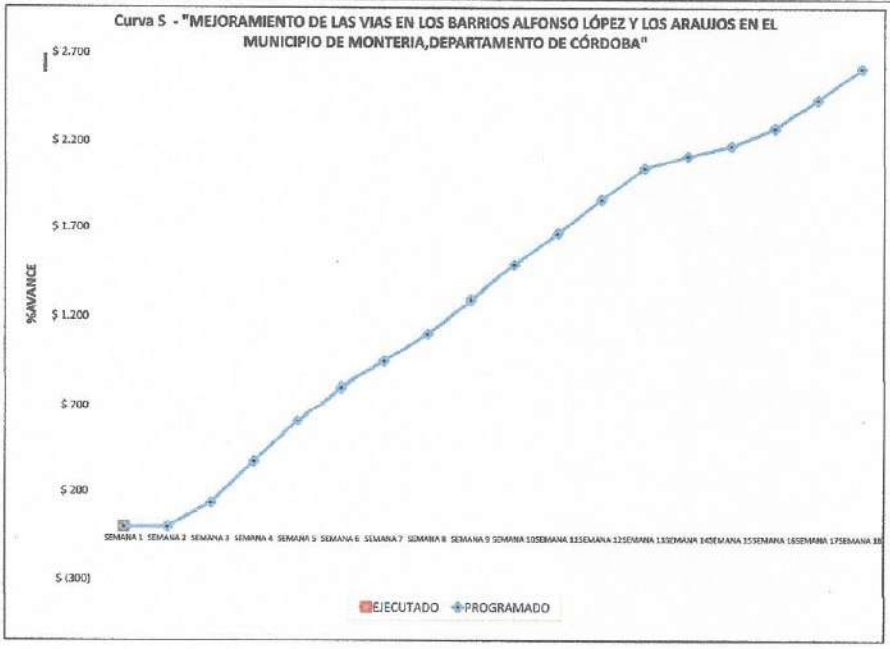

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se realiza socialización del proyecto el día 8 de agosto del 2022, asistencia de la comunidad, entidad contratante, firma contratista y firma interventora
2. Se entregan documentos para inicio de obra por parte de la firma contratista y firma interventora a entidad contratante
3. Se aprueba personal profesional de obra de acuerdo al pliego de condiciones
4. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
5. Se solicita a la firma contratista entrega de programación de obra y flujo de caja
6. Se instala valla informativa de obra, se solicita a la firma contratista cambiar de lugar de esta teniendo en cuenta que donde actualmente se instalo no es muy visible al publico
7. Se inician actividades de topografía sobre la vía, por parte de la firma contratista e interventoría
8. Se Inicio el reconocimiento en campo de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato de obra
9. Se solicita a la firma contratista entrega de los ensayos de los materiales a utilizar en campo
10. Se Solicita a la entidad contratante nos indique los planos del diseño de espacio publico a construir
11. Se solicita a la entidad contratante nos indique los planos del diseño de las redes eléctricas a intervenir
11. Se realizar localización del eje de la vía y bordes de esta a construir, se identifican viviendas las cuales entrarían dentro del paramento del diseño de la vía entregado por la entidad contratante, las observaciones sobre este tema fueron entregadas a la entidad contratante para que gestione con la comunidad las acciones a tomar para solución este inconveniente

059

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 14 (Día) | 8 (Mes) | 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 1 Del: 9/08/2022 Al: 14/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	798,90

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA



SOCIALIZACIÓN



SOCIALIZACIÓN



TOPOGRAFIA

INFORMACION AMBIENTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

-Se entrega documentación de cantera a utilizar para materiales de subbase granular y rajón por parte de la firma contratista- Cantera Chicorel.
- Se solicita a la entidad contratante entregar permiso de tala de arboles

Fotografía 1:

Fotografía 2:

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra

Fotografía 1:

Fotografía 2:

Observaciones:

1. A la fecha no se han iniciado actividades de intervención en la vía a construir
2. Se realiza socialización de la obra con la comunidad
3. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
4. Se aprueba personal en obra para la ejecución del contrato

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

060

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. **FECHA** 22 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 2 Del: 15/08/2022 Al: 21/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se reflejan al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	0,00%	0,00%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ 0	$ -
Valor de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoria.	$ 23.943.705,11	Ejecución físico a la fecha presenta desfase en 0%	11,11%
			Ejecución física programada	11,11%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de inicio	9/08/2022	Fecha de inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VIA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90

DESCRIPCION Via Existente En Terreno Natural

Actividad:

ESTADO	
BUENO	
REGULAR	
MALO	

PROGRAMADO	


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
	0

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PERSONAL DE LA ZONA	0	LABORANDO	0	TOTAL INTERVENTORIA	0

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3		$ 137.650.728
SEMANA 4		$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.388.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

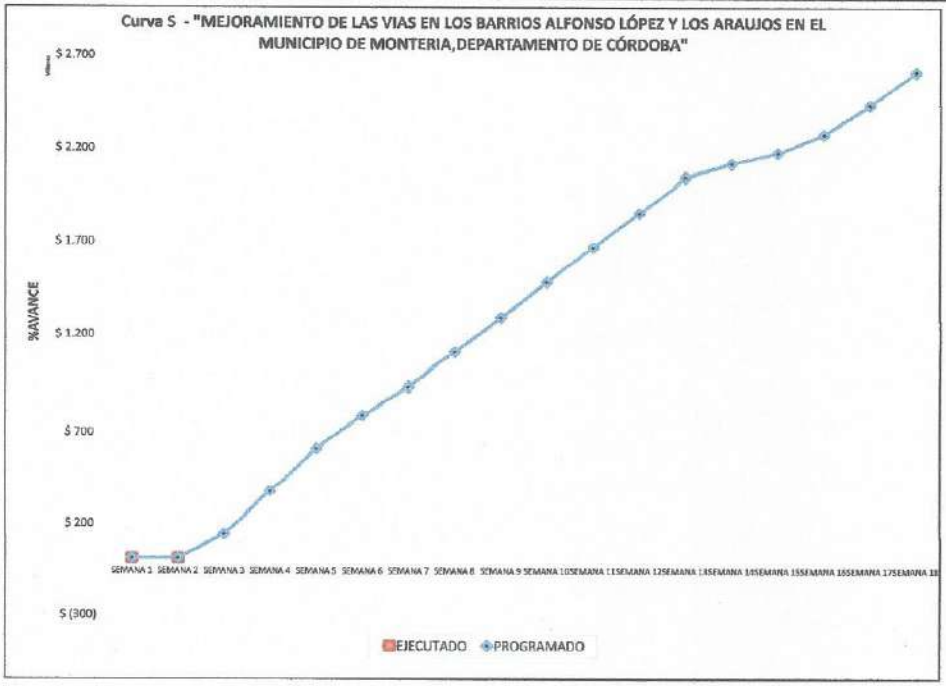

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se entregan documentos para inicio de obra por parte de la firma contratista y firma interventora a entidad contratante
2. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
3. Se solicita a la firma contratista entrega de programación de obra y flujo de caja impresas y firmadas
4. Se instala valla informativa de obra, se solicita a la firma contratista cambiar de lugar de esta teniendo en cuenta que donde actualmente se instalo no es muy visible a la comunidad
5. continúan las actividades de topografía sobre la vía, por parte de la firma contratista e interventoría
6. Se inicia el reconocimiento en campo de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato de obra
7. Se solicita a la firma contratista la entrega de los ensayos de los materiales a utilizar en campo
8. Se Solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de espacio publico a construir
9. Se solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de las redes eléctricas a intervenir
10. Se realizar recorrido entre contratista, interventoría y control urbano para visitar las viviendas que se encuentran ubicadas dentro del diseño del espacio publico para la vía a construir

061

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 22 (Día) | 8 (Mes) | 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 2 Del: 15/08/2022 Al: 21/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 5B ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



RECORRIDO CON CONTROL URBANO



RECORRIDO CON CONTROL URBANO



RECORRIDO CON CONTROL URBANO



TOPOGRAFIA



TOPOGRAFIA

INFORMACION SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

-Se realizar visita recorrido entre contratista e interventoria a las viviendas que se encuentran ubicadas dentro del diseño del espacio publico para la vía a construir



Fotografía 1:



Fotografía 2:

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita entrega de dotación al personal en obra
3.Se solicita documentos de retroexcavadora y equipos a utilizar

Fotografía 1:

Fotografía 2:

Observaciones:

1. A la fecha no se han iniciado actividades de intervención en la vía a construir
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles y diseño de espacio publico a construir
4. A la fecha No se presenta atraso al programa de obra

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

062

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/09/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA **FECHA:** 20 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 22/08/2022 Al: 28/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 5E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se reeitan al costo Incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,27%	0,17%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,17%	5,27%	-5,10%
Valor de la Obra programada:	$ 137.650.727	$ 4.446.668,80	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 4.446.669	$ 137.650.728	$ (133.204.059,00)
Valor de interventoria	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 35.915.557,67	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -	16,67%
			Ejecución física programada	16,67%	5,1%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 5E ENTRE CALLES 2 Y 9)			
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural	

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 320D	1
	1


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	6	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	1	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	16	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4		$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.604
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

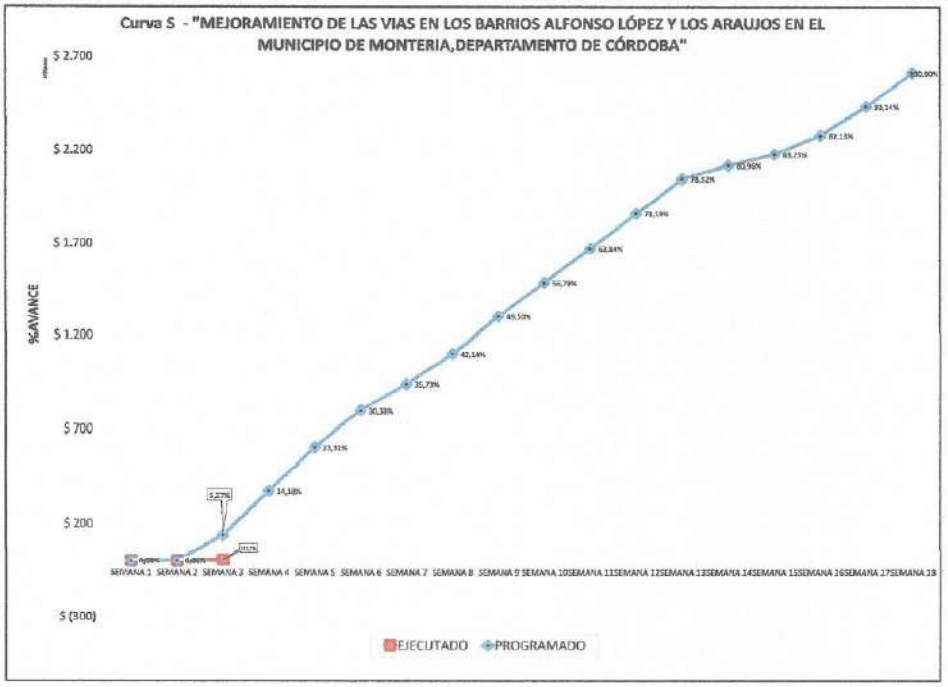

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se entregan documentos para inicio de obra por parte de la firma contratista y firma interventora a entidad contratante
2. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
3. Se solicita a la firma contratista entrega de programación de obra y flujo de caja impresas y firmadas
4. Se inicia actividades de excavacion desde el PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 AL PR0+095
5. Continúan las actividades de control de obra con topografía sobre la vía, por parte de la firma contratista e interventoría
6. Se solicita a la firma contratista contar con el equipo mínimo requerido en campo, solo se cuenta con retrocargador y tres volquetas
7. Se entrega por parte de la entidad contratante los planos del diseño de espacio publico a construir
8. Se solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de las redes eléctricas a intervenir
9. Se solicita a la entidad contratante entrega de permiso de corte de arboles
10. La firma contratista realiza excavacion desde el PR0+040 AL PR0+095 sin contar con el equipo mínimo requerido y sin contar con materiales como son rajon, y subbase granular para que puedan ir excavando y protegiendo la subrasante y evitar así que se produzcan fallos en estas por causa de lluvias, se le deja claro a la firma contratista que de presentarse fallos en la subrasante por esta causa debe subsanar estos sin costo alguno para el proyecto.

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA **FECHA:** 29 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 22/08/2022 Al: 28/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



LLUVIAS PR0+000 AL PR0+036



SEÑALIZACIÓN VIA

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita entrega de dotación al personal en obra
3.Se solicita documentos de equipo mínimo según pliegos
4.Se solicita colocar señalizacion en obra deacuerdo a PMT aprobado
5.Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en area a intervenir y colocar senderos peatonales a las viviendas afectadas por la excavación



Fotografía 1: Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en area a intervenir



Fotografía 2: Se solicita entrega de dotación al personal en obra

Observaciones:

1. A la fecha se inician actividades de excavación en la vía a construir PR0+000 AL PR0+095
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles, diseño de espacio publico a construir Y diseño electrico a implementar
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 5,10%
5.La firma contratista no acata las solicitudes de realizadas por la firma interventora en cuanto a lo relacionado con tener en campo equipo mínimo y realizar intervención por tramos

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ANEXO 04

ACTAS DE COMITÉ TECNICO DE SEGUIMINETO AL CONTRATO

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.1

FECHA PRESENTE ACTA		
8	8	2022
DD	MM	AA
PÁGINA 1	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	INGENIERO SUPERVISOR ALCALDIA	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	Elkin Rojas Anaya.
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	Jorge Carrascal P.

II. OBJETO

INICIO DE OBRA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

1. INICIO DE OBRA
2. SOCIALIZACION DEL PROYECTO
3.REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA**	**FECHA PRESENTE ACTA**			
		8	8		2022
		DD	MM		AA
	ACTA DE COMITÉ No.1	PÁGINA	2	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

1. INICIO DE OBRA:

*Se tiene como fecha tentativa de inicio el dia 8 de agosto del 2022

*Se entrega por parte de la firma contratista los siguientes documentos para firma de acta de inicio:

	Registro fotográfico de la valla informativa instalada (Según Formato)	11	Plan de Seguridad Industrial y salud Ocupacional (si aplica)
2	Acta de Socialización del proyecto (Según Formato)	12	Permiso y/o Licencia Tala y Poda de Árboles
3	Registro fotográfico situación existente (Según Formato)	13	Permiso y/o Licencia canteras aprobadas
4	Relación del Personal Profesional Propuesto (Según Formato)	14	Póliza del contrato y recibo de pago
5	Relación de equipo ofrecido (Según Formato)	15	Aprobación de póliza
6	Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)	16	Certificado de Registro presupuestal CRP
7	Inscripción de profesionales y trabajadores en seguridad social		
8	Cronograma de obra actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio		
9	Plan de calidad (si aplica)		
10	Plan ambiental (si aplica)		

*Estos documentos se deben entregar impresos y firmados originales

*Se solicita por parte de la firma contratista aplazar acta de inicio dos dias

*Por parte de la firma interventora se le indica a la firma contratista que contamos con todos los documentos para dar acta de inicio y recomendamos iniciar el dia 8 de de agosto del 2022

2. SOCIALIZACION DEL PROYECTO:

*Se realizo acta de socializacion el dia 8 de agosto del 2022 en la institución la Luz del Saber del barrio alfonzo lopez a la 9:00 a.m, se cuenta con asistencia de la comunidad, ..tratista, interventoria y entidad contratante

*Se realizo recorrido entre la comunidad, firma contrtaista e interventoria para revisar recorrido de aguas lluvias en los sectores a intervenir

3.REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES

*Se solicita a la entidad contratante lo siguiente:

- Permiso de tala de arboles, toda vez que se cuenta con solo radicado de solicitud de solicitud de esta
- Solicitar si se puede convertir en caso de llegarse a NO ejecutar los recursos de los planes PAPSO y PGIO en su implementacion a cantidades de obra
- Se solicita planos de diseños de como va a quedar el espacio publico a construir sobre la longitud de la via a intervenir
- Entrega de CDP a la interventoria
- Entrega de lista de chequeo de interventoria para dar acta de inicio al contrato

La entidad contratante solicitara los documentos pendientes en el menor tiempo posible para poder iniciar actividades de obra

*Se solicita a la firma contratista los siguientes documentos:

- Analisis de precios unitarios en pdf y excel firmados por el representante legal, se entregara en fecha 11 de agosto del 2022 por la firma contratista
- Flujo de caja o inversion complementario al promagrama de trabajo, se entregara en fecha hoy 08 de agosto del 2022 por la firma contratista
- Trazar eje de la via y parametros de esta deacuerdo a diseño entregado por la entidad contratante para verificar las casas que se encuentran dentro del trazado de la via a intervenir
- Despues de verificadas la viviendas que interfieren en el diseño de la via a intervenir, se debe enviar oficio con nomenclatura incluida para solicitar a la entidad contratante nos indique las acciones a tomar con respectos a estas viviendas

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.1

FECHA PRESENTE ACTA			
8	8		2022
DD	MM		AA
PÁGINA	3	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

- Ensayos de materiales de subbse y rajon de la cantera a utilizar
- Listado del personal a ingresar a obra y sus correspondientes afiliaciones a seguridad social
- Esquema de señalizacion a implementar en desarrollo del PMT

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE	CONTRATSITA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

VII. PROXIMA REUNION

FECHA: 12 (DIA) | AGOSTO (MES) | 2.022 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Monteria en Cordoba, a los

OCHO (Día en letras) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2.022 (Año de firma del acta)

068

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.2

FECHA PRESENTE ACTA			
12	8		2022
DD	MM		AA
PÁGINA	1	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	INGENIERO SUPERVISOR ALCALDIA	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	Elkin Rojas Anaya.
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	Jorge Carrascal P.
A MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	E.M.R.

II. OBJETO

GESTION DE DOCUMENTOS, DISEÑOS E INICIO DE OBRA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

***Se solicita a la entidad contratante lo siguiente:**	
- Permiso de tala de arboles, toda vez que se cuenta con solo radicado de solicitud de solicitud de esta	NO CUMPLE
- Solicitar si se puede convertir en caso de llegarse a NO ejecutar los recursos de los planes PAPSO y PGIO en su implementacion a cantidades de obra	SI CUMPLE
- Se solicita planos de diseños de como va a quedar el espacio publico a construir sobre la longitud de la via a intervenir	NO CUMPLE
- Entrega de CDP a la interventoria	NO CUMPLE
- Entrega de lista de chequeo de interventoria para dar acta de inicio al contrato	SI CUMPLE
***Se solicita a la firma contratista los siguientes documentos:**	
- Analisis de precios unitarios en pdf y excel firmados por el representante legal	NO CUMPLE
- Flujo de caja o inversion complementario al promagrama de trabajo	NO CUMPLE
- Trazar eje de la via y parametros de esta deacuerdo a diseño entregado por la entidad contratante para verificar las casas que se encuentran dentro del trazado de la via y enviar oficio a entidad contratante del tema	SI CUMPLE

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.2

FECHA PRESENTE ACTA		
12	8	2022
DD	MM	AA
PÁGINA 2	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

V. TEMAS TRATADOS

- Ensayos de materiales de subbse y rajon de la cantera a utilizar — NO CUMPLE
- Listado del personal a ingresar a obra y sus correspondientes afiliaciones a seguridad social — NO CUMPLE
- Esquema de señalizacion a implementar en desarrollo del PMT — NO CUMPLE

..CIO DE OBRA:

* Se firma acta de inicio de obra en fecha 09 de agosto del 2022

3.REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES

*Se solicita a la entidad contratante lo siguiente:

- Permiso de tala de arboles, toda vez que se cuenta con solo radicado de solicitud de solicitud de esta

La entidad contratante informa que ya realizo el tramite ante la CVS y que solo faltaria la resolución, en espera de esta

- Se solicita planos de diseños de como va a quedar el espacio publico a construir sobre la longitud de la via a intervenir

La entidad contratante informa que enviara diseño de andenes mediante oficio a firma contratista e interventoria

- Se solicita realizar visita a viviendas donde hay que intervenir por estar dentro del diseño geometrico de la via

- La entidad contratante informa que control urbano visitara el dia 16 de agosto la via donde se construira el pavimento, para visitar casas que quedan dentro del diseño del pavimento

A la fecha la firma contratista no ha dispuesto de equipo minimo para iniciar actividades en obra, asi mismo debe dotar a su gente de los EPP necesarios para realizar actividades de obra

Se solicita a la firma contratista los siguientes documentos para inicio de actividades de obra:

- Analisis de precios unitarios en pdf y excel firmados por el representante legal
- Flujo de caja o inversion complementario al promagrama de trabajo
- Ensayos de materiales de subbse y rajon de la cantera a utilizar
- Listado del personal a ingresar a obra y sus correspondientes afiliaciones a seguridad social
- Esquema de señalizacion a implementar en desarrollo del PMT
- Señalizacion en obra para inicio de actividades
- Equipo minimo exigido en pliego de condiciones

070

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.2

FECHA PRESENTE ACTA			
12	8		2022
DD	MM		AA
PÁGINA	3	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE

VII. PROXIMA REUNIÓN

FECHA: 19 (DIA) — AGOSTO (MES) — 2.022 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Yolombo en antioquia, a los

_____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.3

FECHA PRESENTE ACTA		
23	8	2022
DD	MM	AA
PÁGINA 1	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	INGENIERO SUPERVISOR ALCALDIA	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	Elkin Rojas Anaya.
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	Jorge Carrascal P.
A MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
JUAN IGNACIO PUPO	REP. LEGAL CONTRATISTA	

II. OBJETO

DOCUMENTOS REQUERIDOS Y ACTIVIDADES DE OBRA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

***Hojas de vida de personal:** Se aprueban todas las hojas de vida en fecha 4/08/2022, después de haber completado toda la documentación

***Relación del equipo mínimo obligatorio:** Se aprobó equipo mínimo de obra en el formato de la alcaldía, pero no se presento documentación de estos

***Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica:** Se entrega en fecha 11 de agosto del 2022||

Se realizan observaciones a estos – a la fecha no se han presentado por parte del contratista

***Programa de obra:** -El programa de obra se envió por primera vez en fecha 2-08-2022

***Se solicito ajuste a 4 meses**

***Se envió nuevamente y se solicito ajuste en cuanto intervención para que las dos primeras semanas fuera de topografía y no de ejecución de obra, se requiere impreso y**

firmado por Representante Legal

***Plan de manejo de tránsito- PMT:** -PMT - SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN WORD SIN FIRMA EL 27-7-2022, SE PRESENTAN OBSERVACIONES

-Se presenta nuevamente el 03-08 -2022

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA**	FECHA PRESENTE ACTA	
		23 / DD	8 / MM / 2022 / AA
	ACTA DE COMITÉ No.3	PÁGINA 2 DE 3	

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

V. TEMAS TRATADOS

-La firma contratista radica PMT en la secretaria de transito y transporte municipal

-Se aprueba por la STTM mediante oficio No. STTM 1454 del 2022 de fecha 08 de agosto del 2022, pero se debe cumplir con lo señalizado en este oficio.

-Se debe presentar PMT ajustado con esquema de señalización a implementar

PLAN DE CALIDAD: SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN WORD SIN FIRMA

-Se presenta el 03-08 -2022 Manual de Sistema de Gestión de Calidad: El contratista deberá presentar Plan de Inspección y Ensayos, donde se dé cumplimiento a Especificaciones Técnicas, indicando ensayo a realizar, frecuencia y norma a cumplir

***Plan de seguridad industrial y salud ocupacional:** *Se presenta el 03-08 -2022

DOCUMENTOS PARA ACTA DE INICIO:

*Registro fotográfico de la valla informativa instalada

*Acta de Socialización del proyecto: realizada el 8 de agosto del 2022

*Registro fotográfico situación existente: Entregado por la firma contratista

*Relación del Personal Profesional Propuesto: Entregado por la firma contratista

*Relación de equipo ofrecido: Aprobado relacion de equipo minimo, falta entregar documentación

*Relación de afiliación del personal a Seguridad social: Entregado por la firma contratista

*Inscripción de profesionales y trabajadores en seguridad social

*Cronograma de obra actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio: Pendiente presentar impreso y firmado por el rep. Legal

*Plan de calidad: se aprobó para acta de inicio, se debe ajustar

*Plan ambiental: se aprobó para acta de inicio, se debe ajustar

*Plan de Seguridad Industrial y salud Ocupaciona: se aprobó para acta de inicio, se debe ajustar

*Permiso y/o Licencia Tala y Poda de Árboles: ya se realizo la gestión por parte de la entidad contratante, Falta resolución de CVS

*Permiso y/o Licencia canteras aprobadas: Entregado por la firma contratista

DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES:

***Afiliación del personal profesional aprobado:** 10 profesionales

***Afiliación del personal de obra y dotación del personal en obra:** 6 personas (maestro (1), Obreros (5)

***Afiliación de operadores de equipos y maquinarias:** Presentan: Afiliación a ARL de Operador de Retroexcavadora, y conductores de 3 volquetas, no se presentan de más afiliaciones

En caso de ser alquilado deberá presentar contrato de alquiler y afiliación o pago de ultima planilla por parte del propietario

***Documentación de equipos:** -Presentan: De 3 volquetas T.P., SOAT, RUNT, LICENCIA CONDUCTOR, Retroexcavadora T.P.

- No presenta documentación de: 1 Retrocargador de pala, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Grúa Canasta, 1 Grúa hincar postes, 1 Carrotanque, 1 Carro canasta con brazo hidráulico

*Ensayos de materiales de cantera: - Se presenta por parte de la firma contratista, se presentan observaciones al rajón y se indica que parámetros debe cumplir el geotextil

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.3

FECHA PRESENTE ACTA			
23	8		2022
DD	MM		AA
PÁGINA	3	DE	3

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD:

*Entrega permiso tala de arboles: la entidad contratante indica que ya se realizo la gestión por parte de la entidad contratante, falta resolución por parte de CVS

rega de diseño espacio publico: En espera de comunicado donde indique este, como se estableció en reunión

Mediante correo se envio a la interventoria y firma contratista diseño de especio publico

*Diseño Eléctrico: No se han entregado

Informes Mensuales: Se solicita por parte de la entidad contratante entrega de informes mensuales I final de mes, los 5 deben estar publicados en la pagina de la entidad

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entrega de documentacion equipos en fecha 23 de agsoto del 2022	CONTRATISTA
Entrega de documentacion de afiliaciones de operadores de equipos en fecha 23 de agsoto del 2022	CONTRATISTA
Señalización: entrega de esquemas de señalización en fecha 24 de agosto del 2022	CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 2 (DIA) | SEPTIEMBRE (MES) | 2.022 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Yolombo en antioquia, a los

_____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

ANEXO 05

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO	INFORME No.1	
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO	
		DESDE	HASTA
		8-ago-22	31-ago-22
		CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

No. ORDEN	FECHA	ESPECIFICACION							
		DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	RANGO CUMPLIMIENTO	FRECUENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACION /ACCIONES
		ART. 320-13 SUBBASE							
		CLASE C NT1 CLASE B NT2 CLASE A NT3							
1		GRANULOMETRIA	E-213 O E-123			SBG-50 SBG-38	1 VEZ AL MES	% PASA	FRANJAS SEGÚN TABLA 320 -3
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS		CANTERA CHICORAL	1				CUMPLE
2		DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES 500 REVOLUCIONES	E-218			MAX 50 A 500 REV	1 VEZ AL MES	29%	CUMPLE
3		DEGRADACION POR ABRASION	E-238			- CLASE C MAX 35 CLASE B MAX 30 CLASE A	1 VEZ AL MES		NO SE REQUIERE SEGÚN TABLA 320 -3
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS		CANTERA CHICORAL	1			29%	CUMPLE
4		SULFATO DE SODIO	E-220			MAX 12	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - FINOS		CANTERA CHICORAL	1			5,8%	CUMPLE
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - GRUESOS		CANTERA CHICORAL	1			4,1%	CUMPLE
5		SULFATO DE MAGNESIO	E-220			MAX 18	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - FINOS		CANTERA CHICORAL	1			9,7%	CUMPLE
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - GRUESOS		CANTERA CHICORAL	1			11,6%	CUMPLE
6		LIMITE LIQUIDO %	E-125			MAX 25	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS		CANTERA CHICORAL	1			NL	CUMPLE
7		INDICE DE PLASTICIDAD %	E-125, E-126			MAX 6	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS		CANTERA CHICORAL	1			NP	CUMPLE
8		EQUIVALENTE DE ARENA %	E-133			MIN 25	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS		CANTERA CHICORAL	1			39%	CUMPLE
9		CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, MÁXIMO (%)	E-211			MAX 2%	1 VEZ AL MES		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - FINOS		CANTERA CHICORAL	1			0,2%	CUMPLE
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - GRUESOS		CANTERA CHICORAL	1			0,4%	CUMPLE
		RESISTENCIA DEL MATERIAL							
10		CRB %	E-148			CLASE C MIN 30 CLASE B MIN 30 CLASE A MIN 40	CADA VEZ QUE SE CAMBIE DE MATERIAL		
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - GRUESOS		CANTERA CHICORAL	1			31,0%	CUMPLE
11		ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN	E-142						
	8/08/2022	JORGE LUIS GALLEGO SILVA - LABORATORIOS - GRUESOS		CANTERA CHICORAL	1			2,004g/cm3	

Firma
Nombre: JORGE CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula No.: 22202223731-COR

Firma
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Director de Interventoría

076

J.G.S.	**DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS (ANALISIS POR TAMIZADO) INV-E-123-13, LIMITES DE ATTERBERG INV-E-125 y E-126 - 13 Y CLASIFICACION DE LOS SUELOS (U.S.C - AASHTO)**	CODIGO: FO-S-15-26-2
		VERSION : 02
	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO

ENSAYO N° 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MUESTRA

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE MATERIAL: CANTERA CHICORAL

TIPO DE MATERIAL: Sub-base

DOSIFICACION: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU

MUESTRA No. 1

FECHA DE TOMA 8-ago-22

FECHA ENSAYO 9-ago-22

3. ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

HUMEDAD NATURAL				PESO TOTAL DE LA MUESTRA HUMEDA
W1	W2	W3	%	6726 gr
234,2	221,5	45,6	7,22%	

Peso total de la muestra seca (gr)		6273,3	Peso total del material pasa tamiz N°4 (gr)		2803,0	Especificación Sub-base SBG-38
TAMIZ		Peso retenido individual	% Retenido individual	% Retenido Acumulado	% Que pasa	
Pulg	mm					
2"	50,00	0,0	0,0	0,0	100,0	
1 1/2"	37,50	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
1"	25,00	715,0	11,4	11,4	88,6	75 - 95
1/2"	12,50	1025,0	16,3	27,7	72,3	55 - 85
3/8"	9,52	576,3	9,2	36,9	63,1	45 - 75
N°4	4,760	1154,0	18,4	55,3	44,7	30 - 60
N°10	2,000	925,0	14,7	70,1	29,9	20 - 45
N°40	0,425	934,0	14,9	85,0	15,0	8 - 30
N°200	0,075	356,0	5,7	90,6	9,4	2 - 15
Pasan		588,0	9,4	100,0	0,0	

CLASIFICACION	
MODULO DE FINURA	
% RETENIDO TOTAL DE GRAVAS	55,3
% RETENIDO TOTAL DE ARENAS	35,3
% TOTAL PASA TAMIZ N° 200 =	9,4
% DE ERROR EN LA GRADACION =	0,0
LIMITE LIQUIDO	NL
LIMITE PLASTICO	NP
INDICE DE PLASTICIDAD	NP
INDICE DE GRUPO	1

EQUIPO UTILIZADO PARA ENSAYOS

Balanzas: LBL-20-14; LBL-320-01; LBL-8100-20
Cazuela Casagrande: LCCG-12

CLASIFICACION AASHTO
A-1-a
CLASIFICACION U.S.C.S
GP-GM


Limites de Atterberg


LIMITE LIQUIDO

ENSAYO N°	1	2	3
N° DE GOLPES	NP	0	0
N° DE TARA			
PESO SUELO+TARA HUMEDO	0,00	0,00	0,00
PESO SUELO+TARA SECO	0,00	0,00	0,00
PESO TARA	0,00	0,00	0,00
% DE HUMEDAD	0,00	0,00	0,00

LIMITE PLASTICO

ENSAYO N°	1	2	
TARA N°			
PESO SUELO+TARA HUMEDO	0,00	0,00	
PESO SUELO+TARA SECO	0,00	0,00	
PESO TARA	0,00	0,00	
% DE HUMEDAD	0,00	0,00	



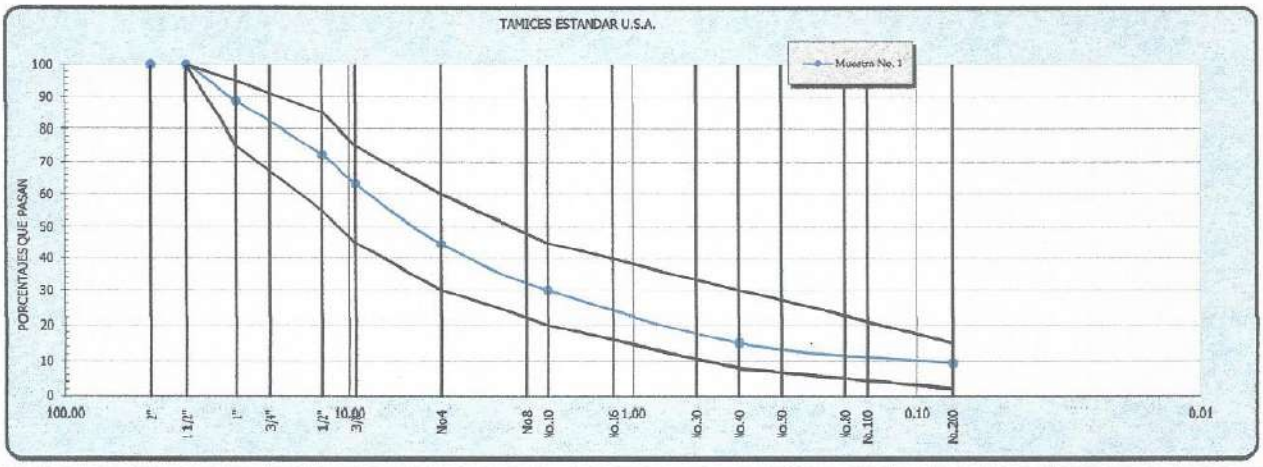

OBSERVACIONES :

ELABORÓ	REVISÓ	
Nombre: JORGE VANDA	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA	
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO	

077

J.G.S.	**RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES INV-E-218 - 219 - 2013** JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	CÓDIGO: FO-S-15-23 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO MUESTRA No. 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MATERIAL.

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE DE MATERIAL: CANTERA CHICORAL — ENSAYO No. 1

TIPO DE MATERIAL: Sub-base — FECHA DE TOMA 8-ago-22

LABORATORIO: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU — FECHA DE ENSAYO 10-ago-22

3. ENSAYO

TAMAÑO DEL MATERIAL	Tamaño máximo		Tamaño máx. nominal		EQUIPO UTILIZADO
	38 mm	1 1/2"	25 mm	1"	Maquina de los Angeles

PRUEBA No	1	2
Gradación usada	A	A
Número de esferas		12
Número de revoluciones		500
Peso muestra seca antes de ensayo, (g)		5000
Peso muestra seca después de ensayo y lavado por tamiz No 12, (g)		3544
Perdida, (g)		1.456
% Perdida por abrasión e impacto		**29%**

Tamaños				Peso y granulometrías de la muestra para ensayo (g)						
				I.N.V. E - 218 -13				I.N.V. E - 219 -13		
Pasa tamiz		Retenido en tamiz		TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm				TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm		
mm	(alt)	mm	(alt)	A	B	C	D	1	2	3
75	3,0"	62,5	2,1/2"					2500 ± 50		
62,5	2,1/2"	50	2"					2500 ± 50		
50	2,0"	37,5	1,1/2"					5000 ± 50	5000 ± 50	
37,5	1,1/2"	25	1"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
25	1,0"	19	3/4"	1250 ± 25						5000 ± 25
19	3/4"	12,5	1/2"	1250 ± 25	2500 ± 10					
12,5	1/2"	9,5	3/8"	1250 ± 25	2500 ± 10					
9,5	3/8"	63	1/4"			2500 ± 10				
6,3	1/4"	4,76	No 4			2500 ± 10				
4,75	No 4	2,36	No 8				5000 ± 10			
Totales				5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	10000 ± 100	10000 ± 75	10000 ± 50
N° de Esferas				12	11	8	6	12	12	12
Masa de la carga (g)				5000 ± 25	4584 ± 25	3330 ± 20	2500 ± 15	5000 ± 25	5000 ± 25	5000 ± 25
N° de Revoluciones				500	500	500	500	1000	1000	1000

4. ESPECIFICACIÓN

NIVEL DE TRAFICO	NT1		NT2		NT3		CONCRETO		ARTICULO
CLASE DE MATERIAL	C		B		A				
REVOLUCIONES	500	100	500	100	500	100	500	100	
AFIRMADO	50	-	50	-	50	-	-	-	311 - 13
SUBBASE GRANULAR	50	-	50	-	50	-	-	-	320 - 13
BASE GRANULAR	40	8	40	8	35	7	-	-	330 - 13
MEZCLA DENSA EN CALIENTE -RODADURA-	25	5	25	5	25	5	-	-	450-13
MEZCLA DENSA EN CALIENTE -INTERMEDIA-	35	7	35	7	35	7	-	-	450-13
MEZCLA DENSA EN CALIENTE -BASE-	-	-	35	7	35	7	-	-	450-13
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	-	-	-	-	-	-	40	8	500-13
CONCRETO ESTRUCTURAL	-	-	-	-	-	-	40	8	630-13

5. CONTROL

Producto Conforme: SI [X] NO [ ]

Disposición producto no conforme:

a. Reprocesar [ ] c. Aceptación por derogación (con o sin reparación) [ ]

b. Reclasificar [ ] d. Rechazar [ ]

OBSERVACIONES:

ELABORO	REVISO
Nombre: JORGE VANDA	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO

	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO NORMA INV- E-220 - 13	CÓDIGO: FO-S-15-25 VERSIÓN: 08
J.G.S.	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO MUESTRA No 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MATERIAL.

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE MATERIAL: CANTERA CHICORAL — ENSAYO No. 1

TIPO DE MATERIAL: Sub-base — FECHA DE TOMA 8-ago-22

LABORATORIO: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU — FECHA DE ENSAYO 10-ago-22

3. ENSAYO

Solución utilizada: Sulfato de Sodio (Na_2SO_4) — Gs solución gr/cm3: 1,6 — N° de ciclos: 5

Equipo utilizado: Termómetro — Balanza — Horno

Agregados	Tamiz: Tamaño Agreg. Pasa	Tamiz: Tamaño Agreg. Retiene	Tamiz: Para determinar la perdida	% Retenido Gradación original	% Retenido Gradación Ponderada	Masa fracciones antes del ensayo (g)	Masa fracciones después del ensayo (g)	% pasa menor tamiz después del ensayo	% Perdida ponderado (% pérdida corregido)
Fino	3/8"	N°4	N°4	18,4	42,7	100,0	97,0	0,03	1,3
	N°4	N°8	N°8	11,9	27,7	100,0	92,0	0,08	2,2
	N°8	N°16	N°16	5,1	11,8	100,0	92,0	0,08	0,9
	N°16	N°30	N°30	6,5	15,1	100,0	92,0	0,08	1,2
	N°30	N°50	N°50	1,1	2,6	100,0	93,0	0,07	0,2
	TOTALES			43,0	100,0	*% EN PERDIDA AGREG. FINO*			5,8
Grueso	3"	2 1/2"	2"						
	2 1/2"	1 1/2"	1 1/4"						
	1 1/2"	1"	5/8"	11,4	20,6	1002,0	973,0	2,89	0,6
	1"	3/4"	5/8"	6,5	11,7	510,0	501,0	1,76	0,2
	3/4"	1/2"	5/16"	9,9	17,8	672,0	658,0	2,08	0,4
	1/2"	3/8"	5/16"	9,2	16,6	331,0	305,0	7,85	1,3
	3/8"	N°4	N°5	18,4	33,3	300,0	285,0	5,00	1,7
	TOTALES			55,3	100,0	*% EN PERDIDA AGREG. GRUESO*			4,1

4. ESPECIFICACIÓN

Materiales	Sulfato sodio	Sulfato de magnesio
Afirmados, subbases y bases	12	18
Pavimentos asfalticos	-	18
Concreto para pavimento	10	15
Concreto estructural -grava-	12	18
Concreto estructural -arena-	10	15

5. CONTROL

Producto Conforme: SI [X] NO [ ]

Disposición producto no conforme:

a. Reprocesar [ ] c. Aceptación por derogación (con o sin reparación) [ ]

b. Reclasificar [ ] d. Rechazar [ ]

Observaciones:

ELABORO	REVISO
Nombre: JORGE VANDA	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO

J.G.S.	**SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO** **NORMA INV- E-220 - 13**	CÓDIGO: FO-S-15-25 VERSIÓN: 08
	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO MUESTRA No 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MATERIAL.

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE MATERIAL: CANTERA CHICORAL — ENSAYO No. 1

TIPO DE MATERIAL: Sub-base — FECHA DE TOMA 8-ago-22

DOSIFICACION: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU — FECHA DE ENSAYO 10-ago-22

3. ENSAYO

Solución utilizada: Sulfato de Magnesio ($MgSO_4$) — Gs solución gr/cm3: 1,3 — N° de ciclos: 5

Equipo utilizado: Termómetro ____ Balanza ____ Horno ____

Agregados	Tamiz: Tamaño Agreg. Pasa	Tamiz: Tamaño Agreg. Retiene	Para determinar la perdida	% Retenido Gradación original	% Retenido Gradación Ponderada	Masa fracciones antes del ensayo (g)	Masa fracciones después del ensayo (g)	% pasa menor tamiz después del ensayo	% Perdida ponderado (% pérdida corregido)
Fino	3/8"	N°4	N°4	18,4	42,7	100,0	92,0	8,00	3,4
	N°4	N°8	N°8	11,9	27,7	100,0	89,0	11,00	3,0
	N°8	N°16	N°16	5,1	11,8	100,0	89,0	11,00	1,3
	N°16	N°30	N°30	6,5	15,1	100,0	89,0	11,00	1,7
	N°30	N°50	N°50	1,1	2,6	100,0	89,0	11,00	0,3
	TOTALES			43,0	100,0	***% EN PERDIDA AGREG. FINO***			**9,7**
Grueso	3"	2 1/2"	2"						
	2 1/2"	1 1/2"	1 1/4"						
	1 1/2"	1"	5/8"	11,4	20,6	1020,0	910,0	10,78	2,2
	1"	3/4"	5/8"	6,5	11,7	512,0	459,0	10,35	1,2
	3/4"	1/2"	5/16"	9,9	17,8	675,0	628,0	6,96	1,2
	1/2"	3/8"	5/16"	9,2	16,6	331,0	282,0	14,80	2,5
	3/8"	N°4	N°5	18,4	33,3	300,0	260,0	13,33	4,4
	TOTALES			55,3	100,0	***% EN PERDIDA AGREG. GRUESO***			**11,6**

4. ESPECIFICACIÓN

Materiales	Sulfato sodio	Sulfato de magnesio
Afirmados, subbases y bases	12	18
Pavimentos asfalticos	-	18
Concreto para pavimento	10	15
Concreto estructural -grava-	12	18
Concreto estructural -arena-	10	15

5. CONTROL

Producto Conforme: SI [X] NO [ ]

Disposición producto no conforme:

a. Reprocesar [ ] c. Aceptación por derogación (con o sin reparación) [ ]

b. Reclasificar [ ] d. Rechazar [ ]

Observaciones:

ELABORO	REVISO
Nombre: **JORGE VANDA**	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO

080

	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV-E-133-13	CODIGO: FO-S-15-27 VERSIÓN: 06
J.G.S.	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO **MUESTRA No.** 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MATERIAL.

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE DE MATERIAL: CANTERA CHICORAL — ENSAYO No. 1

TIPO DE MATERIAL: Sub-base — FECHA DE TOMA 8-ago-22

DOSIFICACION: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU — FECHA ENSAYO 9-ago-22

3. ENSAYO

PRUEBA	A	B	C
Probeta No.	1	2	3
Lectura de la arena -mm-	2,6	2,7	2,6
Lectura de la arcilla -mm-	6,9	7,0	6,7
Equivalente de arena %	38	39	39
Promedio %	39,0		
EQUIVALENTE DE ARENA	**39**	**%**	
Equipo utilizado para el ensayo			

4. ESPECIFICACIÓN

Sub-base 25 %

ESPECIFICACIONES INVIAS 2013	
Sello arena asfalto	50 % Min.
Mezcla densa en caliente	50 % Min.
ub-base	25 % Min.
Base Granular	30 % Min.
Agregado fino para concreto	60 % Min.

5. CONTROL

Producto Conforme: SI [X] NO [ ]

Disposición producto no conforme:

a. Reprocesar [ ] c. Aceptación por derogación (con o sin reparación) [ ]

b. Reclasificar [ ] d. Rechazar [ ]

OBSERVACIONES:

ELABORO	REVISO
Nombre: JORGE VANDA	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO

	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS INV E - 211 -13	CÓDIGO: FO-S-15-63
		VERSIÓN: 04
	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

MUESTRA No. 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLANTA: CANTERA CHICORAL

2. MATERIAL

DESCRIPCIÓN: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE DE MATERIAL: CANTERA CHICORAL

TIPO DE MATERIAL: Sub-base

LABORATORIO: 4 DE SUB BASE X 1 DE ARENA RIO SINU

ENSAYO No. 1

FECHA DE TOMA 8-ago-22

FECHA DE ENSAYO 11-ago-22

3. ENSAYO

Equipo utilizado, cod: Balanza _____ Horno _____

AGREGADO FINO

Tamaño del agregado				Masa mínima de la muestra de ensayo, (g)	Peso muestra (g) -M-	Peso Material retiene tamiz (g) -R-	% terrones de arcilla y partículas deleznables	% Retenido Gradación original	% terrones de arcilla por % retenido grad.original -P-
Pasa		Retiene							
mm	Alternat.	mm	Alternat.						
4, 75	No.4	1,18	No.16	> 25	25	24,1	3,60	5,1	0,2
% Terrones de arecilla y partículas deleznables									**0,2**

AGREGADO GRUESO

Tamaño del agregado				Masa mínima de la muestra de ensayo, (g)	Peso muestra (g) -M-	Peso Material retiene tamiz (g) -R-	% terrones de arcilla y partículas deleznables	% Retenido Gradación original	% terrones de arcilla por % retenido grad.original -P-
Pasa		Retiene							
mm	Alternat.	mm	Alternat.						
4,75	No.4	9,5	3/8"	1000	1000	985	1,50	18,4	0,3
9,5	3/8"	19	3/4"	2000	2000	1982	0,90	9,2	0,1
19	3/4"	37,5	1½"	3000	3000	2978	0,7	6,5	0,0
Mayores de 37,5 mm (1½")				5000	0	0		0	
% Terrones de arcilla y partículas deleznables									**0,4**

% Terrones de arcilla y partículas deleznables, total **0,6**

4. ESPECIFICACION

% Terrones de arcilla y partículas deleznables, total 2 % max.

Agregado fino 0,2 % max. Agregado grueso 0,4 % max.

Materiales	Fino	Grueso
Afirmado, subbase y base granular	2% max.	
Pavimento de concreto hidraulico	3% max.	
Concreto estructural	1% max.	0,25% max.

5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Producto Conforme: SI [X] NO [ ]

Disposición producto no conforme:

a. Reprocesar [ ] c. Aceptación por derogación (con o sin reparación) [ ]

b. Reclasificar [ ] d. Rechazar [ ]

OBSERVACIONES: _____

ELABORO	REVISO
Nombre: JORGE VANDA	Nombre: JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo: Laboratorista	Cargo: ING GEOTECNICO

J.G.S.	**RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) INV-E - 148 - 13**	CODIGO: FO-S-15-22
JORGE LUIS GALLEGO SILVA CIVIL M.P 25202-40122 DE CND INGENIERO ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS		VERSIÓN: 03-FEB-16

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**MUESTRA No. :**	1
MATERIAL:	Sub-base			**Ensayo No.**	1
DESCRIPCIÓN:	Suelo Granular Arena limoso			**FECHA DE MUESTREO**	8 de agosto de 2022
PLANTA:	CANTERA CHICORAL	**FECHA DE MUESTREO:**	8 de agosto de 2022	**FECHA DE ENSAYO:**	10 de agosto de 2022

DENSIDAD SECA

PRUEBA	1	2	3	4
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Peso muestra húmeda + molde, (g).	9315	9561	9671	9557
Peso molde, (g)..	5169	5169	5169	5169
Peso muestra húmeda, (g).	4146	4392	4502	4388
Volumen molde, cm3.	2123,2	2123,2	2123,2	2123,2
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	1,953	2,069	2,120	2,067
Densidad muestra seca, gr/cm3	1,901	1,984	1,993	1,913

HUMEDAD

Recipiente No.	3	32	44	35
Peso rec. + Muestra Hum. (g).	234,5	225,6	321,6	234,7
Peso rec. + Muestra Seca (g).	230	219,1	306,7	221,6
Peso Recipiente (g).	63,2	67,3	72,7	58,2
Contenido de Humedad (%)	2,7	4,3	6,4	8,0


PREPARACION DE MUESTRAS PARA CBR.

PRUEBA	1	2	3
No. de Golpes	56	25	10
Molde No.	31	56	103
No. de Capas	5	5	5
Peso muestra húmeda + molde, (g).	12198	10832	11989
Peso molde, (g)..	7669	6532	7785
Peso muestra húmeda, (g).	4529	4300	4204
Volumen molde, cm3	2146,61	2104,92	2115,8
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,110	2,043	1,987
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,002	1,938	1,885

HUMEDAD

Recipiente No.	1	2	3
Peso rec. + Muestra Hum. (g).	234,5	234,5	234,5
Peso rec. + Muestra Seca (g).	225,1	225,1	225,1
Peso Recipiente (g).	51,2	51,2	51,2
Contenido de Humedad (%)	5,41	5,41	5,41

CURVA PROCTOR MODIFICADO NORMA INV- E-142

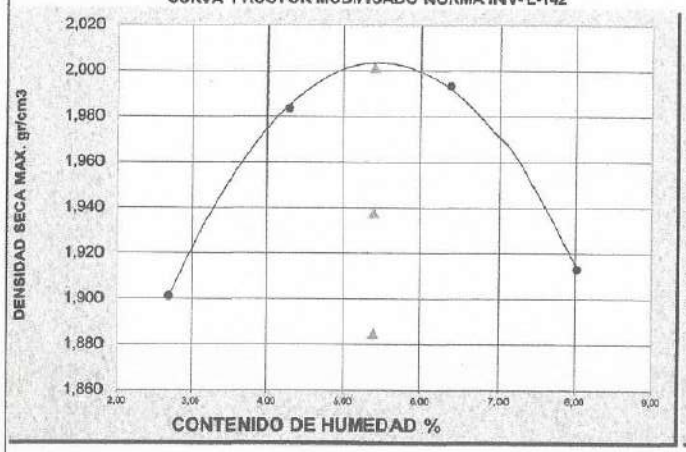

CBR vs DENSIDAD SECA MAXIMA



CBR	Sin corrección		
A 2,54 mm (0,1")	70,98	47,29	31,55
A 5,08 mm (0,2")	82,90	55,29	36,83

CBR	*Corregido*		
A 2,54 mm (0,1")	70,86	47,25	31,49
A 5,08 mm (0,2")	122,8	81,9	54,6

RESULTADOS DEL ENSAYO		
DENSIDAD MAX.	2,004	Gr/cm3
HUMEDAD OPTIMA	5,45	%
DENSIDAD,AL 95% PM	1,904	Gr/cm3
CBR A 100 % DE PROCTOR MODIFICAD	71,1	%
CBR A 95 % DE PROCTOR MODIFICADO	37,0	%
% RET. TAMIZ 3/4"GRAD. ORIGINAL	17,67	%

OBSERVACIONES :

ELABORO		REVISO	
Nombre:	JORGE VANDA	Nombre:	JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo:	Laboratorista	Cargo:	ING GEOTECNICO

280

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

INFORME No.1	
PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO	
DESDE	HASTA
9-ago-22	31-ago-22
CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

No. ORDEN	FECHA	ESPECIFICACION							
		DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	RANGO CUMPLIMIENTO	FRECUENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACION /ACCIONES
		ART. 221-13 PEDRAPLEN							
		GRANULOMETRIA	E-123			TAMAÑO MAX 2/3 DE LA CAPA COMPACTADA	CADA 8 DIAS		CURVA GRANULOMETRICA SEGÚN TABLA 221-1
						% EN MASA DE PARTICULAS MENORES AL TAMIZ DE 25,00 mm(1"), SERA INFERIOR AL 35%			
						% EN MASA DE PARTICULAS QUE PASEN EL TAMIZ DE 75 mm (No.200). SERA INFERIOR AL 10%			
1		RESISTENCIA A LA ABRASION					1 VEZ AL MES		SEGÚN TABLA E-219
		DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	E-219			MAX 50%			
	3/09/2022	INTERVENTORIA				32,76%			CUMPLE
3									

Firma
Nombre: JORGE CARRASCAL
Director de Obra

Firma
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Director de Interventoría

ROBINSON MARTINEZ SANDOVAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	*ESTUDIO DE SUELOS* *DISEÑO DE PAVIMENTOS* *CARACTERIZACION DE MATERIALES* *DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS* *ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD*	

RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (3/4") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES
I.N.V. E – 219-13

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN VÍA ALFONSO LÓPEZ		
CONTRATISTA: ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ INGENIERÍA SAS	MATERIAl: PIEDRA RAJÓN	FECHA: 03/09/2022

PRUEBAS	1	2	3	4
Gradación usada	E			
No. de Esferas	12			
No. de Revoluciones	500			
Pa= Peso de muestra seca antes del ensayo, gr	10000			
Pb= Peso de muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre el tamiz 200	6724			
Pa - Pb = Pérdida	3276			
% Desgaste = (Pa-Pb)/Pa *100	32,76			
Especificación Articulo INV 320 -13, máximo 50%	**Cumple Art. 320-13**			

OBSERVACIONES:

ROBINSON MARTINEZ SANDOVAL
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Cra 14C N° 39-38 B/ La Floresta. Tel (4)7891152 - 3137836397. Montería - Córdoba.
laboratoriorams@gmail.com

ANEXO 06

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MONTERÍA

CONTROL PARAFISCALES OBRA

FECHA		
DD	MES	AÑO
31	AGO	2022

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022 | **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA | **PLANILLA No.:** AGOSTO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Período laborado	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	MES O PERIODO																													EPS	Pensiones	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	J	V	S				
PLANILLAS: 9439861259 Y 9440037459																																						
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA			1069468639		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
RODOLFO URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA			6.889.639								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS			11.000.193								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
DIANA PALACIOS MOSQUERA	ING. ESPECIALISTRA AMBIENTAL			1.067.886.516								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO			78.747.853								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA			1.064.985.371								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
MARIA CAMILA CABALLEO	SECRETARIA			1.003.002.882								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO			1.067.926.673								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR			78.694.807											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
NINI JOHANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL			49.606.740								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO	AUXILIAR SISO			10.778.895																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
ESTEBAN FIGUEROA SALAS	ING. AUXILIAR DE OBRA			10.932.363								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
MATEO DE JESUS SEBÁ FERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA			1.067.947.461								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFACOR
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO			78.700.712																									X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ERICK PLAZA ARDINES	CADENERO			1.067.926.278																									X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JHONATAN LEON MARTINEZ	AYUDANTE			1.003.452.457								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JULIAN HERNANDEZ FLOREZ	AYUDANTE			1.133.797.655								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
EDER LUIS BLANCO TABORDA	AYUDANTE			1.003.434.734								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	AYUDANTE			10.767.500								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
JAWIT GONZALEZ MORELO	AYUDANTE			1.067.866.750								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	OFICIOS VARIOS			1.003.466.270																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
RAFAEL DARIO PASTRANA PASTRANA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA			1.064.991.934																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
CARMELO ENRIQUE LLORENTE GALVAN	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA			1.064.985.163																														X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR


Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS


220

ANEXO 07

PROGRAMA DE INVERSIONES

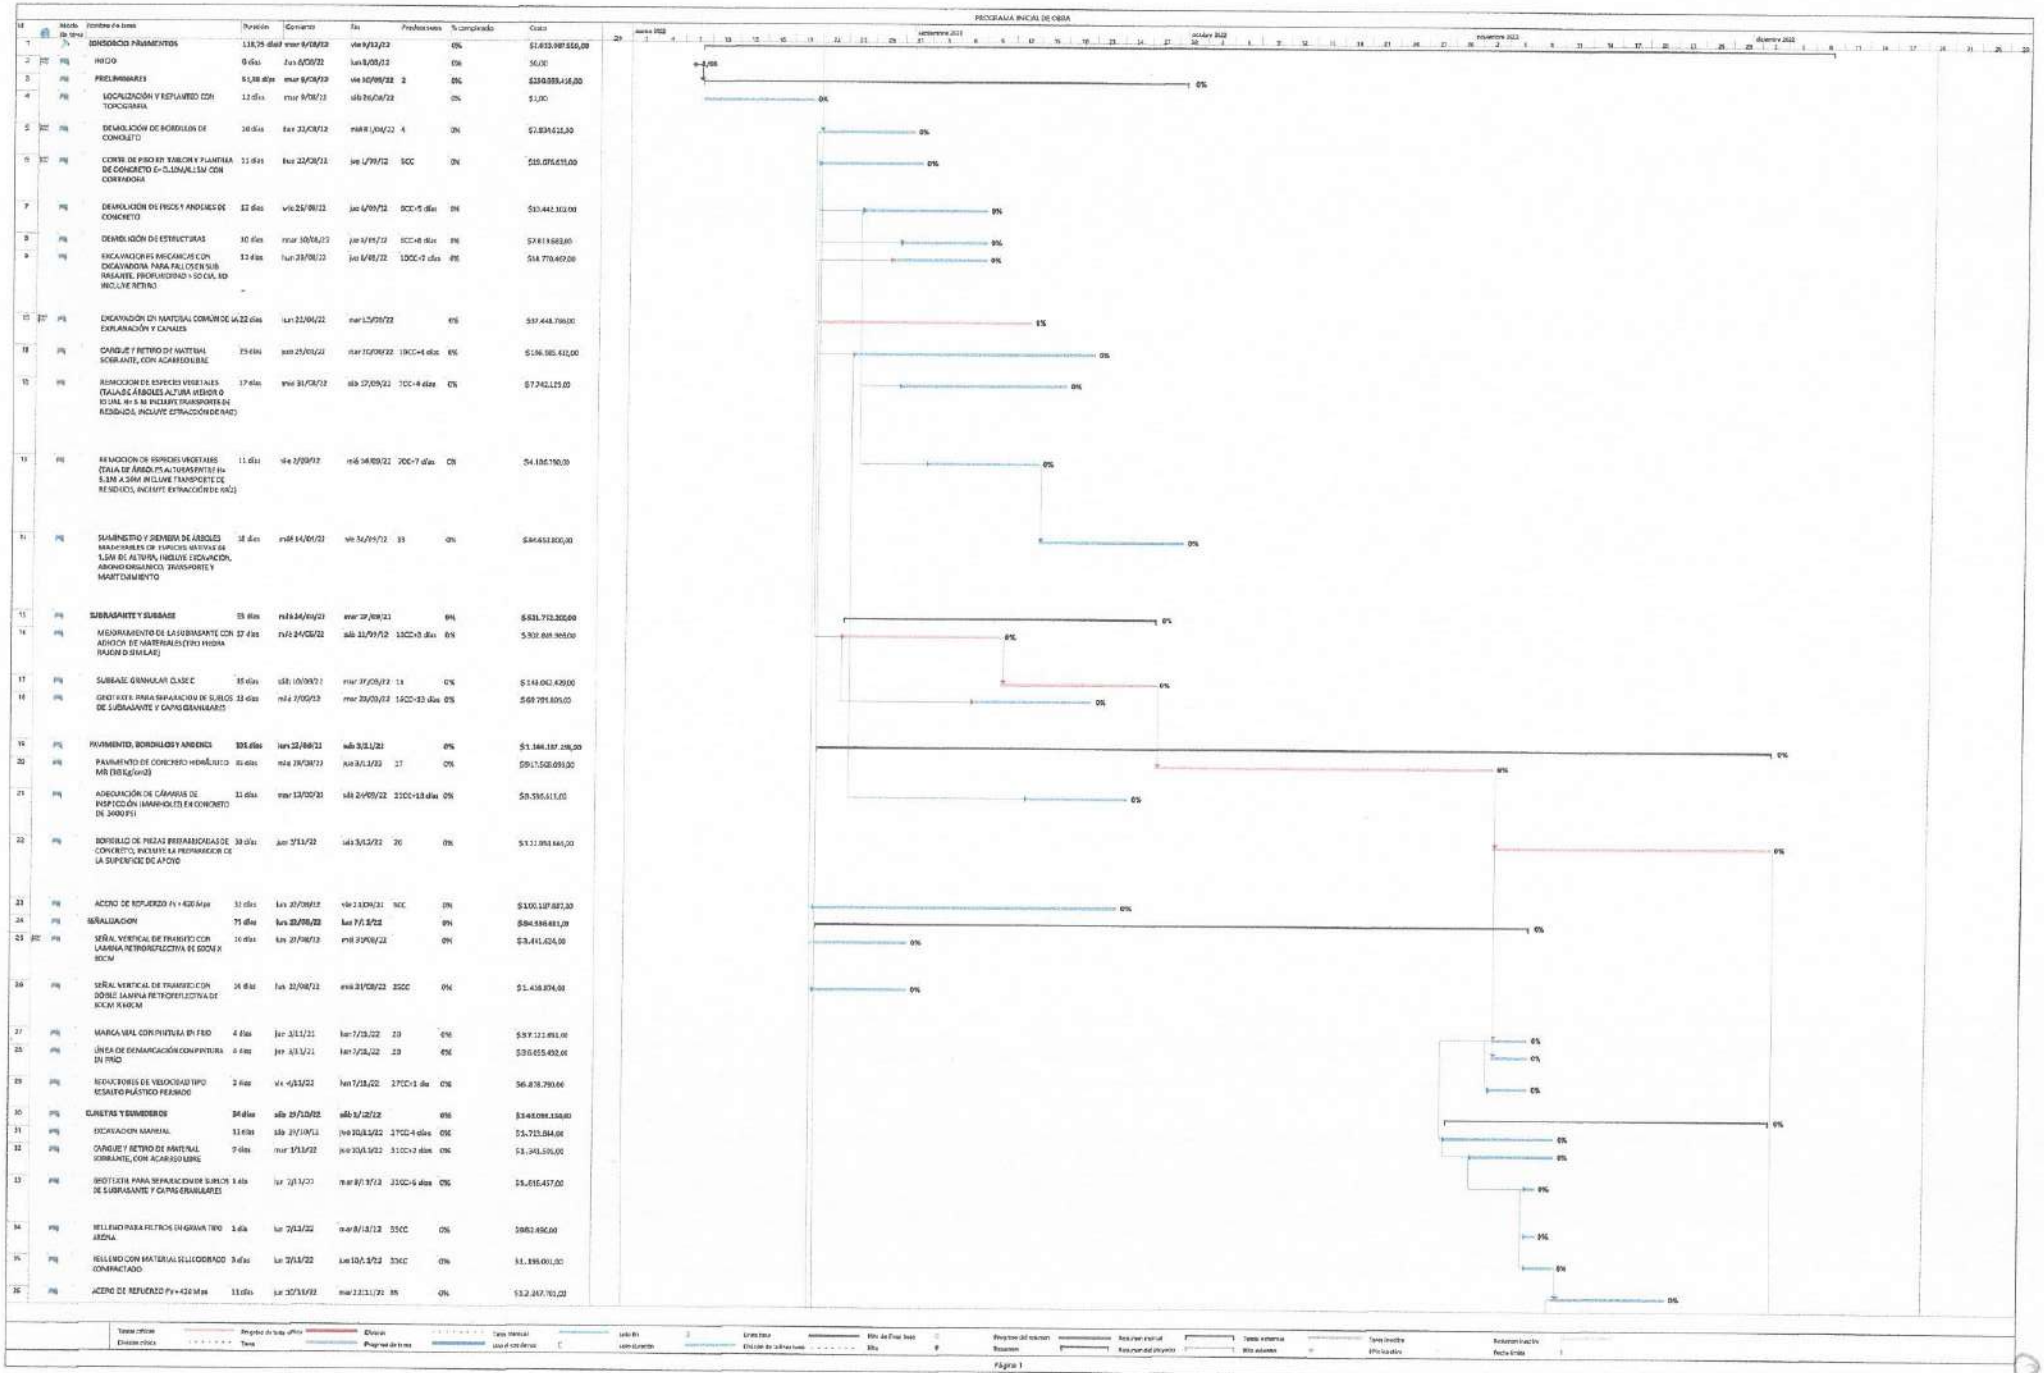

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo
1		CONSORCIO PAVIMENTOS	118,75 días?	mar 6/09/22	vie 9/12/22		0%	$1.032.987.550,00
2		INICIO	0 días	jue 6/09/22	lun 6/09/22		0%	50,00
3		PRELIMINARES	5,38 días	mar 6/09/22	vie 16/09/22	2	0%	$230.999.416,00
4		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	1 día	mar 6/09/22	sáb 24/09/22		0%	$1,00
5		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	10 días	lun 22/09/22	mar 4/10/22	4	0%	$7.834.612,50
6		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,10M,f'c=15M CON CORTADORA	11 días	lun 22/09/22	jue 6/10/22	SCC	0%	$15.076.611,00
7		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	12 días	vie 23/09/22	jue 6/10/22	SCC+5 días	0%	$10.442.102,00
8		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	10 días	mar 30/08/22	jue 8/09/22	SCC+8 días	0%	$7.811.683,00
9		EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALCOS EN SUB RASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO	12 días	lun 29/08/22	jue 8/09/22	10CC+2 días	0%	$14.770.467,00
10		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE 14,22 días EXPLANACIÓN Y CANALES		lun 22/09/22	mar 4/10/22		0%	$37.448.700,00
11		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	23 días	jue 29/09/22	mar 18/09/22	10CC+4 días	0%	$106.985.412,00
12		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR 0 5 0 M, H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	17 días	mié 31/08/22	sáb 17/09/22	7CC+4 días	0%	$7.742.125,00
13		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA PROMEDIO H= 5,1M A 20M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	11 días	vie 2/09/22	mié 14/09/22	7CC+7 días	0%	$4.186.150,00
14		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 5,5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	18 días	mié 14/09/22	vie 30/09/22	13	0%	$84.651.800,00
15		SUBRASANTE Y SUBBASE	55 días	mié 14/09/22	mar 29/11/22		0%	$631.713.300,00
16		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO HIDRA RASION O SIMILAR)	37 días	mié 14/09/22	sáb 22/10/22	10CC+3 días	0%	$302.869.968,00
17		SUBBASE GRANULAR CLASE C	35 días	sáb 10/09/22	mar 27/09/22	16	0%	$148.042.429,00
18		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	33 días	mié 21/09/22	mar 25/10/22	16CC+10 días	0%	$69.701.809,00
19		PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES	101 días	lun 12/09/22	sáb 3/12/22		0%	$1.166.187.298,00
20		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (50 Kg/cm2)	81 días	mié 28/09/22	lun 28/11/22	17	0%	$317.568.091,00
21		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	11 días	mar 13/09/22	sáb 24/09/22	21CC+13 días	0%	$8.536.611,00
22		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	38 días	jue 3/11/22	sáb 3/12/22	20	0%	$131.894.868,00
23		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	31 días	lun 10/09/22	vie 21/09/22	SCC	0%	$100.107.887,00
24		SEÑALIZACION	75 días	lun 22/08/22	lun 7/11/22		0%	$84.586.681,00
25		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 80CM	16 días	lun 29/08/22	mié 21/09/22		0%	$3.441.624,00
26		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 80CM X 60CM	16 días	lun 22/08/22	mié 21/09/22	25CC	0%	$1.416.874,00
27		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	4 días	jue 3/11/22	lun 7/11/22	23	0%	$37.121.491,00
28		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	4 días	jue 3/11/22	lun 7/11/22	23	0%	$30.655.452,00
29		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO REFLEJADO	2 días	vie 4/11/22	lun 7/11/22	27CC+1 día	0%	$6.838.790,00
30		CUNETAS Y SUMIDEROS	34 días	sáb 29/10/22	sáb 3/12/22		0%	$343.094.138,00
31		EXCAVACION MANUAL	11 días	sáb 29/10/22	lun 10/11/22	27CC+4 días	0%	$1.712.884,00
32		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	9 días	mar 1/11/22	jue 10/11/22	31CC+3 días	0%	$1.340.596,00
33		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	1 día	lun 7/11/22	mar 8/11/22	31CC+6 días	0%	$5.616.457,00
34		RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	1 día	lun 7/11/22	mar 8/11/22	33CC	0%	$982.490,00
35		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	3 días	lun 7/11/22	lun 10/11/22	33CC	0%	$1.196.001,00
36		ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa	11 días	lun 10/11/22	mar 22/11/22	35	0%	$12.247.760,00

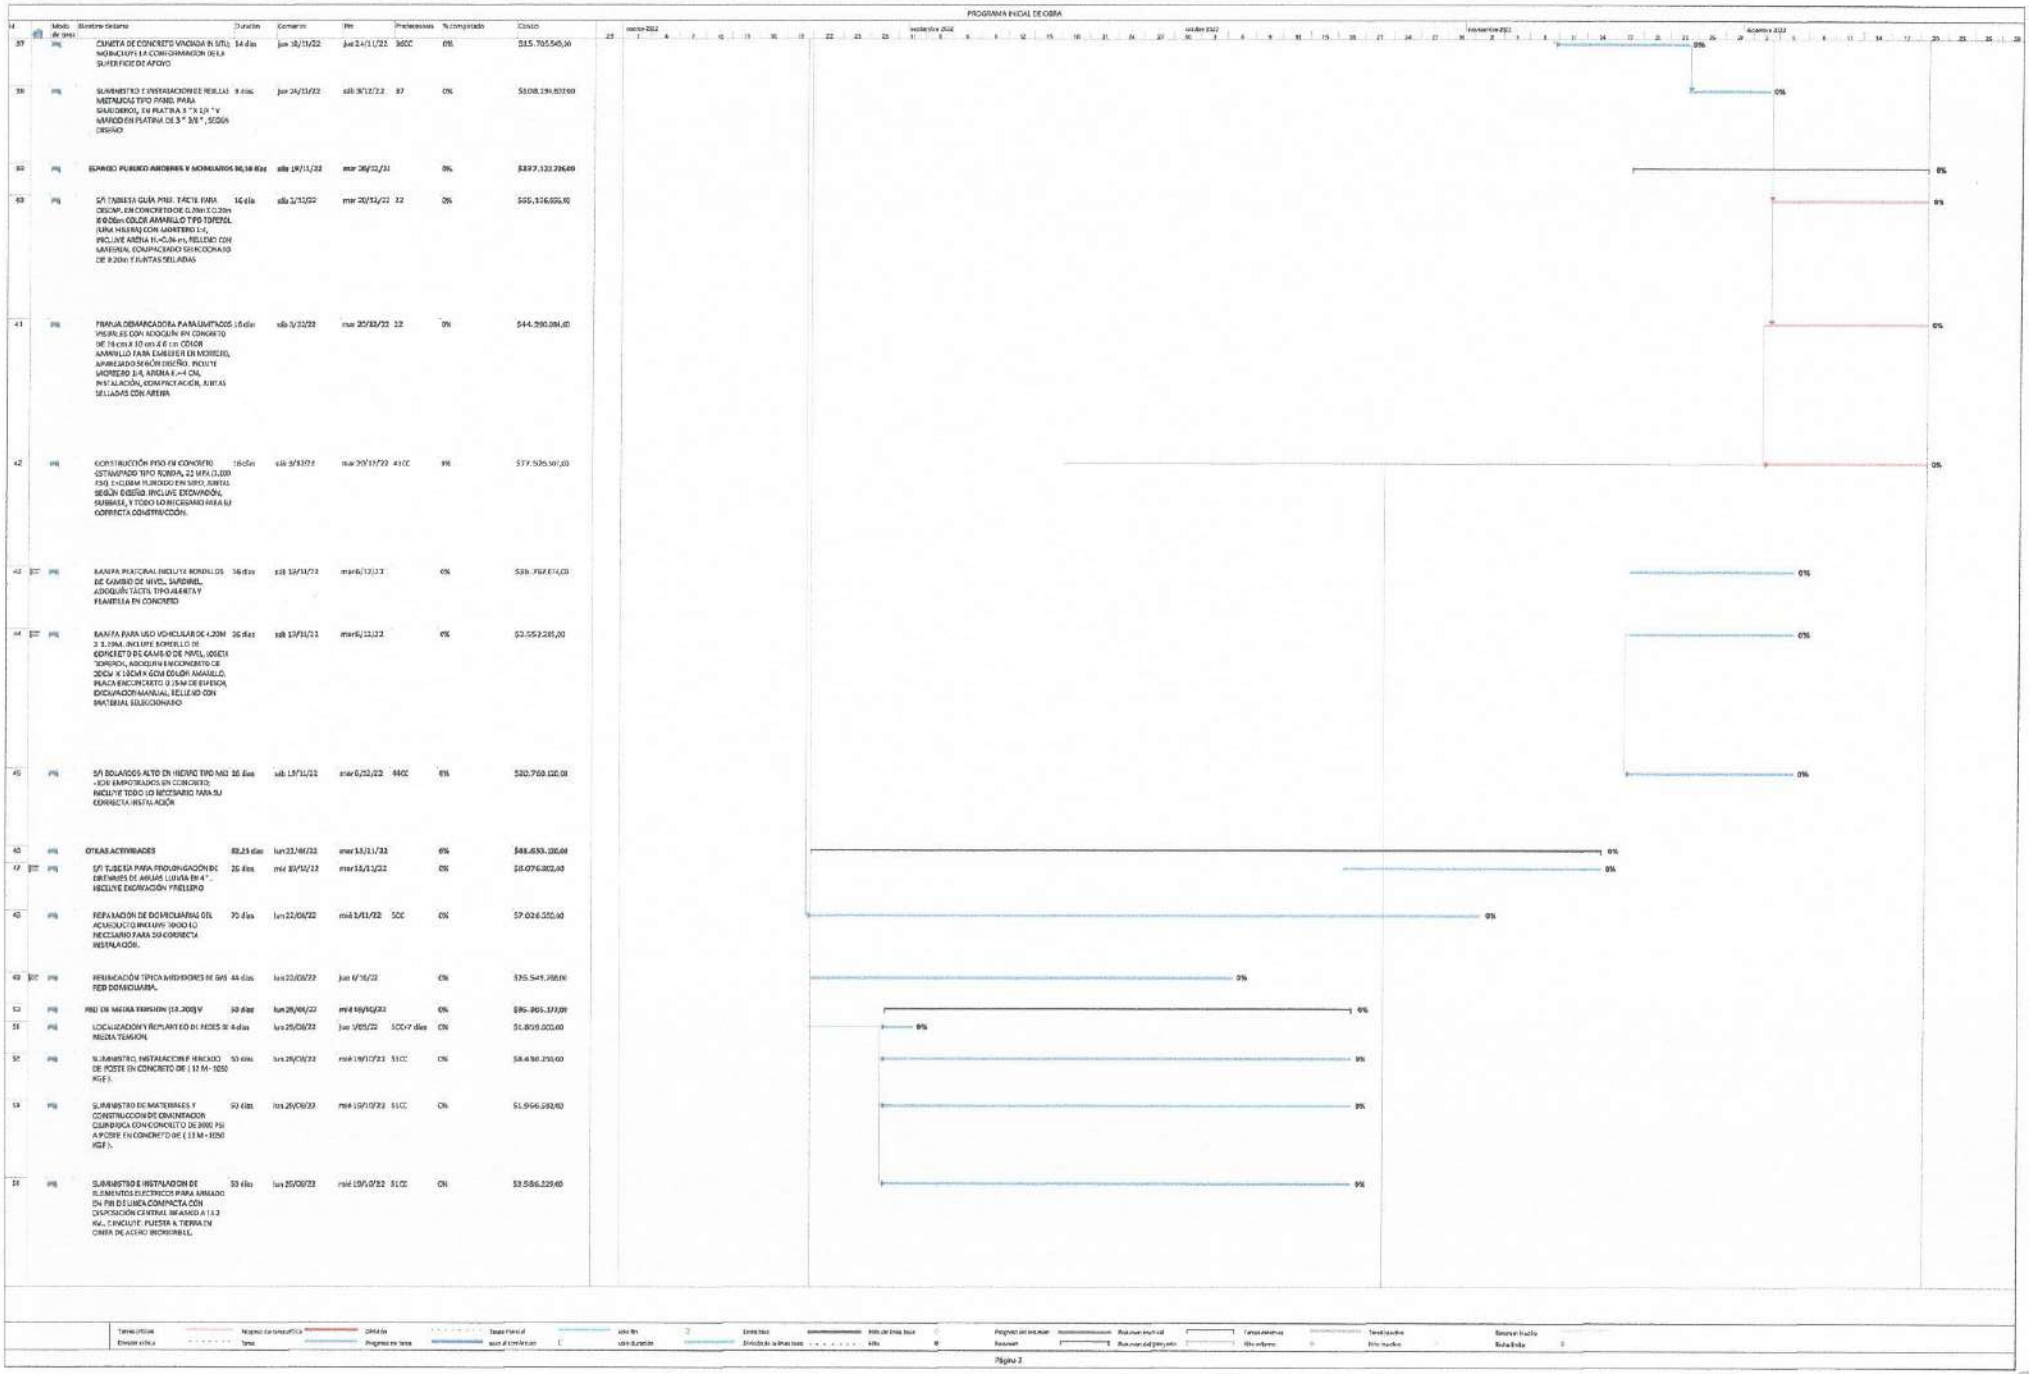

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo
37		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	14 días	jue 10/11/22	jue 24/11/22	36CC	0%	$15.705.545,00
39		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA TIPO PANEL PARA SUMIDEROS, EN PLATINA 3 "X 1/4 " Y MARCO EN PLATINA DE 3 " 3/8 " , SEGÚN DISEÑO	9 días	jue 24/11/22	sáb 3/12/22	37	0%	$108.194.837,00
40		ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIO	86,38 días	sáb 19/11/22	mar 28/02/23		0%	$397.123.726,00
41		SEÑALIZACION GUÍA PISO TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPOFEL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=4CM, RELLENO CON SARDINEL COMPACTADO SEGÚN DISEÑO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	16 días	sáb 3/12/22	mar 20/12/22	32	0%	$65.326.855,00
43		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 10 cm x 10 cm x 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA E:=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	16 días	sáb 3/12/22	mar 20/12/22	32	0%	$44.390.084,00
42		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO ROMPA, 21 MPA (3.000 PSI), COLOR AMARILLO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	186 días	sáb 3/12/22	mar 20/12/22	41CC	0%	$77.526.301,00
45		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	56 días	sáb 10/12/22	mar 6/02/23		0%	$30.792.674,00
44		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 3.19M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TORSIONAL, ADOQUIN ENCONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	56 días	sáb 10/12/22	mar 6/02/23		0%	$2.552.281,00
46		SEÑALIZACIÓN ALTO EN HIERRO TIPO MIXTO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	16 días	sáb 19/11/22	mar 6/12/22	44CC	0%	$20.769.100,00
48		OTRAS ACTIVIDADES	83,25 días	lun 21/10/22	mar 13/12/22		0%	$48.653.100,00
47		SUMINISTRO Y TUBERIA PARA PROLONGACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIA EN 4 " , INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	26 días	mié 19/10/22	mar 13/12/22		0%	$8.076.802,00
45		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	70 días	lun 22/08/22	mié 1/11/22	50C	0%	$7.026.550,00
49		REUBICACIÓN TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	44 días	lun 22/08/22	jue 6/10/22		0%	$35.549.288,00
52		RED DE MEDIA TENSION (13.200)V	59 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22		0%	$86.965.173,00
50		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE POSES DE MEDIA TENSION.	4 días	lun 29/08/22	jue 1/09/22	50C+7 días	0%	$1.859.000,00
51		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	53 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	51CC	0%	$8.436.250,00
53		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI APOYOS EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	53 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	51CC	0%	$1.966.592,00
54		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN PIR DE LUMA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BRAZO A 1.2 Kv, , INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE,	53 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	51CC	0%	$3.586.229,00

PROGRAMA INICIAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo
35		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT EN BASICA AEREA EN CABLE RESISTIDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0AWG.	50 días	lun 15/08/22	mié 19/10/22	31CC	0%	$13.733.040,00
36		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT EN BASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	50 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	31CC	0%	$68.591.050,00
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	50 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	31CC	0%	$5.549.626,00
38		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR REPASIDO A 13.2 KV.	50 días	lun 29/08/22	mié 19/10/22	31CC	0%	$2.051.702,00
39		**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**	75,75 días	lun 15/08/22	sáb 3/12/22		0%	$74.434.588,00
69		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE POSTES DE 4 días BAJA TENSION.		lun 15/08/22	jue 25/08/22	42CC	0%	$1.260.450,00
41		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 950 KGF)	40 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	42CC	0%	$10.672.730,00
42		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 950 KGF).	40 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	41CC	0%	$4.963.642,00
43		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ABRAZADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	39 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	41CC	0%	$10.084.340,00
44		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENZADA	39 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	42CC	0%	$1.644.676,00
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REFERENCIA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	39 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	42CC	0%	$1.451.080,00
46		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENZADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO RECOCIDAS	40 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	42CC	0%	$947.936,00
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENZADA DE BT A 120/240 V.	40 días	lun 24/10/22	sáb 3/12/22	42CC	0%	$17.608.248,00
48		**SUBESTACION IS ELECTRICOS (13.200/240/120)V**	1 día	jue 22/09/22	vie 23/09/22		0%	$8.672.446,20
49		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIPASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V., INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCION EL SECCIONADOR, CPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	1 día	jue 22/09/22	vie 23/09/22	60	0%	$8.672.446,20
70		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V**	4 días	mar 29/11/22	vie 2/12/22		0%	$12.475.561,68
71		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUM (6D - (2xdes. 6 + 1xdes. 6) AWG.	4 días	mar 29/11/22	vie 2/12/22		0%	$2.491.825,30
72		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	4 días	mar 29/11/22	vie 2/12/22	71CC	0%	$2.750.286,19
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	4 días	mar 29/11/22	vie 2/12/22	71CC	0%	$7.233.700,08
74		FIN	0 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22	73	0%	$0,00

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REP. LEGAL JOSE IGNACIO PUPO GARCIA

010

ANEXO 08

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

092

Alcaldía de MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

Hoja 1 de 1		INFORME No.1
FECHA PRESENTE ACTA		
31	AGOSTO	2022
DD	MM	AA

ACTA DE DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO : $ 2.680.932.314,00

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN IGNACIO PUPO GARCIA

POLIZA

Aseguradora : SEGURO MUNDIAL

Numero : CRC-100008907 Y CRC-100002734

FECHA INICIO 07 DE JULIO DE 2022

TIEMPO 4 MESES

FECHA FINAL 09 DE DICIEMBRE DE 2027

OBRA	X	INTERVENTORIA		PRESTACION DE SERVICIOS	
LEGALIZACION		ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO		ACTUALIZACION SEGÚN REINICIO	
ACTUALIZACION ADICIONAL Y/O MODIFICATORIO		RECIBO FINAL			

AMPARO		VIGENCIA DESDE DD	MM	AA	HASTA DD	MM	AA
1. Garantia Unica de Cumplimiento	X	9	AGO	2022	9	JUN	2023
2. Buen manejo y correcta inversion del anticipo y/o pago anticipado							
3. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	X	9	AGO	2022	9	DIC	2025
4. Estabilidad de obra	X	9	DIC	2022	7	DIC	2027
5. Calidad de los estudios y diseños							
6. Responsabilidad Civil	X	7	JUL	2022	9	DIC	2022
7. Calidad del servicio suministrado							

Contratos Adicionales: Modificación No. Póliza No.

Firma

Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520233553 CND

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: BITSkplB+OorbwndKeRTiQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUSZR000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	350018781	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09/08/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ABP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **11/08/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **11** días del mes **AGOSTO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XRp6SQlHoKkpZREdGjEbVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350018782	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09/08/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

RCE: 09/08/2022- 09/12/2022
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PISA - AFE

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350018782	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO 09

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	8 de agosto de 2022	**Y EL**	31 de agosto de 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	CMA-SPM-007-2022	**CONTRATO No.:**	LP – SPM – 008-2022
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04)MESES	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04)MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE AGOSTO DEL 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09 DE AGOSTO DEL 2022
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	08 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (04)MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	CUATRO (04)MESES
VALOR INICIAL :	$215.493.346,00	**VALOR INICIAL :**	$2.680.932.314,00
VALOR ADICION(ES):	$0,00	**VALOR ADICION(ES):**	$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$215.493.346,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$2.680.932.314,00
VALOR PAGADO A ACTA No.1:	$0,00	**VALOR PAGADO A ACTA 1:**	$0,00
VALOR POR PAGAR:	$215.493.346,00	**VALOR POR PAGAR:**	$2.680.932.314,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	**VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**	**CONCEPTO**	**VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**			**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/08/2022	9/06/2023	$21.549.334,60	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	9/08/2022	9/06/2023	$268.093.231,40
CALIDAD DEL SERVICIO	9/12/2022	10/12/2027	$21.549.334,60	PRESTACIONES SOCIALES	9/08/2022	9/12/2025	$536.186.462,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9/08/2022	10/12/2025	$21.549.334,60	ESTABILIDAD DE LA OBRA	9/12/2022	9/12/2027	$804.279.624,20

046

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	8 de agosto de 2022	**Y EL**	31 de agosto de 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
LOCALIZACIÓN	CARRERA 6E SUR			

				RESPONSABILIDAD CIVIL	9/08/2022	0-12-22	$400.000.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**

4. CURVA "S"

MES	SEMANA	EJECUTADO %	PROGRAMADO %
1	1	$ 0,00	$ 0,00
	2	$ 0,00	$ 0,00
	3	$ 4.446.668,80	$ 137.650.728,06
	4	$ 21.530.383,30	$ 370.757.265,20
	5	$ 45.760.458,74	$ 609.410.642,74
	6		$ 792.838.687,21
	7		$ 933.931.819,37
	8		$ 1.101.595.188,54
	9		$ 1.293.947.804,34
	10		$ 1.484.188.506,78
	11		$ 1.668.818.898,98
	12		$ 1.860.963.930,32
	13		$ 2.047.177.459,28
	14		$ 2.116.368.422,65
	15		$ 2.176.078.739,15
	16		$ 2.277.675.862,15
	17		$ 2.434.547.532,60
	18		$ 2.613.987.559,09



696

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	8 de agosto de 2022	**Y EL**	31 de agosto de 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR			

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A A LA FECHA

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

1. SE APRUEBA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA EN FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES:

•Socialización del proyecto el día 08 de agosto del 2022
•Trabajos con las comisiones de topografía correspondientes a la nivelación y secciones, y evaluación de avance físico de los corredores a intervenir.
•Localización y Replanteo, 100% en todos los tramos

TRAMO 1. PR0+000 – PR0+645, Longitud de intervención proyectada: 645.00m
TRAMO 2. PR0+645 – PR0+798, Longitud de intervención proyectada: 153.00m

Para un total de 798 mts de longitud de vía a intervenir
•Excavaciones PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 al PR0+120
•Instalación de geotextil del PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+070 al PR0+120
•Suministro e Instalación de Rajón del PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+070 al PR0+120
•Demolición de bordillos PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 al PR0+120
•Reparación de tuberías para suministro de agua y domiciliarias

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

100

ANEXO 10
REGISTRO FOTOGRAFICO

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME No.1

PERIOD: 8 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ANTES	DURANTE	FINAL
		
DESCRIPCION: INICIAL	DESCRIPCION: EXCAVACIÓN	DESCRIPCION: COLOCACIÓN DE RAJON

ANTES	DURANTE	FINAL
		
DESCRIPCION: INICIAL	DESCRIPCION: EXCAVACIÓN	DESCRIPCION: COLOCACIÓN DE RAJON

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME No.1

PERIOD: 8 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ANTES	DURANTE	FINAL
		
DESCRIPCION: EXCAVACIÓN	DESCRIPCION: EXCAVACIÓN	DESCRIPCION: COLOCACIÓN DE RAJON
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
DESCRIPCION: INICIAL	DESCRIPCION: EXCAVACIÓN	DESCRIPCION: COLOCACIÓN DE RAJON

ANEXO 11
CORRESPONDENCIA ENVIADA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja __1__ de __1__	INFORME No	1
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO		
		08 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	
		DESDE	HASTA	
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
21/07/2022	ESASM-001-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	VIA EMAIL
21/07/2022	ESASM-002-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO MENDOZA - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	HOJA DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
27/07/2022	ESASM-003-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
29/07/2022	ESASM-004-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SEGUNDA REMISIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
1/08/2022	ESASM-005-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	TERCERA REMISIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
1/08/2022	ESASM-006-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	VIA EMAIL
1/08/2022	ESASM-007-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
2/08/2022	ESASM-008-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
4/08/2022	ESASM-009-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	VIA EMAIL
9/08/2022	ESASM-010-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	VIA EMAIL
9/08/2022	ESASM-011-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	REMISIÓN DE DOCUMENTOS	VIA EMAIL
9/08/2022	ESASM-012-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	SOLICITUD DE PLANOS ESPACIO PÚBLICO	VIA EMAIL
10/08/2022	ESASM-013-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	SOLICITUD DE ATENCIÓN A VIVIENDAS FUERA DE PARAMENTO	VIA EMAIL
11/08/2022	ESASM-014-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	SOLICITUD DE PLANOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS	VIA EMAIL
12/08/2022	ESASM-015-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE AFILIACIONES Y DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA	VIA EMAIL
21/08/2022	ESASM-016-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	VIA EMAIL
21/08/2022	ESASM-017-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	OBSERVACIONES APU INICIALES	VIA EMAIL

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja 1 de 1	INFORME No	1
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO		
		08 DE AGOSTO DE 2022 DESDE	31 DE AGOSTO DE 2022 HASTA	
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
21/08/2022	ESASM-018-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD TÉCNICA DE ACUERDO CON APROBACIÓN DE PMT	VIA EMAIL
21/08/2022	ESASM-019-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO MENDOZA - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1-2	VIA EMAIL
21/08/2022	ESASM-020-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	APROBACIÓN A PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	VIA EMAIL
22/08/2022	ESASM-021-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD TÉCNICA Y DOCUMENTAL	VIA EMAIL
22/08/2022	ESASM-022-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO	VIA EMAIL
25/08/2022	ESASM-023-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTO TÉCNICOS	VIA EMAIL
28/08/2022	ESASM-024-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	VIA EMAIL
28/08/2022	ESASM-025-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACIONES AL PERSONAL DE OBRA	VIA EMAIL
29/08/2022	ESASM-026-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMAN QUINTERO MENDOZA - Secretario de Infraestructura	MONTERÍA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.3	VIA EMAIL
29/08/2022	ESASM-027-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	VIA EMAIL

VBO - Interventor	Contratista de Interventoria: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA
	Contrato No: CMA-SPM-007-2022	Contrato No. LP-SPM-008-2022
	Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

106

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, Julio 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-001-2022

Señores:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA
Attn.: JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

Referencia: CONTRATO LP- SPM-008-2022 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Solicitud de Documentos

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio del presente escrito se permite solicitar la siguiente información, dando cumplimiento a lo requerido en:

- CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del contrato de obra:

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

- De igual manera lo requerido en Pliegos de condiciones:

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de 5 días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
4. Programa de obra.
5. Plan de manejo de tránsito- PMT.
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

- Se adjuntan a la presente formatos a tramitar a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la entidad contratante, para aprobación de Acta de Inicio:

- Acta de Socialización
- Registro Fotográfico situación existente
- Registro Fotográfico Valla
- Relación Afiliación persona
- Relación maquinaria propuesta
- Relación personal propuesto
- Formato Acta de Inicio
- Lista chequeo Acta de Inicio

Lo anterior deberá ser tramitado y remitido a la interventoría para revisión y fines pertinentes

Cordialmente

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C. Archivo
Anexos: Lo enuncadi
Elaboró. E.M.R.L.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-001-2022 - Solicitud de Documentos

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de julio de 2022, 16:27
Para: jipupo@hotmail.com, Sec Infraestructura <inframtr20@gmail.com>
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Referencia: CONTRATO LP- SPM-008-2022 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Solicitud de Documentos

2 adjuntos

ESASIM-001-2022 SOLICITUD DOCUMENTOS.pdf
192K

formatos inicio obras.zip
865K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, Julio 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-002-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: DR. GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

Referencia: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Hojas de vida profesionales

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente y dando cumplimiento a lo requerido nos permitimos remitir las hojas de vida de profesionales en desarrollo del contrato de la referencia:

• INGENIERO DIRECTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
• INGENIERO RESIDENTE	ELKIN ROJAS ANAYA
• ESPECIALISTA EN VIAS	JORGE HUMBERTO PINZON QUIROGA
• PROFESIONAL SST	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
• PROFESIONAL ABOGADO	YANETH PATRICIA RUEDA LANDINES
• PROFESIONAL CONTADOR	SANDRA MILENA GARNICA CARDENAS
• PROFESIONAL TOPOGRAFO	AHIMELEC DANIEL GONZALEZ SANCHEZ

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C. Archivo
Anexos: Lo enunciado
Elaboró. E.M.R.L.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-002-2022 - Hojas de vida profesionales

2 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 22 de julio de 2022, 8:30
Para: Sec Infraestructura <inframtr20@gmail.com>, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Referencia: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Hojas de vida profesionales

8 adjuntos

- **ESASIM-002-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES INTERVENTORIA.pdf** 190K
- **1.H.V. DIRECTOR ELSA RUEDA.pdf** 4640K
- **2. H.V. RESIDENTE ELKIN ROJAS.pdf** 1236K
- **3. H.V. JORGE HUMBERTO ESP. VIAS.pdf** 1413K
- **5. H.V. ABOGADO PATRICIA RUEDA.pdf** 1650K
- **4. H.V. SGSST ELSA RUEDA.pdf** 2342K
- **6. H.V. CONTADORA SANDRA GARNICA.pdf** 1753K
- **7. H.V AHIMELEC GONZALEZ TOPOGRAFO.pdf** 490K

Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co> 9 de agosto de 2022, 17:20
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Buenas tardes Ing Elsa
Adjunto el Acta de aprobación de las hojas de vida del personal de Interventoría
Saludos
[El texto citado está oculto]

- **4. Aprobacion de HV interv v2.pdf** 12850K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, julio 27 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-003-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoría

Se envían hoja de vida de los señores de JIMMY ALEXANDER LÓPEZ LARA y MARÍA CAMILA CABALLERO BALLESTEROS los cuales no se les indica el cargo a ejercer, se les recuerda que las hojas de vida presentadas deben estar firmadas y con su correspondiente carta de compromiso

Se solicita complementar información requerida, dando cumplimiento estricto a lo estipulado por la entidad contratante en ANEXO TECNICO DE OBRA No. 01, que forman parte integral del presente contrato

Los documentos soportes faltantes deberán ser presentado a mas tardar en fecha JULIO 28 de 2022, a fin de poder continuar con proceso de aprobación de profesionales para inicio de obra

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
					de la expedición del Diploma				
4	Área Ambiental / Ingeniero ambiental o sanitario y ambiental o ingeniero civil con postgrado en área ambiental 30%				Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.		Experiencia como profesional área ambiental de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA A LA FECHA**
5	Ingeniero electricista 30%				Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.		Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA A LA FECHA**
6	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional		Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías		**NO CUMPLE** • No cumple con el perfil de Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo 100%
7	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique		Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA A LA FECHA**
8	Inspector de Obra MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNÁNDEZ 100%	**NO**	**NO**	**SI**	N/A	**SI**	N/A	**SI**	**NO CUMPLE** Se debe subsanar lo siguiente: • No presenta carta de compromiso • Se debe firmar hoja de vida

212

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-003-2022 - Remisión Hojas de Vida Profesionales

3 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 27 de julio de 2022, 20:50
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructita@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

ESASIM-003-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES.pdf
487K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 28 de julio de 2022, 8:09
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Buen dia

Me podria regalar un modelo de la carta de compromiso
gracias
[El texto citado está oculto]

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 28 de julio de 2022, 17:12
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Buenas tardes ing Elsa
Adjunto hojas de vida del personal teniendo en cuenta sus observaciones

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

compromiso carta a interventoria.pdf
1561K

HDV MATEO SEBA firmada.pdf
1259K

HOJA DE VIDA MARIA CAMILA CABALLERO firmada.pdf
2436K

HDV JIMMY LOPEZ firmada.pdf
2182K

Relacion Personal Propuesto CPM.docx
128K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, julio 29 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-004-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Segunda Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoría

Se solicita complementar información requerida, dando cumplimiento estricto a lo estipulado por la entidad contratante en ANEXO TECNICO DE OBRA No. 01, que forman parte integral del presente contrato

Los documentos soportes faltantes deberán ser presentado a mas tardar en fecha JULIO 29 de 2022, a fin de poder continuar con proceso de aprobación de profesionales para inicio de obra

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
5	Ingeniero electricista 30%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	SI	Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO CUMPLE** • Se deben presentar certificados área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento
6	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional		Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA SEGUNDA REVISIÓN**
7	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique		Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA A LA FECHA**
8	Inspector de Obra MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNÁNDEZ 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	**CUMPLE**
9	Secretaria MARÍA CAMILA CABALLERO BALLESTEROS 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	**CUMPLE**
10	Mensajero JIMMY ALEXANDER LOPEZ LARA 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	**CUMPLE**

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-004-2022 - Segunda Remisión Hojas de Vida Profesionales

2 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 29 de julio de 2022, 9:45
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cco: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Segunda Remisión Hojas de Vida Profesionales

ESASIM-004-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES REVISIÓN 2.pdf
412K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 29 de julio de 2022, 17:55
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Buenas tardes

Se adjunta hoja de vida del ing residente, con su carta de compromiso, igual las observaciones subsanadas del ing ambiental especialista

Hoja de Vida Diana Palacios.pdf

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COMPROMISO CARTA INTER RESIDENTE.pdf
220K

HV RODOLFO URRIAGA.pdf
9314K

Relacion Personal Propuesto CPM.docx
128K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 01 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-005-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Tercera Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoria

Se solicita complementar información requerida, dando cumplimiento estricto a lo estipulado por la entidad contratante en ANEXO TECNICO DE OBRA No. 01, que forman parte integral del presente contrato

Los documentos soportes faltantes deberán ser presentado a mas tardar en fecha JULIO 29 de 2022, a fin de poder continuar con proceso de aprobación de profesionales para inicio de obra

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
	PALACIO MOSQUERA 30%								DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 002508 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOÑITOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS", desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 07 de agosto de 2021. Y En la tercera revisión se presenta certificación la misma empresa HERSA CONSTRUCTORES S.A.S donde se observa el contrato de obra: LP No 002 DE 2020, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS – DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 002508 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOÑITOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS", desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 07 de agosto de 2021. Se observa que solo cambio una palabra en esta certificación, se solicita al contratista adjuntar acta final de obra o liquidación donde se indique claramente actividades y objeto del contrato de obra Se presenta la misma observación con el segundo certificado presentado de la empresa ASOMURA
5	Ingeniero electricista 30%				Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.		Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA ESTA REVISIÓN**

818

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-003-2022 - Remisión Hojas de Vida Profesionales

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 1 de agosto de 2022, 6:55
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Tercera Remisión Hojas de Vida Profesionales

ESASIM-005-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES REVISIÓN 3.pdf
421K

120

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 01 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-006-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Solicitud de Documentos

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio del presente escrito se permite solicitar la siguiente información, dando

cumplimiento a lo requerido en:

• CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del contrato de obra: 17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

• De igual manera lo requerido en Pliegos de condiciones: 8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de 5 días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional, a la fecha no se presentado todo el personal a aprobar según pliego de condiciones.
2. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, a la fecha no se han presentado.
   Estos deben ser presentados en formato Excel y Pdf firmados por el representante legal del consorcio.
3. Programa de obra, se debe hacer ajusta a programa de obra, toda vez que se evidencia que las actividades no tienen recursos asignados, tampoco tienen actividades sucesoras y predecesoras, lo que conlleva a que no se pueda hacer un control de las actividades, complementario a este programa se debe presentar flujo de caja o inversión por semanas
4. Plan de manejo de tránsito- PMT, se presenta plan de manejo de tráfico en Word, se debe presentar en Pdf y firmado por un profesional aprobado o representante legal.
   Este plan debe ser presentado ante la autoridad competente de la ciudad para su aprobación e implementación toda vez que afecta la movilidad de un sector de la comunidad
5. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-006-2022 - Solicitud de Documentos

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 1 de agosto de 2022, 11:21
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Solicitud de Documentos

ESASIM-006-2022 SOLICITUD DE DOCUMENTOS.pdf
473K

122

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 01 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-007-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoría

Se solicita complementar información requerida, dando cumplimiento estricto a lo estipulado por la entidad contratante en ANEXO TECNICO DE OBRA No. 01, que forman parte integral del presente contrato

Los documentos soportes faltantes deberán ser presentado a mas tardar en fecha AGOSTO 01 de 2022, a fin de poder continuar con proceso de aprobación de profesionales para inicio de obra

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
5	Ingeniero electricista 30%				Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.		Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA ESTA REVISIÓN**
6	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional		Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA ESTA REVISIÓN**
7	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas LUIS GUILLERMO ALVAREZ MIRANDA 100%	**SI**	**SI**		Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique	Ingeniero Industrial: **SI** Especialista: **SI**	Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO CUMPLE** • No presenta licencia en SST vigente
8	Inspector de Obra MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNÁNDEZ 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	N/A	**SI**	N/A	**SI**	**CUMPLE**
9	Secretaria MARÍA CAMILA CABALLERO BALLESTEROS 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	N/A	**SI**	N/A	**SI**	**CUMPLE**
10	Mensajero JIMMY ALEXANDER LOPEZ LARA 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	N/A	**SI**	N/A	**SI**	**CUMPLE**

123

COMUNICADO: ESASIM-007-2022 - Remisión Hojas de Vida Profesionales

5 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 1 de agosto de 2022, 21:23
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

ESASIM-007-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES REVISIÓN 4.pdf
415K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 10:11
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>
Cc: jipupo@hotmail.com, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>

Buenos días a todos. Por medio del presente se hace la entrega de la corrección en la hoja de vida del profesional SST y se entrega la hoja de vida del especialista.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

alejaxander hoja de vida especialista vias.pdf
4169K

HOJA DE VIDA LUIS GUILLERMO ALVAREZ - SST.pdf
2515K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 16:02
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>
Cc: jipupo@hotmail.com, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>

Buenas tardes a todos. Por medio del presente se hace la entrega de la hoja de vida de la profesional social y la hoja de vida del ingeniero eléctrico.
quedo atento a cualquier inquietud.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

HOJA DE VIDA NINI JOHANNA ROPERO SOCIOLOGA 2022.pdf.pdf
752K

HOJA DE VIDA SIMON PEÑA MENDOZA 2022.pdf
1172K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 20:30
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>

adjuntaron la misma hoja de vida de nini johana

125

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA
Bucaramanga, agosto 02 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-008-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoría

Se solicita complementar información requerida, dando cumplimiento estricto a lo estipulado por la entidad contratante en ANEXO TECNICO DE OBRA No. 01, que forman parte integral del presente contrato

Los documentos soportes faltantes deberán ser presentado a más tardar en fecha AGOSTO 03 de 2022, a fin de poder continuar con proceso de aprobación de profesionales para inicio de obra

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
1	Director de Obra / Ingeniero Civil o de vías y transporte con Estudios de posgrado en gerencia. JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ 60%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 3 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma.	Ingeniero Civil: marzo 13 de 2012 SI Especialista: agosto 25 del 2016 SI	Experiencia como director de obra de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	1. Consorcio Colina Real – 2,83 Meses 2.Consorcio Vías Oriente – 7,13 Meses 3. Unión Temporal Vías Inat – 5,10 Meses SI	CUMPLE
2	Residente de obra (2) / Ingeniero civil RODOLFO NELSON URRIAGA HERNANDEZ 100%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma	Ingeniero Civil: SI Especialista: SI	Experiencia como Residente de obra de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	SI	CUMPLE
3	Ingeniero civil con postgrado en vías ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA 20%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma	Ingeniero Civil: abril 20 de 2006 SI Especialista: diciembre 16 del 2015 SI	Experiencia como profesional área estructuras de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	SI	CUMPLE
4	Área Ambiental / Ingeniero ambiental o sanitario y ambiental o ingeniero civil con postgrado en área ambiental DIANA PATRICIA PALACIO MOSQUERA 30%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	Ingeniero Civil: abril 09 de 2015 SI	Experiencia como profesional área ambiental de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	SI	CUMPLE

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: consorciocrespaciopublico@gmail.com Cel. 3174359776

926

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
5	Ingeniero electricista 30%				Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.		Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA ESTA REVISIÓN**
6	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo 100%				Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional		Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías		**NO PRESENTA HOJA DE VIDA PARA ESTA REVISIÓN**
7	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas LUIS GUILLERMO ALVAREZ MIRANDA 100%	**SI**	**SI**		Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique	Ingeniero Industrial: **SI** Especialista: **SI**	Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	**SI**	**CUMPLE**
8	Inspector de Obra MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNÁNDEZ 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**CUMPLE**
9	Secretaria MARÍA CAMILA CABALLERO BALLESTEROS 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**CUMPLE**
10	Mensajero JIMMY ALEXANDER LOPEZ LARA 100%	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**N/A**	**SI**	**CUMPLE**

172

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-008-2022 - Remisión Hojas de Vida Profesionales

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 12:57
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

ESASIM-008-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES REVISIÓN 5.pdf
396K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 04 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-009-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remiten hojas de vida de profesionales por parte de la firma contratista, anexo a la presente se describen la evaluación a estas por parte de la interventoría

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA/ VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
5	Ingeniero electricista 30%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	SI	Experiencia como profesional área eléctrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	SI	CUMPLE
6	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo NINÍ JOHANNA ROPERO DAZA 100%	SI	N/A	SI	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional	SI	Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías	SI	CUMPLE
7	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas LUIS GUILLERMO ALVAREZ MIRANDA 100%	SI	SI	SI	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique	Ingeniero Industrial: SI Especialista: SI	Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	SI	CUMPLE
8	Inspector de Obra MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNÁNDEZ 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	CUMPLE
9	Secretaria MARÍA CAMILA CABALLERO BALLESTEROS 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	CUMPLE
10	Mensajero JIMMY ALEXANDER LOPEZ LARA 100%	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	CUMPLE

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-009-2022 - Remisión Hojas de Vida Profesionales

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 6:22
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida Profesionales

- 1.HOJA DE VIDA ING. JORGE CARRASCAL P. DIRECT...
- 2.HV RODOLFO URRIAGA RESIDENTE.pdf
- 3.alejaxander hoja de vida especialista vias.pdf
- 4.Hoja de Vida Diana Palacios.pdf
- 5.HOJA DE VIDA SIMON PEÑA MENDOZA 2022 ELCTR...
- 6.HOJA DE VIDA NINI JOHANNA ROPERO SOCIOLOG...
- 7.HOJA DE VIDA LUIS GUILLERMO ALVAREZ - SST.pdf
- 8.HDV MATEO SEBA firmada Inspector.pdf
- 9.HDV JIMMY LOPEZ firmada Mensajero .pdf
- 10.HOJA DE VIDA MARIA CAMILA CABALLERO firma...

ESASIM-009-2022 HOJAS DE VIDA PROFESIONALES REVISIÓN 6.pdf
395K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 09 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-010-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Solicitud de Documentos

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio del presente escrito se permite solicitar la siguiente información, dando

cumplimiento a lo requerido en:

• De igual manera lo requerido en Pliegos de condiciones: 8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de 5 días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, a la fecha no se han presentado.
   Estos deben ser presentados en formato Excel y Pdf firmados por el representante legal del consorcio.
2. Se debe presentar flujo de caja o inversión por semanas
3. Antes de ingresar personal en obra, se debe presentar listado de personal con cargo a desempeñar y sus respectivas afiliaciones a seguridad social para que se pueda autorizar su ingreso a la obra

Lo anterior deberá ser tramitado y remitido a la interventoría para revisión y fines pertinentes

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

133

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 09 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-011-2022

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
GERMAN QUINTERO
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión de documentos

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio de la presente remite a ustedes lo siguientes documentos que hacen parte del acta de inicio del contrato de obra:

1. Registro fotográfico de la valla informativa instalada (Según Formato)
2. Acta de Socialización del proyecto (Según Formato)
3. Registro fotográfico situación existente (Según Formato)
4. Relación del Personal Profesional Propuesto (Según Formato)
5. Relación de equipo ofrecido (Según Formato)
6. Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)
7. Inscripción de profesionales y trabajadores en seguridad social
8. Cronograma de obra actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio
9. Plan de calidad
10. Plan ambiental
11. Plan de Seguridad Industrial y salud Ocupacional
12. Permiso y/o Licencia Tala y Poda de Árboles
13. Permiso y/o Licencia canteras aprobadas
14. Póliza del contrato y recibo de pago
15. Aprobación de póliza
16. Certificado de Registro presupuestal CRP

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-011-2022 - Remisión de documentos del contrato de obra

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 9 de agosto de 2022, 16:52
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Remisión de documentos

DOCUMENTOS ACTA DE INICIO.pdf

ESASIM-011-2022 REMISION DE DOCUMENTOS.pdf
228K

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-012-2022 - SOLICITUD DE PLANOS ESPACIO PÚBLICO

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 9 de agosto de 2022, 19:38
Para: "s.infraestructura@monteria.gov.co" <s.infraestructura@monteria.gov.co>, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE PLANOS ESPACIO PÚBLICO

ESASIM-012-2022 SOLICITUD DE PLANOS DE ESPACIO PUBLICO.pdf
330K

136

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 09 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-012-2022

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
GERMAN QUINTERO
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE PLANOS ESPACIO PUBLICO

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio de la presente solicita la entrega de los planos donde se detalle los andenes a construir en la Carrera 8E Sur del proyecto que tiene por objeto:" MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", toda vez que no se publicaron los diseños en la etapa de licitación

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

137

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 10 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-013-2022

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
GERMAN QUINTERO
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCION A VIVIENDAS FUERA DE PARAMENTO

Cordial Saludo;

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora informa:

- En recorrido realizado entre contratista, interventoría y entidad contratante se pudo evidenciar que algunas casas ubicadas sobre la vía carrera 8E Sur se encuentran ubicadas dentro del espacio del diseño presentado por la entidad contratante para realizar la pavimentación y construcción de espacio público de esta vía
- Se procede por parte de la firma contratista a verificar las viviendas que se encuentran fuera del paramento según diseño de pavimento.
- Mediante comunicado LP-SPM-008-2022 la firma contratista adjunta listado de viviendas fuera del paramento con respecto al diseño del pavimento entregado por la entidad contratante, el cual se adjunta a este comunicado.

Por tal motivo se solicita a la entidad contratante tomar las acciones pertinentes para solucionar este inconveniente y poder ejecutar el contrato de obra No. LP-SPM-008-2022 de acuerdo al diseño presentado por la entidad contratante dentro del plazo contractual

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

CRA 8E NUMERO 3 - 66	k0+110	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 04	k0+130	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 10	k0+140	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 20	k0+150	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 39	k0+170	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 3 - 54	k0+170	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 51	k0+170	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 16	k0+200	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 24	k0+205	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 30	k0+210	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 17	k0+210	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 23	k0+220	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 35	k0+230	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 02	k0+280	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 18	k0+290	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 35	k0+290	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 24	k0+300	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 23	k0+300	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 34	k0+316	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 27	k0+310	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 46	k0+320	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 45	k0+320	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 49	k0+330	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 50	k0+340	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 60	k0+400	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 68	k0+410	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 69	k0+420	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 12	k0+440	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 18	k0+440	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 20	k0+450	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 22	k0+460	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 26	k0+460	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 28	k0+470	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 30	k0+473	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 41	k0+480	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 51	k0+486	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 54	k0+495	DERECHO

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-013-2022 - SOLICITUD DE ATENCIÓN A VIVIENDAS FUERA DE PARAMENTO

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 10 de agosto de 2022, 18:12
Para: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIÓN A VIVIENDAS FUERA DE PARAMENTO

ESASIM-013-2022 SOLICITUD DE ATENCION A VIVIENDAS FUERA DE PARAMENTO.pdf
784K

140

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 11 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-014-2022

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
GERMAN QUINTERO
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE PLANOS Y DISEÑOS ELECTRICOS

Cordial Saludo;

La firma interventora por medio de la presente remite comunicado LP-SPM-008-2022 – 015 de fecha 11 de agosto del 2022, donde solicita la entrega de los planos, diseños o esquemas sobre las redes eléctricas a implementar en el proyecto a ejecutarse sobre la Carrera 8E Sur que tiene por objeto:" MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", toda vez que no se publicaron los diseños en la etapa de licitación

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

141

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-014-2022 - SOLICITUD DE PLANOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 11 de agosto de 2022, 18:35
Para: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE PLANOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS

ESASIM-014-2022 REMISION SOLICITUD DE PLANOS ELECTRICOS.pdf
573K

142

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 16 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-015-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE AFILIACIONES Y DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA

Cordial Saludo;

La firma interventora evidencia en campo personal del contratista sin dotación realizando actividades de cerramiento, por tal motivo la firma interventora solicita la suspensión de esta actividad hasta tanto no se cumpla con la dotación de personal.

Se le informa a la firma contratista que dentro de las obligaciones se encuentra en la cláusula 9 del contrato de obra, numeral 13 *"Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;* ***así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)"***

Así mismo se le recuerda la a la firma contratista que antes de ingresar personal en obra, se debe presentar listado de personal con cargo a desempeñar y sus respectivas afiliaciones a seguridad social para que se pueda autorizar su ingreso a la obra

También se solicita la firma contratista contar en campo con personal SISO para control de las actividades de afiliaciones, entrega de EPP, charlas de salud ocupacional, análisis de riesgos por tareas y demás obligaciones que se requieran

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-015-2022 - SOLICITUD DE AFILIACIONES Y DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 16 de agosto de 2022, 12:36
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE AFILIACIONES Y DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

ESASIM-015-2022 SOLICITUD DE AFILIACIONES Y DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA.pdf
107K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-016-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cordial Saludo;

Mediante RADICADO: LP-SPM-008-2022 – 017 de fecha 16 de agosto del 2022, se presenta por parte de la firma contratista ensayos de materiales para la construcción de la vía, como son rajón y subbase granular:

Subbase granular:

- Se debe presentar ensayo de desgaste en la máquina de los ángeles a 500 revoluciones

Rajón:

- Se deben presentar ensayos de acuerdo con la siguiente tabla:

DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	RANGO CUMPLIMIENTO	FRECUENCIA	OBSERVACION /ACCIONES
ART. 221-13 PEDRAPLEN				
GRANULOMETRIA	E-123	TAMAÑO MAX 2/3 DE LA CAPA COMPACTADA	CADA 8 DIAS	CURVA GRANULOMETRICA SEGÚN TABLA 221-1
		% EN MASA DE PARTICULAS MENORES AL TAMIZ DE 25,0 mm (1"), SERA INFERIOR AL 35%		
		% EN MASA DE PARTICULAS QUE PASEN EL TAMIZ DE 75 mm (No. 200), SERA INFERIOR AL 10%		
RESISTENCIA A LA ABRASION				
DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	E-219	MAX 50%	1 VEZ AL MES	

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: consorciocrespaciopublico@gmail.com Cel. 3174359776

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-016-2022 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de agosto de 2022, 12:23
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cco: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

2 adjuntos

ESASIM-016-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf
263K

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS MONTERIA.xlsx
978K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-017-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Observaciones APU iniciales

Respecto a los APU contractuales remitidos, la firma interventora se permite hacer las siguientes observaciones:

1. Se solicita que los APU (en Excel) deben estar amarrados a una base de datos de costos de equipos, materiales, transporte y mano de obra, de tal manera que se garantice que el valor de un mismo insumo será igual para la totalidad de ítems que lo requiera, y de esta manera se eviten cambios y valores como los que se han encontrado en la revisión.

2. Se presentan las siguientes observaciones:

Ítem 1.01 a Ítem 1.1:
El rendimiento del equipo se debe ajustar de acuerdo con el de la mano de obra.
Los ítems que tengan dos minicargadores se deben ajustar a un solo minicargador
Se debe ajustar trabajadores dos ayudantes para esta tarea por cada trabajador calificado
No se pueden tener números ocultos para los cálculos
Se debe agregar nombre y firma del representante legal del consorcio a todos los ítems
Las herramientas menores deben ser un % de la mano de obra
En los ítems donde incluye el transporte de material se debe ajustar a 1,3 m3k
En la mano de obra el jornal del ayudante debe ser el mismo para todos los APUs

Ítem 2.01:
En los materiales se debe presentar un tipo de materiales a cobrar no dos materiales como se indica y la cantidad es 1,0
No se debe incluir vehículo para transporte de agua
Se debe incluir transporte de material
El rendimiento de los equipos se debe ajustar de acuerdo con el de la mano de obra y deben ser iguales entre ellos.
Las herramientas menores deben ser un % de la mano de obra

Ítem 2.02:
Se debe incluir transporte de material
El rendimiento de los equipos se debe ajustar de acuerdo con el de la mano de obra y deben ser iguales entre ellos.
Las herramientas menores deben ser un % de la mano de obra

Ítem 2.03:
No debe llevar desperdicios, se debe analizar de tal forma que no coloque desperdicios para un m2

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-017-2022 - Observaciones APU iniciales

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de agosto de 2022, 19:23
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Observaciones APU iniciales

2 adjuntos

ESASIM-017-2022 OBSERVACIONES A APUS CONTRACTUALES.pdf
92K

APUS PAV MONT - PARA ENTREGAR.xlsx
606K

148

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-018-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD TECNICA DE ACUERDO CON APROBACION DE PMT

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora informa:

1. En respuesta a solicitud de aprobación de PMT radicado en la secretaria de transito y transporte municipal de la ciudad de montería, se dio aprobación a este mediante oficio No. STTM 1454 del 2022 de fecha 08 de agosto del 2022.
2. Esta aprobación se da por un término de 30 días contados a partir del 02 de agosto del 2022
3. Esta aprobación se da siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

- Previo visto bueno de la secretaria de Planeación Municipal
- El contratista NO debe realizar actividades de manejo de escombros, cargue y descargue, con vehículos en horas pico
- Abstenerse de generar circulación de vehículos pesados por las zonas de influencia en horas pico.
- Todos los vehículos de carga que ingresen o salgan de la obra deberán tener lonas protectoras que impidan la caída de material particulado hacia las vías u otros vehículos, la constructora se hará responsable del aseo del aseo y limpieza de las vías donde queden desechos de materiales que caigan desde los vehículos donde son transportados.
- Con respecto al tránsito de vehículos pesados se deberá tener en cuenta el vigente decreto de cargue y descargue de la ciudad.
- Las zonas de cargue y descargue se ubicarán dentro del cerramiento provisional.
- El contratista deberá colocar y mantener la señalización de obra, así como los pasacalles informativos durante la ejecución de proyecto y retirarla una vez terminada la obra. esta señalización deberá ser clara y de fácil interpretación, que les facilite a los actores viales la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura de acuerdo con cada etapa de cierre.
- La valla debe contener de forma clara quien es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la entidad, número de teléfono ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado.
- La señalización de tránsito peatonal debe colocarse antes de iniciar la obra, definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el transito que se estima. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.00 m, además se debe implementar mallas protectoras de posibles caídas de escombros. Es importante colocar la señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados.
- Cada 60m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos
- El contratista debe tener reguladores de tránsito permanentes con sus respectivos uniformes reflectivos y elementos luminosos de control de tránsito, con el objeto de orientar el transito mientras permanezca la vía parcialmente cerrada, así como de ofrecer rutas alternas de tránsito mediante la instalación de pasacalles informativos de acuerdo con cada etapa de cierre.
- El contratista deberá realizar mantenimiento y riego regular a las rutas alternas, dispuestas como desvíos de cada etapa de cierre dispuestas en el plan de manejo de tránsito.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-018-2022 - SOLICITUD TECNICA DE ACUERDO CON APROBACION DE PMT

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de agosto de 2022, 19:43
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD TÉCNICA DE ACUERDO CON APROBACIÓN DE PMT

2 adjuntos

ESASIM-018-2022 SOLICITUD TECNICA DEACUERDO A APROBACION DE PMT.pdf
92K

APROBACION PMT.pdf
965K

150

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-019-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: DR. GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA No.1-2.

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente me permito remitir lo siguiente:

1. Informe Semanal No.1. Periodo 09 de agosto al 14 de agosto de 2022
2. Informe Semanal No.2. Periodo 15 de agosto al 21 de agosto de 2022

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: OFICIO No. STTM 1454 del 2022
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-019-2022 - INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1-2

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de agosto de 2022, 20:00
Para: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1-2.

3 adjuntos

- **ESASIM-019-2022 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA.pdf** 76K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA No.1.pdf** 371K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA No.2.pdf** 445K

152

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 21 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-020-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Aprobación A Programa De Obra Y Flujo De Caja

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora da aprobación al programa de obra y flujo de caja semanal presentado por la firma contratista y solicita se entreguen estos en medio físico impresos y firmados por el representante legal

Se adjunta a este oficio programación de obra y flujo de caja

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

153

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-020-2022 - Aprobación A Programa De Obra Y Flujo De Caja

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 21 de agosto de 2022, 20:09
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Aprobación A Programa De Obra Y Flujo De Caja

3 adjuntos

Flujo de caja semanal Ajustado.xlsx
54K

154

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 22 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-021-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD TECNICA Y DOCUMENTAL

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora solicita a la firma contratista presentar la siguiente documentación a fin de dar autorización de inicio de obra:

1. La documentación legal de los equipos mínimos siguientes a mantener en campo:
   - Retrocargador De Pala
   - Minicargador Con Martillo Demoledor
   - Vibrocompactador 31 Hp
   - Retroexcavadora De Oruga 155 Hp;
   - Vehículo Para Transporte De Agua
   - Carro Canasta Con Brazo Hidráulico
   - Volquetas
   - Grúa Canasta
   - Grúa Hincar Poste
   - Motobomba 3"
   - motosierra
   - Compactador Saltarín (Canguro)
   - Compactador Manual Vibratorio (Rana)
2. Presentar la documentación correspondiente a los operadores y/o conductores de la maquinaria y equipos que van a ser utilizados en obra, los cuales son contrato laboral, afiliación de estos al sistema de seguridad social y parafiscales, el cual debe ser realizado por el propietario del equipo, en caso del contratista no ser propietario del equipo deberá allegar copia del contrato de alquiler de dicho equipo
3. PMT ajustado al proyecto con sus respectivos esquemas de señalización y donde se describa como se va a informar al personal que transite por la vía como se harán los cierres, las vías alternativas a tener en cuenta.
   Se envía modelo adjunto a este oficio de esquema de señalización para su implementación.
4. Se debe presentar plan de intervención por cuadras, donde se describa equipo a utilizar, personal o cuadrillas a trabajar, horarios de trabajos, actividades a realizar, fecha de inicio y terminación de cada frente de trabajo a ser intervenido

Así mismo se le indica a la firma contratista que:

- Para iniciar la actividad de excavación la firma contratista deberá tener en campo materiales como son el geotextil, rajón y subbase de tal manera que tramo que se intervenga en

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-021-2022 - SOLICITUD TECNICA Y DOCUMENTAL

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 22 de agosto de 2022, 11:07
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Asunto: SOLICITUD TÉCNICA Y DOCUMENTAL

2 adjuntos

- **ESASIM-021-2022 SOLICITUDES TECNICAS.pdf** 146K
- **ANEXO 1. MANTENIMIENTO CICLORRUTA V 1.1.pdf** 469K

156

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 22 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-022-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Citación a comité técnico.

Cordial Saludo;

A fin de evaluar temas inherentes al desarrollo del contrato en referencia, me permito citarlo a usted como representante legal del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERA a comité técnico virtual por la plataforma Google Meet, el día martes 23 de agosto del 2022 a las 10:00 a.m.

El link será enviado 10 minutos antes de la hora de inicio del comité técnico virtual al grupo en whassap Pav. Alfonzo López

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-022-2022 - Citación a comité técnico

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 22 de agosto de 2022, 14:53
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Citación a comité técnico.

ESASIM-022-2022 CITACION A COMITE TECNICO.pdf
75K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 25 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-023-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: REQUERIMIENTOS TECNICOS

Mediante el siguiente comunicado y de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones la firma interventora solicita a la firma contratista:

1. Mantener en campo con su documentación legal el equipo mínimo requerido:
   - Retrocargador De Pala
   - Minicargador Con Martillo Demoledor
   - Vibrocompactador 31 Hp
   - Retroexcavadora De Oruga 155 Hp;
   - Carrotanque
   - Volquetas
   - Motobomba 3"
   - Motosierra
   - Compactador Saltarín (Canguro)
   - Compactador Manual Vibratorio (Rana)
2. Presentar la documentación correspondiente a los operadores y/o conductores de la maquinaria y equipos que van a ser utilizados en obra, los cuales son contrato laboral, afiliación de estos al sistema de seguridad social y parafiscales, el cual debe ser realizado por el propietario del equipo, en caso del contratista no ser propietario del equipo deberá allegar copia del contrato de alquiler de dicho equipo

3. Se debe presentar plan de intervención por cuadras, donde se describa equipo a utilizar, personal o cuadrillas a trabajar, horarios de trabajos, actividades a realizar, fecha de inicio y terminación de cada frente de trabajo a ser intervenido

Así mismo se le indica a la firma contratista que:

- No se autoriza la intervención del PR0+040 en adelante hasta tanto no se tenga el equipo mínimo requerido en campo, toda vez que en el momento solo se cuenta con una retro excavadora con su operador, un minicargador sin operador y tres volquetas con sus conductores,
- A la fecha no se cuenta con equipo Vibrocompactador para sello de la subrasante al momento de la excavación, ni materiales como rajón y subbase para ir conformando la estructura del pavimento e ir protegiendo la subrasante en caso de lluvia
- Se deberá contar con plástico en caso de que llueva proteger la subrasante

- Se debe implementar lo dispuesto en el PMT, en cuanto a los esquemas se señalización, a la fecha no se cuenta con maletines, ni paleteros para controlar el tráfico a la entrada y salida de volquetas de la zona de trabajos
- Se debe implementar los programas del PGIO como son:

  - EJE S&SO

    Kit de Emergencias: Incluye extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor), camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)
    Kit para trabajos con soldadura
    Careta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levantable - guantes - overol especial.
    Kit señalización SST: incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.
    Examen médico ocupacional de ingreso y egreso incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas
    Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO
    eje de seguridad industrial y salud ocupacional.

  - EJE AMBIENTAL

    Kit señalización Ambiental: incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.
    Kit para desperdicios sólidos: Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la intemperie, de fácil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico
    de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-
    Lavado de Herramientas: Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.
    Cubrimiento de Materiales Granulares: (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.
    Cubrimiento de escombros: Tela verde para cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.
    Alquiler baño portátil: Suministro de baño portátil
    Kit aseo Edificación: consta de pica, pala con mango, escoba, balde plástico 25 lt.
    Kit aseo Infraestructura: consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy con llanta neumática), como mínimo de H:45cm, balde plástico de 25 lt, cepillo de casquillo de 37 x 7
    Brigada de aseo: Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementación y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional
    Kit de derrames pequeños: consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín
    Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental.

  - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA

Cerramiento tipo 3: consta de postes de madera rolliza de 2m de altura libre, enterrados como mínimo 0,3m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4.con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Adicionalmente entre postes debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual al poste. Separación entre postes máximo de 5m

- EJE MANEJO DE TRAFICO
  Señales preventivas, señales reglamentarias, señales informativas y paleteros con dotación más prestaciones

- PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "PAPSO":

La implementación de estos programas tiene asignado unos recursos así:

- Implementación de gestión de obra (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de tráfico) $42.330.163
- PAPSO $20.577.216

TOTAL: $62.907.379

De acuerdo con la propuesta ganadora del proceso de licitación del contrato de obra en la Nota 4 se tiene: "*El valor del PGIO Y PAPSO es modificable, en todo caso durante la ejecución del contrato se deberá garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo con lo previsto por la entidad en el cuadro que discrimina las actividades del mismo.*"
Se adjunta formulario de propuesta ganadora y discriminación del APIU

- Antes de iniciar se debe presentar afiliaciones de todo personal a ingresar a obra, mediante oficio para así realizar su autorización previa verificación de documentos

lo anterior se debe presentar e implementar de manera inmediatamente

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

161

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-023-2022 - REQUERIMIENTOS TECNICOS

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 25 de agosto de 2022, 5:45
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Asunto: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

3 adjuntos

- **ESASIM-023-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf** 202K
- **FORMULARIO N°1-ALFONSO LOPEZ CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.pdf** 168K
- **3.1. APIU-ALFONSO LOPEZ.pdf** 310K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 28 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-024-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cordial saludo,

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora solicita a la firma contratista entrega de los siguientes documentos:

1. Entrega de informes mensuales, los cuales deben ser entregados los 28 de cada mes para revisión de interventoría y remisión a la entidad contratante a más tardar los días 3 de cada mes
    - Informe mensual al plan de calidad
    - Informe mensual al plan de Seguridad y salud en el trabajo
    - Informe mensual al plan de manejo ambiental
    - Informe mensual Técnico
2. Mantener en campo con su documentación legal el equipo mínimo requerido:
    - Retrocargador De Pala
    - Minicargador Con Martillo Demoledor
    - Vibrocompactador 31 Hp
    - Retroexcavadora De Oruga 155 Hp;
    - Carrotanque
    - Volquetas
    - Motobomba 3"
    - Motosierra
    - Compactador Saltarín (Canguro)
    - Compactador Manual Vibratorio (Rana)
3. Presentar la documentación correspondiente a los operadores y/o conductores de la maquinaria y equipos que van a ser utilizados en obra, los cuales son contrato laboral, afiliación de estos al sistema de seguridad social y parafiscales, el cual debe ser realizado por el propietario del equipo, en caso del contratista no ser propietario del equipo deberá allegar copia del contrato de alquiler de dicho equipo
4. Implantación de viviendas sobre diseño de vía en plano topográfico para identificar viviendas fuera de parámetros.
5. Entrega de programa de obra y flujo de caja en físico y firmado
6. Indicar sitio de disposición final de materiales de excavación, demolición y tala de arboles
7. Entregar copia de las actas de vecindad realizadas a la fecha

8. Se debe hacer el tramite de conformación de veedurías ante entidad contratante

Así mismo se le indica a la firma contratista que:

- Se debe realizar el lleno con materiales de manera inmediata en el tramo PR0+000 al PR0+040, toda vez que se realizó excavación y quedaron tres arboles expuestos y son un peligro para la comunidad, toda vez que perdieron soporte en las raíces y se pueden caer por lluvias o brisas





- A la fecha no se cuenta con equipo Vibrocompactador para sello de la subrasante al momento de la excavación, ni materiales como rajón y subbase para ir conformando la estructura del pavimento e ir protegiendo la subrasante en caso de lluvia, en caso de que la subrasante se produzcan fallos por esta falta de equipos y materiales y lluvia, el contratista asumirá su arreglo sin ningún costo para la entidad




- Se deberá contar con plástico en caso de que llueva proteger la subrasante

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

- Se debe implementar lo dispuesto en el PMT, en cuanto a los esquemas se señalización, a la fecha no se cuenta con maletines, ni paleteros para controlar el tráfico a la entrada y salida de volquetas de la zona de trabajos
- Se debe dotar al personal en obra de los EPP



- las volquetas deben contar con lona de protección a la hora de realizar el retiro de materiales de excavaciones, demoliciones y demás.

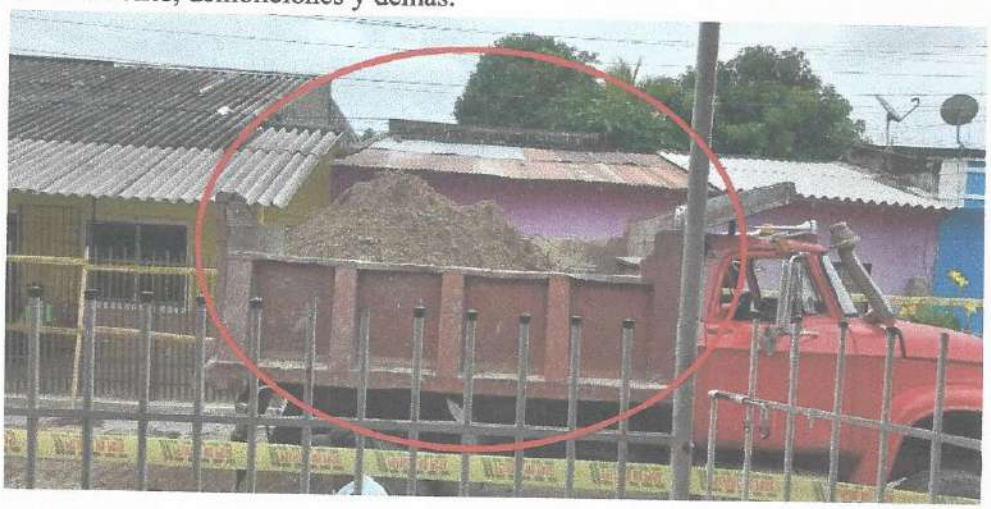

- Se debe implementar cerramiento tipo 3 con lona verde, como se indica en el componente Eje De Seguridad Y/O Obra



- Se debe implementar los programas del PGIO como son:
  - EJE S&SO

    Kit de Emergencias: Incluye extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor), camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)
    Kit para trabajos con soldadura
    Careta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levantable - guantes - overol especial.
    Kit señalización SST: incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.
    Examen médico ocupacional de ingreso y egreso incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas
    Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO
    eje de seguridad industrial y salud ocupacional.
  - JE AMBIENTAL

    Kit señalización Ambiental: incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.
    Kit para desperdicios sólidos: Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la intemperie, de fácil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico
    de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-
    Lavado de Herramientas: Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.
    Cubrimiento de Materiales Granulares: (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.
    Cubrimiento de escombros: Tela verde para cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.
    Alquiler baño portátil: Suministro de baño portátil
    Kit aseo Edificación: consta de pica, pala con mango, escoba, balde plástico 25 lt.
    Kit aseo Infraestructura: consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy con llanta neumática), como mínimo de H:45cm, balde plástico de 25 lt, cepillo de casquillo de 37 x 7
    Brigada de aseo: Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementación y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional
    Kit de derrames pequeños: consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín
    Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental.
  - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA

    Cerramiento tipo 3: consta de postes de madera rolliza de 2m de altura libre, enterrados como mínimo 0,3m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4.con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Adicionalmente entre postes debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual al poste. Separación entre postes máximo de 5m
  - EJE MANEJO DE TRAFICO

Señales preventivas, señales reglamentarias, señales informativas y paleteros con dotación más prestaciones

- PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "PAPSO":

La implementación de estos programas tiene asignado unos recursos así:

- Implementación de gestión de obra (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de tráfico) $42.330.163

PAPSO $20.577.216

TOTAL: **$62.907.379**

De acuerdo con la propuesta ganadora del proceso de licitación del contrato de obra en la Nota 4 se tiene: "*El valor del PGIO Y PAPSO es modificable, en todo caso durante la ejecución del contrato se deberá garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo con lo previsto por la entidad en el cuadro que discrimina las actividades del mismo.*"

Se adjunta a este oficio informe: INFORME PAPSO e INFORME PGIO entregados por la entidad contratante en la etapa de pliegos

- Antes de iniciar se debe presentar afiliaciones de todo personal a ingresar a obra, mediante oficio para así realizar su autorización previa verificación de documentos

Lo anterior se debe presentar e implementar de manera inmediatamente

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-024-2022 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 28 de agosto de 2022, 10:38
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

3 adjuntos

- **ESASIM-024-2022 SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf** 1077K
- **2. INFORME PAPSO - ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS.pdf** 4706K
- **2. INFORME PGIO - ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS.pdf** 12068K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 28 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-025-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACIONES AL PERSONAL DE OBRA

Cordial saludo,

Después de haber revisado la documentación enviada por la firma contratista, solicitamos la entrega de los siguientes documentos relacionados en la siguiente tabla:

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	RESPONSABLE EMPRESA	EXAMENES MEDICOS			FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	SALUD	AFILIACION PENSION	ARL	CAJA COMPENSACION
					ENTIDAD EXAMEN INGESO	ING	RET						
1	JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRAS	1069468639	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		02/08/2022		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	NO PRESENTA
2	RODOLFO URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA	6.889.639	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	NO PRESENTA
3	ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ESPECIALISTA EN VIAS	11.000.193	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	NO PRESENTA
4	SIMON PEÑA MENDOZA	INGENIERO ELECTRICO	78.747.853	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	NO PRESENTA
5	DIANA PALACIOS MOSQUERA	ING. ESPECIALISTRA AMBIENTAL	1.057.886.516	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776

897

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	RESPONSABLE EMPRESA	EXAMENES MEDICOS			FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	SALUD	AFILIACION PENSION	ARL	CAJA COMPENSACION
					ENTIDAD EXAMEN INGESO	ING	RET						
6	NINI JOHANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL	49.606.740	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	NO PRESENTA
7	LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA	1.064.985.371	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	NO PRESENTA
8	MATEO DE JESUS SEBA FERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA	1.067.947.461	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		SANITAS	PROTECCION	SURA	NO PRESENTA
9	JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO	1.067.926.673	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
10	MARIA CAMILA CABALLEO	SECRETARIA	1.003.002.882	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
11	ESTEBAN FIGUEROA SALAS	ING. AUXILIAR DE OBRA	10.932.363	CONSTRUCTORA VIENA SAS	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		23/06/2022		NO PRESENTA	COLPENSIONES	SURA	NO PRESENTA
12	JHONATAN LEON MARTINEZ	AYUDANTE	1.003.452.457	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		CAJACOPI	NO PRESENTA	SURA	NO PRESENTA
13	JULIAN HERNANDEZ FLOREZ	AYUDANTE	1.133.797.655	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		NO PRESENTA	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
14	EDER LUIS BLANCO TABORDA	AYUDANTE	1.003.434.734	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
15	GUSTAVO URANGO GONZALEZ	AYUDANTE	10.767.500	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	NO PRESENTA
16	JAWIT GONZALEZ MORELO	AYUDANTE	1.067.866.750	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022		NO PRESENTA	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
17	SERGIO RAUL SEJIN MACEA	AYUDANTE	78.694.807	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		11/08/2022		SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	NO PRESENTA
18	VIRGILIO FUENTES TORREGLOSA	MAESTRO DE OBRA	6.893.241	CONSTRUCTORA VIENA SAS	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		14/02/2022		MUTUAL SER	COLPENSIONES	SURA	NO PRESENTA
19	ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	OFICIOS VARIOS	1.003.466.270	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		22/08/2022		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	NO PRESENTA
20	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO	AUXILIAR SISO	10.776.895	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		17/08/2022		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	NO PRESENTA
21	MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO	78.700.712	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		25/08/2022		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	NO PRESENTA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	RESPONSABLE EMPRESA	EXAMENES MEDICOS			FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	SALUD	AFILIACION PENSION	ARL	CAJA COMPENSACION
					ENTIDAD EXAMEN INGESO	ING	RET						
22	ERICK PLAZA ARDINES	CADENERO	1.067.926.278	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		25/08/2022		MUTUAL SER	NO PRESENTA	SURA	NO PRESENTA
23	RAFAEL DARIO PASTRANA PASTRANA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1.064.991.934	L.J.C INGENIERIA SAS	NO PRESENTA			23/08/2022		NO PRESENTA	NO PRESENTA	SURA	NO PRESENTA

- Se debe aclarar la afiliación a Arl sura y examen de salud ocupacional del señor ESTEBAN FIGUEROA SALAS, los cuales están por la CONSTRUCTORA VIENA SAS
- Se indica que el señor VIRGILIO FUENTES TORREGLOSA identificado con cedula de ciudadanía 6.893.241, maestro de obra, se encuentra afiliado por la empresa CONSTRUCTORA VIENA SAS, la cual no hace parte del contrato de obra y mucho menos es consorciado dentro del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

  Por lo anteriormente descrito no están autorizados a entrar a obra hasta tanto se realice la afiliación a seguridad social y aportes parafiscales por el Consorcio Pavimentos Montería

- Todos los documentos deben ser presentados impresos y legibles no impresiones de fotos
- Se le recuerda a la firma contratista que antes de iniciar se debe presentar afiliaciones de todo personal a ingresar a obra, mediante oficio para así realizar su autorización previa verificación de documentos

Lo anterior se debe presentar e implementar de manera inmediatamente

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

047

171

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-025-2022 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACIONES AL PERSONAL DE OBRA

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 28 de agosto de 2022, 12:27
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACIONES AL PERSONAL DE OBRA

ESASIM-025-2022 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACIONES AL PERSONAL EN OBRA.pdf
201K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 29 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-026-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: DR. GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.3.

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente me permito remitir lo siguiente:

1. Informe Semanal No.3. Periodo 22 de agosto al 28 de agosto de 2022

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-026-2022 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.3.

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 28 de agosto de 2022, 19:47
Para: s.infraestructura@monteria.gov.co, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.3.

2 adjuntos

ESASIM-026-2022 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.3.pdf
76K

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA No.3.pdf
537K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, agosto 29 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-027-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: REQUERIMIENTOS TECNICOS

cordial saludo,

Mediante el siguiente comunicado la firma interventora manifiesta:

1. Se ha hecho caso omiso a los requerimientos y recomendaciones realizadas reiteradamente por la interventoría en lo referente a inicio de trabajos de excavación, toda vez que se debe dar cumplimiento a lo exigido en Especificaciones Técnicas, y contar con la totalidad de insumos (personal, materiales, equipos) necesarios para la ejecución de las actividades

2. La firma contratista no cuenta con la totalidad de equipo mínimo exigido en Pliegos de condiciones, no teniendo en campo:

- Retrocargador De Pala
- Minicargador Con Martillo Demoledor (no cuenta con operador)
- Vibrocompactador 31 Hp
- Carrotanque
- Carro canasta con brazo hidráulico
- Motosierra
- Compactador Saltarín (Canguro)
- Compactador Manual Vibratorio (Rana)
- Grúa canasta
- Grúa para postes

3. La firma contratista no cuenta en obra con materiales aprobados, a fin de efectuar protección de subrasante una vez se realice proceso de excavación

4. Habiéndose solo autorizado inicio de trabajos en tramo PR0+000 a PR0+037, el contratista de manera unilateral inicio trabajos de excavación en sector de CALLE 8F SUR PR0+040 en adelante, la decisión de no permitir intervenciones en otros tramos se debe a que la firma contratista NO cuenta con los recursos de equipos y materiales necesarios para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a especificaciones técnicas

5. A fecha de hoy y debido a las lluvias presentadas durante los últimos días se observa una subrasante saturada y afectada por la alta humedad.

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA






6. No cumplir con las exigencias técnicas, efectuar actividades no autorizadas y debido a esto alterar la calidad de la subrasante, son de total responsabilidad de la firma contratista, quien deberá a su costa verificar el estado de esta y realizar las mejoras requeridas que garanticen el cumplimiento de Estudios y Diseños y Especificaciones Técnicas, que forman parte integral del contrato

ITEM 1.05 EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO Ver Capitulo 2 Articulo 201 de Normas y Especificaciones de INVIAS 2012
ITEM 1.06 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
Ver Capitulo 2 Articulo 210 de Normas y Especificaciones de INVIAS 2012

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito nuevamente se solicita a la firma contratista

1. Dar cumplimiento en todos sus aparte a lo requerido en Pliegos de Condiciones
2. Dar cumplimiento en todos sus apartes a lo requerido en Especificaciones Técnicas
3. Acatar las solicitudes y requerimientos de la interventoría, toda vez que como es de su conocimiento nuestras funciones son de control: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE, debiendo garantizar el cumplimiento de lo requerido por la entidad contratante.
4. Hacer caso omiso a lo requerido por la interventoría y sin autorización realizar obras, ocasionará su NO RECIBO y por ende su NO PAGO, y adicionalmente su reporte a la entidad contratante a fin de que se apliquen las sanciones a que haya lugar

Esperamos se tomen los correctivos de manera inmediata y se dé cumplimiento a lo estipulado claramente por la entidad contratante ALCALDIA DE MONTERIA

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ING MARIO TORRES- APOYO DE SUPERVISION – ALCALDIAN DE MONTERIA
ING. GERMAN QUINTERO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-027-2022 - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 29 de agosto de 2022, 10:14
Para: jipupo@hotmail.com, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, Administración@constructorajipg.com
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, s.infraestructura@monteria.gov.co, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ESASIM-027-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
362K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 29 de agosto de 2022, 10:18
Para: admnistracion@constructorajipg.com

[El texto citado está oculto]

ESASIM-027-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
362K

ANEXO 12

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja 1 de 1	INFORME No	1
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO		
		08 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	
		DESDE	HASTA	
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
2/08/2022	LP-SPM-008-2022-002	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA	VIA EMAIL
2/08/2022	LP-SPM-008-2022-003	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EN PROJET	VIA EMAIL
3/08/2022	LP-SPM-008-2022-004	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DEL PLAN DE CALIDAD	VIA EMAIL
3/08/2022	LP-SPM-008-2022-005	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DEL OLAN DE MANEJO DE TRAFICO	VIA EMAIL
3/08/2022	LP-SPM-008-2022-006	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO	VIA EMAIL
3/08/2022	LP-SPM-008-2022-007	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DEL PLAN DE SEFURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	VIA EMAIL
4/08/2022	LP-SPM-008-2022-008	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LA PRESENTACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA VALLA	VIA EMAIL
4/08/2022	LP-SPM-008-2022-009	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA Representante Legal	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	Copia de INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO EN REFERENCIA. "REF:CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS... ", remitida a CARLOS ORDOSGOITIA, Alcalde de Monteria	VIA EMAIL
4/08/2022	LP-SPM-008-2022-010	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL ACTA DE INICIO	VIA EMAIL
6/08/2022	LP-SPM-008-2022-011	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LAS RESOLUCIONES DE LA CANTERA A REUTILIZAR	VIA EMAIL
10/08/2022	LP-SPM-008-2022-012	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	TERRAZAS DE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN SALIDAS DEL PARAMENTO	VIA EMAIL
11/08/2022	LP-SPM-008-2022-013	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	RESPUESTA PARCIAL AL COMUNICADO ESASIM-010-2022 (ENTREGA DE APUS)	VIA EMAIL
11/08/2022	LP-SPM-008-2022-014	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO	VIA EMAIL
11/08/2022	LP-SPM-008-2022-015	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	SOLICITUD DE PLANOS, DISEÑOS O ESQUEMAS SOBRE LAS REDES ELÉCTRICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROYECTO	VIA EMAIL
12/08/2022	LP-SPM-008-2022-016	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	DANDO RESPUESTA AL COMUNICADO ESASIM-010-2022 DEL 09 DE AGOSTO. (ENTREGA DE FLUJO NDE CAJA, CRONOGRAMA A ACTA DE INICIO Y AFILIACIONES)	VIA EMAIL
16/08/2022	LP-SPM-008-2022-017	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIOS Y AFILIACIONES DE TRABAJADERES	VIA EMAIL

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja 1 de 1	INFORME No	1
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO		
		08 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	
		DESDE	HASTA	
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
23/08/2022	LP-SPM-008-2022-018	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA EN OBRA Y AFILIACIÓN DE OPERADORES	VIA EMAIL
23/08/2022	LP-SPM-008-2022-019	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA EN OBRA	VIA EMAIL
24/08/2022	LP-SPM-008-2022-020	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO AJUSTADO	VIA EMAIL
25/08/2022	LP-SPM-008-2022-021	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA Representante Legal	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	Copia de AUTORIZACIÓN A INGENIERO ELÉCTRICO PARA LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA ENTIDAD DE AFINA, remitido a CARLOS ORDOSGOITIA Alcalde de Monteria	VIA EMAIL
27/08/2022	LP-SPM-008-2022-022	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE AFILIACIONES DEL PERSONAL TOPOGRÁFICO	VIA EMAIL
27/08/2022	LP-SPM-008-2022-023	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	RESPUESTA AL COMUNICADO ESASIM-016-2022, PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	VIA EMAIL
27/08/2022	LP-SPM-008-2022-024	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	RESPUESTA AL COMUNICADO ESASIM-018-2022, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO AJUSTADO	VIA EMAIL
29/08/2022	LP-SPM-008-2022-025	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	RESPUESTAS A LOS COMUNICADOS ESASIM-021-2022 Y ESASIM-021-2022	VIA EMAIL
31/08/2022	LP-SPM-008-2022-026	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE LAS AFILIACIONES DEL OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR Y RETROCARGADOR	VIA EMAIL
31/08/2022	LP-SPM-008-2022-027	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL BOTADERO DE MATERIALES, CREACIÓN DE VEEDURÍA Y ACTAS DE VENCIDAD	VIA EMAIL

VBO - Interventor

Contratista de Interventoria: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA
Contrato No: CMA-SPM-007-2022	Contrato No. LP-SPM-008-2022
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 002

Montería - Córdoba. 02/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega del levantamiento topográfico de la vía.

Mediante el presente, se hace la entrega del levantamiento topográfico de la vía que comprante la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega del levantamiento topográfico de la vía.

2 mensajes

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 10:38
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

PLANO PAVIMENTO ALFONSO LOPEZ_29072022.dwg

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 002 topografia.pdf
243K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 13:15
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>

Buenas tardes

Observaciones a plano:
*Se debe insertar cotas de diseño en perfiles
*Se debe llevar un abscisado continuo como en el diseño inicial del proyecto PR00+000 - PR0+798, No por tramos
*Se debe presentar perfil completo y que incluya el diseño de la entidad contratante
*Se debe presentar carteras de mejoramiento, subbase y Rasante
[El texto citado está oculto]

182

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 003

Montería - Córdoba. 02/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de la programación del proyecto en projet.

Mediante el presente, se hace la entrega de la programación en projet, del proyecto que comprante la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de la programación del proyecto en projet.

4 mensajes

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 10:45
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

2 adjuntos

- **PDT CONSORCIO PAVIMENTOS.mpp** 427K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 003 programacion.pdf** 243K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 14:02
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>

Buenas tardes
Recomendaciones a programación:
*Se debe ajustar a 4 meses, si inicia el 8 esta debe llegar al 8 de diciembre, revisar inicio y finalización de algunas actividades

El mar, 2 ago 2022 a las 10:45, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA (<consorciopavimentosmonteria@gmail.com>) escribió:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 14:19
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

LISTO.
[El texto citado está oculto]

- **PDT CONSORCIO PAVIMENTOS.mpp** 430K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 20:40
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>

Listo enviame el flujo de caja por semana
[El texto citado está oculto]

184

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 004

Montería - Córdoba. 03/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega del plan de calidad.

Mediante el presente, se hace la entrega del plan de calidad del proyecto, ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

Jorge Carrascal

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

185

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega del plan de calidad.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 3 de agosto de 2022, 11:09
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 004 Plande de Calidad.pdf
243K

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- CONTRATO LP-SPM-008-2022.pdf
1129K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 005

Montería - Córdoba. 03/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega del Plan de Manejo de Trafico

Mediante el presente, se hace la entrega del plan de Manejo de Trafico del proyecto, ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López. Dicho plan ya fue radicado ante la secretaria de transito de la ciudad de montería.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega del PMT

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 3 de agosto de 2022, 11:15
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

- **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.pdf** 1427K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 005 PMT.pdf** 243K

188

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 006

Montería - Córdoba. 03/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de la correspondencia enviada por el consorcio.

Mediante el presente, se hace la entrega de la correspondencia enviada por el consorcio pavimentos Montería ante los diferentes entes de telecomunicaciones y servicios públicos, para que estos se den por enterados de la ejecución del proyecto ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

189

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Correspondencia a entes públicos

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 3 de agosto de 2022, 11:30
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

- **Cartas enviadas a entes publicos.pdf**
  2702K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 006 Correspondencia.pdf**
  243K

190

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 007

Montería - Córdoba. 03/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega del plan de seguridad industrial y salud ocupacional.

Mediante el presente, se hace la entrega del plan de seguridad industrial y salud ocupacional para el proyecto ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega del plan de seguridad industrial y salud ocupacional.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 3 de agosto de 2022, 14:09
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 007 Plan SST.pdf** 243K
- **10. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.pdf** 1289K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 008

Montería - Córdoba. 04/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de la presentación para la publicidad de la valla.

Mediante el presente, se hace la entrega de la presentación para la valla publicitaria del proyecto ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Elaboro: Jorge Carrascal

Cordialmente,

Jorge Carrascal

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de la presentación para la publicidad de la valla.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 8:53
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

VALLA CPM.pdf
127K

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 008 Publicidad de la valla.pdf
243K

194

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 009

04 de agosto de 2022 Montería - Córdoba.

Señor
Carlos Ordosgoitia
Alcaldía de Montería.

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Invitación a la socialización del proyecto antes mencionado en referencia.

Respetado señor

De manera atenta le invitamos a la reunión de solarización y de inicio de la obra del proyecto en referencia, el cual se ejecutará en el marco del contrato de obra LP-SPM-008-2022. Ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Lugar: Centro educativo la luz del saber – Crr 8E #5 -15 Brr. Alfonso López
Fecha: Lunes 8 de agosto de 2022
Hora: 9:00 Am

En este encuentro se estarán dando a conocer los lineamientos contractuales del proyecto, socializaremos el componente técnico y de gestión social. También se estarán resolviendo las dudas que se puedan presentar. Cabe resaltar que también extenderemos la invitación a la JAC del barrio Alfonso López y Los Araujos, a las secretarias de infraestructura y planeación, considerando que es de suma importancia que nos acompañen a dicha socialización.

Para cualquier información adicional, puede comunicarse con nuestra profesional social Nini Ropero Daza, al número de celular 3106939253 o al correo electrónico nini34@hotmail.com

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JUAN IGNACIO PUPU GARCIA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Copia. Secretaria de Infraestructura
Copia. Secretaria de Planeación
Copia. JAC. Brr. Alfonso López

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Invitación a la socialización del proyecto ubicado en el barrio Alfo López

2 mensajes

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 15:09
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

Buenas tardes a todos, para informarles sobre la fecha y lugar donde se llevará a cabo la reunión para la socialización del proyecto. La invitación a las entidades públicas se les hará de forma física.

2 adjuntos

1.Formato de Exposicion para Socializaciones.pptx
15748K

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 009 Invitacion a socializacion.pdf
344K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 18:49
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>

Presentación ajustada
[El texto citado está oculto]

1.Formato de Exposicion para Socializaciones Ajustada.pptx
15748K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 010

Montería - Córdoba. 04/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de la documentación requerida para el acta de inicio.

Mediante la presente, se hace la entrega de la documentación requerida para el acta de inicio del proyecto ubicado, en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López. Por lo tanto, se anexan los siguientes documentos:

No.	Nombre del Documento	Si / N.A.
1	Registro fotográfico de la valla informativa instalada (Según Formato)	SI
2	Acta de Socialización del proyecto (Según Formato)	SI
3	Registro fotográfico situación existente (Según Formato)	SI
4	Relación del Personal Profesional Propuesto (Según Formato)	SI
5	Relación de equipo ofrecido (Según Formato)	SI
6	Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)	SI
7	Inscripción de profesionales y trabajadores en seguridad social	SI

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

8	Cronograma de obra actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio	SI
9	Plan de calidad (si aplica)	SI
10	Plan ambiental, Seguridad Industrial y salud Ocupacional (si aplica)	SI
11	Plan de manejo de tráfico (si aplica)	SI
12	Documento de Constitución de la fiducia aprobación (si hay anticipo). Cuando es pago anticipado (diferente al anticipo) no se requiere fiducia.	N.A
13	Licencia de construcción aprobada por curaduría	N.A.
14	Permiso y/o Licencia Tala y Poda de Árboles	SI
15	Permiso y/o Licencia de Intervención de causes	N.A
16	Permiso y/o Licencia canteras aprobadas	SI
17	Permiso y/o Licencia Invias (para trazabilidad fluvial)	N.A
18	Póliza del contrato y recibo de pago	SI
19	Aprobación de póliza	SI
20	Certificado de Registro presupuestal CRP	SI

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de la documentación requerida para el acta de inicio.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 17:46
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

19 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 010 Documentacion para Acta de Inicio.pdf** 298K
- **Lista de Chequeo Acta Inicio.docx** 135K
- **1.Registro Fotográfico Valla.pdf** 712K
- **2. Acta de Socializacion CPM.pdf** 2768K
- **3. Registro Fotografico Situacion existente CPM.pdf** 1535K
- **4. Relacion Personal Propuesto CPM.pdf** 478K
- **5. Relacion Equipos Propuesto CPM.pdf** 584K
- **6. Relación de Afiliacion del personal.pdf** 484K
- **7. Afiliaciones a la ARL.rar** 3281K
- **8. Cronograma - Projet CONSORCIO PAVIMENTOS.mpp** 430K
- **9. MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- CONTRATO LP-SPM-008-2022.pdf** 1129K
- **10. PLAN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OPUPACIONAL.pdf** 1289K
- **11. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.pdf** 1427K
- **14. RADICACION COBRO AMBIENTAL.pdf CVC.pdf** 568K
- **16. CertificadoRMN_GAJ-091_30-05-2018Signed.pdf** 69K
- **18. Poliza_10_CRC-100008907_0 (1).pdf** 1227K
- **18.1 Poliza_24_CRC-100002734_0 (1).pdf** 1969K
- **19. APROBACION Y RESOLUCION POLIZA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.pdf** 2456K
- **20. CRP 22001574 CONTRATO LP-SPM-008-2022 OBRA DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS.pdf** 329K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 011

Montería - Córdoba. 06/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de las resoluciones de la cantera a utilizar

Mediante la presente, se hace la entrega de las resoluciones de la cantera a utilizar en el proyecto ubicado, en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López. Por lo tanto, se anexan los siguientes documentos:

CANTERA	PROPIEARIO	LICENCIA AMBIENTAL	LICENCIA EXPLOTACION	MATERIALES
CHICORAL	ROSA MARIA GANEM BECHARA C.C 51.914.889	RES. 2-6499 DEL 19 SEP 2019	GAJ-091	MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRAVAS, ARENAS PARA RELLENO, PIEDRA RAJON, SUBBASE

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

200

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Resoluciones ambientales de la cantera a utilizar

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 6 de agosto de 2022, 9:02
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

3 adjuntos

- **16. Certificado RMN_GAJ-091_30-05-2018 - Cantera Chicoral.pdf** 69K
- **16.1 RESOLUCION_2-4427 - Licencia Ambiental - Cantera Chicoral.pdf** 1950K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 011 Resoluciones de canteras.pdf** 254K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 012

Montería - Córdoba. 10/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Terrazas de viviendas que se encuentran salidas del paramento.

Mediante el presente, se le informa a la interventoría la situación encontrada en campo, una vez hecho el levantamiento topográfico de la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López. Donde se pudo evidenciar que varias terrazas de viviendas con o sin rejas se encuentran salidas del paramento. Aproximadamente las viviendas se encuentran salidas entre los 50 y 70cm quedando dentro de los parámetros del andén de la vía. En el siguiente cuadro se hace una relación de las viviendas que se encuentran con este problema.

LISTADO DE LAS VIVIENDAS FUERA DEL PARAMENTO		
DIRECCION	***ABSCISA***	***LADO***
CRA 8E NUMERO 2 - 3	k0+045	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 2 - 13	k0+050	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 5	k0+055	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 15	k0+060	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 2 - 55	k0+060	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 22	k0+070	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 30	k0+080	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 29	k0+080	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 2 -41	k0+090	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 2 - 42	k0+090	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 52	k0+092	DERECHO
CRA 8E NUMERO 2 - 47	k0+094	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 3 - 52	k0+096	DERECHO

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

CRA 8E NUMERO 3 - 66	k0+110	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 04	k0+130	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 10	k0+140	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 20	k0+150	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 39	k0+170	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 3 - 54	k0+170	DERECHO
CRA 8E NUMERO 3 - 51	k0+170	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 16	k0+200	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 24	k0+205	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 30	k0+210	DERECHO
CRA 8E NUMERO 4 - 17	k0+210	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 23	k0+220	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 4 - 35	k0+230	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 02	k0+280	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 18	k0+290	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 35	k0+290	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 24	k0+300	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 23	k0+300	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 34	k0+316	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 27	k0+310	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 46	k0+320	DERECHO
CRA 8E NUMERO 5 - 45	k0+320	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 5 - 49	k0+330	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 50	k0+340	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 60	k0+400	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 68	k0+410	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 69	k0+420	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 12	k0+440	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 18	k0+440	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 20	k0+450	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 22	k0+460	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 26	k0+460	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 28	k0+470	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 30	k0+473	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 41	k0+480	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 6 - 51	k0+486	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 54	k0+495	DERECHO

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

CRA 8E NUMERO 6 - 70	k0+500	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 06	k0+525	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 16	k0+540	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 44	k0+580	DERECHO
CRA 8E NUMERO 6 - 24	k0+610	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 8 - 02	k0+640	DERECHO
CRA 8E NUMERO 8 - 03	k0+640	IZQUIERDO
CRA 8E NUMERO 8 - 23	k0+660	DERECHO

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

204

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 012 Viviendas fuera de paramento

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 10 de agosto de 2022, 16:54
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 012 Viviendas fuera de paramento.pdf
544K

205

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 013

Montería - Córdoba. 11/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Respuesta parcial al COMUNICADO: ESASIM-010-2022

Mediante el presente y atendiendo a la solicitud del comunicado ESASIM-010-2022 del día 09 de agosto, se realiza la entrega de los Apus en formato Excel y Pdf correspondientes a la propuesta económica para el proyecto antes mencionado en referencia.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

entrega de Apus en formato Excel y Pdf

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 11 de agosto de 2022, 10:13
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

4 adjuntos

- **OFERTA ECONOMICA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.pdf** 86K
- **APUS PAV MONT - PARA ENTREGAR.pdf** 446K
- **APUS PAV MONT - PARA ENTREGAR.xlsx** 421K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 013 Apus.pdf** 243K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 014

Montería - Córdoba. 11/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de pólizas actualizadas al acta de inicio.

Mediante el presente se realiza la entrega de las pólizas actualizadas una vez firmada el acta de inicio con fecha de 9 agosto de 2022, del proyecto ubicado en la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de las Pólizas actualizadas a acta de inicio

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 11 de agosto de 2022, 10:26
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

3 adjuntos

- **Poliza_10_CRC-100008907_1_unlocked.pdf** 971K
- **Poliza_24_CRC-100002734_2_unlocked.pdf** 1162K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 014 Actu. Policias acta de inicio.pdf** 243K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 015

Montería - Córdoba. 11/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Solicitud de planos, diseños o esquemas sobre las redes eléctricas a implementar en el proyecto.

Mediante el presente se le solicita a la interventoría los planos, diseños o esquemas sobre las redes eléctricas a implementar en el proyecto antes mencionado en referencia. Como son las redes de baja tensión y media tensión, lo referente a la subestación eléctrica y el alumbrado público.
Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

210

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Solicitud de diseños electricos

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 11 de agosto de 2022, 16:40
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 015 Solicitud de diseños electricos.pdf
243K

211

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 016

Montería - Córdoba. 12/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Dando respuesta al comunicado ESASIM-010-2022 del 09 de agosto.

Mediante el presente se hace la entrega del flujo de caja semanalmente, cronograma a fecha de inicio 9 de agosto y las afiliaciones del personal propuesto en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

entrega de Flujo de caja, cronograma actualizado a acta de inicio y Afiliaciones del profesional propuesto

2 mensajes

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 12 de agosto de 2022, 17:57
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

4 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 016 Flujo de caja y Afiliaciones.pdf** 243K
- **Flujo de caja semanal.xltx** 20K
- **8. Cronograma - Projet CONSORCIO PAVIMENTOS.mpp** 505K
- **Afiliaciones personal propuesto.pdf** 24415K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 15 de agosto de 2022, 19:16
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>

Se envia programación inicial de obra y flujo de caja para su impresión y firma

El vie, 12 ago 2022 a las 17:58, CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA (<consorciopavimentosmonteria@gmail.com>) escribió:

3 adjuntos

- **Flujo de caja semanal.xlsx** 48K
- **Flujo de caja semanal.pdf** 201K
- **8. Cronograma - Projet CONSORCIO PAVIMENTOS.mpp** 401K

213

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 017

Montería - Córdoba. 16/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de ensayos de laboratorio y afiliaciones de trabajadores.

Mediante el presente se hace la entrega de las afiliaciones de los trabajadores y los ensayos de laboratorio de los materiales cantera, piedra Rajon y Subbase a utilizar en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

214

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

oficio para el correo anterior

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 16 de agosto de 2022, 17:41
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 017 Ensayos de material de cantera.pdf
243K

215

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 018

Montería - Córdoba. 23/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de documentos de la maquinaria en obra y afiliación de operadores.

Mediante el presente se hace la entrega de los documentos de la maquinaria en obra y afiliación de operadores a utilizar en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

entrega de documentación maquinaria y personal en obra

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 23 de agosto de 2022, 9:17
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

2 adjuntos

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 018 Documentacion de maquinaria y operadores.pdf
243K

Documentos.rar
12640K

217

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 019

Montería - Córdoba. 23/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de documentos de la maquinaria en obra.

Mediante el presente se hace la entrega de los documentos de la maquinaria en obra, vibrocompactador Dynapac y minicargador Bodcat a utilizar en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de documentos de la maquinaria en obra.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 23 de agosto de 2022, 16:30
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

Libre de virus.www.avast.com

3 adjuntos

- **Vibrocompactador.rar** 809K
- **Minicargador.rar** 1260K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 019 Documentacion de maquinaria en obra.pdf** 293K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO pavimentos montería

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 020

Montería - Córdoba. 24/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega del plan de manejo de tráfico ajustado.

Mediante el presente se hace la entrega del plan de manejo de tráfico ajustado y sus esquemas de señalización a utilizar en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras.
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

220

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

entrega del PMT ajustado con esquemas de señalización.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 24 de agosto de 2022, 9:55
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

6 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 020 Plan de manejo de trafico - Ajustado.pdf**
  78K
- **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - Ajustado.pdf**
  1627K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 2.pdf**
  133K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 4.pdf**
  133K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 1.pdf**
  131K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 3.pdf**
  131K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 021

Montería - Córdoba. 25/08/22

Señor
CARLOS ORDOSGOITIA
Alcaldía de Montería.

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Autorización a ingeniero eléctrico para legalización del proyecto en la entidad de Afinia.

Mediante el presente se da la autorización a ingeniero eléctrico Simón Mendosa identificado con numero de cedula 78.747.853 de Montería y matrícula profesional CN 205 34600, para legalización del proyecto antes mencionado en referencia, ante la entidad de Afinia. Para adelantar los tramites o procesos necesarios para iniciar con las actividades que corresponde a la intervención de la calle 2 entre las carreras 8E y 8F, y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 de los barrios Alfonso López y los Araujos.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JUAN IGNACIO PUPU GARCIA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Copia. Secretaria de Infraestructura

222

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Autorización al ingeniero eléctrico para legalización del proyecto ante afina

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 25 de agosto de 2022, 11:44
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 021 - Autorizacion electrico.pdf
286K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 022

Montería - Córdoba. 27/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de afiliaciones del personal topográfico.

Mediante el presente se hace la entrega de las afiliaciones del personal topográfico que se utilizara en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de afiliaciones de personal.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 27 de agosto de 2022, 8:48
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

3 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 022 Afiliaciones topos.pdf** 243K
- **medardo - Topografo.pdf** 2607K
- **Erick plaza - Cadenero.pdf** 3243K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 023

Montería - Córdoba. 27/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Repuesta al comunicado ESASIM-016-2022. Plan de inspección y ensayos

Mediante el presente se hace da repuesta al comunicado ESASIM-016-2022. Y se envía el plan de inspección y ensayos a utilizar en el proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Plan de ensayos

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 27 de agosto de 2022, 11:52
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

14 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 023 Inspeccion de ensayos.pdf** 243K
- **PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS MONTERIA.xlsx** 930K
- **DESGASTE PIEDRA RAJON.pdf** 327K
- **PARTICULAS LIVIANAS PIEDRA RAJON.pdf** 214K
- **SOLIDEZ S. PIEDRA RAJON.pdf** 286K
- **SOLIDEZ M. PIEDRA RAJON.pdf** 281K
- **GRADACION PIEDRA RAJON.pdf** 455K
- **TERRONES PIEDRA RAJON.pdf** 220K
- **DESGASTE SUB BASE.pdf** 326K
- **SOLIDEZ M. SUB BASE.pdf** 286K
- **SOLIDEZ S. SUB BASE.pdf** 287K
- **TERRONES SUB BASE.pdf** 224K
- **GRADACION SUB BASE.pdf** 469K
- **Geotex-601 - GEOTEXTIL 2500.pdf** 712K

727

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 024

Montería - Córdoba. 27/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Repuesta al comunicado ESASIM-018-2022. Plan de manejo de transito ajustado.

Mediante el presente se hace da repuesta al comunicado ESASIM-018-2022. se envía el plan de tránsito ajustado para entregar a la secretaria de tránsito y solicitar el tiempo real de la intervención del proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

PMT ajustado a entregar a Secretaria de Transito por mas tiempo

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 27 de agosto de 2022, 12:01
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

6 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 024 PMT ajustado.pdf** 243K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 3.pdf** 131K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 1.pdf** 131K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 4.pdf** 133K
- **SEÑALIZACION PMT V2 ESQUEMA 2.pdf** 133K
- **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - Ajustado.pdf** 1730K

CONSORCIO
PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO pavimentos montería

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 025

Montería - Córdoba. 29/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Respuestas a los comunicados ESASIM-021-2022 y ESASIM-021-2022

1. Mediante el presente se da respuestas a los comunicados ESASIM-021-2022 del 22 de agosto y el ESASIM-021-2022 del 25 agosto. Teniendo en cuanta que nos encontramos realizando la actividad de excavación mecánica nos permitimos informar que por el momento tenemos en obra una retroexcavadora de orugas, un minicargador y las volquetas para el retiro de material proveniente de la excavación. En cuanto a que ya contamos con un tramo de la vía acondicionado para recibir material de estabilización "piedra rajon y subbabse" informamos que en el día de mañana nos llega el vibrocompactador para iniciar con dicha actividad. También contamos con los equipos menores como lo son motobomba de 3¨, compacador manual rana y saltarin, estando en bodega.

   Como bien sabemos el proyecto está ubicado en la zona sur del municipio de Montería, donde a su alrededor se encuentran diferentes tipos de invasiones peligrosas, donde se puede generar alguna perdida o problemática teniendo toda la maquinaria en campo. Dicho esto, damos a conocer un motivo por el cual no hemos llevado a la obra el carro canasta, grúa canasta, grúa hinca poste.

   Por otro lado, aun la alcaldía de Montería no ha entregado la certificación de aprovechamiento para la tala de árboles del proyecto y por esa razón no contamos con la disposición de la motosierra en campo, una vez se tenga el certificado antes mencionado y se vaya a realizar dicha actividad se dispondrá de tal equipo menor.

2. Con respecto a la documentación de la maquinaria, Se presento el contrato entre el consorcio y el subcontratista del alquiler de la maquinaria y la papelería correspondiente de la maquinaria que se está utilizando en obra, una vez llega a la obra se le solicita al subcontratista su documentación y también las afiliaciones de los operadores. E inmediatamente de les envía a ustedes para que hagan su debida revisión.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO pavimentos montería

NIT. 901.609.836-4

3. Teniendo en cuenta las observaciones dada por ustedes y por la secretaria de tránsito, el PMT fue ajustado bajo las condiciones necesarias para intervención del proyecto y este mismo ha sido implementado en campo.

4. Tomando la sugerencia dada por ustedes como interventoría con respecto a la programación inicial, se realizaron los ajustes al cronograma y al flujo de caja. Donde estos ya fueron entregados tanto en físico como en medio magnético.

5. Con respecto a los materiales que se van a utilizar en la actividad para el mejoramiento de la subrasante, cabe resaltar que el geotextil se encuentra en la bodega, la piedra rajon y la subbase clase c están a disposición de nosotros en la cantera, ya que se realizó una compra de aproximadamente para el 50% del proyecto. La idea principal es instalar el material de estabilización directamente a la excavación y no generar sobre sobre costos en acarreos de un lugar a otro.

6. Las actividades de excavación mecánica y demolición se han suspendido, atendiendo las sugerencias dadas por la interventoría y no se dará reinicio hasta que contemos con la maquinaria necesaria para realizar las actividades de corte y relleno al mismo tiempo.

7. Teniendo en cuenta las observaciones dada por de la interventoría; Se le dará el debido cumplimiento al cerramiento provisional de la obra a como se indique en la propuesta económica presentada por el contratista.

8. Asumiendo la sugerencia dada por de la interventoría; Se le dará el debido cumplimiento al PGIO y al PAPSO que corresponden a la obra, a como se indicó en la propuesta económica presentada por el contratista.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras.
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Respuestas a los comunicados ESASIM-021-2022 y ESASIM-021-2022

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 29 de agosto de 2022, 17:52
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 023. Respuestas.pdf
135K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 026

Montería - Córdoba. 31/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de las afiliaciones del operador del vibrocompactador y retrocargador.

Mediante el presente se hace la entrega de las afiliaciones del operador del vibrocompactador y retrocargador, a utilizar en la intervención del proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

233

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de afiliaciones y documentación de maquinaria

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 31 de agosto de 2022, 15:21
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

3 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 026. Afiliaciones.pdf** 243K
- **operador vibrocompactador.pdf** 2873K
- **documentos retrocargador.pdf** 4450K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 027

Montería - Córdoba. 31/08/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de certificación del botadero de materiales, creación de veeduría y actas de vecindad.

Mediante el presente se hace la entrega de certificación del botadero de materiales, creación de veeduría y actas de vecindad del proyecto antes mencionado en referencia. Que corresponde a la calle 2 entre las carreras 8E y 8F y la carrera 8E entre las calles 2 y 9 del barrio Alfonso López.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Entrega de certificación del botadero de materiales, creación de veeduría y actas de vecindad.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 31 de agosto de 2022, 15:31
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com

4 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 027. Botadero, Veeduria.pdf** 243K
- **Certificado de botadero..pdf** 292K
- **Acta de Veeduria...pdf** 422K
- **Actas de Vecindad.pdf** 11171K
