Usuario Pago:
BECHAVAR
4069

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04759

Fecha de Pago: 16-09-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GIL CARDONA MARIO DE JESUS ,Id: 8291216

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLIN, EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA. CODIGO BPIM:2021050790059

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA Nº FE00-950 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 56,802,058.00 **Vlr Deducc.:** 10,906,949.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 45,895,109.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
45	INSTITUTO PARA DLO ANTIC	39-10011735	TRANSFERENCIA	GIL CARDONA MARIO DE JESUS ,Id: 8	$45,895,109.00
				Total:	**$45,895,109.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$47,732,822	$1,193,321	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$47,732,822	$954,656
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$47,732,822	$477,328	06.RETEF/TE HONORARIO P.NATUR. (10.0	10	$47,732,822	$4,773,282
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$47,732,822	$238,664	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$9,089,236	$1,360,385
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$47,732,822	$1,909,313				

TOTAL Deducibles: **$10,906,949.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

255-2022
PG:1
SIA
SECOP

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

Usuario Ordenó
BECHAVAR

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4069

Fecha/Estado
16/08/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 11 : 11.EGR.CONTRATACION PROYECTOS INVERSIÓN

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.261

PAGADO A: GIL CARDONA MARIO DE JESUS ,Id: 8291216

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLIN, EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA. CODIGO BPIM:2021050790059

Doc. Ref. : FACTURA Nº FE00-950 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 56,802,058.00 **Vlr Deducc.:** 10,906,949.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **45,895,109.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20211527	021486	1.2.3.3.04.7	360.4	2.3.2.01.01.001.03.02.03.13	INTERVENTORIA - CONSTRUCCION DE VÍAS	$56,802,058.00

TOTAL: **$56,802,058.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$47,732,822	$1,193,321	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2 0%)	2	$47,732,822	$954,656
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$47,732,822	$477,328	06.RETEF/TE HONORARIO P.NATUR. (10.0	10	$47,732,822	$4,773,282
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0,5%	0.5	$47,732,822	$238,664	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$9,069,236	$1,360,385
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$47,732,822	$1,909,313				

TOTAL Deducibles: **$10,906,949.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

REVISADO 16 AGO 2022

VIGENTE

DCARDONA

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : -20214861

Fecha de Impresión: 03-Feb-2022 **Fecha del Compromiso:** 01/01/2022 01:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
C0.261	8291216	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	230,421,794.00

Tipo Compromiso: 81.VIGENCIA FUTURA. CONTRATO OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLIN, EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA. CODIGO BPIM:2021050780059

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	01/01/2022 01:00:00	230,421,794.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	FON.	Código	Descripción	Vlr Reservado
-20211527	13 1	360.4.2.3.2.01.01.001.03.0	INTERVENTORIA - CONSTRUCCION DE VÍAS	230,421,794.00

Total: **230,421,794.00**

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARLENY DEL SOCORRO SOSSA RESTREPO
SUBSECRETARIA TESORERIA Y RENTAS

***

***

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1527

Fecha de Impresión: 26-Oct-2021
Fecha de la Reserva: 26-Oct-2021 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2021

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Articulos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Articulos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2021 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.3.2.01.01.001.03.05.01.13	13	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR-PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLÍN	$230,421,794.00
		Total:	**$230,421,794.00**

Que se Reserva la suma de : Doscientos Treinta Millones Cuatrocientos Veinte y Un Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos.. ($230,421,794.00)

Descripción:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLIN, EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA. CODIGO BPIM:2021050790059

Información Complementaria:

MGA - Productos
2402041- Vía terciana mejorada
BPIM
2021050790059- Construcción de puente vehicular y peatonal sobre el rio medellin del municipio de Barbosa antioquia
CPC - Bienes y servicios
53221- Puentes y carreteras elevadas

DIANA PATRICIA CARDONA ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
ALCALDE

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

viernes, 16 de septiembre de 2022

Solicitud	85159

Cliente:	MUNICIPIO DE BARBOSA	NIT:	8909804457
Tipo Retiro:	ARCHIVO PLANO	Valor:	**$56.802.058**
Responsable:	MARLENY DEL SOCORRO SOSA RESTREPO	Documento:	39206433

Plano	8909804457202291610528.txt	Nro Registros:	7

Identificación	Nombre	Valor	Nro. Cta	Banco	Referencia
8291216	MARIO DE JESUS GIL CAR	$45.895.109	420052805	23	CONV756 2021ACTA1OP4069
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$238.664	344001789	1	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$477.328	65147220388	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$6.133.667	65154211611	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$954.656	65157742773	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$1.909.313	65171495754	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$1.193.321	65100000911	7	
7		**$56.802.058**			

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social ¡Es la gente!

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUB SECRETARÍA DE CONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA: PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA, RURAL, METROPOLITANA Y REGIONAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA

NOMBRE: MARIO DE JESUS GIL CARDONA

NUMERO DE CONTRATO: 0255 de 2022

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 230.421.794,00)

DIA: 03 **MES:** Febrero **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance del contrato, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor de contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

PLAZO: Ocho (08) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

REPORTE DE ACTIVIDADES

La interventoría de obra se encargó de la supervisión técnica y administrativa de las actividades desarrolladas por el contratista de obra, así:

- Se realizaron actividades de excavaciones varias en material común en seco para pilas, red de alcantarillado y pozos de inspección, adicionalmente se excavo hasta el nivel de subrasante para el estribo.
- Se realizaron los rellenos para estructuras con suelos del proyecto para la red de alcantarillado provisional.
- Se realizaron rellenos para estructuras en arenilla para construcción de red de alcantarillado
- Se realizaron concretos solados para para red provisional de alcantarillado y canal abierto
- Se realizaron actividades de figuración, armado e instalado de acero de refuerzo f´y= 420 Mpa para pilas y estribos 1 y 2.
- Se realizaron actividades de figuración, armado e instalado de acero de refuerzo f´y= 420 Mpa para pilas y estribos 1 y 4.
- Se realizó el transporte de material común proveniente de las excavaciones en las zonas anteriormente descritas
- Se realizó transporte de material granular desde la fuente hasta la obra.
- Se realizó la instalación de pasacalles, valla informativa y demás elementos.
- Se realizó la instalación de barreras plásticas tipo maletín.

PERIODO INFORMADO Y COBRADO: DESDE EL 02 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022.

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social
¡Es la gente!

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades. Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

PARÁGRAFO: se autoriza el pago por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 56.802.058,00)** Soportado en la factura FE00-950 anexa a este documento, el cual afectara el compromiso presupuestal N.° 1057.

Para constancia se firma en Barbosa a los 29 días del mes de julio del año 2022.

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante legal del Contratista de Interventoría.

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

CARLOS ARTURO HERRERA MOSQUERA
Apoyo a la supervisión.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 255 del 03 de febrero de 2022, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474/ de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	02	05	2022	AL	30	06	2022
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	24.63%			**0%**			

1. **Datos del interventor**

INTERVENTORIA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROBINSON JAIR RAMÍREZ FORERO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO
RESIDENTE SST	JOSÉ LUIS BOTERO BETANCUR
RESIDENTE AMBIENTAL	ALEJANDRO GIL POSADA
RESIDENTE SOCIAL	SANDRA LILIANA CHAVARRÍA ZAPATA
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	WILMAR ANDREY BUITRAGO

Datos del contratista de obra

REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALONSO QUESADA OREJANERA
DIRECTOR DE OBRA	LUDWING QUINTERO BLANCO
RESIDENTE DE OBRA	ARNOLDO TOSCANO DI FILIPPO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JUAN CAMILO GARZON CRUZ
RESIDENTE SST	FREDY MOSQUERA IBARGUEN
RESIDENTE AMBIENTAL	LEIDY JOHANA NIEVES CASTRO
RESIDENTE SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ
ESPECIALISTA GEOTECNIA	ALVARO DIEGO RENGIFO TAMAYO

2. **Datos del contrato**

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	255	25/01/2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	1527	26/10/2021
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	20203916	24/03/2021

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

NÚMERO POLIZA Y FECHA	65-44-101209462 65-40-101063604	09/05/2022 09/05/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	10/02/2022	
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
NIT	8.291.216	
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.	
VALOR	$230.421.794 M/L	
PLAZO	8 MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	02/05/2022	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	02/01/2023	
ADICIÓN	N/A	
PRORROGA	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO BAJO INTERVENTORIA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN, EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.		

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Objeto del contrato: Interventoría técnica, administrativa ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción del puente vehicular y peatonal sobre el río Medellín, en el sector de la estación del municipio de Barbosa, Antioquia.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Alcance del objeto:

Tanto el objeto como el alcance del mismo se vienen cumpliendo satisfactoriamente por parte del contratista.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas que requiere el proyecto en cada una de las actividades, como lo es; la calidad de los materiales utilizados en obra, la implementación de topografía, el cumplimiento con las dimensiones requeridas de los elementos, y la realización de los ensayos pertinentes a los materiales.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: el contratista ha desarrollado las actividades técnicas cumpliendo con sus obligaciones.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: el contratista ha hecho entrega de todos los documentos exigidos.

- Porcentaje de ejecución física del contrato bajo seguimiento de interventoría: actualmente el porcentaje de ejecución física del contrato de obra corresponde al 15% del total del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	56259114	$ 3.125.000	N/A	$ 609.000	$ 3.884.000
Junio	56936793	$ 3.125.000	N/A	$ 609.000	$ 3.884.000

- Modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: (N/A)

- cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales: (N/A)

- Materialización de riesgos y su mitigación. No se presentaron eventualidades y por lo tanto no se hizo uso de la matriz de riesgos y su mitigación.

- observaciones adicionales frente al desempeño del contratista. (N/A)

- Si el contrato ha sido auditado por parte de los entes de control. (N/A)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
13	310.1.2.3.2.01.01.001.03.05.01.13	20211057	20214861	$ 230.421.794
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- cambios o reservas presupuestales al presente contrato. (N/A)

- Relación de los pagos realizados.

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COMPROMISO PRESUPUESTAL (ADICIÓN)	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se autoriza realizar el primer pago correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022, por valor de: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 56.802.058,00)**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 230.421.794,00
Adición	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 230.421.794,00
Pagos Realizados (Acumulado)	N/A
Pago autorizado del mes de mayo y junio.	$ 56.802.058
Porcentaje de ejecución financiera	0.0 %

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Si el contrato cuenta con anticipos o es un contrato interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso)
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado del mes	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

- Multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. N/A
- Estado de las garantías del contrato

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

1. **DE CUMPLIMIENTO:**

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
ACTO:	PAGO PARCIAL			
RIESGOS AMPARADOS:	**AMPARO**		**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADORA**
Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N° 65-44-101209462 ANEXO 0	Cumplimiento del Contrato		03/02/2022 hasta 28/02/2023	$ 46.084.358,80
	Pago de Salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		03/02/2022 hasta 31/10/2025	$ 23.042.179,40
	Calidad del servicio		31/10/2022 hasta 31/10/2027	$ 34.563.269,10
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA –ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A			

2. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

CONTRATO:	CONTRATO N° 000255 DE 2022		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
ACTO:	ACTA DE INICIO		
RIESGOS AMPARADOS:	**AMPARO**	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADORA**
Póliza de garantía responsabilidad civil extracontractual N° 65-40-101053604 ANEXO 0	Predios, labores y operaciones.	03/02/2022 hasta 31/10/2022	$ 200.000.000,00
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA –ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A		

Barbosa Social
¡Es la gente!

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 255 DEL 2022

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 56.802 058,00)**

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-07-2022

Atentamente,

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante legal de Contratista de Interventoría.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

MARIO GIL CARDONA
INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL 2525 ANT

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ea6244fb7efda8264017bc25ecff3ef11cda0583750e0951c8810fece2fdf75a0cb075935c74380a7975d624d227ee6

Número de Factura: FE00-950
Fecha de Emisión: 22/07/2022
Fecha de Vencimiento: 21/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 22/07/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nombre Comercial: GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nit del Emisor: 8291216
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellin
Dirección: CR 51 51 17 OF 700
Teléfono / Móvil: 6045117432
Correo: mariogilconsultorias@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE BARBOSA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CALLE 15 NO. 14-82
Teléfono / Móvil: 4548300
Correo: carolina.sossa@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	01	INTERVENTORIAS	RH	1,00	$ 47.732.821,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.069.236,15	19.00			$ 47.732.821,85

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA DE PAGO NO. 1 DEL CONTRATO No 000255, PARA LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO

Favor Consignar en la cuenta corriente 420 052 805 del Banco de occidente a nombre de Mario De Jesús Gil Cardona

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-07-22 07:40:15
Documento generado el: 2022-07-22 07:40:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		47.732.821,85
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		47.732.821,85
IVA		9.069.236,15
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.069.236,15
Total neto factura (=)		56.802.058,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 56.802.058,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	2.863.969,31
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026486211 Rango desde: 926 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2022-09-10

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

RESOLUCION DE FACTURACION

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 – 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764017863894

(415)7707212489984(8020) 001876401786389 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 9 1 2 1 6	0	GIL	CARDONA	MARIO	DE JESUS

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CR 51 51 17

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación; se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-09-10 / 08:41:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: GIL CARDONA MARIO DE JESUS
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 8291216 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación
1006. Organización: GIL CARDONA MARIO DE JESUS

997. Fecha formalización: 2021-09-10/08:41:28

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS EFICIENTE

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 187640017863894

(415)7707212439984(8020) 00187640017863894

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
829215	0	GIL	CARDONA	MARIO	DE JESUS

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	28. Establecimiento: GIL CARDONA MARIO DE JESUS CR 51 51 17									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	4	FE00		867		1,200	6	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento:									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número		33. Hasta el número		38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14796388305

(415)7707212489984(8020) 000001479638830 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 1 2 1 6	0	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 2 9 1 2 1 6	1 9 7 0 0 1 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GIL	CARDONA	MARIO	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 51 51 17 OF 700

42. Correo electrónico: mariogilconsultorias@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 1 7 9 9 7	3 1 1 3 9 0 0 9 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 7 0 1 0 3	4 2 2 0	2 0 0 7 0 1 0 3	4 2 9 0	0 0 2 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 11 - 09 / 11 : 42: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GIL CARDONA MARIO DE JESUS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO ELECTRÓNICO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14796388305

(415)7707212489984(8020) 000001479638830 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 1 2 1 6	0	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14796388305

(415)7707212439984(8020)000001479638830 5

5. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.): 8 2 9 1 3 [illegible] 6 | 6. DV: [illegible] | 12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín | 14. Suizón electrónico: 1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía - 3 | 149. Número de identificación: 2 4 4 1 5 4 3 2 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional: 1 4 2 5 2 4 7

152. Primer apellido: ALZATE | 153. Segundo apellido: MOLINA | 154. Primer nombre: BEATRIZ | 155. Otros nombres: EUGENIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 9 0 6 1 1

COPIA DOCUMENTO SIN VALIDEZ

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

OTROS GASTOS

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 - 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

COSTO OFICINA

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 - 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

tic

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Descripción	Valor	Fecha y hora de pago	Número de transacción
**********RIOR 10	$ 152,771	20/May/2022 - 01:46 PM	375710411-43

Estado de la transacción:
Codigo 1 Tu banco aprobó tu transaccion

DETALLES DEL PAGO

Entidad financiera	Dirección IP	Referencia
BANCO DE OCCIDENTE	190.249.249.22	375710411-43
Cus	**Empresa**	**Nit**
14040710	Colombia Movil S.A.E.S.P.	830114830

tic

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Dirección	Valor	Fecha y hora de pago	Número de transacción
*********58335300	$ 156,959	10/Jun/2022 - 02:57 PM	378225017-78

Estado de la transacción

Código 1 Tu banco aprobó tu transacción

DETALLES DEL PAGO

Entidad financiera	Dirección IP	Referencia
BANCO DE OCCIDENTE	190.28.71.191	378225017-78
Cus	**Empresa**	**NIT**
145673940	Colombia Móvil S.A. E.S.P.	830114079

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

PAPELERIA

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 – 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

CUENTA DE COBRO

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
CC. 8.291.216

DEBE A:

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789

LA SUMA DE:

Ochenta Mil Pesos m/l ($80.000)

POR CONCEPTO DE:

Servicio de Fotocopias, escaneo hojas, edición informes, registros fotográficos entre otros, durante el período entre el 2 de mayo y el 31 de mayo de 2022 para el contrato 000255 de 2022 para la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción del Puente Vehicular y Peatonal sobre el Río Medellín en el sector de La Estación del Municipio de Barbosa – Antioquia.

Medellín, Mayo 31 de 2022

Nidia Arboleda A

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789
Tel: 3147837046

Favor expedir cheque a mi nombre.

CUENTA DE COBRO

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
CC. 8.291.216

DEBE A:

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789

LA SUMA DE:

Ochenta Mil Pesos m/l ($80.000)

POR CONCEPTO DE:

Servicio de Fotocopias, escaneo hojas, edición informes, registros fotográficos entre otros, durante el período entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2022 para el contrato 000255 de 2022 para la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción del Puente Vehicular y Peatonal sobre el Río Medellín en el sector de La Estación del Municipio de Barbosa – Antioquia.

Medellín, Junio 30 de 2022

Nidia Arboleda A

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789
Tel: 3147837046

Favor expedir cheque a mi nombre.

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 | 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14303756633

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4328278 9 - 8

6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzon electronico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación: 43282789

27. Fecha expedición: 1987/10/30

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA | 29. Departamento: 16 Antioquia | 30. Ciudad/Municipio: 05 Andes | 034

31. Primer apellido: ARBOLEDA

32. Segundo apellido: ACEVEDO

33. Primer nombre: NIDIA

34. Otros nombres: DEL SOCORRO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 16 Antioquia

40. Ciudad/Municipio: 05 Andes | 034

41. Dirección principal: CL 54 52 A 11

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 8416463

45. Teléfono 2: 3113858017

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 0090 | 47. Fecha inicio actividad: 2013/07/02

Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades: 50. Código | 1 | 2

Ocupación: 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20. Obligación NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:

55. Forma | 56. Tipo

Exportadores

Sector: 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CIIU

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2014/07/29

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe, en consecuencia corresponde exclusivamente a la realidad por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma no obligatoria

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: VASQUEZ TORO CESAR AUGUSTO

985. Cargo: Analista V

Fecha generación documento PDF 29 07 2014 02:38:29Pm

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

CAMPAMENTO U OFICINA

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 - 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

INMOBILIARIA Alianza-N

MATRICULA: 007
NIT: 39.207.677- 8

Barbosa 23 junio 2022

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Nit. 8291216-0

DEBE A:

MARIA NORA AGUDELO CEBALLOS
CC 39.207.677 Barbosa (Antioquia)

LA SUMA DE:
Seiscientos mil pesos **($600.000)**

Por concepto de:

Canon arrendamiento vivienda urbana ubicada en la dirección calle 12 N.° 22-31 apto 202 Barbosa, Antioquia

Atentamente,

Ma Nora Agudelo C

MARIA NORA AGUDELO CEBALLOS
Representante legal
INMOBILIARIA ALIANZA-N
Correo electrónico: inmobiliariaalianzan@gmail.com

Teléfono: 4065305 Celular: 3215864162

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14391282247

(415)7707212489984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 2 0 7 6 7 7	8	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 2 0 7 6 7 7	1 9 8 5 1 1 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUDELO	CEBALLOS	MARIA	NORA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
INMOBILIARIA ALIANZA - N	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

41. Dirección principal: CR 15 10 40 LC 204

42. Correo electrónico: inmobiliariaalianzan@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 0 6 5 3 0 5	3 2 1 5 8 6 4 1 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 8 1 0	2 0 1 6 0 7 2 1	6 8 2 0	2 0 1 6 0 7 2 1	8 2 9 9	8 2 1 9	1 3 1 7	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO CEBALLOS MARIA NORA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-05-2022 10:10:21AM

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1469282247

(415)7707212459984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 9 2 0 7 6 7 7 | 8

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Nacional

13.

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

52. Naturaleza
55. Fondos
58. Sin personería jurídica
62. Formas asociativas
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas
64. Entidades de régimen especial de derecho público de orden nacional, departamental, municipal, distrital o asociativas especiales
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Sucursales

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 6 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 9 8 6 2 2 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	

Vigencia

80. Desde
81. Hasta

Composición del Capital

82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado %
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

89. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	90. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica
94. Nombre de grupo económico y/o empresa
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior
171. País
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EF
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural de exterior con EF

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14691282247

(415)7707212489984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 2 0 7 6 7 7	8	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 8 1 0

162. Nombre del establecimiento
INMOBILIARIA ALIANZA - N

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

165. Dirección
CR 15 10 40 LC 204

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 6 1 5 9 8 3	2 0 1 6 0 7 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 0 6 5 3 0 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

INMOBILIARIA Alianza N

MATRICULA: 007
NIT 39.207.677- 8

Barbosa 8 de julio de 2022

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Nit. 8291216-0

DEBE A:

MARIA NORA AGUDELO CEBALLOS
CC 39.207.677 Barbosa (Antioquia)

LA SUMA DE:
Seiscientos mil pesos (**$600.000**)

Por concepto de:

Canon arrendamiento vivienda urbana ubicada en la dirección calle 12 N.° 22-31 apto 202 Barbosa, Antioquia

Atentamente,

Ma Nora Agudelo C

MARIA NORA AGUDELO CEBALLOS
Representante legal
INMOBILIARIA ALIANZA-N
Correo electrónico: inmobiliariaaliazan@gmail.com

Teléfono: 4065305 Celular: 3215864162

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario 14691282247

(415)7707212489984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 2 0 7 6 7 7	8	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 2 0 7 6 7 7	1 9 8 5 1 1 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUDELO	CEBALLOS	MARIA	NORA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
INMOBILIARIA ALIANZA - N	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

41. Dirección principal: CR 15 10 40 LC 204

42. Correo electrónico: inmobiliariaalianzan@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 0 6 5 3 0 5	3 2 1 5 8 6 4 1 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 8 1 0	2 0 1 6 0 7 2 1	6 8 2 0	2 0 1 6 0 7 2 1	8 2 9 9	8 2 1 9	1 3 1 7	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Código 4 9 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO CEBALLOS MARIA NORA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-05-2022 10:10:21AM

COPIA NO VALIDA
EJEMPLAR
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14691282247

(415)7707212489984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 2 0 7 6 7 7	8	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 6 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 1 3 9 8 6 2 2 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 1 2 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN VALOR DOCUMENTO INFORMATIVO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14691282247

(415)7707212499984(8020) 000001469128224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 9 2 0 7 6 7 7 | 8

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o regionales adicionales

1

150. Tipo de establecimiento: Otro tipo de establecimiento 9 9

151. Actividad económica: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 8 1 0

152. Nombre del establecimiento: INMOBILIARIA ALIANZA - N

153. Departamento: Antioquia 0 5

154. Ciudad/Municipio: Barbosa 0 7 9

155. Dirección: CR 15 10 40 LC 204

156. Número de matrícula mercantil: 2 1 3 1 5 9 3

157. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 7 2 1

158. Teléfono: 4 0 6 5 3 0 5

159. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

DOCUMENTO CON FINES INFORMATIVOS

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

COSTOS DE LEGALIZACION

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 – 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

POLIZAS

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 – 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7709998021167003773402

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000037734021

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
27/04/2022 01:55p.m.

RECIBIMOS DE: GIL CARDONA MARIO DE JESUS — CC. 8.291.216

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos .....

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101209462

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
MEDELLIN-44-101209462-2-1	$790,965.00		$150,284.00	$941,249.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 941,249.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 941,249.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003773402

TOTAL: $941,249.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/24/2022 4:52:00PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670037734O2

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000037734021

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
27/04/2022 01:55p.m.				
RECIBIMOS DE: GIL CARDONA MARIO DE JESUS			CC. 8.291.216	
LA SUMA DE: Quinientos treinta y un mil setecientos treinta y cuatro pesos .**********				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101063604				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	**PRIMA**	**GASTO**	**IVA**	**VALOR**
MEDELLIN-40-101063604-2-1	$446,835.00		$84,899.00	$531,734.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 531,734.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 531,734.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003773402

TOTAL: $531,734.00


CAJERO: PAGUESTADO

6/24/2022 4:55:47PM

172.16.10.23

INFORME MENSUAL No. 01 – CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

MES DE MAYO DEL 2022

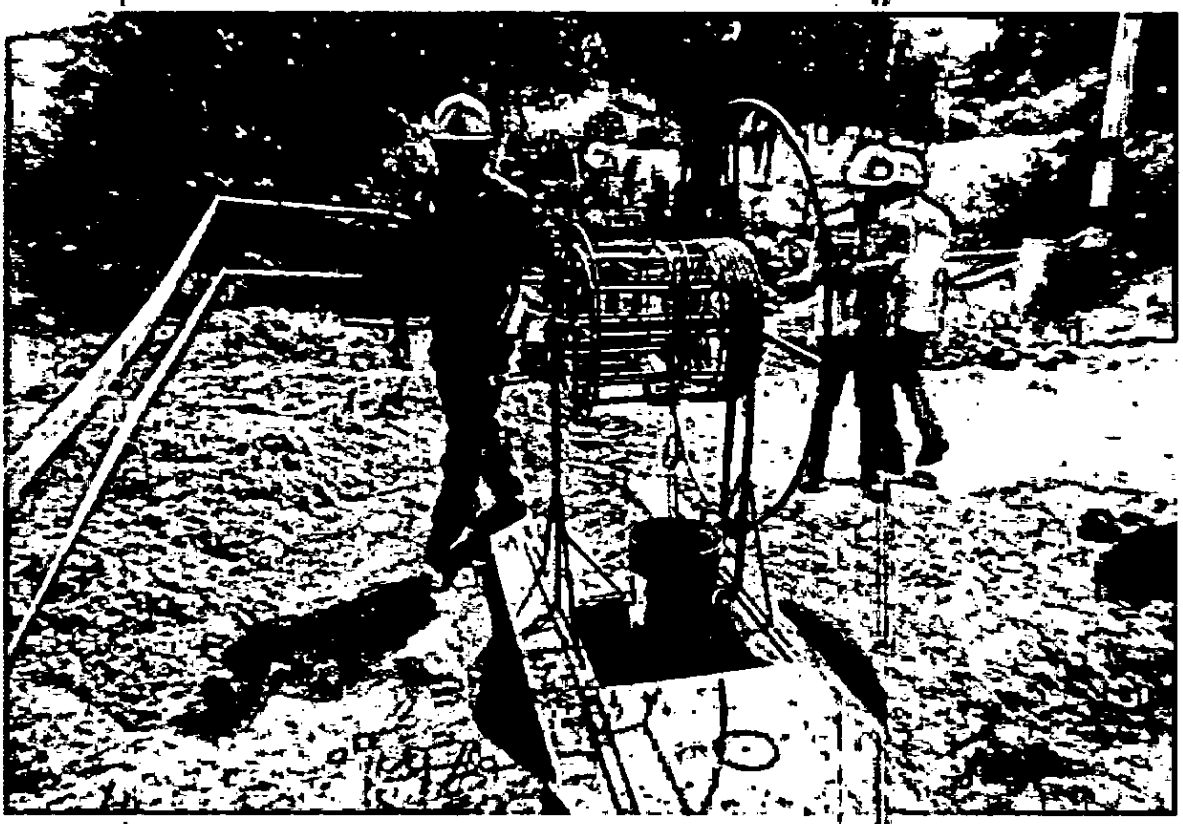

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO.

BARBOSA (ANTIOQUIA)

2022


1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se muestran los avances del contrato de interventoría No. 255 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.", como también los aspectos generales en cuanto al desarrollo de la obra y su respectivo seguimiento, asimismo las labores concernientes a estas y el estado actual de las mismas, siempre teniendo en cuenta las condiciones de calidad, eficiencia y eficacia para un buen desarrollo del proyecto y procurando garantizar las condiciones de seguridad de la misma. Para el periodo comprendido del 02 al 31 de mayo de 2022.


1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A través del contrato de interventoría No. 255 del 3 de febrero de 2022, se realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico, social y en seguridad y salud en el trabajo, del puente vehicular y peatonal ubicado en la calle 13, sector La Estación en el Municipio de Barbosa. Este puente cuenta con las siguientes características:

Puente vehicular y peatonal con una luz total de 70 m aproximadamente con una luz central en vigas postensadas de 40 m y una altura de 2,25 m y dos luces de 15 m en vigas reforzadas con una altura de 0,8 m. con una separación entre ellas de 4,30 m. Se tendrá un ancho del tablero de 8,80 m y un espesor de 0,22 m, se contará con dos carriles de 3,65 m, un andén de 1.50 m en un costado y baranda vehicular metálica en ambos costados. Estará cimentado en dos pilas por apoyo de diámetro de 1.30 m y profundidad de 12 m para el caso de las pilas de los apoyos externos (luz de 15 m) y de 18 m y 24 m para los apoyos centrales (luz de 40 m). Contará con las respectivas aproximaciones en muro en tierra armada, costado derecho del puente en una longitud de 24.5 m y en el margen izquierdo del río en una longitud de 42 m.

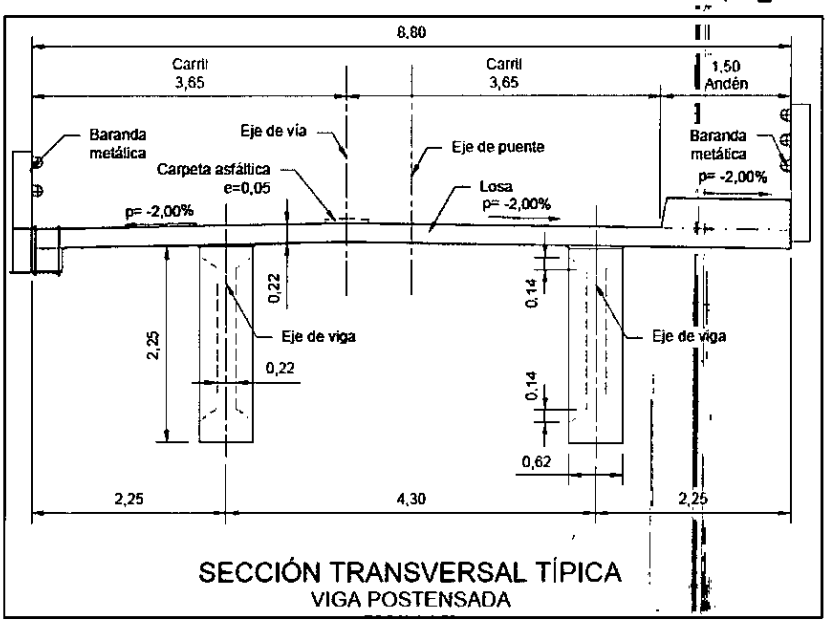

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA
VIGA POSTENSADA

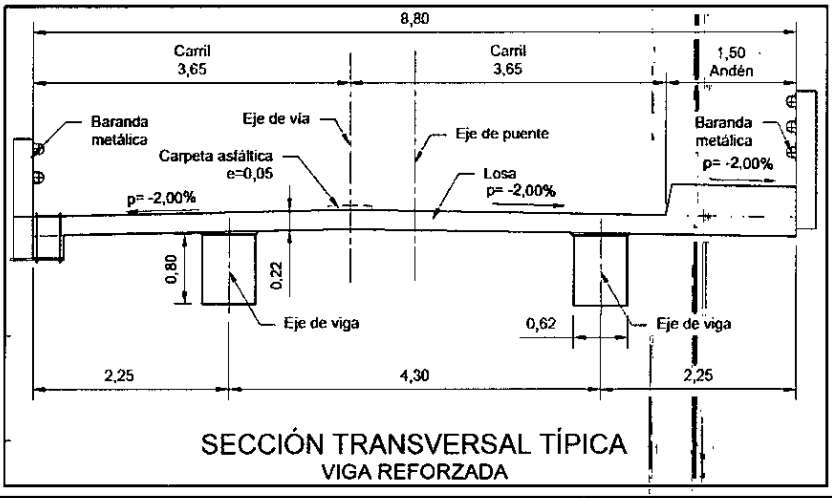

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA
VIGA REFORZADA

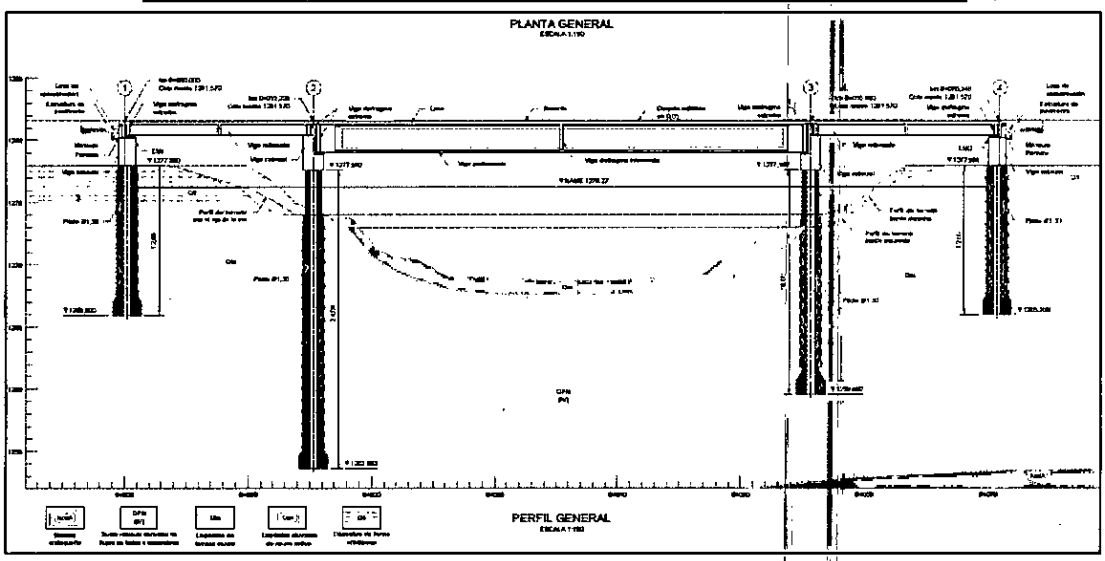
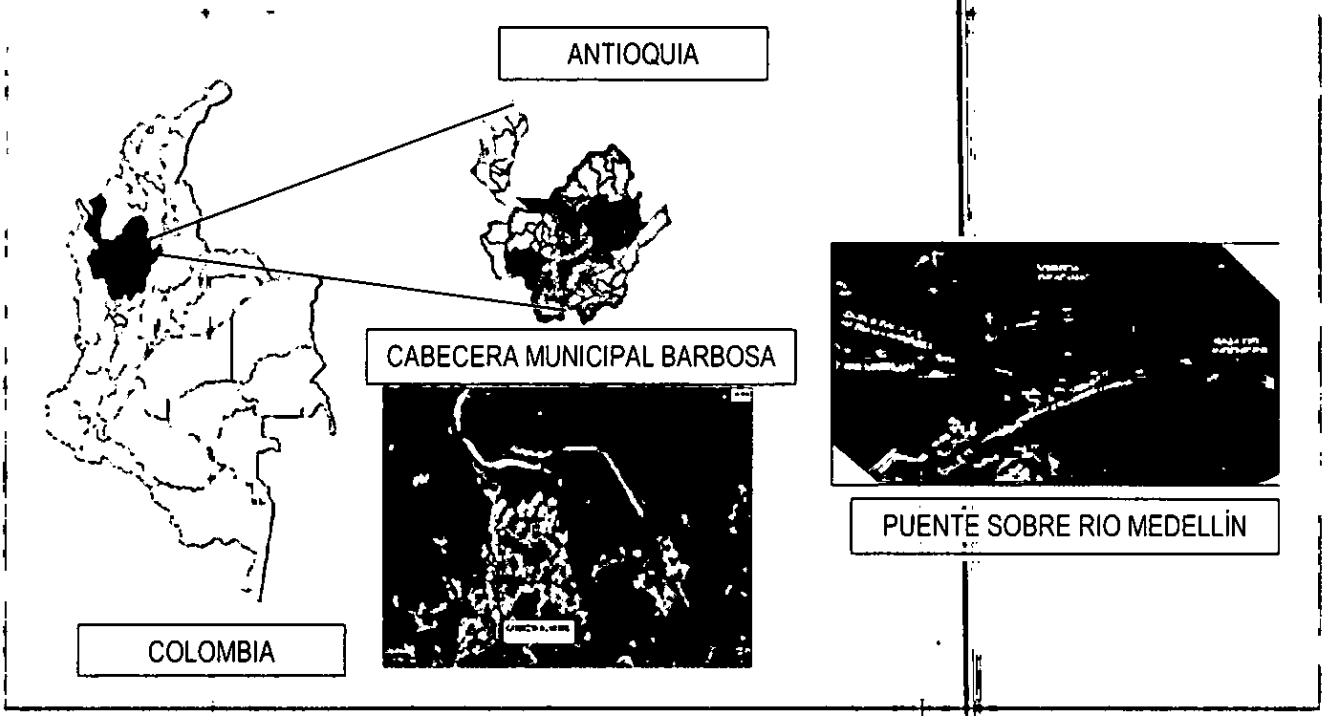


Ilustración 1. Secciones típicas del puente y perfil general – Tomado del diseño estructural

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la calle 13 del municipio de Barbosa ubicado al norte del Valle de Aburrá, por un costado del puente (margen derecha del río Medellín) se encuentra la zona urbana en el barrio Cecilia Caballero y conectará con zona rural del municipio por el otro costado del puente (margen izquierda del río Medellín) hacia el sector La Estación.

Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto



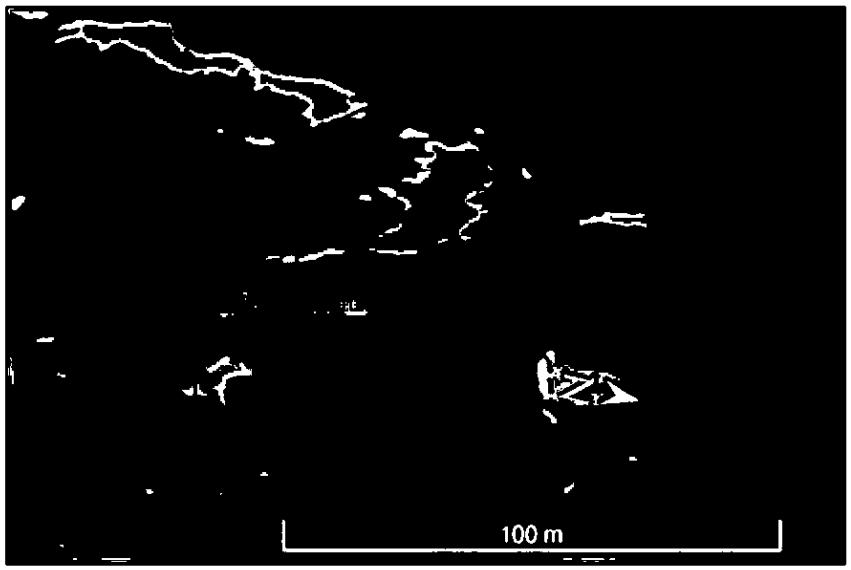


Ilustración 2. Ubicación del proyecto – Tomado de Estudios técnicos del proyecto.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DE CONTRATO:	154 del 25 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.
Valor inicial del contrato:	$ 230.421.794,00
Valor de las adiciones:	$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 230.421.794,00
Valor del anticipo (0%)	$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 00,00 (Cero pesos)

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	000154
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE INTECO
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A


	TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.
Valor inicial del contrato:	$ 3.045.044.954,00
Valor de las adiciones:	$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.045.044.954,00
Valor del anticipo (0%)	$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	**$ 00,00 (Cero pesos)**

2.3 RESUMEN INVERSIONES

Inversión programada con corte al 29 de mayo de 2022:
($ 49.776.312 – 01.63%).

Inversión ejecutada con corte al 29 de mayo de 2022:
($ 59.386.612 – 01.95%).

Retraso o adelanto en días: 0.32% de adelanto financiero.

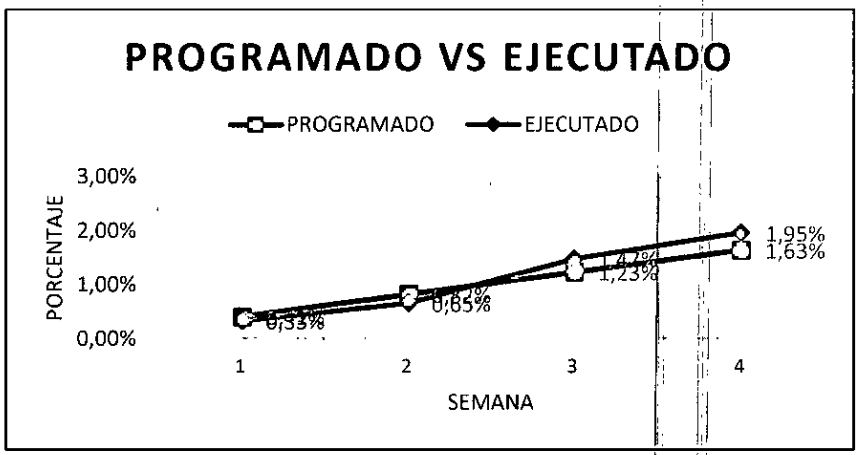

Con el flujo de caja presentado por el contratista de obra, se calculó la inversión en las primeras 4 semanas del contrato. Según lo evidenciado anteriormente, se presenta un avance financiero en el contrato, sin embargo este aún no es representativo frente a la ejecución total de contrato.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	INTERVENTORÍA	
No. del contrato	255 del 03 de febrero de 2022	
Contratista:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Cedula / NIT	8.291.216	
Representante Legal:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Identificación:	8.291.216	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y, DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	Jueves, 03 de febrero de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	8 Meses	
Valor Inicial:	$230.421.794,00	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de Inicio:	Lunes, 02 de mayo de 2022	
Fecha de Terminación:	Lunes, 02 de enero de 2023	
CONDICIONES FINALES		
Total Suspensiones (Dias):	N.A.	
Total Prorrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo Final (meses):	N.A.	8 Meses
Valor Final:	$230.421.794,00	
Fecha de Terminación Final:	Lunes, 02 de enero de 2023	

MODIFICACIÓN No. 1	
Número de Contrato Adicional:	N.A.
Fecha:	
Plazo Adicional (Meses):	
Valor Adicional:	
Valor Final del Contrato:	
Fecha de Terminación:	

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

PRÓRROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	N.A.
Plazo Adicional (Meses):	
Motivo:	

3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Control de Pólizas

TOMADOR: GIL CARDONA, MARIO DE JESUS
Identificación: 8.291.216
Dirección: CR 51 NRO. 51-17 OF 700
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5117997
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA V.A
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		9 de mayo de 2022
No. de póliza:	65-44-101209462		**Anexo:** 0
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	$ 46.084.358,80	2-may.-22	27-may.-23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 23.042.179,40	2-may.-22	27-ene-26
Calidad del servicio	$ 34.563.269,10	27-ene-23	28-ene-28

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		9 de mayo de 2022	
No. de póliza:	65-40-101063604		Anexo:	0
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	$ 200.000.000,00	2-may.-22	27-ene-23	
Contratistas y Subcontratistas	$ 60.000.000,00	2-may.-22	27-ene-23	
Vehículos propios y no propios	$ 60.000.000,00	2-may.-22	27-ene-23	

3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 2. Balance del contrato de interventoría

ACTA DE INTERVENTORIA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
01[1]	31/05/2022	$24.085.299	$24.085.299	$206.366.495

Figura 2. Resumen de facturación

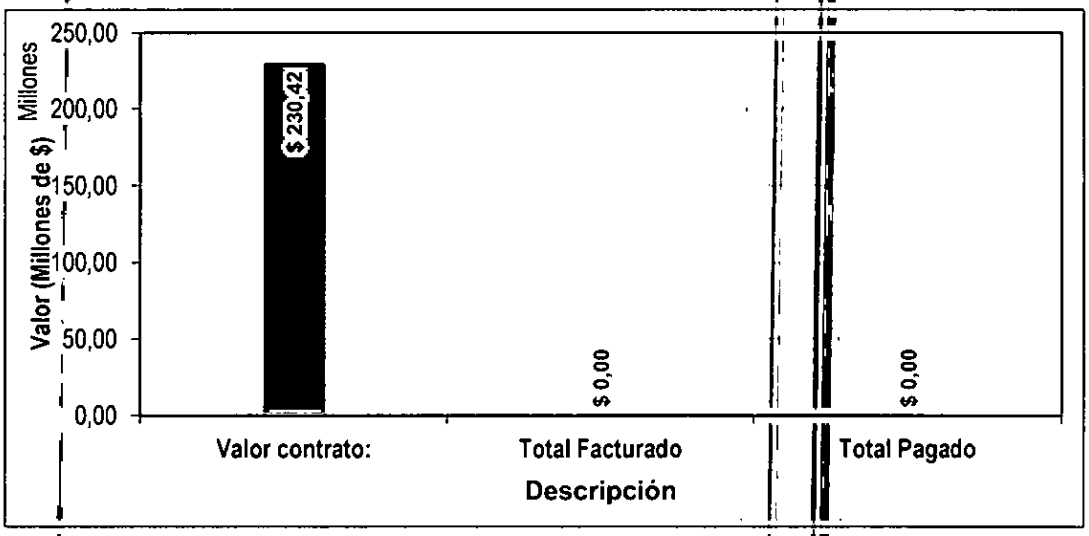


Tabla 3. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del Anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de Anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 230.421.794,00
Valor de las Adiciones:	$00,00
Valor Final del Contrato:	**$ 230.421.794,00**
Total Facturado	$ 00,00
Índice de Facturación	
Total Pagado	$ 00,00

[1] Acta en trámite, aun no se ha conciliado ni suscrito.

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Índice de Pagos	0,0
Saldo por pagar a la fecha	$ 230.421.794,00

3.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Presupuesto inicial

Valor inicial del contrato	$ 230.421.794,00
Adiciones:	$ 00,00
Valor facturado:	$ 00,00
Saldo del contrato	$ 230.421.794,00

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	OBRA	
No. del contrato	154 del 25 de enero de 2022	
Contratista:	CONSORCIO PUENTE INTECO	
Cedula / NIT	901.555.010-4	
Representante Legal:	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	
Identificación:	91.293.585	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	Martes, 25 de enero de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	7 Meses	
Valor Inicial:	$3.045.044.954,00	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de Inicio:	Lunes, 02 de mayo de 2022	
Fecha de Terminación:	Viernes, 02 de diciembre de 2022	

CONDICIONES FINALES		
Total Suspensiones (Días):	N.A.	
Total Prorrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo Final (meses):	N.A.	8 Meses
Valor Final:	$3.045.044.954,00	
Fecha de Terminación Final:	Viernes 02 de diciembre de 2022	

MODIFICACIÓN No. 1	
Número de Contrato Adicional:	N.A.
Fecha:	
Plazo Adicional (Meses):	
Valor Adicional:	
Valor Final del Contrato:	
Fecha de Terminación:	

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

PRORROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	N.A.
Plazo Adicional (Meses):	
Motivo:	

4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tabla 2. Control de Pólizas

TOMADOR: CONSORCIO PUENTE INTECO
Identificación: 9001555010-4
Dirección: Carrera 48 No. 25 AA SUR 70 INT 209
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5062413
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA V.A
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	7 de junio de 2022

No. de póliza:	65-44-101209479		Anexo:	4
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	$ 609.008.990,80	2-may.-22	2-dic.-22	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 609.008.990,80	2-may.-22	2-dic.-22	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 913.513.486,20	5 años 0 meses y 0 días		
Calidad del servicio	$ 17.000.000,00	5-feb.-22	2-dic.-27	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		7 de junio de 2022	
No. de póliza:	65-40-101063545		Anexo:	4
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	$ 500.000.000,00	2-may.-22	2-dic.-22	

4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 5. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
01[2]	31/05/2022	$75.421.145	$75.421.145	$2.989.623.809

Figura 3. Resumen de facturación

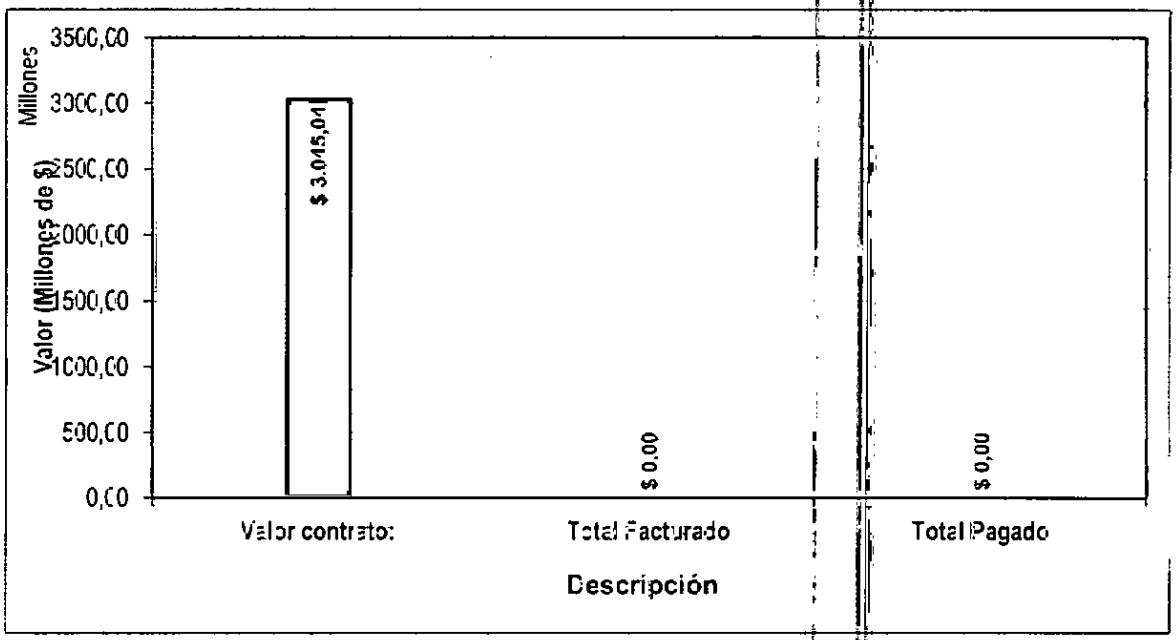


Tabla 6. Totales de pago y facturación

[2] Acta en trámite, aún no se ha conciliado ni suscrito por las partes.

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del Anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de Anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 3.045.044.954
Valor de las Adiciones:	$00,00
Valor Final del Contrato:	**$ 3.045.044.954,00**
Total Facturado	$ 00,00
Índice de Facturación	
Total Pagado	$ 00,00
Índice de Pagos	0,0
Saldo por pagar a la fecha	$ 3.045.044.954,00

4.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Presupuesto inicial

Valor inicial del contrato	$ 3.045.044.945,00
Adiciones:	$ 00,00
Valor facturado:	$ 00,00
Saldo del contrato	$ 3.045.044.945,00

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por el contratista de obra y la interventoria, durante el periodo del mes de mayo de 2022:

Semana No. 1 - del 02 al 08 de nayo: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

El día lunes 02 de mayo se realiza la firma del acta de inicio a los contratos de obra e interventoría y se realiza una reunión en las oficinas de la alcaldía de Barbosa entre interventoría, contratista de obra y entidad contratante, posterior a esto, contratista e interventoría realizan visita de campo. Se inicia la construcción del campamento de obra.

Se realiza la instalación de la valla informativa del contrato, en el margen izquierdo del río Medellín.

Durante esta semana los profesionales realizan actividades administrativas y en obra se continúa con la construcción del campamento de obra con madera en la zona del margen derecho del río Medellín. Entre contratista e interventoría se comparten información contractual y revisiones a dichos documentos tales como formatos para levantamiento de actas de vecindad y entorno, PMT, PMA, hojas de vida de los profesionales, APU's contractuales, factor prestacional para el personal de obra, desglose del AU, seguridad social del personal que labora, programación de obra, flujo de caja, entre otros.

Semana No. 2 - del 09 al 15 de mayo: Durante esta semana se realizan las siguientes actividades:

El lunes 09 de mayo en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Barbosa, se realiza el primer comité de obra donde se tratan temas del área social, ambiental y técnicas, de esta reunión se levanta acta de comité. Comisión de topografía realiza localización de las pilas y de los bordes del tablero del puente luego del envío de la localización definitiva del proyecto de acuerdo al ajuste de diseño de la cimentación del puente; es importante resaltar que, con este ajuste de diseños, se busca reducir la profundidad de las pilas y ampliar la sección del puente para pasar de 8.30 m a 8.80 m; dejando 2 carriles vehiculares de 3.65 m y un andén de 1.50 m

El día martes 10 de mayo en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Barbosa, se realiza una reunión de las áreas ambiental y SST, para definir procedimientos y documentación a llevar a cabo durante el proyecto. Se realiza recorrido de obra entre profesionales del área técnica y ambiental, para evaluar interferencia de árboles, redes secas (energía, telecomunicaciones y alumbrado público) y alcantarillado existente, luego de la implantación del proyecto por parte de la topografía del contratista de obra.

Se inicia el levantamiento de las actas de vecindad el día lunes 09 de mayo dándole continuidad en el transcurso de la semana y se levantan las actas de entorno con acompañamiento de la profesional social del municipio el día jueves 12 de mayo, tanto en el barrio Cecilia Caballero como en el sector La Estación.

Durante esta semana se continuó la construcción del campamento de obra, se realiza el cerramiento con sarán verde en la parte frontal del campamento y se inicia la construcción de los baños para el personal operativo. Contratista de obra realiza visita a las plantas o canteras para suministro de materiales y a los puntos autorizados para botadero de material.

Los profesionales del contratista de obra e interventoría realizan labores administrativas del proyecto.

Semana No. 3 - del 16 al 22 de mayo: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- El día lunes 16 de mayo realizo visita de obra el apoyo a la supervisión y el profesional forestal del municipio para conocer el proyecto y programar el inventario forestal para el trámite de aprovechamiento ante la entidad ambiental (Corantioquia).
- Comisión de topografía realiza actividades de localización de eje de vía y bordes de intervención, con cotas y abscisas, tanto en el margen derecho como izquierdo del río Medellín, verificando la necesidad de realizar un ajuste a la implantación del proyecto, debido a que no estaba coincidiendo el eje de la vía actual con el eje de los diseños del puente.
- Se finaliza la construcción del campamento de obra en el margen derecho del río y se realiza rocería y cerramiento perimetral de obra en el costado izquierdo del río (Sector La Estación).

- El día miércoles 18 de mayo se realiza el comité de obra N° 02 en las oficinas de la entidad contratante.
- Se finaliza el levantamiento de las actas de vecindad y entorno del proyecto
- Con el ajuste a la implantación de proyecto, el día jueves 19 de mayo, comisión de topografía realiza nuevamente la localización de las pilas de los ejes 1 y 4 (estribos del puente), del eje de vía y bordes derecho e izquierdo de la intervención con cotas y abscisado. Las pilas de los ejes 2 y 3 no se pueden localizar, debido a que quedan en el flujo del río Medellín. Con esta nueva implantación, se verifica que el eje de la vía actual coincida con el eje de vía de diseño del puente.
- Llegan a la obra cemento, madera y acero para iniciar la construcción de las pilas del puente.

Semana No. 4 - de 23 al 29 de mayo: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- El día lunes 23 de mayo, se inició la excavación manual de las pilas 1-2 (eje 1) y pilas 7-8 (eje 4), durante la semana se continuó con esta actividad a igual que con la construcción de los anillos de protección (acero, formaleta y concreto preparado en obra). Se instalan molinetes puntos de anclaje y líneas de vida en las pilas 7 y 8.
- El día miércoles 25 de mayo de 2022 el profesional forestal del municipio realizó el inventario de los individuos arbóreos que pueden llegar a interferir en la construcción del puente y sus aproches, comisión de topografía acompaña la actividad para la toma de altura de los árboles.
- Supervisión informó a la entidad ambiental (Corantioquia) del inicio de actividades constructivas del puente, según requerimiento de la resolución de ocupación de cauce.
- Se realizó el comité de obra N° 03, el día miércoles 25 de mayo en el campamento de obra.
- Comisión de topografía realizó chequeo a los primeros anillos de las pilas 1-2-7-8 y deja referencias para control de verticalidad de las pilas durante su proceso de excavación y realiza levantamiento y toma de datos para realizar propuesta de traslado de la red de alcantarillado de aguas combinadas que interfieren con la construcción del puente y del aproche del margen derecho del río.
- El día jueves 26 de mayo, funcionarios del municipio en compañía de la inspección de Policía realizaron visita de campo con la persona que realiza la explotación minera contigua al proyecto para notificarle que a partir de la fecha no puede volver a realizar esta actividad en este sector ni ingresar a la obra sin un permiso directo de la entidad contratante.
- El día viernes 27 de mayo la pila # 8 (eje 4) llegó a una profundidad de 3.50 m, profundidad a la cual se encontró la tubería de alcantarillado de aguas combinadas existente, por lo que se suspende su excavación, mientras el contratista de obra evalúa y realiza una alternativa técnica para realizar un desvío provisional de dicho alcantarillado y así poner continuar con su excavación.
- Las pilas finalizan semana con las siguientes excavaciones: pila 1: 1.0 m, pila 2: 1.0 m ubicadas en el margen izquierdo del río, pila 7: 4.40 m y pila 8: 3.5 m ubicadas en el margen derecho del río.

- La supervisión inició gestión con las empresas encargadas de las redes secas que se encuentran por el alineamiento del proyecto (energía, telecomunicaciones y alumbrado público), debido a que generan interferencia y se debe programar un movimiento de estas.
- Se define entre las partes (contratista de obra, interventoría y supervisión) el sector o trazado para el traslado de la red de alcantarillado de aguas combinadas que interfieren con el proyecto, el cual se ejecutará por el costado izquierdo según el abscisado del puente (debajo del andén adoquinado y ciclorruta existente).
- Actualmente los asesores del contratista de obra (geotecnia y estructural) se encuentra revisando los diseños ajustados del proyecto para emitir recomendaciones u observaciones.
- Contratista e interventoría se encuentran trabajando en la elaboración de la proyección financiera del proyecto.
- Supervisión comparte a las partes, los formatos técnicos a implementar durante la ejecución de la obra.
- Contratista de obra se encuentra ajustando el PMT, PASAO, programación de obra y flujo de caja según observaciones presentadas por la interventoría.

En cuanto al plazo, al 31 de mayo de 2022 habían transcurrido 30 días de los 215 días calendario, correspondientes al 13.95% del plazo contractual.

4.1 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

Durante el presente periodo se tomó una muestra de cilindros de concreto realizados el día 26 de mayo durante el vaciado de los anillos de protección de las pilas 7 y 8 con concreto preparado en obra, se espera para el siguiente informe mensual tener los resultados de resistencia a los 28 días.

4.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES.

Durante el presente periodo se usaron los siguientes materiales:

- Cemento Cemex de uso estructural
- Acero de refuerzo corrugado de D=3/8".
- Arena para concreto.
- Triturado para concreto.

De lo anterior, el contratista de obra presentó los certificados de calidad del cemento y el acero mediante el comunicado CPB-049-2022, están pendientes los controles de calidad a la arena y al triturado para el concreto preparado en obra.

4.3 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

El listado del equipo y maquinaria puestos por el contratista de obra para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, durante el mes de mayo, es el siguiente, y se relaciona en la siguiente tabla, control de maquinaria y equipo.

- Dos (2) volquetas sencillas.
- Dos (2) molinetes.
- Una (1) camioneta.
- Una (1) estación total.
- Una (1) concretadora.

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
INTERVENTORÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MAT. PROF. 2525 ANT

FORMATO	15-4		
VERSIÓN			
PAGINA	1	DE	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2022 (Año)

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA — SECRETARIA: OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: may-22 — CONTRATO No. 154 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUENTE LA ESTACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE INTECO — SECTOR:

MAQUINARIA Y EQUIPO	MAYO																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVADORA																															
VIBROCOMPACTADOR RODILLO																															
COMPACTADOR DE LLANTAS																															
BULLDOZER																															
FINISHER																															
RETROEXCAVADORA																															
CAMIONETA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1
CAMIONES																															
CARROTANQUE																															
MOLINETES																								2	2	2	2	2			2
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA		1							1						1	1			1						1	1					
CONCRETADORA 2 SACOS																									1	1	1	1			1
PLANTA ELÉCTRICA																															
EQUIPO DE SOLDADURA																															
VOLQUETAS																								1	2	2					
UNIDAD SANITARIA PORTÁTIL																															
COMPACTADOR MANUAL (RODILLO)																															
COMPACTADOR MANUAL (CANGURO)																															
COMPACTADOR DE PLACA (RANA)																															
MOTOBOMBA																															
MOTOSIERRAS																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

D (DISPONIBLE) V (VARADO)

Tabla: Control de maquinaria y equipo.

4.4 CONTROL CLIMATOLÓGICO

Del 02 al 31 de mayo del 2022, se presentaron 28.5 horas de lluvias durante los periodos laborados en jornada diurna (12 días); además de 9 días con lluvia en la jornada nocturna. A pesar de que las lluvias diurnas se presentaron en el 50% de los días laborados (24 días), no afectaron mayormente el avance del proyecto, solo en la última semana cuando se iniciaron los trabajos de la excavación manual de las pilas de cimentación del puente; en los demás días se realizaron actividades preliminares de obra, que no representan mayor avance al proyecto.

Este control de lluvias se relaciona en la siguiente tabla: Control climatológico.

MARIO GIL CARDONA
INTERVENTORIA
CONTROL CLIMATOLOGICO

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MAT. PROF. 2525 ANT

FORMATO	154
VERSION	
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31 (Día) 5 (Mes) 2022 (Año)

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA — SECRETARIA: OBRAS PÚBLICAS

CONTROL CLIMATOLOGICO

MES DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022 — CONTRATO No.: 154 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUENTE LA ESTACION

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE INTEC — SECTOR:

FECHA	ESTADO DEL TIEMPO					HORA		OBSERVACIONES
	SECO	LLOVIZNA	LLUVIA DIA	LLUVIA NOCHE	OTRO	DESDE	HASTA	
1 DE MAYO								
2 DE MAYO			X			7:30:00 a. m.	6:00:00 a.m.	
3 DE MAYO	X							SOLEADO
4 DE MAYO	X							SOLEADO
5 DE MAYO	X							SOLEADO
6 DE MAYO			X			1:00:00 p. m.	2:00:00 p. m.	
7 DE MAYO	X							NUBLADO
8 DE MAYO								
9 DE MAYO			X			4:30:00 p. m.	6:00:00 a.m	
10 DE MAYO			X	X		4:30:00 p. m.	4:30:00 p.m	
11 DE MAYO			X	X		11:30:00 a. m.	3:30:00 p.m	
12 DE MAYO	X			X				SOLEADO
13 DE MAYO		X						LLUVIAS LEVES MAÑANA
14 DE MAYO			X			8:30:00 a. m.	9:30:00 a. m.	
15 DE MAYO			X			7:00:00 a. m.	10:30:00 a. m	
16 DE MAYO	X			X				SOLEADO
17 DE MAYO			X	X		7:30:00 a. m.	8:00:00 a. m.	
17 DE MAYO			X	X		1:30:00 p. m.	5:30:00 p. m.	LLUVIAS INTERMITENTES
18 DE MAYO			X	X		3:30:00 p. m.	5:30:00 p. m.	
19 DE MAYO		X		X		11:30:00 a. m	5:30:00 p. m.	LLUVIAS INTERMITENTES
20 DE MAYO	X							SOLEADO
21 DE MAYO	X							SOLEADO
22 DE MAYO								
23 DE MAYO			X			2:30:00 p. m.	3:00:00 p. m.	
24 DE MAYO	X							SOLEADO
25 DE MAYO	X							SOLEADO
26 DE MAYO	X							SOLEADO
27 DE MAYO	X							SOLEADO
28 DE MAYO	X							SOLEADO
29 DE MAYO								
30 DE MAYO								
31 DE MAYO			X	X		5:30:00 p. m	3:30:00 p. m	NUBLADO

FESTIVO DOMINGO

Tabla: Control climatológico

4.5 ACTAS DE COMITÉ



Durante el presente mes se realizaron los comités de obra números 1, 2 y 3 correspondientes a los días 09, 18 y 25 de mayo del 2022, de manera presencial. Las actas de estas reuniones se presentan en el anexo N° 02.

4.6 BITÁCORA FIRMADA.


Se entrega escaneada como anexo 03 al informe mensual

4.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de todo el mes, se presenta como anexo 01 al informe mensual. A continuación se muestran algunas imágenes representativas de la semana 1 a la semana 4.

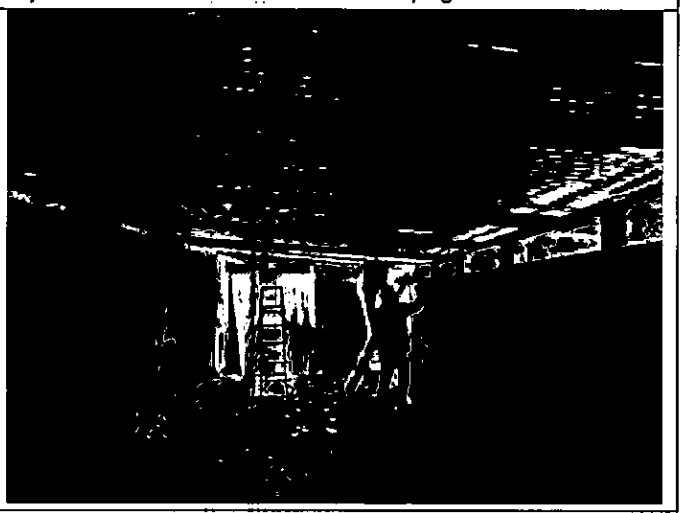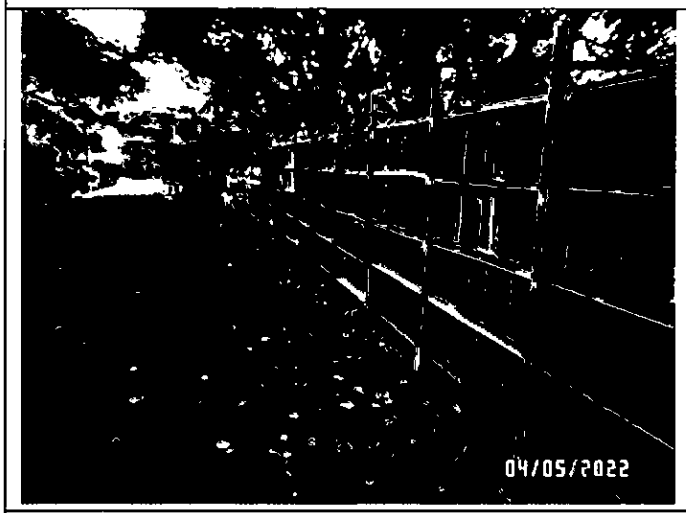
SEMANA 1	
	
Se inicia construcción de campamento de obra y localización con comisión de topografía	
	
Construcción del campamento de obra	
	
Construcción del campamento de obra	


SEMANA 2

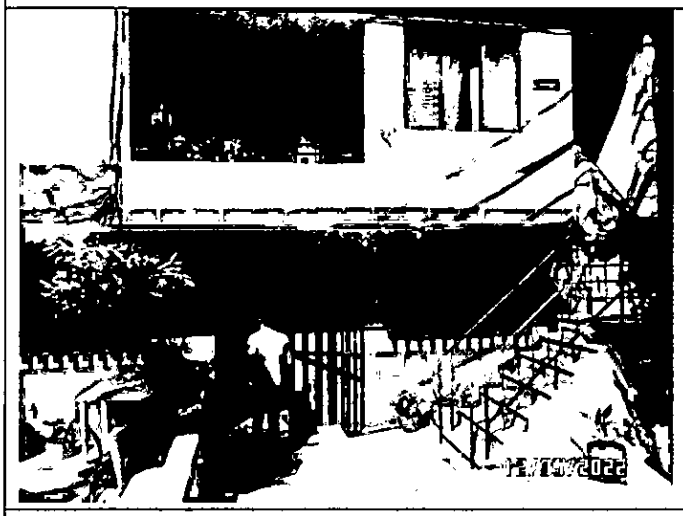




Levantamiento de actas de vecindad y entorno.

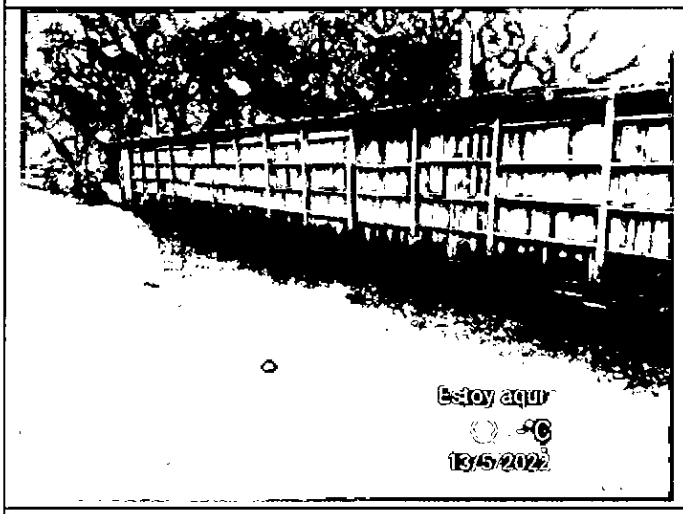

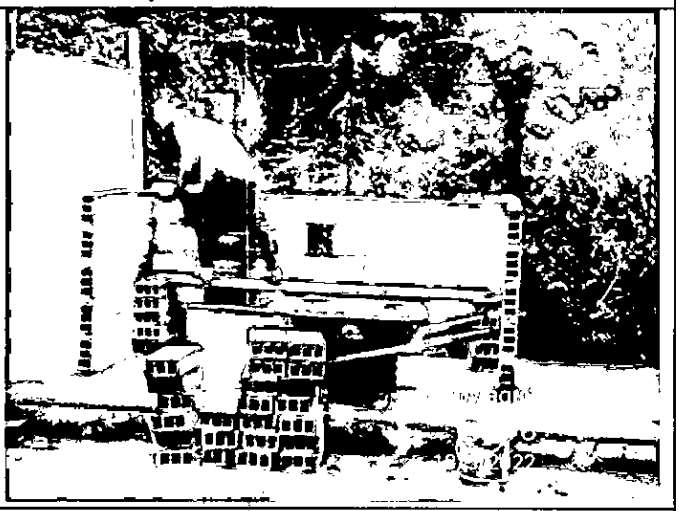


Construcción del campamento de obra.



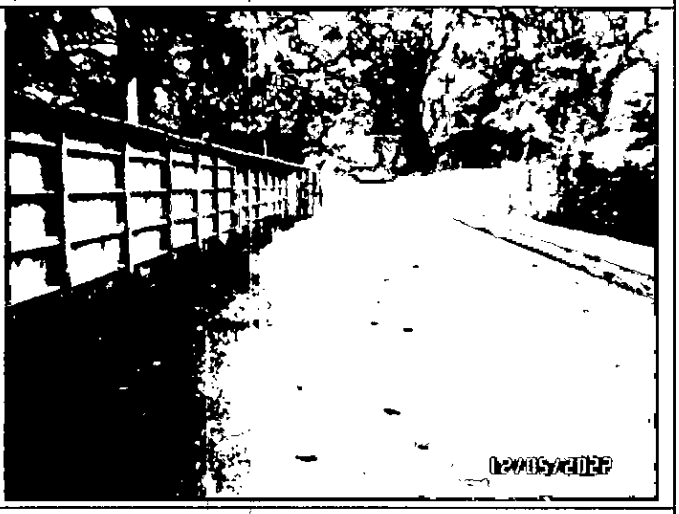

Instalación de sarán verde en cerramiento perimetral de obra.

SEMANA 4

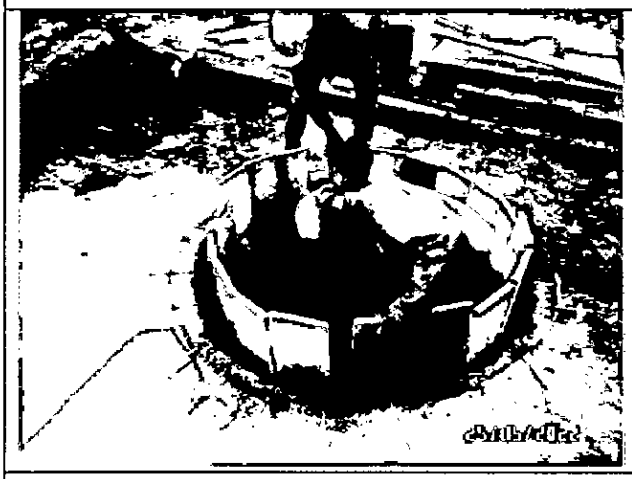

Excavación manual, instalación de acero y formaleta en anillo de protección para pilas. Pilas 7 y 8.



Chequeo de topografía de los primeros metros de excavación de pilas. Pilas 1 y 2.



Inventario forestal realizado por el funcionario del municipio de Barbosa.



Comité de obra N° 06



Excavación manual de pilas 7-8 del eje 4 del puente (margen derecha del río).



Excavación manual de pilas 1-2 del eje 1 de puente (margen izquierda del río).


6. CONCLUSIONES.

- El contratista de obra tramitará el acta N° 01 por un valor de $75.421.145, correspondiente al mes de mayo de 2022; el valor ejecutado acumulado es de $75.421.145, correspondiente al 2.48% del valor del contrato de obra. Actualmente el contratista de obra no ha tramitado ninguna cuenta referente a este contrato.
- La interventoría tramitará el acta N° 01 por un valor de $24.085.299, correspondiente al mes de mayo de 2022; el valor ejecutado acumulado es de $24.085.299, correspondiente al 10.45% del valor del contrato de interventoría. Actualmente la interventoría no ha tramitado ninguna cuenta referente a este contrato.
- El plazo de ejecución del contrato de obra es de 7 meses (215 días calendario), de los cuales, al 31 de mayo de 2022, habían transcurrido 30 días, lo cual representa un 13.95% de avance en tiempo para el contrato de obra. Para el caso de la interventoría, el plazo contractual son 8 meses (246 días calendario) y a corte del presente informe mensual, había transcurrido el 12.20% del plazo.
- Durante el periodo de este informe, se presentaron 28.5 horas de lluvias para los periodos laborados en jornada diurna (12 días); además de 9 días con lluvia en la jornada nocturna. A pesar de que las lluvias diurnas se presentaron en el 50% de los días laborados (24 días), no afectaron mayormente el avance del proyecto, solo en la última semana cuando se iniciaron los trabajos de la excavación manual de las pilas de cimentación del puente; en los demás días se realizaron actividades preliminares de obra, que no representan mayor avance al proyecto.
- El contratista de obra presentó para el presente mes, los certificados de calidad del cemento Cemex de uso estructural y del acero de refuerzo de 3/8".
- Aun para el presente mes no se tienen resultados de control de laboratorio, solo se tomó una muestra de concreto (4 cilindros) del vaciado de los anillos de protección de las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente, los cuales serán fallados a los 28 días durante el mes de junio de 2022.

JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
Director de Interventoría.
Mario Gil Cardona – Contratista de interventoría.

INFORME MENSUAL No. 02 – CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

MES DE JUNIO DEL 2022

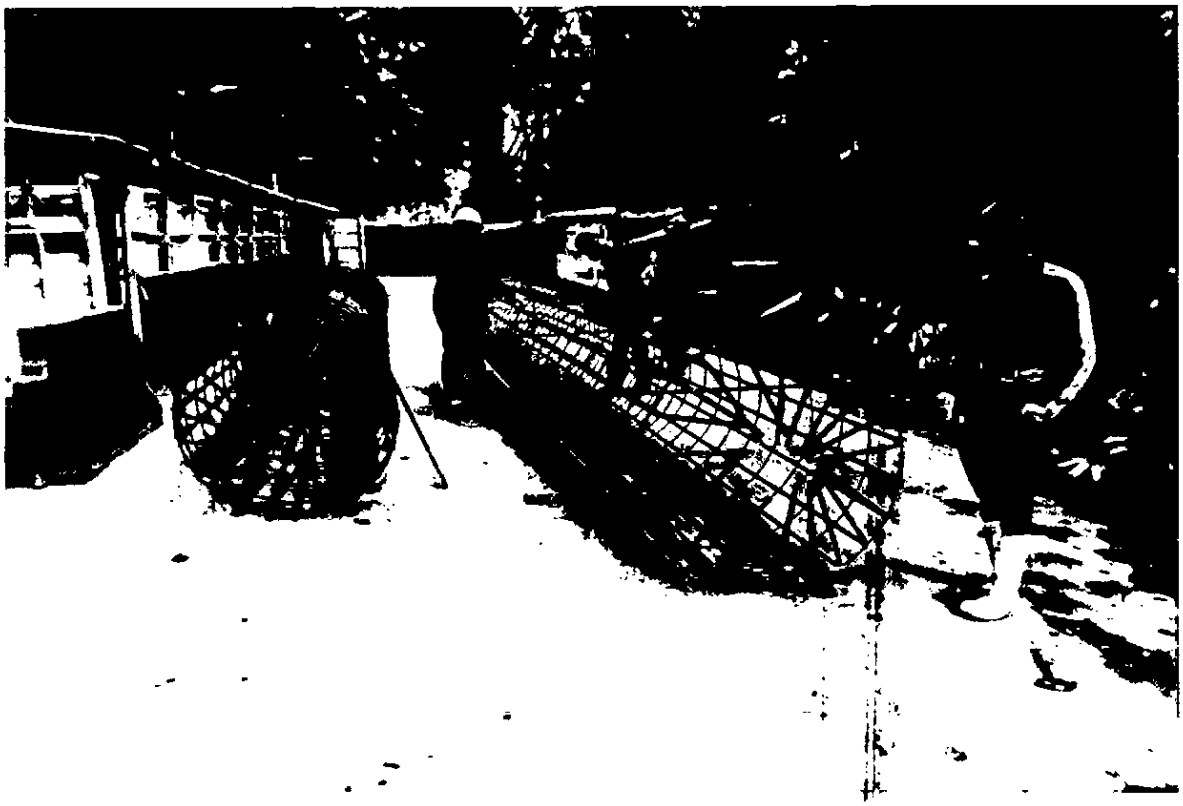

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO.

BARBOSA (ANTIOQUIA)

2022


1. INTRODUCCIÓN


En el presente documento se muestran los avances del contrato de interventoría No. 255 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRAN", como también los aspectos generales en cuanto al desarrollo de la obra y su respectivo seguimiento, asimismo las labores concernientes a estas y el estado actual de las mismas, siempre teniendo en cuenta las condiciones de calidad, eficiencia y eficacia para un buen desarrollo del proyecto y procurando garantizar las condiciones de seguridad de la misma. Para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2022.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A través del contrato de interventoría No. 255 del 3 de febrero de 2022, se realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico, social y en seguridad y salud en el trabajo, del puente vehicular y peatonal ubicado en la calle 13, sector La Estación en el Municipio de Barbosa. Este puente cuenta con las siguientes características:

Puente vehicular y peatonal con una luz total de 70 m aproximadamente con una luz central en vigas postensadas de 40 m y una altura de 2,25 m y dos luces de 15 m en vigas reforzadas con una altura de 0,8 m. con una separación entre ellas de 4,30 m. Se tendrá un ancho del tablero de 8,80 m y un espesor de 0,22 m, se contará con dos carriles de 3,65 m, un andén de 1.50 m en un costado y baranda vehicular metálica en ambos costados. Estará cimentado en dos pilas por apoyo de diámetro de 1.30 m y profundidad de 12 m para el caso de las pilas de los apoyos externos (luz de 15 m) y de 18 m y 24 m para los apoyos centrales (luz de 40 m). Contará con las respectivas aproximaciones en muro en tierra armada, costado derecho del puente en una longitud de 24.5 m y en el margen izquierdo del río en una longitud de 42 m.

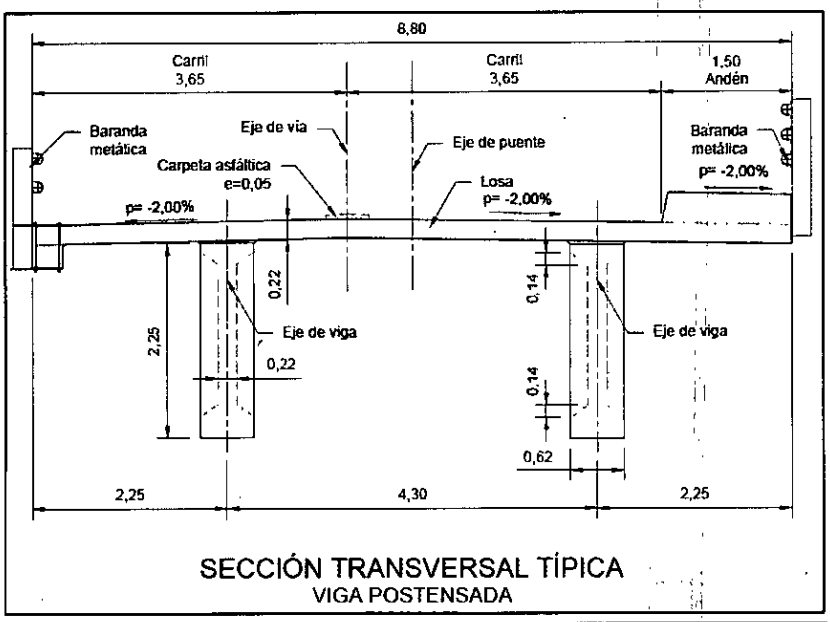

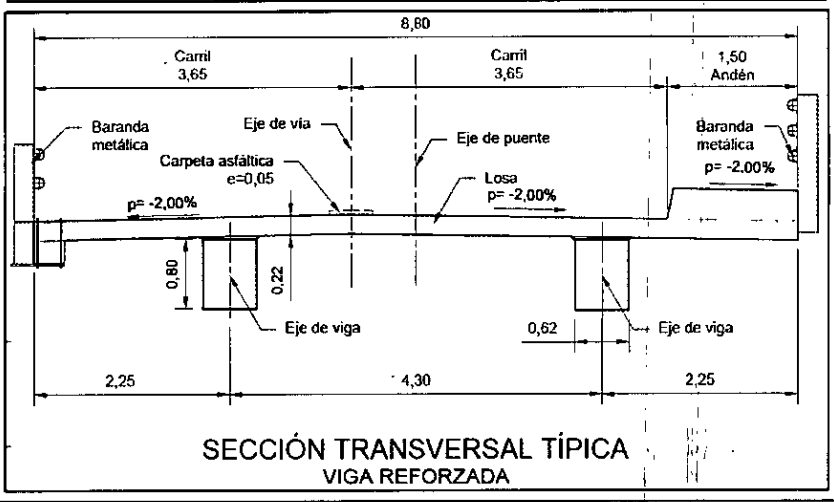

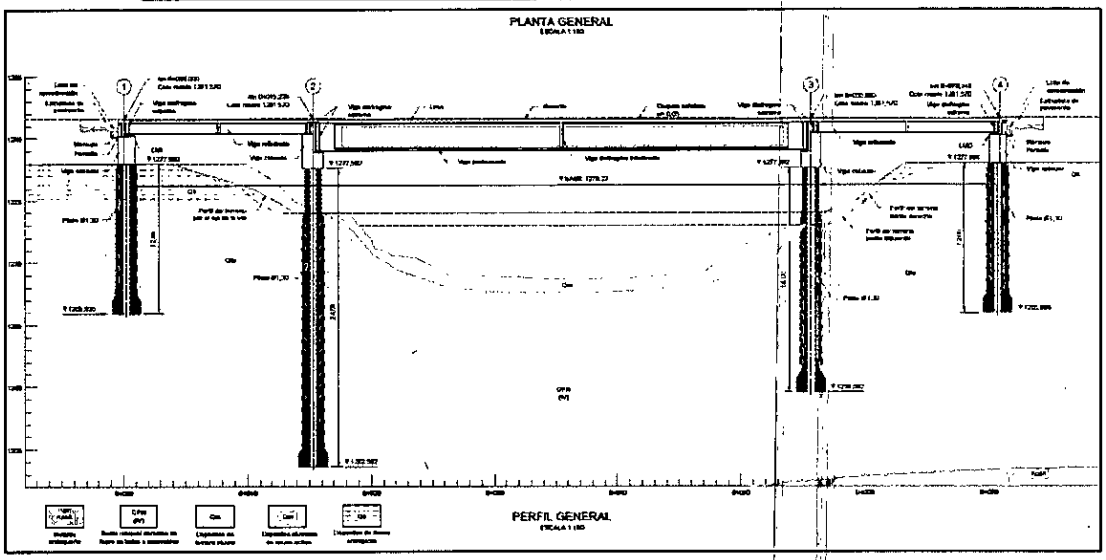
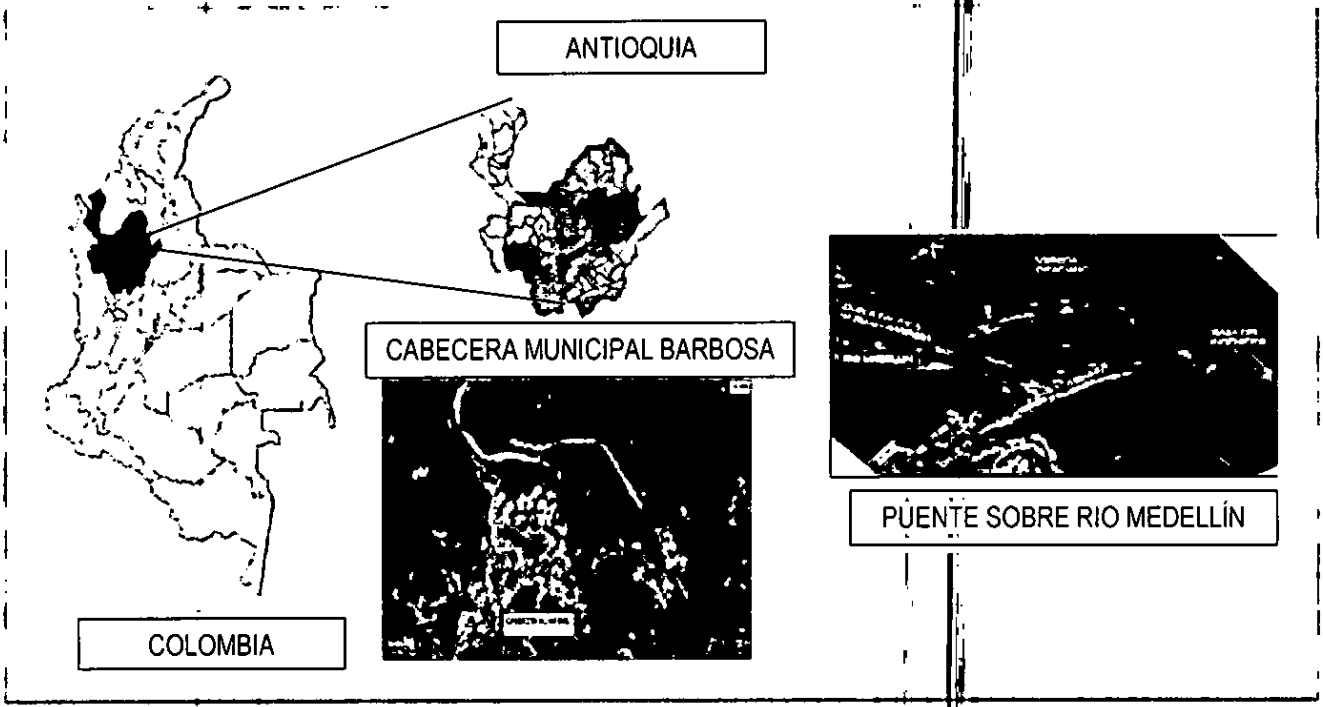


Ilustración 1. Secciones típicas del puente y perfil general – Tomado del diseño estructural

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la calle 13 del municipio de Barbosa ubicado al norte del Valle de Aburrá, por un costado del puente (margen derecha del río Medellín) se encuentra la zona urbana en el barrio Cecilia Caballero y conectará con zona rural del municipio por el otro costado del puente (margen izquierda del río Medellín) hacia el sector La Estación.

Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto



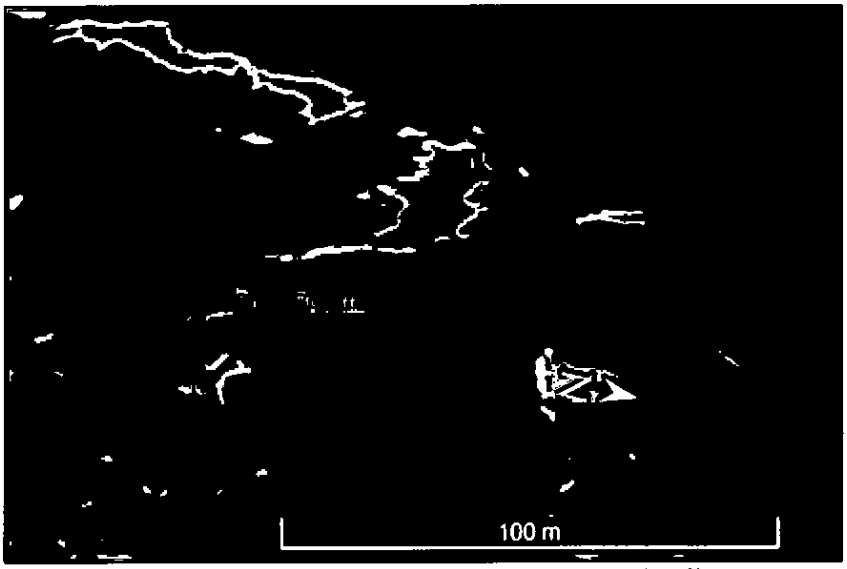


Ilustración 2. Ubicación del proyecto – Tomado de Estudios técnicos del proyecto.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DE CONTRATO:	154 del 25 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRAN
Valor inicial del contrato:	$ 230.421.794,00
Valor de las adiciones:	$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 230.421.794,00
Valor del anticipo (0%)	$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 00,00 (Cero pesos)

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	000154
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE INTECO
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.


Valor inicial del contrato:	$ 3.045.044.954,00
Valor de las adiciones:	$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.045.044.954,00
Valor del anticipo (0%)	$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 meses
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 75.421.145,00

2.3 RESUMEN INVERSIONES

Inversión programada con corte al 26 de junio de 2022:
($ 136.687.315 – 4.49%).

Inversión ejecutada con corte al 26 de junio de 2022:
($ 141.156812 – 5.15%).

Retraso o adelanto: 0.66% de adelanto financiero.

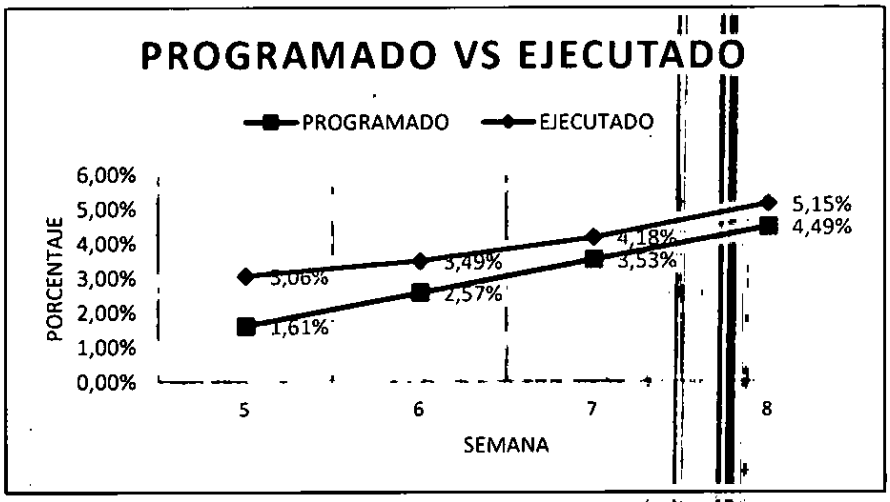

Con el flujo de caja presentado por el contratista de obra, se calculó la inversión para las cuatro (4) semanas del mes de junio. Según lo evidenciado anteriormente, se presenta un avance financiero en el contrato, sin embargo este aún no es representativo frente a la ejecución total del contrato.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	INTERVENTORÍA
No. del contrato	855 [illegible]03 de febrero de 2022

Contratista:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Cedula / NIT	8 291.216	
Representante Legal:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Identificación:	8 291.216	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRAN	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	Jueves, 03 de febrero de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	8 Meses	
Valor Inicial:	$230.421.794,00	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de Inicio:	Lunes, 02 de mayo de 2022	
Fecha de Terminación:	Lunes, 02 de enero de 2023	
CONDICIONES FINALES		
Total Suspensiones (Días):	N.A.	
Total Prorrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo Final (meses):	N.A.	8 Meses
Valor Final:	$230.421.794,00	
Fecha de Terminación Final:	Lunes, 02 de enero de 2023	

MODIFICACIÓN No. 1	
Número de Contrato Adicional:	N.A.
Fecha:	
Plazo Adicional (Meses):	
Valor Adicional:	
Valor Final del Contrato:	
Fecha de Terminación:	

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

PRÓRROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	N.A.
Plazo Adicional (Meses):	
Motivo:	

3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Control de Pólizas

TOMADOR: GIL CARDONA, MARIO DE JESUS
Identificación: 8.291.216
Dirección: CR 51 NRO. 51-17 OF 700
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5117997
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA V.A
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		9 de mayo de 2022
No. de póliza:	65-44-101209462		**Anexo:** 0
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	$ 46.084.358,80	2-may.-22	27-may.-23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 23.042.179,40	2-may.-22	27-ene.-26
Calidad del servicio	$ 34.563.269,10	27-ene.-23	28-ene.-28

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		9 de mayo de 2022
No. de póliza:	65-40-101063604		**Anexo:** 0
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Predios labores y operaciones	$ 200.000.000,00	2-may.-22	27-ene.-23
Contratistas y Subcontratistas	$ 60.000.000,00	2-may.-22	27-ene.-23
Vehículos propios y no propios	$ 60.000.000,00	2-may.-22	27-ene.-23

3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 2. Balance del contrato de interventoria

ACTA DE INTERVENTORIA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
01	31/05/2022	$23.556.513	$23.556.513	$206.865.281
02	30/06/2022	$29'238.571	$56.802.058	$177.626.710

Figura 2. Resumen de facturación

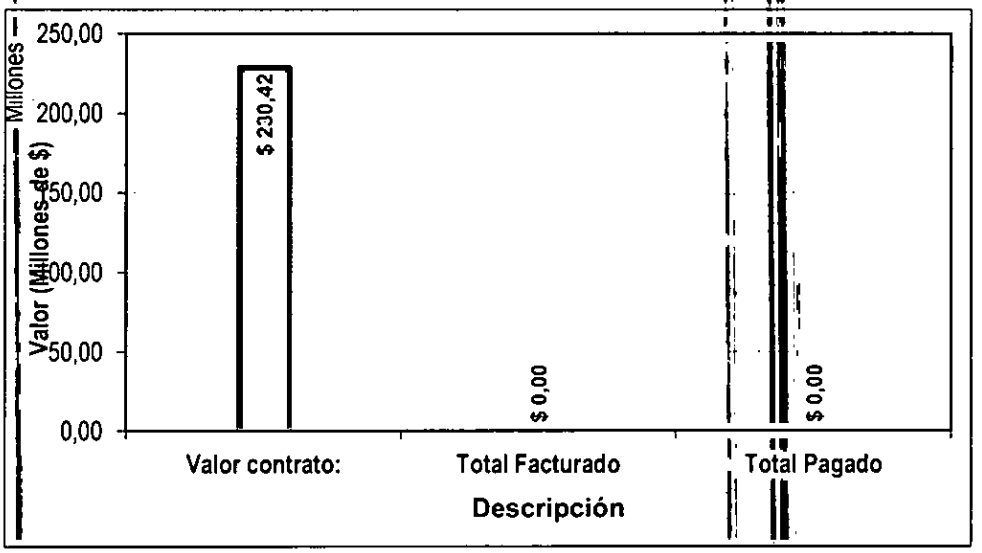


Tabla 3. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del Anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de Anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 230.421.794,00
Valor de las Adiciones:	$00,00
Valor Final del Contrato:	**$ 230.421.794,00**
Total Facturado	$ 00,00
Índice de Facturación	0
Total Pagado	$ 00,00
Índice de Pagos	0,0
Saldo por pagar a la fecha	$ 230.421.794,00

3.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Presupuesto inicial

Valor inicial del contrato	$ 230.421.794,00
Adiciones:	$ 00,00
Valor facturado:	$ 00,00
Saldo del contrato	$ 230.421.794,00

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	OBRA

No. del contrato	154 del 25 de enero de 2022	
Contratista:	CONSORCIO PUENTE INTECO	
Cedula / NIT	901.555.010-41	
Representante Legal:	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	
Identificación:	91.293.585	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR. PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL FUTURO CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL MUNICIPIO.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	Martes, 25 de enero de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	7 Meses	
Valor Inicial:	$3.045.044.954,00	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de Inicio:	Lunes, 02 de mayo de 2022	
Fecha de Terminación:	Viernes 02 de diciembre de 2022	
CONDICIONES FINALES		
Total Suspensiones (Días):	N.A.	
Total Prorrogas (meses):	N.A.	N.A.
Plazo Final (meses):	N.A.	8 Meses
Valor Final:	$3.045.044.954,00	
Fecha de Terminación Final:	Viernes 02 de diciembre de 2022	

MODIFICACIÓN No. 1	
Número de Contrato Adicional:	N.A.
Fecha:	
Plazo Adicional (Meses):	
Valor Adicional:	
Valor Final del Contrato:	
Fecha de Terminación:	

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de Suspensión:	

Fecha de Reiniciación:	
Motivo: I	
Días de Suspensión:	

PRORROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	N.A.
Plazo Adicional (Meses):	
Motivo:	

4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tabla 2. Control de Pólizas

TOMADOR: CONSORCIO PUENTE INTECO
Identificación: 9001555010-4
Dirección: Carrera 48 No. 25 AA SUR 70 INT 209
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5062413
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA V.A
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		7 de junio de 2022	
No. de póliza:	65-44-101209479		**Anexo:**	4
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	
Cumplimiento	$ 609.008.990,80	2-may.-22	5-feb.-23	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 609.008.990,80	2-may.-22	5-feb.-26	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 913.513.486,20	2-may.-22	5 años, 0 meses y 0 días.	
Calidad del servicio	$ 17.000.000.00	5-feb.-22	2-dic.-27	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		7 de junio de 2022	
No. de póliza:	65-40-101063545		**Anexo:**	4
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	$ 500.000.000,00	2-may.-22	6-feb.-23	

4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 5. Balance del contrato de obra

		BALANCE DEL CONTRATO

ACTA DE OERA No.	FECHA CORTE	Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
01	31/05/2022	$75.421.145	$75.421.145	$2.969.623.809
02[1]	30/06/2022	$47.687.460	$123.108.603	$2.921.936.351

Figura 3. Resumen de facturación

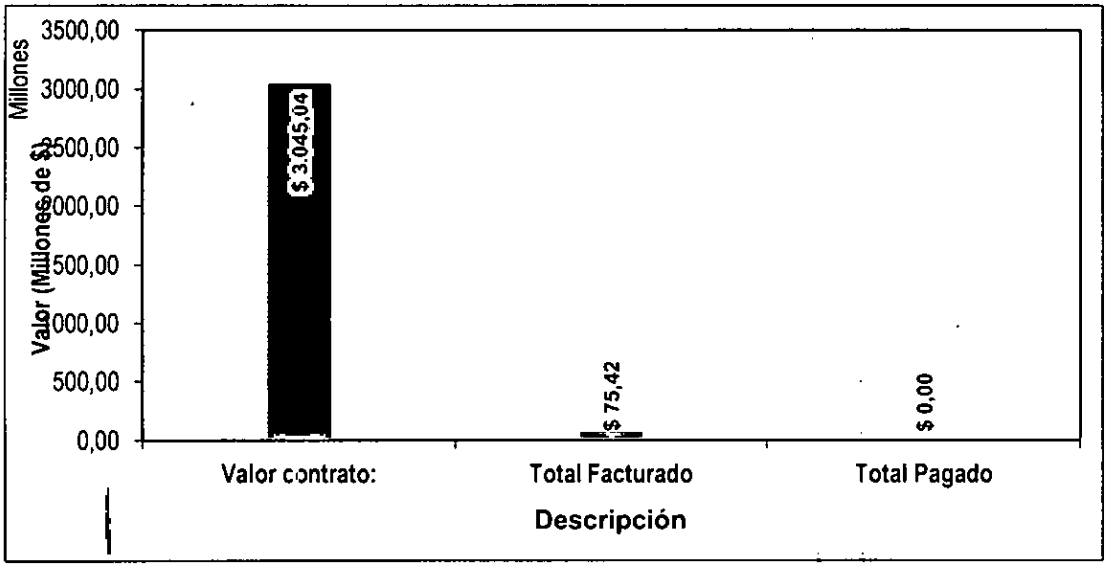


Tabla 6. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del Anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de Anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 3.045.044.954
Valor de las Adiciones:	$00,00
Valor Final del Contrato:	**$ 3.045.044.954,00**
Total Facturado	$ 75.421.145,00
Índice de Facturación	0.02
Total Pagado	$ 00,00
Índice de Pagos	0,0
Saldo por pagar a la fecha	$ 3.045.044.954,00

4.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Presupuesto inicial

Valor inicial del contrato	$ 3.045.044.945,00
Adiciones:	$ 00,00
Valor facturado:	$ 75.421.145,00
Saldo del contrato	$ 3.045.044.945,00

[1] Acta en conciliación, su valor puede [illegible].

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por el contratista de obra y la interventoría, durante el periodo del mes de junio de 2022:

Semana No. 5 - del 30 de mayo al 05 de junio: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- El día lunes 31 de mayo se realiza el vaciado de los primeros anillos de las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente, sector margen derecha del rio.
- Se continúa con la excavación manual y vaciado de anillos de protección en las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente, sin actividades las pilas 7 y 8 del eje 4.
- El día jueves 02 de junio realiza visita de obra de la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas de Barbosa. Se resuelven inquietudes de las áreas técnica, social y ambiental.
- Se toman muestras de concreto en el vaciado en obra de los anillos de protección de las pilas, el día jueves 02 de junio, para control de resistencia.
- Se adecúa en la margen izquierda del río (eje 1 del puente) el punto ecológico, la instalación de la camilla, botiquín, extintor y cuarto para el personal operativo de obra. De igual manera se lleva la red provisional de acueducto desde el margen derecho del río.
- El día viernes 03 de junio se realiza la socialización del proyecto en el sector La Estación, con asistencia de la comunidad, profesionales del municipio de Barbosa, interventoría y del contratista de obra.
- Con una retroexcavadora de llantas se realiza excavación o cajeo para construcción de estribo del eje 4 del puente (margen derecha del río) y excavación de brecha para desvío provisional de la red de alcantarillado que interfiere con la construcción de la pila # 8.

Semana No. 6 - del 06 al 12 de junio: Durante esta semana se realizan las siguientes actividades:

- El día lunes 06 de junio, la comisión de topografía del contratista de obra realiza levantamiento y toma de datos para realizar la propuesta del desvío definitivo de la red de alcantarillado combinado que interfiere con el estribo del eje 4 del puente. Se plantea interceptar la red existente y pasarlo al costado izquierdo de la sección del puente (debajo del andén adoquinado y ciclorruta existentes).
- Se realiza la instalación de una red de energía provisional de obra para el margen izquierdo del río (eje 1), se instala un tablero con tomas para la conexión de las motobombas y equipos menores.
- Se continúa con la excavación manual y vaciado de anillos de protección en las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente, sin actividades las pilas 7 y 8 del eje 4, debido a la interferencia de la red de alcantarillado existente.

- Se inicia el uso de motobombas en las excavaciones de las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente para abatir el nivel freático existente.
- Se realiza perfilación de excavación y vaciado de solado para desvío provisional de alcantarillado que interfiere con construcción de la pila 8 del estribo del eje 4 del puente.
- Se realiza comité de obra de manera virtual el jueves 09 de junio a las 9 am.

Semana No. 7 - del 13 al 19 de junio: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- El día 13 de junio de 2022, se presenta inconveniente en la excavación de las pilas 1 y 2 del eje 1, debido a que en la excavación se presenta un extracto de suelo arenoso y a medida que se excava se desconfina el material y de empieza a presentar socavación, la excavación se suspende para evitar colapso del material que afecte la integridad del personal de excavación.
- El día miércoles 15 de junio se realiza comité de obra No 5 de manera presencial en las instalaciones de la alcaldía municipal.
- El personal eléctrico realiza ajustes a la red provisional de energía de la margen izquierda del río, la cual se afectó por lluvias fuertes.
- Con una retroexcavadora de llantas se realiza excavación o cajeo para construcción de estribo del eje 1 del puente (margen izquierda del río).
- Se realiza cargue y retiro de material, en la margen izquierda del río, material resultante de la excavación para estribo No 1.
- Se continúa con la excavación manual y vaciado de anillos de protección en las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente, sin actividades las pilas 1 y 2 del eje 1.
- El día 15 de junio, la comisión de topografía del contratista de obra realiza localización topográfica de los ejes de las pilas 7 y 8 del eje 4 y toma de datos para propuesta del desvío definitivo del alcantarillado que interfiere con el aproche del puente.
- El día jueves 16 de junio realiza visita de obra, por parte de los especialistas estructural y geotecnia con el fin de verificar el procedimiento más adecuado para la excavación de las pilas 1 y 2 del eje 1, en la cual se determinó que la manera más adecuada de abordar el problema presentado en esta excavación es con formaleta metálica.

Semana No. 8 - del 20 al 26 de junio: Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Se continúa con la excavación manual y vaciado de anillos de protección en las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente, sin actividades las pilas 1 y 2 del eje 1, debido a extracto de suelo arenoso encontrado en el sitio de la excavación.
- Se inicia el uso de motobombas en las excavaciones de las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente para abatir el nivel freático existente.
- Inicio de armado de acero para pilas 1, 2, 7 y 8, esta actividad se está desarrollando en el margen derecha del río sobre el eje No 4.

- El día miércoles 22 de junio se recibe visita por parte del ingeniero Juan Pablo (apoyo de la supervisión municipal) en compañía de personal de la empresa municipal de alumbrado público con el fin de verificar y programar la visita para retiro de postes de alumbrado público que interfieren con el proyecto, el día jueves 23 de junio personal de la empresa anteriormente mencionada realiza el retiro de postes de concreto de alumbrado público, accesorios e inhabilitan la energía de un tercer poste.
- Se realiza comité de obra No 6 de manera virtual el miércoles 22 de junio a las 10:00 am.

En cuanto al plazo, al 30 de junio de 2022 habían transcurrido 60 días de los 215 días calendario, correspondientes al 27.91% del plazo contractual de obra y del 24.39% del plazo de interventoría.

4.1 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

A la fecha el contratista de obra no ha presentado los resultados de laboratorio de los cilindros de concreto a los 28 días, de las muestras tomadas en el mes de mayo de 2022. La interventoría solicitó estos resultados el pasado jueves 30 de junio mediante correo electrónico.

4.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES.

A la fecha el contratista de obra no ha presentado los certificados de calidad de los materiales usados durante el mes de junio de 2022, como lo son del acero de refuerzo principal de las pilas de los estribos del puente, cemento Cemex tipo estructural, arena y triturado para concretos. La interventoría solicitó estos certificados el pasado jueves 30 de junio mediante correo electrónico.

4.3 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

El listado del equipo y maquinaria puestos por el contratista de obra para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, durante el mes de junio, es el siguiente, y se relaciona en la siguiente tabla, control de maquinaria y equipo.

- Dos (2) volquetas sencillas.
- Dos (2) molinetes.
- Una (1) camioneta.
- Una (1) estación total.
- Una (1) concretadora.
- Una (1) retroexcavadora de llantas.
- Dos (2) motobombas de 2".

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
INTERVENTORÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MAT. PROF. 2525 ANT

FORMATO	15-4		
VERSION			
PAGINA	1	DE	
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2022

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA — SECRETARIA: OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: jun-22 — CONTRATO No. 154 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUENTE LA ESTACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE INTECO — SECTOR:

MAQUINARIA Y EQUIPO	JUNIO																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EXCAVADORA																														
VIBROCOMPACTADOR RODILLO																														
COMPACTADOR DE LLANTAS																														
BULLDOZER																														
FINISHER																														
RETROEXCAVADORA			1	1										1	1	1														
CAMIONETA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
CAMIONES																														
CARROTANQUE																														
MOLINETES	2	2	2	2		2	2	2	2	2	D		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA						1									1															
CONCRETADORA 2 SACOS	1	1	1	1		1	1	1	1	1	D		D	D	1	1	1	D			1	1	1	1	D			1	1	1
PLANTA ELÉCTRICA																														
EQUIPO DE SOLDADURA																														
VOLQUETAS														1	2	1														
UNIDAD SANITARIA PORTÁTIL																														
COMPACTADOR MANUAL (RODILLO)																														
COMPACTADOR MANUAL (CANGURO)																														
COMPACTADOR DE PLACA (RANA)																														
MOTOBOMBA									2	2	D		D	1	1	D	2	D			2	2	2	2	2			2	2	2
MOTOSIERRAS																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

D (DISPONIBLE) V (VARADO)

FESTIVO
DOMINGO

Tabla: Control de maquinaria y equipo.

4.4 CONTROL CLIMATOLÓGICO

Del 01 al 30 de junio del 2022, se presentaron 22 horas de lluvias durante los periodos laborados en jornada diurna (14 días); además de 21 días con lluvia en la jornada nocturna. Las lluvias diurnas se presentaron en el 58% de los días laborados (24 días), afectaron mayormente los trabajos de la excavación manual de las pilas de cimentación del puente, debido a que durante las lluvias se suspendían los trabajos de excavación; para ello el contratista de obra implementó unas carpas en cada una de las pilas donde se realizan trabajos en aras de que en caso de lluvias leves o precipitaciones de tiempos cortos, esta actividad no se frene, sabiendo que es una ruta crítica del proyecto.

Este control de lluvias se relaciona en la siguiente tabla: Control climatológico.

MARIO GIL CARDONA INTERVENTORIA CONTROL CLIMATOLÓGICO	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA Ingeniero Civil MAT. PROF. 2525 ANT	FORMATO	15-4		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2022 (Año)

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA — SECRETARIA: OBRAS PÚBLICAS

CONTROL CLIMATOLÓGICO

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 — CONTRATO No. 154 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUENTE LA ESTACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE INTECO — SECTOR:

FECHA	ESTADO DEL TIEMPO					HORA		OBSERVACIONES
	SECO	LLOVIZNA	LLUVIA DIA	LLUVIA NOCHE	OTRO	DESDE	HASTA	
1 DE JUNIO			X	X		3:00:00 p. m.	3:30:00 p. m.	
2 DE JUNIO	X			X				
3 DE JUNIO			X	X		6:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
4 DE JUNIO	X							SOLEADO
5 DE JUNIO								
6 DE JUNIO	X							SOLEADO
7 DE JUNIO			X	X		7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
8 DE JUNIO	X							NUBLADO
9 DE JUNIO			X	X		1:30:00 p. m.	3:00:00 p. m.	
10 DE JUNIO			X	X		3:00:00 p. m.	3:30:00 p. m.	
11 DE JUNIO			X	X		7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
12 DE JUNIO								
13 DE JUNIO	X							SOLEADO
14 DE JUNIO			X	X		10:45:00 a. m.	12:00:00 p. m.	
15 DE JUNIO			X	X		11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	TARDE SOLEADA
16 DE JUNIO			X	X		2:00:00 p. m.	2:30:00 p. m.	
16 DE JUNIO			X	X		4:00:00 p. m.	5:30:00 p. m.	
17 DE JUNIO			X	X		9:00:00 a. m.	9:30:00 a. m.	
18 DE JUNIO	X							SOLEADO
19 DE JUNIO								
20 DE JUNIO				X				
21 DE JUNIO			X	X		6:30:00 a. m.	8:30:00 a. m.	SOLEADO
22 DE JUNIO	X			X				SOLEADO
23 DE JUNIO	X			X				SOLEADO
24 DE JUNIO	X			X				SOLEADO
25 DE JUNIO	X			X				SOLEADO
26 DE JUNIO								
27 DE JUNIO								
28 DE JUNIO			X	X		6:00:00 a. m.	7:30:00 a. m.	SOLEADO
29 DE JUNIO	X			X				SOLEADO
30 DE JUNIO			X	X		1:30:00 p. m.	3:00:00 p. m.	

FESTIVO
DOMINGO

Tabla: Control climatológico.

4.5 ACTAS DE COMITÉ

Durante el presente mes se realizaron los comités de obra números 4, 5, 6 y 7 correspondientes a los días 09, 15, 22 y 29 de junio del 2022, se realizaron de manera presencial y virtual. Las actas de estas reuniones se presentan en el anexo N° 02.


4.6 BITÁCORA FIRMADA.

Se entrega escaneada como anexo 03 al informe mensual.

4.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de todo el mes, se presenta como anexo 01 al informe mensual. A continuación se muestran algunas imágenes representativas de la semana 5 a la semana 8.


REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 5

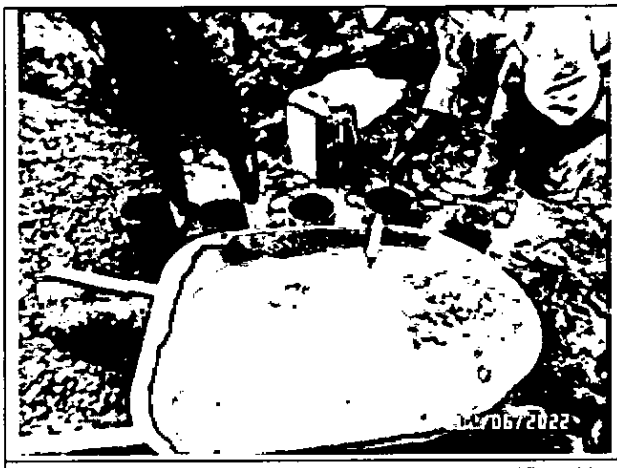

Toma de muestras de concreto para verificación de resistencia a la compresión en vaciado de anillos de protección de pilas.




Visita de obra de la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de la supervisión de la Secretaria de Obras Públicas de Barbosa.

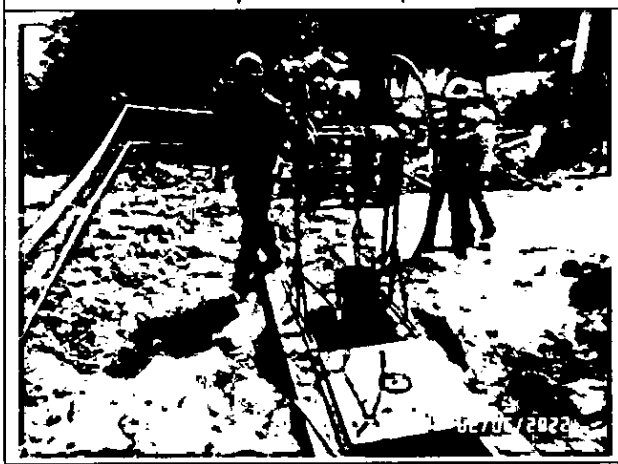

Excavación manual de las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente (margen izquierda del río).



Socialización del proyecto en el sector La Estación.


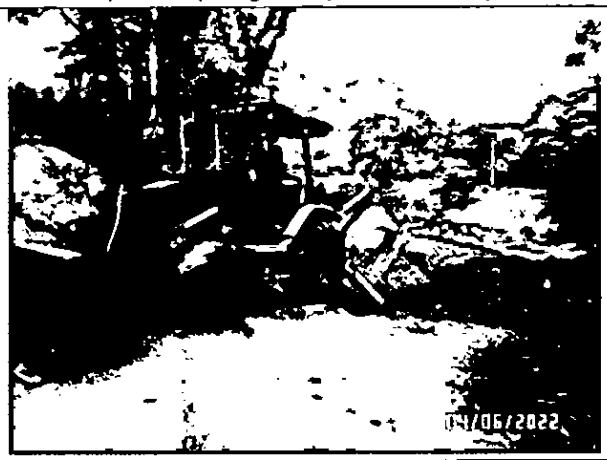


Excavación o cajeo para construcción de estribo del eje 4 del puente (margen derecha del río).




Excavación para desvío provisional de alcantarillado que interfiere con la construcción de las pilas del eje 4.




REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 6

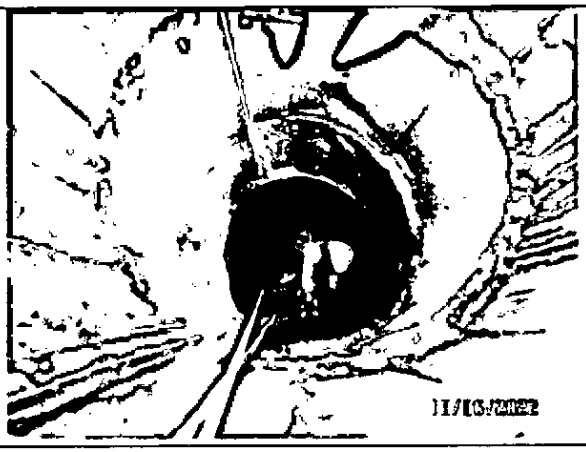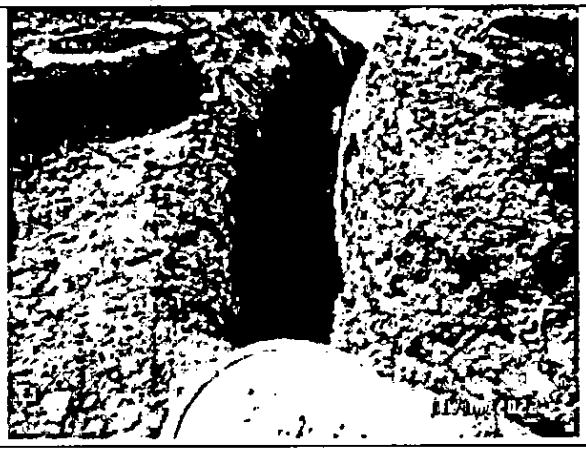	
Excavación manual de las pilas con uso de motobombas para abatir nivel freático.	Excavación manual de las pilas 1 y 2 del eje 1 del puente, margen izquierdo del río.
	
Perfilación de excavación y vaciado de solado para desvío provisional de alcantarillado que interfiere con construcción de pila 8.	Toma de datos con comisión de topografía para la propuesta (planta-perfil) del desvío definitivo de la red de alcantarillado que interfiere con el eje 4.
	
Red provisional de obra para acueducto y energía que pasa del margen derecho al izquierdo del río.	Material que procede de las excavaciones de las pilas.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 7

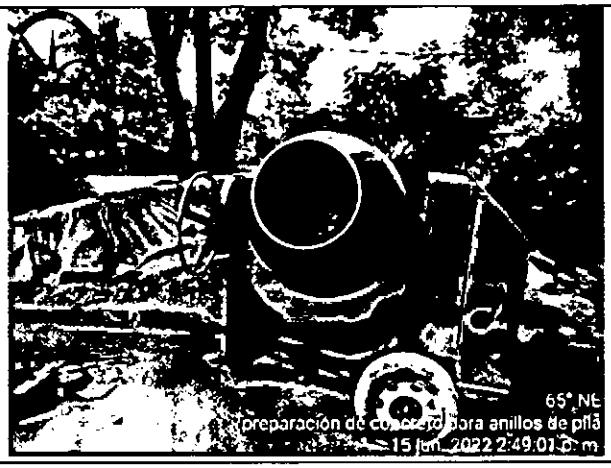	
Preparación de concreto para vaciado de anillos de protección en pilas No 7 y 8 del eje No 4.	Visita de obra de los especialistas estructural y de geotecnia.
	
Excavación manual de las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente (margen derecha del río).	Instalación de cartelera informativa y buzón de sugerencias sector La Estación.
	
Excavación o cajeo para construcción de estribo del eje 1 del puente (margen izquierda del río).	Excavación para desvío provisional de alcantarillado que interfiere con la construcción de las pilas del eje 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 8

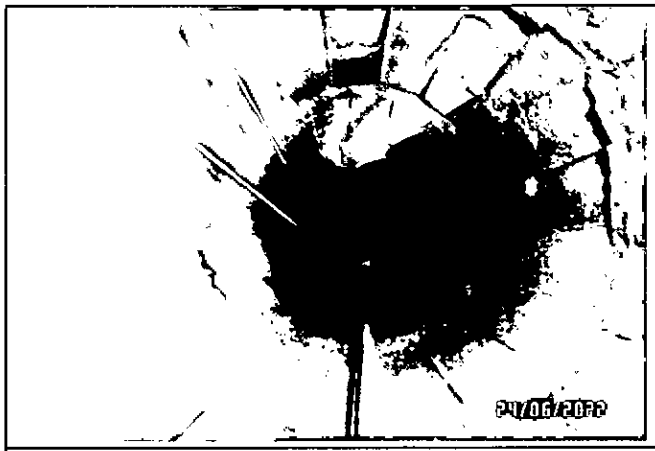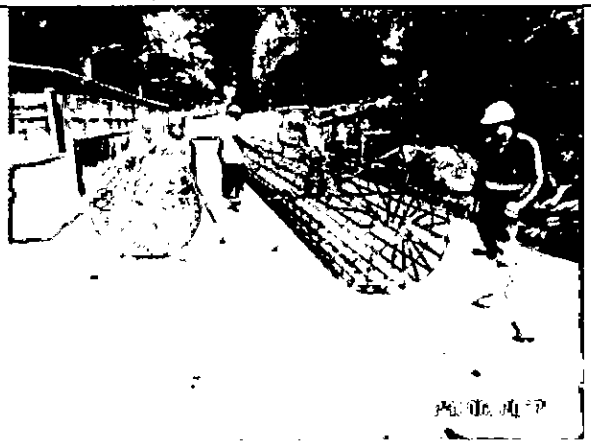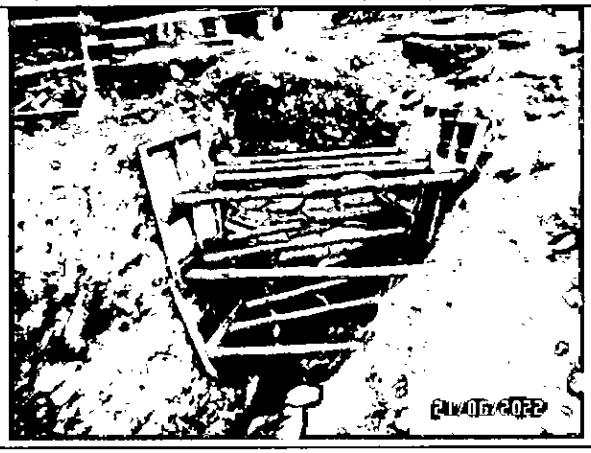	
Excavación manual de las pilas con uso de motobombas para abatir nivel freático.	Excavación manual de las pilas 7 y 8 del eje 4 del puente, margen derecho del río.
	
Armado de acero de refuerzo principal (canastas) para las pilas de los estribos de los ejes 1 y 4 del puente.	Corte y figurado de acero para refuerzo principal de pilas de los ejes 1 y 4 del puente.
	
Entibado en madera y champeado de mortero para protección de taludes en desvío provisional de alcantarillado.	Retiro de postes de concreto y accesorios de alumbrado público que interfieren con el trazado del proyecto, realizado por la empresa municipal.

6. CONCLUSIONES.

- El contratista de obra tramitará el acta N° 02 por un valor de $47.687.460[2], correspondiente al mes de junio de 2022; el valor ejecutado acumulado es de $123.108.603[3], correspondiente al 4.04% del valor del contrato de obra. Actualmente el contratista de obra solo ha tramitado y facturado el acta de obra N° 01 por valor de $ 75.421.145.
- La interventoría tramitará el acta N° 02 por un valor de $29.238.571, correspondiente al mes de junio de 2022; el valor ejecutado acumulado es de $56.802.058, correspondiente al 24.65% del valor del contrato de interventoría. Actualmente la interventoría no ha tramitado ninguna cuenta referente a este contrato.
- El plazo de ejecución del contrato de obra es de 7 meses (215 días calendario), de los cuales, al 30 de junio de 2022, habían transcurrido 60 días, lo cual representa un 27.91% de avance en tiempo para el contrato de obra. Para el caso de la interventoría, el plazo contractual son 8 meses (246 días calendario) y a corte del presente informe mensual, había transcurrido el 24.39% del plazo.
- Durante el periodo de este informe, se presentaron 22 horas de lluvias durante los periodos laborados en jornada diurna (14 días); además de 21 días con lluvia en la jornada nocturna. Las lluvias diurnas se presentaron en el 58% de los días laborados (24 días), afectaron mayormente los trabajos de la excavación manual de las pilas de cimentación del puente, debido a que durante las lluvias se suspendían los trabajos de excavación; para ello el contratista de obra implementó unas carpas en cada una de las pilas donde se realizan trabajos en aras de que en caso de lluvias leves o precipitaciones de tiempos cortos, esta actividad no se frene, sabiendo que es una ruta crítica del proyecto.
- A la fecha el contratista de obra no ha presentado los certificados de calidad de los materiales usados durante el mes de junio de 2022, como lo son del acero de refuerzo principal de las pilas de los estribos del puente, cemento Cemex tipo estructural, arena y triturado para concretos
- A la fecha el contratista de obra no ha presentado los resultados de laboratorio de los cilindros de concreto a los 28 días, de las muestras tomadas en el mes de mayo de 2022.

JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
Director de Interventoría.
Mario Gil Cardona – Contratista de interventoría.

[2] Acta de obra en conciliación, el valor puede variar.
[3] Ibídem.

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

COMPROBANTES DE PAGO

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 - 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
IDENTIFICACIÓN:	70.8[illegible]2.443
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 3.208.263,5	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 256.662
TOTAL DEVENGADO	$ 3.208.263,5	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 256.662

NETO PAGADO	$ 2.951.606,5

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

Jaime A. Herrera E.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 31 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
IDENTIFICACIÓN:	70.812.443
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 3.208.268,5	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 256.662
TOTAL DEVENGADO	$ 3.208.268,5	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 256.662

NETO PAGADO	$ 2.951.606,5

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

Jaime A. Herrera E.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR	
MGC	
PERÍODO DE PAGO	
16 AL 31 DE MAYO DE 2022	
CENTRO DE COSTO/ OBRA	
PUENTE BARBOSA	

NOMBRE EMPLEADO:	ROBINSON JAIR RAMIREZ F
IDENTIFICACIÓN:	1102366219
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.950.000	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 156.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.950.000	TOTAL DEDUCCIONES	- 156.000

NETO PAGADO	$ 1.794.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Robinson Ramirez

C.C. 1.102'366.219

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	ROBINSON JAIR RAMIREZ F
IDENTIFICACIÓN:	1102366219
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.950.000	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 156.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.950.000	TOTAL DEDUCCIONES	156.000

NETO PAGADO	$ 1.794.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Robinson Ramirez

C. C. 1.102'366.219

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	SANDRA LILIANA CHAVARRÍA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN:	43189772
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 2.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 160.000
TOTAL DEVENGADO	$ 2.000.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 160.000

NETO PAGADO	$ 1.840.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Sandra Chavarría Z.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 31 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	SANDRA LILIANA CHAVARRÍA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN:	43189772
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 2.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 160.000
TOTAL DEVENGADO	$ 2.000.000	TOTAL DEDUCCIONES	$ 160.000

NETO PAGADO	$ 1.840.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Sandra Chavarría Z.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERIODO DE PAGO
1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	ALEJANDRO GIL POSADA
IDENTIFICACIÓN:	1037611337
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 500.000	SEGURIDAD SOCIAL	40.000
TOTAL DEVENGADO	$ 500.000	TOTAL DEDUCCIONES	$ 40.000

NETO PAGADO	$ 460.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 31 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	ALEJANDRO GIL POSADA		
IDENTIFICACIÓN:	1037611337		
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 500.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 40.000
TOTAL DEVENGADO	$ 500.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 40.000

NETO PAGADO	$ 460.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.



COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR	MGC
PERÍODO DE PAGO	1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA	PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JOSE LUIS BOTERO BETANCUR
IDENTIFICACIÓN:	71385359
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 100.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $100.000

NETO PAGADO	$ 1.150.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 71 385 859

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 31 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JOSE LUIS BOTERO BETANCUR
IDENTIFICACIÓN:	71385659
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 100.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $100.000

NETO PAGADO	$ 1.150.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 71385659

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	HERNANDO GONZALEZ HENAO
IDENTIFICACIÓN:	71613284
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 20.000
TOTAL DEVENGADO	$ 250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $20.000

NETO PAGADO	$ 230.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 31 DE MAYO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	HERNANDO GONZALEZ HENAO
IDENTIFICACIÓN:	71613284
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 20.000
TOTAL DEVENGADO	$ 250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $20.000

NETO PAGADO	$ 230.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
IDENTIFICACIÓN:	70.812.443
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 3.208.268,5	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 256.662
TOTAL DEVENGADO	$ 3.208.268,5	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 256.662

NETO PAGADO	$ 2.951.606,5

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

Jaime A. Herrera E.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JAIME ALBERTO HERRERA ECHEVERRI
IDENTIFICACIÓN:	70.812.443
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 3.208.268,5	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 256.662
TOTAL DEVENGADO	$ 3.208.268,5	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 256.662

NETO PAGADO	$ 2.951.606,5

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

Jaime A. Herrera E.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	ROBINSON JAIR RAMIREZ F
IDENTIFICACIÓN:	1102366219
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.950.000	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 156.000
TOTAL DEVENGADO	**$ 1.950.000**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**- 156.000**

NETO PAGADO	**$ 1.794.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Robinson Ramirez 1.102'366.219

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	ROBINSON JAIR RAMIREZ F
IDENTIFICACIÓN:	1102366219
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES POR:**	
SUELDO	$ 1.950.000	SEGURIDAD SOCIAL	- $ 156.000
TOTAL DEVENGADO	**$ 1.950.000**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**- 156.000**

NETO PAGADO	**$ 1.794.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Robinson Ramirez
Firma y C.C. 1.102'366.219

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
IMGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	SANDRA LILIANA CHAVARRÍA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN:	43189772
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 2.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 160.000
TOTAL DEVENGADO	$ 2.000.000	TOTAL DEDUCCIONES	$ 160.000

NETO PAGADO	$ 1.840.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Sandra Chavarría Z.

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
T MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	SANDRA LIL ANA CHAVARRÍA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN:	43189772
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 2.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 160.000
TOTAL DEVENGADO	$ 2.000.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $ 160.000

NETO PAGADO	$ 1.840.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago

Firma y C.C.

Sandra Chavarría Z

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA


NOMBRE EMPLEADO:	ALEJANDRO GIL POSADA		
IDENTIFICACIÓN:	1037611337		
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES POR:**	
SUELDO	$ 500.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 40.000
TOTAL DEVENGADO	**$ 500.000**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**- $ 40.000**

NETO PAGADO	**$ 460.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.



COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA


NOMBRE EMPLEADO:	JOSE LUIS BOTERO BETANCUR
IDENTIFICACIÓN:	71385659
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 100.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $100.000

NETO PAGADO	$ 1.150.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 71.385.659

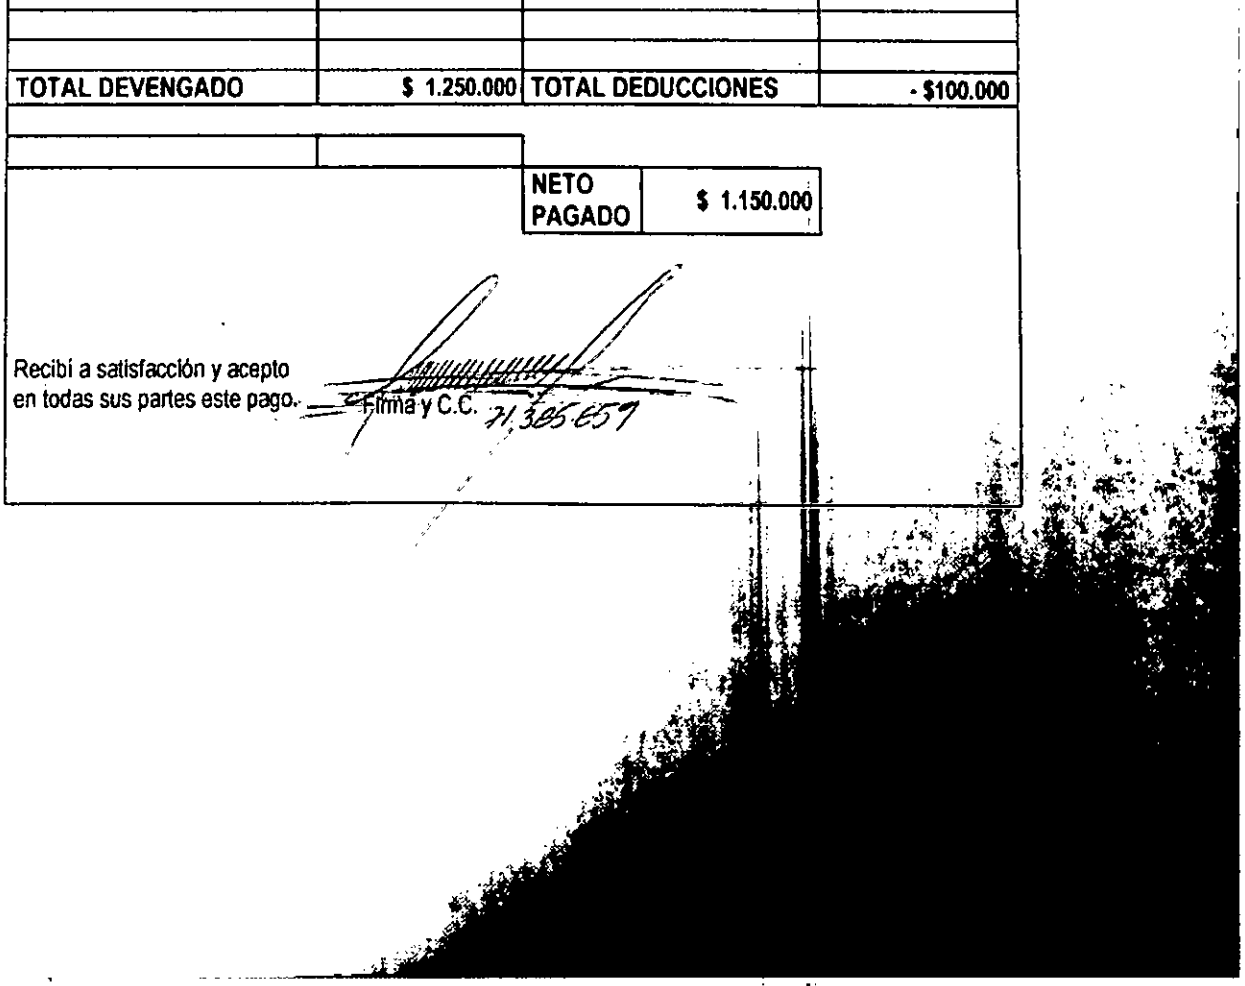

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	JOSE LUIS BOTERO BETANCUR
IDENTIFICACIÓN:	71385569
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 1.250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 100.000
TOTAL DEVENGADO	$ 1.250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $100.000

NETO PAGADO	$ 1.150.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma y C.C. 71.385.569

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
1 AL 15 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	HERNANDO GONZALEZ HENAO
IDENTIFICACIÓN:	71613284
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 20.000
TOTAL DEVENGADO	$ 250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $20.000

NETO PAGADO	$ 230.000

Recibi a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.



COMPROBANTE DE NOMINA

EMPLEADOR
MGC
PERÍODO DE PAGO
16 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE COSTO/ OBRA
PUENTE BARBOSA

NOMBRE EMPLEADO:	HERNANDO GONZALEZ HENAO
IDENTIFICACIÓN:	71613284
CUENTA BANCARIA	DAVIVIENDA

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES POR:	
SUELDO	$ 250.000	SEGURIDAD SOCIAL	- 20.000
TOTAL DEVENGADO	$ 250.000	TOTAL DEDUCCIONES	- $20.000

NETO PAGADO	$ 230.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Hernando Gonzalez H.

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

ACTA DE INTERVENTORÍA NRO 1

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 – 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

ALCALDIA
Barbosa - Antioquia

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 **DEL MES DE** JULIO **DEL AÑO** 2022

CONTRATO No. 000255 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO : Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción del Puente Vehicular y Peatonal sobre el Río Medellín en el sector de La Estación del Municipio de Barbosa - Antioquia, a todo costo incluye materiales, transporte, mano de obra calificada y no calificada y demás gastos e impuestos locales y nacionales en los que deba incurrir para la ejecución del mismo el futuro contratista de acuerdo con el convenio interadministrativo Número 756 del 2021 suscrito

VALOR DEL CONTRATO: $ 230.421.794,00

CONTRATISTA MARIO DE JESUS GIL CARDONA

INTERVENTOR

PLAZO DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

VIGENCIA: 2 DE ENERO DE 2023

En Barbosa a los un (1) días del mes de Julio de 2022 se reunieron Mario de Jesús Gil Cardona, representante legal del contratista y Carolina Sossa Arango, supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial según condiciones que se detallan a continuación:

GRUPO AJUSTE	ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. MODIF. DE		OBRA EJECUTADA				OBRA FALTANTE	
											PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	PRESTACIÓN	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	1	Costos Directos de Personal														
	1.1	Director	mes	8	$ 4.600.000	1,5	100%	$ 55.200.000			1,97	$ 13.593.000	1,97	$ 13.593.000	6,03	$ 41.607.000
	1.2	Residente	mes	8	$ 3.800.000	1,5	100%	$ 45.600.000			1,97	$ 11.229.000	1,97	$ 11.229.000	6,03	$ 34.371.000
	1.3	Residente ambiental	mes	8	$ 3.500.000	1,5	10%	$ 4.200.000			1,97	$ 1.034.250	1,97	$ 1.034.250	6,03	$ 3.165.750
	1.4	Residente Social	mes	8	$ 3.500.000	1,5	10%	$ 4.200.000			1,97	$ 1.034.250	1,97	$ 1.034.250	6,03	$ 3.165.750
	1.5	Residente SST	mes	8	$ 2.100.000	1,5	100%	$ 25.200.000			1,97	$ 6.205.500	1,97	$ 6.205.500	6,03	$ 18.994.500
	1.6	Ingeniero Revisor Estructural	mes	8	$ 5.000.000	1,5	20%	$ 12.000.000			1,97	$ 2.955.000	1,97	$ 2.955.000	6,03	$ 9.045.000
	1.7	Ingeniero Especialista en Hidráulica	mes	8	$ 1.590.657	1,5	10%	$ 1.908.789			0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.908.789
		SUBTOTAL						$ 148.308.789				$ 36.051.000		$ 36.051.000		$ 112.257.789
	2.	Personal de apoyo														
	2.1	Contador	mes	8	$ 1.200.000	1,52	5%	$ 729.600			1,97	$ 179.664	1,97	$ 179.664	6,03	$ 549.936
	2.2	Auxiliar de oficina	mes	8	$ 1.000.000	1,76	5%	$ 704.000			1,97	$ 173.360	1,97	$ 173.360	6,03	$ 530.640
		SUBTOTAL						$ 1.433.600				$ 353.024		$ 353.024		$ 1.080.576
	3.	otros gastos														
	3.1	Costos de oficina principal (arrendamiento y servicios)	mes	8	$ 2.000.000		5%	$ 800.000			1,97	$ 197.000	1,97	$ 197.000	6,03	$ 603.000
	3.2	Papelería (procesos e informes)	mes	8	$ 80.000			$ 640.000			1,97	$ 157.600	1,97	$ 157.600	6,03	$ 482.400
	3.3	Campamento u oficina en obra	mes	8	$ 500.000			$ 4.000.000			1,97	$ 985.000	1,97	$ 985.000	6,03	$ 3.015.000
		SUBTOTAL						$ 5.440.000				$ 1.339.600		$ 1.339.600		$ 4.100.400
	4.	Gastos de legalización														
	4.1	Pólizas	0,30%					$ 691.264				$ 691.264		$ 691.264		$ -
	4.1	Estampillas	9,50%					$ 18.394.975				$ 4.529.763		$ 4.529.763		$ 13.865.213
	4.2	Honorarios	10,00%					$ 19.383.132				$ 4.768.171		$ 4.768.171		$ 14.594.961
		SUBTOTAL						$ 38.449.371				$ 9.989.198		$ 9.989.198		$ 28.460.173
								COSTO DIRECTO TOTAL :	$ 193.631.760			$ 47.732.822		$ 47.732.822		$ 145.898.938
								ADJ (___ %) Costos Indirectos :	0			0		0		0
								COSTO TOTAL OBRAC :	$ 193.631.760			$ 47.732.822		$ 47.732.822		$ 145.898.938
								IVA (19%) :	$ 36.790.034			$ 9.069.236		$ 9.069.236		$ 27.720.798
								VALOR TOTAL OBRAS INCLUIDO IVA :	$ 230.421.794			$ 56.802.058		$ 56.802.058		$ 173.619.736

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA : CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
(En letras)

OBSERVACIONES:

Nota: El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron.

(Firma)
(Nombre) MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Contratista

(Firma)
(Nombre) CAROLINA SOSSA ARANGO
Secretaria de Obras Públicas

Original: Oficina Jurídica
cc Central Única de Cuentas - Contratista - Interventor - Unidad Ejecutora

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 51 Nro. 51-17 Of. 700 Edificio Henry - Teléfono: 511 74 32 - 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

Medellín, julio de 2022

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Los Suscritos, **BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA** en su calidad de Contadora y **MARIO DE JESÚS GIL CARDONA**, hace saber que el ingeniero **MARIO DE JESUS GIL CARDONA con NIT. 8291216-0**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Beatriz Eugenia Alzate Molina
Matr. Profe. 142624-T
C.C. 24.415.482

Mario de Jesús Gil Cardona
Representante Legal
C.C. 8.291.216 Medellín

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
24415482

ALZATE MOLINA

BEATRIZ EUGENIA


Beatriz E. Alzate





FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1984
APIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-FEB-2003 APIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



A-1430800-54115712-M-24415482-20030612 0692103161A 02 1287149.10

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

142624-T



BEATRIZ EUGENIA
ALZATE HOLGUIN
C.C. 24415[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 145 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD SUR/UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORTES RODRIGUEZ 153046

FIRMA DEL TITULAR 6543A

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B Z 0 0 8 8 7 1 2 5 E 6 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24415482 de APIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 142624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SEGURO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 003212 FECHA 1 2 20

Por la cual se resuelve una Solicitud
En el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida

EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL ANTIOQUIA

EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 4113 DE 1.995, EMANADA DE LA PRESIDENCIA DEL ISS, Y

CONSIDERANDO

Que el 27 de Agosto de 2009 presentó solicitud de prestación económica por vejez el(la) asegurado(a) **MARIO DE JESUS GIL CARDONA**, identificado(a) con c.c. N° 8.291.216, fecha de nacimiento 19 de Junio de 1948, Afiliación N° 020715981 de la Seccional Antioquia.

Que consultado el archivo de solicitantes de Bono Tipo A, se estableció que la(el) señor(a) **GIL CARDONA** se trasladó al Fondo Privado de Pensiones, verificándose con ello la selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Que a través de ODA No 10/21104 de 26 de Octubre de 2010, la oficina de devolución de aportes de este Instituto envía el detalle de los aportes devueltos por la AFP privada del señor(a) **GIL CARDONA**.

Que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 en el inciso 5° establece "...*Tampoco será aplicable el régimen de transición para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de Prima media con prestación definida*".

Al respecto, el Memorando 130001545 del 21 de Junio de 2010 emanado de la Vicepresidencia de Pensiones de este Instituto expresa: "... para la recuperación del régimen de transición en los casos en los que exista traslado proveniente del Régimen de Ahorro Individual — RAIS, *en observancia al reciente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia SU — 062 del 03 de febrero de 2010.*

En dicha providencia la Corte Constitucional reitera la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en la Sentencia C-789 de 2002, aclarando que es necesario verificar la rentabilidad producida en los dos regímenes, es decir en el de Ahorro Individual y en el de Prima Media con Prestación Definida.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, es del caso advertir que en adelante para la conservación del régimen de transición en los casos de traslado del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación definida, se deberá observar lo establecido en la sentencia C-789 de 2002, en concordancia con el Decreto 692 de 1994, el Decreto 3995 de 2008 y especialmente la Sentencia SU 062 de 2010, razón por la que deberá exigirse:
a) Haber cotizado durante 15 años o más al entrar en vigencia el sistema de pensiones, es decir 01 de abril de 1994. La anterior fecha puede variar a 30 de junio de 1995, o la fecha de entrada en vigencia de la entidad territorial, según corresponda, en el caso de servidores públicos del orden territorial.

b) Se traslade al Régimen de Prima Media todo el ahorro que el asegurado había efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad, incluidos los rendimientos obtenidos en el RAIS.

c)En el traslado de los recursos del RAIS al RPM se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

d) Dicho ahorro no sea inferior al monto total de aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media incluidos los rendimientos que se hubieran obtenido en el mismo.

Hechas las validaciones de los literales antes mencionados por parte de la Oficina de Devolución de Aportes y revisado el requisito de los 15 años de cotización anteriores al 01 de Abril de 1994 fecha en la que entra en vigencia la Ley 100 de 1993 se encuentra que el asegurado tiene cotizados un total de 910 semanas por lo que si le es posible al asegurado recuperar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de a ley 100 de 1993.

No obstante lo anterior, es importante señalar que no obra en el expediente el cálculo aritmético emitido por la Oficina de Devolución de aportes de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, donde se defina si el solicitante se encuentra o no inmerso en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual se procede a estudiar la pensión de vejez según lo señalado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, siendo posible estudiar la viabilidad de la reliquidación de la prestación de forma oficiosa o a solicitud de parte, una vez se allegue la certificación en mención.

Que según lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, se requiere para acceder a la pensión de vejez, haber cumplido 55 años si es mujer o 60 años si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. Número de semanas que se incrementarán a partir del 01 de Enero de 2005 en 50 y a partir del 01 de Enero de 2006 se incrementarán en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.

Que revisado el reporte de semanas, expedido por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales, se encontró que el señor(a) **GIL CARDONA** cotizó durante toda su vida laboral un total de 1.434 semanas.

Que en atención al Memorando VP No 00015038 del 1 de Octubre de 2004 en el cual se refiere al alcance del Memorando VP No 10242 del 15 de Julio de 2004 –[OBLIGACIÓN DE APORTAR DOCUMENTOS DE AFILIACION A SALUD PARA TRAMITAR PENSION ANTE EL ISS- en alusión al Decreto 510 de 2003, se establece que "(...) cuando se trate de un servidor público afiliado al ISS pensiones que desea radicar la solicitud de pensión, que no se encuentra afiliado al ISS salud, sino a otra EPS, no se deberá exigir certificación de aportes realizados en salud, teniendo en cuenta que las entidades públicas por norma legal realizan los aportes en salud, pensiones y riesgos por el mismo valor".

Que en el caso concreto del asegurado **GIL CARDONA**, se cumplen las condiciones anteriormente indicadas para adquirir el derecho, razón por la cual se concluye que es procedente acceder a su reconocimiento.

Que según el artículo 3 del Decreto 758 de 1990 aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, la pensión de vejez se reconocerá a solicitud de la parte interesada, reunidos los requisitos mínimos, pero será necesario la desafiliación del régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma y teniendo en cuenta para la liquidación hasta la última semana cotizada por este riesgo. (DEPENDIENTE)

En el caso concreto del asegurado(a **GIL CARDONA**, conforme con la historia laboral se observa que la última cotización la realizo con el empleador IDEA NIT 890980179, efectuando su última cotización en ciclo 2004/12 y observando los últimos 4 años anteriores a esta cotización, no se encuentra pendiente ningún retiro con otro empleador, lo que da lugar a liquidar el retroactivo a partir del cumplimiento de la edad.

Que para efectos de la liquidación se tuvo en cuenta el promedio de lo devengado o cotizado por el asegurado durante toda su vida laboral hasta la fecha de la última cotización; los cuales se trajeron a valor actual, arrojando un ingreso base de liquidación de $7.831.959 por las cotizaciones efectuadas en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad, y un ingreso base de liquidación de $5.540.152 por las cotizaciones efectuadas durante toda la vida laboral, siendo lo cotizado durante los últimos 10 años el más favorable, al cual se le aplicó el 66.01% por tener 1.434 semanas cotizadas al ISS, dando un monto inicial de pensión de $ 5.169.876.oo, a partir del 19 de Junio de 2008.

Que según lo establecido en el artículo 8, literal d) de la ley 797 de 2003, los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia en un 1% que corresponde en el caso concreto del asegurado **GIL CARDONA** a $ 1.961.463.oo, el cual se descontará del valor girado por concepto de retroactivo.

Que en consecuencia,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Conceder prestación económica de vejez al(a la) asegurado(a) **MARIO DE JESUS GIL CARDONA**, identificado(a) con c.c. N° 8.291.216, fecha de nacimiento 19 de Junio de 1948, Afiliación N° 020715981 de la Seccional Antioquia, a partir del 19 de Junio de 2008 en cuantía mensual de $5.169.876 más los reajustes anuales de ley.

Que se adeuda por concepto de retroactivo desde el dia 19 de Junio de 2008 hasta el día 28 de Febrero de 2011, la suma de $ 196.146.310.oo, al cual se le descontara el 1% para el Fondo de

SEGURO SOCIAL

Libertad y Orden

BICENTENARIO 1810-2010

RESOLUCIÓN N° FECHA

Por la cual se resuelve una Solicitud
En el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida

Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia que corresponde en el caso concreto del asegurado **GIL CARDONA** a $ 11.961.463.oo.según lo establecido en el artículo 8, literal d) de la ley 797 de 2003 para los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20), para un retroactivo adeudado de **$194.184.847.**

El valor de la pensión se generó con un Ingreso Base de liquidación de $7.831.959, un porcentaje de liquidación del 66.01% y un total de 1.434 semanas cotizadas.

La consignación de la mesada pensional y el retroactivo se hará a través de BANCO DE BOGOTA SUCURSAL ESTADIO, en la nómina de MARZO DE 2011 pagadera en el mes de ABRIL DE 2011.

PARAGRAFO El ingreso de la prestación económica en la nómina anteriormente citada, esta condicionada a no presentarse inconsistencias en los cruces de bases de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Multivinculados, Devolución de Aportes, Pago de otra Pensión, etc. De presentarse inconsistencia, la prestación económica y las mesadas adeudadas serán ingresadas en la nómina de pensionados inmediatamente siguiente o en la nómina en la cual se subsane la inconsistencia. Se informa que el ISS elabora la nómina de pensionados para todo el Nivel Nacional con dos meses de antelación, no siendo viable la inclusión de prestaciones en nóminas ya cerradas.

ARTICULO SEGUNDO Se ordena realizar los descuentos de salud respectivos para la EPS CAFESALUD .

ARTICULO TERCERO Solicitar el Cálculo aritmético a la Oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones y que se pronuncie acerca de si el asegurado **MARIO DE JESUS GIL CARDONA**, conserva el régimen de Transición de acuerdo al Memorando 130001545 del 21 de Junio de 2010 de la Vicepresidencia de Pensiones.

ARTICULO CUARTO Reconocer personería al Dr GERMAN GIRALDO RAMIREZ con TP No 28.548 del CS de la J.

ARTICULO QUINTO Contra la presente Resolución proceden los Recursos de Reposición ante el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado y de Apelación ante la Gerencia Seccional de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTICULO QUINTO Una vez notificada la presente resolución se ordena la devolución del expediente a la Oficina de alistamiento de este Instituto para

SEGURO SOCIAL

BICENTENARIO

RESOLUCIÓN N° 003212 FECHA

Por la cual se resuelve una Solicitud
En el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida

efectos de que una vez se allegue el Cálculo aritmético de la Oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones, se traslade nuevamente el expediente al Departamento de Atención al pensionado a efectos de realizar si resulta procedente la reliquidación de la prestación económica otorgada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en MEDELLIN, a los _____ días del mes de _____ de 201

EBINTON BRAYAN RIVAS
Jefe Departamento de Atención al Pensionado

NOTA: En caso de que la presente resolución no pueda notificarse personalmente al interesado, se notificará mediante edicto. Esta notificación por edicto surte todos los efectos legales.
Proyectó: Edna Mezá.

ARUS®
Tecnología e información • Compromiso

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-08, 08:41:29 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 56259114

Periodo Cotización 202206 Periodo Servicio 202205

PAGADA 2022-06-06 13:25:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	Dirección	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 8291216										
Tipo Cotizante	Subtipo					N	GIL CARDONA MARIO DE JESUS	5001000 - 05		ANTIOQUIA
59	02									

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Ing	Ret	Sal. mes	Pensión					Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	0	30	30	30			NINGUNO		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPSS10		12.5 %	$ 25 000 000	$ 3 125 000	$ 0	14	3	2.436 %	$ 25 000 000	$ 609 000	CCF04	0.6 %	$ 25 000 000	$ 150 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.125.000	$ 609.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.884.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología · Información · Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-06, 03:45:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 56936793

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 06/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA		
Documento	CC8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8291216	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	59	02																		0	0	30	30	(14N-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 25.000.000	$ 3.125.000	2,436	$ 25.000.000	$ 609.000	(CCF04) COMFAMA	$ 25.000.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.884.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 3.125.000	$ 609.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.884.000	$ 0	$ 3.884.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-09, 08:38:27 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56256265

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-08 10:11:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70812443		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					HERRERA ECHEVERRI JAIME ALBERTO	5686000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DÍas AFP	DÍas EPS	DÍas ARP	DÍas CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			V	$ 6.416.537	25-14		16 %	$ 6.416.537	$ 1.026.700	$ 32.100	$ 32.100	EPS010		4 %	$ 6.416.537	$ 256.700	$ 0	14-4	5	6.960 %	$ 6.416.537	$ 446.600	CCF04	4 %	$ 6.416.537	$ 256.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.026.700	$ 32.100	$ 32.100	$ 256.700	$ 446.600	$ 256.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.050.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-21, 11:19:56 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56255934

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-06 13:29:21.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				S	RAMIREZ FORERO ROBINSON JAIR	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-21, 08:25:34 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56670560

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-21 08:20:48.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037611337		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL POSADA ALEJANDRO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-09, 10:04:19 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56255978

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-09 08:44:17.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43189772		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIA ZAPATA SANDRA LILIANA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 4 000 000	230201		16 %	$ 4 000 000	$ 640 000	$ 20 000	$ 20 000	EPS010		4 %	$ 4 000 000	$ 160 000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 4 000 000	$ 278 400	CCF04	4 %	$ 4 000 000	$ 160 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 160.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-21, 11:20:43 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56256809

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-08 10:22:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71385659		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BOTERO BETANCUR JOSE LUIS	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
SNO	BET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VET	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IDC	Total Aporte AFP	Total Aporte Prom.	Total Aporte Fondo	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IDC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IDC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IDC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30			V	$ 2 500 000	230001		16 %	$ 2 500 000	$ 400 000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2 500 000	$ 100 000	$ 0	14-4	5	6.960 %	$ 2 500 000	$ 174 000	CCF04	4 %	$ 2 500 000	$ 100 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 174.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-06-21, 11:19:07 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56255978

Periodo Cotización 202205 **Periodo Servicio** 202206

PAGADA 2022-06-09 08:44:17.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71613284		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ HENAO HERNANDO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:14:56 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56455352

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-07-13 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70812443		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					HERRERA ECHEVERRI JAIME ALBERTO	5686000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:19:29 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 56937587

Periodo Cotización 202206 Periodo Servicio 202207

PAGADA 2022-07-06 15:41:23.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	Dirección	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				S	RAMIREZ FORERO ROBINSON JAIR	5001000 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
																														Tarifa AFP	Aporte AFP	Tarifa FSP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Tarifa EPS	Aporte UPC	Tarifa ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	Aporte Riesgos	Tarifa CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:16:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56455959

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-07-13 09:51:44.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037611337		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GIL POSADA ALEJANDRO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa UPC	IBC UPC	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1 000 000	25-14		16 %	$ 1 000 000	$ 160 000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1 000 000	$ 40 000	$ 0	14-4	5	6.960 %	$ 1 000 000	$ 69 600	CCF04	4 %	$ 1 000 000	$ 40 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 69.600	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:46:28 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56482493

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-07-13 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43189772		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIA ZAPATA SANDRA LILIANA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30				230201		16 %	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 3.800.000	$ 264.500	CCF04	4 %	$ 3.800.000	$ 152.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:18:25 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56455959

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-07-13 09:51:44.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71385659		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BOTERO BETANCUR JOSE LUIS	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			230301		16 %	$ 2 500 000	$ 400 000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2 500 000	$ 100 000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2 500 000	$ 174 000	CCF04	4 %	$ 2 500 000	$ 100 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 174.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá. 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-13, 11:47:02 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 56482493

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-07-13 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO DE JESUS GIL CARDONA				
Documento	CC 8291216	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71613284		**Residente**		**Exonerado**	**S**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ HENAO HERNANDO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	30		F	$ 6 000 000	230301		16 %	$ 6 000 000	$ 960 000	$ 30 000	$ 30 000	EPS010		4 %	$ 6 000 000	$ 240 000	$ 0	14-1	5	0.980 %	$ 6 000 000	$ 417 600	CCF04	4 %	$ 6 000 000	$ 240 000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 240.000	$ 417.600	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MUNICIPIO DE BARBOSA

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** i dentificada con el número de documento **8291216** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 31 de julio de 2009 con la Cuenta Corriente 420-052805 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **11 de julio de 2022.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.261 **Fecha Contrato:** 03/02/2022

Contrato: CONTRATO DE INTERVENTORIA **Valor Contrato:** 230,421,794.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 8291216 GIL CARDONA MARIO DE JESUS

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA , AMBIENTAL, FINANCIERA, Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO MEDELLIN EN SECTOR DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA , A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES , TRANSPORTES MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y DEMAS GASTOS E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES EN LOS QUE DEBA INCURRIR PARA LA EJECUCION DEL MISMO EL FUTURO

CDPs: RA:-20211527

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL		**56,802,058.00**		
1	12/08/2022	24.65	56,802,058.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
		24.65	56,802,058.00			
