MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
ARQUITECTA

Neiva, 23 de enero de 2019 MHJG-MDN-020-2019

ACTA DE ENTREGA

OBJETO: REPAPAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA QUE CONSTA DE REPARACION DE APARATOS SANITARIOS, CUBIERTAS, PISOS, RED ELECTRICA, PINTURA Y VARIOS
N° CONTRATO: CONTRATO N° 1255 DE 2018
CONTRATISTA: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
VIGENCIA: 25 DE ENERO DE 2019

En Neiva, a los 24 días del mes de ENERO del 2019 , los suscritos al final de esta, nos reunimos con el fin hacer entrega y recibo, de las actividades de obra civil ejecutadas en el **BLOQUE HENRY GIROUX** de la institución educativa en las cuales se relacionan los siguientes espacios:

SEGUNDO PISO

Salón 11-12-13-14-15

- Instalación cielo pvc
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- pintura de pared salones.
- instalación de 12 lámparas led. 60x60 de 45 w en cada salón.
- instalación de 5 puntos de tomacorrientes para ventilador y televisor.
- Instalación de 1 interruptores doble por salón
- Cambio de puertas
- Aseo general

PASILLO SEGUNDO PISO

- Instalación cielo pvc con corta goteras en súper board
- Instalación 14 luminarias led de 9 w

- Instalación de 3 sensores de movimiento
- Tablero de 12 circuitos
- Emboquillado de piso
- Instalación de dispensador de agua frente a baños

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES

- Instalación cielo pvc
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- Instacion de lámparas hermética (6)
- Instalación de sensor (2)

PRIMER PISO

Salón 1-2-3-4-5

- Pintura techo
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- pintura de pared salones.
- instalación de 12 lámparas led 60x60 de 45 w con marcos de sobreponer (12) cada salon
- instalación de 5 puntos de tomacorrientes, ventilador y televisor.
- Instalación de 1 interruptores doble por salón
- Aseo general

PASILLO PRIMER PISO

- Instalación cielo pvc con corta goteras en súper board
- Instalación 14 luminarias led de 9 w
- Instalación de 3 sensores de movimiento
- Tablero de 12 circuitos


BAÑOS HOMBRES – MUJERES Y PROFESORES


- Instalación cielo pvc
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- Instacion de lámparas hermética (6)
- Instalación de sensor (2)


REGISTRO FOTOGRAFICO

PRIMERO Y SEGUNDO PISO

PINTURA PAREDES SALONES E INSTALACION DE LUMINARIAS

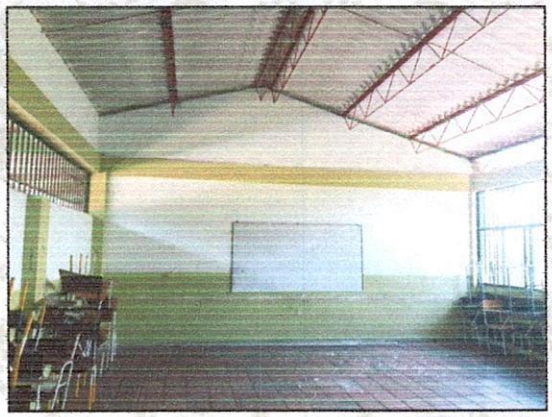


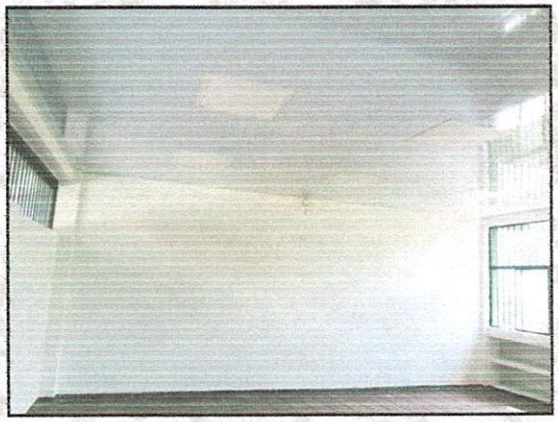


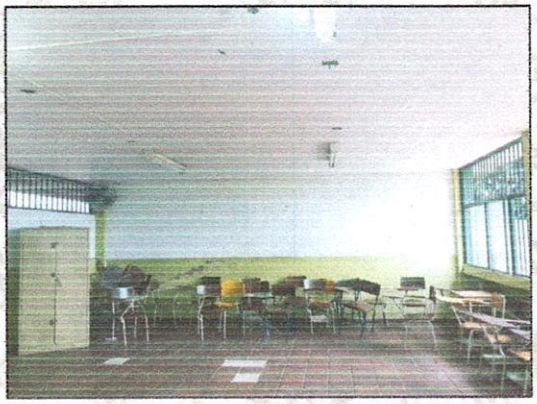




CAMBIO DE PUERTAS SALONES

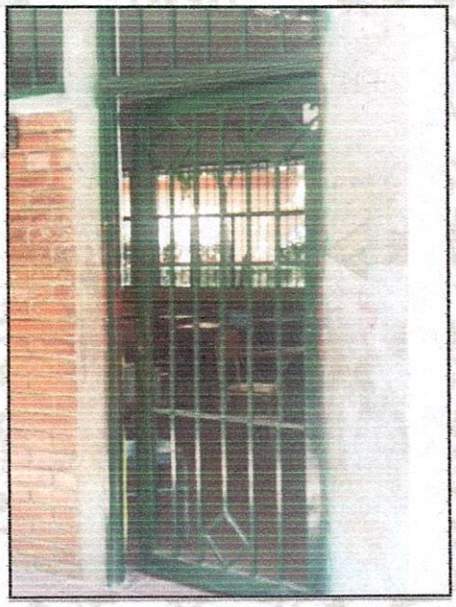


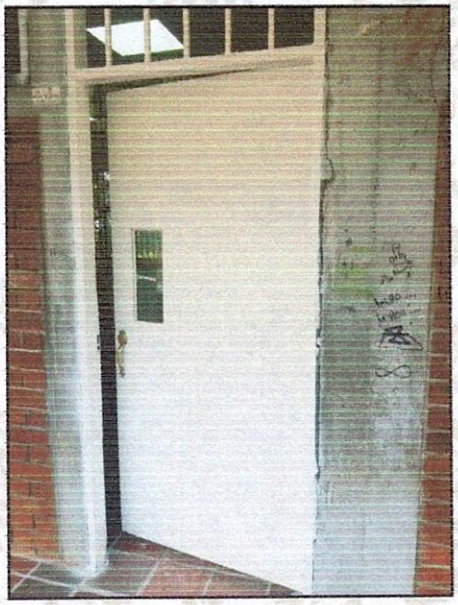


PASILLO PRIMER Y SEGUNDO PISO

INSTALACION DE CIELO PVC, LUMINARIAS LED, SENSORES, EMBOQUILLADA

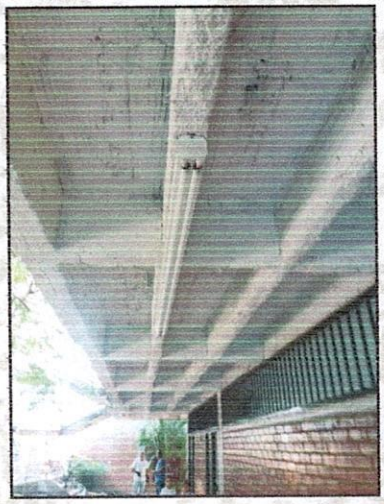

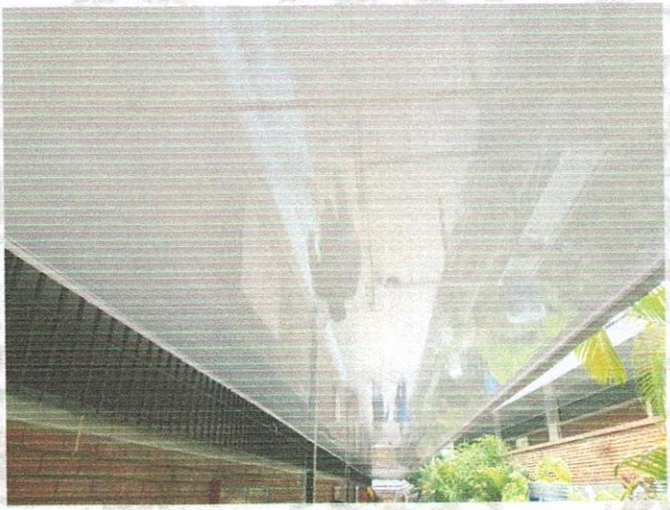




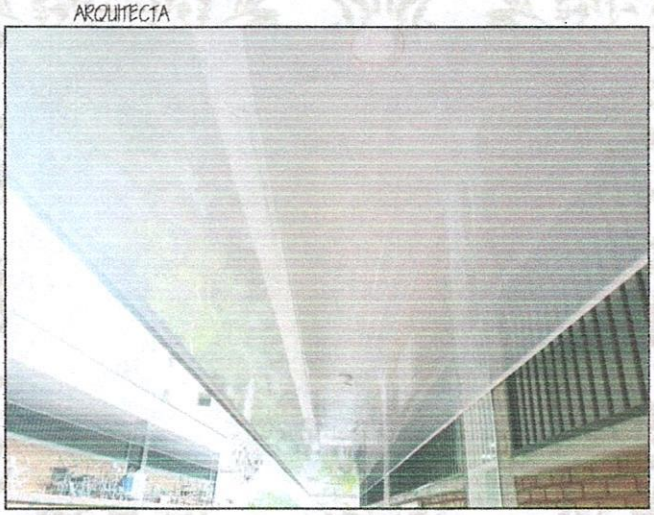

EMBOQUILLADA DE PISO



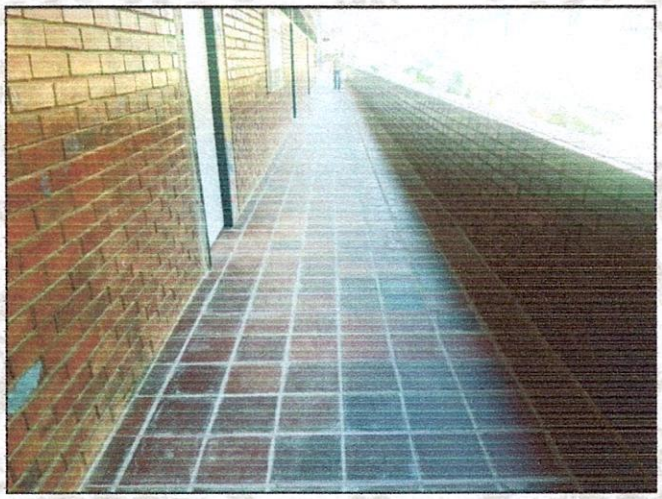

INSTALACION PVC EN BAÑOS E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS Y SENSORES









OBSERVACIONES:

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

YASAIRA MURIEL A
Residente de obra

LIBARDO PERDOMO
Rector Normal Superior Neiva

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
ARQUITECTA

Neiva, 23 de enero de 2019 MHJG-MDN-019-2019

ACTA DE ENTREGA

OBJETO: REPAPAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA QUE CONSTA DE REPARACION DE APARATOS SANITARIOS, CUBIERTAS, PISOS, RED ELECTRICA, PINTURA Y VARIOS
N° CONTRATO: CONTRATO N° 1255 DE 2018
CONTRATISTA: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
VIGENCIA: 25 DE ENERO DE 2019

En Neiva, a los 24 días del mes de ENERO del 2019 , los suscritos al final de esta, nos reunimos con el fin hacer entrega y recibo, de las actividades de obra civil ejecutadas en el **BLOQUE PETER MCLAREN** de la institución educativa en las cuales se relacionan los siguientes espacios:

SEGUNDO PISO

Salón 16-17-18-19-20

- Reforzamiento estructural techo en drywall
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- pintura de pared salones.
- instalación de 12 lámparas led. 60x60 de 45 w en cada salón.
- instalación de 5 puntos de tomacorrientes para ventilador y televisor.
- Instalación de 1 interruptores doble por salón
- Aseo general

PASILLO SEGUNDO PISO

- Instalación cielo pvc con corta goteras en súper board
- Instalación 14 luminarias led de 9 w
- Instalación de 3 sensores de movimiento

- Tablero de 12 circuitos
- Instalación de dispensador de agua frente a baños
- Muro en mampostería.
- **BAÑOS HOMBRES**
- Pintura paredes
- Instalación cielo pvc
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- Enchape de baño (pisos y paredes)
- Instalación de sanitarios (5)
- Instalación de orinales incluye grifería (3)
- mesón e Instalación de lavamanos incluye grifería (3)
- Instalación de puertas en acero inoxidable (5)
- Instacion de lámparas hermética (6)
- Instalación de sensor (2)
- Rejilla piso(1)
- Instalación de llave de paso (tapa) (1)
- Instalación y pintura de puerta reja (1)

BAÑOS MUJERES

- Pintura paredes
- Instalación cielo pvc
- Enchape de baño (pisos y paredes)
- Instalación de sanitarios (5)
- Mesón e instalación de lavamanos incluye grifería (3)
- Instalación de puertas en acero inoxidable (5)
- Instalación de puerta reja (1)
- Instacion de lámparas hermética (2)

- Instalación de sensor (2)
- Rejilla piso (1)
- Instalación de llave de paso (tapa) (1)
- Instalación y pintura de puerta reja (1)

BAÑOS PROFESORES

- Enchape pared y piso
- Instalación cielo pvc
- Instalación de rejilla piso (1)
- Instalación de sanitario (1)
- Instalación de lavamanos (1)
- Instalación de puerta reja (1)

LAVA TRAPEROS

- Enchape pared y piso
- Instalación cielo pvc
- Instalación de rejilla piso (2)
- Instalación De llave (1)

PRIMER PISO

Salón 6-7-8-9-10

- Pintura techo
- Instalaciones de tubería EMT y cable para funcionamiento de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- pintura de pared salones.
- instalación de 12 lámparas led 60x60 de 45 w con marcos de sobreponer (12) cada salon
- instalación de 5 puntos de tomacorrientes, ventilador y televisor.
- Instalación de 1 interruptores doble por salón
- Aseo general

PASILLO PRIMER PISO

- Instalación cielo pvc con corta goteras en súper board
- Instalación 14 luminarias led de 9 w
- Instalación de 3 sensores de movimiento
- Tablero de 12 circuitos
- Emboquillado de piso


BAÑOS HOMBRES – MUJERES Y PROFESORES


- Instacion de lámparas hermética (6)
- Instalación de sensor (2)

REGISTRO FOTOGRAFICO

PRIMERO Y SEGUNDO PISO

PINTURA PAREDES EN SALONES

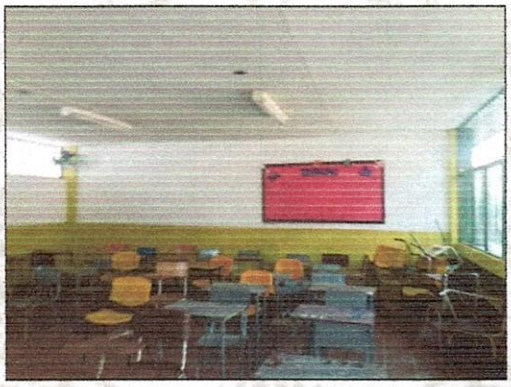

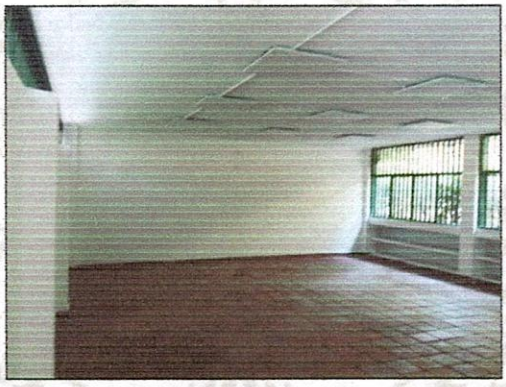





MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
ARQUITECTA

INSTALACION LAMPARAS LED







PASILLO PRIMERO Y SEGUNDO PISO

INSTALACION DE CIELO PVC, LUMINARIAS LED, SENSORES




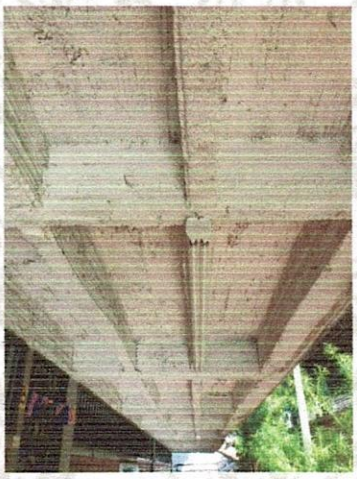

MURO MAMPOSTERIA



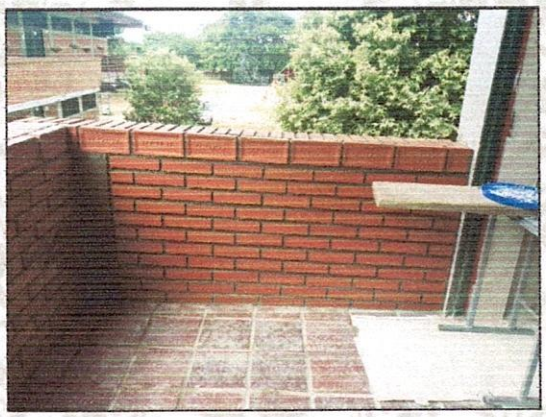

EMBOQUILLADO PISO - PRIMER PISO








MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
ARQUITECTA


BAÑOS HOMBRE- MUJERES SEGUNDO PISO

ENCHAPES PISO PARED, PINTURA, CAMBIO DE PUERTAS, LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES.

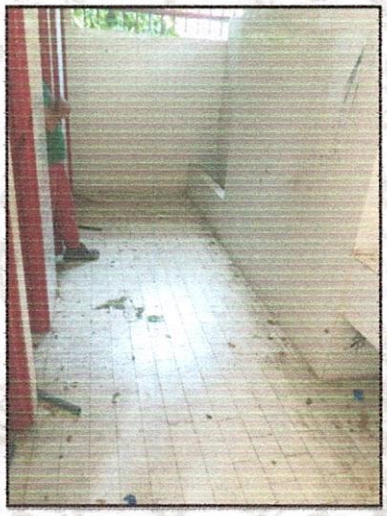

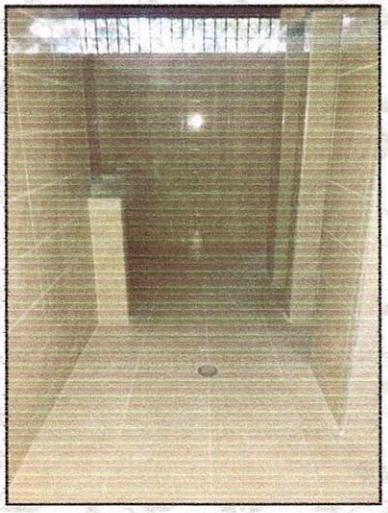

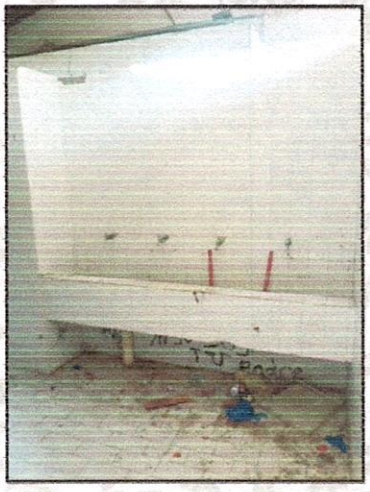


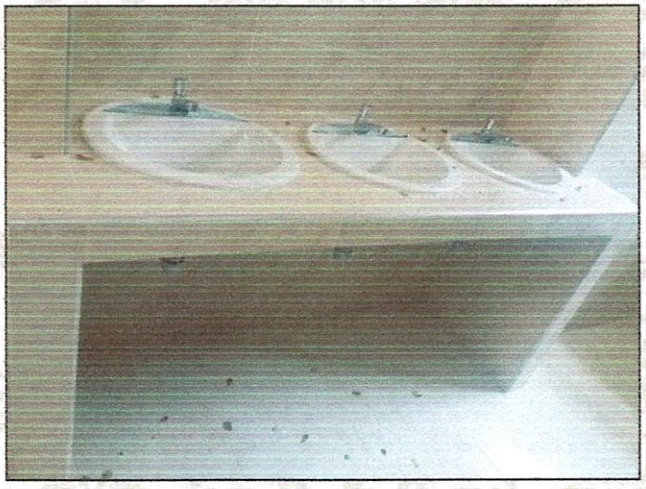







CAMBIO DE PUERTAS EN ACERO

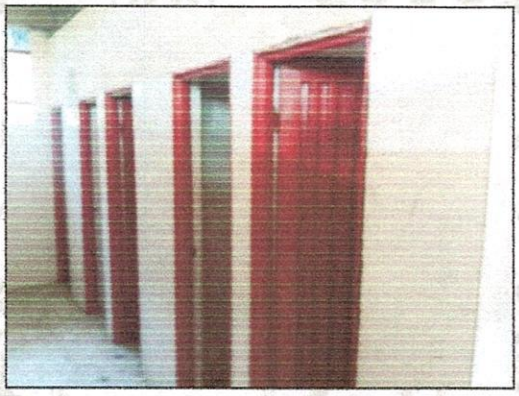



INSTALACION LAMPARAS HERMETICAS BAÑOS



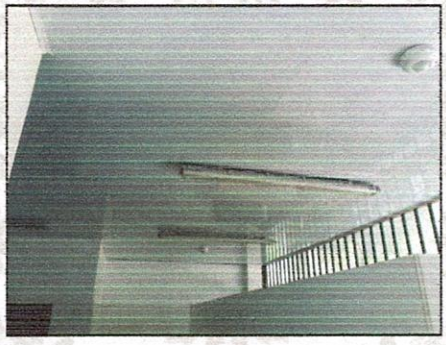

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

YASAIRA MURIEL A

Residente de obra

LIBARDO PERDOMO

Rector Normal Superior Neiva

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
ARQUITECTA

Neiva, 17 de enero de 2019 MHJG-MDN-010-2019

ACTA DE ENTREGA

OBJETO: REPAPAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA QUE CONSTA DE REPARACION DE APARATOS SANITARIOS, CUBIERTAS, PISOS, RED ELECTRICA, PINTURA Y VARIOS
N° CONTRATO: CONTRATO N° 1255 DE 2018
CONTRATISTA: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
VIGENCIA: 25 DE ENERO DE 2019

En Neiva, a los 15 días del mes de ENERO del 2019 , los suscritos al final de esta, nos reunimos con el fin hacer entrega y recibo, de las actividades de obra civil ejecutadas en el **BLOQUE PAULO FREIRE** de la institución educativa en las cuales se relacionan los siguientes espacios:

SEGUNDO PISO

Salón 21-22-23-24-25-26

- Instalación de cielo pvc,
- pintura de pared salones.
- instalación de lámparas led.12 cada salón.
- pintura zócalo,
- instalación de 5 puntos tomacorrientes para ventilador y televisor.
- instalación de puertas con vidrio.
- Instalación de vidrio ventanas (salón 26 y 25)
- pintura de ventanas.
- Instalación de 2 interruptores sencillos por salón
- Instalación de tubería para desagües de aire acondicionado.
- Instalación de guarda escoba (salón 26-21-22)
- limpieza de guarda escoba ,pisos y ventanas

PASILLO

- Instalación cielo pvc con corta goteras en súper board
- Instalación 14 luminarias
- Instalación de 3 sensores de movimiento
- Tablero de 24 circuitos

PRIMER PISO

BAÑOS HOMBRES

- Pintura paredes -techo
- Enchape de baño (pisos –paredes)
- Instalación de sanitarios (5)
- Instalación de orinales incluye grifería (3)
- Instalación de lavamanos incluye grifería (3)
- Instalación de puertas en acero inoxidable (5)
- Instacion de lámparas hermética (2)
- Instalación de sensor (1)
- Rejilla piso (2)
- Instalación de llave de paso (tapa) (1)

BAÑOS MUJERES

- Pintura paredes -techo
- Enchape de baño (pisos –paredes)
- Instalación de sanitarios (5)
- Instalación de lavamanos incluye grifería (3)
- Instalación de puertas en acero inoxidable (5)
- Instacion de lámparas hermética (2)

- Instalación de sensor (1)
- Rejilla piso (2)
- Instalación de llave de paso (tapa) (1)

BAÑOS PROFESORES

Enchape pared y piso

Pintura pared y techo

Instalación de interruptor (2)

Instalación de rejilla piso (2)

Instalación de lámpara led redonda 9W (2)

Instalación de sanitario (1)

Instalación de lavamanos (1)

SALON SALA DE SISTEMA 1 Y 2

- Pintura pared y cielo
- Lámparas herméticas funcionado (8) cada sala
- Puertas y ventanas pintadas
- Pintura de zócalo
- Limpieza guarda escoba y aseo general.

SALON BIBLIOTECA

- Pintura pared y cielo
- Lámparas herméticas funcionado (15)
- Puertas y ventanas pintadas
- Pintura de zócalo
- Limpieza guarda escoba y aseo general.

PASILLO PRIMER PISO

- Instalación de tablero trifásico de 18 circuitos
- instalación lámparas led 9w (10)
- instalación de sensor de movimiento (3)
- Instalación de guarda escoba y tableta granito
- Cajas de inspección (2)
- Instalación de tubería 3 " EMT
- Instalación tubería 1" EMT


FACHADAS

- Pintura fachada SUR primero y segundo piso
- Pintura baranda
- Pintura rejas, puertas y ventanas general
- Pintura fachadas NORTE
- Pintura fachada ORIENTE
- Pintura fachada OCCIDENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PINTURA PAREDES Y ZOCALO EN SALONES



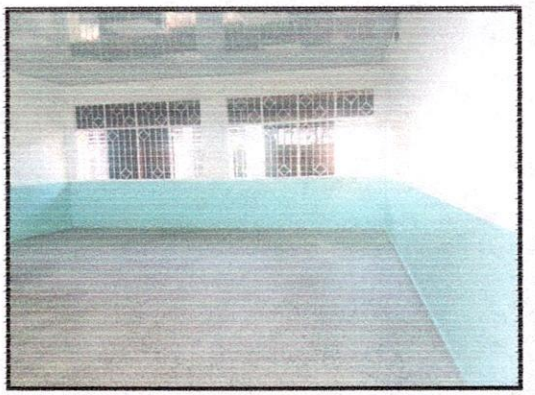

INSTALACION CIELO PVC-CAMBIO DE LUMINARIAS SALONES





PASILLO SEGUNDO PISO

INSTALACION DE CIELO PVC, LUMINARIAS LED, SENSORES.







PRIMER PISO


BAÑOS HOMBRES –MUJERES, INSTALACION ENCHAPE PISO Y PARED, LUMINARIAS, SENSORES, INSTALACION APARATOS SANITARIOS, PINTURA PARED Y TECHO.



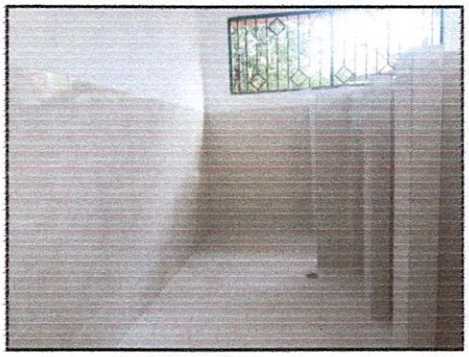

INSTALACION DE LAVAMANOS, ORINALES, SANITARIOS - CONSTRUCCION MESON

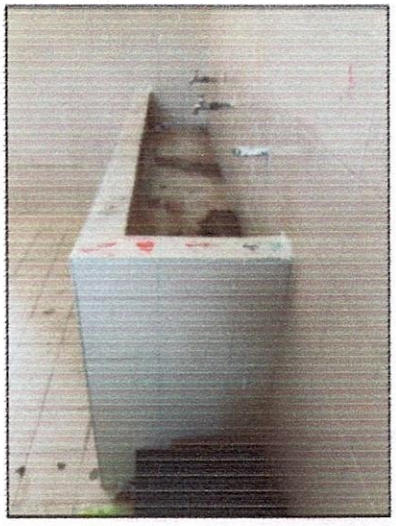

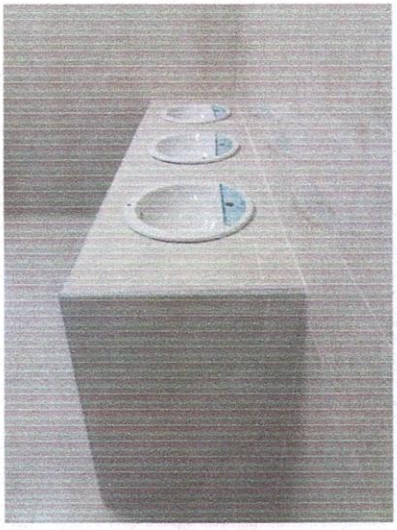




CAMBIO DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE PARA CABINAS DE BAÑOS.






SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA

PINTURA PAREDES, ZOCALO Y TECHO.

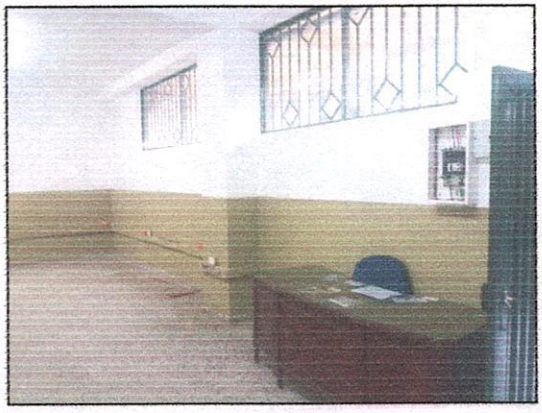

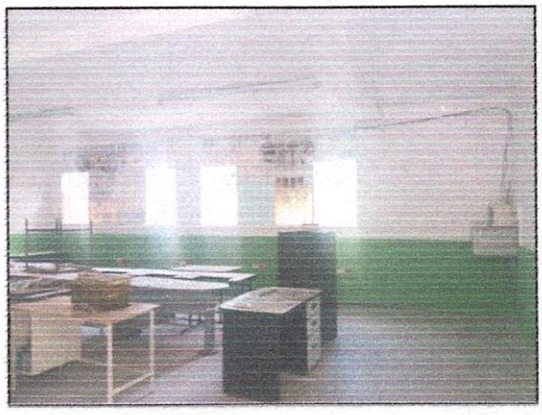

PASILLO PRIMER PISO

INSTALACION DE LUMINRIAS, INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO







FACHADAS



APLICACIÓN PINTURA EN FACHADAS, REJAS, VENTANAS, PUERTAS Y BARANDAS.

- FACHADA ORIENTE

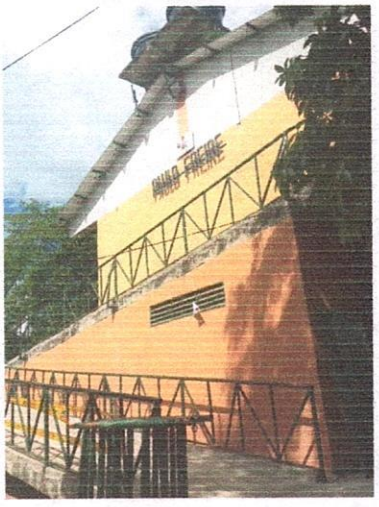


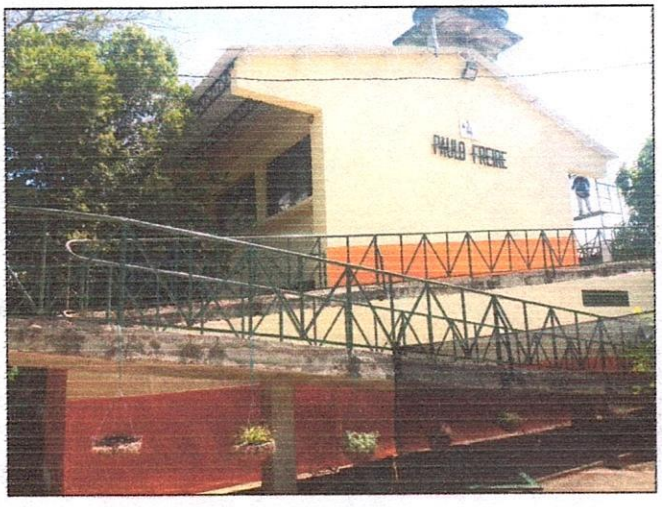


- FACHADA OCCIDENTE

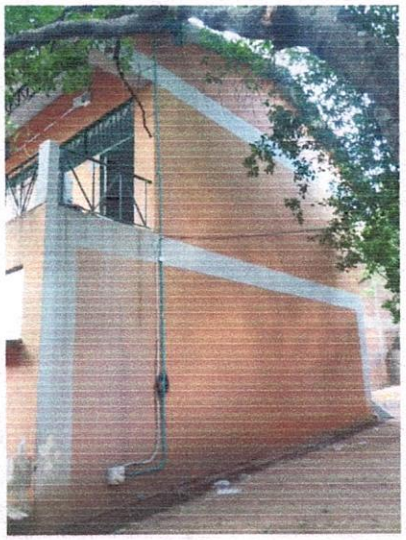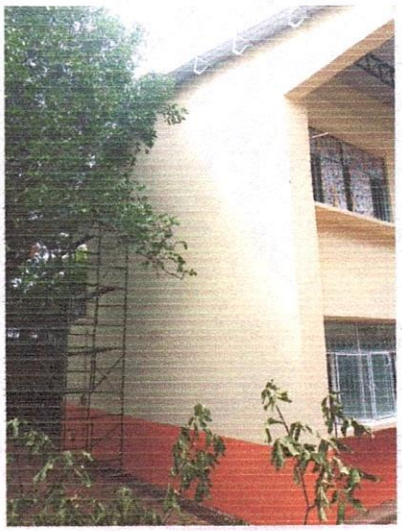
- FACHADA NORTE

- FACHADA SUR
- SEGUNDO PISO

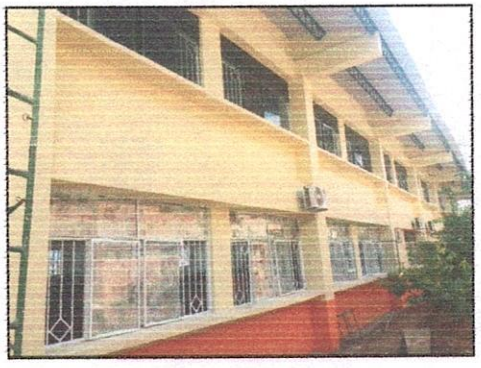

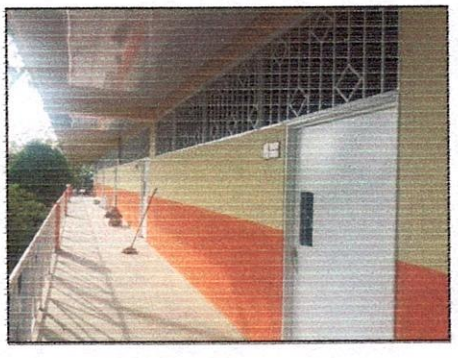


- PRIMER PISO

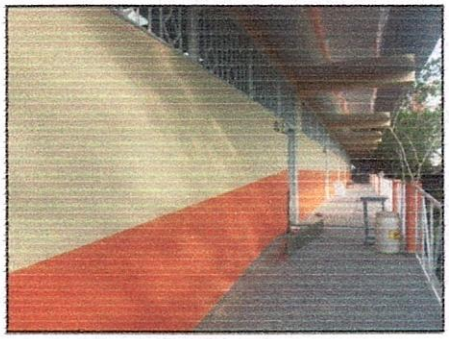



- BARANDAS

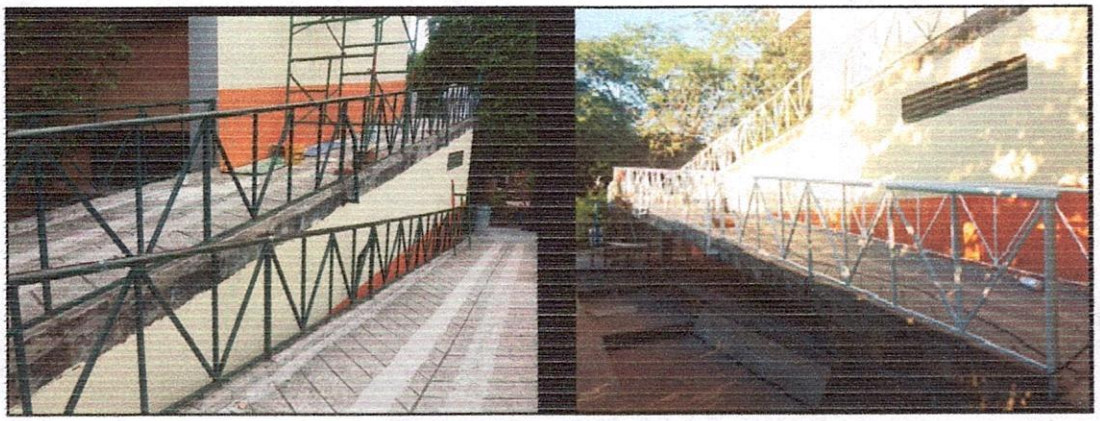

OBSERVACIONES:

- Se hace entrego de (2) llaves correspondiente a la biblioteca
- Llaves de los salones 22-23-24-25-26 cada uno (2) llaves.
- Salon 21 (1) llave
- Sala sistemas (1) llave
- Sala musica (1) llaves.
- baño profesores (1) llave.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

YASAIRA MURIEL A

Residente de obra

LIBARDO PERDOMO

Rector Normal Superior Neiva

Gustavo Gonzalez Silva
Vecino

Jose Heriberto Vargas
Vecino

Hector Ramon Angel
