albañilería, 52 Oficiales en los que se incluye, enchapadores, plomeros pintores.

Observacion: Se deja por escrito que unas actividades realizadas durante este día no fueron Supervisadas por el equipo de interventoria.

Equipos y Herramientas.

mini cargador, moto Carro, Andamios, gatos metalicos Soldadura, formaletas, tableros tablones. bogge, Dulidoras, Cortadora de enchape, y Herramientas menores

Clima: Soleado

Residente de Obra

Residente de interventoria

Fecha 29 de Agosto del 2022
Hora de inicio 7:00
Hora de finalizacion de actividades 5:00
Contratista Consorcio turquia
interventoria Gavinco ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Hidrodomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo barrio el poblado.

Escaneado con CamScanner

Actividad en obra: desencofre de columnas, vigas y muchones levante de muros en ladrillos fundicion de concreto para viga de cimentacion, fundida de columna para tunque, fundida de placa para tunque, Armado de columnas y muchones; excavaciones, pintura, enchape, instalación de puerta, instalacion de tuberia Hidraulica y Sanitaria, Resanes, visita tecnicas a viviendas por entregar, y viviendas priorizadas.

Personal en Obra:
Residentes de Obra, inspectores de Obra de Subcontratista, Director de Obra consorcio, interventoria Auxiliares Sociales, Siso y Auxiliares, bodegueros, 28 ayudantes de albanileria y 52 oficiales en los que se incluye, pintores, enchapadores.

Observaciones: mejorar pintura y acabados en viviendas Sanitarias por entregar, a los Subcontratista se le recomienda supervizar los frisados de los baños en su proceso inicial para mejorar las Dimenciones establecida en los planos

Equipo y Herramientas:
Andamios, Sierras, metalicas, gato, metalicos, mini Cargador, moto carro tablones, tableros, bagge y formaletas de madera.

Clima: Soleado durante todo el dia

Residente de Obra.

Residente Interventoria

Fecha 30 de Agosto 2022
inicio de actividades 7:00 Horas am
Hora de finalizacion 5:00 pm.
Contratista: Consorcio turguia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Cons. Ltda S.A.S.

Proyecto: Conexiones Hidrodomiciliarias de agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo barrio el Pablado.

Actividad en Obra:
levante de muros en ladrillo, excavacion. pañete, instalacion de enchapes, Puertas. Resanes de detalles a Subsanar, desencofre de Columnas Vigas y muchones, Diplante de Unidades nuevas, Entrega de inventario

Escaneado con CamScanner

En ejecucion, visita tecnicas a viviendas en ejecucion. aperturas pintura, suministro de material
Viviendas Aperturadas: con codigos:
Mz 1 - 181 - tipologia 3
Mz 6 - 130 - tipologia 3

* Observaciones: Revisar algunas Fugas Presentadas en unas unidades Sanitarias en los aparatos Sanitarios y tuberia y lavamanos
* Socializar con el personal nuevo los planos ya que se an presentados trazados y replanteos incorrectos en algunas viviendas "544, 547"

Personal en Obra:
Residente de Obra consorcio
Residente interventoria, Inspectores de Obra; Auxiliares, Social, SISO y Auxiliares. bodegueros, 58 Oficiales de albañileria y 25 ayudantes. en el numeros se incluye, pintores, enchapadores y plomeros.
Clima: Soleado todo el dia

Residente interventoria

Residente de Obra.

Fecha 31 de Agosto 2022
Hora de inicio 7:00 Am
Hora de finalizacion 5:00 pm
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria Gavilco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Hidrodomiciliaria de Agua Potable y Saneamiento basico en la Ciudad de Sincelejo barrio el Poblado

Actividad en Obra:
trazada y replanteo en intervenciones nuevas, levante de muro, Excavacions, fundida de cimentacion Pañete, pintura, Resana, desencofrada de columnas, armada de viga corona, Suministro de material aperturas de Viviendas,

Aperturas: M69 - 535 - tipologia 2
M65 - 519 - tipologia 3
M65 - 520 - tipologia 3
M65 - 521 - tipologia 3
M65 - 522 - tipologia 3
M65 - 523 - tipologia 3
M65 - 528 - tipologia 2
M65 - 529 - tipologia 2
M65 - 640 - tipologia 3

Observacion: durante la apertura las Vivienda con codigo: 640, 519. se cambio de posicion segun diagnostico.

Escaneado con CamScanner

Tabien dejo Por escrito que durante las visita tenicas a la viviendas en ejecución se ha evidenciado los anclajes para la Viga Corona sobre las columnas realizados Sin epoxica.

Personal en Obra: Residente de Obra. interventoria, inspectors de Obra, Auxiliars Sociales. Siso y Auxiliares bodegueros. 52 oficiales de albañilería y 25 ayudantes.

Clima: Soleado todo el día.

Residente de Obra

Residente interventoria

Fecha 1 de Septiembre 2022
Hora de inicio 7:00
Hora de finalización 5:00
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Gavinco ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: conexiones hidrodomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo barrio el poblado.

Actividad en Obra: Visidad tecnicas a viviendas en ejecución, fundas y replanteos, levante de muro en ladrillo, enchape, pintura, encofrado

de Columnas, muchones, y Viga descencofrando de placa tunque. fundida de Cimentacion, entregas de viviendas terminadas, Resanes,

Observaciones: las Viviendas por entregar algunas presentan detalles en las Sanitarios, filos, Pintura, puertas y pedestals.

Personal en Obra: Residente de Obra Residente de interventoria. Auxiliares Sociales, Siso y Auxiliares. bodegueros 52 oficiales y 24 Ayudantes de Albañileria

Nota: Corregir o ajustar dimensiones minimas estableida en los Planos con anterioridad a ejecución, de la unidad Sanitaria con codigo 206 de la manzana Z, en la que presenta actualmente 124 x 215 medidas sin pañete.

Clima: Soleado todo el día

Residente de Obra

Residente interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: 2 de Septiembre 2022
Hora de inicio 7:00 Am
Hora de finalizacion 5:00 pm
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Cavinco ingenieros
Consultores S.A.S.
Proyecto: Conexions Hidrodomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo barrio el poblado

Actividad en Obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecucion, entregas de viviendas terminadas, levante de muros en ladrillos, excavacion para cimentacion y Columna para tanque, Resane, Subsanacion de detalles, pañete, pintura

Observaciones: las viviendas por entregar aún presenta detalles en su entrega, detalles de Conexions pintura, goteras en mangueras Sanitarias, filos de muros. ajuste en puerta y cerraduras

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de interventoria Auxiliares Sociales. Siso y Auxiliars bodegueros. 46 oficiales de Albañileria 24 ayudantes.

Equipo y Herramientas.
1 mini cargador 2 moto carros

Andamios, Serchas metalicas, Gatos mecanicos, boggo, tableros, tablones Formaletas de madera Polidora y cortadora de baldosa

Clima: Soleado todo el dia

Kafmen.
Residente de Obra

Residente Interventoria

Fecha 3 de Septiembre 2022
Hora de inicio 7:00 Am
Hora de finalizacion: 5:00 pm
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Cavinco ingeniero
Consultores S.A.S.
Proyecto: conexions Hidrodomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo barrio el poblado

Actividad en Obra: Recorrido tecnico a viviendas por entregar, levantes de muro en ladrillos, pañete, Excavaciones, Resanes, Subsanaciones de detalles, pintura, desencofrado de columnas, vigas y muchos.

Observacion: algunas Viviendas Recibidas quedaron pendientes Con algunos detalles por Subsanar

Escaneado con CamScanner

Personal en Obra
Residente de Obra, Residente de interventoria, Auxiliares Sociales, SISO y Auxiliares bodeguero, 46 oficiales de albañilería y 20 Ayudantes

Equipo y Herramienta.
2 moto carros, 1 mini cargador Andamios, Escaleras, gatos metal Formaletas de madera, tablo , tablones, boggs, Pulidora, Cor- tadoras de baldosas.

Clima: Soleado

Kaimero.
Residente de Obra

Residente Interventor

Fecha: 5 de Septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución trazado y replanteo, levante de muro en ladrillo, enchape, Pintura, instalación de puertas, encofrado y desencofrado de

Escaneado con CamScanner

Personal en Obra
Residente de Obra, Residente de interventoria, Auxiliares Sociales, SISO y Auxiliares bodeguero, 46 oficiales de albanileria y 20 Ayudantes.

Equipo y Herramienta.
2 moto carros, 1 mini cargador, Andamios, Serchas, gatos metalicos, Formaletas de madera, tableros, tablones, bugge, Pulidora, Cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado

Kaimero.
Residente de Obra

Residente Interventoria

Fecha: 5 de Septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalizacion: 5:00PM
Contratista: consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución trazado y replanteo, levante de muro en ladrillo, enchape, Pintura, instalación de Puertas, encofrado y desencofrado de

columnas y machones y viga de amarre, fundida de cimentación, Suministro de material.
Por la tarde recorrido por Parte de los directores de obra de interventoria y contratista en acompañamiento de las Sociales, tecnicos de interventoria, contratista y los veedores, revisando las viviendas que faltan por entregar para completar las 52 que quedaron en compromiso por entrega.
aperturas de viviendas.

Aperturas: M39 - 445 - tipologia 3
M39 - 277 - tipologia 3
M41 - 284 - tipologia 3
M41 - 343 - tipologia 3
M41 - 279 - Adecuación

observación: Durante la visita tecnica a la vivienda en ejecución se ha evidenciado, Pega mayor a 2cm, Pega Sin llenar completamente, Vano sin Parrilla para machón, medida interna del baño sin cumplir y columna desplomada.
Las viviendas por entregas algunas Presentan detalles en los filos. Pinturas, en el fluido del agua que no baja. y enchape.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, director de obra, director de Interventoria, Sociales, Aux. sociales, inspectores, bodegueros, 42 oficiales, 18 Ayudantes y SISO.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, 1 minicargador, Andamios Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Nota: corregir o ajustar dimensiones minimas establecida en los Planos con anterioridad y ejecución de la viviendas Sanitaria con Codigo 603 de la manzana 36, en la

Escaneado con CamScanner

que Presenta actualmente 2.13m x 1.20m medidas con Pañete.

Clima: Soleado todo el día.

Residente de obra

Residente Interventoría

Fecha: 6 de Septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turfoia
Interventoría: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarios de agua Potable y Sanamiento básico en la ciudad de Sincelejo

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, levante de muros en ladrillos, encofrado y fundida de machones, Viga corona, instalación de tubería sanitaria, excavación de tubería sanitaria, fundida de columnas, Pañete y Pintura.
Por la tarde visita del ministerio de Vivienda, FOVIS, Alcaldia, donde se hizo recorrido en acompañamiento con los directores, de obra e Interventoría, sociales, tecnicos, siso y Ucedores, revisando viviendas entregadas y en ejecución.

Aperturas: M29 - 078 - tipologia 3
M25 - 090 - tipologia 3. Se reubico de lugar por humedad e inestabilidad del terreno.
M25 - 068 - tipologia 3. Se reubica por Protección de mejora-

Personal en obra: Director de obra, Director Interventoría, Residente de obra, Residente Interventoría, Sociales, AUX. Sociales, Inspectores, bodegueros, 51 oficiales, 27 Ayudantes, S:SO.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, 1 minicargador, Andamios, Serchas, gatos, formaletas de maderas, tableros, tablones, buggy, Puliduras, Cortadoras de baldosas.
Clima: Soleado todo el día.

Residente Interventoría

Residente de obra

Fecha: 7 de Septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turfuia
Interventoría: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sanamiento básico en la ciudad de sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, trazado y replanteo, encofrado y fundida de colomnas, machones, Viga corona, desencofrado de columnas, levante de muros en ladrillo, encha, instalación de Puerta, Pintura, armado de acero Para losa de tanque elevado y fundida de esta, instalación de tubería sanitaria y hidrosanitaria.

Aperturas: M44 - 348 - tipologia 3
M44 - 341 - tipologia 3
M44 - 342 - tipologia 2

Observación: Durante la visita tecnica a las viviendas en ejecución se ha evidenciado. Vivienda M2 - 602 - tipologia 3

Escaneado con CamScanner

no han corregido la medida interna del baño, Pañetaron y quedo de 2.12 m x 1.20m interno y se pudo evidenciar que una columna quedo mas alta que la otra. La Vivienda 235, Presenta la losa del tanque elevado con medidas que no cumplen de 1m x 1.46m x 0.10m y tiene grietas.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 52 oficiales 33 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, 1 minicargador, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el dia

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 8 de Septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sanamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: En el dia de hoy Por motivos de lluvia toda la mañana, realizaron actividades de enchape, levantamiento de muros e instalación de Puertas y tuberia hidrosanitaria.

Aperturas: M26 - 097 - tipologia 3

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 56 oficiales, 27 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Lluvia toda la mañana.
Nublado toda la tarde.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 9 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoña: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sanamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecucion y con detalles Por Subsanar, entregas de viviendas terminadas, levante de muros en ladrillos, encofrado y fundida de columnas, losa Para tanque elevado, Viga corona, excavación Para instalacion de tubena, instalación de tuberia, enchape.

Escaneado con CamScanner

Aperturas: M32 - 046 - tipología 2.
M35 - 132 - tipología 2

observación: Durante la visita tecnica a las viviendas en ejecución se ha evidenciado, que la vivienda M2.208 el baño no cumple con las medidas internas, Aún no han corregido las medidas internas del baño de la vivienda M2.206, losa del tanque elevado con grietas y Pegas de muro mayor a 2cm.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, AUX. Sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 56 oficiales, 27 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el dia.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 10 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gauinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en observación Por detalles, Ya terminadas y subsanadas, acabado interno y externo, Filos, Presión del agua de los aparatos sanitarios, enchape defectuoso y duplicidad de baños.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, AUX. Sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 44 oficiales, 23 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el dia.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 12 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: consorcio Turquia
Interventoria: Gauinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, levante de muros, Pañete, fundida y encofrado de columnas, machones y viga corona, enchape, instalacion de Puertas, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos sanitarios.

Escaneado con CamScanner

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en observación Por detalles, Ya terminadas y subsanadas, acabado interno y externo, Filos, Presión del agua de los aparatos sanitarios, enchape defectuoso y duplicidad de baños

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 44 oficiales, 23 Ayudantes.

EQUIPO Y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el dia.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 12 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: consorcio Turquia
Interventoria: Gauinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable Y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, levante de muros, Pañete, fundida y encofrado de columnas, machones Y viga corona, enchape, instalacion de Puertas, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos Sanitarios.

Escaneado con CamScanner

Apertoras: M22 - 109 - tipologia 2

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 58 oficiales, 30 AYudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Nublado todo el dia.

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 13 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 9:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable Y Saneamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, Pañete, levante de muros, fundida de losa Para tanque elevado, fundida Y encofrado de machones, Y columnas, fundida de Plantilla, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos Sanitario, enchape, instalación de Puerta Y acabado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 59 oficiales, 23 AYudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos, metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el dia

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 14 de septiembre 2022
Hora de Inicio: 9:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable Y Saneamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, levante de muros, encofrado Y fundida de columnas, Viga corona, machones, Pañete, fundida de Plantilla, encofrado, armado del acero Y fundida de losa Para tanque elevado, instalación de Puerta, Pañete, enchape, instalación de cubierta, excavación e instalación de tuberia Sanitaria e instalación de aparatos Sanitarios.

Apertuns: M5 - 600 - tipologia 3
M5 - 654 - tipologia 3
M8 - 231 - tipologia 3
M5 - 116 - Adecuación
M4 - 158 - tipologia 3. cambio de ubicación Por desagué de tuberia
M3 - 169 - tipologia 3
M3 - 170 - tipologia 2
M3 - 171 - tipologia 3

Escaneado con CamScanner

M1 - 202 - Tipología 3, Pendiente la ubicación Por Problemas de espacio en la vivienda.

M1 - 186 - tipología 3.

M1 - 185 - tipología 2.

M1 - 187 - se realiza cambio de tipología Por temas de espacio; vivienda.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 55 Oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, Formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado todo el día.

Residente Interventoría

Residente de obra

Fecha: 15 Septiembre de 2022
Hora de Inicio: 7:00 AM
Hora de Finalización: 5:00 pM
Contratista: Consorcio Turquía
Interventoría: Gainco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarios de Agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo

Actividad en obra: Se realiza recorrido Tecnico por parte de los Inspectores de obra, residente de Interventoría y Supervisor de Veolia con el fin de Verificar la Instalación de los Medidores que ya fueron Domiciliarios

cobrados en el acta #1 y #2, Como esta actividad se realizó después de estar instalados estos domiciliarios el Supervisor de veolia, Solicito el registro fotografico para poder revisar y dar aval.
Por otra parte el contratista continua con las actividades de fundida de viga, levante de muros, Instalación de Puertas, enchape, Instalacion de aparatos sanitarios.
Por parte del area Social se realiza un recorrido con la junta comunal para que tuvieran claridad acerca de las viviendas ya entregadas.
Interventoría no recibe viviendas el dia de hoy ya que no han Subsanado los detalles.
No hay aperturas el dia de hoy.

Personal en obra: Residentes de obra, Residente de Interventoría, Sociales, Aux. Sociales, Sisos, bodegueros, Inspectores de obra y de Interventoría, 55 oficiales y 30 Ayudantes.

Equipos y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Cachos, Gatos, formaletas de madera, Tableros, buggies, pulidoras, cortadoras.

Clima: Lluvioso en la mañana
Soleado tarde.

Residente Interventoría

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Fecha: 16 de Septiembre de 2022
Hora de Inicio: 7:00 AM
Hora de finalización: 5:pM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoría: Gaunco Ingenieros Consultores S.A.S.

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarios de Agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo

Actividad en obra: En el dra de hoy el contratista Continua con las actividades de levante de muro, fundida de Vigas corona, Instalacion de tubería Sanitaria, Subsanacion de detalles de las viviendas a entregar.
Por otra parte se observó que algunos trabajadores estaban paralizados por falta de materiales como: Gravilla y arena.
Se recomienda al contratista dar pronta Solución a la escacez de estos materiales, para que el avance de la obra no se vea afectado.

Personal en obra: Residentes de obra, Inspectores de obra e Interventoría, Aux. Social, Socives, SISOS, Bodegueros, 55 oficiales, 30 Ayudantes.

Equipos y Herramientas: 2 mixto camos, Andamios, Pulidores, trozadores, bagys, Tableros, formaletas.

Clima: Soleado.

Contratista
Residente Interventoría

Residente de obra

Fecha: 17 de Septiembre de 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoría: Gaunco Ingenieros consultores S.A.S.

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarios de Agua potable y saneamiento basico en la ciudad de Sincelej

Actividad en obra: En el dra de hoy el contratista Continua con las actividades de levante de muro e Instalacion de tubería Sanitaria y enchape.
Se observó que continuan con la falencia de escacez de materiales como: Grava, arena y acero.
En el dra de hoy no se reciben Viviendas ya que aún no se terminan de Subsanar detalles.

Personal en obra: Residentes de obra, Inspectores de Interventoría y obra, Sociales, Bodegueros, SISOS, oficiales y Ayudantes
Equipos y Herramientas: mixto camos, formaletas, Andamios, Tablas, gatos, cerchas, bagys, cortadores, pulidores.

Clima: soleado.

Contratista
Residente Interventoría

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

fecha: 19 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores SAS

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, Pañete, levante de muros, fundida de losa Para tanque elevado, fundida y encofrado de machones, y columnas, fundida de Plantilla, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos sanitario, enchape, instalación de Porta y acabado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 52 oficiales, 30 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, Cortadoras de baldosas.

Clima: Lluvia en la mañana
seco en la tarde

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 20 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico en acompañamiento con la alcaldia a viviendas en ejecución Para revisar el estado de estas y supervisar las viviendas que ya se han entregado Para saber como va el funcionamiento de estas mismas.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 52 oficiales, 31 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

clima: Soleado

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

fecha: 21 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, levante de muros, fundida de losa Para tanque elevado, fundida y encofrado de machones y columnas, Pañete, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos sanitario, enchape, instalación de cubierta y acabados.

Aperturas: M21 - 489 - tipologia 3
M22 - 108 - Adecuación
M57 - 431 - Adecuación
M69 - 542 - Tipologia 3
M69 - 553 - Tipologia 3
M73 - 552 - Tipologia 3
M70 - 580 - Tipologia 2
M70 - 551 - Tipologia 3
M51 - 485 - Adecuación
M55 - 412 - Adecuación
M55 - 409 - Adecuación
M61 - 514 - Adecuación
M65 - 561 - Tipologia 2
M66 - 564 - Adecuación
M73 - 589 - Tipologia 3
M03 - 180 - Tipologia 3
M06 - 133 - Tipologia 3

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, sociales, AUX. Sociales, Inspectores, SISO, bodegueros, 50 oficiales, 30 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos formaletas de maderas, tableros, tablones, buggy, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 22 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamient básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Capacitación Por Parte de Veolia Sobre el Proyect de conexiones Intradomiciliarias, de como usar las baterias sanitarias adecuadamente.
Recorrido y visita a las viviendas terminadas y en ejecució Por Parte del ministerio de vivienda, Enterritorio, Veolia, Alcaldi Interventona, Contratista y Veedores.

Aperturas: M70 - 575 - Tipologia 3
M70 - 576 - Tipologia 3
M70 - 574 - Tipologia 3
M70 - 577 - Tipologia 3
M65 - 524 - Adecuación
M71 - 609 - Adecuación

Escaneado con CamScanner

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 51 oficiales, 30 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Lluvia en la mañana
Nublado en la tarde

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 23 de Septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turfuia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, Pañete, levante de muros, fundida y encofrado de machones, columnas y Viga corona, fundida de Plantilla, excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos sanitarios, enchape y acabado

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Social, Inspectores, Siso, bodegueros, 51 oficiales, 31 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos,

formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Solcado en la mañana
Lluvia en la tarde

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 24 de Septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turfuia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución Pañete, Excavación e instalación de tuberias, instalación de aparatos sanitarios, enchape, instalación de cubiertas, acabado y encofrado y fundida de machones y Plantilla.

Aperturas: M44 - 347 - Tipologia 2
M45 - 335 - Tipologia 3

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. Social, Inspectores, Siso, bodegueros, 50 oficiales, 28 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, Formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, Cortadoras de baldosas.

Escaneado con CamScanner

Clima: Soleado.

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 26 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, Levante de muro, encofrado y fundida de machones, Viga Corona y columna, excavación e instalación de tubería, instalación de aparatos sanitarios, instalación de cubiertas, fundida de Plantilla, acabado, Pañete y enchape.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 48 oficiales, 32 Ayudante

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Clima: Soleado.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 26 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventona: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad en obra: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, Levante de muro, encofrado y fundida de machones, Viga Corona y columna, excavación e instalación de tubería, instalación de aparatos sanitarios, instalación de cubiertas, fundida de Plantilla, acabado, Pañete y enchape.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. sociales, Inspectores, Siso, bodegueros, 48 oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado

Residente Interventoria

Residente de obra.

fecha: 27 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, Pañete, levante de muros, encofrado y fundida de losa Para tanque elevado, fundida de Plantilla, excavación e instalación de tuberias, encofrado y fundida de columnas y Viga corona, enchape, acabado, instalación de aparatos sanitarios

Persond en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, sociales, AUX. sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 47 oficiales, 35 Ayudantes

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Polidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Lluvia en la mañana
Seco en la tarde.

Residente Interventona

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

fecha: 28 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad: En el dia de hoy el contratista continua con las actividades de levante de muro, fundida y encofrado de viga corona, machones y columnas, excavación e instalación de tubería sanitaria, subsanación de detalles de viviendas a entregar, enchape y acabado.

Aperturas: M32 - 647 - Tipologia 3
M61 - 516 - Tipologia 3
M61 - 515 - Tipologia 3
M61 - 526 - Tipologia 3
M61 - 513 - Tipologia 3
M69 - 540 - Tipologia 3
M45 - 328 - Tipologia 2
M45 - 334 - Tipologia 3 => reubicación segun diagnostico
M45 - 337 - Tipologia 3 => reubicación segun diagnostico.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Sociales, Aux. sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 51 oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, Cortadoras de baldosas.
Clima: Nublado en la mañana
Lluvia en la tarde

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 29 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S

Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo

Actividad: Recorrido tecnico a viviendas en ejecucion, levante de muro, encofrado y fundida de machones, viga corona y columna, excavación e instalación de tubería, instalación de aparatos sanitarios, instalación de cubiertas, fundida de Plantilla, acabado, Pañete y enchape.
Aperturas: M30 - 646 - Tipologia 2
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, Aux. sociales, Inspectores, siso, bodegueros, 53 oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, Serchas, gatos metalicos, Formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, Cortadoras de baldosas.

Clima: Nublado todo el dia.

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

fecha: 30 de septiembre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de Finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoría: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad: En el dia de hoy Interventoría realiza recorrido con la Veeduría, sin acompañamiento del residente del contratista, verificando el estado de los baños de cada una de las viviendas en ejecución.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, AUX. Sociales, Inspectores, Siso. bodegueros, 51 oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Lluvia en la mañana
Soleado en la tarde

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 01 de Octubre del 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Actividad: Recorrido tecnico a viviendas en ejecución, entregas de viviendas terminadas, Pañete, levante de muros, fundida de Plantilla, instalación de aparatos sanitarios, acabado y enchape.

observaciones: beneficiarios dicen que la tapa del tanque elevado se hunde. y cuando el tanque se llena no deja subir a la bomba.
Vivienda 158.M4, el registro lo hicieron sin acero. Y Presenta un acabado en mal estado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Sociales, AUX. sociales, siso, Inspectores, bodegueros, 50 oficiales, 32 Ayudantes.

Equipo y Herramientas: 2 moto carros, Andamios, serchas, gatos metalicos, formaletas de maderas, tableros, tablones, bugge, Pulidoras, cortadoras de baldosas.

Clima: Soleado.

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Anexo 10. Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **6** **Fecha Informe** **3/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/22**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1:	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
4/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
5/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
2/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
3/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
4/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
9/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA

Informe No. **6** **Fecha Informe** **3/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/22**

9/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
1/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
3/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
6/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
6/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
8/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
9/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **6** **Fecha Informe** **3/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/22**

5/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
6/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
7/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
3/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envìo Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
7/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
9/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
11/07/2022	GA-DOMI-080-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 03 periodo del 01 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
12/07/2022	GA-DOMI-081-22	Solicitud No. 7 de verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-082-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-083-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
12/07/2022	GA-DOMI-084-22	Remisión Informe Semanal No. 12 periodo del 04 de julio de 2022 al 10 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
18/07/2022	GA-DOMI-085-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-086-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-087-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-088-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-089-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 3. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
21/07/2022	GA-DOMI-090-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/07/2022	GA-DOMI-091-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-092-22	Remisión Informe Semanal No. 13 periodo del 11 de julio de 2022 al 17 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
22/07/2022	GA-DOMI-093-22	Trabajadores laborando sin Elementos de Protección Personal, EPP	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/07/2022	GA-DOMI-094-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-095-22	Solicitud materiales suficientes para terminación de viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-096-22	Remisión Informe Semanal No. 14 periodo del 18 de julio de 2022 al 24 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
27/07/2022	GA-DOMI-097-22	Aprobación ordenes de giro No. 01 y 02	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-098-22	Solicitud de entrega del estado de los 192 diagnósticos faltantes.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-099-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-064	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
28/07/2022	GA-DOMI-100-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-066 y CONS-TUR-SINC-067 del 27 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
28/07/2022	GA-DOMI-101-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-065	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	CONS-TUR-SINC-053	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-056	Entrega de diagnósticos Paquete 16	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
2/07/2022	CONS-TUR-SINC-054	Oficio 053 - Respuesta comunicación GA-DOMI-071-22	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-057	Información aprobación de micromedidores de ½"	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-059	Acompañamiento pruebas técnicas.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-060	Entrega de diagnósticos Paquete 17	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
16/07/2022	CONS-TUR-SINC-061	Entrega de informes mensuales 01 y 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
21/07/2022	CONS-TUR-SINC-063	Entrega de diagnósticos Paquete 18	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
24/06/2022	20222200118481	Solicitud información sobre el cumplimiento del cronograma para el contrato	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
29/06/2022	20222200120441	Solicitud información de acuerdo al plan de contingencia remitido mediante	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **6** **Fecha Informe** **3/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/22**

22/07/2022	20222200133451	Devolución Factura Electrónica de venta No. FV-2-1 del 21/07/2022	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
7/07/2022	20222200124601	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
2/08/2022	GA-DOMI-102-22	Remisión Informe Semanal No. 15 periodo del 25 de julio de 2022 al 31 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
3/08/2022	GA-DOMI-103-22	Solicitud materiales de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
3/08/2022	GA-DOMI-104-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 15	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
4/08/2022	GA-DOMI-105-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062 y CONS-TUR-SINC-068	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
5/08/2022	GA-DOMI-106-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
5/08/2022	GA-DOMI-107-22	Remision oficio 20222200141481	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
8/08/2022	GA-DOMI-108-22	Solicitud diagnosticos pendientes	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
9/08/2022	GA-DOMI-109-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 04 periodo del 01 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-110-22	Solicitud de inclusion pendientes de respuesta	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-111-22	Remisión Informe Semanal No. 16 periodo del 01 de agosto de 2022 al 07 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
12/08/2022	GA-DOMI-112-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
16/08/2022	GA-DOMI-113-22	Solicitud información contraloría general de la republica	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-114-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 4. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-115-22	Remision actas de reunion Contraloria, Ministerio y enterritorio.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
18/08/2022	GA-DOMI-116-22	Remisión Informe Semanal No. 17 periodo del 08 de agosto de 2022 al 14 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
18/08/2022	GA-DOMI-117-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 17.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
19/08/2022	GA-DOMI-118-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
19/08/2022	GA-DOMI-119-22	Aprobación informe mensual 3 (1.Jul.22 al 31.Jul.22)	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-120-22	Resp comunicacion CONS-TUR-SINC-077	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-121-22	Acta de recibo parcial de obra No. 02.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
23/08/2022	GA-DOMI-122-22	PQR 192, 196 y 194 de solicitud de inclusión.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/08/2022	GA-DOMI-123-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-073	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-124-22	Remisión Informe Semanal No. 18 periodo del 15 de agosto de 2022 al 21 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-125-22	Seguimiento Plan de Contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
24/08/2022	GA-DOMI-126-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-076	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
29/08/2022	GA-DOMI-127-22	Solicitud exámenes de Egreso y certificados de paz y salvo con trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-128-22	Solicitud remisión Informe de accidente y reporte a la ARL	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-129-22	Traslado petición del Sr. José Alfredo Pen Ayala	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
30/08/2022	GA-DOMI-130-22	Remisión Informe Semanal No. 19 periodo del 22 de agosto de 2022 al 28 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
31/08/2022	GA-DOMI-131-22	Viviendas priorizadas pendienes de entrega	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
16/08/2022	CONS-TUR-SINC-077	RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE MATERIALES E INICIO DE	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
29/08/2022	CONS-TUR-SINC-089	Entrega de diagnósticos Paquete 19B	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
20/07/2022	20222200131921	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 3, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
4/08/2022	20222200141471	Visita técnica solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación	Enterritorio	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	20222200156751	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu
1/09/2022	GA-DOMI-132-22	Personal en obra laborando sin Elementos de Protección Personal (EPP)	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-133-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-134-22	Solicitud cumplimiento compromisos del acta de seguimiento No. 24	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-135-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-093	GAVINCO Ingenieros Consultore	Veolia
7/09/2022	GA-DOMI-136-22	Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
9/09/2022	GA-DOMI-137-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-138-22	Fecha de radicación facturación - Septiembre 2022	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-139-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 05 periodo del 01 de agosto	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-140-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 5. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-141-22	Situaciones evidenciadas en obra	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
14/09/2022	GA-DOMI-142-22	Solicitud de pago a SSI y parafiscales	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
14/09/2022	GA-DOMI-143-22	Actualización Plan de contingencia ejecución actividad 3	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
15/09/2022	GA-DOMI-144-22	Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
16/09/2022	GA-DOMI-145-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
16/09/2022	GA-DOMI-146-22	Respuesta oficio SPM-1300.10.02.1414	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/09/2022	GA-DOMI-147-22	Solicitud de respuestas PQR 192, 193, 194.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/09/2022	GA-DOMI-148-22	Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
20/09/2022	GA-DOMI-149-22	Acta de recibo parcial de obra No. 03.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **6** **Fecha Informe** **3/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/22**

21/09/2022	GA-DOMI-150-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 28	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-151-22	Aprobación informe mensual 4 (1.Ago.22 al 31.Ago.22)	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-152-22	Resp oficio 20222200162301	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-153-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/09/2022	GA-DOMI-154-22	Aclaración de solicitud de inclusión emitido en el informe de visita técnica N°2.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
23/09/2022	GA-DOMI-155-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-105	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
26/09/2022	GA-DOMI-156-22	Solicitud de visita y concepto de linderos.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
27/09/2022	GA-DOMI-157-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-111	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-158-22	Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
28/09/2022	GA-DOMI-159-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 29	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-160-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
30/09/2022	GA-DOMI-161-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-119 del 29 de septiembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
30/09/2022	GA-DOMI-162-22	Solicitud acta de recibo parcial de obra No. 04 e informe mensual de	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
1/09/2022	CONS-TUR-SINC-093	viviendas para instalación de micromedidores.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
13/09/2022	CONS-TUR-SINC-105	Entrega de diagnósticos Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
26/09/2022	CONS-TUR-SINC-114	Relación de códigos para apertura para la semana 26/09/2022 al 2/10/2022.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consu
2/09/2022	20222200162301	Observaciones visita de seguimiento del 09 al 12 de agosto de 2022.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consu

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALIACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			X	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		X	X	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		X	X	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	X		X	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	X		X	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portenciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para la intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico inicial
									PCI-012 Cambio Plan de intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría


Entrega Informe Mensual de Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	**INFORME MENSUAL N°. 6 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 6 V-0	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
	F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
	2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
	2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
	F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
	F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
	PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
	2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
	F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
	F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
	2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
	F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
	Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
	Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 6 V-0	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
	Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
	Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
	Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
	Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
	Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
	Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
	Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
	Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
	Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
	Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
	Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
	Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
	Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
	Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
	Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
	Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
	Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
	Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	
	Anexo 24. Control de equipos	N/A						X	
	Anexo 25. Control de inspección y ensayos	N/A						X	
	Anexo 26. Cambio especificación	N/A						X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes octubre del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
	
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 05 de octubre de 2022	Fecha: 05 de octubre de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

consorcio Turquía

NIT.901570934-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA

CERTIFICACIÓN

Certifico que la persona jurídica **CONSORCIO TURQUIA** con **NIT No. 901.570.934 - 7,** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) meses.

Expedida el once (11) del mes de octubre de 2022

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.406 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS
T.P No. 111.052-T
C.C. No. 72.245.947 DE BARRANQUILLA
CONTADOR PUBLICO

Sincelejo Sucre Barrio Ford Cll 16 14ª 71 local 2
Correo electrónico: coordinadorturquiapci@gmail.com,
Teléfono: 3142996037-3107480482

CEDULA DE CIUDADANIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.246.947
MARQUEZ CONTRERAS

APELLIDOS
JAIME RICARDO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1980
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-MAR-1998 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2800100-00163347-M-0072246947-20090717 0013596514A 1 7560011684

COPIA VALIDAD PARA: _____

TARJETA PROFESIONAL



COPIA VALIDA PARA: _____

Certificado No:

FAA47C851AE326F4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72246947 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 111052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** Actuando en nombre propio, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.012, me permito certificar que he efectuado el pago y me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los once (11) días del mes de octubre de 2022

Atentamente,

ISAIAS VARGAS GONZALEZ.
CC. 7.710.012 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante legal de **V&M INGENIERIA S.A.S**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933, se permite certificar que la compañía ha efectuado el pago y se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los once (11) días del mes de octubre de 2022


Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
CC. 7.713.933 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

TARJETA PROFESIONAL



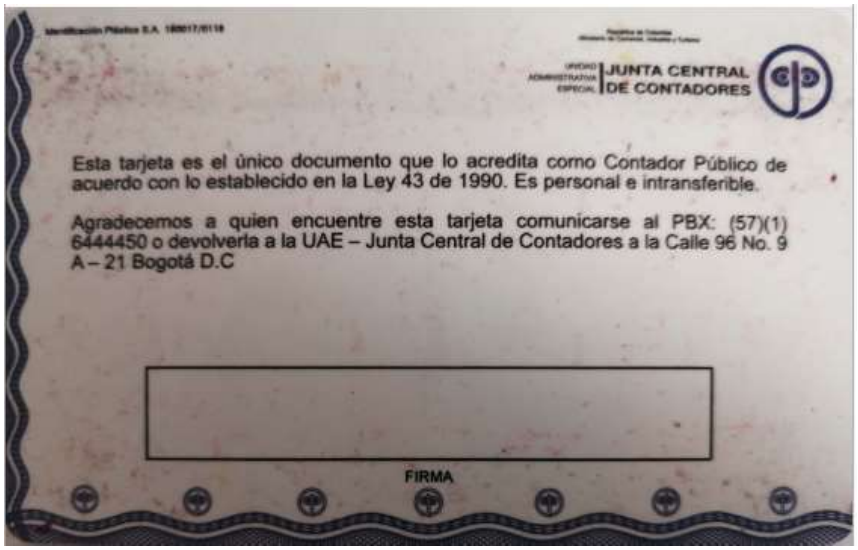

DOCUMENTO DE IDENTIDAD





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F547C8A 1AE4 26F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA BERNARDA RAMOS JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102840197 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 244730-TSI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 02 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 04 días del mes de Octubre del 2022.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.477.519

GARZON RUBIO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260106-T

MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271024 290395

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

765B255A83DD002B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2022 Y EL 30/09/2022 PLAZO: 8 meses

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 6																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO** 341

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																													SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														**0**	**0,00%**	
De la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	155	45,45%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	54,55%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																														**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																														0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES																														**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																														0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		150	43,99%	**S**
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:29.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:38.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:37.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEANDRA MARIA OROZCO TOUS identificado(a) con CC 1026565862

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:36.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ISAAC MANUEL MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92530837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:37.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9441112458	1691175500	E	2022-10-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30

Este certificado se expide el día 2022-10-06 a las 09:36.

Contratista

enterritorio	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2022 Y EL 30/09/2022 PLAZO: 8 meses

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 6																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 1, 2 y 3
Profesional tecnico de diadnosticos	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 2
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	NA	Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	NA	Actividad 2y 3
Profesional de calidad	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 2 y 3
Inspector de obra	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	NA	Actividad 3
Maestro de obra	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	NA	Actividad 3
oficiales	52	46	46	NA	42	51	52	36	56	58	NA	58	62	59	55	59	42	NA	42	50	49	39	52	50	NA	48	47	51	53	54	NA	Actividad 3
ayudantes	24	24	20	NA	18	27	33	17	27	29	NA	30	32	23	32	34	14	NA	14	26	29	16	31	30	NA	32	35	32	32	31	NA	Actividad 3
almacenista	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	Actividad 3
herrero	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	Actividad 3
Auxiliar de bodega	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**110**	**104**	**100**	**NA**	**94**	**112**	**119**	**87**	**117**	**121**	**NA**	**122**	**128**	**116**	**121**	**127**	**90**	**NA**	**90**	**110**	**112**	**89**	**117**	**114**	**NA**	**114**	**116**	**117**	**119**	**119**	**NA**	**TOTAL PERIODO**		**2885**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región	88	82	78	NA	72	90	97	65	95	99	NA	100	106	94	99	105	68	NA	68	88	90	67	95	92	NA	92	94	95	97	97	NA	2313	80,17%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	NA	572	19,83%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																															**0**	**0,00%**	
De la región	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	22	NA	22	22	22	22	22	NA	572	19,83%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE																															**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																															0	0,00%	
En condición de desplazamiento																															0	0,00%	
MUJERES																															**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	26	0,90%	
Mano de Obra Calificada	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	NA	182	6,31%	
Profesionales - Técnicos	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	7	NA	7	7	7	7	7	NA	182	6,31%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragón Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	24407560	Y	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	TODOS	348.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	24407560	2022-10-12	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 92259364	HERRERA FLOREZ ARCADIO JOSE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
2	CC 1066185817	GARCIA MONTOYA EDGAR ANTONIO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
3	CC 1102823989	PATRON MOGUEA CARMEN ADRIANA	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
4	CC 1102861895	JULIO BARON INES AMINTA	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
5	CC 1143459999	LOPEZ VEGA CARLOS ALBERTO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	24407560	Y	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	TODOS	348.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	24407560		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	5.000.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	348.000	0	0	348.000
Gran Total					null	0	0	null

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	348.000	0	0	348.000
Gran Total					348.000	0	0	348.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24413812	E	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	SINCELEJO	602.600	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	24413812	2022-10-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 3921713	HERNANDEZ PEREZ MANUEL ANTONIO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
2	CC 9195942	HERNANDEZ GAVIRIA ROGER	1.000.000																	0							PROTECCION-230201	33.334	5.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
3	CC 11154287	GALVIS CONTRERA JADER SEGUNDO	1.000.000																	0							COLPENSION ES-25-14	33.334	5.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
4	CC 12120416	CHADID AMAYA JOSE LUIS	1.000.000																	0							COLPENSION ES-25-14	33.334	5.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
5	CC 18776292	PEREZ GOMEZ OLIMPO RAFAEL	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
6	CC 78726590	CANCHILA CALLE CARLOS EDUARDO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	166.667	6.700	CCF DE SUCRE-CCF41	166.667	6.700	166.667	11.700	0,06960	5	0	0	0	0	0	01	0	51.800	S
7	CC 79548116	ESCUDERO ARRIETA EDAEL VICENTE	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
8	CC 92228645	SIERRA CORREA LUIS GABRIEL	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	33.334	5.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
9	CC 92230523	SIERRA CORREA DIEGO ARMANDO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	33.334	5.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
10	CC 92543411	GONZALEZ PATERNINA MANUEL GREGORIO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	166.667	6.700	CCF DE SUCRE-CCF41	166.667	6.700	166.667	11.700	0,06960	5	0	0	0	0	0	01	0	51.800	S
11	CC 92548816	RIVERA PAYARES MARLO RAFAEL	1.000.000																	0							COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
12	CC 92640237	SANCHEZ PEREZ VICTOR ALFONSO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	166.667	6.700	CCF DE SUCRE-CCF41	166.667	6.700	166.667	11.700	0,06960	5	0	0	0	0	0	01	0	51.800	S
13	CC 1002995618	SIERRA PADILLA EDELBETH	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
14	CC 1002995951	SIERRA PADILLA CARLOS JUNIOR	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	100.000	16.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	100.000	4.000	CCF DE SUCRE-CCF41	100.000	4.000	100.000	7.000	0,06960	3	0	0	0	0	0	01	0	31.000	S
15	CC 1062404182	BRITTO SIERRA BRAYAN ENRIQUE	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	4	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
16	CC 1102842388	HERNANDEZ MEZA MAURO ANTONIO	1.000.000																	0							COLPENSION ES-25-14	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	166.667	6.700	CCF DE SUCRE-CCF41	166.667	6.700	166.667	11.700	0,06960	5	0	0	0	0	0	01	0	51.800	S
17	CC 1103113560	PEREZ ALDANA RADAMEL VICENTE	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	166.667	6.700	CCF DE SUCRE-CCF41	166.667	6.700	166.667	11.700	0,06960	5	0	0	0	0	0	01	0	51.800	S
18	CC 1193121515	SALGADO SALGADO DIEGO ANDRES	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	33.334	5.400	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	33.334	1.400	CCF DE SUCRE-CCF41	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	1	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738		JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24413812	E	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	SINCELEJO	602.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	24413812		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.933.343	1.933.343	1.933.343	1.933.343	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				18	310.300	0	0	310.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	5.400	0	0	5.400
PORVENIR	230301	800224808	8	13	246.000	0	0	246.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	58.900	0	0	58.900
EPS(Administradoras: 7)				18	78.300	0	0	78.300
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	3	14.800	0	0	14.800
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	5.400	0	0	5.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	5.400	0	0	5.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	12.200	0	0	12.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	5.400	0	0	5.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	27.000	0	0	27.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	8.100	0	0	8.100
ARP(Administradoras: 1)				18	135.700	0	0	135.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	135.700	0	0	135.700
CCF(Administradoras: 1)				18	78.300	0	0	78.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	18	78.300	0	0	78.300
Gran Total					602.600	0	0	602.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738		JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24402133	E	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	501.900	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24402133	2022-10-06	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 92275635	AYALA CHAVEZ YONIS	1.000.000																	0							COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
2	CC 92510863	PATERNINA CESAR ALBERTO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
3	CC 92538889	CERPA OSORNO JUAN CARLOS	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
4	CC 1005569585	CAMAÑO ARRIETA MANUEL ESTEBAN	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
5	CC 1032407922	COLEY SIERRA LUIS MARIO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
6	CC 1066732444	GONZALEZ JIMENEZ OSCAR ALBERTO	1.000.000																	0							PROTECCION-230201	133.334	21.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
7	CC 1100542638	ACOSTA BUELVAS SANTIAGO DE JESES	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
8	CC 1100543844	ACOSTA BUELVAS CARLOS ARTURO	1.000.000																	0							PROTECCION-230201	133.334	21.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
9	CC 1102811736	FERIA SERPA VENANCIO MANUEL	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
10	CC 1102844866	PATERNINA FERIA JORGE EMIRO	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
11	CC 1102872385	VECINO PADILLA ELVIS YAIR	1.000.000																	0							COLFONDOS-231001	133.334	21.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S
12	CC 1193077284	FERIA NIÑO PEDRO JESUS	1.000.000																	0							PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	133.334	5.400	CCF DE SUCRE-CCF41	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	41.500	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738		JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24402133	E	2022-10-12	TODOS LOS CENTRO	TODOS	TODOS	501.900	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24402133		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.008	1.600.008	1.600.008	1.600.008	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	256.800	0	1.800	0	258.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	21.400	0	200	0	21.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	21.400	0	200	0	21.600
PORVENIR	230301	800224808	8	8	171.200	0	1.100	0	172.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	42.800	0	300	0	43.100
EPS(Administradoras: 7)				12	64.800	0	800	0	65.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	10.800	0	100	0	10.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	10.800	0	100	0	10.900
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	5.400	0	100	0	5.500
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	3	16.200	0	200	0	16.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	5.400	0	100	0	5.500
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	10.800	0	100	0	10.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	5.400	0	100	0	5.500
ARP(Administradoras: 1)				12	111.600	0	800	0	112.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	111.600	0	800	0	112.400
CCF(Administradoras: 1)				12	64.800	0	500	0	65.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	12	64.800	0	500	0	65.300
Gran Total					498.000	0	3.900	0	501.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905		WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	24389231	Y	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	TODOS	2.722.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
70	24389231	2022-10-15	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 9111316	LAMBRAÑO MADRID LUIS MIGUEL	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	16.300	N
2	CC 15607336	MADERA SALGADO LUIS JOSE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
3	CC 19812027	ROMERO CAÑAS FRANCISCO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
4	CC 23179538	MEDINA FLOREZ CAROLINA	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	51.100	N
5	CC 73568789	RAMIREZ CAMPO WILSON	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	51.100	N
6	CC 78485078	GUZMAN VARGAS NESTOR FERNANDO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	11.70	N
7	CC 78734954	ARROYO MADERA JOSE DOMINGO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
8	CC 92230842	ALVAREZ SIERRA DAVINSON	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
9	CC 92276415	TORRES PITALUA EVER ENRIQUE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
10	CC 92448838	BERRIO JIMENEZ DELIO JOSE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	11.700	N
11	CC 92496880	PEREZ ALVAREZ JUAN ERNESTO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
12	CC 92506202	NOVOA GUERRERO LEONEL ENRIQUE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
13	CC 92507688	REGINO DIAZ JORGE LUIS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
14	CC 92508067	PINEDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
15	CC 92512334	MARTINEZ ALVAREZ HUGO MANUEL	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
16	CC 92515625	REGINO DIAZ LUIS VICENTE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
17	CC 92521934	VILLALBA CASTILLO JOSE LUCIANO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.60	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
18	CC 92523882	PADILLA ARRIETA RAFAEL IGNACIO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
19	CC 92535602	JIMENEZ GONZALEZ MANUEL ENRIQUE	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
20	CC 92538620	ROMERO BETIN MANUEL ANTONIO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
21	CC 92539489	LOPEZ ARNEDO OSCAR LUIS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
22	CC 92544149	CONTRERAS GUEVARA NATHANAEL	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	51.100	N
23	CC 92545305	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
24	CC 92559348	PATERNINA CONTRERAS JADER DEL CRISTO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
25	CC 92641547	VERGARA MONTALVO JORGE LUIS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
26	CC 92641557	VERGARA MONTALVO YAN CARLOS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
27	CC 92670304	SALCEDO DIAZ SOFANOR ANTONIO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
28	CC 1005572322	SANTOS CANCHILA CESAR LUIS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
29	CC 1005573866	RODRIGUEZ BALDOVINO JOSE ARMANDO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
30	CC 1005627645	GENES CELIS HERNAN DE JESUS	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
31	CC 1005676913	MEJIA JARABA JOSE RAFAEL	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	30.200	N
32	CC 1010018752	FERIA MORENO MANUEL ALFONSO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
33	CC 1050968666	ARROYO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	48.800	N
34	CC 1051827711	GARCIA ACOSTA CARLOS ALFREDO	1.000.000																	0							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
35	CC 1062963206	CUADRADO PEREZ ALEX	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
36	CC 1072250823	FLOREZ FLOREZ JOSE ANGEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
37	CC 1075089506	SALAS VILLEGAS EDINSON	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.60	N
38	CC 1100392548	AGUILAR TOVAR JULIO EMIRO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
39	CC 1101440773	SANCHEZ MERCADO PEDRO MANUEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
40	CC 1101444220	SIOLO ORTIZ ADOLFO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
41	CC 1102795970	SIMANCA ESCORCIA LEDER FRANCISCO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
42	CC 1102798078	PORTILLO PATERNINA EVER JOSE	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	51.100	N
43	CC 1102804144	VILORIA ARIAS LUIS ALFONSO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
44	CC 1102806622	ROMERO MONTALVO CARLOS DAVID	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
45	CC 1102812202	VELASQUEZ CARE JESUS MANUEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
46	CC 1102812600	PEREZ MERCADO ALEX	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	400.000	27.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	27.900	N
47	CC 1102825040	PEREZ MOLINA JULIO CESAR	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
48	CC 1102839254	MEDRANO GERMAN CARLOS MARIO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
49	CC 1102852168	POLO PADILLA FRAN YAIR	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
50	CC 1102863211	VILLEGAS BOLAÑOS YAN CARLOS	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
51	CC 1102868865	VANEGAS MORALES DEINER JOSE	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
52	CC 1102870774	MEJIA JARABA CHAINY	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	48.800	N
53	CC 1102873396	GENES CELIS JESUS YEISON	1.000.000																	0						PROTECCION-230201	466.667	74.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	466.667	58.400	SIN CCF-	0	0	466.667	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	165.600	N
54	CC 1102878746	MARTINEZ MONTERROZA CARLOS ARTURO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	11.700	N
55	CC 1102881938	ARIAS PEREZ ANDERSON	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
56	CC 1102883511	CHONA SILGADO DIEGO DANIEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	48.800	N
57	CC 1102884547	SEVERICHE ROBLES DANIEL EDUARDO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	48.800	N
58	CC 1102897208	VILLAREAL SUAREZ GUILLERMO ANTONIO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
59	CC 1104257364	ROMERO RODRIGUEZ LUIS MANUEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
60	CC 1126246961	LOPEZ OVIEDO ANDRES DAVID	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
61	CC 1148439080	CRUZ PEÑA VICTOR FAVIO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
62	CC 1148946197	DELGADO RUIZ LUIS ALBERTO	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	46.500	N
63	CC 1193030959	GUERRA MERCADO SEBASTIAN	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	48.800	N
64	CC 1193077399	SANTOS VASQUEZ MARLON DAVID	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	11.700	N
65	CC 1193553246	RIVALDO QUERUBIN JOSE LUIS	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N
66	CC 1193559075	ACOSTA CANOLES JESUS DAVID	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	18.600	N
67	PT 5204587	JOSEPH PABON JIMMY RICHARDSON	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	30.200	N
68	PT 5333907	SANCHEZ ARRIETA JOSE DAVID	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
69	PT 5366516	PADRON LINARES JOSE PASCUAL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N
70	PT 7090680	DAZA RAMIREZ DARWIN DANIEL	1.000.000																	0						SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-	0	0	766.667	53.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	53.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905		WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	24389231	Y	2022-10-12	TODOS LOS CENTROS	SUCRE	TODOS	2.722.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
70	24389231		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
466.667	466.667	37.166.690	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	74.700	0	0	74.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	74.700	0	0	74.700
EPS(Administradoras: 1)				1	58.400	0	0	58.400
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	58.400	0	0	58.400
ARP(Administradoras: 1)				70	2.589.800	0	0	2.589.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	70	2.589.800	0	0	2.589.800
Gran Total					2.722.900	0	0	2.722.900

Anexo 15. Control de seguridad industrial

enterritorio	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	CÓDIGO:	**F-GG-24**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/09/2022	**Y EL**	30/09/2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
	Bueno	**Deficiente**	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		Durante el periodo el Contratista dispuso de tres camiones que distribuyen los materiales desde la bodega principal hacia las bodegas localizadas en El Barrio El Poblado y a las viviendas intervenidas. Un mini cargador y dos motocarros, los cuales distribuyen los materiales desde los diferentes puntos de acopios temporales hacia las viviendas intervenidas. En el periodo utilizó cortadoras y pulidoras para el corte de ladrillos, acero, ceramica, estos se encontraban en buen estado.
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios	x		Los operarios de los vehiculos y maquinaria cuentan con licencia de conduccion requerida.
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		El Contratista mantuvo tres bodegas para el almacenamiento de materiales; una en el campamento principal y dos ubicadas en el Barrio El Poblado. Estas mejoraron en aspectos de orden y correcto almacenamiento de materiales. En las bodegas principales se cuenta con puntos de atención de emergencias y primeros auxilios, conformados por camillas, botiquín, extintores, kid antiderrames
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		Las bodegas ubicadas en El Barrio El Poblado, presentan dificultades de acceso en los dias que se presentan lluvias por lo que las vias se colocan en mal estado.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		A pesar que el Contratista realiza entrega elementos de protección personal de forma constante, debido a la intermitencia en la entrada de trabajadores al proyecto, se presentaron casos puntuales en las inspecciones diaria realizadas por Interventoría donde se observó personal laborando sin los EPP requeridos, por lo anterior mediante oficio N° GA-DOMI-132-22 de fecha 01 de septiembre y correo electrónico de fecha 14 de septiembre, se les solicitó el retiro de la obra de los trabajadores que no cuenten con los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios hasta tanto se utilicen correctamente, según fue establecido en el programa SST aprobado para la prevención de accidentes e incidentes y lo reglamentado por la Ley.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		En general se realizó la demarcacion y señalizacion de areas donde se realizaban actividades de excavaciones. Sin embargo se presentaron algunas demoras en algunas viviendas donde permanecieron excavaciones abiertas por la demora en la intervencion de las mismas.
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		El personal que ingresó a trabajar en el mes de septiembre de 2022 en el proyecto fue afiliado a seguridad social integral



Firma: _____

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/09/2022	**Y EL**	30/09/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		El Contratista mantuvo el mismo proveedor para el suministro de los materiales pétreos que se utilizan en el proyecto. Este cuenta con los permisos, autorizaciones, licencias ambientales vigentes, de las canteras donde se extraen estos materiales, la cual fue otorgada por CARSUCRE, mediante Resolucion N° 1054 del 22 de mayo de 2016 y registro minero N°FFU-142 del 16 de febrero de 2010 otorgado por la Agencia Nacional Minera.
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		Se ha mejorado el almacenamiento de materiales en las viviendas a intervenir, sin embargo se han presentado casos puntuales en algunas viviendas donde se dejan materiales (hierro) a la interperie, para lo cual se le solicita al Contratista que subsane esta situacion de manera inmediata..
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Durante el periodo se realizaron los preoperacionales a la maquinaria y equipos que se encuentran operando en la obra.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Las volquetas que realizaron el transporte de materiales utilizaron carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría tránsito Municipal y de la Resolución N° 0472 de 2017 y Resolución N° 1257 de 2021 de Minambiente, para la realización de esta actividad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		Los residuos sólidos que se generan en la obra se les realiza clasificación y separación en la fuente, para lo cual el Contratista cuenta con puntos ecológicos para su correcto almacenamiento. Los residuos son trasladados al campamento principal para que posteriormente sean recolectados por la Empresa de Aseo INTERASEO SA ESP para su disposición final en sitios autorizados por las autoridades ambientales competentes.
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		se observo mejoras en el almacenamiento de materiales en las viviendas.

Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		Durante el mes de septiembre de 2022, los materiales pétreos como arena, balasto, gravilla son acopiados en el campamento principal; se cubren con plásticos para evitar arrastre de aguas lluvias y emisión de material particulado y polvo. Estos materiales son trasladados directamente a las viviendas que están por intervenir o acopiados en puntos estratégicos en el barrio El Poblado, donde se trasladan con un mini cargador que opera en la obra exclusivamente para el traslado de materiales hacia las viviendas.
Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		
El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		El contratistta presento mejoras en el periodo en cuanto al orden y aseo en las bodegas
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Los campamentos principales cuentan con equipos de control de incendios.
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Los escombros son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Se generan pcos escombros en el proyecto.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizan charlas a los trabajadores

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

Director de Interventoria

Anexo 17. Informes semanales

Bogotá D.C, 07 de septiembre de 2022



Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de septiembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 19 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 29 de agosto de 2022 al 04 de septiembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 20, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y nueve (49) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577				
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1				
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ				
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.				

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220577	
Contratista		CONSORCIO TURQUIA	
Valor inicial	$	5.034.941.972,00	
Valor actual	$	5.034.941.972,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		13/04/2022	
Plazo inicial (Días)		244 Días	
Plazo actual (Días)	244 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		13/12/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	142	58,20%	
Días remanentes del Contrato	99	40,57%	
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220585	
Interventor		GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.	
Valor inicial	$	542.723.071,00	
Valor actual	$	542.723.071,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		13/04/2022	
Plazo inicial		244 Días	
Plazo actual	244 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		13/12/2022	
Ejecución del Contrato	142	58,20%	
Días remanentes del Contrato	99	40,57%	
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-	

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.619.017.954,41	52,02%	$ 899.240.636,20	17,86%	-$ 1.719.777.318,21	-34,16%
Durante el Periodo	$ 191.290.171,48	3,80%	$ 79.341.706,57	1,58%	-$ 111.948.464,91	-2,22%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.810.308.125,89**	**55,82%**	**$ 978.582.342,77**	**19,44%**	**-$ 1.831.725.783,12**	**-36,38%**

Semáforo

Desviación en días

-89 Días

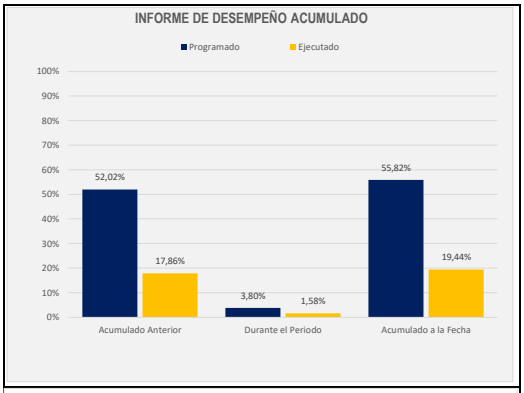

Observaciones al desempeño del proyecto


***Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


***Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.*

***Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 158 viviendas, de las cuales 76 están terminadas (18 cuentan observaciones de detalles para entrega definitiva a los beneficiarios), 82 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 373 para inicio de actividades.*

***Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

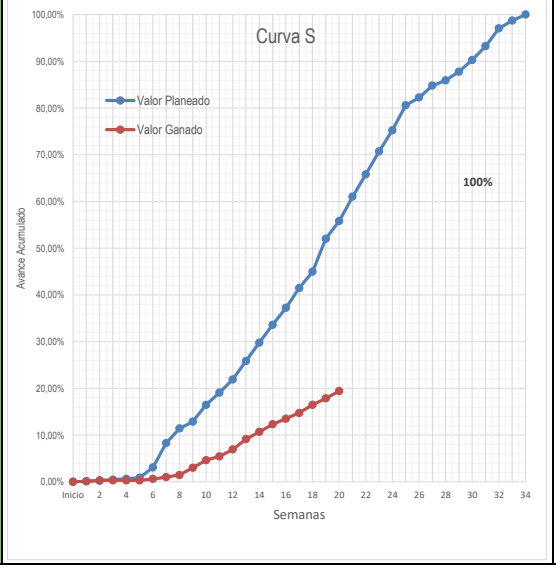

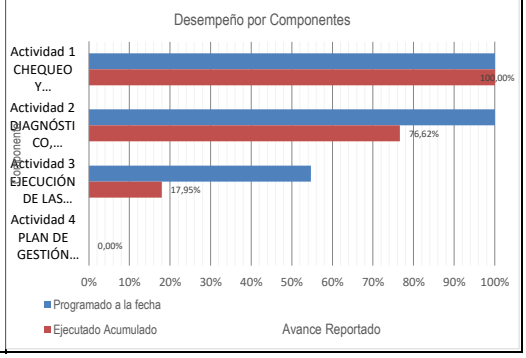

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	52,02%	17,86%	-34,16%	
Durante el Periodo	3,80%	1,58%	-2,22%	
Acumulado a la Fecha	**55,82%**	**19,44%**	**-36,38%**	





AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ 169.474.642,25	$ 812.481.571,33

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 351.110.691,92	6,97%	2	$ 351.110.691,92	6,97%	N/A	$ 219.060.307,07








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!


enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** | Fecha **5/09/2022**



No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
4	$ 118.286.493,33	21,80%	4	$ 118.286.493,33	21,80%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.
* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.
* Actividad 3. A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 158 viviendas, de las cuales 76 están terminadas (18 cuentan observaciones de detalles para entrega definitiva a los beneficiarios), 82 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 373 para inicio de actividades.
* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 531
Se evidenció una diferencia en 162 diagnósticos por debajo a la meta establecida.

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 379
Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 232
Viviendas terminadas: 76
Viviendas en ejecución: 82
Viviendas totales iniciadas: 158

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El 24 de agosto de 2022, se realizó reunión de seguimiento para revisión del avance del proyecto en las Actividades 2: Diagnósticos y Actividad 3: Ejecución de obra. Así mismo, se contó con la participación y asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio e Interventoría.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-123-22 del día 29 de agosto de 2022, esta Interventoría en respuesta a la comunicación CONS-TUR-SINC-073 y dando alcance al correo electrónico del día 19 de agosto de 2022, se reiteraron las observaciones dadas a los diagnósticos remitidos por el Consorcio Turquía en el paquete 18B.
El día 24 de agosto de 2022 con la carta GA-DOMI-125-22 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, se procedió a solicitar al Consorcio Turquía dar cumplimiento con las metas fijadas en el plan de contingencia para subsanar el atraso reportado en el cronograma de obra, así como también el aumento de mano de obra e incremento de nuevas aperturas de viviendas a intervenir.

* El día 24 de agosto de 2022 con carta GA-DOMI-127-22, se solicitó al Consorcio Turquía remitir los exámenes de egreso y certificados de paz y salvo del personal que laboró para el constructor, debido a que se retiraron y no se ha suministrado dicha información a esta Interventoría.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 29 de agosto de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios, suministro de materiales, subsanación de las viviendas por entregar. El Contratista de Obra no realizó aperturas nuevas.

* El día 30 de agosto de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de excavaciones para la cimentación del tanque elevado, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo.
* Se evidenció que el Contratista de obra no atendió todas las observaciones de detalles de las viviendas por entregar.
* Se realizaron dos aperturas cuyos códigos son: S-SC-EP-M1-VE-181, S-SC-EP-M6-VE-130.

* El día 31 de agosto de 2022, el contratista continuó con las actividades de excavaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de vigas.
* Se realizó la apertura de nueve viviendas bajo los códigos N°.S-SC-EP-M65-VE-519, S-SC-EP-M65-VE-520, S-SC-EP-M65-VE-521, S-SC-EP-M65-VE-522, S-SC-EP-M65-VE-523, S-SC-EP-M65-VE-528, S-SC-EP-M65-VE-529, S-SC-EP-M69-VE-535 y S-SC-EP-M65-VE-640,
* Se efectuó recorrido conjunto entre los residentes de interventoría y obra, con el fin de realizar la verificación del avance de las viviendas que se encuentran en ejecución.
* En las horas de la tarde se realizó comité de seguimiento, en donde se establecieron compromisos para la entrega de las viviendas que hacen falta por detalles y entrega de los diagnósticos faltantes.
* El día 01 de septiembre de 2022, el Contratista de obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios.
* En cumplimiento de los compromisos contraídos se realizó recorrido con el Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría y social de interventoría, con el fin de verificar el estado de las viviendas priorizadas y las que hacen falta por la entrega.
* El día 02 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. En el día de hoy no se realizaron aperturas.
* El día 03 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitarias, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros y fundida de machones, fundida de placa aérea para los tanques elevados, se recibieron viviendas por parte del contratista.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 30 de agosto de 2022


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

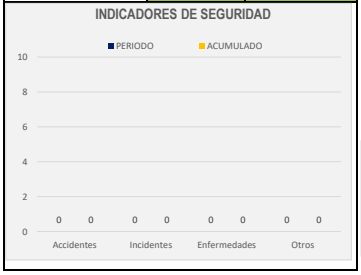

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	86	0	86	59,3%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	24,1%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	5,5%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	11,0%
	Total	**145**	**0**	**145**	**100,00%**



* No se presentaron lluvias durante las horas laborales
* Con respecto a los temas operativos se informa que el contratista a través de la comunicación CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022, remitió la actualización del plan de contingencia, en donde manifiesta las actividades atrasadas por el acarreo de los materiales dentro del sitio de la obra, así mismo, informa la disponibilidad de materiales para dar apertura de las intervenciones de viviendas en los meses siguientes y se han tomado las acciones correctivas para minimizar los tiempos de transporte de los materiales.
* Respecto a las 8 horas de los días 4 y 5 de agosto de 2022 del ítem 7 imputables al contratista se debe a que los trabajadores y subcontratista pararon las actividades de obra por inconformidades por falta de materiales en los frentes de obra abiertos.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Juaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	08 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 104 Edith quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30 .	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección .	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Torres Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Torres Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39 .	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS


PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
		El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas.			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizo la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidencio mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 J con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizo los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

• El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliaria de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado quinientos treinta y uno (531) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

• Para la actividad tres (3) se han iniciado un total de ciento cincuenta y ocho (158) viviendas, setenta y seis (76) se encuentran terminadas, de las cuales dieciocho (18) se encuentran con observaciones, ochenta y dos (82) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones, y el levante de muros.

• Respecto a la actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, y se continuará con las visitas vivienda por viviendas y reuniones sectorizadas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **5/09/2022**

*Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 19,44% y un porcentaje programado acumulado de 55,82%cual representa un atraso de 36,38% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 7,02% y el restante 29,36% si son responsabilidad del contratista de obra.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-133-22 del día 02 de septiembre de 2022. Se envió al contratista de obra el seguimiento al plan de contingencia semana 19. En el cual se describe la situación tanto de la etapa 1 como de la 2. Se le informa al contratista de obra que solo se han terminado 76 intervenciones, por lo tanto, está pendiente por finalizar para entrega 116 viviendas, ya que conforme al plan de contingencia con corte al 28 de agosto de 2022 se debió haber terminado 192 intervenciones. Finalmente se le solicitó al contratista que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con materiales suficientes para la ejecución de actividades, aumente la mano de obra e incremente la apertura de intervenciones, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato continúa en atraso

* De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista de obra, se realizó reunión el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado.

* Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2022

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al 11 de septiembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 19 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 05 de septiembre de 2022 al 11 de septiembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 21, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 15/09/2022
HORA: 3:42:08 p. m.
20224300346412

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y nueve (49) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	149		61,07%
Días remanentes del Contrato	92		37,70%
Acumulado a última acta pagada	$ 351.110.691,92		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	149		61,07%
Días remanentes del Contrato	92		37,70%
Acumulado a última acta pagada	$ 118.286.493,33		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.810.308.125,89	55,82%	$ 978.792.719,36	19,44%	-$ 1.831.515.406,54	-36,38%
Durante el Periodo	$ 262.138.383,14	5,21%	$ 101.884.182,08	2,02%	-$ 160.254.201,06	-3,18%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.072.446.509,03**	**61,02%**	**$ 1.080.676.901,44**	**21,46%**	**-$ 1.991.769.607,60**	**-39,56%**

Semáforo

Desviación en días

-97 Días

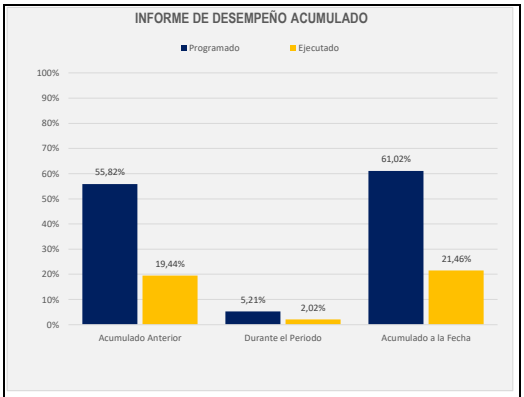

Observaciones al desempeño del proyecto

** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*

** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.*


Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquía para 82 viviendas se evidencio 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los cuales la Entidad realizo las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoría se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.


En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 172 viviendas, de las cuales 76 están terminadas, 96 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 359 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

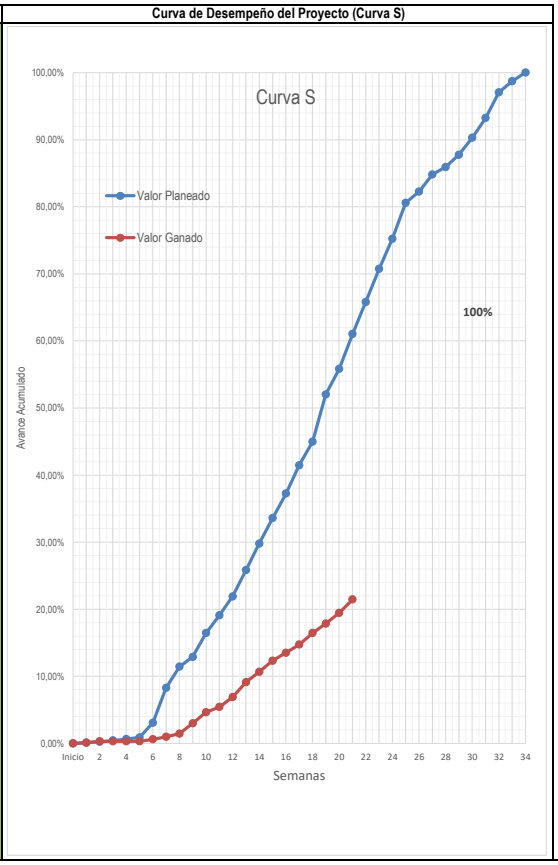

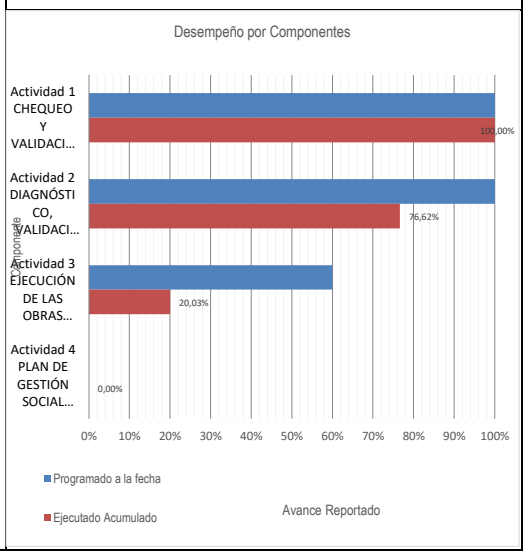

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	55,82%	19,44%	-36,38%	
Durante el Periodo	5,21%	2,02%	-3,18%	
Acumulado a la Fecha	**61,02%**	**21,46%**	**-39,56%**	

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ 169.474.642,25	$ 812.481.571,33


No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
2	$ 351.110.691,92	6,97%	2	$ 351.110.691,92	6,97%	11/08/2022	$ 812.481.571,33


INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21


Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** | Fecha **12/09/2022**

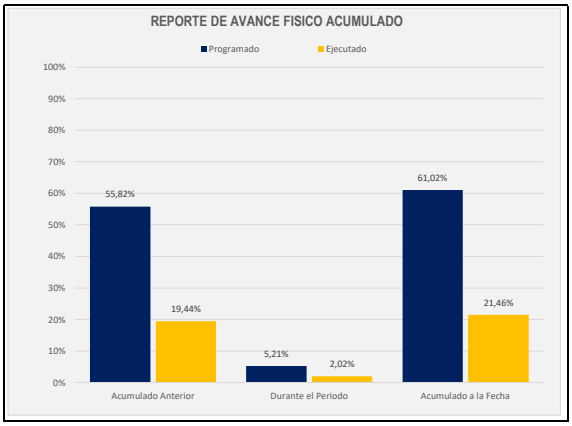

2	$ 351.110.691,92	6,97%	2	$ 351.110.691,92	6,97%	N/A	$ 219.060.307,07








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 166.615.982,81	30,70%	4	$ 118.286.493,33	21,80%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

*** Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

*** Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.

Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquía para 82 viviendas se evidencio 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los cuales la Entidad realizo las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoría se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.

En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

*** Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 172 viviendas, de las cuales 76 están terminadas, 96 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 359 para inicio de actividades.

*** Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.

diagnósticos programación inicial: 693
diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693
diagnósticos Aprobados acumulados: 531
Se evidenció una diferencia en 162 diagnósticos por debajo a la meta establecida.

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 416
Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 272
Viviendas terminadas: 76
Viviendas en ejecución: 96
Viviendas totales iniciadas: 172

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El 08 de septiembre de 2022, se realizó reunión de seguimiento para revisión del avance del proyecto en las Actividades 2: diagnósticos y Actividad 3: Ejecución de obra. Así mismo, se contó con la participación y asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio e Interventoría.

* El día 09 de septiembre de 2022 con la carta GA-DOMI-137-22 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, se procedió a solicitar al Consorcio Turquía dar cumplimiento con las metas fijadas en el plan de contingencia para subsanar el atraso reportado en el cronograma de obra, así como también el aumento de mano de obra e incremento de nuevas aperturas de viviendas a intervenir.
* Con carta GA-DOMI-138-22 del día 09 de septiembre de 2022 se informó al Consorcio Turquía el plazo máximo para el trámite del acta de recibo parcial de obra No. 3 y la entrega del informe mensual del mes de agosto de 2022.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 05 de septiembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios, suministro de materiales, subsanación de las viviendas por entregar.

El Contratista de Obra realizó cinco (5) aperturas nuevas cuyos códigos son: S-SC-EP-M39-VE-445, S-SC-EP-M39-VE-277, S-SC-EP-M41-VE-284, S-SC-EP-M41-VE-343 y S-SC-EP-M41-VE-279. Por otra parte, el día 05 de septiembre de 2022 se realizó recorrido con el director de Interventoría para revisar las condiciones de las viviendas entregadas y las priorizadas.
* El día 06 de septiembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de excavaciones para la cimentación del tanque elevado, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo.

Se realizaron tres (3) aperturas cuyos códigos son: S-SC-EP-M25-VE-090, S-SC-EP-M29-VE-078 y S-SC-EP-M26-VE-068. En horas de la mañana se llevó a cabo reunión de seguimiento en las instalaciones de la Alcaldía de Sincelejo con la visita de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y asistencia del contratista de obra, Interventoría, representantes del FOVIS y VEOLIA (Empresa de Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado).

En las horas de la tarde se realizó recorrido de obra con el contratista, ministerio de vivienda, Interventoría y veedores, con el fin de verificar el estado de las viviendas terminadas y que se encuentran en ejecución.
* El día 07 de septiembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de excavaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención.

Se realizó la apertura de tres (3) viviendas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M44-VE-341, S-SC-EP-M44-VE-342 y S-SC-EP-M44-VE-348.
* El día 08 de septiembre de 2022, el Contratista de obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios y excavación para cimentaciones.

En cumplimiento de los compromisos contraídos se realizó recorrido con la asistencia del Residente de Interventoría, Inspectores de Interventoría y Social de Interventoría, con el fin de realizar la verificación de los detalles pendientes por subsanar por parte del Consorcio Turquía en las viviendas terminadas, de las cuales se constató la atención en su totalidad. En horas de la tarde se realizó comité de seguimiento de obra, en el cual asiste Enterritorio, Contratista e Interventoría.

Se realizó la apertura de una vivienda cuyo código es: S-SC-EP-M26-VE-097.
* El día 09 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones.

Se realizaron dos (2) aperturas de viviendas, cuyos códigos son: S-SC-EP-M32-VE-046 y S-SC-EP-M35-VE-132.
* El día 10 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitarias, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros y fundida de machones, fundida de placa aérea para los tanques elevados, no se recibieron viviendas por parte del contratista, por otra parte se observó que en varias viviendas no se encuentran laborando ya que no hay materiales como: arena y gravilla.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 30 de agosto de 2022.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21


Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	86	5	91	60,7%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	23,3%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	5,3%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	10,7%
	Total	**145**	**5**	**150**	**100,00%**



* El día 8 de septiembre se presentaron lluvias desde las 6 de la mañana hasta las 12 del medio día.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldia / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22	Area técnica del contratista Consorcio	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16l 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16l 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16l 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B .47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pomnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pomnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39 .	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizo la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidencio mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 J con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizo los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **12/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

• El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliaria de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado quinientos treinta y uno (531) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

A la fecha se tiene la entrega por el Consorcio Turquía de 62 diagnósticos para revisión de interventoría, de los cuales 27 son de atención de observaciones, 32 de primera revisión y 3 pendientes por duplicidad. Es de anotar que continúan pendiente con observaciones de un total de 30 diagnósticos no atendidos por el contratista de obra.

En cuanto a la revisión y respuesta del FOVIS a las viviendas que no se habían podido localizar se tiene 16 no efectivas, 2 en revisión en campo por el contratista de obra, que no se ha respondido por la Entidad, 20 pendientes de realizar visita para diagnósticos y 7 por diagnósticos. Por consiguiente está faltando de localizar o visitar de un total de 19.

En resumen se tiene los siguientes datos:

- Diagnósticos aprobados: 531
- Diagnósticos 2ª revisión: 27
- Diagnósticos 1ª revisión: 32
- Diagnósticos con observaciones: 30 + 3 con duplicidad.
- Viviendas no efectivos (FOVIS): 16
- Viviendas no efectivos (Concepto técnico): 5
- Viviendas en revisión en campo (Resultado respuesta FOVIS): 2
- Vivienda falta respuesta FOVIS: 1
- Viviendas pendientes visitar (Resultado respuesta FOVIS): 20
- Viviendas con diagnósticos (Resultado respuesta FOVIS): 7
- Faltante por localizar contratista de obra: 19

TOTAL: 693

• Para la actividad tres (3) se han iniciado un total de ciento setenta y dos (172) viviendas, setenta y seis (76) se encuentran terminadas y noventa y seis (96) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones, y el levante de muros.

Es importante mencionar que en el comité de seguimiento No. 27 del día 08 de septiembre de 2022el contratista se comprometió a lo siguiente:

• # Viviendas iniciadas hasta el día 07/09/2022: 169 se cumplió parcialmente, el Consorcio Turquía se compromete llegar a 272
• # Viviendas terminadas (entregadas) 07/09/2022: 76
• # Viviendas terminadas acumuladas: El Consorcio Turquía se compromete llegar a 156

• Respecto a la actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, y se continuará con las visitas vivienda por viviendas y reuniones sectorizadas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

*Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 21,46% y un porcentaje programado acumulado de 61,02% lo cual representa un atraso de 39,56% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 7,27% y el restante 32,28% si son responsabilidad del contratista de obra.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-137-22 del día 09 de septiembre de 2022. Se envió al contratista de obra el seguimiento al plan de contingencia semana 20. Se le informa al contratista de obra que solo se han terminado 76 intervenciones, estando pendiente por finalizar para entrega 156 viviendas, ya que conforme al plan de contingencia con corte al 04 de septiembre de 2022 se debió haber terminado 232 intervenciones. Finalmente se le solicitó al contratista que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con materiales suficientes para la ejecución de actividades, aumente la mano de obra e incremente la apertura de intervenciones, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato continúa en atraso.

* De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista de obra, se realizó reunión el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado.

* Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 21 de septiembre de 2022

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 20/09/2022
HORA: 10:36:00 a. m.
20224300354042

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al 18 de septiembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 22 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2022 al 18 de septiembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 22, bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Informe social, Estado del clima en la semana reporte IDEAM, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y cinco (45) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: DDG
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** | Fecha **19/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220577
Contratista			CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial	$		5.034.941.972,00
Valor actual	$		5.034.941.972,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial (Días)			244 Días
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			13/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	156		63,93%
Días remanentes del Contrato	85		34,84%
Acumulado a última acta pagada	$		351.110.691,92
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.			2220585
Interventor			GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial	$		542.723.071,00
Valor actual	$		542.723.071,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial			244 Días
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			13/12/2022
Ejecución del Contrato	156		63,93%
Días remanentes del Contrato	85		34,84%
Acumulado a última acta pagada	$		118.286.493,33
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.072.446.509,03	61,02%	$ 1.080.676.901,44	21,46%	-$ 1.991.769.607,60	-39,56%
Durante el Periodo	$ 240.883.919,64	4,78%	$ 184.048.345,68	3,66%	-$ 56.835.573,96	-1,13%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.313.330.428,68**	**65,81%**	**$ 1.264.725.247,12**	**25,12%**	**-$ 2.048.605.181,56**	**-40,69%**

Desviación en días: -99 Días

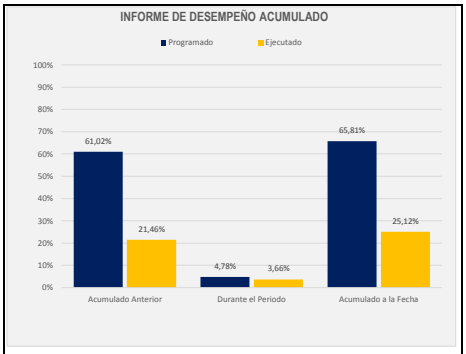

Observaciones al desempeño del proyecto

**** Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el Nº. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado Nº. 20224300189742.***

**** Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoria.***


Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquia para 82 viviendas se evidenció 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los cuales la Entidad realizó las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoria se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.


En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

**** Actividad 3. A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 187 viviendas, de las cuales 130 están terminadas y de estas 47 tienen observaciones, 57 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 344 para inicio de actividades.***

**** Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.***

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

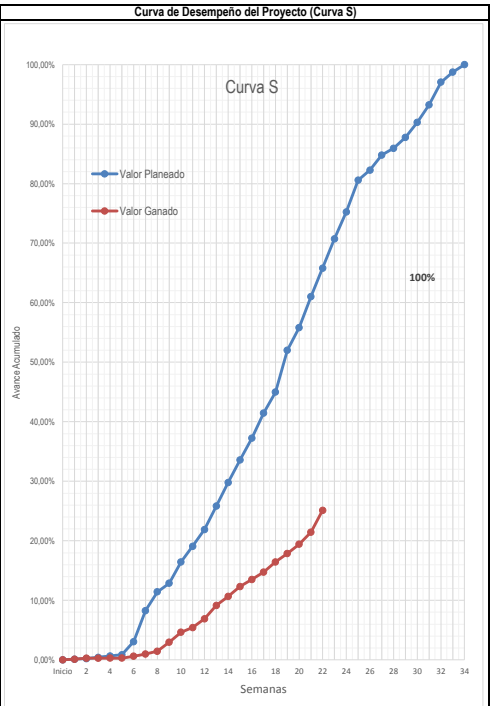

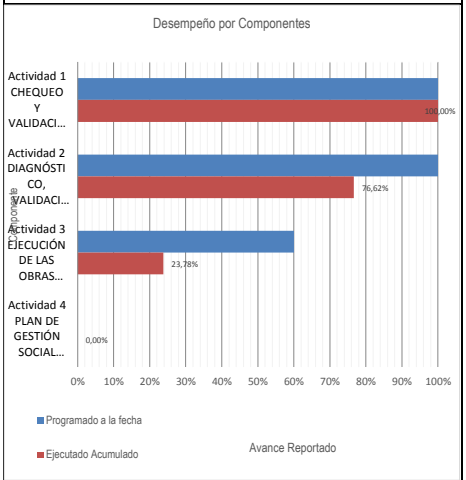

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 12/09/2022 al 18/09/2022 | Fecha 19/09/2022

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	61,02%	21,46%	-39,56%	
Durante el Periodo	4,78%	3,66%	-1,13%	
Acumulado a la Fecha	**65,81%**	**25,12%**	**-40,69%**	

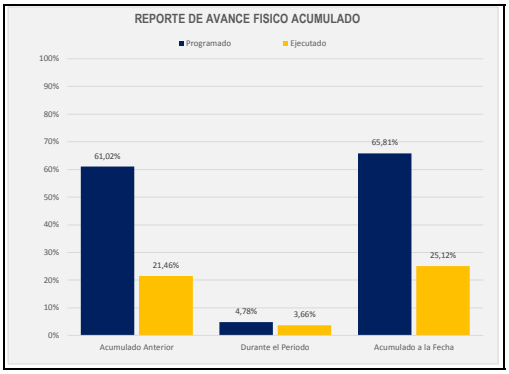


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,56	$ 169.474.642,25	$ 812.481.571,33

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 351.110.691,92	6,97%	2	$ 351.110.691,92	6,97%	N/A	$ 219.060.307,07








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 166.615.982,81	30,70%	4	$ 118.286.493,33	21,80%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.

Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquía para 82 viviendas se evidenció 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los cuales la Entidad realizó las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoría se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.

En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

* Actividad 3. A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 187 viviendas, de las cuales 130 están terminadas y de estas 47 tienen observaciones, 57 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 344 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.

diagnósticos programación inicial: 693
diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693
diagnósticos Aprobados acumulados: 531
Se evidenció una diferencia en 162 diagnósticos por debajo a la meta establecida.

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 450
Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 312
Viviendas terminadas: 130 , 47 tienen observaciones de detalles minimos.
Viviendas en ejecución: 57
Viviendas totales iniciadas: 187

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 15 de septiembre de 2022 con la carta GA-DOMI-143-22 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, se procedió a solicitar al Consorcio Turquía dar cumplimiento con las metas fijadas en el plan de contingencia para subsanar el atraso reportado en el cronograma de obra, así como también el aumento de mano de obra e incremento de nuevas aperturas de viviendas a intervenir.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 12 de septiembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios, suministro de materiales, subsanación de las viviendas por entregar. Por otra parte el día 12 de septiembre se recibe a los profesionales en comunicacion de la alcaldia, esto con el fin de hacer una nota informativa acerca del avance del proyecto. El Contratista de Obra realizó una (01) apertura nueva cuyo código es: S-SC-EP-M22-VE-109.

* El día 13 de septiembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de excavaciones para la cimentación del tanque elevado, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo. En este día no se realizaron aperturas.

* El día 14 de septiembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de excavaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención. En este día se realizó recorrido con los veedores por parte del area social y se realizó la apertura de doce (12) viviendas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M69-VE-534, S-SC-EP-M05-VE-600 , S-SC-EP-M05-VE-654, S-SC-EP-M08-VE-231, S-SC-EP-M05-VE-116, S-SC-EP-M04-VE-158, S-SC-EP-M03-VE-169, S-SC-EP-M03-VE-170, S-SC-EP-M03-VE-171, S-SC-EP-M01-VE-202, S-SC-EP-M01-VE-186, y S-SC-EP-M01-VE-185.

* El día 15 de septiembre de 2022, el Contratista de obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios y excavación para cimentaciones. En este día y en cumplimiento de los compromisos contraídos, se realizó recorrido con la asistencia del Residente de Interventoría, Inspectores de Interventoría y supervisor de Veolia con el fin de realizar la verificación de la instalación de domiciliarias sanitarias y micromedidores de las viviendas que ya fueron cobradas en las actas 1 y 2, por otra parte, en el area social se realiza un recorrido con la junta comunal. En horas de la tarde se realiza el comité de seguimiento al avance del contrato, el cual cuenta con la asistencia de Enterritorrio, Contratista e Interventoría.

* El día 16 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones.

* El día 17 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitarias, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros y fundida de machones, fundida de placa aérea para los tanques elevados, no se recibieron viviendas por parte del contratista, por otra parte, se observó que en varias viviendas no se encuentran laborando ya que no hay materiales como: arena y gravilla.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	91	2	93	61,2%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	23,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	5,3%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	10,5%
	Total	**150**	**2**	**152**	**100,00%**



* El día 15 de septiembre se presentaron lluvias desde las 10 de la mañana hasta las 12 del medio día.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por	Fecha		Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldia / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022		El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022		El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022		El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022		El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022		El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022		El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022		El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022		El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022		El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022		El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022		El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022		El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022		El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022		El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022		El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022		El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022		El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022		El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022		El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022		El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	definir con planeacion si esta en zona de riesgo
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022		El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022		El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022		El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022		El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022		El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022		El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022		El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Área técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N° 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **19/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliaria de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado quinientos treinta y uno (531) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

*A la fecha se tiene la entrega por el Consorcio Turquía de 62 diagnósticos para revisión de interventoría, de los cuales 27 son de atención de observaciones, 32 de primera revisión y 3 pendientes por duplicidad. Es de anotar que continúan pendiente con observaciones de un total de 30 diagnósticos no atendidos por el contratista de obra.

* En cuanto a la revisión y respuesta del FOVIS a las viviendas que no se habían podido localizar se tiene 16 no efectivas, 2 en revisión en campo por el contratista de obra, que no se ha respondido por la Entidad, 20 pendientes de realizar visita para diagnósticos y 7 por diagnósticos. Por consiguiente, falta localizar o visitar un total de 19.

En resumen se tiene los siguientes datos:

- Diagnósticos aprobados: 531
- Diagnósticos 2ª revisión: 27
- Diagnósticos 1ª revisión: 32
- Diagnósticos con observaciones: 30 + 3 con duplicidad.
- Viviendas no efectivos (FOVIS): 16
- Viviendas no efectivos (Concepto técnico): 5
- Viviendas en revisión en campo (Resultado respuesta FOVIS): 2
- Vivienda falta respuesta FOVIS: 1
- Viviendas pendientes visitar (Resultado respuesta FOVIS): 20
- Viviendas con diagnósticos (Resultado respuesta FOVIS): 7
- Faltante por localizar contratista de obra: 19

TOTAL: 693

* Para la actividad tres (3) se han iniciado un total de ciento ochenta y siete (187) viviendas, ciento treinta (130) se encuentran terminadas, de las cuales cuarenta y siete (47) tienen observaciones minimas , y cincuenta y siete (57) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones, y el levante de muros.

Es importante mencionar que en el comité de seguimiento No. 28 del día 15 de septiembre de 2022 el Contratista se comprometió a lo siguiente:

* # Viviendas iniciadas hasta el día 07/09/2022: 169 se cumplió parcialmente, el Consorcio Turquía se compromete llegar a 272.
* # Viviendas terminadas (entregadas) 07/09/2022: 76.
* # Viviendas terminadas acumuladas07/09/2022: 76 No se cumplio. El Consorcio Turquia se compromete llegar a 156

* Respecto a la actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, y se continuará con las visitas vivienda por viviendas y reuniones sectorizadas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

* Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 25,12% y un porcentaje programado acumulado de 65,81% lo cual representa un atraso de 40,69% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 7,38% y el restante 33,31% si son responsabilidad del contratista de obra.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-137-22 del día 09 de septiembre de 2022. Se envió al contratista de obra el seguimiento al plan de contingencia semana 20. Se le informa al contratista de obra que solo se han terminado 76 intervenciones, estando pendiente por finalizar para entrega 156 viviendas, ya que conforme al plan de contingencia con corte al 04 de septiembre de 2022 se debió haber terminado 232 intervenciones. Finalmente se le solicitó al contratista que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con materiales suficientes para la ejecución de actividades, aumente la mano de obra e incremente la apertura de intervenciones, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato continúa en atraso.

* De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista de obra, se realizó reunión el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado.

* Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 28 de septiembre de 2022

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 28/09/2022 HORA: 4:04:00 p. m.
20224300365512

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al 25 de septiembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 23 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 19 de septiembre de 2022 al 25 de septiembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 23, bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Informe social, Estado del clima en la semana reporte IDEAM, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y cinco (45) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** | Fecha **26/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577		
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1		
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ		
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.		

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	163		66,80%
Días remanentes del Contrato	78		31,97%
Acumulado a última acta pagada	$ 520.585.334,17		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	163		66,80%
Días remanentes del Contrato	78		31,97%
Acumulado a última acta pagada	$ 118.286.493,33		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.313.330.428,68	65,81%	$ 1.264.777.423,37	25,12%	-$ 2.048.553.005,31	-40,69%
Durante el Periodo	$ 247.968.740,81	4,92%	$ 124.793.967,43	2,48%	-$ 123.174.773,38	-2,45%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.561.299.169,48**	**70,73%**	**$ 1.389.571.390,80**	**27,60%**	**-$ 2.171.727.778,69**	**-43,13%**

Desviación en días: -105 Días

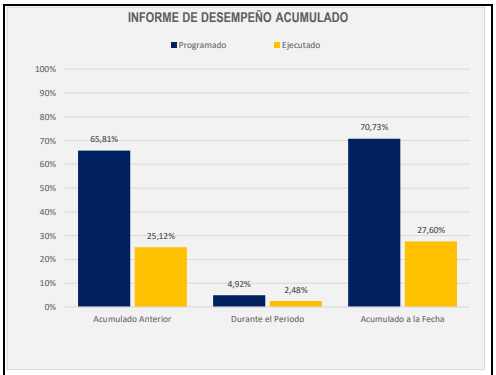

Observaciones al desempeño del proyecto

***Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*

***Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.*


Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquia para 82 viviendas se evidenció 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los cuales la Entidad realizó las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoría se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.


En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

***Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 213 viviendas, de las cuales 130 están terminadas y de estas 45 tienen observaciones, 83 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 318 para inicio de actividades.*

***Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

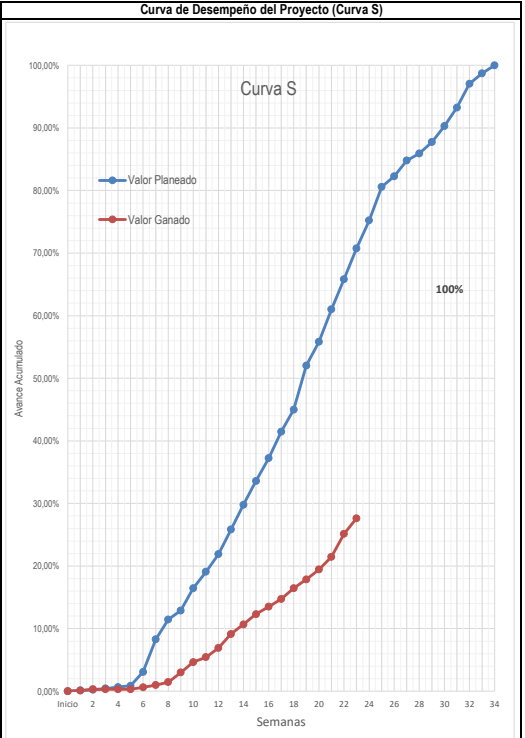

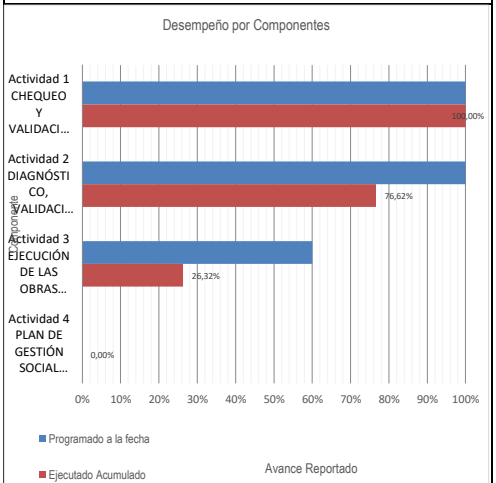

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	65,81%	25,12%	-40,69%	
Durante el Periodo	4,92%	2,48%	-2,45%	
Acumulado a la Fecha	**70,73%**	**27,60%**	**-43,13%**	





AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 289.357.129,77	$ 692.599.083,83

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 888.613.090,18	17,65%	2	$ 520.585.334,17	10,34%	9/09/2022	$ 353.326.921,98











INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

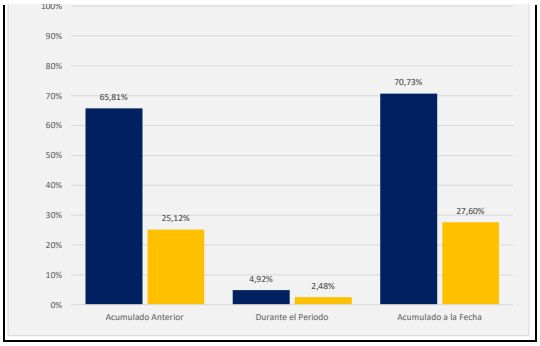







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
5	$ 166.615.982,80	30,70%	4	$ 118.286.493,33	21,80%	24/08/2022	$ 36.878.032,68







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 554 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 531 diagnósticos acumulados. En cuanto a las 97 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.

Con relación a lo reportado por el FOVIS en la consulta realizada por el Consorcio Turquía para 82 viviendas se evidenció 23 registros repetidos, los cuales se eliminaron y se obtuvo una cantidad de 59 predios a los que Entidad realizó las visitas. Una vez efectuada la revisión a la respuesta dada por el FOVIS por esta Interventoría se obtuvo 40 viviendas efectuadas de las cuales 20 están pendientes por visitar y 20 ya están incluidas dentro del PCI, 16 viviendas no efectivas, dos (2) pendientes de verificación en campo y una que no se ha obtenido respuesta.

En cuanto a las solicitudes de inclusión por medio de PQR´s se tiene la presentación de 190 peticiones, de las cuales en la respuesta dada por el FOVIS son efectivas un total de 105 viviendas, ochenta y cuatro (84) no efectivas por estar en zonas de riesgo y una (1) está pendiente de respuesta.

* Actividad 3. A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 213 viviendas, de las cuales 130 están terminadas y de estas 45 tienen observaciones, 83 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 318 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.	**Actividad 3.**
diagnósticos programación inicial: 693 diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693 diagnósticos Aprobados acumulados: 531 Se evidenció una diferencia en 162 diagnósticos por debajo a la meta establecida.	Viviendas programación inicial: 485 Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 352 Viviendas terminadas: 130 , 45 tienen observaciones de detalles mínimos. Viviendas en ejecución: 83 Viviendas totales iniciadas: 213

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 23 de septiembre de 2022 con la carta GA-DOMI-143-22 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, se procedió a solicitar al Consorcio Turquía dar cumplimiento con las metas fijadas en el plan de contingencia para subsanar el atraso reportado en el cronograma de obra, así como también el aumento de mano de obra e incremento de nuevas aperturas de viviendas a intervenir.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 19 de septiembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios, suministro de materiales, subsanación de las viviendas por entregar.
* El día 20 de septiembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de excavaciones para la cimentación del tanque elevado, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo. En este día no se realizaron aperturas.
* El día 21 de septiembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de excavaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención. En el día de hoy se realizaron diecisiete (17) aperturas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M21-VE-489 , S-SC-EP-M22-VE-108, S-SC-EP-M57-VE-431, S-SC-EP-M69-VE-542, S-SC-EP-M69-VE-553, S-SC-EP-M73-VE-552, S-SC-EP-M70-VE-580, S-SC-EP-M70-VE-551, S-SC-EP-M57-VE-435, S-SC-EP-M55-VE-412, S-SC-EP-M55-VE-409, S-SC-EP-M61-VE-514, S-SC-EP-M65-VE-561, S-SC-EP-M60-VE-564, S-SC-EP-M73-VE-589, S-SC-EP-M08-VE-133 y S-SC-EP-M05-VE-180.
* El día 22 de septiembre de 2022, el Contratista de obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios y excavación para cimentaciones. En este día y en cumplimiento de los compromisos contraídos, se realizó recorrido con el ministerio de vivienda, Enterritorio, Representantes de la Alcaldía de Sincelejo (Sucre), Contratista de Obra e Interventoría, con el fin de revisar las unidades sanitarias a mostrar en la visita programada por la Ministra de Vivienda al proyecto.

Se realizaron 6 aperturas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M70-VE-575, S-SC-EP-M70-VE-576, S-SC-EP-M70-VE-574, S-SC-EP-M70-VE-577, S-SC-EP-M65-VE-524 y S-SC-EP-M71-VE-609.
* El día 23 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. En horas de la mañana se realiza la reunión de cierre y comité de seguimiento del recorrido realizado el día anterior, a esta asisten el contratista, interventoría, y la
* El día 24 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitarias, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros y fundida de machones, fundida de placa aérea para los tanques elevados, no se recibieron viviendas por parte del contratista, por otra parte, se observó que en varias viviendas no se encuentran laborando ya que no hay materiales como: arena y gravilla.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	93	7	100	62,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	22,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	5,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	10,1%
	Total	**152**	**7**	**159**	**100,00%**



* El día 22 de septiembre de 2022, en las horas de la mañana se registró lluvias en la zona del proyecto de un total de 3 horas.
* El día 23 de septiembre de 2022, en horas de la tarde se registró lluvias en la zona del proyecto de un total de 4 horas.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR		Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión		No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Área técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22	Area técnica del contratista Consorcio	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 J con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliaria de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado quinientos treinta y uno (531) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial y de acuerdo con el compromiso fijado en comité de seguimiento No. 28 y 29, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, obteniendo un potencial neto de 618 viviendas posibles beneficiarias, 30 no efectivas y 1 renuncia, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Viviendas efectivas: 618
Viviendas aprobadas: 531
Viviendas no efectivas: 30
Renuncias: 1
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 44
Viviendas terminadas:130
Viviendas en ejecución: 83
Viviendas iniciadas: 213

* Para la actividad tres (3) se han iniciado un total de doscientos trece (213) viviendas, de las cuales ciento treinta (130) se encuentran terminadas (cuarenta y cinco (45) tienen observaciones de detalles) y ochenta y tres (83) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones, y el levante de muros.

Es importante mencionar que en el comité de seguimiento No. 29 del día 23 de septiembre de 2022 el Contratista se comprometió a lo siguiente:

* # Viviendas nuevas iniciadas hasta el día 29/09/2022: 50
* # Viviendas terminadas (entregadas) 29/09/2022: 20.
* # Viviendas terminadas acumuladas07/09/2022: 150

* Respecto a la actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, y se continuará con las visitas vivienda por viviendas y reuniones sectorizadas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

* Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 27,60% y un porcentaje programado acumulado de 70,73% lo cual representa un atraso de 43,13% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 7,74% y el restante 35,40% si son responsabilidad del contratista de obra.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-137-22 del día 09 de septiembre de 2022. Se envió al contratista de obra el seguimiento al plan de contingencia semana 20. Se le informa al contratista de obra que solo se han terminado 76 intervenciones, estando pendiente por finalizar para entrega 156 viviendas, ya que conforme al plan de contingencia con corte al 04 de septiembre de 2022 se debió haber terminado 232 intervenciones. Finalmente se le solicitó al contratista que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con materiales suficientes para la ejecución de actividades, aumente la mano de obra e incremente la apertura de intervenciones, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato continúa en atraso.

* De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista de obra, se realizó reunión el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

* Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2022

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 4/10/2022 HORA: 3:50:28 p. m.
20224300372442

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 24 periodo del 26 de septiembre de 2022 al 02 de octubre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 24 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 26 de septiembre de 2022 al 02 de octubre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 24, bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Informe social, Estado del clima en la semana reporte IDEAM, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y cinco (45) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** | Fecha **3/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE — **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220577
Contratista			CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial	$		5.034.941.972,00
Valor actual	$		5.034.941.972,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial (Días)			244 Días
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			13/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	170		69,67%
Días remanentes del Contrato	71		29,10%
Acumulado a última acta pagada	$		520.585.334,17
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.			2220585
Interventor			GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial	$		542.723.071,00
Valor actual	$		542.723.071,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial			244 Días
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			13/12/2022
Ejecución del Contrato	170		69,67%
Días remanentes del Contrato	71		29,10%
Acumulado a última acta pagada	$		166.615.982,80
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.561.299.169,48	70,73%	$ 1.389.643.984,27	27,60%	-$ 2.171.655.185,21	-43,13%
Durante el Periodo	$ 226.714.277,31	4,50%	$ 121.259.609,71	2,41%	-$ 105.454.667,60	-2,09%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.788.013.446,79**	**75,23%**	**$ 1.510.903.593,98**	**30,01%**	**-$ 2.277.109.852,81**	**-45,23%**

Desviación en días: -110 Días

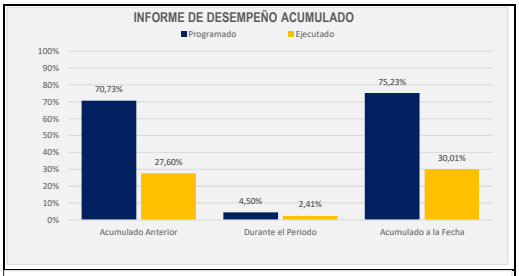

Observaciones al desempeño del proyecto


***Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


***Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 611 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 545 diagnósticos acumulados. Interventoria dio observaciones a un total de 66 diagnósticos, los cuales a corte del presente informe semanal no han sido subsanados por el Consorcio Turquia; está pendiente de entrega de 7 diagnósticos y 44 predios que no se han diagnosticado por el contratista de obra. Hay 30 diagnósticos no efectivos y una (1) renuncia.*

***Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 222 viviendas, de las cuales 131 están terminadas y de estas 20 tienen observaciones, 91 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 323 para inicio de actividades.*

***Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

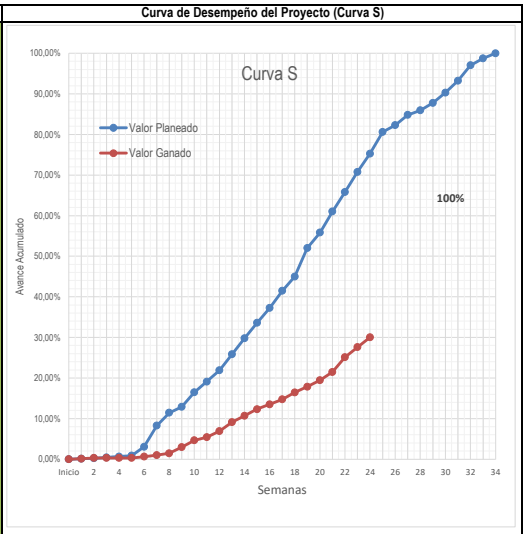

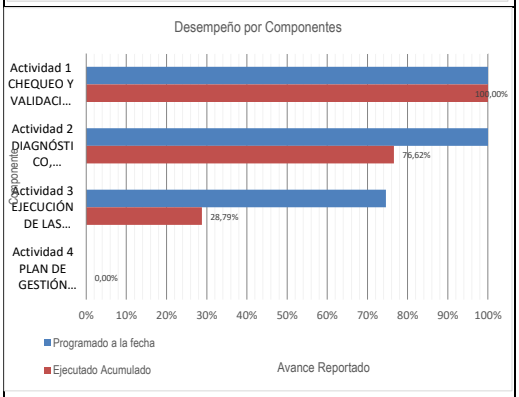

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	70,73%	27,60%	-43,13%	
Durante el Periodo	4,50%	2,41%	-2,09%	
Acumulado a la Fecha	**75,23%**	**30,01%**	**-45,23%**	

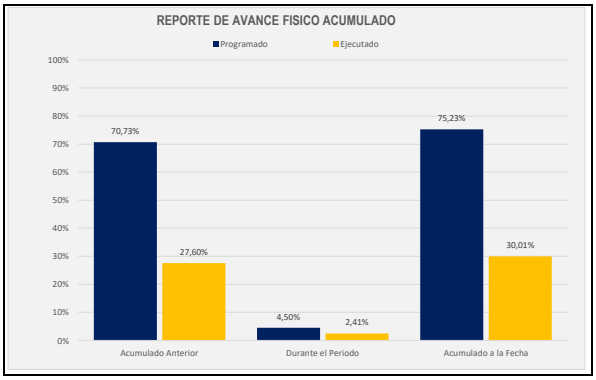


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 289.357.129,77	$ 692.599.083,83

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 888.613.090,18	17,65%	2	$ 520.585.334,17	10,34%	9/09/2022	$ 353.326.921,98








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 166.615.982,80	30,70%	5	$ 166.615.982,80	30,70%	24/09/2022	$ 48.329.489,48







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 611 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 545 diagnósticos acumulados. Interventoría dio observaciones a un total de 66 diagnósticos, los cuales a corte del presente informe semanal no han sido subsanados por el Consorcio Turquía; está pendiente de entrega de 7 diagnósticos y 44 predios que no se han diagnosticado por el contratista de obra. Hay 30 diagnósticos no efectivos y una (1) renuncia.

* Actividad 3. A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 222 viviendas, de las cuales 131 están terminadas y de estas 20 tienen observaciones, 91 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 323 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693 Diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693 Diagnósticos Aprobados acumulados: 545 Se evidenció una diferencia en 148 diagnósticos por debajo a la meta establecida.	Viviendas programación inicial: 517 Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 397 Viviendas terminadas: 131, 20 tienen observaciones de detalles mínimos. Viviendas en ejecución: 91 Viviendas totales iniciadas: 222

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 29 de septiembre de 2022 con la carta GA-DOMI-143-22 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, se procedió a solicitar al Consorcio Turquía dar cumplimiento con las metas fijadas en el plan de contingencia para subsanar el atraso reportado en el cronograma de obra, así como también el aumento de mano de obra e incremento de nuevas aperturas de viviendas a intervenir.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 26 de septiembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios, suministro de materiales y subsanación de las viviendas por entregar.

* El día 27 de septiembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de excavaciones para la cimentación del tanque elevado, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo. En este día se realizaron 5 aperturas cuyos códigos son: S-SC-EP-M45-VE-334, S-SC-EP-M45-VE-337, S-SC-EP-M70-VE-574, S-SC-EP-M45-VE-335 y S-SC-EP-M44-VE-347.
* El día 28 de septiembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de excavaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención. En el día de hoy se realizaron seis (6) aperturas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M61-VE-513, S-SC-EP-M61-VE-515, S-SC-EP-M61-VE-516, S-SC-EP-M61-VE-526, S-SC-EP-M69-VE-540 y S-SC-EP-M32-VE-64.
* El día 29 de septiembre de 2022, el Contratista de obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios y excavación para cimentaciones. En este día y en cumplimiento de los compromisos contraídos, se realizó comité de seguimiento con la asistencia de los representantes de la Entidad (ENTerritorio), contratista e interventoría. Teniendo en cuenta los diferentes incumplimientos de parte del Consocio Turquía a los compromisos fijados en los comités de seguimiento, se le solicitó presentar un plan de trabajo cumplible y realizable que permita atender los diferentes requerimientos dados por la Entidad e Interventoría, y así mismo avanzar en el cumplimiento del Plan de Contingencia presentado.

Se realizó una apertura bajo el código N°. S-SC-EP-M30-VE-646.
* El día 30 de septiembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. Para el día de hoy no se realizan aperturas, y se solicitó al contratista de obra atender las observaciones emitidas de detalles de las viviendas cobradas en el acta #3. Por otra parte, en el día de hoy se tenía programado un recorrido con la veeduría para revisar el estado de las viviendas en ejecución, sin embargo no se contó con la asistencia del personal del Consocio Turquía y se realizó la reprogramación de dicho recorrido.
* El día 01 de octubre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitarias, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación de registros sanitarios, levante de muros y fundida de machones, fundida de placa aérea para los tanques elevados, se recibieron viviendas por parte del contratista.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	100	9	109	64,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	20,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	4,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	9,5%
	Total	**159**	**9**	**168**	**100,00%**



* El día 28 de septiembre de 2022, en las horas de la tarde se registró lluvias en la zona del proyecto de un total de 5 horas.
* El día 29 de septiembre de 2022, en horas de la tarde se registró lluvias en la zona del proyecto de un total de 2 horas.
* El día 30 de septiembre se presentaron lluvias en horas de la mañana, para un total de 2 horas.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**

Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**

Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio de 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio de 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio de 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio de 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**

Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**

Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **3/10/2022**






9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliaria de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado quinientos treinta y uno (545) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial y de acuerdo con el compromiso fijado en comité de seguimiento No. 28 y 29, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, obteniendo un potencial neto de 618 viviendas posibles beneficiarias, 30 no efectivas y 1 renuncia, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Viviendas efectivas: 618
Viviendas aprobadas: 545
Viviendas no efectivas: 31
Renuncias: 1
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 44
Viviendas terminadas:131
Viviendas en ejecución: 91
Viviendas iniciadas: 222

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de doscientos veintidós (222) viviendas, de las cuales ciento treinta y uno (131) se encuentran terminadas (20 tienen observaciones de detalles) y noventa y uno (91) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas, machones, y el levante de muros.

Es importante mencionar que en el comité de seguimiento No. 30 del día 29 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta los diferentes incumplimientos de parte del Consocio Turquía a los compromisos fijados en los comités de seguimiento, se le solicitó presentar un plan de trabajo cumplible y realizable que permita atender los diferentes requerimientos dados por la Entidad e Interventoría, y así mismo avanzar en el cumplimiento del Plan de Contingencia presentado.

* Respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, y se continuará con las visitas vivienda por viviendas y reuniones sectorizadas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

* Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 30,01% y un porcentaje programado acumulado de 75,23% lo cual representa un atraso de 45,23% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 8,20% y el restante 37,03% si son responsabilidad del contratista de obra.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-137-22 del día 09 de septiembre de 2022. Se envió al contratista de obra el seguimiento al plan de contingencia semana 20. Se le informa al contratista de obra que solo se han terminado 76 intervenciones, estando pendiente por finalizar para entrega 156 viviendas, ya que conforme al plan de contingencia con corte al 04 de septiembre de 2022 se debió haber terminado 232 intervenciones. Finalmente se le solicitó al contratista que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con materiales suficientes para la ejecución de actividades, aumente la mano de obra e incremente la apertura de intervenciones, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato continúa en atraso.

* De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista de obra, se realizó reunión el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 18. Informe de gestión social

Municipio	SINCELEJO	**Contrato:**		2220577
Contratista de obra	CONSORCIO TURQUIA	**Contratista de interventoría**		GAVINCO
Fecha:	Septiembre	**Elaboró:**	Candelaria Gózales Medina	**Revisó:** July Paulin Rios Anaya

1. LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Acompañamiento a Visitas de obra:

Durante el periodo del mes de agosto se realizaron visitas de socialización casa a casa en las aperturas de viviendas hasta la fecha de cierre de este informe se tiene un total de 53 viviendas visitadas en el barrio el Poblado, para la actividad de socialización casa a casa en las aperturas. Esta actividad se realizó con el acompañamiento del área técnica y social de la interventoría, miembros de la veeduría y líderes de JAC

Cabe resaltar que los beneficiarios se encuentran muy interesados y felices con la llegada del Programa a sus viviendas, los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría realizan explicación clara y veraz del alcance del Programa a los beneficiarios. Asimismo, se concertó el lugar de intervención en cada vivienda.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y Principales resultados	Responsable	Evidencias
1 al 30 de septiembre del 22	El Poblado	Contratistas de obra e interventoría Veedores JAC	El Poblado	Socialización del PCI, se despejaron dudas e inquietudes	Contratistas Interventoría	Actas, asistencia y registro fotográficos

Diseñar, publicar y distribuir material publicitario:

Durante este periodo se llevó a cabo perifoneo el 21 y 22 de septiembre del año en curso, el en barrio el Poblado, con el fin de invitar a la comunidad a la capacitación masiva en educación sanitaria, se realizaron entrega de oficios de invitación a miembros de la veeduría,

Por otra parte, se continuo con la entrega de folletos informativos en las diferentes actividades realizadas.

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	----------	---------
Material para las Capacitaciones	folletos	Folletos
Material Informativo y/o de convocatoria	Perifoneo local y oficios de invitación	Video del Perifoneo
Otras actividades de divulgación: Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)	Perifoneo, Cartelera informativas	Video Perifoneo y fotos de las carteleras.

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Punto de Atención: El punto de atención la profesional social brinda atención personalizada, las personas se acercan a preguntar sobre la recepción de hojas de vida y sobre como participar para el proceso de inclusión, dudas e inquietudes sobre las intervenciones en sus viviendas, a lo cual el área social suministra toda la información solicitada, dejando claridad sobre las dudas presentadas y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe informar que durante este periodo se atendió en el punto a un solo beneficiario, el cual tenía dudas con el estado de su diagnóstico. El cual fue resuelto de manera inmediata.

Los puntos de atención se encuentran ubicados en la calle 9 manzana 32- lote 38, casa del beneficiario José tiran y el segundo punto de atención se encuentra ubicado en la dirección Carrera 17 D# 45 A 05, en la casa de la beneficiaria Luz Mery Rivera. las atenciones a la comunidad se están brindando los días lunes, martes y jueves de 8:00am a 12:00pm y de 2:00 a 4:00 pm. De igual forma se cuenta con un número de contacto para que la comunidad pueda comunicarse a la línea 3015973080 con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.
Adicionalmente, es de señalar que los Puntos de Atención a la Comunidad dispone de un cartel Informativo para que la comunidad tenga orientación donde están ubicadas las instalaciones del Programa, en el mismo se encuentran plasmados los días y horario de atención. (Debidamente validado por ENTerritorio).

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes o en trámite	Producto	Observaciones
El Poblado	Calle 9 MZ 32- lote 38 Carrea 17D # 45ª -05	195	188	6	Formato PCI 024 .	Por solicitud de inclusión hay 3 en traite y por quejas 3 abiertas, las cuales deben ser atendidas por el Fovis, para poder cerrarlas a satisfacción

Buzón de PQRS: Durante este periodo se realizó revisión del buzón de sugerencias con el acompañamiento de un miembro de la veeduría el cual se ha encontrado vacío.

Comité Veedor:

El 19 de septiembre del año en curso, se realizó una reunión con los miembros del comité veedor y de la JAC, por las profesionales sociales de Alcaldía y Veolia, se contó con la participación de las profesionales sociales de obra be interventoría, en donde se logró integrar y motivar a los líderes del barrio, para que; participaran en la capacitación masiva en Educación sanitaria, La cual estaba programada para el 22 de septiembre. De igual forma, se resolvieron dudas e inquietudes que surgieron durante la reunión.
Por otra parte, la veeduría hizo entrega de un oficio a la profesional social de la Alcaldía, en donde manifestaban, sus inconformidades por las acciones y comportamiento inadecuado de algunos miembros de la JAC, con los profesionales técnicos y sociales de los contratistas de obra e interventoría.
Finalmente unificaron criterios y acordaron trabajar en equipo.
Relación de evidencias: Actas, asistencias y registro fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En el mes de septiembre del año en curso, no se realizó recepción de PQRS.
A la fecha de cierre de este informe se cuenta con un consolidado de la relación de las PQR recepcionadas durante el tiempo de ejecución del Programa, Total de PQR, recepcionadas en el barrio el Poblado, (195) de las cuales (190) correspondientes a solicitudes de inclusión y (5) por quejas de aspectos técnicos, donde la comunidad las ha interpuesto por inconformidad antes mencionada. De las (190) solicitudes para inclusión hay (186) PQR que cuentan con respuesta por parte de los Entes Territoriales, las mismas se encuentran cerradas a satisfacción y (3) están en trámite aún se espera respuesta por parte de los Entes Territoriales. hasta la fecha hay (2) PQR por quejas cerradas por la parte técnica del contratista y (3) abiertas la
cuales se espera respuesta de cierre por parte del FOVIS.
Relación de evidencias: Formatos PCI 024 con su respectivo cierre, 025 actualizados y cartas de respuesta firmadas por los solicitantes.
Es importante informar que, a corte de este informe aún está pendiente el concepto claro de la PQR # 34 a nombre de Darin Blanco Fuentes.

Cuadro acumulativo de PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas		N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior			Observación general / motivo
3er. Informe	9		0	9	N° de PQR	Estado		
4° Informe	24		0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión	
5° informe	54		7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión	
6° informe	0		41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión	
7° informe	0		41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión	
8° informe	0		41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión	
9° informe	5		85	6	149			
						Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas	
TOTAL	195		191	4	191	Abiertas	Solicitud y quejas	

Recorrido de Obra:

- El 05 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana y tarde, se realizaron dos recorridos de obra en horas de la mañana con los miembros de la JAC, en donde se contó con la participación de 12 asistentes, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría. Asimismo, se logró visitar seis viviendas, en diferentes etapas del Proyecto, en ejecución, terminadas y sin iniciar con el fin de verificar el grado de satisfacción de los beneficiarios frente al desarrollo del Programa, se resolvieron dudas e inquietudes de los beneficiarios las inquietudes más frecuentes fueron, estado de los diagnósticos, tiempo de ejecución de las intervenciones.

- De igual forma, en horas de la tarde con los miembros de la veeduría, se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría, se visitaron (10) viviendas, en donde se realizó la socialización del alcance del Programa. Esta actividad fue liderada por el área social, se resolvieron dudas e inquietudes que tenían los beneficiarios, con el apoyo del área técnica, Cabe resaltar que se evidencio la satisfacción de los beneficiarios frente al desarrollo de las intervenciones, La actividad fue muy productiva, puesto que; los líderes de la JAC, expresaron que se venido desarrollando el proyecto de una manera diferente y se nota que la comunidad está tranquila con muchas expectativas.

- Por otra parte, se realizó acompañamiento desde el área social a los funcionarios del FOVIS y de Veolia en recorrido de verificación del estado de la matriz inicial, en donde se logró la identificación de más de (17) predios, los cuales fueron identificados en el matiz inicial, por parte del contratista de obra. Cabe resaltar que al mismo tiempo se socializaba a los potenciales beneficiarios las diferentes situaciones encontradas en el recorrido, según los criterios de focalización del Programa.

- El 6 de septiembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra liderado por la supervisión técnica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se contó con la partición de los profesionales técnicos y sociales de los contratistas de obra e interventoría, representante de la Alcaldía Municipal, miembros de la veeduría y JAC, Aguas de Sucre. En donde se logró visitar (10) viviendas en diferentes etapas de ejecución, de igual forma a las viviendas terminadas, se evidencio la satisfacción de los beneficiarios en todas las visitas realizadas. Se desarrolló la actividad sin dificultades, con buenos comentarios de la supervisión técnica del Ministerio.

- El 22 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana, se realizó un recorrido de obra, se contó con la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ENterritorio, PAD, Alcaldía, FOVIS, Veolia, miembros de la veeduría, JAC, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría. Asimismo, se logró visitar cinco viviendas previamente seleccionadas, para la visita en donde se recibieron buenos comentarios y felicitaciones, por parte del Ministerio, sobre la calidad de las obras y la organización de la logística. Asimismo, fue notorio la satisfacción de los beneficiarios con la intervención realizada y con la llegada de la visita a sus viviendas. De igual forma, los líderes expresaron sus agradecimientos a la supervisión técnica y social de la supervisión de la Entidad contratante.

- El 30 de septiembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra, liderado por las profesionales sociales de obra e interventoría se contó con la participación de tres miembros de la veeduría y un miembro de la JAC. En donde se logró visitar (10) viviendas priorizadas por el área social, se evidencio la preocupación de los lideres con la dificultad, para entregar los materiales en los códigos, por la mala condición de las calles del barrio, debido a las fuertes lluvias los camiones no pueden subir, el contratista de obra ha implementado estrategias, para

entregar los materiales en hombros contratando personal adicional el cual ha venido desarrollando dicha actividad. Se desarrolló la actividad sin dificultades.

Línea de Capacitación:

Capacitación casa a casa en Educación Sanitaria en instalación de Acrílico.

- El 22 de septiembre del año en curso, se realizó la capacitación masiva en educación sanitaria, con la participación de las profesionales sociales de los Entes Territoriales, Veolia, Alcaldía Municipal – Sincelejo y ADS, miembros de la veeduría y JAC, en donde se implementó de manera dinámica la capacitación en los temas de educación sanitaria y atención personalizada, con el fin de resolver las dudas de los asistentes, referente a cada caso puntual, para los actores participantes de la actividad; se temas tales como: buen uso del agua, recomendaciones para el cuidado de los aparatos sanitarios, cultura de pago, y el buen uso de debe darse al Alcantarillado. A esta capacitación asistieron 31 personas.
  Así mismo es importante mencionar que las dudas que se generaron fueron a cercar del proceso de inclusiones y las personas de alto riesgo porque no reciben el beneficio si cuentan con servicios públicos.

- Durante este periodo, se realizaron 34 capacitaciones casa a casa en Educación Sanitaria a viviendas del barrio El Poblado, las cuales consistían en capacitar a los beneficiarios en los temas como salud, Educación sanitaria e higiene en sus viviendas y especialmente en las intervenciones entregadas, para reforzar este proceso se les hace entrega de un folleto informativo, el cual contiene la información referente a la capacitación en Educación Sanitaria y se les habla sobre los beneficios que brinda el programa como lo es el mejoramiento de las condiciones de vida al contar con el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado al interior de las viviendas, y con la instalación de los aparatos hidrosanitarios, la social de contratista les realiza unas recomendaciones para el cuidado de los equipos sanitarios, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpearlos aparatos, también se habló del manejo adecuado de los equipos de agua, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena, no usar el inodoro como caneca de basura. De igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalaciones, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe alguna escape de agua, por último y no menos importante se les brinda algunos consejos para el buen uso del alcantarillado como lo son, no echar resto de comidas en el lavaplatos, cuando se afeiten o se peinen asegurarse que el cabello no caiga en el lavamanos o rejillas de la ducha el buen uso y mantenimiento evitará obstrucciones y taponamientos, posteriormente a la capacitación se hace la instalación del acrílico el cual con permiso del beneficiario se coloca en una parte limpia y seca del baño en la que sea visible para él y todos los integrantes de la familia que vivan en la vivienda.

Durante la visita realizada se logró observar la participación activa, receptiva y por parte de los beneficiarios.

Capacitación Masiva/ Sectorizada / Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitación masiva	22-09-22	El Poblado	31	Contratista e Interventoría.	Asistencia, Registro Fotográfico.
Capacitación Casa a Casa	15-30 de septiembre del 2022	El Poblado	34	Contratista e Interventoría.	Asistencia, Registro Fotográfico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- El 06 de septiembre del presente año se realizó reunión de seguimiento al contrato de manera presencial liderada por la súper visión técnica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de igual forma se contó con la participación de la profesionales sociales y técnicos de los Contratistas de obra e Interventoría, Alcaldía municipal, aguas de Sucre, Veolia, los temas

- abordados fueron las situaciones presentadas con líderes, estrategias para el plan de coque en las ejecuciones de las obras, novedades, cumplimiento de los compromisos pendientes por parte de los Entes Territoriales, PQR, solicitudes de inclusión pendientes por respuesta. Asimismo, cada actor del Programa dio respuesta a la ingeniera Sindy Castro, sobre cada tema antes mencionado, se recibieron buenos comentarios por parte del Ministerio, de igual forma, motivo e invito a los equipos de trabajo a seguir adelante con el avance y ejecución del Proyecto.

- El 6 de septiembre del presente año, se realizó una reunión de cierre de actividades liderada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en las instalaciones de la oficina del consorcio Turquía, se contó con la participación de los directores de obra e interventoría, residentes técnicos y sociales de obra e interventoría y equipos de apoyo, en donde se recibieron recomendaciones, buenos comentarios sobre el desarrollo y calidad de las intervenciones, por parte de la ingeniera Sindy Castro. Quien a su vez agradeció a los equipos de trabajo por todo el apoyo brindado. Relación de evidencias: acta de reunión, asistencia, registro fotográfico

- Se realizó acompañamiento desde el área social y técnica de los contratistas de obra e interventoría a la Alcaldía municipal, el 13 de septiembre del año en curso, a las entrevistas a cinco beneficiarios previamente identificados por el área de comunicaciones de la Alcaldía, desde la etapa del antes. La actividad se desarrolló sin dificultades, se evidencio la felicidad de los beneficiarios y de los funcionarios que participaron en la misma.

Relación de evidencias: acta de reunión, asistencia, registro fotográfico

Generación de Empleo

durante este periodo el Contratista de obra viene vinculando personal de mano de obra no calificada al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y minimizando la tasa de desempleo en la región, generado satisfacción ante la comunidad beneficiada.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabaja dores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
5	85	1	5

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI.

- Es importante mencionar que se necesita más acto de presencia y apoyo por parte de los Entes Territoriales frente a la problemática que se está presentando con los directivos de la JAC.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las actividades programadas en cada una de las líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, veedores, líderes de JAC y el contratista de obra e Interventoría.

- Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de socialización casa a casa.

- En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC. Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, quien, con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra, realizando llamada a altas horas de la noche, insinuando que ningún profesional esta haciendo bien su trabajo; solicito recursos económicos para una caja menos y equipos de cómputo. Así mismo se ha presentado mucha inseguridad en con personal de obra, ya que en alguna ocasión trataron de retener a los profesionales de interventoría si no recibían las unidades sanitarias aun con detalles, para que así les pudieran pagar.
  Estas situaciones desde el componente social la vemos con mucha preocupación, porque no nos deja avanzar en las programaciones que se tiene.

July Rios Anaya

July Paulin Rios Anaya
Profesional social de obra

Candelaria González Medina
Profesional social Interventoría

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

INFORME QUINCENAL N°11

Introducción

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos hidrosanitarios en viviendas para el estrato 1 y 2, que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; es necesario implementar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, que permita cubrir en un mayor porcentaje al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

Con el fin de llevar el Programa a más Municipio necesitado, fue priorizado el barrio El Poblado del municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre.

Dentro de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el barrio el Poblado, durante el periodo del 15 al 30 de septiembre en la línea de participación comunitaria se han realizado recorridos de obra donde se han identificado las diferentes dificultades que tiene la obra, por las fuertes lluvias. por otra parte, en la línea de capacitación se realizó masiva en educación sanitaria y capacitación casa a casa con el tema de educación sanitaria e instalación del acrílico del modo de uso y recomendaciones para el buen mantenimiento de las unidades sanitaria, se realizó un recorrido de obra a las viviendas priorizadas por el área social con los miembros de la Veeduría, atención al ciudadano con el fin el de atender cualquier PQR presentada, resolver dudas e inquietudes de la comunidad.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR	NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS	FECHA DE INFORME	N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO	N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO
Sincelejo	El poblado	El poblado	Del 5 al 30 de septiembre	693	222

INFORMACIÓN POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Línea de Comunicación:

Socializaciones:

Visita Casa a Casa:

Durante el periodo reportado los contratistas de obra e interventoria realizaron 29 socializaciones casa a casa en las aperturas de viviendas con el fin de iniciar el proceso constructivo, en esta actividad las profesionales sociales, socializaron el alcance del Programa, a cada uno de los beneficiarios visitados, cabe resaltar que se contó con el acompañamiento del área técnica, quienes a su vez concertaban con los beneficiarios el lugar para la intervención del Programa se evidencio la satisfacción de los beneficiarios frente al Proyecto.

Cuadro 1. Socializaciones.

Socialización (Lideres/ Masiva/ Sectorizada)	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Relación de Evidencias
Socialización casa a casa	Del 15 al 30 de septiembre	El Poblado	29	asistencia y registro fotográfico

Diseño y distribución de material publicitario: los materiales publicitarios que se han utilizado en las actividades desarrolladas oficios de invitación, folletos informativos, los cuales fueron de gran importancia, toda vez que la participación de la comunidad beneficiara ha sido notoria.

Cuadro 2. Material divulgativo

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	----------	----------
Material para las capacitaciones	Folletos informativos	Escáner del folleto
Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación	Escáner de los oficios
Instalación valla informativa	----------	----------

Otras actividades de divulgación: *Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)*	----------	----------

Línea de Participación Comunitaria:

Actividades con el comité veedor:
El 19 de septiembre del año en curso, se realizó una reunión con los miembros del comité veedor y de la Junta de Acción Comunal, liderada por las profesionales sociales de Alcaldía Municipal – Sincelejo y Veolia, se contó con la participación de las profesionales sociales de obra e interventoria, en donde se logró integrar y motivar a los líderes del barrio, para que participaran en la capacitación masiva en Educación Sanitaria. La cual estaba programada para el 22 de septiembre. De igual forma, se resolvieron dudas e inquietudes que surgieron durante la reunión. Tales como:
¿Cómo va el avance del Proyecto?
¿Quiénes participaran de la capacitación?
¿Todo el barrio participara de la capacitación?
¿Por qué demoran en traer los materiales a las viviendas?

Por otra parte, la Veeduría hizo entrega de un oficio a la profesional social de la alcaldía, en donde manifestaban, sus inconformidades por las acciones y comportamiento inadecuado de algunos miembros de la JAC, con los profesionales técnicos y sociales de los contratistas de obra e interventoria. Finalmente unificaron criterios y acordaron trabajar en equipo.
Relación de evidencias: Actas, asistencias y registro fotográfico

Cuadro 4. Actividades con veedores

Actividad (reunión, capacitación, recorrido de barrio, otras)	Barrio	Fecha	N° asistentes	Relación de Evidencias
Reunión con veeduría y JAC	El poblado	19 /09/2022	14	Acta, asistencia y registro fotográfico

Puntos de Atención: Durante este periodo se realizó atención al ciudadano en los puntos a dos personas las cuales se acercaron a solicitar información referente al estado de su diagnóstico y tiempo de culminación de las obras. Cabe resaltar, que se logró atender todas las dudas e inquietudes en las diferentes visitas casa a casa y recorridos de obra.

Relación de videncias: asistencia y registro fotográfico

Buzón de sugerencias: Durante este periodo se realizó la revisión del buzón de sugerencias semanalmente, con el acompañamiento de un miembro de la Veeduría, el mismo se encontró vacío.

Relación de evidencias: registro fotográfico.

Cuadro 5. Puntos de Atención

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora		
Manzana 32 lote 38 Manzana 55 calle principal	El poblado	Lunes a jueves	2:pm a 4:pm	1	asistencias y Registro Fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En las semanas del 15 al 30 de septiembre de 2021 no se realizó recepción de PQR, se logró realizar el cierre a dos PQR por solicitud de inclusión durante el barrido de la matriz inicial, las cuales fueron identificadas en la matriz y se procedió a realizar el respectivo cierre a las solicitudes. Por otra parte, cabe informar que acorte de este informe, aún se encuentra (1) PQR, por solicitud de inclusión abierta y (3) PQR, por quejas en trámite a cargo del FOVIS la respuesta de cierre.

Relación de evidencias Formatos: PCI 024, cartas de respuesta y formato PCI 025

A la fecha de cierre de este informe se han recepcionado 195 PQRS de las cuales 190 han sido por solicitud de inclusión, se cuentan con (189) PQR por solicitud de inclusión cerradas, (1) abiertas y (3) por quejas de aspectos técnicos y no aceptación del concepto emitido por la Alcaldía. Cabe informar, que aún están en trámite por parte del FOVIS. Es importante informar que la PQR #44 del solicitante Temístocles Bertel Ávila, durante el barrido de la matriz inicial, se evidencio que la vivienda del solicitante se encuentra en la matriz inicial.

Relación de evidencias: PCI 025 actualizado hasta la fecha y cuadro de consolidado.

Recepción y trámite de las PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas	N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9	0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24	0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión
5° informe	54	7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión
6° informe	0	41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión
7° informe	0	41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión
8° informe	0	41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión
9° informe	5	85	6	149		
10° informe	0	2	4	6	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas
TOTAL	195	191	4	149	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas

- Recorridos de obra:

El 22 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana, se realizó un recorrido de obra, se contó con la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ENterritorio, ADS, Alcaldía, FOVIS, Veolia, miembros de la veeduría, JAC, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria. Asimismo, se logró visitar cinco viviendas previamente seleccionadas, para la visita en donde se recibieron buenos comentarios y felicitaciones, por parte del Ministerio, sobre la calidad de las obras y la organización de la logística. Asimismo, fue notorio la satisfacción de los beneficiarios con la intervención realizada y con la llegada de la visita a sus viviendas. De igual forma, los líderes expresaron sus agradecimientos a la supervisión técnica y social de la supervisión de la Entidad contratante.

El 30 de septiembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra, liderado por las profesionales sociales de obra e interventoria se contó con la participación de tres miembros de la Veeduría y un miembro de la JAC, donde se logró visitar (10) viviendas priorizadas por el área social, se evidencio la preocupación de los lideres con la dificultad, para entregar los materiales en los códigos, por la mala condición de las calles del barrio, debido a las fuertes lluvias los camiones no pueden subir, el contratista de obra ha implementado estrategias, para entregar los materiales en hombros contratando personal adicional el cual ha venido desarrollando dicha actividad. Se desarrolló la actividad sin dificultades.

Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico

Cuadro 7. Recorridos de obra

Barrio	Fecha	N° de personas que acompañan el recorrido	Entidades que acompañan la jornada	Situaciones Evidenciadas	Relación de Evidencias
El poblado	22/09/2022	17	Contratistas de obra e interventoria, veeduría, JAC (MVCT) Alcaldía, Veolia,	Viviendas seleccionadas, para la visita	Acta, asistencia y registro fotográfico

	30/09/2022	7	contratistas de obra e interventoría, veeduría, JAC	Viviendas priorizadas por el área social	

Línea de capacitación

- Capacitación masiva y casa a casa en Educación Sanitaria:

El 22 de septiembre del año en curso, se realizó la capacitación masiva en educación sanitaria, con la participación de las profesionales sociales de los Entes Territoriales, miembros de la veeduría y JAC, en donde se implementó de manera dinámica la capacitación en los temas de Educación Sanitaria y atención personalizada, con el fin de resolver las dudas de los asistentes, referente a cada caso puntual, para los actores participantes de la actividad.

A la capacitación asistieron 31 personas, esta se llevó a cabo en la calle principal del barrio el Poblado de Sincelejo. Se dio inicio explicándole a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la educación sanitaria y la higiene, con una ayuda didáctica como fue una cartelera donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente la profesional social continuó con la capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua, otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.

Durante el periodo reportado se llevó a cabo, 8 capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílicos liderada por las profesionales sociales de los contratistas de obra e interventoría, Veedores, los beneficiarios se mostraron muy receptivos y participativos frente a la temática.

Cuadro 9. Capacitaciones en Educación Sanitaria

Capacitación Masiva/ Sectorizada / Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitaciones casa a casa	15-30 /09/2022	El Poblado	8	Contratistas de obra e interventoria y veeduría	listado de asistencia y registro fotográfico.
Capacitación masiva	22-09-2022		31		Acta, asistencia y registro fotográfico,

Reporte de Actividades Complementarias

Comité de Seguimiento:

El 06 de septiembre del presente año se realizó reunión de seguimiento al contrato de manera presencial liderada por la súper visión técnica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de igual forma se contó con la participación de la profesionales sociales y técnicos de los Contratistas de obra e Interventoría, Alcaldía municipal, aguas de Sucre,Veolia, los temas abordados fueron las situaciones presentadas con líderes, estrategias para el plan de coque en las ejecución de las obras, novedades, cumplimiento de los compromisos pendientes por parte de los Entes Territoriales, PQR, solicitudes de inclusión pendientes por respuesta. Asimismo, cada actor del Programa dio respuesta a la ingeniera Sindy Castro, sobre cada tema antes mencionado, se recibieron buenos

comentarios por parte del Ministerio, de igual forma, motivo e invito a los equipos de trabajo a seguir adelante con el avance y ejecución del Proyecto.

Relación de evidencias**:** acta de reunión, asistencia, registro fotográfico.

El 6 de septiembre del presente año, se realizó una reunión de cierre de actividades liderada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en las instalaciones de la oficina del consorcio Turquía, se contó con la participación de los directores de obra e interventoria, residentes técnicos y sociales de obra e interventoria y equipos de apoyo, en donde se recibieron recomendaciones, buenos comentarios sobre el desarrollo y calidad de las intervenciones, por parte de la ingeniera Sindy Castro. Quien a su vez agradeció a los equipos de trabajo por todo el apoyo brindado. Relación de evidencias: acta de reunión, asistencia, registro fotográfico

- Se realizó acompañamiento desde el área social y técnica de los contratistas de obra e interventoria a la Alcaldía municipal, el 13 de septiembre del año en curso, a las entrevistas a cinco beneficiarios previamente identificados por el área de comunicaciones de la Alcaldía, desde la etapa del antes. La actividad se desarrolló sin dificultades, se evidencio la felicidad de los beneficiarios y de los funcionarios que participaron en la misma.

Relación de evidencias: acta de reunión, asistencia, registro fotográfico

Generación de Empleo

Cabe resaltar que durante este periodo el Contratista de obra vinculó al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y sus alrededores, esto ha generado satisfacción ante la comunidad beneficiada. Asimismo, se ha generado empleo en la zona aportando a la inclusión laboral, se realizó oferta de empleo, para la inclusión femenina, con el fin de generar empleo para muchas mujeres de la zona.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
9	98	1	5

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales en especial con la Empresa Prestadora, con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI del barrio el Poblado.

CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las estrategias planteadas con el fin de empoderar el componente social en cada una de las actividades programadas por líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, líderes y el Contratista de Obra e Interventoría.

Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de socialización casa a casa, con el uso del tapabocas.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC.Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, quien con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra. Situación que desde el componente social vemos con mucha preocupación.

July Rios Anaya

Candelaria Gonzalez
profesional social de obra

July Paulin Rios Anaya
Profesional social Interventoría

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS**
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL**
Teléfono: **2743303**

Fecha Impresión **22/03/05**
No. Remisión: **82441330**
Página: **1 de 7**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387965	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387966	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388216	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388239	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388245	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388259	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388267	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392654	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392655	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392674	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392675	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392676	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433242	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433268	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433269	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/04/19
No. Remisión: 82458852
Página: 1 de 6

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2400991	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.26	0.007	0.021	0.001	0.47	0.05	0.02	0.02
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448119	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448120	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448124	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448129	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448131	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448132	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448134	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448138	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448140	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448142	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448143	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448150	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

PazdelRío

Votorantim

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 10.02.2022
HORA: 22:52:22
PÁGINA: 1 / 1

ISO 9001 icontec | I Net | Sello de Calidad icontec | Sello de Calidad icontec | Sello de Calidad icontec | Sello con Reglamento Técnico icontec

PRODUCTO: 6110776 - BARRA CORRU ENDE (M) N.2X6M
CLIENTE: 5083437 / CONCREACEROS S.A.S.
DIRECCIÓN: CL 38 4A 150

REPORTE: 30.297
ORDEN DE ENTREGA: 8086690523
PLACA: TJZ925

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Espa.Res.	Altura Re.
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420,00	14,00		274		0,25
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540,00				4,45	

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Espa.Res.	Altura Re
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
B51965-21	0,27	0,97	0,020	0,015	0,15	0,023	0,016	0,014	0,002	0,000	0,018	0,428	605,69	437,33	14,74	B	249	4,20	0,33
C48598-21	0,29	0,91	0,015	0,027	0,13	0,028	0,020	0,020	0,003	0,000	0,018	0,443	630,87	460,73	15,04	B	255	4,18	0,13
E20051-21	0,27	0,92	0,017	0,033	0,16	0,272	0,100	0,135	0,014	0,003	0,020	0,446	636,52	471,69	14,83	B	249	4,11	0,32
E20551-21	0,28	0,90	0,010	0,027	0,18	0,344	0,084	0,075	0,010	0,000	0,019	0,443	634,98	450,07	15,25	B	249	4,20	0,38
B51495-21	0,29	0,99	0,016	0,022	0,16	0,029	0,022	0,014	0,002	0,002	0,021	0,451	648,79	472,11	14,53	B	250	4,10	0,41

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Firma Autorizada: ING WILLIAM HURTADO SIABATO
Coordinador Calidad Productos

Km 6 Via Nobsa - Belencito
Planta Industrial.

Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS SEGÚN NTC 115 VERSION 2019-19-11	CODIGO: PE-CAL-R-5
		VERSION: 2
		VIGENTE DESDE: 24/09/2020
		PAGINA 1 DE 1

TEMPERATURA AMBIENTAL EN GRADOS CENTIGRADOS			21	HUMEDAD AMBIENTAL EN %			76	
FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO			jueves, 21 de abril de 2022	COLADA MUESTREADA		H-81	TIPO DE ACERO USADO	AISI 1006
DESIGNACION			ALAMBRE TREFILADO; NEGRO; 1,47mm (17 BWG)				"CONFORME";"NO CONFORME"	
DIAMETRO MAYOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,49	1,49	1,48	1,487		
	Desviacion estandar					0,005		
DIAMETRO MENOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,46	1,47	1,49	1,473		
	Desviacion estandar					0,012		
TOLERANCIA EN EL OVALAMIENTO (+-0,03) mm							CONFORME	
MAXIMA RESISTENCIA A LA TRACCION (Mpa)	415		400,84				CONFORME	
ASPECTO SUPERFICIAL	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES OXIDACION						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES RAYADURAS						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES AGRETAMIENTO						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES EXFOLIACIONES						CUMPLE	
VERIFICACION ETIQUETADO	SE VERIFICO QUE LA ETIQUETA CUMPLIESE LO RESPECTIVO A ROTULADO SEGÚN NUMERAL 16 NTC 115						CUMPLE	

ELABORÓ	INGENIERO DE LABORATORIO	JULIETH RADA	APROBÓ	GUILLERMO BONETT-JEFE PLANTA

ACEROS TURIA
DIRECCION:KM 5 VIA MALAMBO-CARACOLI-BARRANQUILLA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO2@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
Procedimiento de muestreo segun numeral 12,1 NTC 115
Ensayo mecanico: Metodo NTC 3353
CERTIFICADO MAQUINA TRACCION NUM 44071 EMITIDO POR LABQUIMEC

FIN DEL CERTIFICADO


Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA NTC 5806 VERSION 2019	CODIGO: PE-CAL-R-1.1 VERSION 7 VIGENTE DESDE:01/09/2019 EL CERTIFICADO CONSTA DE 2 PAGINAS

INFORME NUMERO M470

TEMPERATURA AMBIENTAL DENTRO DEL LABORATORIO >= 16°C			20	HUMEDAD RELATIVA DENTRO DEL LABORATORIO >20%<=80%	79	INFORME PARA LA PLANTA	ACEROS TURIA BARRANQUILLA
ORDEN PRODUCCION	M-20	Turno	2	Fecha de realizacion del ensayo		16-abr-22	
DESIGNACION: MALLA ESTANDAR	XX-084		Coladas Utilizadas	TZF-00110			

DESCRIPCION DE ATRIBUTOS	REQUISITO SEGÚN NTC 5806	OBTENIDO	OBSERVACIONES
Resistencia a la tracción Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	550	759,9	CUMPLE
Resistencia a la fluencia Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	485	668,7	CUMPLE
ESFUERZO CORTANTE EN NEWTON Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 8.3.2	1528	Probeta 1: 7342 · Probeta 2: 5925 · Probeta 3: 6190 · Probeta 4: 6689 · Promedio: 6536 Desviacion estandar: 623,671	CUMPLE

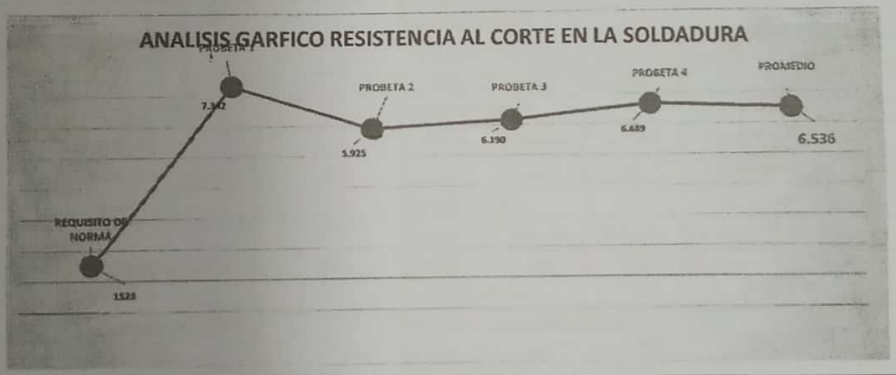

Promedio de Velocidad del ensayo maximo en minutos NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 9.3	689	519	CUMPLE
Ensayo de doblado Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 8.2	No presenta Grietas	No presenta Grietas	CUMPLE
Peso del grafil en gramos /metro Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.5	93,06	Pesaje 1: 96,20 · Pesaje 2: 96,20 · Pesaje 3: 96,20 · Pesaje 4: 96,20 · Promedio: 96,2 Desviacion estandar: 0,00	CUMPLE
Soldaduras rotas "Unidades" Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.3	6	0	CUMPLE
Oxido Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.6	No presenta	No Presenta	CUMPLE

Escaneado con CamScanner

Ancho 235 cm **Maximo 237,5** **Minimo 232,5** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.1		235	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			233,4	234,0	233,6	234,0	233,8	
			Desviacion estandar				0,30	
Longitud 600 cm **Maximo 606** **Minimo 594** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.2		600	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			603,0	602,0	603,0	602,0	602,5	
			Desviacion estandar				0,58	
Numero de barras exacto en unidades Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7	LONGITUDINAL	16	16					CUMPLE
	TRANSVERSAL	40	40					CUMPLE
Diametro del alambre de grafil en mm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL	4	4					CUMPLE
	TRANSVERSAL	4	4					CUMPLE
Separacion en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	LONGITUDINAL		15,0	15,0	15,5	15,0	15,1	
	MAX	15,6	Desviacion estandar				0,00	
	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	TRANSVERSAL		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	MAX	15,6	Desviacion estandar				0,00	
Longitud pelos en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL maximo	8	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			7,8	8,0	8,0	7,0	7,7	
			Desviacion estandar				0,48	
	TRANSVERSAL maximo	5,0	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			4,0	4,5	4,0	4,3	4,2	
			Desviacion estandar				0,24	
ETIQUETADO NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 15.4 RESOLUCION 0277 NUMERAL 6.1	**LA ETIQUETA DEBE CONTENER** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION		**LA ETIQUETA VERIFICADA CONTENIA** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION					CUMPLE

ELABORO	ING. DE CALIDAD JULIETH RADA	APROBO	JEFE . PLANTA CRISTIAN HENAO

ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS
DIRECCION: CALLE 3 SUR NUM 36-10
MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SEGÚN NTC 5806

FIN DEL CERTIFICADO

Escaneado con CamScanner

QUES PLÁSTICOS
COPLAST

FDA

Tanques plásticos fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes, usando materias primas grado FDA


Higiénicos
No se corroen, no sueltan partículas, tienen superficies lisas y fáciles de limpiar

Resistentes
El material de los tanques plásticos esta especificado para estar expuesto a la intemperie



Los Tanques Plásticos Ecoplast son fabricados en dos capas de color negro que impiden el paso de rayos solares inhibiendo el proceso de fotosíntesis necesario para el crecimiento de algas.

Cumplen con la norma técnica colombiana NTC 4384 de Tanques de Polietileno para Almacenamiento Fabricados por el Proceso de Rotomoldeo.

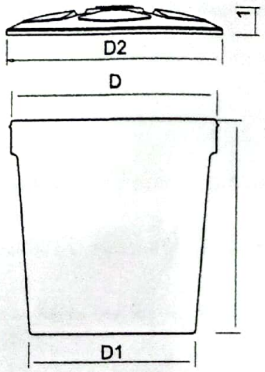

Volumen Bruto Litros	Dimensiones del tanque mm			Dimensiones de la tapa mm	
	D	D1	H	D2	H1
500	931	758	934	975	170
1000	1.232	1.031	1.030	1.275	236
2000	1.520	1.220	1.550	1.585	280

Transporte, almacenamiento y manipulación.

Cantidad máxima por arrume	
Litros	Tanques
2000	5
1000	8
500	12

- Los tanques se pueden transportar en arrumes verticales, en las cantidades indicadas en el cuadro.
- Los arrumes pueden colocarse sobre la plataforma del camión o sobre otros productos teniendo la precaución de hacerlo sobre cartón para evitar daños por rozamiento y vibración durante el viaje.
- Cuando el espacio en la altura no es suficiente, los tanques se pueden cargar acostados y encajados uno entre otro, siempre colocando cartones para evitar daños.


NOTA: En el descargue de los tanques Ecoplast se debe evitar cualquier tipo de golpe, caída o arrastrarlos ya que esto pueden ocasionar fisuras en el producto afectando su desempeño.

Cumplimos con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4384

Garantía
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Escaneado con CamScanner

idráulica
instalación hidráulica

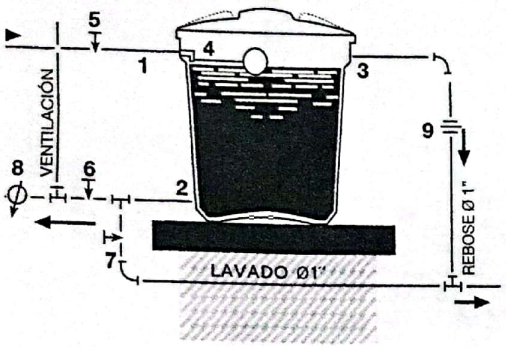

ecesarios:

entrada ø 1/2".

salida ø 1".

rebose ø 1".

ntrada ø 1/2" y flotador.

paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de lavado de tanque.

aso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o de tanque.

aso, se abre solamente para lavar el tanque.

paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acue- ed interna de servicio.

rsal.

-V1 / NOV2021

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que generen apoyos puntuales que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor al diámetro de la tapa del tanque para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo o solventes ya que pueden deteriorar el tanque.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- No enterrar el tanque bajo tierra.


NOTA:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.


Para mayor información comuníquese
a nuestra Línea de Servicio al Cliente
018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN


Conexiones para tanques plásticos
Localización de las conexiones

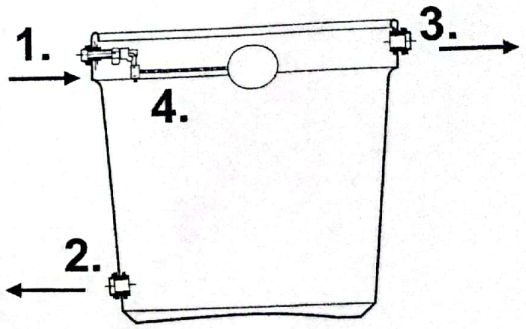

Conexión de entrada Ø 1/2"




2. Conexión de salida al servicio Ø 1"




A. Empaque de caucho
B. Flanche
C. Arandela y empaque
D. Tuerca espigo

Conexión de rebose Ø 1"



4. Válvula con varilla



Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: FFU-142

RMN: FFU-142

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040

Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S. N 9004686153

AREA TOTAL: 109 Hectárea(s) y 7134 mt(s)2 MUNICIPIOS: TOLUVIEJO-SUCRE

MINERALES: DOLOMITA\ ARCILLA\ CALIZA\ GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCISN DEL ARROYO GRANDE CON LA VMA QUE VA DE TOLUVIEJO A MACAJANA

NORTE: 1542415,0000

ESTE: 852090,0000

PLANCHA IGAC: 44

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1541529,6330	853373,9360
1539683,9580	853373,9360
1539523,9980	853127,0000
1539457,9990	852709,9990
1539457,6310	852707,0480
1539457,6310	852701,9990
1539459,9980	852701,9990
1539459,9980	852700,0000
1539724,0020	852683,0020
1540060,0010	852662,0020
1540055,9990	852659,9990
1540153,0000	852680,9990
1540965,0000	852852,9980
1541143,9990	852991,0010
1541529,6330	853286,7850

ANOTACIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

16/02/2010

TIPO ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION	FECHA EJECUTORIA:	22/01/2010
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1113255
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	22/01/2010
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN No.FFU-142 (EL CONTRATO DE CONCESION MINERA SE SUSCRIBE PARA LOS MINERALES DE CALIZA, DOLOMITA ARCILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO FFU-142).

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	04/08/2015
TIPO ANOTACIÓN:	MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA	FECHA EJECUTORIA:	14/09/2012
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	GTRM-351
EXPEDIDO POR:	PAR MEDELLIN	FECHA DOCUMENTO:	14/05/2012
LUGAR:	MEDELLÍN		

ESPECIFICACIÓN: ACEPTAR LA RENUNCIA A LAS ETAPAS DE EXPLORACION(PRIMERO Y SEGUNDO AÑO) Y A LA TOTALIDAD DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, POR LO CUAL EL PRESENTE TITULO MINERO EN LA ETAPA DE EXPLOTACION DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, FECHA EN LA CUAL SE CONCEDIO LA LICENCIA AMBIENTAL.

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	28/01/2016
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	09/12/2015
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	002423
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	06/10/2015
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PERFECCIONADA LA CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES emanadas del Contrato de Concesión No. FFU-142, que le corresponden a MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID a favor de la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.468.615-3.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución téngase a la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., como ÚNICA TITULAR del Contrato de Concesión No. FFU-142, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 002423 de fecha 06 de Octubre de 2015.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ana María González Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código 205

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	1/05/2022 — 15/05/2022
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,55	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5248	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	92,60	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	6,1 (880)	—	—	—
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	12,9 (1870)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	18,3 (2660)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	235	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	320	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***


Escaneado con CamScanner

Cerámicas El Cinco®
Ladrillos bien hechos

FICHA TÉCNICA
PRODUCTOS FABRICADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:
BLOQUE No. 4

DIMENSIONES	
Largo	40 cm
Ancho	9 cm
Alto	20 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	
Largo	± 8 mm
Ancho	± 2 mm
Alto	± 4 mm

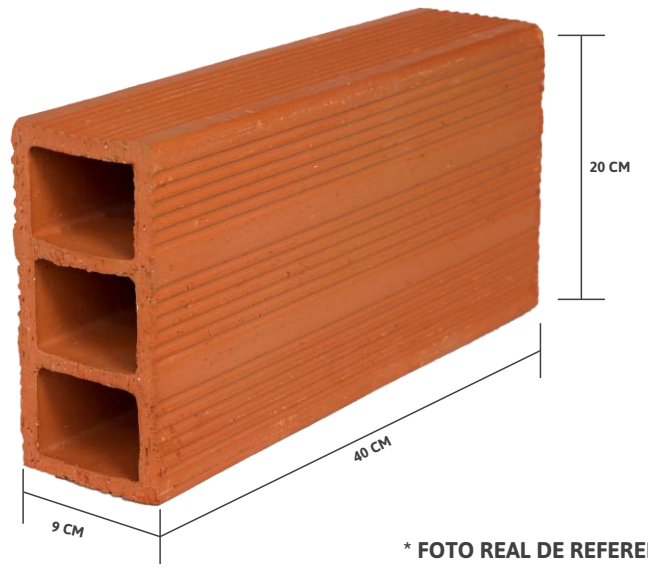

* FOTO REAL DE REFERENCIA.

Color	Terracota
Textura	Rayado
Paredes	10 mm
Tabiques	8 mm
Peso/unidad	4.75 kg Aprox.
Rendimiento	12 Unidades/m²
Aplicación	Mampostería Confinada
Clasificación	PH (Perforación Horizontal), NE (No Estructural)
Resistencia a la compresión	4.57 Mpa
Absorción de agua	11.5 %
Normas aplicadas	ICONTEC NTC 4205 - 4017

WWW.CERAMICASELCINCO.COM
SECTOR EL CINCO KM 1 VARIANTE LA GALLERA - BREMEN (SINCELEJO)
CONMUTADOR: 323 563 9125 321 563 0105
VENTAS@CERAMICASELCINCO.COM CERAMICASELCINCO

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. MAL-38045

FECHA: DD/MM/AA
15/07/2022

CLIENTE	**FERROMATERIALES SAN CARLOS S.A.S**	**DESTINO**	SINCELEJO
		VEHÍCULO No.	SUB 789

PEDIDO No.	17095
REMISIÓN No.	17089
FACTURA No.	0

						ENSAYOS FÍSICOS				COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													DIMENSIONES DE PROCESO			
							ENSAYOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO METRO (kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO (mm)**	**ANCHO DE VENAS (mm)**
R - No. 4	**6**	20221616	2	3024	✓	463.8	605.4	17.2	1.31	0.26	1.24	0.0095	0.036	0.19	0.14	0.06	0.06	0.015	0.00020	0.0022	0.48	0.957	1.060	8.380	1.620
		20221624	3		✓	480.2	622.0	17.7	1.30	0.27	1.20	0.0086	0.035	0.20	0.16	0.06	0.05	0.013	0.00020	0.0022	0.48	0.975	0.850	8.350	1.600
		20221251	4		✓	497.2	637.8	15.5	1.28	0.25	1.19	0.0117	0.033	0.19	0.18	0.08	0.06	0.017	0.00031	0.0022	0.46	0.980	0.740	8.440	1.700
R - 12M	**6**	20221525	2	2256	✓	495.2	639.2	16.9	1.29	0.25	1.20	0.0079	0.036	0.20	0.16	0.07	0.08	0.012	0.00091	0.0020	0.46	0.871	0.870	7.970	2.010
		20221522	4		✓	487.6	629.6	16.9	1.29	0.25	1.19	0.0127	0.032	0.19	0.16	0.07	0.08	0.013	0.00020	0.0020	0.46	0.879	0.940	8.060	2.420
R - No. 5	**6**	20221256	2	432	✓	491.0	628.3	15.9	1.28	0.24	1.21	0.0136	0.034	0.19	0.20	0.07	0.07	0.017	0.00020	0.0021	0.46	1.518	1.010	10.380	2.160
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9
R - 12M						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.835 - 0.888)	Min: 0.48	Max: 8.4	Max: 4.71
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: ferromaterialessancarlos@gmail.com

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS PRESION
NTC- APLICABLE : NTC- 382
REFERENCIA : 1/2" RDE 13.5
LOTE : 10393T
FECHA : 20 de agosto de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	21.24	21.44	mm	21.32
Ovalamiento	-	0.41	mm	0.47
Espesor de pared	1.57	2.08	mm	1.79
Variación espesor de pared	0	12	%	1.87
Presión Sostenida	970	-	psi	CUMPLE
Presión de Rotura	1000		psi	1100
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Impacto	13.6	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE

Realizado por



GUSTAVO MATEUS
Inspector de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3112
gmateus@aliaxis-la.com

Revisado por



LUIS FERNANDO GONZALEZ PINZON
Jefe de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3116
lgonzalez@aliaxis-la.com

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-201607077329**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S. con NIT número 900473048 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 21-05-2021 hasta el 31-07-2022. Durante el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de mayo del año 2021.

PABLO ROBERTO BERNAL LOPEZ
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
21-05-2021 10:42

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
NTC – APLICABLE : NTC - 1087
REFERENCIA : 2" 60 mm
LOTE : 10618T
FECHA : 07 de Mayo de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	60.17	60.47	mm	60.39
Ovalamiento	-	1.60	mm	0.41
Espesor de pared	2.92	3.43	mm	3.38
Variación espesor de pared	-	12	%	1.14
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	500	-	Psi	584
Resistencia Química	-	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	-	0.3	%	CUMPLE

Realizado por

GUSTAVO MATEUS.
TECNICO DE ENSAYOS.

Revisado por

ING. LUIS FERNANDO G.
DIRECTOR TECNICO.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Vereda El Corzo Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
www.durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : **TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS**
NTC – APLICABLE : **NTC - 1087**
REFERENCIA : **4”**
LOTE : **10625T**
FECHA : **15 de mayo de 2022**

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	114.07	114.53	mm	114.30
Ovalamiento	-	2.40	mm	0.62
Espesor de pared	3.30	3.81	mm	3.66
Variación espesor de pared	-	12	%	9.82
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	360	-	Psi	430
Resistencia Química	0	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	0	0.3	%	CUMPLE

REALIZADO POR:



AlVARO ENRIQUE PAVA
TECNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:



ING. LUIS FERNANDO G
JEFE DE CALIDAD

Anexo 21. Acta de Vecindad

Anexo 22. Actas de concertación

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 5

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/08/2022 AL 12/09/2022**

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de Septiembre del año 2022 se reunieron Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal de Interventoría y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	8	$ 22.803.490,38	$ 182.427.923,02	4,00	1,00	5,00	$ 91.213.961,51	$ 22.803.490,38	$ 114.017.451,89	3,00	$ 68.410.471,13
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 228.034.903,78	$ 228.034.903,78	0,0359	0,0781	0,1140	$ 8.186.453,05	$ 17.809.525,99	$ 25.995.979,03	0,89	$ 202.038.924,75
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 45.606.980,756	$ 45.606.980,76	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 45.606.980,76
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 456.069.807,56**				**$ 99.400.414,56**	**$ 40.613.016,37**	**$ 140.013.430,93**		**$ 316.056.376,64**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 86.653.263,44**				**$ 18.886.078,77**	**$ 7.716.473,11**	**$ 26.602.551,88**		**$ 60.050.711,56**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 86.653.263,44				$ 18.886.078,77	$ 7.716.473,11	$ 26.602.551,88		$ 60.050.711,56
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 542.723.071,00**				**$ 118.286.493,33**	**$ 48.329.489,48**	**$ 166.615.982,81**		**$ 376.107.088,20**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO	**$ 542.723.071,00**	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ -	**% ANTICIPO :**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 542.723.071,00	**% RETEGARANTIA :**	**N/A**

Valor Actividad No.3 del Cto de Obra	**$ 4.969.781.068,90**
Valor Actividad No.3 ejecutado según Acta Parcial No.2 del Cto de Obra	**$ 383.618.899,74**
Porcentaje de Avance Actividad No.3	**7,81%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al período del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022		$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 515.586.917,45	5,00%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al período del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022		$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 488.450.763,90	10,00%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoría comprendido al período del 13 de junio de 2022 al 12 de julio de 2022		$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 461.314.610,35	15,00%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoría comprendido al período del 13 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022 y 50% de avance de obra del período del 13 de abril de 2022 al 01 de agosto de 2022		$ 36.878.032,68	6,80%	N/A	N/A	N/A	$ 36.878.032,68	$ 424.436.577,67	21,80%
5	Acta No. 05 de pago del 40% del Mes 5 de Interventoría comprendido al período del 13 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 y 50% de avance de obra del período del 02 de agosto de 2022 al 21 de agosto de 2022		$ 48.329.489,48	8,91%	N/A	N/A	N/A	$ 48.329.489,48	$ 376.107.088,20	30,70%
TOTAL			**$ 166.615.982,80**	**30,70%**	-	-	-	**$ 166.615.982,80**	**$ 376.107.088,20**	**30,70%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de septiembre de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Aprobó

Firma:
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

	CONTROL DE EQUIPOS	CÓDIGO	F-GG-22
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	2020-10-19

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2022 **Y EL** 30/09/2022 **FECHA INICIO** 13/04/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega principal	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

M2401B *Tronzadora*



203 191953-5

Potencia de entrada	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,8
Dimensiones (L x A x A)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1.2 kg
Cable de conexión	2.5 m

Disco de corte, llave.

PULIDORA 9" INDUSTRIAL

DWE490

Potencia	2200W
Voltaje	120V
Velocidad (RPM)	6.500
Tamaño Disco	9" (230 mm)
Velocidad Variable	No
Peso	5,2 Kg



INCLUYE: Guarda Protectora, Flanges y Mango Lateral.

GARANTÍA HERRAMIENTA

3 AÑOS Garantía Limitada

1 AÑO Mantenimiento Gratis

90 DÍAS Satisfacción Garantizada

DEWALT

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

enterritorio	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	F-GG-23
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

FECHA DE PRESENTACIÓN:		**INFORME MENSUAL DEL**	**1-sept**	**AL**	**30-sept**	
CONTRATO No. :	INA-032-2021					
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre					
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.					
SUPERVISOR:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERROTORIO					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	Nombre		Desde	Hasta	
N/A	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	NO APLICA	N/A	N/A	COMPRESION DE CILINDROS
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	Hasta
N/A	1-052-9-2-029	TRANSDUCTOR DE FUERZA	No. CNM-6917-85/19	26/01/2022	26/01/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
01	4	11/06/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON** **102,07% DE LA RESISTENCIA**
02	4	12/09/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGAS DE CORONA** **104,77% DE LA RESISTENCIA**
03	4	11/09/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON** **104,28% DE LA RESISTENCIA**

04	4	12/09/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGAS CORONA** **103,56% DE LA RESISTENCIA**
05	4	4/10/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN MANZANA 52 CASA No. 368** **103,76% DE LA RESISTENCIA**
06	4	4/10/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 502 MANZANA 52 CASA No.368** **103,30% DE LA RESISTENCIA**
07	4	5/10/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN MANZANA 26 CASA No. 068** **104,65% DE LA RESISTENCIA**
08	4	5/10/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 502 MANZANA 26 CASA No.068** **104,53% DE LA RESISTENCIA**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
		Certificado 82441679 Acero de refuerzo de 3/8" y 1/2"	3/06/2022	N/A	Ternium	NTC 2289 GR60
		Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
		205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121
		Ficha tecnica Bloque No. 04	N/A	N/A	Ceramicas el Cinco	ICONTEC NTC 4205-4017
		Certificado MAL-38045 Acero No. 04	N/A	N/A	Grupo Siderurgico Reyna	NTC 2289
		Tubos de Presion 1/2" RDE 13,5	20 de agosto de 2021	N/A	DURMAN	NTC- 382
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2"	7/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 4"	15/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	**Firma**
NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 - 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA


FECHA DE INFORME: 19/09/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACION: BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO 7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 2 CASA No. 203	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022	11/09/2022	3000	NORMAL	254.07	333.12	385.12	2020.1	2648.6	3062.1
												67.34%	88.29%	102.07%
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 2 CASA No. 203	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	3000	NORMAL	261.32	348.52	395.32	2077.8	2771.1	3143.2
												69.26%	92.37%	104.77%
3	MACHÓN MANZANA 4 CASA No. 164	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022	11/09/2022	3000	NORMAL	276.07	347.12	393.47	2195.0	2760.0	3128.5
												73.17%	92.00%	104.28%
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 4 CASA No.164	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	3000	NORMAL	271.65	335.12	390.76	2159.9	2664.5	3106.9
												72.00%	88.82%	103.56%
5														
6														
7														
8														
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TÉCNICO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 - 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA


FECHA DE INFORME: 11/10/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACION: BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI)		
												EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 69 CASA No. 541	17/08/2022	15.24	24/08/2022	31/08/2022	14/09/2022	3000	NORMAL	258.32	325.17	387.14	2053.9	2585.4	3078.2
												68.46%	86.18%	102.61%
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 69 CASA No. 541	19/08/2022	15.24	26/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	3000	NORMAL	259.14	327.00	385.28	2060.4	2600.0	3063.4
												68.68%	86.67%	102.11%
3	MACHÓN MANZANA 69 CASA No. 109	01/09/2022	15.24	08/09/2022	15/09/2022	29/09/2022	3000	NORMAL	256.21	335.12	390.79	2037.1	2664.5	3107.2
												67.90%	88.82%	103.57%
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 69 CASA No. 109	05/09/2022	15.24	12/09/2022	19/09/2022	03/10/2022	3000	NORMAL	285.12	339.45	398.46	2267.0	2699.0	3168.2
												75.57%	89.97%	105.61%
5	MACHÓN MANZANA 52 CASA No. 368	06/09/2022	15.24	13/09/2022	20/09/2022	04/10/2022	3000	NORMAL	270.32	338.97	391.49	2149.3	2695.2	3112.7
												71.64%	89.84%	103.76%
6	VIGA CORONA 502 MANZANA 52 CASA No.368	06/09/2022	15.24	13/09/2022	20/09/2022	04/10/2022	3000	NORMAL	260.94	332.18	389.78	2074.7	2641.2	3099.1
												69.16%	88.04%	103.30%
7	MACHÓN MANZANA 26 CASA No. 068	07/09/2022	16.24	14/09/2022	21/09/2022	05/10/2022	3001	NORMAL	258.23	330.21	395.00	2053.2	2625.5	3140.7
												68.42%	87.49%	104.65%
8	VIGA CORONA 502 MANZANA 26 CASA No.068	07/09/2022	17.24	14/09/2022	21/09/2022	05/10/2022	3002	NORMAL	259.64	333.99	394.65	2064.4	2655.6	3137.9
												68.77%	88.46%	104.53%
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TÉCNICO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 - 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA


FECHA DE INFORME: 31/08/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACION: BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO 7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 2 CASA No. 203	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022		3000	NORMAL	254.07	333.12		2020.1	2648.6	
												67.34%	88.29%	
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 2 CASA No. 203	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022		3000	NORMAL	261.32	348.52		2077.8	2771.1	
												69.26%	92.37%	
3	MACHÓN MANZANA 4 CASA No. 164	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022		3000	NORMAL	276.07	347.12		2195.0	2760.0	
												73.17%	92.00%	
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 4 CASA No.164	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022		3000	NORMAL	271.65	335.12		2159.9	2664.5	
												72.00%	88.82%	
5														
6														
7														
8														
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TECNICO

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso de baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CODIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 3 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SINCELEJO, SUCRE

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220577

OBJETO: "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PERÍODO A PAGAR: **DEL 22 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022**

En Sincelejo, Sucre, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2022 se reunieron Jose Ignacio Cardenas Meneses Representante Legal del Contratista y Luz Andrea Fajardo Corredor Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 144.902,5392

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1,1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1,00	$ 4.759.770,59	$ 4.759.770,59	1,00		1,00	$ 4.759.770,59	$ -	$ 4.759.770,59	-	-
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 904.356,41				$ 904.356,41	$ -	$ 904.356,41		$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5.664.127,00**				**$ 5.664.127,00**	**$ -**	**$ 5.664.127,00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	693	$ 144.902,5392	$ 100.417.459,66	76,00	54,00	130,00	$ 11.012.992,98	$ 7.824.737,12	$ 18.837.330,10	563	$ 81.580.129,57
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 19.079.317,34			-	$ 2.092.392,67	$ 1.486.700,05	$ 3.579.092,72	-	$ 15.500.224,62
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 119.496.777,00**				**$ 13.104.985,65**	**$ 9.311.437,17**	**$ 22.416.422,81**	-	$ 97.080.354,19
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS				-			-		$ -	$ -	-	-
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 14.370,00	$ 14.370,00	1.181,28	852,68	2.033,96	$ 16.974.993,60	$ 12.253.011,60	$ 29.228.005,20	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 57.385,00	$ 57.385,00	666,93	470,01	1.136,94	$ 38.271.778,05	$ 26.971.523,85	$ 65.243.301,90	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 29.682,00	$ 29.682,00	24,70	48,25	72,950	$ 733.145,40	$ 1.432.156,50	$ 2.165.301,90	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			$ -		-				$ -	$ -	-	
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1,00	$ 123.661,00	$ 123.661,00	75,00	54,00	129,00	$ 9.274.575,00	$ 6.677.694,00	$ 15.952.269,00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1,00	$ 150.802,00	$ 150.802,00	75,00	54,00	129,00	$ 11.310.150,00	$ 8.143.308,00	$ 19.453.458,00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 110.519,00	$ 110.519,00	75,00	54,00	129,00	$ 8.288.925,00	$ 5.968.026,00	$ 14.256.951,00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 116.841,00	$ 116.841,00	5,00	9,00	14,00	$ 584.205,00	$ 1.051.569,00	$ 1.635.774,00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 185.833,00	$ 185.833,00	8,00	8,00	16,00	$ 1.486.664,00	$ 1.486.664,00	$ 2.973.328,00	-	-
	APARATOS			$ -		-				$ -	$ -		
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 192.852,00	$ 192.852,00	75,00	54,00	129,00	$ 14.463.900,00	$ 10.414.008,00	$ 24.877.908,00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1,00	$ 148.176,00	$ 148.176,00	75,00	54,00	129,00	$ 11.113.200,00	$ 8.001.504,00	$ 19.114.704,00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1,00	$ 239.081,00	$ 239.081,00	5,00	9,00	14,00	$ 1.195.405,00	$ 2.151.729,00	$ 3.347.134,00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1,00	$ 228.983,00	$ 228.983,00	8,00	8,00	16,00	$ 1.831.864,00	$ 1.831.864,00	$ 3.663.728,00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			$ -		-				$ -	$ -		
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 226.866,00	$ 226.866,00	70,60	49,75	120,35	$ 16.016.739,60	$ 11.286.583,50	$ 27.303.323,10	-	-
	UNIDADES SANITARIAS			$ -		-				$ -	$ -		
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.325.416,00	$ 3.325.416,00	2,00	-	2,00	$ 6.650.832,00	$ -	$ 6.650.832,00	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 2.960.054,00	$ 2.960.054,00	24,00	10,00	34,00	$ 71.041.296,00	$ 29.600.540,00	$ 100.641.836,00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.751.867,00	$ 3.751.867,00	45,00	36,00	81,00	$ 168.834.015,00	$ 135.067.212,00	$ 303.901.227,00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.854.876,00	$ 3.854.876,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN			$ -		-				$ -	$ -	-	-
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 16.092,00	$ 16.092,00	1,50	3,00	4,50	$ 24.138,00	$ 48.276,00	$ 72.414,00	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 49.479,00	$ 49.479,00	20,34	19,79	40,13	$ 1.006.402,86	$ 979.189,41	$ 1.985.592,27	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			$ -		-				$ -	$ -	-	-
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 704.327,00	$ 704.327,00	17,30	11,90	29,197	$ 12.184.857,10	$ 8.379.378,32	$ 20.564.235,42	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1,00	$ 6.655,00	$ 6.655,00	1.989,79	1.428,08	3.417,87	$ 13.242.052,45	$ 9.503.872,40	$ 22.745.924,85	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1,00	$ 68.432,00	$ 68.432,00	10,51	26,33	36,84	$ 719.220,32	$ 1.801.677,70	$ 2.520.898,02	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1,00	$ 71.036,00	$ 71.036,00	46,40	27,20	73,60	$ 3.296.070,40	$ 1.932.179,20	$ 5.228.249,60	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 235.590,00	$ 235.590,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CODIGO:	F-GG-32	
											VERSIÓN:	01	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS										VIGENCIA:	2020-10-20	
	MAMPOSTERIA			$ -		-				$ -	$ -	-	
3.12	Mamposteria en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1,00	$ 35.344,00	$ 35.344,00	35,19	47,01	82,20	$ 1.243.755,36	$ 1.661.521,44	$ 2.905.276,80	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1,00	$ 8.032,00	$ 8.032,00	-	7,00	7,00	$ -	$ 56.224,00	$ 56.224,00	-	-
	MORTEROS			$ -		-				$ -	$ -	-	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 16.234,00	$ 16.234,00	75,89	103,34	179,23	$ 1.231.998,26	$ 1.677.621,56	$ 2.909.619,82	-	-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 17.058,00	$ 17.058,00	52,35	88,94	141,29	$ 892.986,30	$ 1.517.138,52	$ 2.410.124,82	-	-
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 20.301,00	$ 20.301,00	-	0,65	0,65	$ -	$ 13.195,65	$ 13.195,65	-	-
	ELEMENTOS			$ -		-				$ -	$ -	-	
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1,00	$ 383.416,00	$ 383.416,00	4,00	8,00	12,00	$ 1.533.664,00	$ 3.067.328,00	$ 4.600.992,00	-	-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00	4,00	9,00	13,00	$ 236.732,00	$ 532.647,00	$ 769.379,00	-	-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 246.067,00	$ 246.067,00	29,00	17,00	46,00	$ 7.135.943,00	$ 4.183.139,00	$ 11.319.082,00	-	-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	UN	1,00	$ 24.525,00	$ 24.525,00	41,00	21,00	62,00	$ 1.005.525,00	$ 515.025,00	$ 1.520.550,00	-	-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1,00	$ 65.320,00	$ 65.320,00	-	13,60	13,60	$ -	$ 888.352,00	$ 888.352,00	-	-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1,00	$ 25.877,00	$ 25.877,00	-	3,00	3,00	$ -	$ 77.631,00	$ 77.631,00	-	-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1,00	$ 40.300,00	$ 40.300,00	72,00	46,00	118,00	$ 2.901.600,00	$ 1.853.800,00	$ 4.755.400,00	-	-
	ACABADOS			$ -		-				$ -	$ -	-	
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1,00	$ 41.074,00	$ 41.074,00	4,23	-	4,23	$ 173.743,02	$ -	$ 173.743,02	-	-
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00	65,56	14,52	80,08	$ 1.704.560,00	$ 377.520,00	$ 2.082.080,00	-	-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1,00	$ 20.215,00	$ 20.215,00	23,11	1,75	24,86	$ 467.168,65	$ 35.376,25	$ 502.544,90	-	-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 40.484,00	$ 40.484,00	17,91	29,73	47,64	$ 725.068,44	$ 1.203.589,32	$ 1.928.657,76	-	-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 48.925,00	$ 48.925,00	10,67	21,32	31,99	$ 522.029,75	$ 1.042.983,15	$ 1.565.012,90	-	-
3.29	Caiburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 6.616,00	$ 6.616,00	99,43	113,11	212,54	$ 657.828,88	$ 748.335,76	$ 1.406.164,64	-	-
	CONEXIONES			$ -		-				$ -	$ -	-	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 155.488,00	$ 155.488,00	7,00	4,00	11,00	$ 1.088.416,00	$ 621.952,00	$ 1.710.368,00	-	-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UN	1,00	$ 171.923,00	$ 171.923,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 36.602,00	$ 36.602,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 35.954,00	$ 35.954,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 71.908,00	$ 71.908,00	-	-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 101.003,00	$ 101.003,00	34,90	32,20	67,10	$ 3.525.004,70	$ 3.252.296,60	$ 6.777.301,30	-	-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 17.875,00	$ 17.875,00	-	3,50	3,50	$ -	$ 62.562,50	$ 62.562,50	-	-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UN	1,00	$ 209.226,00	$ 209.226,00	1,00	6,00	7,00	$ 209.226,00	$ 1.255.356,00	$ 1.464.582,00	-	-
	INTERVENCIONES VARIAS			$ -		-				$ -	$ -	-	
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1,00	$ 91.825,00	$ 91.825,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			$ -		-				$ -	$ -	-	
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 305.967,00	$ 305.967,00	11,00	8,00	19,00	$ 3.365.637,00	$ 2.447.736,00	$ 5.813.373,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 3.835.167.214,50**				**$ 437.165.315,14**	**$ 312.145.205,23**	**$ 749.310.520,37**		**$ 3.085.856.694,13**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 1.074.613.853,50**				**$ 122.493.721,29**	**$ 87.463.086,50**	**$ 209.956.807,79**		**$ 864.657.045,71**
	ADMINISTRACIÓN	**21,07%**			$ 808.069.732,10				$ 92.110.731,90	$ 65.768.994,74	$ 157.879.726,64		$ 650.190.005,46
	IMPREVISTOS	**1,0%**			$ 38.351.672,14				$ 4.371.653,15	$ 3.121.452,05	$ 7.493.105,20		$ 30.858.566,94
	UTILIDAD	**5%**			$ 191.758.360,72				$ 21.858.265,75	$ 15.607.260,26	$ 37.465.526,01		$ 154.292.834,71
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 36.434.088,54				$ 4.153.070,49	$ 2.965.379,45	$ 7.118.449,94		$ 29.315.638,60
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**$ 4.909.781.068,00**				**$ 559.659.036,43**	**$ 399.608.291,73**	**$ 959.267.328,16**		**$ 3.950.513.739,84**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3					**$ 5.034.941.972,00**				**$ 578.428.149,07**	**$ 408.919.728,90**	**$ 987.347.877,97**		**$ 4.047.594.094,03**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 5.034.941.972,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 981.956.213,60**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 5.034.941.972,00	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 167.258.412,19	3,321953%	-	$ 35.208.027,34	$ 946.748.186,26	$ 132.050.384,85	$ 4.867.683.559,81	3,6910590%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 353.326.921,98	7,017497%	-	$ 134.266.614,91	$ 812.481.571,35	$ 219.060.307,07	$ 4.514.356.637,83	10,3394505%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SINCELEJO		$ 368.027.756,01	7,309474%	-	$ 119.882.487,52	$ 692.599.083,83	$ 248.145.268,49	$ 4.146.328.881,82	17,6489242%
					-					
	TOTAL		**$ 888.613.090,18**	**17,648924%**	**-**	**$ 289.357.129,77**	**$ 692.599.083,83**	**$ 599.255.960,41**	**$ 4.146.328.881,82**	**17,6489242%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Elaboró
CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO TURQUÍA

Aprobó
INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: No Aplica

IDENTIFICACION INMUEBLE

	CODIGO INMUEBLE	MARQUE CON UNA (X) SI ES INCLUSIÓN	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	LATITUD	LONDGITUD	2.1 Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes. ML $14.370,00	2.2 Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes ML $57.385,00	2.3 Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes ML $29.682,00
77	S-SC-EP-M05-VF-117		El Poblado	MARELVIS ESTHER YANES PATERNINA	64702216	KR 16C BIS 45A 24	9°16'41.2" N	75°23'05.6" W	12,50	6,00	
78	S-SC-EP-M05-VF-118		El Poblado	ROSIREL BASILIO SIERRA	1102844800	KR 16C Bis 45A 80	9°16'40.7" N	75°23'05.6" W	21.60	4.15	
79	S-SC-EP-M05-VF-119		El Poblado	LACIDES ANTONIO BASILIO HERRERA	3935579	KR 16C BIS 45A	9°16'39.8" N	75°23'05.2" W	21.10	10.70	
80	S-SC-EP-M05-VF-123		El Poblado	Numael José Campo Montes	92527211	Kr 16 C 45 A 35	9°16'40.0" N	75°23'05.9" W	6,85	12,00	
81	S-SC-EP-M08-VF-134		El Poblado	DANIEO HUMBERTO PEREZ PEREZ	2760808	KR 16 C BIS 45 B 22	9°16'38.3" N	75°23'04.6" W	20,60	10,50	
82	S-SC-EP-M08-VF-135		El Poblado	HERMES YAUDETH TORRES HOYOS	78759991	KR 16 C 45 B 05	9°16'39.1" N	75°23'05.5" W	9.20	3.60	
83	S-SC-EP-M08-VF-136		El Poblado	OSCAR DARIO DIAZ VILLADIEGO	1102843934	KRA 16 C 45 B 13	9°16'38.6" N	75°23'05.3" W	22.50	6.00	
84	S-SC-EP-M08-VF-137		El Poblado	ALECT YOJANA REYES MARTINEZ	64701758	KR 16 C 45 B 23	9°16'38.2" N	75°23'05.1" W	19,70	11,90	
85	S-SC-EP-M04-VF-161		El Poblado	MARIA VIRGELINA FLOREZ CARDONA	64589749	KRA 16 C 45 B 24	9°16'38.2" N	75°23'05.7" W	20,10	13,05	
86	S-SC-EP-M04-VF-162		El Poblado	YESICA PAOLA ANGARITA GOMEZ	1045507927	KR 16 C 45 B 18	9°16'38.3" N	75°23'05.8" W	6.10	1.20	2.70
87	S-SC-EP-M04-VF-164		El Poblado	EVER ENRIQUE PEREZ CRUZ	1003359491	kr 16h 45h 05	9°16'38.5"N	75°23'06.4"W	18.00	4.30	
88	S-SC-EP-M03-VF-172		El Poblado	MARBELIS BARRIOS SALGADO	1049562811	CALL 2 M22 LT 2	9°16'40.7"N	75°23'07.3"W	20.90	12.90	
89	S-SC-EP-M03-VF-173		El Poblado	ADELFINA DEL CARMEN CORTES MOLINA	25806553	CLL 45A 16B-02	9°16'41.1"N	75°23'07.4"W	14,26	3,50	
90	S-SC-EP-M03-VF-174		El Poblado	ANTONIO SEGUNDO MENDEZ AVILA	92525655	KRA 16 C 45 A 06	9°16'41.3"N	75°23'07.0"W	14,40	5,50	
91	S-SC-EP-M03-VF-177		El Poblado	JOSE ALBERTO SALCEDO LUNA	92519035	KRA 16 G 45 A 18	9°16'40.6"N	75°23'06.9"W	20.30	10.06	
92	S-SC-EP-M01-VF-183		El Poblado	ISIDORA AVILA GOMEZ	23909567	KR 16B 45A 45	9°16'40.1"N	75°23'07.7"W	17.90	8.80	
93	S-SC-EP-M02-VF-203		El Poblado	KATIA MILENA MONTERROZA PEREZ	1103496961	KR 16B 45B 06	9°16'38.2"N	75°23'06.8"W	17,10	8,70	
94	S-SC-EP-M37-VF-247		El Poblado	INGRID DINAD SOLANO	26970018	KR 16 H 45 A 14	9°16'46.5"N	75°22'59.0"W	14,60	11,00	
95	S-SC-EP-M38-VF-275		El Poblado	DARY LUZ NISPERUZA	1073254336	Carrera 16 I #45-15	9°16'46.7"N	75°22'58.7"W	12.10	6.00	
96	S-SC-EP-M37-VF-287		El Poblado	Kellys Johana Pérez Gómez	1104377024	kr 16I 45A 09	9°16'46.9"N	75°22'59.2"W	17.20	12.00	
97	S-SC-EP-M34-VF-232		El Poblado	LEIDIS DINAD OLIVERA PINTO	1123400843	CL 45 16 H 04	9°16'46.6"N	75°23'01.6"W	10,00	12,00	
98	S-SC-EP-M31-VF-234		El Poblado	LUZ MERY BALTAZAR FLOREZ	1102857929	KR 16H 45 16	9°16'45.3"N	75°23'01.5"W	16,10	17,24	
99	S-SC-EP-M32-VF-394		El Poblado	JOSE RAFAEL ARRIETA ROMERO	92641902	KR 16 H 45 A 80	9°16'41.9"N	75°23'00.1"W	16.00	12.00	
100	S-SC-EP-M35-VF-490		El Poblado	MARIA DILIA MONROY	43995052	CL 45A # 16H-04	9°16'44.9"N	75°23'00.4"W	7.00	12.00	
101	S-SC-EP-M34-VF-562		El Poblado	ANA FIDELIA HERNANDEZ MEJIA	44120002	Calle 45 A #16H-05	9°16'46.1"N	75°23'01.4"W	9,50	3,50	
102	S-SC-EP-M36-VF-603		El Poblado	MANUEL DEL CRISTO DE AVILA VARGAS	9039877	CL 45 C 16 H 06	9°16'40.7"N	75°22'58.9"W	12,00	11,00	
103	S-SC-EP-M32-VF-690		El Poblado	JOSE GABRIEL TURAN PEREZ	92694444	KR 16H 45 A - 20	9°16'44.1"N	75°23'00.9"W	13.00	13.50	
104	S-SC-EP-M07-VF-041		El Poblado	MARLEDYS MARIA CHARRY MORALES	100550796	KR 16 D 45 A 24	9°16'41.5"N	75°23'04.9"W	7.20	7.27	
105	S-SC-EP-M32-VF-062		El Poblado	ANGELICA MARIA VITOLA GONZALEZ	64586284	Carrera 16 G #45A-39	9°16'43.1"N	75°23'01.2"W	16,00	11,20	
106	S-SC-EP-M32-VF-064		El Poblado	ONEIDA LUZ PARRA HERNANDEZ	64553945	KR 16G 45A 09	9°16'43.9"N	75°23'01.6"W	27,60	15,20	4,00
107	S-SC-EP-M29-VF-070		El Poblado	MAGALIS ESTHER FUENTES HOYOS	23178161	KR 16G 45 A 04	9°16'42.9"N	75°23'02.4"W	20.30	12.00	1.50
108	S-SC-EP-M32-VF-074		El Poblado	TIRISAY HERNANDEZ GALE	1102794212	KR 16G 45A 22	9°16'42.5"N	75°23'01.7"W	12.60		2.00
109	S-SC-EP-M29-VF-077		El Poblado	YAIDRA DEL CARMEN ESCOBLA	49717955	KR 16F 45 A 39	9°16'42.5"N	75°23'02.4"W	17,80	9,50	
110	S-SC-EP-M26-VF-095		El Poblado	VIRNA MARIA MARQUEZ CARDENAS	1010060188	CLL 45B 16E12	9°16'41.5"N	75°23'02.7"W	18,50	5,50	
111	S-SC-EP-M26-VF-098		El Poblado	Carmen edith Oviedo García	42205161	Kr 16 f 45b 38	9°16'40.8"N	75°23'02.0"W	4.70	8.30	
112	S-SC-EP-M07-VF-239		El Poblado	CARMELINA RIVAS ROSA RAMOS	10023612605	KR 16 D 45 A 06	9°16'42.2"N	75°23'05.2"W	14.20	4.40	
113	S-SC-EP-M07-VF-240		El Poblado	FREDY JOSE GUEVARA PEREZ	92540272	KR 16 D 45 A 12	9°16'41.9"N	75°23'05.1"W	13,30	5,00	
114	S-SC-EP-M50-VF-357		El Poblado	ELIZABETH OCHOA QUIROZ	64566363	KRA 17C # 45-35	9°16'49.0"N	75°22'54.8"W	19,15	10,55	4,36
115	S-SC-EP-M51-VF-361		El Poblado	NOEMI MENDOZA MORALES	64572258	Calle 45 A #17C-30	9°16'48.2"N	75°22'53.8"W	15.00	7.50	3.00
116	S-SC-EP-M51-VF-362		El Poblado	TOMAS ENRIQUE NARANJO	78760732	Carrera 17 D #45A-10	9°16'47.8"N	75°22'53.6"W	25.00	13.12	9.70
117	S-SC-EP-M50-VF-441		El Poblado	YARIMA DIAZ	1100335179	KR 17C 45 29	9°16'53.0"N	75°22'52.5"W	17,15	5,15	4,54
118	S-SC-EP-M65-VF-519		El Poblado	ROSARIO ESTHER SUAREZ HERNANDEZ	64571526	Carrera 17 G #45-05	9°16'52.8"N	75°22'52.3"W	20,00	13,50	
119	S-SC-EP-M65-VF-520		El Poblado	ROSA ANGELINA SUAREZ HERNANDEZ	64559353	Carrera 17 G #45-11	9°16'52.6"N	75°22'52.2"W	16.70	9.30	
120	S-SC-EP-M65-VF-521		El Poblado	ANIBAL JOSE HERNANDEZ RUIZ	92542529	M7 65 LT 2	9°16'52.5"N	75°22'51.4"W	21.20	14.20	
121	S-SC-EP-M65-VF-529		El Poblado	FERNAN PEREZ AGUILAR	92527624	Carrera 17 H #45-34	9°16'53.8"N	75°22'51.3"W	22,60	5,20	
122	S-SC-EP-M69-VF-533		El Poblado	ELISA ELENA PEREZ GAMBOA	64477233	Carrera 17 H #45-07	9°16'52.4"N	75°22'50.7"W	20,20	5,00	4,00
123	S-SC-EP-M69-VF-538		El Poblado	FRANCISCO NARVAEZ PEREZ	92547706	Carrera 17 H #45-59	9°16'54.6"N	75°22'49.3"W	17,20	12,00	
124	S-SC-EP-M72-VF-544		El Poblado	DERIS JULIO BAENA	64525546	KRA 17L # 45-05	9°16'53.5"N	75°22'48.9"W	13.50	9.90	
125	S-SC-EP-M72-VF-546		El Poblado	ADOLFO ENRIQUE RUIZ NARVAEZ	92510554	KRA 17L # 45-35	9°16'52.9"N	75°22'49.0"W	15.87	4.50	
126	S-SC-EP-M72-VF-547		El Poblado	ALFREDO SOLAR MATOS	15609626	Carrera 17 L #45-23	9°16'52.5"N	75°22'49.1"W	13,70	8,50	
127	S-SC-EP-M72-VF-550		El Poblado	CARMEN MARIA ARRIETA PEREZ	1102855163	KRA 17L # 45-53	9°16'49.3"N	75°22'54.9"W	14,90	3,42	8,45
128	S-SC-EP-M70-VF-578		El Poblado	LAURA VANESSA FLOREZ ACUÑA	1005573194	Calle 45 Bis #17H-20	9°16'53.1"N	75°22'48.7"W	4.00	3.00	4.00
129	S-SC-EP-M37-VF-188		El Poblado	KELLYS JOHANA MARENCO HERNANDEZ	1104427591	Carrera 16I 45 -15	9°16'46.3"N	75°22'59.8"W	18.50	14.00	
130	S-SC-EP-M03-VF-179		El Poblado	DEBIUS LUCIA CARABALLO MARQUEZ	1103743180	Carrera 16c 45a - 48	9°16'39.8"N	75°23'06.4"W	15,20	9,70	
	#¡REF!	#¡REF!	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			2033,96	1136,94	72,95
			PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO			15,65	8,88	3,84

BASE PLANA – totals by item

Item	Group	Unit price	ACUMULADO	PROMEDIO
2.4	PUNTOS HIDROSANITARIOS	$129.661,00	129,00	1,00
2.5	PUNTOS HIDROSANITARIOS	$150.802,00	129,00	1,00
2.6	PUNTOS HIDROSANITARIOS	$130.519,00	129,00	1,00
2.7	PUNTOS HIDROSANITARIOS	$116.841,00	14,00	1,00
2.8	PUNTOS HIDROSANITARIOS	$185.833,00	16,00	1,00
2.9	APARATOS	$198.832,00	#####	1,00
2.10	APARATOS	$148.176,00	#####	1,00
2.11	APARATOS	$239.081,00	14,00	1,00
2.12	APARATOS	$228.983,00	16,00	1,00
2.13	CAJAS DE INSPECCIÓN	$226.866,00	120,35	0,93
3.1	UNIDADES SANITARIAS	$3.325.416,00	2,00	1,00
3.2	UNIDADES SANITARIAS	$2.960.054,00	34,00	1,00
3.3	UNIDADES SANITARIAS	$3.751.867,00	81,00	1,00
3.4	UNIDADES SANITARIAS	$3.854.676,00		
3.5	CIMENTACIÓN	$16.092,00	4,50	1,50
3.6	CIMENTACIÓN	$49.479,00	40,13	0,62
3.7	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$704.327,00	28,99	0,48
3.8	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$6.655,00	#####	61,87
3.9	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$68.432,00	36,84	2,30
3.10	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$71.036,00	73,60	1,60
3.11	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$238.590,00		
3.12	MAMPOSTERIA	$35.544,00	82,20	2,00
3.13	MAMPOSTERIA	$8.032,00	7,00	3,50
3.14	MORTEROS	$16.234,00	179,23	4,84
3.15	MORTEROS	$17.058,00	141,29	4,04
3.16	MORTEROS	$20.301,00	0,65	0,65
3.17	ELEMENTOS	$388.416,00	12,00	1,00
3.18	ELEMENTOS	$59.183,00	13,00	1,00
3.19	ELEMENTOS	$246.067,00	44,00	1,00
3.20	ELEMENTOS	$24.525,00	62,00	1,00
3.21	ELEMENTOS	$65.520,00	13,60	6,80
3.22	ELEMENTOS	$25.877,00	3,00	3,00
3.23	ELEMENTOS	$40.300,00	126,00	1,00
3.24	ACABADOS	$41.074,00	4,23	4,23
3.25	ACABADOS	$26.000,00	80,08	3,64
3.26	ACABADOS	$28.215,00	24,86	2,76
3.27	ACABADOS	$40.484,00	47,64	4,33
3.28	ACABADOS	$48.925,00	31,99	2,67
3.29	ACABADOS	$6.616,00	212,54	11,81
4.1	CONEXIONES	$118.488,00	10,00	1,00
4.2	CONEXIONES	$178.923,00		
4.3	CONEXIONES	$96.602,00		
4.4	CONEXIONES	$35.954,00	2,00	1,00
4.5	CONEXIONES	$108.003,00	61,10	4,70
4.6	CONEXIONES	$17.875,00	3,50	1,75
4.7	CONEXIONES	$208.226,00	7,00	1,00
4.8	INTERVENCIONES VARIAS	$91.825,00		
4.9	CAJAS DE INSPECCIÓN	$308.967,00	17,60	0,93

Administracion	Imprevistos	Utilidad	Iva	Salario Mínimo	No. Inmuebles para intervención	Costo Validación
21,07%	1%	5,0%	19%	$ 1.000.000,00	693	$ 5.664.127,00

VM: Valor Máximo Ayuda

VM INTRADOMICILIARIA	VM INTRADOMICILIARIA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO
8,23 SMLMV	10,03 SMLMV
$ 8.230.000,00	$ 10.030.000

Totals

Column	Total
DIAGNOSTICO (Sin IVA)	$ 39.848.198,28
DIAGNOSTICO (Incluido IVA)	$ 47.419.355,95
Validación (Sin IVA)	$ 1.888.797,85
Validación (Con IVA)	$ 2.247.669,44
DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Sin IVA)	$ 41.736.996,13
DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Incluido IVA)	$ 49.667.025,40
INTRADOMICILIARIA (sin AIU)	$ 734.228.031,62
DOMICILIARIA (sin AIU)	$ 14.710.235,00
Sumatoria	$ 748.938.266,62
INTRADOMICILIARIA (Incluye AIU)	$ 939.958.726,11
DOMICILIARIA (Incluye AIU)	$ 18.832.042,85
INTRA+DOMC+DIAGNOS	$ 1.008.457.794,35
CASO 1 - INTRA: CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS + DIAGNOSTICO	$ -
CASO 2 - INTRA: CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS	$ -
CASO 2 - INTRA: CHEQUEO NORM INTRA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO	$ -
DESCUENTO POR INTRA	$ -
CONSOLIDADO EJECUTADO DESCUENTOS	$ 1.008.457.794,35
