FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Jueves 1 Septiembre /2022
⇒ PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnosta
- Director de obra
- Trabajador Social
- SISO
- 24 Maestros - 24 Ayudantes
⇒ PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Profesionales social.

- ACTIVIDADES REALIZADAS -

Se continua trabajo administrativo de la actividad 2, organizando trazabilidad de los diagnosticos, beneficiarios potenciales y demás; dentro de las oficinas.
También, se continua ejecutando la actividad 3, con cada una de las labores intrínseca de la misma como excavación, fundición, instalación de tanque, cubierta, entre otras.

- En el día de hoy se realizó COMITE y visita por parte de la Arq. Tatiana del Minvivienda, representante del prestador y Profesional de Fortalecimiento, en conjunto con profesionales de Contratista e Interventoría, al igual, se hicieron recorridos por viviendas intervenidas y registraron observaciones a subsanar.

En la tarde se realizó reunión con veeduría del proyecto donde se socializó las inquietudes e inconformidades de los beneficiarios y se les dio su correspondiente respuesta y justificación, contribuyendo así a mayor claridad de los procesos de intervención.
⇒ Clima: Parcialmente soleado

Ronald Arnedo
R. Interventoría

Ronald Blanco
R obra

Viernes 02 Septiembre / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- SISO
- 24 Maestros - 24 Ayudantes

- PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing. Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora social

→ ACTIVIDADES REALIZADAS -

↳ Se continuan trabajos de la Actividad 2, con el diligenciamiento de los formularios de diagnosticos, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias recapaón de doumentación y registro fotografico

4 Se continua con la ejecución de las actividades correspondiente ACTIVIDAD 3, se realizaron las sigtes:

- Levante de muro e instalación de tubería hidrosanitaria en lavadero estandar.
- Descopfrado de losa Para tanque
- Desmonte de ceramica en adecuación baño.
- Pañete en muros internos de baños
- Fundición de losa y viga para columna e instalación de tanque.
- Levante de muro de baño
- Armado de acero de refuerzo para columnas y columnetas
- Aplicación de pintura en soporte e instalación lavadero estandar en adecuación.

. Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
Residente Interventoría

Ronald Blanco
Residente Obra

Sabado 03 Septembre / 2022

=PERSONAL OBRA

- Ing. residente
- Ing. Diagnostico
- Trabajadera social
- SISO
- 24 Maestros -24 Ayudantes.

-PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS-

Se completaron los 217 diagnosticos aprobados cumpliendo con el total contemplado en el contrato. Actividad 2

- Se continua con la ejecución de la Actividad 3, donde se realizaron las siguientes actividades:
  - Excavación para tubería hidrosanitaria.
  - Pañete en muro externo e interno de baño
  - Excavación de caja de inspección
  - Fundición de Columnas para tanque en Casita Tipo 3.
  - Desmonte de equipos sanitarios en adecuación
  - Construcción de soporte para lavadero estandar.
  - Encofrado de losa para tanque
  - Armado de acero de refuerzo para elementos estructurales.
  - Instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, ducha y accesorios incrustados en baño.

Obs. Se remite de Int. a Construdes, revisión Informe Mensual #4

Estado del clima. soleado

Ronald Arneta
Residente Interventoria

Ronald Blanco
Residente obra

Lunes, 05 Septiembre/2022

= PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora Social
- 24 Maestro
- 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la ejecución de la Actividad 3, con las intervenciones en las viviendas de los beneficiarios con la excavación de la viga de cimentación, levante de mampostería, fundición de columnas y columnetas, fundición de losa para tanque elevado, Instalación de cubierta en fibrocemento, pañete en muros externos e internos de baños, construcción de soporte para lavaplatos y lavadero, Instalación de tubería Sanitaria, excavación de caja de Inspección y Fundición de las mismas.

Observación: - Se recibe mediante correo electrónico de Consorcio Constructores INFORME EJECUTIVO MENSUAL PTO (4) con las observaciones.
- Se recibe de COOPSECOR respuesta de Inclusions ARCA-INT/ENT/276-TEC-057-22

Estado del clima: Soleado

Ronald Arnica
Res. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Martes, 06 Septiembre/2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing Residente
  - Ing. Diagnostico
  - SISO
  - Trabajadora Social
  - 24 Maestros
  - 24 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
  - Arq. Residente
  - Ing Inspector
  - Trabajadora social

=> ACTIVIDADES REALIZADAS-

- Se continua con la ACTIVIDAD 3, ejecutando las actividades en las viviendas intervenidas con adecuación, Caseta tipo 2, Caseta Tipo 3 y Tipo 4, se realizaron:
  - Armado de acero de refuerzo para cimentación
  - Fundición de viga dintel
  - Encofrado de columna para tanque elevado
  - levantamiento de muros en baño y soporte de lavaplatos y lavadero
  - Pañete en muro
  - Instalación de tubería hidrosanitaria

↳ Se recibe de Consorcio constructor. ACTA DE SEGUIMIENTO HIS y ACTA DE SEGUIMIENTO #16, con firmas.

↳ Se recibe de Directora Interventoría Informe Semana N°19 con ajuste

→ Se envía de Gerencia para Entendido Con oficio GER98-E REMISION INFORME SEMANAL N°18.

↳ Se remite aval con fecha de 24 Agosto, informe P610#3. CCR-CORDOBA-2220576-2022-89

Estado del clima; Soleado

Ronald Arnedo
Res. Interventoria

Ronald Blanco.
R. Obra

Miercoles, 07 Septiembre/2022

= PERSONAL OBRA

- Ing Residente
- Ing. Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestros - 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing. Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora social

= ACTIVIDADES REALIZADAS.=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación de cimentación caseta Tipo 3
- levante de muro en bloque.
- Revoque con pañete en muros internos y externos
- Armado de acero de refuerzo para columna de tanque
- Armado de encofrado para losa de tanque
- Fundición de viga dintel.

↳ Se recepciona en Interventoría, por parte de Construredes mediante correo electronico, INFORME MENSUAL Nº 4 para revisión y aprobación con oficio CCR_CORD03A_222057G 2022_091.pdf

↳ Directora Interventoria remite a Construredes observaciones al Informe Mensual corregido Nº 2.

↳ Envío Interventoría a ENTerritorio F-66-09-V1 Acta de reunión Nº17 - 01 SEPT.

Estado del clima: soleado durante la jornada laboral.

Ronald Arrieta.
R. Interventoría

R. Obra

Jueves, 08 Septiembre /2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestros - 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la ejecución de la actividad 3, con las actividades de excavación de cimentación, armado de acero de refuerzo, encofrado de columna para tanque, levante de muro, construcción de soporte para lavaplatos y lavadero estándar.

- Envío en medio magnético de Interventoría a Contratista en oficio TEC 060-22 SOLICITUD ACCIONES PARA MITIGAR ATRASO para fines pertinentes.
- Se emite de parte de Interventoría la aprobación y aval de 20 diagnosticos presentados en cómite de aprobación 18. Con oficio TEC-061-22 RESPUESTA AL OFICIO CCR-CORDOBA_2220576-2022-092
- Se envia a la entidad supervisora INTERRITORIO, ACTA DE COMITE DE APROBACIÓN N°18, con oficio F-66-09 V1 mediante el cual se dieron aval para 20 diagnosticos.
- Se envia oficio TEC-062-22 Remisión solicitudes de inclusión remitido a Planeación Municipal.
- Se envia oficio TEC-063-22 Solicitud de certificación por parte de empresa COOPSEPCOR.

Estado climático: Lluvias Jornada vespertina.

Ronald Arrieta
R. Interventoría

R. Obra

Viernes, 09 Septiembre /2022.

= PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora Social
- 24 Maestros - 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing. Inspector
- Arq. Residente.
- Trabajadora social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3, con la ejecución de las labores de intervención en las viviendas beneficiadas con las siguientes actividades: levante de muro, fundición losa de tanque, armado de acero de refuerzo para viga dintel, excavación de caja de inspección, construcción de Soporte lavaplatos, aplicación de pintura en muros de caseta Tipo 3.

- Se envia de interventoría oficio TEC-064-22 SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- Se recepciona mediante medio magnético por parte de Consorcio Construredes oficio ACTA DE SEGUIMIENTO #17 para firmas pertinentes.

↳ Se realiza recorrido con Ing Inspector de interventoría para ensayos de presión, con manómetro para verificación de presiones en las intervenciones terminadas (10 viviendas)

↳ Se realiza el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN para el propietario de la vivienda B-C-SM-M224-VE-019.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

R. OBRA

Sábado, 10 Septiembre / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestros - 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Continua el desarrollo de la ACTIVIDAD 3, con la ejecución de la construcción de caseta TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4 y adecuaciones, se realizaron: Aplicación de pañete, armado de acero de refuerzo para columna de tanque, armado de encofrado de columnas y columnetas. Levante de muro, instalación de cubierta, instalación de tanque elevado.

·Se recibe primera parte de pedido de cerámica y se realiza la distribución en viviendas pendientes, para terminar la instalación de los equipos sanitarios.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

R. OBRA

Lunes, 12 Septiembre/2022

= PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social
- 30 Maestros - 30 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continúa con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3 con la realización de las intervenciones en las viviendas beneficiadas, dentro de las cuales se laboraron: Instalación de cerámica en piso y pared, encofrado de columna para estructura soporte de tanque, armado de acero para refuerzo de viga dintel, instalación de tanque elevado.

- Se recepciona respuesta de Construredes a oficio TEC-060-22, mediante oficio CCR-CORDOBA_2220576-2022-093
- Se recepciona respuesta de Construredes a oficio TEC-064-22, mediante oficio CCR-CORDOBA_2220576-2022-094
- Se recepciona mediante correo electrónico de parte de Consorcio Construredes informe N°2 correspondiente al mes de Junio para revisión y aprobación de la Interventoría.

Estado del clima: Leves lluvias en jornada de la mañana.

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

R. OBRA

Martes, 13 Septiembre /2022

- PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social
- 30 Maestros - 30 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continúa con el desarrollo de la Actividad 5. con el levantamiento de muros en bloque, construcción de soportes de lavadero estándar, instalación de lavaplatos, instalación de cerámica en piso y pared en viviendas con intervenciones terminadas, fundición de elementos estructurales como viga dintel, columnas y columnetas y losa de tanque elevado.

- Se envía de parte de Interventoría para INTERVENTORIO Informe semanal N°20 y anexos correspondientes al periodo 05 al 11 SEP-2022.
- Se envía oficio TEC-065-22 solicitud certificado de disponibilidad de redes a empresa COOSERCOR LTDA. De parte de Interventoría.
- Se envía oficio TEC-066-22 Solicitud programación de entrega de actas de recibo a satisfacción por parte Interventoría, dirigido a Consorcio CONSTEUREDES.
- Se recepciona mediante correo electrónico de Interventoría, respuesta a oficio TEC-056-22, Respuesta de Disponibilidad de redes por parte de COOSERCOR LTDA.
- Se recaba de Planeación Municipal respuesta de solicitudes de inclusión mediante OFI-SP-047-22 y OFI-SP-048-22

Estado del clima: LLUVIAS

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

R. OBRA

Miercoles, 14 Septiembre /2022

= PERSONAL OBRA

- Ing Diagnóstico
- Ing Residente
- SISO
- Trabajadora Social
- 30 Maestros
- 30 Ayudantes.

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3, con las intervenciones en las viviendas beneficiadas con la realización de: excavación de cajas de inspección, fundición de caja de inspección, instalación de tanque elevado, encofrado de losa tanque, pañete en muros externos e internos, fundición losa tanque, fundición plantilla en baño, levatamiento muros, excavación para tubería hidrosanitaria.

- Se envia de Interventoría ACTA COMITE DE OBRA N°18, realizada el día 07 Septiembre /2022. para ENTERRITORIO
- Se envia por Interventoría oficio TEC-069-22 REITERACION Solicitud acciones frente a atraso de obra. para Consorcio Construredes.
- Se envio de Profesional Socia Interventoría a Trabajadora social de Consorcio Construredes información generada SECOP II para revision y definición entrega a peticionario de compromiso adquiridos en Comite Veeduría (1 Septembre 2022)

→ Observación: Se suspendió y se encuentra a la espera de reprogramación del Comité de obra N°19 con corte al 11 SEP - 2022

Estado del clima: Lluvias

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

R. OBRA.

Viernes, 16 Septiembre /2022

=PERSONAL OBRA

- Ing Diagnóstico - Ing Residente
- SISO
- Trabajadora Social
- 30 Maestros - 30 Ayudantes

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing Inspector
- Arq residente
- Profesional Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS-

Se continúa con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, con el desarrollo de las labores entre las cuales se realizaron: Levantamiento. Soporte de lavadero estándar, enchape en pared y piso, formaleta en viga dintel caseta TIPO 3, armado de formaleta losa tanque, fundición losa tanque, pañete en muro internos y externo. instalación aparatos sanitarios.

- Se recibe subsanación del Informe N°3 mes julio por parte de Contratista, para revisión y aprobación Interventoría (Calidad)
- Se suben por parte de Contratista e Interventoría información solicitada en DRIVE - Intradomiciliarias - BARRIO SAN MARTIN.
- Se realiza Comité obra N° 19 con Interventoria, entidad supervisora, Interventoría y Contratista para socializar avances técnicos y sociales y se llegan a compromisos.

Estado del clima: soleado

Ronald Ameta
R. Interventoría

R. OBRA.

Sábado, 17 Septiembre/2022

= PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- SISO
- Ing. Diagnóstico
- Trabajadora Social
- 30 Maestros — 30 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =
Se continua con el desarrollo de la actividad 3, con las intervenciones en las viviendas beneficiadas según el tipo de intervención, caseta Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4 ó Adecuación, se realizaron las siguientes actividades: levantamiento de muro en bloque 0.09, levantamiento soporte de lavaplatos y lavadero estándar, instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones de pared, instalación cubierta, excavación de zanjas para tubería sanitaria.

↳ Se recepciona Acta de Reunión Nº 18-07 SEPT con oficio F-66-09-V1, enviado por parte de la supervisora con los ajustes y aprobación, para proceder con firmar.

Estado del clima: soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

R. OBRA.

Lunes 19, Septiembre /2022

=PERSONAL OBRA

- Ing Residente
- SISO
- Ing Diagnóstico
- Trabajadora social
- 30 Maestros - 30 Ayudantes.

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3. se continua ejecutando con las intervenciones en las viviendas beneficiadas con las siguientes actividades realizadas: Instalación de cerámica en piso y pared, excavación de cimentación de estructura soporte tanque elevado, construcción de soporte en bloque para lavaplatos y lavadero estándar.

↳ Se envia de Interventoría observaciones Informe Junio N°2 2022, para subsanacción por parte de contratista.

↳ Se recibe mediante correo electrónico oficio F-66-09-V1 Acta de reunion N°18-07 SEPT para recolección firmas, se envía a Consorcio Construredes.

↳ Se recepciona OFI-SP-067-22 por Planeación Municipal para Solicitud de documentación de ejecucion PCI Municipio Córdoba, Bol.

Estado del clima: Lluvias

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

R. OBRA.

Martes, 20 Septiembre /2022

=PERSONAL OBRA

- Ing Residente
- SISO
- Ing Diagnóstico
- Trabajadora Social
- 30 Maestros - 30 Ayudantes

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Sigue el desarrollo de la ACTIVIDAD 3 y ACTIVIDAD 4, con las acciones de intervención en viviendas beneficiadas, en consecuencia, se realiza levante de muro en caseta tipo 2, tipo 3, se realiza fundición de viga cintd, armado de acero de refuerzo, excavación de caja de inspección, instalación de aparatos sanitarios.

- Se envía F-66-09-V1 Acta Reunión N°19 - 16 SEPT a Interventoría
- Se envía Informe Semanal N°21 con anexos, a Supervisora.
- Se envía oficio TEC-069-22 Solicitud cumplimiento Compromisos a Contratista.
- Se envía Acta N°18 firmada a Supervisora.
- Se envía a Planeación Municipal oficio TEC-068-22 REMISION DE SOLICITUDES DE INCLUSIÓN para trámite a 4 solicitudes.

Estado del clima: Soleado

Ronald Amaya
R. Interventoría.

Ronald Blanco
Re. Obra.

Miercoles, 21 Septiembre / 2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing Residente
  - Ing Diagnóstico
  - SISO
  - Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA.
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua ejecutando la actividad 3, con las intervenciones en las unidades sanitarias de los beneficiados, bien sea con Casita Tipo 2, tipo 3, tipo 4 y adecuación, se realizaron: armado de formaleta para losa tanque, instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones de pared, fundición de caja de inspección, excavación de tubería hidráulica, fundición de columnas y columnetas, instalación tanque elevado 500 Lts.

- Se recibe por correo electrónico respuesta a oficio TEC-068-22 por parte de COOSEPCOR LTDA para solicitudes de inclusiones
- Se recibe por correo electrónico respiesta a oficio TEC-065-22 por parte de COOSEPCOR LTDA para solicitudes de inclusiones.
- Se recibe por correo electrónico de Directora interventoría el Acta comite N°18 aprobada por supervisión para diligenciar firmas.
- Se envía de interventoría F66-09-V1 Acta N°19-16 SEPT. para aprobación de supervisión

NOTA: Se reprograma Comité de obra N°20 para día 23/09/2022.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Jueves, 22 Septiembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA-
- Ing. Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA.
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3, se continúa desarrollando con las actividades de intervención en las viviendas, se realizaron: levantamiento de muro en bloque, armado de acero de refuerzo columnas y columnetas, enchape en pared y piso, instalación de aparatos sanitarios. pañete en muro interno y externo, excavación de zanja para tubería hidrosanitaria, fundición de caja de inspección.

- Se envía por Directora Interventoria ACTA SEGUIMIENTO #17 para diligenciamiento de Firmas por parte de Profesionales de supervisión, INTERVENTORIO.

Estado del clima: lluvias torrenciales

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra.

Viernes, 23 Septiembre | 2022

=PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la ejecución de las actividades correspondientes a las intrínsecas de las intervenciones, en la ACTIVIDAD 3.
Se realizaron: Colocación de cerámica en pared y piso, levantamiento de muros, fundición de columna para tanque elevado, pañete en muro externos e internos de unidades sanitarias, armado de formaleta para losa tanque, armado de acero de refuerso para elementos estructurales.

- Se envía a entidad Supervisora Interventoria, oficio IEC-025-22 Solicitud a prestador de servicio COOSEPCOR las especificaciones técnicas de redes de acueducto y alcantarillado.
- Se recibe por correo electrónico aprobación de informe semanal N°19 y N°20 por Interventoria y remitido para fines pertinentes.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Sábado, 24 September /2022

=PERSONAL OBRA

- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, con el desarrollo de las siguientes actividades: armado de formaleta viga dintel, Fundición viga dintel, instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones de pared, excavación cimentación para columna de tanque elevado, excavación y fundición de caja de inspección, Pañete en muros internos y externos en caseta tipo 3.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Lunes, 26 Septiembre /2022

=PERSONAL OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadera social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, con las intervenciones en las viviendas beneficiadas de acuerdo a los necesidades. Siendo Adecuación, Caseta tipo 2, Caseta tipo 3 y Tipo 4 Se realizaron las siguientes actividades; levante de muro, Fundición de columnas, instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones de pared., excavación y fundida de caja de inspección.

- Se envía a Directora Interventoría Informe Semanal N°22 y sus anexos respectivos.

Estado del clima: Nublado

Ronald Arneta.
R Interventoría.

Ronald Blanco.
R. Obra

Martes, 27 Septiembre /2022

= PERSONAL OBRA.
- Ing Residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente.
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continúa con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, se realizaron las siguientes actividades: instalación de cerámica de piso y pared., armado de Formaleta para columnas y columnetas, armado de acero de refuerzo para alimentación de tanque elevado, aplicación de pintura en unidades sanitarias., excavación y fundición de cajas de inspección, instalación de tubería para redes hidrosanitarias

- Se recepciona mediante correo electrónico oficio OFICIO CONSTRUREDES dirigido a contratista, emitido por Personería Municipal de Córdoba Bolivar.
- Se envía oficio TEC-070-22 emitido por Interventoría a COOSEPCOR. mediante el cual se remite solicitud de entrega ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONEX. DOMICILIARIAS.

Estado del clima: Nublado

Ronald Arrieta
R Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles, 28 Septiembre / 2022

=PERSONAL DE OBRA

- Director
- Ing Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Director Interventoría
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua la ejecución de la ACTIVIDAD 3, en los frentes de trabajo, donde se construyen Casita Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y Adecuación, según diagnóstico; las labors desempeñadas: armado de formaleta para columna, levante de muro, instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones de pared, instalación de cubierta y tanque elevado, fundición de viga dintel, fundición de calumnetas y columnas.

- Se realizó Comité de obra Nº 21, se contó con la presencia de Auditoría, Interventoría, entidad supervisora, Contratista Consorcio Constructores y prof. social e Interventoría. Se hizó un recorrido donde se visitaron 12 viviendas (Se encuentran con diagnostico ejecución y cubo a satisfacción). Se socializaron ejecuciones en cada intervención, cantidades de obra y registro fotográfico.

Estado del clima:

Ronald Arieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Jueves, 29 Septiembre /2022

=PERSONAL DE OBRA.

- Ing. Residente
- Ing. Diagnostico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Residente
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se desarrolla la ACTIVIDAD 3, con ejecución de Intervenciones en caseta Tipo 2, Tipo 3, Adecuación, Se realizaron las siguientes actividades: levante de muro para soporte de lavadero estándar, excavación para presta de tubería hidrosanitarias, armado y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales; viga dintel, columnas, losa tanque, cimentación.

Se reinician las labores correspondiente a la ACTIVIDAD 2 donde se realizaron diligenciamiento de formatos diagnósticos, registro fotográficos, levantamiento de planos arquitectonicos, recepción de documentos requeridos y trazados de redes hidrosanitarias.

Estado del clima:

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Viernes, 30 Septembre/2022

= PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional Social

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se desarolla las labores correspondientes a la ACTIVIDAD 3, donde se están ejecutando intervenciones, de acuerdo a las necesidades del beneficiario, de esta manera se construyen Casita tipo 2, tipo 3, tipo 4 y adecuación. Se realizaron: instalación de lavadero estándar, instalación de lavaplatos, pañete en soporte lavadero, instalación de tubería hidrosanitaria y puntos, fundición de viga dintel, armado de acero de refuerzo losa tanque, instalación de aparatos sanitarios, aplicación de pintura.

- Se envía mediante correo electrónico de Interventoría INFORME SEMANAL No 22 Y ANEXOS (19-26 SEP) a Interventoría para revisión y Vo.Bo.

Estado del clima:

Ronald Arrieta
R Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

enterritorio	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2020 Y EL 30/09/2022 PLAZO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO																															
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
RONAL BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**TOTAL PERIODO** 130

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región																															0	0,00%	
RODOLFO JOSE TORRES ANAYA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
YOVANNI CHAMORRO FLOREZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
JULIO SANCHEZ BLANCO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
ERIS ALFONSO HERNANDEZ ESCOBAR	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
CRISTIAN GARIZAO FLOREZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	24	18,46%	
CARLOS JOSE ESCOBAR PIÑA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
JESUS MANUEL VALETH ANDRADE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
WALBERTO GUETTE PACHECO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
ROBERTO ENRIQUE BRITO APIAYU	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
RAFAEL ISIDRO PACHECO HORTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
LUIS EDUARDO MEDINA FONTALVO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
CRISTIAN JOSE PACHECO PEREA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0	0		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	22	16,92%	
HERIBERTO VALENCIA PEREZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
																															0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																															**0**	**0,00%**	
De la región																															0	0,00%	
DONAIRO ALFONSO ESCOBAR ROMERO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
YULDOR VERGARA TOREES	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	25	19,23%	
YEISON ESCOBAR VERGARA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
JESUS ESCOBAR VERGARA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
JOSE LUIS AHUMADA MARTINEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
ALEXI CORDOBA CUESTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
JHON JEIDER SANCHEZ GOMEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	19	14,62%	
MAICOL RIOS ARANGO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
CRISTIAN PACHECO HORTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
PEDRO PABLO GOMEZ DOMINGUEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	
TOMAS DE AVILA ROJANO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	20,00%	

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2020 Y EL 30/09/2022 PLAZO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PROFESIONALES - TÉCNICOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
De la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
MUJERES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
PROVEEDORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2022 Y EL 30/09/2022 PLAZO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	MES: 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022																													OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NOMBRE Y CARGO																															
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Resaltados en rojo lo dias Domingo
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
MARIELIS OCHOA- INSPECTORA DE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
PERSONAL INTERVENTORIA	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**TOTAL PERIODO**	**156**

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

Firma: Marcy A. Correa C.

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL 19

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-105-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 19.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 19 correspondiente al periodo del 29 de agosto del 2022 al 04 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 5/10/2022
HORA: 7:54:42 a. m.
20224300373712

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 25 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3			

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$	1.771.707.945,99	
Valor actual	$	1.771.707.945,99	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	131		87,33%
Días remanentes del Contrato	22,00		14,67%
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 751.461.410,07		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$	202.479.313,00	
Valor actual	$	202.479.313,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	131		87,33%
Días remanentes del Contrato	22,00		14,67%
Acumulado a última acta pagada	$	32.396.690,09	
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 25 Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.166.770.861,14	65,86%	$ 916.327.349,67	51,72%	-$ 250.443.511,47	-14,14%
Durante el Periodo	$ 175.113.366,56	9,88%	$ 132.126.936,25	7,46%	-$ 42.986.430,31	-2,43%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.341.884.227,70**	**75,74%**	**$ 1.048.454.285,92**	**59,18%**	**-$ 293.429.941,79**	**-16,56%**


Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 75,74% frente a un ejecutado del 59,18% indicándonos un atraso de 16,56%


De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 17 el contratista el contratista se comprometió entregar 15 diagnósticos más producto de inclusiones para día martes 06 de septiembre.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 146 viviendas, de las cuales se han terminado 101 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

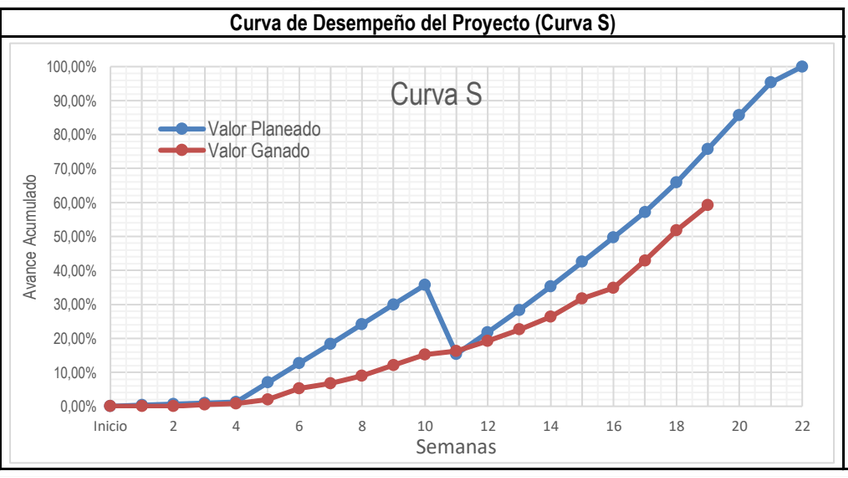

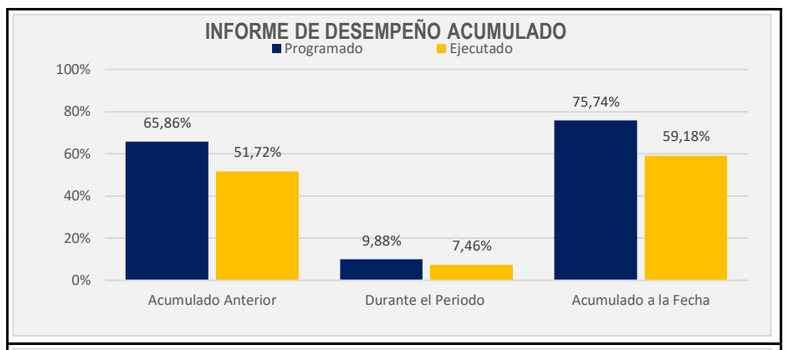

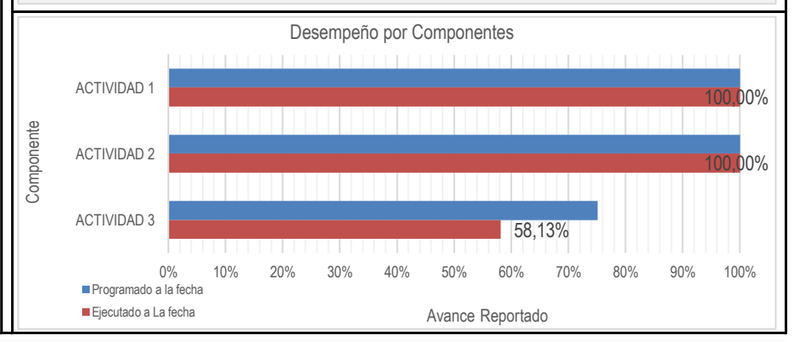


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	65,86%	51,72%	-14,14%	
Durante el Periodo	9,88%	7,46%	-2,43%	
Acumulado a la Fecha	**75,74%**	**59,18%**	**-16,56%**	

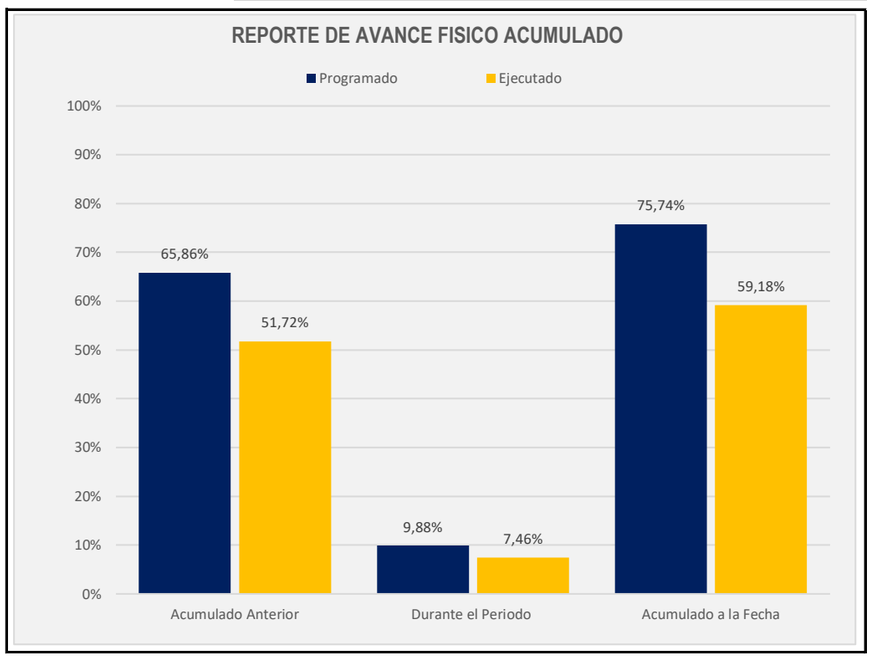


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1		0,00%		










AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 48.595.036,13	24,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 29/08/2022 al 4/09/2022 Fecha 4/09/2022

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítem debería estar con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del 22 al 28 de agosto se hicieron 14 aprobaciones de diagnósticos, completando 217, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, quedando pendiente por aprobación los diagnósticos de inclusiones hasta agotar el monto presupuestal del contrato.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 75,12% vs 58,13% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 16,99%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 146 viviendas de las cuales solo 101 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 45 más, el contratista cuenta con 24 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual de la actividad N° 3.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 152 viviendas terminadas, y se han intervenido 146 viviendas, de las cuales solo 101 están terminadas indicándonos un atraso de 51. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 05 al 11 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista debe seguir presentado los diagnósticos de las inclusiones para aprobación hasta que se agote la totalidad del monto presupuestal del contrato.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 174 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	27	5	32	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**27**	**5**	**32**	**100,00%**

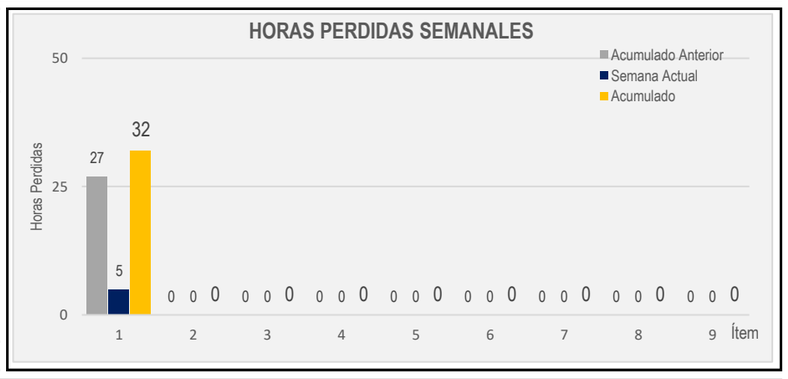

OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias torrenciales el día 30 de agosto 2022 (se adjunta rporte climatologico).

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	1/09/2022	Alcaldia Municipal	19,00	• Visitar al señor Cristóbal Anaya beneficiario del PCI. • Imprimir los documentos del Secop II para hacer entrega al señor Orlando Teherán Peticionario (N°136).	CONTRATISTA	
	2/09/2022	Barrio San martin	14,00	Almacenar, manipular, y hacer uso adecuado del agua potable, el uso adecuado del alcantarillado sanitario, el cuidado de los equipos y recomendaciones generales.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 213	ZAIDA MEDINA FONSECA	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 214	ENILDA ZUÑIGA DE HERRERA	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 215	FRANCISCO MEDINA RODRIGUEZ	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 216	OLIMPA MUÑOZ SANCHEZ	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 217	JASNARIS CHAMORRO BECERRA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 218	MISAEL YEPEZ SUAREZ	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-055-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_083 mediante el cual realizamos entrega de aval para 10 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 016.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-056-22 con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SETENTA Y SEIS (76) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-057-22 con el asunto remisión para su debido tramite de Setenta y seis (76) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-058-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_088 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 017.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-059-22 con el asunto SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No. 3. Mediante el cual requerimos la entrega del informe mensual No. 3 correspondiente al mes de julio 2022 y el cual se debió radicar a la interventoría la primera semana del mes de agosto, el llamado es para cumplir con los tiempos establecidos dado que la interventoría debe revisar el informe antes que este sea radicado en la entidad Enterritorio supervisora del proyecto.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	SI	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	18-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22	NO	NO	23-ago-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	21/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	216	210	134	0	76	110	24	51	0	33	0	217	238	29	220	1	146	101	0	45	152
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**216**	**210**	**134**	**0**	**76**	**110**	**24**	**51**	**0**	**33**	**0**	**217**	**238**	**29**	**220**	**1**	**146**	**101**	**0**	**45**	**152**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/08/2022 Y EL 4/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 04/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		X
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		X
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		X
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		X
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		X
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		X
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		X
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		X
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X

SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**

SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	90%	Caseta t3	$8.339.015,83	$7.505.114,25	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	90%	Adecuacion	$7.760.503,36	$6.984.453,02	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	90%	Caseta t2	$8.292.567,48	$7.463.310,73	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	90%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.123.180,33	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	90%	Adecuacion	$7.419.892,36	$6.677.903,12	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	90%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.162.273,24	28/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	90%	Adecuacion	$8.011.976,60	$7.210.778,94	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	90%	Adecuacion	$9.653.914,02	$8.688.522,62	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	90%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.161.606,64	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	90%	Adecuacion	$9.325.691,25	$8.393.122,13	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	90%	Adecuacion	$7.000.723,74	$6.300.651,37	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	90%	Caseta t3	$8.259.418,86	$7.433.476,97	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	90%	Adecuacion	$7.334.345,73	$6.600.911,16	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	90%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.037.729,55	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	90%	Caseta t3	$8.116.195,29	$7.304.575,76	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	80%	Caseta t3	$6.887.962,53	$5.510.370,02	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	80%	Caseta t3	$7.841.298,86	$6.273.039,09	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	80%	Caseta t2	$7.814.305,69	$6.251.444,55	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	80%	Caseta t4	$9.602.086,12	$7.681.668,90	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	80%	Caseta t3	$8.240.626,46	$6.592.501,17	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	80%	Caseta t2	$8.314.938,30	$6.651.950,64	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	80%	Adecuacion	$7.662.197,96	$6.129.758,37	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	80%	Caseta t4	$8.665.155,76	$6.932.124,61	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	80%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	**TERMINADA**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	70%	Adecuacion	$6.476.015,92	$4.533.211,14	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	70%	Adecuacion	$6.842.321,91	$4.789.625,34	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	130	B-C-SM-MZ92-VE-170	70%	Adecuacion	$6.456.971,29	$4.519.879,90	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	131	B-C-SM-MZ91-VE-171	70%	Adecuacion	$7.013.453,53	$4.909.417,47	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	132	B-C-SM-MZ75-VE-172	70%	Adecuacion	$8.210.038,73	$5.747.027,11	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	133	B-C-SM-MZ-VE56-192	70%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.047.394,22	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	10	134	B-C-SM-MZ33-VE-194	70%	Adecuacion	$7.097.058,66	$4.967.941,06	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	60%	Adecuacion	$7.943.448,36	$4.766.069,02	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	60%	Adecuacion	$7.982.813,63	$4.789.688,18	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	60%	Adecuacion	$7.475.616,81	$4.485.370,09	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	60%	Adecuacion	$7.034.505,34	$4.220.703,20	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	60%	Adecuacion	$5.856.785,90	$3.514.071,54	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	60%	Caseta t3	$8.204.915,74	$4.922.949,44	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	60%	Caseta t3	$7.853.199,32	$4.711.919,59	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	60%	Adecuacion	$8.272.491,16	$4.963.494,70	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	60%	Adecuacion	$6.742.842,11	$4.045.705,27	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	60%	Adecuacion	$6.326.983,38	$3.796.190,03	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	25%	Adecuacion	$7.415.421,93	$1.853.855,48	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	25%	Adecuacion	$7.430.942,29	$1.857.735,57	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	25%	Adecuacion	$3.514.863,97	$878.715,99	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM		148														
SM		149														
SM		150														
SM		151														
SM		152														
SM		153														
SM		154														
SM		156														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	37,33%	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**70,05%**	**152**	**$ 1.209.874.169,22**		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**46,54%**	**101**	**$ 770.397.786,44**		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 04-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	2
20	1	1	2
21	1	1	2
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
TOTAL	**24**	**24**	**45**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 30 de agosto, 2022

	Hoy 29 AGO	Mañana 30 AGO	Miércoles 31 AGO	Jueves 01 SEP	Viernes 02 SEP	Sábado 03 SEP	Domingo 04 SEP
Hora	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 25°
08:00	27°	25°	25°	25°	25°	26°	26°
14:00	32°	30°	30°	31°	31°	31°	31°
20:00	26°	26°	25°	26°	26°	26°	26°
Lluvia	1.1 mm	3.4 mm	10.8 mm	5.4 mm	7.2 mm	5.7 mm	5.2 mm
Viento	← 11 km/h	↑ 10 km/h	↑ 8 km/h	↑ 8 km/h	↑ 9 km/h	↘ 8 km/h	↘ 6 km/h
	05:51	05:51	05:50	05:50	05:50	05:50	05:50
	18:09	18:09	18:08	18:08	18:07	18:06	18:06

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28°	29°	30°	31°	32°	32°	32°	31°	30°	27°	26°	26°	26°	25°	25°

INFORME SEMANAL 20

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 4/10/2022
HORA: 5:21:22 p. m.
20224300373512

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-106-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 20.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 20 correspondiente al periodo del 05 de septiembre del 2022 al 11 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 25 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** | Fecha **11/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	138 — 92,00%
Días remanentes del Contrato	15,00 — 10,00%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 879.693.196,08

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	138 — 92,00%
Días remanentes del Contrato	15,00 — 10,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 32.396.690,09
Estimado ejecutado por llevar a acta	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.341.884.227,70	75,74%	$ 1.048.496.762,44	59,18%	-$ 293.387.465,26	-16,56%
Durante el Periodo	$ 175.113.366,64	9,88%	$ 119.889.826,24	6,77%	-$ 55.223.540,40	-3,12%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.516.997.594,34**	**85,62%**	**$ 1.168.386.588,68**	**65,95%**	**-$ 348.611.005,66**	**-19,68%**

Desviación en días: 30 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 85,25% frente a un ejecutado del 65,95% indicándonos un atraso de 19,68%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 162 viviendas, de las cuales se han terminado 116 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

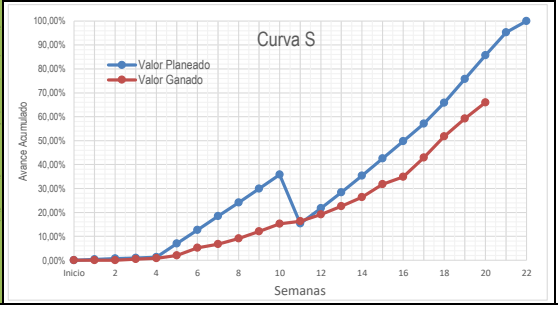




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	75,74%	59,18%	-16,56%	
Durante el Periodo	9,88%	6,77%	-3,12%	
Acumulado a la Fecha	**85,62%**	**65,95%**	**-19,68%**	

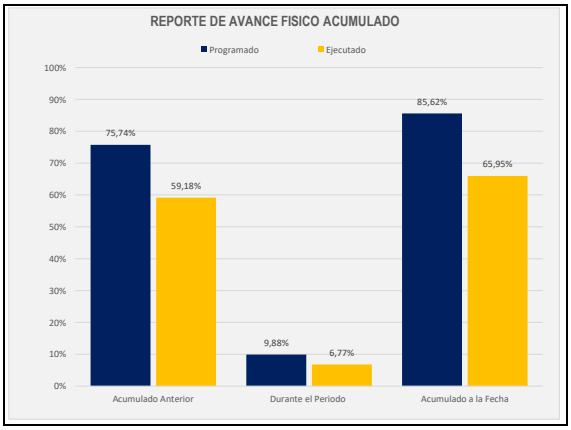


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1		0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 48.595.036,13	24,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 85,62% vs 65,95% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 162 viviendas, de las cuales se han terminado 116 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 174 viviendas terminadas, y se han intervenido 162 viviendas, de las cuales solo 116 están terminadas indicándonos un atraso de 58. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 12 al 18 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un informe indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 196 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

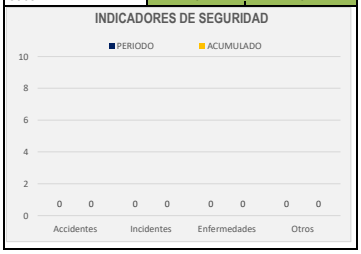

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	32	5	37	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	0	0	0	0,0%
	Total	**32**	**5**	**37**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales el dia 08 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	9/09/2022	Alcaldia Municipal	3,00	• Publicar informacion del Link del Programa en la pagina oficial del municipio o del prestador.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 219	BETILDA MARTINEZ SANABRIA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 220	DOLCEY JOSE MORALES OCHOA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 221	ALVARO MARTINEZ OCHOA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 222	DEISY ROMERO ALVAREZ	7/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 223	ENILDA AAHUMADA DE TORRES	7/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-059-22 con el asunto SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No. 3. Mediante el cual requerimos la entrega del informe mensual No. 3 correspondiente al mes de julio 2022 y el cual se debió radicar a la interventoría la primera semana del mes de agosto, el llamado es para cumplir con los tiempos establecidos dado que la interventoría debe revisar el informe antes que este sea radicado en la entidad Enterritorio supervisora del proyecto.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-060-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA. Donde se indica que de acuerdo a los avances de obra registrados la proyección de intervenciones terminadas por semana es entre 10 y 12 viviendas, cifra que es muy baja frente a las metas establecidas en la reprogramación de obra y lo que NO permitirá cumplir con el objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas necesarias y las cuales se han venido solicitando por parte de la Interventoría y La Supervisión desde hace varias semanas.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-061-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_092 mediante el cual realizamos entrega de aval para 20 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 018.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN. se remite para su debido tramite Nueve (9) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22 con el asunto SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	SI	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE	18-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22	SI	NO	23-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22	NO	NO	
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**		Coopsercor	8-sep-22	NO	NO	

INFORME PCI

Fecha de Corte	12/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	221	210	134	9	85	110	24	49	0	49	0	237	236	29	236	1	162	116	0	45	174		
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**221**	**210**	**134**	**9**	**85**	**110**	**24**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**162**	**116**	**0**	**45**	**174**		

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5/09/2022 Y EL 11/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 11/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x

SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	**TERMINADA**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	**TERMINADA**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	95%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.543.564,40	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	95%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.449.233,92	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	95%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.423.590,41	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	95%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.121.981,81	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	95%	Caseta t3	$8.240.626,46	$7.828.595,14	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	95%	Caseta t2	$8.314.938,30	$7.899.191,39	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	95%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.279.088,06	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	95%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.231.897,97	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	95%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	**TERMINADA**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	90%	Adecuacion	$6.476.015,92	$5.828.414,33	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	90%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.158.089,72	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	130	B-C-SM-MZ92-VE-170	90%	Adecuacion	$6.456.971,29	$5.811.274,16	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	131	B-C-SM-MZ91-VE-171	90%	Adecuacion	$7.013.453,53	$6.312.108,18	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	132	B-C-SM-MZ75-VE-172	90%	Adecuacion	$8.210.038,73	$7.389.034,86	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	133	B-C-SM-MZ-VE56-192	90%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.632.363,99	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	134	B-C-SM-MZ33-VE-194	90%	Adecuacion	$7.097.058,66	$6.387.352,79	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	85%	Adecuacion	$7.943.448,36	$6.751.931,11	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	85%	Adecuacion	$7.982.813,63	$6.785.391,59	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	85%	Adecuacion	$7.475.616,81	$6.354.274,29	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	85%	Adecuacion	$7.034.505,34	$5.979.329,54	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	85%	Adecuacion	$5.856.785,90	$4.978.268,02	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	85%	Caseta t3	$8.204.915,74	$6.974.178,38	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	85%	Caseta t3	$7.853.199,32	$6.675.219,42	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	85%	Adecuacion	$8.272.491,16	$7.031.617,49	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	85%	Adecuacion	$6.742.842,11	$5.731.415,79	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	85%	Adecuacion	$6.326.983,38	$5.377.935,87	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	65%	Adecuacion	$7.415.421,93	$4.820.024,25	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	65%	Adecuacion	$7.430.942,29	$4.830.112,49	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	65%	Adecuacion	$3.514.863,97	$2.284.661,58	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	65%	Adecuacion	$6.179.740,71	$4.016.831,46	2/09/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	65%	Caseta t4	$7.498.669,53	$4.874.135,19	2/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	55%	Caseta t3	$7.576.542,11	$4.167.098,16	3/09/2022	**EN EJECUCION**	**11/09/2022**	17/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	55%	Adecuacion	$7.730.411,89	$4.251.726,54	3/09/2022	**EN EJECUCION**	**8/09/2022**	14/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	55%	Adecuacion	$5.774.463,33	$3.175.954,83	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	55%	Caseta t3	$8.311.308,81	$4.571.219,85	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	55%	Adecuacion	$8.337.864,77	$4.585.825,62	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	55%	Caseta t3	$8.081.818,61	$4.445.000,24	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**14/09/2022**	20/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	55%	Adecuacion	$5.575.323,64	$3.066.428,00	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**11/09/2022**	17/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	55%	Caseta t4	$8.310.190,06	$4.570.604,53	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**14/09/2022**	20/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	55%	Adecuacion	$7.966.932,81	$4.381.813,05	7/09/2022	**EN EJECUCION**	**12/09/2022**	18/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	55%	Adecuacion	$4.519.608,59	$2.485.784,72	7/09/2022	**EN EJECUCION**	**12/09/2022**	18/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	55%	Adecuacion	$5.427.357,42	$2.985.046,58	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	45%	Adecuacion	$6.068.174,04	$2.730.678,32	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	45%	Caseta t3	$8.084.933,32	$3.638.219,99	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**16/09/2022**	22/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	45%	Caseta t3	$7.828.052,76	$3.522.623,74	9/09/2022	**EN EJECUCION**	**18/09/2022**	24/09/2022	9	**15**	**-6**		**X**
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	45%	Caseta t2	$4.292.672,67	$1.931.702,70	10/09/2022	**EN EJECUCION**	**20/09/2022**	26/09/2022	10	**16**	**-6**		**X**
SM		165														
SM		166														
SM		167														
SM		168														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	37,33%	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	70,05%	152	$ 1.209.874.169,22		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**80,18%**	**174**	**$ 1.384.987.535,82**		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**0,00%**	**0**	**$ -**		$ -	**2,51%**	**$ 44.453.375,46**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 11-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
TOTAL	**27**	**27**	**45**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 08 de septiembre, 2022

	Hoy 07 SEP	Mañana 08 SEP	Viernes 09 SEP	Sábado 10 SEP	Domingo 11 SEP	Lunes 12 SEP	Martes 13 SEP
Hora	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°
08:00	26°	26°	26°	26°	25°	25°	25°
14:00	29°	30°	31°	31°	29°	30°	31°
20:00	25°	25°	25°	25°	24°	25°	25°
Lluvia	14.3 mm	3.4 mm	4.9 mm	4.3 mm	15.1 mm	8.6 mm	4.9 mm
Viento	8 km/h	12 km/h	11 km/h	9 km/h	11 km/h	9 km/h	7 km/h
	05:50	05:50	05:50	05:50	05:50	05:49	05:49
	18:04	18:03	18:03	18:02	18:02	18:01	18:00

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: **Mañana:**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01
29°	29°	29°	29°	28°	28°	27°	26°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	24°

INFORME SEMANAL 21

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 5/10/2022
HORA: 8:58:12 a. m.
20224300373962

ADMON

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-107-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 21.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 21 correspondiente al periodo del 12 de septiembre del 2022 al 18 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 22 folios
Proyectó: Leydi Bibiana Castaño-Asistente Administrativa
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** | Fecha **18/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	145	96,67%
Días remanentes del Contrato	8,00	5,33%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.026.342.899,26

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Ejecución del Contrato	145	96,67%
Días remanentes del Contrato	8,00	5,33%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.516.997.594,34	85,62%	$ 1.168.441.390,38	65,95%	-$ 348.556.203,96	-19,67%
Durante el Periodo	$ 171.133.517,51	9,66%	$ 101.776.101,45	5,74%	-$ 69.357.416,06	-3,91%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.688.131.111,85**	**95,28%**	**$ 1.270.217.491,83**	**71,69%**	**-$ 417.913.620,02**	**-23,59%**

Semáforo

Desviación en días: 35 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un avance del 95,28% frente a un ejecutado del 71,69% lo cual representa un atraso de 23,59%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, esto indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 196 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 183 viviendas, de las cuales se han terminado 137 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución de las demás viviendas

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

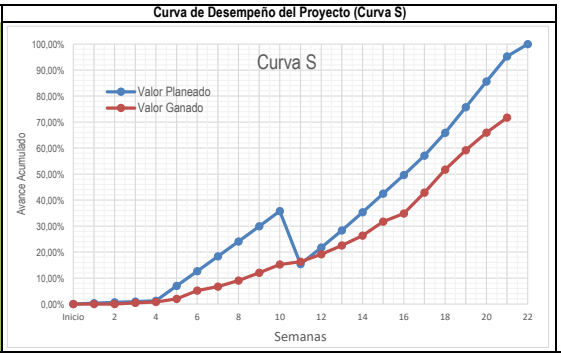

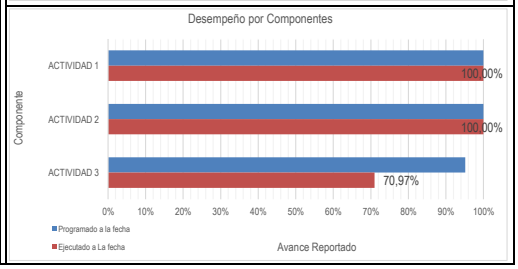


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	85,62%	65,95%	-19,67%	
Durante el Periodo	9,66%	5,74%	-3,91%	
Acumulado a la Fecha	**95,28%**	**71,69%**	**-23,59%**	

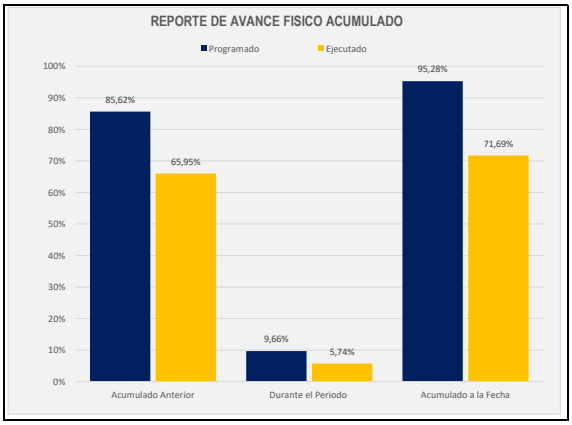

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 85,62% vs 65,95% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 196 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 183 viviendas, de las cuales se han terminado 137 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 196 viviendas terminadas, y se han intervenido 183 viviendas, de las cuales solo 137 están terminadas indicándonos un atraso de 59. El contratista tiene en ejecución 46 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 19 al 26 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un reporte indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra, para lo cual dará inicio a la ejecución de las demás viviendas pendientes para completar la meta contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	37	6	43	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**37**	**6**	**43**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales los dias 13 y 14 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 224	OLGA BECERRA PUERTA	13/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 225	YUBELIS VERGARA GUERRA	13/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
PQR 226	FIDELIA JOSEFA RAMOS RODRIGUEZ	13/09/2022	PQRS	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE , LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN. se remite para su debido tramite Nueve (9) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22 con el asunto SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 12/09/2022 al 18/09/2022 Fecha 18/09/2022

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	19/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																											
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	223	219	219	4	4	169	50	49	0	49	0	237	236	29	236	1	183	137	0	46	196
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**223**	**219**	**219**	**4**	**4**	**169**	**50**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**183**	**137**	**0**	**46**	**196**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/09/2022 Y EL 18/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÓN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 18/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	95%	Caseta t3	$8.204.915,74	$7.794.669,95	30/08/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	95%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.460.539,35	30/08/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	95%	Adecuacion	$8.272.491,16	$7.858.866,60	30/08/2022	EN EJECUCION	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	95%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.405.700,00	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	95%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.010.634,21	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	85%	Adecuacion	$7.415.421,93	$6.303.108,64	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	85%	Adecuacion	$7.430.942,29	$6.316.300,95	1/09/2022	EN EJECUCION	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	85%	Adecuacion	$3.514.863,97	$2.987.634,37	1/09/2022	EN EJECUCION	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	85%	Adecuacion	$6.179.740,71	$5.252.779,60	2/09/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	85%	Caseta t4	$7.498.669,53	$6.373.869,10	2/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	75%	Caseta t3	$7.576.542,11	$5.682.406,58	3/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	75%	Adecuacion	$7.730.411,89	$5.797.808,92	3/09/2022	EN EJECUCION	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	75%	Adecuacion	$5.774.463,33	$4.330.847,50	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	75%	Caseta t3	$8.311.308,81	$6.233.481,61	5/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	75%	Adecuacion	$8.337.864,77	$6.253.398,58	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	75%	Caseta t3	$8.081.818,61	$6.061.363,96	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	75%	Adecuacion	$5.575.323,64	$4.181.492,73	6/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	75%	Caseta t4	$8.310.190,06	$6.232.642,55	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	75%	Adecuacion	$7.966.932,81	$5.975.199,61	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	75%	Adecuacion	$4.519.608,59	$3.389.706,44	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	75%	Adecuacion	$5.427.357,42	$4.070.518,07	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	75%	Adecuacion	$6.068.174,04	$4.551.130,53	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	75%	Caseta t3	$8.084.933,32	$6.063.699,99	8/09/2022	EN EJECUCION	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	75%	Caseta t3	$7.828.052,76	$5.871.039,57	9/09/2022	EN EJECUCION	18/09/2022	24/09/2022	9	15	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	75%	Caseta t2	$4.292.672,67	$3.219.504,50	10/09/2022	EN EJECUCION	20/09/2022	26/09/2022	10	16	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	55%	Adecuacion	$4.772.651,25	$2.624.958,19	11/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	11	17	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	55%	Adecuacion	$8.212.157,27	$4.516.686,50	11/09/2022	EN EJECUCION	23/09/2022	29/09/2022	12	18	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	55%	Caseta t3	$7.989.636,90	$4.394.300,30	12/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	13	19	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	55%	Caseta t3	$8.084.933,32	$4.446.713,33	12/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	14	20	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	55%	Adecuacion	$7.503.681,08	$4.127.024,59	13/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	15	21	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	55%	Adecuacion	$6.068.174,04	$3.337.495,72	13/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	16	22	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	55%	Adecuacion	$8.298.564,37	$4.564.210,40	14/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	17	23	-6		x
SM	13	177	B-C-SM-MZ66-VE-065	55%	Caseta t3	$7.828.052,76	$4.305.429,02	14/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	18	24	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ66-VE-066	55%	Adecuacion	$4.292.672,67	$2.360.969,97	15/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	19	25	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ75-VE-070	55%	Adecuacion	$4.222.499,91	$2.322.374,95	15/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	20	26	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-078	55%	Adecuacion	$5.110.794,97	$2.810.937,23	16/09/2022	EN EJECUCION	7/10/2022	13/10/2022	21	27	-6		x
SM	12	181	B-C-SM-MZ34-VE-119	55%	Adecuacion	$7.021.881,94	$3.862.035,07	16/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	22	28	-6		x
SM	11	182	B-C-SM-MZ56-VE-190	55%	Adecuacion	$7.154.236,55	$3.934.830,10	17/09/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	23	29	-6		x
SM	14	183	B-C-SM-MZ56-VE-191	55%	Caseta t3	$8.896.139,02	$4.892.876,46	17/09/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	24	30	-6		x
SM	13	184	B-C-SM-MZ31-VE-199	55%	Adecuacion	$4.691.093,17	$2.580.101,24	18/09/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	25	31	-6		x
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**63,13%**	**137**	**$ 1.727.254.570,53**		$ -	100,00%	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	63,13%	137					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 18-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**46**

REPORTE DE CLIMA

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

miércoles 14 de septiembre, 2022

	Hoy 13 SEP	Mañana 14 SEP	Jueves 15 SEP	Viernes 16 SEP	Sábado 17 SEP	Domingo 18 SEP	Lunes 19 SEP
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°
08:00	25°	26°	26°	25°	25°	25°	25°
14:00	30°	31°	30°	29°	30°	28°	28°
20:00	26°	26°	25°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	3.2 mm	2.3 mm	8.4 mm	10.3 mm	10 mm	15.3 mm	20.1 mm
Viento	↑ 8 km/h	↑ 10 km/h	↑ 9 km/h	↑ 10 km/h	↘ 7 km/h	↓ 7 km/h	↘ 7 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49
	18:00	18:00	17:59	17:58	17:58	17:57	17:57

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: **Mañana:**

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02
29°	30°	30°	30°	29°	28°	27°	26°	26°	26°	25°	25°	25°	25°	24°

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 13 de septiembre, 2022

	Lunes 12 SEP	Hoy 13 SEP	Mañana 14 SEP	Jueves 15 SEP	Viernes 16 SEP	Sábado 17 SEP	Domingo 18 SEP
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 25°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°
08:00	--	25°	26°	26°	25°	25°	25°
14:00	--	30°	32°	30°	30°	30°	29°
20:00	26°	26°	26°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	7.4 mm	5.3 mm	0.9 mm	6.4 mm	17.4 mm	16.1 mm	9.7 mm
Viento	↑ 6 km/h	↙ 11 km/h	↑ 11 km/h	↑ 9 km/h	↘ 9 km/h	↘ 11 km/h	↑ 7 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49
	18:01	18:00	18:00	17:59	17:58	17:58	17:57

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: 22	23	Mañana: 00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25°	25°	25°	25°	24°	24°	24°	24°	24°	24°	25°	26°	26°	27°	29°
↓	↙	↖	↑	↗	↗	↗	↗	↑	↑	↑	↑	↑	↑	←

INFORME SEMANAL 22

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 6/10/2022
HORA: 3:40:02 p. m.
20224300376892

ADMON

Bogotá D.C, 06 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-108-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Contrato de Interventoría N° 2220587
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENterritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20Bogotá.
Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 22.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 22 correspondiente al periodo del 19 de septiembre del 2022 al 25 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 19 foliosProyectó: Leydi Bibiana Castaño-Asistente Administrativa
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** | Fecha **26/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.119.057.724,53

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Ejecución del Contrato	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.688.131.111,85	95,28%	$ 1.270.137.426,48	71,69%	-$ 417.993.685,37	-23,59%
Durante el Periodo	$ 83.576.834,14	4,72%	$ 85.169.095,71	4,81%	$ 1.592.261,57	0,09%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.771.707.945,99**	**100,00%**	**$ 1.355.306.522,19**	**76,50%**	**-$ 416.401.423,80**	**-23,50%**

Semáforo

Desviación en días: 35 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra correspondiente al contrato inicial el seguimiento nos indica un avance del 100% frente a un ejecutado del 76,50% lo cual representa un atraso de 23,50%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, esto indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución de las demás viviendas las cuales ya tienen parte del material.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

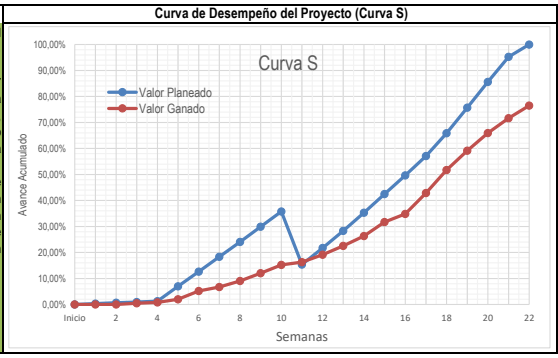

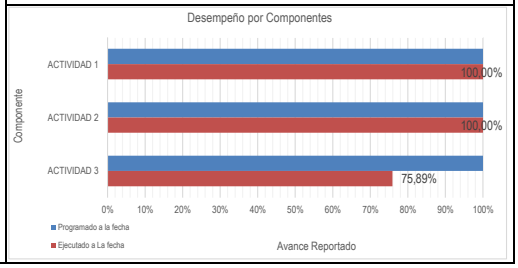


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	95,28%	71,69%	-23,59%	
Durante el Periodo	4,72%	4,81%	0,09%	
Acumulado a la Fecha	**100,00%**	**76,50%**	**-23,50%**	

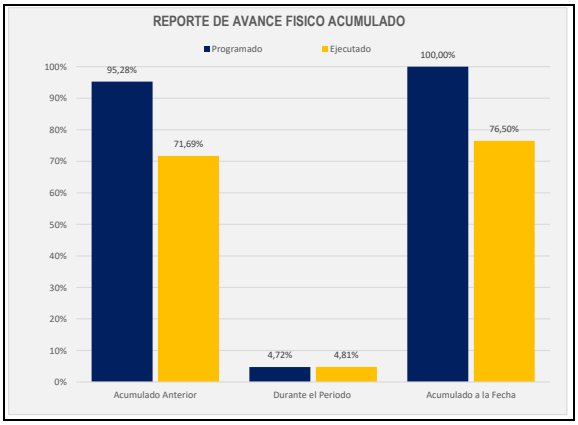

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 100% vs 75,89% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra del contrato inicial debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las ultimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
La Entidad se encuentra formalizando la prórroga y adición al contrato de obra por el 50% del valor inicial y 2.5 meses, tiempo en el cual se ejecutarán otras 108 viviendas aproximadamente, paralelamente a la ejecución de estas nuevas viviendas el Contratista deberá ponerse al día con las viviendas que hacen parte del objeto inicial, es decir, las 217 viviendas de matriz más las 20 de inclusión que se aprobaron teniendo en cuenta que el promedio de intervención fue menor al estimado inicialmente se completa así 237, por tal motivo se solicitó al contratista la reprogramación total del proyecto, incluyendo la adición que esta en proceso, para lo cual el contratista se comprometió a vincular más personal de otra obra que están terminando en la zona y a presionar para la entrega oportuna de materiales.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra del contrato inicial se debería tener 217 viviendas terminadas, y se han intervenido 197 viviendas, de las cuales solo 149 están terminadas indicándonos un atraso de 68 viviendas por terminar para completar las 217. El contratista tiene en ejecución 48 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un reporte indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.En atención a la prórroga al Contrato de obra, el contratista deberá continuar con la ejecución de los diagnósticos para identificar las 108 nuevas viviendas a intervenir.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra, para lo cual dará inicio a la ejecución de las demás viviendas pendientes para completar la meta contractual. Adicionalmente, dede ir preparando la logística y los recursos necesarios para dar inicio a las nuevas viviendas que se adicionaron para la actividad N° 3, aproximadamente 108 viviendas


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	43	8	51	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**43**	**8**	**51**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales los dias 19 y 22 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A				

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Cuatro (4) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22 con el asunto SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA por medio del cual solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.
- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

	Marcy A. Correa C		
	Firma		**Firma**
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22	SI	SI	13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**			8-sep-22	SI		13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-068	20-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	20-sep-22	SI	SI	21-sep-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	26/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES														TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	223	223	223	0	0	187	35	49	0	49	0	237	236	29	236	1	197	149	0	48	217		
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**187**	**35**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**197**	**149**	**0**	**48**	**217**		

1 222

Valor comprometido Actividad 1	**$ 5.140.026,35**
Valor comprometido actividad 2	**$ 39.313.347,50**
Valor comprometido actividad 3	**$ 1.644.779.795,21**
Valor ejecutado actividad 3	**$ 1.310.853.148,34**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/09/2022 Y EL 26/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 26/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	80%	Adecuacion	$8.137.626,09	$6.510.100,87	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	90%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.197.017,00	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	90%	Caseta t3	$8.311.308,81	$7.480.177,93	5/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	90%	Adecuacion	$8.337.864,77	$7.504.078,29	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	85%	Caseta t3	$8.081.818,61	$6.869.545,82	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	85%	Adecuacion	$5.575.323,64	$4.739.025,09	6/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	85%	Caseta t4	$8.310.190,06	$7.063.661,55	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	85%	Adecuacion	$7.966.932,81	$6.771.892,89	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	85%	Adecuacion	$4.519.608,59	$3.841.667,30	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	85%	Adecuacion	$5.427.357,42	$4.613.253,81	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	85%	Adecuacion	$6.068.174,04	$5.157.947,93	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	85%	Caseta t3	$8.084.933,32	$6.872.193,32	8/09/2022	EN EJECUCION	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	85%	Caseta t3	$7.828.052,76	$6.653.844,85	9/09/2022	EN EJECUCION	18/09/2022	24/09/2022	9	15	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	85%	Caseta t2	$4.292.672,67	$3.648.771,77	10/09/2022	EN EJECUCION	20/09/2022	26/09/2022	10	16	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	65%	Adecuacion	$4.772.651,25	$3.102.223,31	11/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	11	17	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	65%	Adecuacion	$8.212.157,27	$5.337.902,23	11/09/2022	EN EJECUCION	23/09/2022	29/09/2022	12	18	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	65%	Caseta t3	$7.989.636,90	$5.193.263,99	12/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	13	19	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	65%	Caseta t3	$8.084.933,32	$5.255.206,66	12/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	14	20	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	65%	Adecuacion	$7.503.681,08	$4.877.392,70	13/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	15	21	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	65%	Adecuacion	$6.068.174,04	$3.944.313,13	13/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	16	22	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	65%	Adecuacion	$8.298.564,37	$5.394.066,84	14/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	17	23	-6		x
SM	13	177	B-C-SM-MZ66-VE-065	65%	Caseta t3	$7.828.052,76	$5.088.234,29	14/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	18	24	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ66-VE-066	65%	Adecuacion	$4.292.672,67	$2.790.237,24	15/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	19	25	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ75-VE-070	65%	Adecuacion	$4.222.499,91	$2.744.624,94	15/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	20	26	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-078	65%	Adecuacion	$5.110.794,97	$3.322.016,73	16/09/2022	EN EJECUCION	7/10/2022	13/10/2022	21	27	-6		x
SM	12	181	B-C-SM-MZ34-VE-119	65%	Adecuacion	$7.021.881,94	$4.564.223,26	16/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	22	28	-6		x
SM	11	182	B-C-SM-MZ56-VE-190	65%	Adecuacion	$7.154.236,55	$4.650.253,76	17/09/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	23	29	-6		x
SM	14	183	B-C-SM-MZ56-VE-191	65%	Caseta t3	$8.896.139,02	$5.782.490,36	17/09/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	24	30	-6		x
SM	13	184	B-C-SM-MZ31-VE-199	65%	Adecuacion	$4.691.093,17	$3.049.210,56	18/09/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	25	31	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ67-VE-183	55%	Caseta t3	$6.957.541,97	$3.826.648,08	18/09/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	26	32	-6		x
SM	17	186	B-C-SM-MZ30-VE-200	55%	Caseta t3	$8.312.234,66	$4.571.729,06	19/09/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	27	33	-6		x
SM	13	187	B-C-SM-MZ31-VE-201	55%	Caseta t3	$6.950.167,16	$3.822.591,94	19/09/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	28	34	-6		x
SM	13	188	B-C-SM-MZ47-VE-105	55%	Adecuacion	$3.899.268,01	$2.144.597,41	20/09/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	29	35	-6		x
SM	14	189	B-C-SM-MZ68-VE-108	55%	Adecuacion	$3.617.504,69	$1.989.627,58	20/09/2022	EN EJECUCION	20/10/2022	26/10/2022	30	36	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-208	55%	Adecuacion	$6.196.096,01	$3.407.852,81	21/09/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	28/10/2022	31	37	-6		x
SM	12	191	B-C-SM-MZ66-VE-198	55%	Adecuacion	$5.360.187,87	$2.948.103,33	21/09/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	32	38	-6		x
SM	15	192	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	55%	Caseta t3	$9.273.205,89	$5.100.263,24	22/09/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	31/10/2022	33	39	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	55%	Adecuacion	$7.909.051,57	$4.349.978,36	22/09/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	1/11/2022	34	40	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	55%	Adecuacion	$7.056.470,53	$3.881.058,79	23/09/2022	EN EJECUCION	28/10/2022	3/11/2022	35	41	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	55%	Caseta t3	$7.321.539,69	$4.026.846,83	23/09/2022	EN EJECUCION	29/10/2022	4/11/2022	36	42	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	55%	Adecuacion	$5.983.563,40	$3.290.959,87	24/09/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	6/11/2022	37	43	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	55%	Adecuacion	$7.900.843,94	$4.345.464,17	24/09/2022	EN EJECUCION	1/11/2022	7/11/2022	38	44	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	55%	Caseta t3	$7.343.027,38	$4.038.665,06	25/09/2022	EN EJECUCION	3/11/2022	9/11/2022	39	45	-6		x
SM		199														
SM		200														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	63,13%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	100,00%	**217**	**$ 39.313.349,11**	**68,66%**	**149**	$ 1.136.527.427,52				

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 26-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**48**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 22 de septiembre, 2022

	Hoy 21 SEP	Mañana 22 SEP	Viernes 23 SEP	Sábado 24 SEP	Domingo 25 SEP	Lunes 26 SEP	Martes 27 SEP
Hora	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°
08:00	24°	25°	25°	26°	26°	26°	25°
14:00	29°	29°	29°	31°	32°	32°	31°
20:00	25°	24°	24°	25°	25°	26°	26°
Lluvia	14.3 mm	12.5 mm	8.4 mm	8.7 mm	8.2 mm	6.3 mm	8.9 mm
Viento	7 km/h	8 km/h	7 km/h	12 km/h	15 km/h	11 km/h	8 km/h
	05:49	05:49	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48
	17:55	17:55	17:54	17:53	17:53	17:52	17:52

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24°	25°	26°	28°	29°	29°	29°	28°	27°	26°	25°	25°	24°	24°	24°

INFORME SEMANAL 23

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 07 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-111-22

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 7/10/2022
HORA: 3:27:04 p. m.
20224300379702

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Contrato de Interventoría N° 2220587
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 23

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 23 cuyo periodo es del 26 de septiembre del 2022 hasta 02 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 18 folios
Proyectó: Ing. Marcy Alejandra Correa – Coordinadora de Interventoría.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 23	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 23

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** | Fecha **2/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR — **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial (Días)	150 Días	
Plazo actual (Días)	226 Días	7.5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo	76 Días	
Fecha Contractual de terminación	11/12/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	159	70,35%
Días remanentes del Contrato	70,00	30,97%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.187.600.591,57

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587	
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	303.315.624,00
Variación del valor	$	100.836.311,00
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial	150 Días	
Plazo actual	226 Días	7.5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo	76 Días	
Fecha Contractual de terminación	11/12/2022	
Ejecución del Contrato	159	70,35%
Días remanentes del Contrato	70,00	30,97%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.771.707.945,99	66,76%	$ 1.355.356.578,68	51,07%	-$ 416.351.367,31	-15,69%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 87.116.920,69	3,28%	$ 81.500.727,96	3,07%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.777.324.138,72**	**66,97%**	**$ 1.442.473.499,37**	**54,35%**	**-$ 334.850.639,35**	**-12,62%**

Semáforo

Desviación en días: 19 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


En el mes de Septiembre se formalizó la adición y prórroga al Contrato de obra, razón por la cual se debe ajustar la programación de obra con las nuevas condiciones, a la fecha de corte del presente informe el Contratista no habia entregado la reprogramación, pero la Interventoría ajustó el cuadro de seguimiento para el control, con el cual se obtiene un avance programado del 66,97% frente a un ejecutado del 54,35% lo cual representa un atraso de 12,62%. Este atraso se debe a que dentro del plazo inicialmente pactado no se terminaron las 217 viviendas de la meta inicial.

En cuanto a la actividad 2 a corte del 2 de octubre se tenian aprobados 237 diagnósticos, con la adición el contratista debe continuar con esta actividad para identificar las 108 viviendas nuevas a intervenir. Se espera la reprogramación de obra con el fin de hacer seguimiento a las entregas establecidas para cada semana.

En cuanto a la actividad 3 el contratista deberá aprovechar las dos primeras semanas del nuevo plazo para ponerse al día con las viviendas pendientes de la primera etapa del contrato, que de acuerdo a los compromisos debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 206 viviendas, de las cuales se han terminado 160 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución 11 viviendas las cuales ya tienen parte del material y se deberá mejorar los rendimientos para lograr tener más viviendas terminadas.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

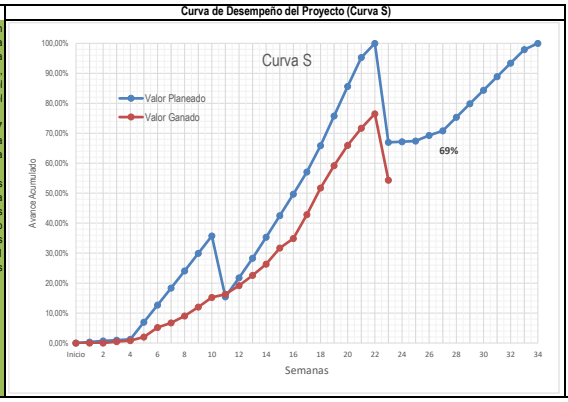

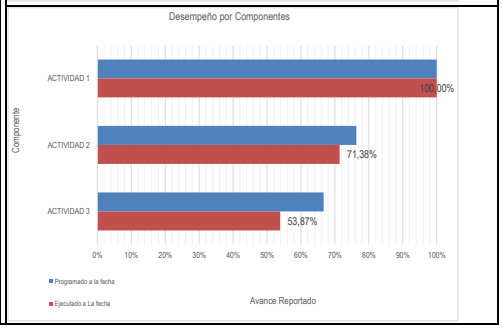


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	100,00%	76,50%	-23,50%	
Durante el Periodo	-33,03%	-22,15%	10,88%	
Acumulado a la Fecha	**66,97%**	**54,35%**	**-12,62%**	

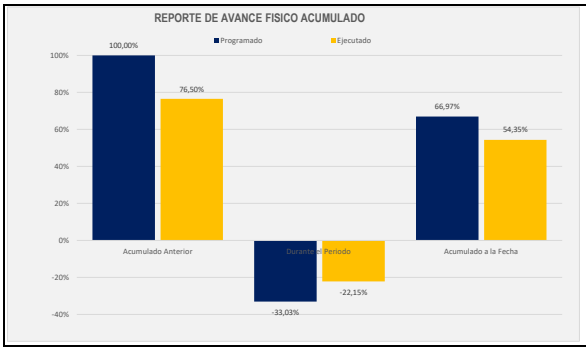

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **2/10/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 76,31% vs EJECUTADO 71,38%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tenía 237 diagnósticos aprobados en actas, con la adición y la prórroga que se hizo al contrato de obra se deberá continuar con esta actividad para identificar las 108 nuevas viviendas objeto de la adición del contrato. Las cuales se deberán realizar en las siguientes semanas. Una vez el contratista entregue la reprogramación con las nuevas condiciones contractuales se hará el seguimiento al avance de esta actividad.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 66,69% vs 53,87% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato, se debería tener 217 viviendas terminadas al 100% que corresponden a la meta inicial, sin embargo, a la fecha se han intervenido 206 viviendas, de las cuales se han terminado 160 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las últimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
A la meta de las 217 viviendas del objeto inicial, se suman las viviendas que se deben ejecutar para agotar el valor antes de la adición, es decir, otras 15 viviendas. La adición que se hizo al contrato de obra es para aproximadamente 108 viviendas. Es decir, en los próximos 2 meses y medio el contratista deberá ejecutar al 100% las 180 viviendas restantes, ya que al corte del presente informe se han terminado 160 viviendas. Una vez se entregue la reprogramación de la obra se hará el seguimiento con las metas propuestas por el contratista, para lo cual deberá disponer de todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con el objeto del contrato.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem **ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10.** El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem **ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.** En la presente semana no se aprobaron diagnósticos adicionales, la cifra sigue siendo los mismos 237.
En el ítem **ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS**
Con corte al 2 de octubre se han intervenido 206 viviendas, de las cuales solo 160 están terminadas indicándonos un atraso de 57. El contratista tiene en ejecución 46 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 03 al 09 de octubre de 2022 el contratista deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en los próximos 2 meses y medio se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	43	8	51	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**43**	**8**	**51**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo no se presentaron lluvias, predomino el tiempo seco.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
PQRS	JHON JAIRO VALETH SOTO	29/09/2022	PQRS	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/09/2022** al **2/10/2022** Fecha **2/10/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Cuatro (4) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22 con el asunto SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA por medio del cual solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.
- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-070-22 con el asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO (INCLUYE MICROMEDIDOR) Y ALCANTARILLADO. Mediante el cual reiteramos respuesta a la solicitud realizada en el oficio TEC-025-22 del 15 de junio, mediante el cual se requirió su gestión como COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición de las especificaciones técnicas de las redes de acueducto (Incluye micromedidor) y alcantarillado, requisito necesario para la intervención de las conexiones domiciliarias a las que haya lugar en el marco del proyecto: DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR).

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copies: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	26/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES										
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	227	223	223	0	0	188	35	67	0	49	0	237	255	29	237	1	206	160	0	46	217		
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**227**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**67**	**0**	**49**	**0**	**237**	**255**	**29**	**237**	**1**	**206**	**160**	**0**	**46**	**217**		

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/09/2022 Y EL 26/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 02/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x

SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ46-VE-213	100%	Caseta t3	$8.311.308,81	$8.311.308,81	5/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ46-VE-214	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ46-VE-215	100%	Caseta t3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$5.575.323,64	$5.575.323,64	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ46-VE-217	100%	Caseta t4	$8.310.190,06	$8.310.190,06	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ46-VE-218	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ46-VE-219	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ46-VE-220	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ46-VE-221	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	63,13%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	100,00%	**217**	$ 39.313.349,11	**68,66%**	**149**	$ 1.136.527.427,52				
2/10/2022	**Semana 23**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	100,00%	**217**	$ 39.313.349,11	**73,73%**	**160**	$ 1.220.432.136,94				
						$ -							

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 02-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**46**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 7/10/2022
HORA: 3:11:43 p. m.
20224300379572

ADMON

Bogotá D.C, 07 de octubre 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-110-22

Señores:
Arquitecta
Erika Marcela Gutierrez Gaitán
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 2220576.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y luego de la revisión dela documentación remitida por el contratista de Obra el día 06 de octubre de 2022 mediante comunicado CCR_CORDOBA_2220576_2022_095 RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2 y después de subsanar las observaciones realizadas, la interventoría verifica que la documentación cumplen con lo estipulado en el contrato de obra No. 2220576, por lo cual, esta interventoría da aval al acta presentada y por lo tanto es remitida a ENTerritorio para trámite correspondiente.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: 42 Folios
Proyectó: Marcy Alejandra Correa Castaño

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_095

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos presentar radicado de acta parcial de obra número 2, para su respectivo trámite y aprobación.

Atentamente,

DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

ANEXO 2. F-FI-06 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	2
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	1/07/2021

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSORCIO CONSTRUREDES

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 9.015.686.776 **DV:** 5

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 3114143542 **CORREO ELECTRÓNICO** cconstruredes@gmail.com

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	$ 442.194.944,42
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO _____ **No. CONTRATO** 2220576 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** _____

No. PROCESO CONTRACTUAL _____

FACTURA No. 00000002 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** _____ **No.** _____

ANTICIPO:	SI [ ]	NO [X]	% [ ]	VALOR $		OTROS DESCUENTOS POR VALOR $	
RETEGARANTIA:	SI [ ]	NO [X]	% [ ]	VALOR $		ESPECIFIQUE:	
AMORTIZA:	SI [X]	NO [ ]	% [ ]	VALOR $	$ 95.946.599,15	ESPECIFIQUE:	

2, PERIODO DE COBRO

INICIO	FIN	DESEMBOLSO Nº	VALOR BRUTO $
1/08/2022	31/08/2022	3	442.194.944,42

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			
NIT / C.C.:	800.173.768-1/ C.C. 79.482.309		899.999.316 - 1/ C.C. 52.008.866 - Supervisor
NOMBRE:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA - Federico Cardona		ENTerritorio - Erika Marcela Gutierrez Pérez

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

CARLOS ANDRÉS BRAVO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / Razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.**: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES

a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

ANEXO 3. FACTURA PROFORMA

CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT:901568676-5 CR 24 # 15 - 17 SAN MARCOS - SUCRE
TEL:3114143542 E-mail: cconstruredes@gmail.com
Miembros:

INMAQ SAS	NIT 800.21.,251-2	65%
GEOINGENIERIA LTDA	NIT 900.019.772-6	35%

FACTURA DE VENTA
F No. 00000005

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - EnTERRITORIO

NIT: 899999316-1 **DIRECCION**: CL 26 # 13 - 19 P 30 **TELEFONO**:3116838389
CIUDAD: BOGOTA D.C. **Fecha:** 07 10 2022
vence: 30 10 2022

PAGO ACTA AVANCE Nº 02 DEL CONTRATO DE OBRA No.2220576

ITEM	DESCRIPCION / SERVICIO		CANT	IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ACT 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS		0	19%	$ -	$ -
2	ACT 2. DIAGNÓSTICO Y CONSULTORIA GRAL DE LA INTERVENCIÓN.		64	19%	$ 8.769.116,16	$ 8.769.116,16
3	ACT 3. COSTO DIRECTO OBRAS		64		$ 326.127.121,52	$ 326.127.121,52
4	ADMINISTRACIÓN	25,44%			$ 82.966.739,72	$ 82.966.739,72
5	IMPREVISTOS	1%			$ 3.261.271,22	$ 3.261.271,22
6	UTILIDAD	5%			$ 16.306.356,08	$ 16.306.356,08

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 531000010-20 A NOMBRE DE CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901.568.676-5

SUBTOTAL	$ 437.430.604,69
IVA	$ 4.764.339,73
TOTAL	$ 442.194.944,42
AMORTIZACION 20%	$ 95.946.599,15
NETO	**$ 346.248.345,27**

SON: cuatroscientos cuarenta y dos millones ciento noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con 42/100

1.) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO) 2.) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DIFERENTE A LA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE

VENDEDOR

NIT. 901,568,676-5

RECIBI Y ACEPTO LA FACTURA

CC/NIT.

ANEXO 4. PRE-ACTA (MATRIZ 3 MOMENTOS – EJECUCIÓN)

$ 39.313.349,11 $ 33.036.427,82 $ 152.241.603

Administracion	Imprevistos	Utilidad	Iva	Salario Minimo	No. Inmuebles para Intervención	Costo Validación
25,44%	1,0%	5,0%	19%	$ 1.000.000,00	217	$ 5.140.026,35

VM: Valor Maximo Ayuda	
VM INTRADOMICILIARIA	VM INTRADOMICILIARIA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO
8,23 SMLMV	10,03 SMLMV
$ 8.230.000,00	$ 10.030.000

IDENTIFICACION INMUEBLE

	CODIGO INMUEBLE	MARQUE CON UNA (X) SI ES INCLUSIÓN	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	Verificacion dato archivo diagnosticos	diferencias	DIAGNOSTICO (Sin IVA)	DIAGNOSTICO (Incluido IVA)	Validación (Sin IVA)	Validación (Con IVA)	DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Sin IVA)	DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Incluido IVA)	INTRADOMICILIARIA (sin AIU)	DOMICILIARIA (sin AIU)	Sumatoria	INTRADOMICILIARIA (Incluye AIU)	DOMICILIARIA (Incluye AIU)	INTRA+DOMC+DIAGNOS	CASO 1 - INTRA: CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS + DIAGNOSTICO	CASO 2 - INTRA: CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS	CHEQUEO NORM INTRA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO	DESCUENTO POR INTRA	CONSOLIDADO EJECUTADO - DESCUENTOS
2	B-C-SM-MZ55-VE-048		SAN MARTIN	CRISTIAN DAVID BENITEZ VERGARA	1.049.453.937	CL 11 # 6 - 37	$ 6.887.962,53	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.834.926,91	$ 69.790,32	$ 4.904.717,23	$ 6.400.959,73	$ 92.395,40	$ 6.698.209,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.698.209,41
2	B-C-SM-MZ55-VE-060		SAN MARTIN	ROSARIO ISABEL CASERES ALVAREZ	22.853.794	CL 10 # 6-52	$ 9.444.985,91	$ 411.528,60	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.738.845,82	$ 929.787,04	$ 6.668.632,86	$ 7.597.657,98	$ 1.230.945,06	$ 9.033.457,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.033.457,31
2	B-C-SM-MZ68-VE-077		SAN MARTIN	IRLENA SOFIA GONZALEZ TERAN	57,445,250	KR 8 # 7 - 20	$ 7.841.298,85	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.555.023,84	$ 69.790,32	$ 5.624.814,16	$ 7.354.296,06	$ 92.395,40	$ 7.651.545,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.651.545,74
2	B-C-SM-MZ89-VE-080		SAN MARTIN	AUDITH JUDITH SANCHEZ PIÑA	22,855,984	CL 11 # 6 - 36	$ 7.814.305,68	$ 244.545,84	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.493.247,35	$ 69.790,32	$ 5.563.037,67	$ 7.272.510,17	$ 92.395,40	$ 7.569.759,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.569.759,84
2	B-C-SM-MZ-VE-082		SAN MARTIN	ONASIS DE LA CRUZ PEREZ MARTINEZ	73.316.850	CRA 6 CL 11-27	$ 9.602.086,12	$ 894.584,85	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.337.228,10	$ 1.085.195,80	$ 6.422.423,90	$ 7.065.956,28	$ 1.436.690,72	$ 8.707.501,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.707.501,27
2	B-C-SM-MZ69-VE-085		SAN MARTIN	ERMIDA ESTHER HENAO ESCOVAR	22.853.647	CL 6 CR 7 - 22	$ 6.566.494,57	$ 261.326,35	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.326.318,71	$ 281.517,19	$ 4.607.835,90	$ 5.727.613,34	$ 372.700,61	$ 6.305.168,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.305.168,22
2	B-C-SM-MZ69-VE-086		SAN MARTIN	LUIS ALFONSO HENAO ESCOBAR	3.831.589	CL 6 CR 7 - 22	$ 8.441.178,67	$ 230.238,34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.317.303,76	$ 730.045,78	$ 6.047.349,55	$ 7.039.578,45	$ 966.507,61	$ 8.210.940,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.210.940,33
2	B-C-SM-MZ69-VE-088		SAN MARTIN	ARTURO EDUARDO ALVAREZ MEZA	6.813.964	CL 5 CR 6-5	$ 7.465.862,82	$ 152.429,41	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.273.731,24	$ 95.691,78	$ 5.369.423,02	$ 6.981.892,79	$ 126.686,35	$ 7.313.433,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.313.433,41
2	B-C-SM-MZ-VE-091		SAN MARTIN	SEGUNDO RAFAEL CARDENAS DIAZ	73.315.437	CL 6 CRA 8-16	$ 8.240.626,45	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.856.653,57	$ 69.790,32	$ 5.926.443,89	$ 7.753.623,66	$ 92.395,40	$ 8.050.873,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.050.873,34
2	B-C-SM-MZ-VE-092		SAN MARTIN	JORGE ISAAC GONZALEZ CRUZATE	73.316.344	CL 2 CRA 4-299	$ 8.314.938,30	$ 434.298,97	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.728.068,33	$ 69.790,32	$ 5.797.858,65	$ 7.583.389,66	$ 92.395,40	$ 7.880.639,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.880.639,33
2	B-C-SM-MZ-VE-096		SAN MARTIN	ARELVIS ESTHER TORRES CANTILLO	39.090.314	CL 6 CRA 8-44	$ 7.662.197,96	$ 285.031,06	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.156.607,07	$ 260.956,66	$ 5.417.563,74	$ 6.826.832,10	$ 345.480,53	$ 7.377.166,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.377.166,90
2	B-C-SM-MZ68-VE-097		SAN MARTIN	MOISES JOSE VERGARA VEGA	3.831.916	CR 7 # 7 - 75	$ 8.172.428,90	$ 230.238,34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.192.486,74	$ 651.864,26	$ 5.844.351,00	$ 6.874.333,19	$ 863.003,10	$ 7.942.190,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.942.190,56
2	B-C-SM-MZ58-VE-100		SAN MARTIN	PEDRO RAFAEL PORTO FONSECA	12.548.951	CL 7 CR 6 - 36	$ 7.970.674,95	$ 398.878,39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.481.835,04	$ 82.741,05	$ 5.564.576,09	$ 7.257.401,41	$ 109.540,88	$ 7.571.796,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.571.796,56
2	B-C-SM-MZ59-VE-102		SAN MARTIN	JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO	73.315.081	CL 7 CR 6 - 35	$ 8.805.748,19	$ 398.878,39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.758.100,24	$ 437.243,46	$ 6.195.343,71	$ 7.623.148,91	$ 578.866,62	$ 8.406.869,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.406.869,80
2	B-C-SM-MZ47-VE-103		SAN MARTIN	PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE	22.854.084	CL 8 CR 5A - 1	$ 8.549.349,69	$ 286.948,88	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.695.885,36	$ 390.334,55	$ 6.086.219,91	$ 7.540.782,63	$ 516.763,91	$ 8.262.400,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.262.400,81
2	B-C-SM-MZ47-VE-104		SAN MARTIN	TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ	22.853.685	CL 8 CR 5A - 23	$ 8.247.586,35	$ 292.144,38	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.784.570,06	$ 69.790,32	$ 5.854.360,38	$ 7.658.192,30	$ 92.395,40	$ 7.955.441,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.955.441,97
2	B-C-SM-MZ58-VE-107		SAN MARTIN	FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA	3.831.482	CL 8 # 6 - 27	$ 7.990.185,62	$ 316.833,34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.067.602,86	$ 573.682,74	$ 5.641.285,60	$ 6.708.999,43	$ 759.498,58	$ 7.673.352,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.673.352,28
2	B-C-SM-MZ47-VE-110		SAN MARTIN	ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ	73.315.246	CL 7 CR 5A - 74	$ 6.954.066,54	$ 296.533,13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.804.202,53	$ 69.790,32	$ 4.873.992,85	$ 6.360.283,73	$ 92.395,40	$ 6.657.533,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.657.533,41
2	B-C-SM-MZ47-VE-111		SAN MARTIN	MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA	22.856.586	CL 7 CR 5A - 50	$ 8.318.089,48	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.915.164,81	$ 69.790,32	$ 5.984.955,13	$ 7.831.086,69	$ 92.395,40	$ 8.128.336,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.128.336,37
2	B-C-SM-MZ47-VE-112		SAN MARTIN	YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA	22.855.582	CL 7 5 - 50	$ 6.827.279,62	$ 278.235,92	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.722.255,48	$ 69.790,32	$ 4.792.045,80	$ 6.251.794,03	$ 92.395,40	$ 6.549.043,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.549.043,70
2	B-C-SM-MZ47-VE-113		SAN MARTIN	JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA	22.856.754	CL 7 # 5A-22	$ 5.043.864,79	$ 284.480,21	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.370.447,09	$ 69.790,32	$ 3.440.237,41	$ 4.462.134,91	$ 92.395,40	$ 4.759.384,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.759.384,58
2	B-C-SM-MZ47-VE-114		SAN MARTIN	MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA	22.854.513	CL 7 CR 5 - 20	$ 7.850.343,92	$ 189.753,13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.535.954,51	$ 95.691,78	$ 5.631.646,29	$ 7.329.050,18	$ 126.686,35	$ 7.660.590,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.660.590,79
2	B-C-SM-MZ47-VE-115		SAN MARTIN	ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO	22.854.219	CL 7 # 5A-10	$ 8.322.147,74	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.918.230,19	$ 69.790,32	$ 5.988.020,51	$ 7.835.144,95	$ 92.395,40	$ 8.132.394,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.132.394,62
2	B-C-SM-MZ21-VE-118		SAN MARTIN	JAIDER ANTONIO SENCIO BARRIOS	73.317.318	CL 8 # 3 - 4	$ 8.148.709,56	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.721.093,22	$ 135.921,79	$ 5.857.015,01	$ 7.574.155,31	$ 179.946,86	$ 7.958.956,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.958.956,44
2	B-C-SM-MZ30-VE-120		SAN MARTIN	DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA	22.854.629	CR 5A CL 10 - 32	$ 8.665.155,76	$ 230.238,33	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.365.411,77	$ 851.117,54	$ 6.216.529,32	$ 7.103.268,65	$ 1.126.794,52	$ 8.434.917,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.434.917,43
2	B-C-SM-MZ30-VE-121		SAN MARTIN	AMALFI ESTHER NIETO REALES	22.855.136	CL 11 4A - 69	$ 7.765.616,43	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.497.857,57	$ 69.790,32	$ 5.567.647,89	$ 7.278.613,64	$ 92.395,40	$ 7.575.863,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.575.863,31
2	B-C-SM-MZ30-VE-122		SAN MARTIN	RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES	73.316.822	CL 11 4A - 59	$ 8.106.560,84	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.755.387,91	$ 69.790,32	$ 5.825.178,23	$ 7.619.558,06	$ 92.395,40	$ 7.916.807,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.916.807,73
2	B-C-SM-MZ87-VE-124		SAN MARTIN	FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ	85.485.870	CL 11 4A - 70	$ 7.971.802,84	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.653.599,25	$ 69.790,32	$ 5.723.389,57	$ 7.484.800,04	$ 92.395,40	$ 7.782.049,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.782.049,72
2	B-C-SM-MZ30-VE-125		SAN MARTIN	JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES	73.317.470	CL 11 KR 4A - 19	$ 8.100.577,84	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.750.868,68	$ 69.790,32	$ 5.820.659,00	$ 7.613.575,04	$ 92.395,40	$ 7.910.824,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.910.824,72
2	B-C-SM-MZ30-VE-126		SAN MARTIN	MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ	1.049.454.476	CL 11 4A - 29	$ 8.057.934,94	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.718.658,62	$ 69.790,32	$ 5.788.448,94	$ 7.570.932,15	$ 92.395,40	$ 7.868.181,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.868.181,82
2	B-C-SM-MZ87-VE-127		SAN MARTIN	FELIPE MANUEL VERGARA VILLA	3.831.622	CL 11 4A-32	$ 7.998.497,32	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.673.762,77	$ 69.790,32	$ 5.743.553,09	$ 7.511.494,53	$ 92.395,40	$ 7.808.744,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.808.744,21
2	B-C-SM-MZ87-VE-128		SAN MARTIN	JOSE GREGORIO MARTINEZ MEZA	73.352.002	CR 4A 11 - 15	$ 7.523.102,18	$ 286.222,80	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.241.808,07	$ 69.790,32	$ 5.311.598,39	$ 6.939.629,70	$ 92.395,40	$ 7.236.879,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.236.879,38
2	B-C-SM-MZ87-VE-129		SAN MARTIN	SANDRA PAOLA GUISADO FERNANDEZ	22.855.631	CL 12 4A - 27	$ 8.132.932,40	$ 189.753,13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.762.356,77	$ 82.741,05	$ 5.845.097,82	$ 7.628.784,12	$ 109.540,88	$ 7.943.179,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.943.179,27
2	B-C-SM-MZ66-VE-131		SAN MARTIN	ANDY XIOMARA ESCUDERO PEREZ	1.003.190.169	CRA 8 CL 9-3	$ 8.139.325,77	$ 160.626,52	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.776.235,85	$ 95.691,78	$ 5.871.927,63	$ 7.647.158,64	$ 126.686,35	$ 7.978.699,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.978.699,25
2	B-C-SM-MZ67-VE-133		SAN MARTIN	MANUEL DEL CRISTO BOHORQUEZ ALVAREZ	3.831.621	CL 9 # 7 - 53	$ 6.390.026,30	$ 284.238,18	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.387.445,01	$ 69.790,32	$ 4.457.235,33	$ 5.808.538,45	$ 92.395,40	$ 6.105.788,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.105.788,12
2	B-C-SM-MZ66-VE-134		SAN MARTIN	MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO	22.853.475	CL 9 # 7 - 46	$ 8.426.367,53	$ 294.209,67	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.838.177,47	$ 149.664,20	$ 5.987.841,67	$ 7.729.163,16	$ 198.140,43	$ 8.132.157,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.132.157,86
2	B-C-SM-MZ56-VE-135		SAN MARTIN	ERASMO MANUEL PEREZ DIAZ	73.315.730	CL 9 # 6 - 88	$ 7.522.231,25	$ 281.979,27	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.244.355,55	$ 69.790,32	$ 5.314.145,87	$ 6.943.002,31	$ 92.395,40	$ 7.240.251,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.240.251,98
2	B-C-SM-MZ56-VE-136		SAN MARTIN	ALEJANDRO PEREZ PADILLA	15.245.173	CL 9 6-75	$ 7.922.709,35	$ 211.116,43	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.574.478,67	$ 95.691,78	$ 5.670.170,45	$ 7.380.052,31	$ 126.686,35	$ 7.711.592,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.711.592,92
2	B-C-SM-MZ-VE-137		SAN MARTIN	ISIDRO MANUEL HENAO ESCOBAR	73.316.151	CL 9 # 6-66	$ 8.275.053,66	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.882.657,96	$ 69.790,32	$ 5.952.448,28	$ 7.788.050,87	$ 92.395,40	$ 8.085.300,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.085.300,54
2	B-C-SM-MZ56-VE-138		SAN MARTIN	TOMAS FONSECA GONZALEZ	5.120.199	CL 9 6-58	$ 7.984.245,73	$ 202.609,08	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.627.385,78	$ 95.691,78	$ 5.723.077,56	$ 7.450.096,04	$ 126.686,35	$ 7.781.636,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.781.636,65
2	B-C-SM-MZ56-VE-139		SAN MARTIN	OSCAR DAVID BECERRA RIVERA	72.297.061	CL 9 CRA 6-38	$ 7.415.285,53	$ 140.099,74	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.257.791,86	$ 82.741,05	$ 5.340.532,91	$ 6.960.790,65	$ 109.540,88	$ 7.275.185,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.275.185,79
2	B-C-SM-MZ56-VE-140		SAN MARTIN	INES BENEDICTA PADILLA PALENCIA	22.853.700	CL 9 6-46	$ 8.097.289,18	$ 169.226,33	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.737.987,94	$ 95.691,78	$ 5.833.679,72	$ 7.596.522,24	$ 126.686,35	$ 7.928.062,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.928.062,85
2	B-C-SM-MZ31-VE-142		SAN MARTIN	APOLER ROMAN CALVO HOYOS	3.831.874	CL 9 4A-39	$ 7.456.473,74	$ 290.434,06	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.188.299,73	$ 69.790,32	$ 5.258.090,05	$ 6.868.790,01	$ 92.395,40	$ 7.166.039,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.166.039,68
2	B-C-SM-MZ32-VE-143		SAN MARTIN	EDWIN GABRIEL PUELLO CHAMORRO	73.316.258	CR 4A CL 8 - 45	$ 8.877.043,95	$ 230.238,34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.881.076,57	$ 495.501,22	$ 6.376.577,79	$ 7.785.957,27	$ 655.994,07	$ 8.646.805,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.805,61
2	B-C-SM-MZ87-VE-145		SAN MARTIN	MANUELA SEGUNDA VILLA AYOLA	22.858.537	CL 12 # 4A - 3	$ 8.314.813,04	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.912.689,97	$ 69.790,32	$ 5.982.480,29	$ 7.827.810,25	$ 92.395,40	$ 8.125.059,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.125.059,92
2	B-C-SM-MZ87-VE-146		SAN MARTIN	FIDEL ENRIQUE HENAO ESCOBAR	12.586.040	CL 12 # 4A - 39	$ 7.503.681,08	-$ 804.749,51	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 6.051.197,91	$ 69.790,32	$ 6.120.988,23	$ 8.011.180,92	$ 92.395,40	$ 8.308.430,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.308.430,59
2	B-C-SM-MZ87-VE-147		SAN MARTIN	ANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ	26.842.705	CL 12 4A - 49	$ 8.285.180,86	$ 215.053,53	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.871.196,96	$ 69.790,32	$ 5.940.987,28	$ 7.772.877,66	$ 92.395,40	$ 8.070.127,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.070.127,33
2	B-C-SM-MZ87-VE-148		SAN MARTIN	JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA	12.698.121	CR 5A 11 - 48	$ 8.170.302,31	$ 189.753,11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.803.534,65	$ 69.790,32	$ 5.873.324,97	$ 7.683.299,52	$ 92.395,40	$ 7.980.549,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.980.549,20
2	B-C-SM-MZ89-VE-149		SAN MARTIN	ROBERT JAVITH VERGARA JEREZ	73.317.298	CL 12 5A-39	$ 8.178.886,20	$ 140.099,73	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.821.622,57	$ 95.691,78	$ 5.917.314,15	$ 7.707.245,86	$ 126.686,35	$ 8.038.786,47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.038.786,47
2	B-C-SM-MZ89-VE-150		SAN MARTIN	PABLO EMILIO CAUSADO SANCHEZ	3.831.454	CRA 6A 11-30	$ 8.339.015,84	$ 140.099,73	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.955.526,07	$ 82.741,05	$ 6.038.267,12	$ 7.884.520,97	$ 109.540,88	$ 8.198.916,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.198.916,11
2	B-C-SM-MZ89-VE-151		SAN MARTIN	ELVIDA NAVARRO NAVARRO	33.204.357	CR 6A # 11 - 20	$ 7.760.503,35	$ 317.153,77	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.397.764,11	$ 69.790,32	$ 5.467.554,43	$ 7.146.099,90	$ 92.395,40	$ 7.443.349,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.443.349,58
2	B-C-SM-MZ56-VE-152		SAN MARTIN	ELVER DAVID OCHOA MEDINA	72.099.587	CL 9 CRA 6-22 APTO 101	$ 8.292.567,48	$ 1.046.722,15	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.222.678,99	$ 95.691,78	$ 5.318.370,77	$ 6.914.304,71	$ 126.686,35	$ 7.245.845,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.245.845,33
2	B-C-SM-MZ76-VE-153		SAN MARTIN	OSCAR ALFREDO TORRES CANTILLO	73.315.785	CL 7 8 - 30	$ 6.803.533,69	$ 278.671,57	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.703.990,06	$ 69.790,32	$ 4.773.780,38	$ 6.227.612,44	$ 92.395,40	$ 6.524.862,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.524.862,12
2	B-C-SM-MZ075-VE-154		SAN MARTIN	RONALD ALBERTO MANJARRES PORTO	1.049.452.013	CL 9 # 8-50	$ 7.419.892,36	$ 282.301,96	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.166.810,73	$ 69.790,32	$ 5.236.601,05	$ 6.840.340,72	$ 92.395,40	$ 7.137.590,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.137.590,40
2	B-C-SM-MZ75-VE-155		SAN MARTIN	ONEIDA MARIA DIPPE DE FRANCO	29.207.395	CR 9 CL 8 - 70	$ 7.958.081,38	$ 307.714,74	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.554.133,22	$ 69.790,32	$ 5.623.923,54	$ 7.353.116,97	$ 92.395,40	$ 7.650.366,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.650.366,64
2	B-C-SM-MZ75-VE-156		SAN MARTIN	ESPERANZA ESTHER QUIROZ VERA	22.856.301	CL 10 CRA 8-25	$ 8.011.976,60	$ 222.935,03	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.620.028,32	$ 108.642,51	$ 5.728.670,83	$ 7.440.355,49	$ 143.831,82	$ 7.789.041,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.789.041,57
2	B-C-SM-MZ145-VE-157		SAN MARTIN	MAIRA SOL ROSALES QUIROZ	22.855.489	CL 10 # 7	$ 9.653.914,01	$ 334.081,75	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.685.809,57	$ 1.199.134,90	$ 6.884.944,47	$ 7.527.443,29	$ 1.587.534,70	$ 9.319.832,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.319.832,26
2	B-C-SM-MZ75-VE-158		SAN MARTIN	MARIEL JOSE ROSALES QUIROZ	73.316.691	CRA 9 CL 8-72	$ 6.846.229,60	$ 244.545,84	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.736.115,37	$ 95.691,78	$ 4.831.807,15	$ 6.270.143,14	$ 126.686,35	$ 6.601.683,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.601.683,76
2	B-C-SM-MZ-VE145-160		SAN MARTIN	ANA AYDEE MEDINA DE URIBE	22.853.289	CL 10 # 7 - 2	$ 9.325.691,24	$ 325.691,50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.717.861,30	$ 925.499,58	$ 6.643.360,88	$ 7.569.876,57	$ 1.225.268,90	$ 8.999.999,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.999.999,74
2	B-C-SM-MZ-VE145-162		SAN MARTIN	IDALUZ GUERRA VEGA	22.854.666	CL 10 7 - 44	$ 7.000.723,74	$ 327.143,67	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.718.251,30	$ 1.167.862,30	$ 4.886.113,60	$ 4.922.592,90	$ 1.546.132,89	$ 6.673.580,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.673.580,07
2	B-C-SM-MZ84-VE-165		SAN MARTIN	SIXTA ISABEL VILLAMIZAR PADILLA	22.854.587	CRA 8 CL 10-29	$ 8.259.418,86	$ 189.753,13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.831.996,11	$ 108.642,51	$ 5.940.638,62	$ 7.720.979,64	$ 143.831,82	$ 8.069.665,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.069.665,73
2	B-C-SM-MZ91-VE-167		SAN MARTIN	SERGIO ALFONSO CRUZATE ROMERO	3.831.686	CL 11 7A - 34	$ 7.334.345,73	$ 281.333,86	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.102.924,84	$ 69.790,32	$ 5.172.715,16	$ 6.755.762,20	$ 92.395,40	$ 7.053.011,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.053.011,87
2	B-C-SM-MZ77-VE-179		SAN MARTIN	MARIS LUZ JULIO VERGARA	45.523.464	CR 8 CL 6 - 23	$ 8.930.810,61	$ 230.238,34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.374.418,26	$ 1.042.771,86	$ 6.417.190,12	$ 7.115.192,33	$ 1.380.525,67	$ 8.700.572,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.700.572,27
2	B-C-SM-MZ-VE87-180		SAN MARTIN	IGNACIA MARIA CRUZ ROMERO	22.853.408	CR 8 CL 8 - 40	$ 8.116.195,29	$ 189.753,12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.762.665,23	$ 69.790,32	$ 5.832.455,55	$ 7.629.192,50	$ 92.395,40	$ 7.926.442,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.926.442,17
			ACUMULADO	ACUMULADO					$ 9.743.462,58	$ 11.594.720,47		$ 1.515.952,61	$ 11.017.372,34	$ 13.110.673,25	$ 347.412.601,95	$ 14.950.866,39	$ 362.363.468,34	$ 459.939.543,72	$ 19.793.452,01	$ 492.843.668,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 492.843.668,99
			PROMEDIO	PROMEDIO														479.732.995,73	[illegible]						

1040,19 502,13

ANEXO 5. F-GG-32 - ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220576

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUREDES (N.I.T 901568676 - 5)

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS. (N.I.T 800.173.768 -1)

PERÍODO A PAGAR: **1 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

En Bogotá DC, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2022 se reunieron el Ing. Duarte Jose Pineda Director de Obra del Contratista y la Ing. Marcy Correa Castaño Directora de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS													
1,1	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	GL	1,00	$ 4.319.349,87	$ 4.319.349,87	1,00	0,00	1,00	4.319.349,9	$ -	$ 4.319.349,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 4.319.349,87				4.319.349,87	$ -	$ 4.319.349,87		-
	IVA 19%				$ 820.676,48				820.676,48	$ -	$ 820.676,48		-
	TOTAL (ACTIVIDAD 1)				**$ 5.140.026,35**				**$ 5.140.026,35**	**$ -**	**$ 5.140.026,35**		**-**
ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.													
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	217,00	$ 152.241,60	$ 33.036.427,82	60,00	64,00	124,00	9.134.496,0	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40	93,00	$ 14.158.469,42
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 33.036.427,82				$ 9.134.496,00	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40		14.158.469,42
	IVA 19%				$ 6.276.921,29				$ 1.735.554,00	$ 1.851.257,86	$ 3.586.812,10		$ 2.690.109,19
	TOTAL (ACTIVIDAD 2)				**$ 39.313.349,11**				**$ 10.870.050,00**	**$ 11.594.720,26**	**$ 22.464.770,50**		**$ 16.848.578,61**
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO													
	2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 10.170,51	$ -	1.848,10	2088,20	3.936,30	18.796.119,5	$ 21.238.058,98	$ 40.034.178,51		$ -
2,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 43.860,81	$ -	1.021,90	1056,70	2.078,60	44.821.361,7	$ 46.347.717,93	$ 91.169.079,67		$ -
2,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 21.402,93	$ -	447,00	510,10	957,10	9.567.109,7	$ 10.917.634,59	$ 20.484.744,30		$ -
	PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos							-					
2,4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und		$ 94.202,36	$ -	44,00	62,00	106,00	4.144.903,8	$ 5.840.546,32	$ 9.985.450,16		$ -
2,5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und		$ 112.904,76	$ -	50,00	61,00	111,00	5.645.238,0	$ 6.887.190,36	$ 12.532.428,36		$ -
2,6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 85.214,13	$ -	44,00	62,00	106,00	3.749.421,7	$ 5.283.276,06	$ 9.032.697,78		$ -
2,7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 89.406,34	$ -	42,00	41,00	83,00	3.755.066,3	$ 3.665.659,94	$ 7.420.726,22		$ -
2,8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 142.030,87	$ -	27,00	56,00	83,00	3.834.833,5	$ 7.953.728,72	$ 11.788.562,21		$ -
	APARATOS							-					
2,9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und		$ 147.311,27	$ -	45,00	58,00	103,00	6.629.007,2	$ 8.544.053,66	$ 15.173.060,81		$ -
2,101	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und		$ 114.887,70	$ -	46,00	58,00	104,00	5.284.834,2	$ 6.663.486,60	$ 11.948.320,80		$ -
2,11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und		$ 185.296,96	$ -	42,00	41,00	83,00	7.782.472,3	$ 7.597.175,36	$ 15.379.647,68		$ -
2,12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und		$ 177.856,36	$ -	26,00	52,00	78,00	4.624.265,4	$ 9.248.530,72	$ 13.872.796,08		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN							-					
2,13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M		$ 175.509,36	$ -	77,40	81,50	158,90	13.584.424,5	$ 14.304.012,84	$ 27.888.437,30		$ -
	3. ADECUACIONES							-					
	UNIDADES SANITARIAS							-					
3,1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.596.959,72	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:			F-GG-32
											VERSIÓN:			01
	GERENCIA DE PROYECTOS										VIGENCIA:			2020-10-20
3,2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.305.691,80	$ -	4,00	4,00	8,00	9.222.767,2	$ 9.222.767,20	$ 18.445.534,40		$ -
3,3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.927.724,89	$ -	26,00	32,00	58,00	76.120.847,1	$ 93.687.196,48	$ 169.808.043,62		$ -
3,4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 3.012.931,39	$ -	-	1,88	1,88	-	$ 5.678.188,58	$ 5.678.188,58		$ -
	CIMENTACIÓN							-					
3,5	Relleno compactado con material de sitio	M3		$ 12.187,55	$ -	9,41	38,64	48,05	114.684,8	$ 470.878,18	$ 585.563,03		$ -
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3		$ 36.557,30	$ -	2,98	0,00	2,98	108.940,8	$ -	$ 108.940,75		$ -
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS							-					
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3		$ 547.962,74	$ -	23,87	25,39	49,26	13.079.870,6	$ 13.912.773,97	$ 26.992.644,57		$ -
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG		$ 4.953,42	$ -	3.406,00	3241,00	6.647,00	16.871.348,5	$ 16.054.034,22	$ 32.925.382,74		$ -
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2		$ 52.948,33	$ -	96,35	137,20	233,55	5.101.614,0	$ 7.264.510,88	$ 12.366.124,83		$ -
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2		$ 53.858,79	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,11	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3		$ 180.903,59	$ -	24,00	28,00	52,00	4.341.686,2	$ 5.065.300,52	$ 9.406.986,68		$ -
	MAMPOSTERÍA							-					
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2		$ 26.760,01	$ -	126,09	185,53	311,62	3.374.169,7	$ 4.964.784,66	$ 8.338.954,32		$ -
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und		$ 5.988,18	$ -	8,00	8,00	16,00	47.905,4	$ 47.905,44	$ 95.810,88		$ -
	MORTEROS							-					
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2		$ 12.398,76	$ -	183,32	306,97	490,29	2.272.940,7	$ 3.806.047,36	$ 6.078.988,04		$ -
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2		$ 12.851,95	$ -	218,61	217,60	436,21	2.809.564,8	$ 2.796.584,32	$ 5.606.149,11		$ -
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2		$ 15.479,97	$ -	41,76	58,93	100,69	646.455,9	$ 912.157,23	$ 1.558.613,16		$ -
	ELEMENTOS							-					
3,17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und		$ 293.930,52	$ -	12,00	17,00	29,00	3.527.166,2	$ 4.996.818,84	$ 8.523.985,08		$ -
3,18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und		$ 45.618,89	$ -	52,00	60,00	112,00	2.372.182,3	$ 2.737.133,40	$ 5.109.315,68		$ -
3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 188.625,09	$ -	31,00	32,00	63,00	5.847.377,8	$ 6.036.002,88	$ 11.883.380,67		$ -
3,201	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und		$ 18.970,82	$ -	60,00	64,00	124,00	1.138.249,2	$ 1.214.132,48	$ 2.352.381,68		$ -
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2		$ 49.939,55	$ -	-	11,08	11,08	-	$ 553.330,21	$ 553.330,21		$ -
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	ML		$ 18.894,82	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und		$ 30.580,27	$ -	46,00	54,00	100,00	1.406.692,4	$ 1.651.334,58	$ 3.058.027,00		$ -
	ACABADOS							-					
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2		$ 31.418,61	$ -	13,64	0,00	13,64	428.549,8	$ -	$ 428.549,84		$ -
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2		$ 19.876,75	$ -	69,99	17,90	87,89	1.391.173,7	$ 355.793,83	$ 1.746.967,56		$ -
3,26	Recuperación de piso esmaltado	M2		$ 15.405,26	$ -	12,30	9,60	21,90	189.484,7	$ 147.890,50	$ 337.375,20		$ -
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2		$ 30.290,43	$ -	62,10	106,89	168,99	1.881.035,7	$ 3.237.804,64	$ 5.118.840,34		$ -
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2		$ 36.709,45	$ -	50,85	64,97	115,82	1.866.675,5	$ 2.385.012,97	$ 4.251.688,50		$ -
3,29	Estuco blanco en polvo para muros	M2		$ 4.777,63	$ -	600,69	822,90	1.423,59	2.869.874,6	$ 3.931.511,73	$ 6.801.386,29		$ -
	4. ACOMETIDAS							-					
	CONEXIONES							-					
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und		$ 121.071,76	$ -	3,00	2,00	5,00	363.215,3	$ 242.143,52	$ 605.358,80		$ -
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und		$ 132.377,90	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
4,3	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und		$ 28.070,96	$ -	2,00	1,00	3,00	56.141,9	$ 28.070,96	$ 84.212,88		$ -
4,4	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und		$ 27.279,28	$ -	1,00	1,00	2,00	27.279,3	$ 27.279,28	$ 54.558,56		$ -
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML		$ 78.181,52	$ -	66,80	96,90	163,70	5.222.525,5	$ 7.575.789,29	$ 12.798.314,83		$ -
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML		$ 12.950,73	$ -	84,00	54,00	138,00	1.087.861,3	$ 699.339,42	$ 1.787.200,74		$ -
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und		$ 69.790,32	$ -	59,00	64,00	123,00	4.117.628,9	$ 4.466.580,48	$ 8.584.209,36		$ -
	INTERVENCIONES VARIAS							-					

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2		$ 162.285,76	$ -	20,35	11,04	31,39	3.302.515,2	$ 1.791.634,79	$ 5.094.150,01		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN							-					
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M		$ 238.957,93	$ -	11,20	8,00	19,20	2.676.328,8	$ 1.911.663,44	$ 4.587.992,26		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.304.671.478,60**				**306.103.811,74**	**$ 362.363.468,36**	**$ 668.467.280,10**		**$ 636.204.198,50**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**422.583.091,93**				**99.147.024,63**	**$ 117.369.527,40**	**$ 216.516.552,02**		**$ 206.066.539,91**
	ADMINISTRACIÓN	**25,44%**			331.908.424,16				77.872.809,71	$ 92.185.266,35	$ 170.058.076,06		$ 161.850.348,10
	IMPREVISTOS	**1,00%**			13.046.714,79				3.061.038,12	$ 3.623.634,68	$ 6.684.672,80		$ 6.362.041,99
	UTILIDAD	**5,00%**			65.233.573,93				15.305.190,59	$ 18.118.173,42	$ 33.423.364,00		$ 31.810.209,93
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			12.394.379,05				2.907.986,21	$ 3.442.452,95	$ 6.350.439,16		$ 6.043.939,89
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.727.254.570,53**				**405.250.836,37**	**$ 479.732.995,76**	**$ 884.983.832,12**		**$ 842.270.738,41**
VALOR TOTAL (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)					**1.771.707.945,99**				**421.260.912,71**	**$ 491.327.716,02**	**$ 912.588.628,97**		**$ 859.119.317,02**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.771.707.945,99**	**V/R ANTICIPO (ACTIVIDAD 3):**	**$ 345.450.914,11**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO (ACTIVIDAD 3) :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.771.707.945,99	**% RETEGARANTIA:**	

% EJECUTADO PRESENTE ACTA:	**27,73%**
% FACTURADO PRESENTE ACTA:	**90% DEL ACTA**
	24,96%

FORMA DE PAGO: ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas parciales mensuales de obra e informe mensual del CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoría, acompañados de la respectiva factura o cuenta de cobro.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de las 3 Actividades, se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en la actividad de entrega de obras señalado en este estudio y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente durante la ejecución del contrato, dicha entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el anexo "ESQUEMA DE GARANTÍAS Y

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3) (90%)	% PAGADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	RETENCIÓN GARANTÍA (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (ACTIVIDAD 3)	SALDO POR AMORTIZAR (ACTIVIDAD 3)	VALOR NETO A PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	SALDO POR PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	% PAGADO ACUMULADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)
1	**COBRO ACTA PARCIAL No. 1 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)**		**$ 379.145.500,44**	**21,40%**		**$ 81.050.167,27**	**$ 264.400.746,84**	**$ 298.095.333,17**	**$ 1.473.612.612,82**	**21,40%**
2	**COBRO ACTA PARCIAL No. 2 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)**		**$ 442.218.303,32**	**24,96%**		**$ 95.946.599,15**	**$ 168.454.147,69**	**$ 346.271.704,170**	**$ 1.127.340.908,65**	**24,96%**
TOTAL			**$ 442.218.303,32**	**24,96%**	**$ -**	**$ 176.996.766,42**	**$ 432.854.894,53**	**$ 644.367.037,34**	**$ 1.127.340.908,65**	**46,36%**

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/08/2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT: 901568676 - 5

Aprobó
INTERVENTOR:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: ING. MARCY CORREA CASTAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA.
NIT: 800.173.768 -1

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ARQ. ERIKA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR - ENTerritorio

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las
Nota 2: Instrucciones para la firma
Nota 3: La vivienda identificada con código B-C-SM-MZ-VE-082 corresponde a una caseta tipo 4, que conforme al item contractual Incluye cubierta con teja en fibrocemento, sin embargo, esta caseta se construyó al interior de la vivienda por lo cual no se requirió la cubierta, en atención a lo anterior se retiro de este item los costos correspondientes a la cubierta, por lo cual no se paga la Unidad sino 0.88
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA

ANEXO 6 F-GG-03 – PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO POR LA FIRMA INTERVENTORA PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO


enterritorio	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-GG-03**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA :	**2022- 09-30**

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	18 Abril 22
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	2220576		
OBJETO	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.727.254.570,53		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUREDES		
INTERVENTOR	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	20,00 %	$ 345.450.914,11	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios	$ 17.272.545,71	5,00%
2	Transporte	$ 17.272.545,71	5,00%
3	Impuesto de Guerra	$ 17.272.545,71	5,00%
4	Compra de materiales	$ 293.633.277	85,00%
TOTAL		**$ 345.450.914,11**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	**CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE**	**Nombre**	**FEDERICO CARDONA PABON**
Cargo	Representante Legal Contratista de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901568676-5	**Cargo**	Representante Legal Arca Arquitectura e Ingeniería S.A

AVALÓ	
Firma	
Nombre	
Cargo	Designado Entidad Territorial

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2:

Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondienteinterventor.

Nota 3: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

Original: Enterritorio

Copias: Contratista, Interventoría

ANEXO 7. F-GG-36 – CONTROL DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022			**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**		**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576							
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR							
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99							
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES							
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA							
PLAZO:	5 MESES							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato	20% de la actividad N° 3			
ADICIÓN #1 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** X	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	46,36	
PÓLIZA No.	11 - 45 - 101112033			FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :	$354.450.914,10	
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42			PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$168.454.147,69			

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
23/08/2022	00000001	$379.145.500,44	$81.050.167,27
6/10/2022	00000002	$442.218.303,32	$95.946.599,15
TOTAL		$ 821.363.803,76	$ 176.996.766,42

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ

Firma

Nombre ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITÁN
Cargo Supervisor del Contrato

APROBÓ

Firma

Nombre CARLOS ANDRÉS BRAVO
Cargo Gerente del Convenio

ANEXO 8. F-GG-31 – INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. (ADJUNTAR SOPORTES)

enterritorio	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CÓDIGO:	F-GG-31
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022		**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576						
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR						
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99						
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES						
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA						
PLAZO:	5 MESES						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato		20% de la actividad N° 3		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**	**FIDUCIA**	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		46,36
POLIZA No.	11 - 45 - 101112033		FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :		$354.450.914,11
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42		PENDIENTE POR AMORTIZAR:		$168.454.147,69		

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	$ 137.788.300,24

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
11/07/2022	2	Salario Junio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$3.760.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$7.520.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Norelis Anaya			$2.040.000,00	$9.560.000,00
30/07/2022	2	Salario	Oswaldo Garzon			$3.360.000,00	$12.920.000,00
30/07/2022	2	Salario	Ronal Blanco			$3.340.000,00	$16.260.000,00
30/07/2022	2	Salario	Rafael Castillo			$1.012.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$17.272.545,00	

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
							$0,00
							$0,00
							$0,00
							$0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$0,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
3/06/2022	2	Transporte de Cerámica				$1.782.000,00	$1.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Herramientas y Equipos Menores				$5.000.000,00	$6.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Materiales Petreos				$1.875.000,00	$8.657.000,00
29/06/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$9.845.000,00
22/07/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$11.033.000,00
30/07/2022	2	Transporte de Puertas Metalicas y Bloques				$6.239.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							$191.218.812,00
30/07/2022	2	Compra de cemento gris 50 kg Argos	G Y J FERRETERÍA SA	800130426 - 3		$10.599.925,00	$201.818.737,00
15/07/2022	2	Compra de Acero	ConcreAceros	900507746 - 8		$17.983.295,00	$219.802.032,00
26/07/2022	2	Compra de Medidores	ACUATUBOS SAS	800226360-1		$8.108.898,00	$227.910.930,00
26/07/2022	2	Compra Tub y Accesorios PVC	Ingrid del CarmenOchoa Valeth	22854952-1		$54.845.055,00	$282.755.985,00
23/06/2022	2	Compra de Puertas Metalicas	METALICAS Y ALUMINIOS WILLIAMS	901038925-0		$10.877.292,00	$293.633.277,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$293.633.277,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

OTROS - Exclusivamente del Proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE Nº	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto							
Nuevo acumulado por este concepto							

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:	0
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:	$354.450.914,11
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:	$1,41
Nuevo saldo de anticipo en numero:	**$1,41**
Nuevo saldo de anticipo en letras:	**CERO PESOS**

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ

Firma

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Obra

APROBÓ

Firma Harcy A. Correa C

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Interventoría

APROBÓ

Firma

Nombre

Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

ANEXO 9. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) 001876402917615 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Cód. 2 3

24. Dirección
CR 24 15 17 BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Sucre	San Marcos

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-05-21 / 09:31:46 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 85474042 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUREDES

997. Fecha formalización 2022-05-21 09:31:46

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) **001876402917615 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUREDES CR 24 15 17 BRR CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRED	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ANEXO 10. CERTIFICACIÓN BANCARIA (VIGENTE NO MAYOR A 30 DÍAS)

Certificado
Bancario

Martes, 20 de septiembre de 2022

Señor(a)
ENTERRITORIO

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CONSTRUREDES identificado(a) con NIT 901568676, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53100001020	2022/03/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ANEXO 11. RUT ACTUALIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

¡Bienvenido, ahora eres usuario activo de la DIAN!

Trabajaremos juntos por una Colombia más honesta

Queremos decirte que puedes contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora tienes algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso aquí estamos para responderte:

1. **¿El RUT tiene fecha de vencimiento?**
   No, el RUT no tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.

2. **¿Cuándo debes actualizar el RUT?**
   Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debes realizarla dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.

3. **¿Debes crear una cuenta en la página de la DIAN?**
   Sí, es muy importante, así podrás ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, tendrás acceso a información de tu interés.

4. **¿Qué beneficios tienes al crear la cuenta?**
   Podrás obtener la copia de tu RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y presentar las declaraciones tributarias, entre otros.

5. **¿Estás obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?**
   Si la respuesta es SÍ, debes activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrás presentar las declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información exógena, entre otras.

6. **¿Si necesitas orientación en temas tributarios, qué puedes hacer?**
   Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales brindan orientación acertada y confiable gratuita.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de los siguientes medios:

Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención: 057(1) 3556922
Puntos de atención.

¡Muchas gracias por creer en Colombia!

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14814187508

(415)7707212489984(8020) 000001481418750 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	San Marcos 7 0 8

41. Dirección principal
CR 24 15 17 BRR CENTRO

42. Correo electrónico cabeto25@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 2 9 5 3 0 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 2 2 0 2 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 27 61. Fecha 2022 - 02 - 23 / 10 : 33: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROCHA MENDOZA LILIA
985. Cargo Analista III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **000001481418750 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 2 1 8
81. Hasta	2 0 3 0 0 2 1 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 2 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **000001481418750 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 0 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 5 4 7 4 0 4 2			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
GUTIERREZ	URIBE	CARLOS	ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 0 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 3 9 7 4 0			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
URIBE	CARRIAZO	MARCO	TULIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **0000014814187508**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 1 6 2 5 1	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INMAQ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 2 0 2 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 1 9 7 7 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GEOINGENIERIA LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 2 0 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ANEXO 12. PAGO DE APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1657431678	9440128219	E	2022/09/19	2022/09/16	BANCOLOMBIA	0	$5,738,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	11	$733,334	$117,400	MIN002	11	$733,334	$29,400	CCF41	11	$733,334	$29,400	14-11	11	$733,334	$51,100	11	$0	$0
4	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$18,533,334**	**$2,965,400**			**$18,533,334**	**$741,400**			**$18,533,334**	**$741,400**			**$18,533,334**	**$1,290,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,965,400	$0	$0	$2,965,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$720,000	$0	$0	$720,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,925,400	$0	$0	$1,925,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,290,000	$0	$0	$1,290,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,290,000	$0	$0	$1,290,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$741,400	$0	$0	$741,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$741,400	$0	$0	$741,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$741,400	$0	$0	$741,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$29,400	$0	$0	$29,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**11**	**$5,738,200**	**$0**	**$0**	**$5,738,200**

2022/09/16 02:42 PM

ANEXO 13. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES (REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1466A89FFF494309

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR DARIO SOTO SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78702431 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 63631-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 85.474.042 de Santa Marta, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUREDES identificado con el Nit. No. 901.568.676-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por el CONSORCIO. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


En constancia, se firma en San Marcos a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.



CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE
C. C. No. 85.474.042 de Santa Marta
CONSORCIO CONSTRUREDES
Representante Legal

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022

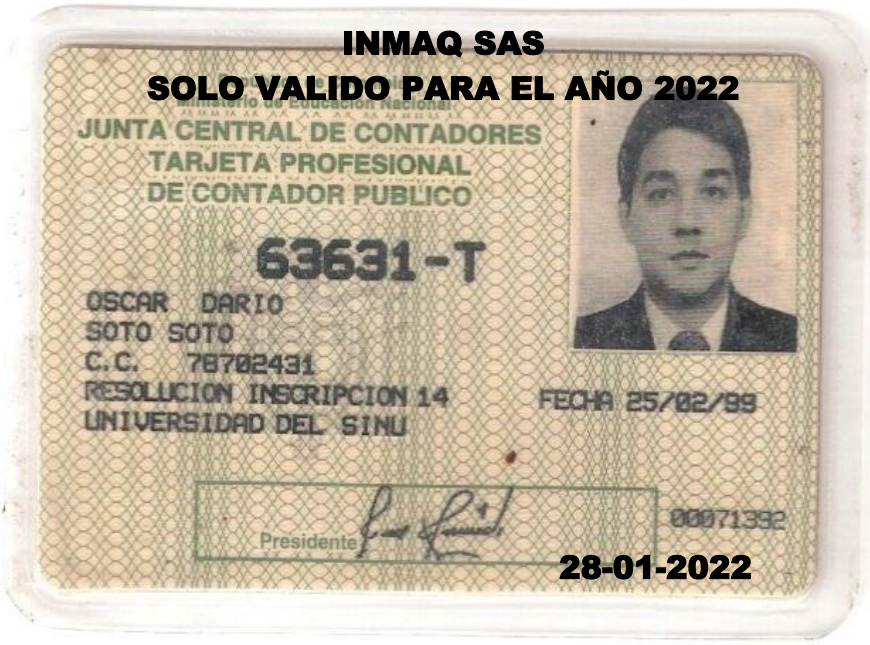

28-01-2022

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022





24-MAR-1970

MONTERIA
(CORDOBA)

1.70 AB+ M

28-AGO-1988 MONTERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

INMAQ

VALIDO SOLO POR EL AÑO 2022

NUMERO 78.702.431

SOTO SOTO

APELLIDOS

OSCAR DARIO

NOMBRES

FIRMA

06-05-2022



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ENE-1973**

SAN ANDRES DE SOTAVENTO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1992 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00404747-F-0040926744-20121012 **0031388573A** 1 7842057607



FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.926.744 de Riohacha y Tarjeta Profesional No. 97057-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOINGENIERIA LIMITADA** identificada con Nit. Nº 900.019.772-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Riohacha a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,

MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA
C.C. No. 40.926.744 de Riohacha
T.P. No. 97057-T

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, OSCAR DARIO SOTO SOTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.702.431 de Montería y Tarjeta Profesional No. 63631-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INMAQ S.A.S. identificada con Nit. Nº 800.216.251-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en San Marcos a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.

OSCAR DARIO SOTO SOTO
T. P. No. 63631-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 2 A 2 7 8 9 B A 5 C E 5 C 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40926744 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 97057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

97057-T

MARIA DEL SOCORRO
COVO POSADA
C.C. 40926744
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD C. U. DE LA COSTA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

106880



FIRMA DEL TITULAR

016538

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022, **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A** con **NIT: 800173768-1**, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al tercer día (3) del mes de octubre de 2022.

Marcy A. Correa C

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años
Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	Bosconia Cesar	Aprobar la CESION DEL 100% de los derechos preferencias. beneficios y obligaciones emanados del Contrato de concesion 0363-20, de la Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A a favor de la Sociedad MARMOLES VENEZIANOS LTDA., segun Resolucion 00006 del 11/01/2012 y modificada con la Resolucion 000162 del 24/09/2012.	Resolución 1266 del 2008	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

Formato
Informe HSE Interventoría No 05
IN-FO-13 V-1

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	PERIODO			1 al 30 de septiembre de 2022		
		CUMPLIMIENTO					
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN GENERAL (CONTRATISTA)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual fue avalado mediante el informe técnico de especialista HSE # 4 emitido el 25 de abril del 2022, en el transcurso del periodo se evidencia la afiliaciones del personal que esta realizando el diagnóstico de las viviendas. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 93,1%. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoria
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social de 33 personas y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, así mismo son verificados por la interventoria donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoría.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoría.
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por Interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP, uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por COVID -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y ponte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterrriorio.		X		80%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene realizo la conformación de la brigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 93,1 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ COPAST Y CONVIVENCIA.	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 17 de septiembre del 2022, para el periodo no aplica realizar reunión de comité de convivencia laboral.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comités.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	El CONSORCIO CONSTRUREDES tiene pendiente la entrega de los paz y salvos del personal retirado del proyecto,			X	0%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo en trabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecanicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas, el área de la ZMPA se encuentra organizada y aseada. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 1266 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A. está avalado para explotación y comercialización de material pétreo, se solicita al contratista realizar el requerimiento al proveedor la actualización del título minero HHNL-20ya que se tenía vigente hasta el 02 de agosto del 2022. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	Para este periodo solo se generaron Residuos de Construcción y Demolición, el material es reutilizado como relleno en las mismas excavaciones realizadas, es importante aclarar que la excavación es mínima.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia un vehículo, el uso de herramientas menores (pulidoras) que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para -1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Evaluación Inicial, Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadísticas de Incidentes, Alertas de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quienes apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con fechas vigentes a la EPS, ARL , AFP ,CCF , a todos los profesionales se les han realizado los exámenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obra, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas de emisiones atmosféricas, Control de plagas. Licencias, permisos y bitácoras, Manejo de campamentos transitorios, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST

CONSTANTE K 200

PERIODO	No TOTAL DE PERSONAL MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		ACCIDENTES LABORALES		No DIAS DE INCAPACIDADES CAUSADAS		No ACCIDENTES		No. ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS POLITO MORTAL		AUSENTISMO LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	DIAY HORA DIATA	DIAY HORA MIXTA	CNATA HORA DIATA	CNATA HORA MIX	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MAYO	n	n	n	336	n	1056	336	336	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
JUNIO	33	33	n	2640	n	8304	2640	2640	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
JULIO	33	33	n	2640	n	8304	2640	2640	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
AGOSTO	33	33	n	2640	n	8304	2640	2640	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
SEPTIEMBRE	0	33	0	2640	0	8304	2640	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTUBRE																						

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS DIAS PERDIDOS LABORALES		MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA DISCAPACIDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO DIARIO		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				PERSONAL/COPAST COPAST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				PRESENTACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	No. de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de veces de reunión mensual	No total de veces al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas en mes	No. Actividades Programadas	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o Incidentes reportados	No accidentes y/o Incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	0	0	0%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JUNIO	0	0	0%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JULIO	0	0	0%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
AGOSTO	0	0	0%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
SEPTIEMBRE	0	0	0%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
OCTUBRE	0		0%													

Formato
Informe HSE Interventoría No 05
IN-FO-11 V:1

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	PERIODO	1 al 30 de septiembre de 2022

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD
N/A				N/A				N/A		

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
septiembre-22	Elemento de protección personal	X	
septiembre-22	Actos y condiciones seguras	X	

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, chatarra)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	ESCOMBROS	EXCAVACION	RECOBRO	RECOMENDACIÓN	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
JUNIO	ARENA DE RIO	31	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	32	Reutilización de material de excavación en relleno	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	31														
JULIO	ARENA DE RIO	31	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	65	Reutilización de material de excavación en relleno	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	30														
AGOSTO	ARENA DE RIO	119	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	27	Reutilización de material de excavación en relleno	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	70														
SEPTIEMBRE	ARENA DE RIO	98	Licencia Ambiental de la Resolución 1046 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A.	0	0	0	0	0	0	42	Reutilización de material de excavación en relleno	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	50														
OCTUBRE																

Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.

FOTOGRAFÍA







UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO: INSPECCIÓN DE CONDICIONES HSE









UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: **En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 88,5 % con los aspectos de Seguridad Industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de toda la documentación completa del personal que ingresa al proyecto, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, por lo tanto la Interventoría genera un llamado de atención al contratista para que le dé cumplimiento a estos requerimientos, falta de entrega de paz y salvos de personal retirado del proyecto, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.**

T.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR
