CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	SI	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	18-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22	NO	NO	23-ago-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	21/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	216	210	134	0	76	110	24	51	0	33	0	217	238	29	220	1	146	101	0	45	152
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**216**	**210**	**134**	**0**	**76**	**110**	**24**	**51**	**0**	**33**	**0**	**217**	**238**	**29**	**220**	**1**	**146**	**101**	**0**	**45**	**152**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/08/2022 Y EL 4/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 04/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		X
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		X
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		X
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		X
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		X
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		X
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		X
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		X
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X

SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**

SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	90%	Caseta t3	$8.339.015,83	$7.505.114,25	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	90%	Adecuacion	$7.760.503,36	$6.984.453,02	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	90%	Caseta t2	$8.292.567,48	$7.463.310,73	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	90%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.123.180,33	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	90%	Adecuacion	$7.419.892,36	$6.677.903,12	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	90%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.162.273,24	28/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	90%	Adecuacion	$8.011.976,60	$7.210.778,94	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	90%	Adecuacion	$9.653.914,02	$8.688.522,62	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	90%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.161.606,64	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	90%	Adecuacion	$9.325.691,25	$8.393.122,13	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	90%	Adecuacion	$7.000.723,74	$6.300.651,37	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	90%	Caseta t3	$8.259.418,86	$7.433.476,97	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	90%	Adecuacion	$7.334.345,73	$6.600.911,16	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	90%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.037.729,55	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	90%	Caseta t3	$8.116.195,29	$7.304.575,76	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	80%	Caseta t3	$6.887.962,53	$5.510.370,02	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	80%	Caseta t3	$7.841.298,86	$6.273.039,09	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	80%	Caseta t2	$7.814.305,69	$6.251.444,55	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	80%	Caseta t4	$9.602.086,12	$7.681.668,90	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	80%	Caseta t3	$8.240.626,46	$6.592.501,17	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	80%	Caseta t2	$8.314.938,30	$6.651.950,64	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	80%	Adecuacion	$7.662.197,96	$6.129.758,37	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	80%	Caseta t4	$8.665.155,76	$6.932.124,61	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	80%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	**TERMINADA**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	70%	Adecuacion	$6.476.015,92	$4.533.211,14	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	70%	Adecuacion	$6.842.321,91	$4.789.625,34	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	130	B-C-SM-MZ92-VE-170	70%	Adecuacion	$6.456.971,29	$4.519.879,90	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	131	B-C-SM-MZ91-VE-171	70%	Adecuacion	$7.013.453,53	$4.909.417,47	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	132	B-C-SM-MZ75-VE-172	70%	Adecuacion	$8.210.038,73	$5.747.027,11	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	133	B-C-SM-MZ-VE56-192	70%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.047.394,22	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	10	134	B-C-SM-MZ33-VE-194	70%	Adecuacion	$7.097.058,66	$4.967.941,06	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	60%	Adecuacion	$7.943.448,36	$4.766.069,02	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	60%	Adecuacion	$7.982.813,63	$4.789.688,18	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	60%	Adecuacion	$7.475.616,81	$4.485.370,09	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	60%	Adecuacion	$7.034.505,34	$4.220.703,20	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	60%	Adecuacion	$5.856.785,90	$3.514.071,54	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	60%	Caseta t3	$8.204.915,74	$4.922.949,44	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	60%	Caseta t3	$7.853.199,32	$4.711.919,59	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	60%	Adecuacion	$8.272.491,16	$4.963.494,70	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	60%	Adecuacion	$6.742.842,11	$4.045.705,27	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	60%	Adecuacion	$6.326.983,38	$3.796.190,03	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	25%	Adecuacion	$7.415.421,93	$1.853.855,48	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	25%	Adecuacion	$7.430.942,29	$1.857.735,57	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	25%	Adecuacion	$3.514.863,97	$878.715,99	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM		148														
SM		149														
SM		150														
SM		151														
SM		152														
SM		153														
SM		154														
SM		156														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	37,33%	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**70,05%**	**152**	**$ 1.209.874.169,22**		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**46,54%**	**101**	**$ 770.397.786,44**		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 04-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	2
20	1	1	2
21	1	1	2
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
TOTAL	**24**	**24**	**45**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 30 de agosto, 2022

	Hoy 29 AGO	Mañana 30 AGO	Miércoles 31 AGO	Jueves 01 SEP	Viernes 02 SEP	Sábado 03 SEP	Domingo 04 SEP
Hora	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 25°
08:00	27°	25°	25°	25°	25°	26°	26°
14:00	32°	30°	30°	31°	31°	31°	31°
20:00	26°	26°	25°	26°	26°	26°	26°
Lluvia	1.1 mm	3.4 mm	10.8 mm	5.4 mm	7.2 mm	5.7 mm	5.2 mm
Viento	← 11 km/h	↑ 10 km/h	↑ 8 km/h	↑ 8 km/h	↑ 9 km/h	↘ 8 km/h	↘ 6 km/h
	05:51	05:51	05:50	05:50	05:50	05:50	05:50
	18:09	18:09	18:08	18:08	18:07	18:06	18:06

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28°	29°	30°	31°	32°	32°	32°	31°	30°	27°	26°	26°	26°	25°	25°

daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Leydi Castaño <asistente.medellin@grupoarca.com.co>
Enviado: martes, 4 de octubre de 2022 6:07 p. m.
Para: Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>; Interventoría Intradomiciliarias <intradomiciliariasarca@gmail.com>
Cc: Marcy Correa <marcy.correa@grupoarca.com.co>; Karen Martinez <karen.martinez@grupoarca.com.co>
Asunto: RE: GER105-E REMISIÓN INFORME SEMANAL 19

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

[El texto citado está oculto]

20224300373712.pdf
3733K

daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Leydi Castaño <asistente.medellin@grupoarca.com.co>
Enviado: martes, 4 de octubre de 2022 6:07 p. m.
Para: Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>; Interventoría Intradomiciliarias <intradomiciliariasarca@gmail.com>
Cc: Marcy Correa <marcy.correa@grupoarca.com.co>; Karen Martinez <karen.martinez@grupoarca.com.co>
Asunto: RE: GER105-E REMISIÓN INFORME SEMANAL 19

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

[El texto citado está oculto]

20224300373712.pdf
3733K

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 20 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-103-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4. DE INTERVENTORÍA. PERIODO FACTURADO DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos el acta parcial No. 4 para el cobro del periodo del 27 de julio de 2022 al 27 de agosto del 2022 del contrato en referencia, la cual contienen los siguientes documentos:

- Oficio de remisión del acta parcial de Interventoría.
- F-FI-06 Certificación de cumplimiento para el pago.
- Factura de Venta.
- F-GG-32 Acta de recibo parcial y balance presupuestal.
- Resolución de factura.
- Certificación Bancaria vigente.
- RUT-Con expedición menor a un mes.
- Pago de aportes de Seguridad Social - personal mínimo aprobado.

- Parafiscales (Revisor fiscal)
- Pantallazo plataforma SECOP II, cargue de informe mensual.
- Aprobación informe mensual por parte de la supervisión.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: Lo enunciado.
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

F-FI-06 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO	CÓDIGO:	F-FI-06
enterritorio		VERSIÓN:	2
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	1/07/2021

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.**

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 800.173.768 **DV:** 1

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 2442000 **CORREO ELECTRÓNICO** yolanda.rodriguez@grupoarca.com.co

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [X] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	16.198.345,04
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	23.285.120,99

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 221005 **No. CONTRATO** 2220587 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

No. PROCESO CONTRACTUAL INA-036-2021

FACTURA No. **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

2, PERIODO DE COBRO

INICIO 27/07/2022 **FIN** 27/08/2022 **DESEMBOLSO Nº** 4 **VALOR BRUTO $** 39.483.466,03

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			
NIT / C.C.:	79.702.746		52.008.866
NOMBRE:	Federico Cardona Pabón		Erika Marcela Gutierrez Gaitán

OBSERVACIONES:

Afectación presupuestal: RP 2544

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

Carlos Andres Bravo

ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACION GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantía:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso Nº:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

	3. APROBACIONES
a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

FACTURA DE VENTA.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO



ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
AVENIDA CARRERA 28 37 38
2442900
Subgerencia.financiera@grupoarca.com.co
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

-100177

NIT. 800173768-1

RESOLUCION No. 18764034364770 NUMERACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN. 09/09/2022 HASTA 23/08/2023 AUTORIZA DESDE -100175 HASTA -100901

Cliente:	NIT o C.C:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTerritorio	899999316 - 1

Dirección:	Ciudad:
CLL 26 # 13 - 19	BOGOTA D.C

Correo electrónico:	Teléfono:
facturacionelectronica@enterritorio.gov.co;kjavela@enterritorio.gov.co;yolanda.rodriguez@grupoarca.com.co	5940407

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2022-09-20	2022-10-20

Método de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Terminos de Pago	30 días
Moneda	COP
Tasa de Cambio	0.00
Incoterm	

N°	Código	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Precio Unitario	Tipo Impuesto	Tasa Impuesto	Base Impuesto	Impuesto	Total
1	INT	Pago correspondiente al Acta de Interventoría N° 4, pago fijo mensual (del periodo comprendido del 27 de julio al 27 de agosto de 2022). Según contrato No. 2220587 de 2022, cuyo Objeto es: la "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar".	1	cada	13,612,054.66	IVA	19.00 %	13,612,054.66	2,586,290.38	13,612,054.66
2	INT	Pago correspondiente al Acta de Interventoría N° 4, pago por Avance (del periodo comprendido del 27 de julio al 27 de agosto de 2022). Segun contrato No. 2220587 de 2022, cuyo Objeto es: la "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar".	1	unidad	19,567,328.56	IVA	19.00 %	19,567,328.56	3,717,792.43	19,567,328.56

Total Items: 2 Total Cantidad: 2 Actividad Económica 7110: Responsables de IVA:

Monto en letra: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100 COP

Observaciones: FAVOR HACER TRANSFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE EN LA CUENTA CORRIENTE No: 256-02666-7 A NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA NIT 800.147.640-8

SUBTOTAL	33,179,383.22
I.V.A	6,304,082.81
I.N.C	0.00
IMP. AL CONSUMO	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
DESCUENTO	0.00
CARGO	0.00
VALOR TOTAL	39,483,466.03
VALOR TOTAL A PAGAR	39,483,466.03

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE:
c52519f0e50d67ebb68864d3db0f0a0b2c7083aa5fed5e02334b166efb387d893892e6a08bd23b5c640bbbcda8ce77ec

SELLO:
MIIHPTCCBSWgAwIBAgIKKlFQqPzMIHMiTjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIxMTEyNTIzMzcwMFoXDTIyMTEyNTIzMzcwMFowggFiMR0wGwYDVQQJDBRDQVJSRVJBIDcgIyA2IEMgLS

Fecha y hora de generación : 2022-09-20 00:00:00
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2022-09-20 15:41: 11-05:00

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

F-GG-32 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 4

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220587 DE 2022

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolivar

CONTRATISTA : ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA

SUPERVISOR: Érika Marcela Gutierrez Gaitán

PERÍODO A PAGAR: **DEL 27/07/2022 AL 27/08/2022**

En Bogotá D.C, a los treinta y ún (31) días del mes de Agosto del año 2022 se reunieron Marcy Alejandra Correa Castaño Directora de Interventoría y Karol Yulieth Javela Pérez Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	5	$ 13.612.054,66	$ 68.060.273,28	3,00	1,00	4,00	40.836.163,98	$ 13.612.054,66	$ 54.448.218,64	1,00	$ 13.612.054,64
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 85.075.341,60	$ 85.075.341,60	-	0,23	0	-	$ 19.567.328,57	$ 19.567.328,57	0,77	$ 65.508.013,03
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 17.015.068,32	$ 17.015.068,32	-	-	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.015.068,32
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 170.150.683,19**				**40.836.163,98**	**$ 33.179.383,22**	**$ 74.015.547,20**		**$ 96.135.135,98**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 32.328.629,81**				**7.758.871,15**	**6.304.082,81**	**$ 14.062.953,96**		**$ 18.265.675,85**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19,00%**			$ 32.328.629,81				7.758.871,15	$ 6.304.082,81	$ 14.062.953,96		$ 18.265.675,85
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 202.479.313,00**				**48.595.035,13**	**$ 39.483.466,03**	**$ 88.078.501,16**		**$ 114.400.811,83**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: **202.479.313,00**
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO 202.479.313,00

V/R ANTICIPO: **N/A**
% ANTICIPO : **N/A**
% RETEGARANTIA : **N/A**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 26 de abril de 2022 al 26 de mayo de 2022	6-jul.-22	$ 16.198.345,05	8,00%	N/A	N/A	N/A	$ 16.198.345,05	$ 186.280.967,95	8,00%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 27 de mayo de 2022 al 27 de junio de 2022	28-jul.-22	$ 16.198.345,04	8,00%	N/A	N/A	N/A	$ 16.198.345,04	$ 170.082.622,91	16,00%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoría comprendido al periodo del 27 de junio de 2022 al 27 de julio de 2022	9-jul.-22	$ 16.198.345,04	8,00%	N/A	N/A	N/A	$ 16.198.345,04	$ 153.884.277,87	24,00%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoría comprendido al periodo del 27 de julio de 2022 al 27 de agosto de 2022		$ 39.483.466,03	19,50%	N/A	N/A	N/A	$ 39.483.466,03	$ 114.400.811,84	43,50%
TOTAL			**$ 88.078.501,16**	**43,50%**	-	-	-	**$ 88.078.501,16**	**$ 114.400.811,84**	**43,50%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de septiembre de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: FEDERICO CARDONA PAJON
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA

Aprobó

Firma:
Nombre: ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

RESOLUCIÓN DE FACTURA.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764016492741

(415)7707212489984(8020) 001876401649274 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1				

11. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AVENIDA CARRERA 28 37 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-08-17 / 04:56:31 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres CARDONA PABON FEDERICO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79482309 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2021-08-17 16:56:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764016492741

(415)7707212489984(8020) **001876401649274 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1				

11. Razón social

ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. AVENIDA CARRERA 28 37 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		100,103	100,901	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

2022 - 98401

Bogotá, 30 de agosto de 2022

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA
OCCIRENTA
NIT 800.147.640 – 8

CERTIFICA QUE:

ARCA – ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. identificado con **Nit. 800.173.768-1,** maneja inversiones en nuestro fondo de inversión colectiva sin pacto de permanencia Occirenta Nit. 800.147.640-8, como se relaciona a continuación:

Número de Inversión	1001201003580
Estado	Activo

Para realizar aportes a la Inversión debe realizar lo siguiente:

- De Ctas Bco Occidente a Fiduinversiones: El cliente radica la carta en la oficina banco y ésta la realiza por el canal.
- De Otros bancos a Fiduinversiones:

1. El cliente remite al buzón de aportes@fiduoccidente.com.co el soporte con el timbre del banco de donde salen los recursos hacia la Fiduciaria.

2. Si tiene Director Comercial / Oficiales asignados, el cliente le hace llegar el soporte y luego se remite al buzón de aportes.

3. El cliente radica el soporte con el timbre del banco origen, en cualquiera de las oficinas Bco Occidente y ellos lo envían al buzón de Aportes

Nota: Tener en cuenta que se debe enviar una única vez para evitar abonos dobles realizados por la oficina y por la Fiduciaria.

- Horario para adiciones en oficina: 8:30am – 3:00pm
- Usted tendrá la posibilidad de transferir o adicionar recursos desde las siguientes cuentas :

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec internacional Código SC 2821-1

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

NUMERO CUENTA	BANCO	TIPO CUENTA	FONDO
256-02666-7	OCCIDENTE	CORRIENTE	OCCIRENTA
000-58686-7	BOGOTA	AHORROS	OCCIRENTA
031-0768249-9	BANCOLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
150-72038-1	POPULAR	AHORROS	OCCIRENTA
90110518510	GNB SUDAMERIS	AHORROS	OCCIRENTA
506-1949-013	CITIBANK COLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
00083163-1	AV VILLAS	AHORROS	OCCIRENTA
012-211696-4	COLPATRIA	AHORROS	OCCIRENTA
00650-031753-9	DAVIVIENDA	AHORROS	OCCIRENTA
005-51167-9	HELM BANK	AHORROS	OCCIRENTA
039-06789-7	CORPBANCA	AHORROS	OCCIRENTA
309-00194-9	BBVA COLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
24020700386	CAJA SOCIAL	AHORROS	OCCIRENTA
010503231513	BANCOOMEVA	AHORROS	OCCIRENTA

Esta certificación se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Bogotá a los 30 días del mes de agosto de 2022, con destino a la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO, NIT 899.999.316-1.**

Cordialmente,

Katherine Jimenez

KATHERINE JIMENEZ

Unidad de atención al consumidor financiero

Los Clientes de Fiduciaria de Occidente S.A. cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero, quien da trámite gratuitamente a las quejas por posibles incumplimientos de las normas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ella presta, o respecto de su calidad. También es vocero del Cliente ante los estamentos directivos de la Fiduciaria, lo cual implica la posibilidad de dirigirle recomendaciones, propuestas y peticiones sobre aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Clientes. "Sólo es necesario indicar el motivo de la queja o recomendación, describir los hechos y los derechos que se consideren vulnerados e incluir la identificación y demás datos para contactar al Cliente y hacerle llegar la respuesta." El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora Lina María Zorro Cerón y su suplente es la doctora Bertha García Meza, podrá dirigirse a ellos a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a Lzorro@bancodeoccidente.com.co, ó defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o a la Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 7462060 Ext. 15318 y 15311 Fax 3121024 ó a cualquier oficina de Fiduoccidente, ó a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec internacional Código SC 2821-1

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

RUT-CON EXPEDICIÓN MENOR A UN MES.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844708886

(415)7707212489984(8020) 000001484470888 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AVENIDA CARRERA 28 37 38

42. Correo electrónico miguel.cardenas@grupoarca.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 1 2 4 4 2 9 0 0	6 0 1 2 4 4 2 9 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	1 9 9 2 0 8 1 4	4 2 9 0	1 9 9 2 0 8 1 4		7 1 2 0	7 4 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 13 : 55: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844708886

(415)7707212489984(8020) **000001484470888 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 3 5 7	0 7 5 3
73. Fecha	1 9 9 2 0 8 1 4	2 0 2 0 0 2 2 0
74. Número de notaría	3 0	7 3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 9 0 4	2 0 2 0 0 2 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 1 4 2 1 9	0 0 5 1 4 2 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 4 2 6
81. Hasta	2 0 2 9 0 9 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	9 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 0 9 0 9 2 4		-
3	3 6	2 0 2 1 0 5 2 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844708886

(415)7707212489984(8020) **000001484470888 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 8 2 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	PABON	FEDERICO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 0 2 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	ROJAS	CARLOS	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844708886

(415)7707212489984(8020) **000001484470888 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 4 8 2 3 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARDONA	PABON	FEDERICO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 2 6	2 0 1 6 0 3 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 2 2 8 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BORRERO	PABON	MATEO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 2 6	2 0 1 6 0 3 1 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 0 2 7 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MALAVER	ROJAS	CARLOS	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 9 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 5 1 1 8 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	SANZON	MARIA	ALEJANDRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 3 1 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 3 3 4 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	GACHARNA	RAQUEL	AURORA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 4 0 2 0 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844708886

(415)7707212489984(8020) **000001484470888 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 2 5 3 9		7 4 4 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MAYORGA	ALMEIDA	CARLOS	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 1 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 5 7 2 1		8 0 4 0 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASCARDO	RINCON	HUGO	FRANCISCO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 1 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14844708886

(415)7707212489984(8020) **000001484470888 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL MÍNIMO APROBADO.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52885857

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRACION

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846682033**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1582961148		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 52885857	LEMUS GOMEZ YIRA	DEPEND		$ 3.561.600	FIJO																22-29				25-14 COLPENSIONES	8	$ 949.600	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.000	EPS008-COMPENSAR	8	$ 949.600	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 949.600		$ 0	8	$ 949.600	CCF24-COMPENSAR	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 52885857	LEMUS GOMEZ YIRA	DEPEND		$ 3.561.600	FIJO																				25-14 COLPENSIONES	22	$ 2.611.840	$ 417.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 417.900	EPS008-COMPENSAR	22	$ 2.611.840	$ 104.500	$ 0	$ 104.500	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.611.840		$ 181.800	22	$ 2.611.840	CCF24-COMPENSAR	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.036.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	RONALD JAVIER	Apellidos	ARRIETA MONTERROZA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	78380772
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 3.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 480.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 480.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 120.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 120.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 208.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 3.000.000	$ 120.000

TOTAL PAGADO:	**$ 928.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	65 - OFICINA MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844627248**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/10
Número Autorización	1596714002		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARCY ALEJANDRA	Apellidos	CORREA CASTAÑO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	43160977
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 4.673.760	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.673.760
FSP - Solidaridad	$ 23.400	Cotización Obligatoria	$ 747.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 23.400
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 794.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.673.760
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 187.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 187.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.673.760
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 325.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 4.673.760	$ 187.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.494.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52885857

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRACION

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846682033**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1582961148		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 52885857	LEMUS GOMEZ YIRA	DEPEND		$ 3.561.600	FIJO																22-29				25-14 COLPENSIONES	8	$ 949.600	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.000	EPS008-COMPENSAR	8	$ 949.600	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 949.600		$ 0	8	$ 949.600	CCF24-COMPENSAR	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 52885857	LEMUS GOMEZ YIRA	DEPEND		$ 3.561.600	FIJO																				25-14 COLPENSIONES	22	$ 2.611.840	$ 417.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 417.900	EPS008-COMPENSAR	22	$ 2.611.840	$ 104.500	$ 0	$ 104.500	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.611.840		$ 181.800	22	$ 2.611.840	CCF24-COMPENSAR	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.036.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	RONALD JAVIER	Apellidos	ARRIETA MONTERROZA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	78380772
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 3.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 480.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 480.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 120.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 120.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 208.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 3.000.000	$ 120.000

TOTAL PAGADO:	**$ 928.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049454594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LEYDIS KATHERINE	Apellidos	HERRERA PALOMINO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049454594
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 224.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 224.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 56.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 56.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 97.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.400.000	$ 56.000

TOTAL PAGADO:	**$ 433.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7846682033**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/02
Número Autorización	1582961148		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMMA FERNANDA	Apellidos	GRIJALBA BOLAÑOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1085294161
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.798.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.798.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 287.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 287.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.798.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 72.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 72.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.798.500
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.798.500	$ 72.000

TOTAL PAGADO:	**$ 441.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1233339123

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIAMYS EMELLY	Apellidos	SANCHEZ PORTILLO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1233339123
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 240.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 240.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 60.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 60.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.500.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 104.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.500.000	$ 60.000

TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRACION

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846682033**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1582961148

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
25	CC 80192920	FORERO ANAYA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.559.391	FIJO																25-26				230301-PORVENIR	2	$ 170.627	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 170.627	$ 6.900	$ 0	$ 6.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 170.627		$ 0	2	$ 170.627	CCF24-COMPENSAR	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 80192920	FORERO ANAYA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.559.391	FIJO																				230301-PORVENIR	28	$ 2.388.765	$ 382.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 382.300	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.388.765	$ 95.600	$ 0	$ 95.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.388.765		$ 12.500	28	$ 2.388.765	CCF24-COMPENSAR	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 627.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ARL | sura

Medellín, 24 de agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000020 OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1102882556	OCHOA MENDEZ MARIELIS VANESSA	29/08/2022		156o9259	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/08/2022 16:17:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.48.216.250, 192.230.104.12, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

No. de Radicación

Fecha de Radicación D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐	A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia ☐ -Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) — A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: OCHOA	Segundo apellido: MENDEZ	Primer nombre: MARIE/IS	Segundo nombre: VANESSA

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.102.682.566	Femenino X Masculino ☐	0 2 0 6 1 1 9 9 8

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M — Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA	PROTECCION	1'500.000

18. Residencia	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico
cra 35 #13-60 Sincelejo		3004020196	mariel.sbamendez@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona		Localidad/Comuna	Departamento
Sincelejo	Urbana X Rural ☐		Portenir	Sucre

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
MECA Arquitectura e Ing. S.A.	NIT	800.173.768-1	

39. Ubicación Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Av. Cra 28 #37-38	2442500	g.talentohumano@sopreca.com.co	Sincelejo	Sucre

- 2a. COPIA: AFILIADO -

Página 1 de 2
03/2016

VIGILADO Supersalud

comfacor

FORMULARIO DE AFILIACIONES Y NOVEDADES DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SU GRUPO FAMILIAR

-Por favor leer las indicaciones al respaldo antes de diligenciar
-Diligenciar este formato con letra clara, legible y sin tachones.

Versión	2
F. Aprobación	30/12/2021
Código	FO-MISF-AFI-04

I. TIPO DE NOVEDAD

Afiliación de Trabajador	X	Afiliación de trabajador y grupo familiar		Actualización de Información	
Traslado de trabajador		Adición de personas a cargo de trabajador afiliado		Reintegro	

N° de folios:

Radicado:

II. DATOS DEL EMPLEADOR

NIT X CC CE PA PE

Nombre o Razón Social:

No: 800.173.768-1 — Drcq Arquitectura e Ingenia. SA.

III. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo de Identificación: TI CC X CE PA PE	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Número de Identificación: 1.078807556	Ochoa	Mendez	Marielis	Vanessa

Lugar y Fecha de Nacimiento	Lugar y Fecha de Expedición	Genero	Estado Civil
2 6 98	7 6 2016	M F X I	Soltero X Casado Unión libre Separado Viudo Divorciado

Dirección de Residencia:	Barrio de Residencia:	Municipio de Residencia:	Departamento de Residencia:	Urbana / Rural
Cra 35 #13-60	Torcoroma	Sincelejo	Sucre	Urbana X

Estrato:	Teléfono casa:	Número de celular:	Correo electrónico (si lo tiene):	País de residencia
2	3004020896	3004020896	marielisvmendez@gmail.com	Colombia

Dirección donde trabaja:	Barrio donde trabaja:	Municipio donde trabaja:	Zona donde Labora	Fecha Ingreso a la Empresa	Salario Mensual
c/3-Kras	Abajo Cordoba Bolo	Cordoba Bolivar	Urban X Rural	21/8/2022	$1'500.000

Ocupación / Profesión:	Teléfono Oficina:	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Orientación Sexual	¿Cuenta usted con acreditación como veterano de guerra?
Ing. Civil	3205747617		Heterosexual X Homosexual Bisexual Información no disponible	SÍ NO X

Nivel Educativo		Factor de vulnerabilidad		Pertenencia étnica	
Preescolar	Técnico/Tecnológico	Desplazado	Población migrante	Afrocolombiano	
Básica X	Profesional Universitario	Victima del conflicto armado (No desplazado)	Población zonas frontera (Nacionales)	Comunidad negra	
Secundaria	Posgrado/Maestría	Desmovilizado o reinsertado	Ejercicio del trabajo sexual	Indígena	
Media	Ninguna	Hijo (as) de desmovilizados o reinsertados	No aplica	Palenquero	
Básica adultos	Información no disponible	Damnificado desastre natural	No disponible	Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	
Secundaria adultos		Cabeza de familia		Room/gitana	
Media adultos		Hijo (as) de madres cabeza de familia		No se auto reconoce en ninguno de los anteriores	
Primera infancia		En condición de discapacidad		No disponible	

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE? SÍ NO

NIT CC CE PA PE No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso D M A	Salario Mensual
				$
NIT CC CE PA PE No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso D M A	Salario Mensual
				$

IV. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A)

Tipo de Identificación: TI CC CE PA PE	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Número de Identificación:				

Lugar y Fecha de Nacimiento D M A	Lugar y Fecha de Expedición D M A	Genero M F I	Dirección:	Barrio:	Municipio:

Teléfono:	Celular:	Correo electrónico (si lo tiene):

Ocupación						Nombre de la empresa	NIT	El(La) conyuge recibe cuota monetaria	¿Por cuál Caja de Compesación?
Ama de casa	Trabaja	Independiente	Pensionado	Estudia	No trabaja			SÍ NO	

¿Desea incluir a su cónyuge o compañero(a) a su grupo familiar? SÍ NO

V. INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN DE GRUPO FAMILIAR

(Ingrese aquí las personas que desea registrar como sus beneficiarios)

(Para acceder al derecho de cuota monetaria debe anexar los documentos descritos en la circular 02 de 2016 de la Superintendencia de Subsidio Familiar)

Tipo de Doc	N° de Identificación	Apellidos y Nombres Completos	Parentesco: Conyuge	Hijo	Hijastro	Padre/Madre	Otro, Interiano	Discapacitado	Fecha de Nacimiento D	M	A	Fecha de Expedición Doc D	M	A	Género M	F	I

Apreciado Afiliado: Tú y tu familia son muy importantes para COMFACOR, por eso queremos estar siempre en contacto contigo. Para lograrlo es indispensable que nos autorices contactarte. No olvides diligenciar de forma clara y correcta todos tus datos para informarte todo lo que tenemos para ti.

VI. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.comfacor.com.co y disponible en la Carrera 9 No. 12-01 de la ciudad de Montería, Córdoba. Igualmente, declaro haber informado a los titulares de los datos que proveo en este medio, que entregaría sus datos a COMFACOR y que poseo su autorización para ello y para que se les de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada Política, la cual que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Declaro que la información aquí suministrada es cierta, verídica y, que en caso de ser admitida mi solicitud, me comprometo a cumplir con las normas establecidas por la Ley en lo concerniente a lo establecido en el Regimen de Subsidio Familiar; igualmente, autorizo a COMFACOR para que, por cualquier medio, se verifiquen los datos aquí contenidos y compruebe el cumplimiento de las mismas, si lo estima conveniente. Cualquier falsedad u omisión voluntaria conlleva a la anulación de esta solicitud. La omisión a este requisito puede generar falsedad documental, investigada penalmente.

Firma del empleador

Marielis Ochoa M.
Firma trabajador
Cedula:

VIII. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE COMFACOR

Recibe subsidio: SÍ NO / Numero de Beneficiarios:	Observaciones:	Firma y Sello de Radicación	Firma y Sello de Digitación
Revisado por:	Digitado por: / Fecha:	Información sujeta a verificación	

Motivo de devolución (ver respaldo):

Número de documentos aceptados		Registro Civil	Declaración Juramentada	Cert. De Estudio	Copia de Cédula	Cert. Laboral Cónyuge	Copia Tarj. Identidad	Custodia Legal	Certificado EPS Padres	Registro Defunción	Certificado de Discapacidad	Recuerde que para acreditar derecho a subsidio familiar monetario no se reciben documentos parciales

VIGILADO SuperSubsidio

comfacor

FORMULARIO DE AFILIACIONES Y NOVEDADES DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SU GRUPO FAMILIAR

-Por favor leer las indicaciones al respaldo antes de diligenciar
-Diligenciar este formato con letra clara, legible y sin tachones.

Versión	2
F. Aprobación	30/12/2021
Código	FO-MISF-AFI-04

I. TIPO DE NOVEDAD

N° de folios	Radicado

- Afiliación de Trabajador [X]
- Traslado de trabajador [ ]
- Afiliación de trabajador y grupo familiar [ ]
- Adición de personas a cargo de trabajador afiliado [ ]
- Actualización de información [ ]
- Reintegro [ ]

II. DATOS DEL EMPLEADOR

NIT [X] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No: 800.173.768-1

Nombre o Razón Social: Area Arquitectura e Ingeniería SA

III. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [X] CE [ ] PA [ ] PE [ ]

Número de Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
1.102.882.556	OCHOA	MENDEZ	MARIELIS	VANESSA

Lugar y Fecha de Nacimiento	Lugar y Fecha de Expedición	Genero	Estado Civil
Cordoba 2 6 1998	Sincelejo 7 6 2016	M [ ] F [X] I [ ]	Soltero [X] Casado [ ] Unión libre [ ] Separado [ ] Viudo [ ] Divorciado [ ]

Dirección de Residencia:	Barrio de Residencia:	Municipio de Residencia:	Departamento de Residencia:	Urbana / Rural
Calle 575-65	los Guayacanes	Cordoba	Bolivar.	Urbana [X] Rural [ ]

Estrato:	Teléfono casa:	Número de celular:	Correo electrónico (si lo tiene):	País de residencia
			marielisomendez@gmail.com	Colombia

Dirección donde trabaja:	Barrio donde trabaja:	Municipio donde trabaja:	Zona donde Labora	Fecha Ingreso a la Empresa	Salario Mensual
Cll 13 Kra 5	Abajo	Cordoba	Urban [X] Rural [ ]	29/8/2022	$ 1'500.000

Ocupación / Profesión:	Teléfono Oficina:	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Orientación Sexual	¿Cuenta usted con acreditación como veterano de guerra?
Ing. civil	3004020196		Heterosexual [X] Homosexual [ ] Bisexual [ ] Información no disponible [ ]	SÍ [ ] NO [X]

Nivel Educativo

Preescolar	[ ]	Técnico/Tecnológico [ ]
Básica	[ ]	Profesional Universitario [X]
Secundaria	[ ]	Posgrado/Maestría [ ]
Media	[ ]	Ninguna [ ]
Básica adultos	[ ]	Información no disponible [ ]
Secundaria adultos	[ ]	
Media adultos	[ ]	
Primera Infancia	[ ]	

Factor de vulnerabilidad

Desplazado	[ ]	Población migrante [ ]
Víctima del conflicto armado (No desplazado)	[ ]	Población zonas frontera (Nacionales) [ ]
Desmovilizado o reinsertado	[ ]	Ejercicio del trabajo sexual [ ]
Hijo (as) de desmovilizados o reinsertados	[ ]	No aplica [ ]
Damnificado desastre natural	[ ]	No disponible [ ]
Cabeza de familia	[ ]	
Hijo (as) de madres cabeza de familia	[ ]	
En condición de discapacidad	[ ]	

Pertenencia étnica

Afrocolombiano	[ ]
Comunidad negra	[ ]
Indígena	[ ]
Palenquero	[ ]
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	[ ]
Room/gitano	[ ]
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores	[ ]
No disponible	[ ]

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE? SÍ [ ] NO [X]

NIT / No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso (D M A)	Salario Mensual
NIT [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No.				$
NIT [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No.				$

IV. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A)

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ]

Número de Identificación:	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Lugar y Fecha de Nacimiento (D M A)	Lugar y Fecha de Expedición (D M A)	Genero	Dirección:	Barrio:	Municipio:
		M [ ] F [ ] I [ ]			

Teléfono:	Celular:	Correo electrónico (si lo tiene):

Ocupación: Ama de casa [ ] Trabaja [ ] Independiente [ ] Pensionado [ ] Estudia [ ] No trabaja [ ]

Nombre de la empresa: NIT:

El(La) conyuge recibe cuota monetaria: SÍ [ ] NO [ ]

¿Por cuál Caja de Compesación?

¿Desea incluir a su cónyuge o compañero(a) a su grupo familiar? SÍ [ ] NO [ ]

V. INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN DE GRUPO FAMILIAR

(Ingrese aquí las personas que desea registrar como sus beneficiarios)

(Para acceder al derecho de cuota monetaria debe anexar los documentos descritos en la circular 02 de 2016 de la Superintendencia de Subsidio Familiar)

Tipo de Doc	N° de Identificación	Apellidos y Nombres Completos	Parentesco: Cónyuge	Hijo	Padre o Madrastra	Padrastro	Hno. Hijastro	Discapacitado	Fecha de Nacimiento D	M	A	Fecha de Expedición Doc D	M	A	Género M	F	I

Apreciado Afiliado: Tú y tu familia son muy importantes para COMFACOR, por eso queremos estar siempre en contacto contigo. Para lograrlo es indispensable que nos autorices contactarte. No olvides diligenciar de forma clara y correcta todos tus datos para informarte todo lo que tenemos para ti.

VI. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.comfacor.com.co y disponible en la Carrera 9 No. 12-01 de la ciudad de Montería, Córdoba. Igualmente, declaro haber informado a los titulares de los datos que proveo en este medio, que entregaría sus datos a COMFACOR y que poseo su autorización para ello y para que se les de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada Política, la cual que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Declaro que la información aquí suministrada es cierta, verídica y, que en caso de ser admitida mi solicitud, me comprometo a cumplir con las normas establecidas por la Ley en lo concerniente a lo establecido en el Regimen de Subsidio Familiar; igualmente, autorizo a COMFACOR para que, por cualquier medio, se verifiquen los datos aquí contenidos y compruebe el cumplimiento de las mismas, si lo estima conveniente. Cualquier falsedad u omisión voluntaria conlleva a la anulación de esta solicitud. La omisión a este requisito puede generar falsedad documental, investigada penalmente.

Firma del empleador

Firma trabajador
Cedula: 1.102.882.556

VIII. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE COMFACOR

Recibe subsidio: SÍ [ ] NO [ ] Número de Beneficiarios:	Observaciones:	Firma y Sello de Radicación	Firma y Sello de Digitación
Revisado por:	Digitado por: / Fecha:	Información sujeta a verificación	

Motivo de devolución (ver respaldo):

Número de documentos aceptados		Registro Civil	Declaración Juramentada	Cert. De Estudio	Copia de Cédula	Cert. Laboral Cónyuge	Copia Tarj Identidad	Custodia Legal	Certificado EPS Padres	Registro Defunción	Certificado de Discapacidad	Recuerde que para acreditar derecho a subsidio familiar monetario no se reciben documentos parciales

VIGILADO SuperSubsidio

RECOMENDACIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligencie completamente el formulario preferiblemente en letra imprenta o a máquina, sin tachones, enmendaduras, repisados, ni uso de corrector.
2. Escriba correctamente el número de identificación del trabajador y el NIT. Del empleador.
3. Antes de entregar el formulario, revise cuidadosamente la información suministrada y verifique que la documentación este completa, correcta y los soportes requeridos correspondan con los solicitados de acuerdo con la circular 02 de 2016 de Superintendencia del Subsidio Familiar.
4. No utilice números romanos en el diligenciamiento del formulario.
5. Utilice siempre cuatro dígitos para el año y dos para el mes y día.
6. En caso de quedar información o documentos pendientes debe diligenciar otro formato.
7. Recuerde que no se deben dejar campos en blanco dentro del formulario.

RECUERDE QUE PARA RECIBIR CUOTA MONETARIA DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Debe ser trabajador permanente que labore un mínimo de 96 horas por mes, con una remuneración mensual igual o inferior al equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes y tener personas legalmente a cargo. Art. 3 Ley 789/2002
2. Se considerarán personas a cargo únicamente:
- Los hijos, hijastros o hermanos huérfanos de padres menores de 18 años. Para los hijos o hermanos huérfanos mayores de 12 años se requiere adjuntar certificados de estudio. Si son discapacitados deben acreditar dicha condición con el respectivo certificado de la EPS, que cumpla con los parámetros normativos.
- Los padres mayores de 60 años que dependan económicamente del trabajador y que ninguno de los dos reciba renta, pensión ni salario.
3. Si el trabajador labora en más de una empresa, se tendrá en cuenta la suma de los ingresos recibidos en cada empleo.
4. Se tendrá en cuenta la suma de los ingresos laborales de los dos padres, y en caso de que estos no superen los cuatro salarios mínimos, se pagará cuota monetaria a cada padre por los mismos hijos sobre los que se demuestre el derecho.
5. Si sumados los ingresos laborales del trabajador y su cónyuge no superan los seis salarios mínimos legales vigentes, sólo se pagara cuota monetaria a uno de los padres por los hijos sobre los cuales demuestre el derecho.
6. Si sumados los ingresos laborales de los dos padres superan seis salarios mínimos legales vigentes ninguno podrá recibir cuota monetaria.

Nota: Si se cumple con los anteriores requisitos se debe adjuntar la documentación exigida para cada caso, de acuerdo con la guía de afiliación que se encuentra disponible en nuestra página web y para que la afiliación sea válida, la empresa debe estar afiliada a la Caja de Compensación y el trabajador debe cumplir con todas las condiciones del Régimen del Subsidio Familiar.

CAUSALES DE DEVOLUCIÓN

1. Formatos y documentos: ☐Mal diligenciados ☐Incompletos ☐Enmendados ☐Ilegibles

Ítems: _____

2. Marque los anexos faltantes o inconsistencias presentadas

☐ Copia de registro civil de _____ que acredite parentesco.

☐ Certificado de estudio del presente año de _____

☐ Certificado de EPS donde demuestre discapacidad _____

3. Otro ¿Cuál? _____

AVISO DE PRIVACIDAD

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA – COMFACOR, persona jurídica identificada con Nit. 891080005-1, con domicilio en la Carrera 9 # 12-01 de la ciudad de Montería (Córdoba), se permite informar a todos los titulares de datos personales que llegaren a ser incluidos en nuestras bases de datos:

--> Que el día veintitrés de julio de 2021, mediante la Resolución AEI 185, el AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN de COMFACOR aprobó la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015.

--> Que la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN es puesta a conocimiento de los titulares de los datos personales objeto de tratamiento, por medio del presente Aviso de Privacidad, el día 25 de agosto de 2021.

--> Que la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN se encuentra publicada en www.comfacor.com.co, donde se podrá consultar el tratamiento de los datos personales, las finalidades del tratamiento, los derechos de titulares de datos y la información sobre el carácter facultativo de la respuesta a preguntas sobre datos sensibles.

--> Que COMFACOR pone a disposición los siguientes canales de atención para el ejercicio de sus derechos como titular de datos personales: Dirección: Carrera 9 No. 12 – 01 Montería (Córdoba), Portal web: www.comfacor.com.co/PQRS, teléfono: 01 8000 413 758 o al Correo: atencionalcliente@comfacor.com.co.

Señor Afiliado, se informa que puede radicar documentos y aclarar cualquier inquietud desde los diferentes Centros Integrales de Servicios (CIS) de Comfacor en los municipios del departamento de Córdoba, la información de estos CIS puede ser consultada desde nuestra pagina web www.comfacor.com.co

Si requiere mayor orientación en el diligenciamiento del formulario, consultar el link https://www.comfacor.com.co/servicios/requisitos-para-acceder-al-subsidio-comfacor/, en la página web de la Caja.

Dirección Sede Principal: Calle 9 # 12 - 01 Barrio Buenavista

Si tienes alguna inquietud puedes comunicarte al Centro de Atención al Cliente (CAC) por los canales:
Telefono: 300 912 0308
Línea gratuita nacional: 01 8000 413 758



VIGILADO SuperSubsidio

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	65 - OFICINA MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844627248**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/10
Número Autorización	1596714002		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARCY ALEJANDRA	Apellidos	CORREA CASTAÑO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	43160977
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 4.673.760	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.673.760
FSP - Solidaridad	$ 23.400	Cotización Obligatoria	$ 747.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 23.400
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 794.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.673.760
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 187.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 187.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.673.760
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 325.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 4.673.760	$ 187.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.494.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049454594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LEYDIS KATHERINE	Apellidos	HERRERA PALOMINO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049454594
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 224.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 224.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 56.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 56.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 97.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.400.000	$ 56.000

TOTAL PAGADO:	**$ 433.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7846682033**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/02
Número Autorización	1582961148		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMMA FERNANDA	Apellidos	GRIJALBA BOLAÑOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1085294161
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.798.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.798.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 287.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 287.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.798.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 72.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 72.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.798.500
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.798.500	$ 72.000

TOTAL PAGADO:	**$ 441.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1233339123

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7844637391**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2022	Periodo Cotización Salud	agosto / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/08/12
Número Autorización	1599862866		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIAMYS EMELLY	Apellidos	SANCHEZ PORTILLO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1233339123
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 240.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 240.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 60.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 60.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.500.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 104.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.500.000	$ 60.000

TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRACION

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846682033**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1582961148

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
25	CC 80192920	FORERO ANAYA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.559.391	FIJO																25-26				230301-PORVENIR	2	$ 170.627	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 170.627	$ 6.900	$ 0	$ 6.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 170.627		$ 0	2	$ 170.627	CCF24-COMPENSAR	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 80192920	FORERO ANAYA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.559.391	FIJO																				230301-PORVENIR	28	$ 2.388.765	$ 382.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 382.300	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.388.765	$ 95.600	$ 0	$ 95.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.388.765		$ 12.500	28	$ 2.388.765	CCF24-COMPENSAR	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 627.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ARL | sura

Medellín, 24 de agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000020 OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1102882556	OCHOA MENDEZ MARIELIS VANESSA	29/08/2022		156o9259	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/08/2022 16:17:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.48.216.250, 192.230.104.12, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

No. de Radicación

Fecha de Radicación D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐	A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia ☐ -Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) — A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: OCHOA	Segundo apellido: MENDEZ	Primer nombre: MARIE/IS	Segundo nombre: VANESSA

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.102.682.566	Femenino X Masculino ☐	0 2 0 6 1 1 9 9 8

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M — Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA	PROTECCION	1'500.000

18. Residencia	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico
cra 35 #13-60 Sincelejo		3004020196	mariel.sbamendez@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona		Localidad/Comuna	Departamento
Sincelejo	Urbana X Rural ☐		Portenir	Sucre

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
MECA Arquitectura e Ing. S.A.	NIT	800.173.768-1	

39. Ubicación Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Av. Cra 28 #37-38	2442500	g.talentohumano@sopreca.com.co	Sincelejo	Sucre

- 2a. COPIA: AFILIADO -

Página 1 de 2
03/2016

VIGILADO Supersalud

comfacor

FORMULARIO DE AFILIACIONES Y NOVEDADES DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SU GRUPO FAMILIAR

-Por favor leer las indicaciones al respaldo antes de diligenciar
-Diligenciar este formato con letra clara, legible y sin tachones.

Versión	2
F. Aprobación	30/12/2021
Código	FO-MISF-AFI-04

I. TIPO DE NOVEDAD

Afiliación de Trabajador	X	Afiliación de trabajador y grupo familiar		Actualización de Información	
Traslado de trabajador		Adición de personas a cargo de trabajador afiliado		Reintegro	

N° de folios:

Radicado:

II. DATOS DEL EMPLEADOR

NIT X CC CE PA PE

Nombre o Razón Social:

No: 800.173.768-1 — Drcq Arquitectura e Ingenia. SA.

III. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo de Identificación: TI CC X CE PA PE	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Número de Identificación: 1.078807556	Ochoa	Mendez	Marielis	Vanessa

Lugar y Fecha de Nacimiento	Lugar y Fecha de Expedición	Genero	Estado Civil
2 6 98	7 6 2016	M F X I	Soltero X Casado Unión libre Separado Viudo Divorciado

Dirección de Residencia:	Barrio de Residencia:	Municipio de Residencia:	Departamento de Residencia:	Urbana / Rural
Cra 35 #13-60	Torcoroma	Sincelejo	Sucre	Urbana X

Estrato:	Teléfono casa:	Número de celular:	Correo electrónico (si lo tiene):	País de residencia
2	3004020896	3004020896	marielisvmendez@gmail.com	Colombia

Dirección donde trabaja:	Barrio donde trabaja:	Municipio donde trabaja:	Zona donde Labora	Fecha Ingreso a la Empresa	Salario Mensual
c/3-Kras	Abajo Cordoba Bolo	Cordoba Bolivar	Urban X Rural	21/8/2022	$1'500.000

Ocupación / Profesión:	Teléfono Oficina:	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Orientación Sexual	¿Cuenta usted con acreditación como veterano de guerra?
Ing. Civil	3205747617		Heterosexual X Homosexual Bisexual Información no disponible	SÍ NO X

Nivel Educativo		Factor de vulnerabilidad		Pertenencia étnica	
Preescolar	Técnico/Tecnológico	Desplazado	Población migrante	Afrocolombiano	
Básica X	Profesional Universitario	Victima del conflicto armado (No desplazado)	Población zonas frontera (Nacionales)	Comunidad negra	
Secundaria	Posgrado/Maestría	Desmovilizado o reinsertado	Ejercicio del trabajo sexual	Indígena	
Media	Ninguna	Hijo (as) de desmovilizados o reinsertados	No aplica	Palenquero	
Básica adultos	Información no disponible	Damnificado desastre natural	No disponible	Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	
Secundaria adultos		Cabeza de familia		Room/gitana	
Media adultos		Hijo (as) de madres cabeza de familia		No se auto reconoce en ninguno de los anteriores	
Primera infancia		En condición de discapacidad		No disponible	

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE? SÍ NO

NIT CC CE PA PE No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso D M A	Salario Mensual
				$
NIT CC CE PA PE No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso D M A	Salario Mensual
				$

IV. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A)

Tipo de Identificación: TI CC CE PA PE	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Número de Identificación:				

Lugar y Fecha de Nacimiento D M A	Lugar y Fecha de Expedición D M A	Genero M F I	Dirección:	Barrio:	Municipio:

Teléfono:	Celular:	Correo electrónico (si lo tiene):

Ocupación						Nombre de la empresa	NIT	El(La) conyuge recibe cuota monetaria	¿Por cuál Caja de Compesación?
Ama de casa	Trabaja	Independiente	Pensionado	Estudia	No trabaja			SÍ NO	

¿Desea incluir a su cónyuge o compañero(a) a su grupo familiar? SÍ NO

V. INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN DE GRUPO FAMILIAR

(Ingrese aquí las personas que desea registrar como sus beneficiarios)

(Para acceder al derecho de cuota monetaria debe anexar los documentos descritos en la circular 02 de 2016 de la Superintendencia de Subsidio Familiar)

Tipo de Doc	N° de Identificación	Apellidos y Nombres Completos	Parentesco: Conyuge	Hijo	Hijastro	Padre/Madre	Otro, Interiano	Discapacitado	Fecha de Nacimiento D	M	A	Fecha de Expedición Doc D	M	A	Género M	F	I

Apreciado Afiliado: Tú y tu familia son muy importantes para COMFACOR, por eso queremos estar siempre en contacto contigo. Para lograrlo es indispensable que nos autorices contactarte. No olvides diligenciar de forma clara y correcta todos tus datos para informarte todo lo que tenemos para ti.

VI. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.comfacor.com.co y disponible en la Carrera 9 No. 12-01 de la ciudad de Montería, Córdoba. Igualmente, declaro haber informado a los titulares de los datos que proveo en este medio, que entregaría sus datos a COMFACOR y que poseo su autorización para ello y para que se les de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada Política, la cual que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Declaro que la información aquí suministrada es cierta, verídica y, que en caso de ser admitida mi solicitud, me comprometo a cumplir con las normas establecidas por la Ley en lo concerniente a lo establecido en el Regimen de Subsidio Familiar; igualmente, autorizo a COMFACOR para que, por cualquier medio, se verifiquen los datos aquí contenidos y compruebe el cumplimiento de las mismas, si lo estima conveniente. Cualquier falsedad u omisión voluntaria conlleva a la anulación de esta solicitud. La omisión a este requisito puede generar falsedad documental, investigada penalmente.

Firma del empleador

Marielis Ochoa M.
Firma trabajador
Cedula:

VIII. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE COMFACOR

Recibe subsidio: SÍ NO / Numero de Beneficiarios:	Observaciones:	Firma y Sello de Radicación	Firma y Sello de Digitación
Revisado por:	Digitado por: / Fecha:	Información sujeta a verificación	

Motivo de devolución (ver respaldo):

Número de documentos aceptados		Registro Civil	Declaración Juramentada	Cert. De Estudio	Copia de Cédula	Cert. Laboral Cónyuge	Copia Tarj. Identidad	Custodia Legal	Certificado EPS Padres	Registro Defunción	Certificado de Discapacidad	Recuerde que para acreditar derecho a subsidio familiar monetario no se reciben documentos parciales

VIGILADO SuperSubsidio

comfacor

FORMULARIO DE AFILIACIONES Y NOVEDADES DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SU GRUPO FAMILIAR

-Por favor leer las indicaciones al respaldo antes de diligenciar
-Diligenciar este formato con letra clara, legible y sin tachones.

Versión	2
F. Aprobación	30/12/2021
Código	FO-MISF-AFI-04

I. TIPO DE NOVEDAD

N° de folios	Radicado

- Afiliación de Trabajador [X]
- Traslado de trabajador [ ]
- Afiliación de trabajador y grupo familiar [ ]
- Adición de personas a cargo de trabajador afiliado [ ]
- Actualización de información [ ]
- Reintegro [ ]

II. DATOS DEL EMPLEADOR

NIT [X] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No: 800.173.768-1

Nombre o Razón Social: Area Arquitectura e Ingeniería SA

III. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [X] CE [ ] PA [ ] PE [ ]

Número de Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
1.102.882.556	OCHOA	MENDEZ	MARIELIS	VANESSA

Lugar y Fecha de Nacimiento	Lugar y Fecha de Expedición	Genero	Estado Civil
Cordoba 2 6 1998	Sincelejo 7 6 2016	M [ ] F [X] I [ ]	Soltero [X] Casado [ ] Unión libre [ ] Separado [ ] Viudo [ ] Divorciado [ ]

Dirección de Residencia:	Barrio de Residencia:	Municipio de Residencia:	Departamento de Residencia:	Urbana / Rural
Calle 575-65	los Guayacanes	Cordoba	Bolivar.	Urbana [X] Rural [ ]

Estrato:	Teléfono casa:	Número de celular:	Correo electrónico (si lo tiene):	País de residencia
			marielisomendez@gmail.com	Colombia

Dirección donde trabaja:	Barrio donde trabaja:	Municipio donde trabaja:	Zona donde Labora	Fecha Ingreso a la Empresa	Salario Mensual
Cll 13 Kra 5	Abajo	Cordoba	Urban [X] Rural [ ]	29/8/2022	$ 1'500.000

Ocupación / Profesión:	Teléfono Oficina:	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Orientación Sexual	¿Cuenta usted con acreditación como veterano de guerra?
Ing. civil	3004020196		Heterosexual [X] Homosexual [ ] Bisexual [ ] Información no disponible [ ]	SÍ [ ] NO [X]

Nivel Educativo

Preescolar	[ ]	Técnico/Tecnológico [ ]
Básica	[ ]	Profesional Universitario [X]
Secundaria	[ ]	Posgrado/Maestría [ ]
Media	[ ]	Ninguna [ ]
Básica adultos	[ ]	Información no disponible [ ]
Secundaria adultos	[ ]	
Media adultos	[ ]	
Primera Infancia	[ ]	

Factor de vulnerabilidad

Desplazado	[ ]	Población migrante [ ]
Víctima del conflicto armado (No desplazado)	[ ]	Población zonas frontera (Nacionales) [ ]
Desmovilizado o reinsertado	[ ]	Ejercicio del trabajo sexual [ ]
Hijo (as) de desmovilizados o reinsertados	[ ]	No aplica [ ]
Damnificado desastre natural	[ ]	No disponible [ ]
Cabeza de familia	[ ]	
Hijo (as) de madres cabeza de familia	[ ]	
En condición de discapacidad	[ ]	

Pertenencia étnica

Afrocolombiano	[ ]
Comunidad negra	[ ]
Indígena	[ ]
Palenquero	[ ]
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	[ ]
Room/gitano	[ ]
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores	[ ]
No disponible	[ ]

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE? SÍ [ ] NO [X]

NIT / No.	NOMBRE DEL EMPLEADOR	Si labora por horas, ¿Cuántas al mes?	Fecha Ingreso (D M A)	Salario Mensual
NIT [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No.				$
NIT [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ] No.				$

IV. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A)

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PE [ ]

Número de Identificación:	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Lugar y Fecha de Nacimiento (D M A)	Lugar y Fecha de Expedición (D M A)	Genero	Dirección:	Barrio:	Municipio:
		M [ ] F [ ] I [ ]			

Teléfono:	Celular:	Correo electrónico (si lo tiene):

Ocupación: Ama de casa [ ] Trabaja [ ] Independiente [ ] Pensionado [ ] Estudia [ ] No trabaja [ ]

Nombre de la empresa: NIT:

El(La) conyuge recibe cuota monetaria: SÍ [ ] NO [ ]

¿Por cuál Caja de Compesación?

¿Desea incluir a su cónyuge o compañero(a) a su grupo familiar? SÍ [ ] NO [ ]

V. INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN DE GRUPO FAMILIAR

(Ingrese aquí las personas que desea registrar como sus beneficiarios)

(Para acceder al derecho de cuota monetaria debe anexar los documentos descritos en la circular 02 de 2016 de la Superintendencia de Subsidio Familiar)

Tipo de Doc	N° de Identificación	Apellidos y Nombres Completos	Parentesco: Cónyuge	Hijo	Padre o Madrastra	Padrastro	Hno. Hijastro	Discapacitado	Fecha de Nacimiento D	M	A	Fecha de Expedición Doc D	M	A	Género M	F	I

Apreciado Afiliado: Tú y tu familia son muy importantes para COMFACOR, por eso queremos estar siempre en contacto contigo. Para lograrlo es indispensable que nos autorices contactarte. No olvides diligenciar de forma clara y correcta todos tus datos para informarte todo lo que tenemos para ti.

VI. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.comfacor.com.co y disponible en la Carrera 9 No. 12-01 de la ciudad de Montería, Córdoba. Igualmente, declaro haber informado a los titulares de los datos que proveo en este medio, que entregaría sus datos a COMFACOR y que poseo su autorización para ello y para que se les de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada Política, la cual que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Declaro que la información aquí suministrada es cierta, verídica y, que en caso de ser admitida mi solicitud, me comprometo a cumplir con las normas establecidas por la Ley en lo concerniente a lo establecido en el Regimen de Subsidio Familiar; igualmente, autorizo a COMFACOR para que, por cualquier medio, se verifiquen los datos aquí contenidos y compruebe el cumplimiento de las mismas, si lo estima conveniente. Cualquier falsedad u omisión voluntaria conlleva a la anulación de esta solicitud. La omisión a este requisito puede generar falsedad documental, investigada penalmente.

Firma del empleador

Firma trabajador
Cedula: 1.102.882.556

VIII. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE COMFACOR

Recibe subsidio: SÍ [ ] NO [ ] Número de Beneficiarios:	Observaciones:	Firma y Sello de Radicación	Firma y Sello de Digitación
Revisado por:	Digitado por: / Fecha:	Información sujeta a verificación	

Motivo de devolución (ver respaldo):

Número de documentos aceptados		Registro Civil	Declaración Juramentada	Cert. De Estudio	Copia de Cédula	Cert. Laboral Cónyuge	Copia Tarj Identidad	Custodia Legal	Certificado EPS Padres	Registro Defunción	Certificado de Discapacidad	Recuerde que para acreditar derecho a subsidio familiar monetario no se reciben documentos parciales

VIGILADO SuperSubsidio

RECOMENDACIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligencie completamente el formulario preferiblemente en letra imprenta o a máquina, sin tachones, enmendaduras, repisados, ni uso de corrector.
2. Escriba correctamente el número de identificación del trabajador y el NIT. Del empleador.
3. Antes de entregar el formulario, revise cuidadosamente la información suministrada y verifique que la documentación este completa, correcta y los soportes requeridos correspondan con los solicitados de acuerdo con la circular 02 de 2016 de Superintendencia del Subsidio Familiar.
4. No utilice números romanos en el diligenciamiento del formulario.
5. Utilice siempre cuatro dígitos para el año y dos para el mes y día.
6. En caso de quedar información o documentos pendientes debe diligenciar otro formato.
7. Recuerde que no se deben dejar campos en blanco dentro del formulario.

RECUERDE QUE PARA RECIBIR CUOTA MONETARIA DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Debe ser trabajador permanente que labore un mínimo de 96 horas por mes, con una remuneración mensual igual o inferior al equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes y tener personas legalmente a cargo. Art. 3 Ley 789/2002
2. Se considerarán personas a cargo únicamente:
- Los hijos, hijastros o hermanos huérfanos de padres menores de 18 años. Para los hijos o hermanos huérfanos mayores de 12 años se requiere adjuntar certificados de estudio. Si son discapacitados deben acreditar dicha condición con el respectivo certificado de la EPS, que cumpla con los parámetros normativos.
- Los padres mayores de 60 años que dependan económicamente del trabajador y que ninguno de los dos reciba renta, pensión ni salario.
3. Si el trabajador labora en más de una empresa, se tendrá en cuenta la suma de los ingresos recibidos en cada empleo.
4. Se tendrá en cuenta la suma de los ingresos laborales de los dos padres, y en caso de que estos no superen los cuatro salarios mínimos, se pagará cuota monetaria a cada padre por los mismos hijos sobre los que se demuestre el derecho.
5. Si sumados los ingresos laborales del trabajador y su cónyuge no superan los seis salarios mínimos legales vigentes, sólo se pagara cuota monetaria a uno de los padres por los hijos sobre los cuales demuestre el derecho.
6. Si sumados los ingresos laborales de los dos padres superan seis salarios mínimos legales vigentes ninguno podrá recibir cuota monetaria.

Nota: Si se cumple con los anteriores requisitos se debe adjuntar la documentación exigida para cada caso, de acuerdo con la guía de afiliación que se encuentra disponible en nuestra página web y para que la afiliación sea válida, la empresa debe estar afiliada a la Caja de Compensación y el trabajador debe cumplir con todas las condiciones del Régimen del Subsidio Familiar.

CAUSALES DE DEVOLUCIÓN

1. Formatos y documentos: ☐Mal diligenciados ☐Incompletos ☐Enmendados ☐Ilegibles

Ítems: _____

2. Marque los anexos faltantes o inconsistencias presentadas

☐ Copia de registro civil de _____ que acredite parentesco.

☐ Certificado de estudio del presente año de _____

☐ Certificado de EPS donde demuestre discapacidad _____

3. Otro ¿Cuál? _____

AVISO DE PRIVACIDAD

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA – COMFACOR, persona jurídica identificada con Nit. 891080005-1, con domicilio en la Carrera 9 # 12-01 de la ciudad de Montería (Córdoba), se permite informar a todos los titulares de datos personales que llegaren a ser incluidos en nuestras bases de datos:

--> Que el día veintitrés de julio de 2021, mediante la Resolución AEI 185, el AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN de COMFACOR aprobó la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015.

--> Que la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN es puesta a conocimiento de los titulares de los datos personales objeto de tratamiento, por medio del presente Aviso de Privacidad, el día 25 de agosto de 2021.

--> Que la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN se encuentra publicada en www.comfacor.com.co, donde se podrá consultar el tratamiento de los datos personales, las finalidades del tratamiento, los derechos de titulares de datos y la información sobre el carácter facultativo de la respuesta a preguntas sobre datos sensibles.

--> Que COMFACOR pone a disposición los siguientes canales de atención para el ejercicio de sus derechos como titular de datos personales: Dirección: Carrera 9 No. 12 – 01 Montería (Córdoba), Portal web: www.comfacor.com.co/PQRS, teléfono: 01 8000 413 758 o al Correo: atencionalcliente@comfacor.com.co.

Señor Afiliado, se informa que puede radicar documentos y aclarar cualquier inquietud desde los diferentes Centros Integrales de Servicios (CIS) de Comfacor en los municipios del departamento de Córdoba, la información de estos CIS puede ser consultada desde nuestra pagina web www.comfacor.com.co

Si requiere mayor orientación en el diligenciamiento del formulario, consultar el link https://www.comfacor.com.co/servicios/requisitos-para-acceder-al-subsidio-comfacor/, en la página web de la Caja.

Dirección Sede Principal: Calle 9 # 12 - 01 Barrio Buenavista

Si tienes alguna inquietud puedes comunicarte al Centro de Atención al Cliente (CAC) por los canales:
Telefono: 300 912 0308
Línea gratuita nacional: 01 8000 413 758



VIGILADO SuperSubsidio

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PARAFISCALES (REVISOR FISCAL)

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 6 E 7 5 C 5 0 E B 0 B 1 7 1 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79512539 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 74455-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79512539**

MAYORGA ALMEIDA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1970**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-JUL-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500101-42094053-M-0079512539-20020122 **04434**02022A 01 114495920

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



74455-T

CARLOS ALBERTO
MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79512539
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

83087

CARVAJAL S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

079512539

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 05 de septiembre de 2022

Yo, **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79512539 de BOGOTA y tarjeta profesional No 74455-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ARCA-ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** identificada con Nit 800.173.768-1, ,manifiesto que dicha empresa ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79.512.539 de BOGOTA
Revisor Fiscal

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PANTALLAZO PLATAFORMA SECOP II, CARGUE DE INFORME MENSUAL.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	2022.04.26 Acta de inicio Contrato de interventoría 2220587- ARCA.pdf	2022.04.26 Acta de inicio Contrato de interventoría 2220587- ARCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 1.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 2.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 3.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 4.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 1.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 2.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 3.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 4.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 5.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Julio 2022 parte 1.pdf	Informe Mes de Julio 2022 parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Julio 2022 parte 2.pdf	Informe Mes de Julio 2022 parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Julio 2022 parte 3.pdf	Informe Mes de Julio 2022 parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Julio 2022 parte 4.pdf	Informe Mes de Julio 2022 parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Julio 2022 parte 5.pdf	Informe Mes de Julio 2022 parte 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Agosto 2022 parte 1.pdf	Informe Mes de Agosto 2022 parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Agosto 2022 parte 2.pdf	Informe Mes de Agosto 2022 parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Agosto 2022 parte 3.pdf	Informe Mes de Agosto 2022 parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Agosto 2022 parte 4.pdf	Informe Mes de Agosto 2022 parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Mes de Agosto 2022 parte 5.pdf	Informe Mes de Agosto 2022 parte 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Activar Windows

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

APROBACIÓN INFORME MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

20222200171871

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222200171871

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 19-09-2022

Ingeniera Marcy Alejandra Correa
Directora de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias –Córdoba, Bolívar
Carrera 28 # 37 -38
luisa.morales@grupoarca.com, comarcy.correa@grupoarca.com.co
Bogota, D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINIS-TRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPAR-TAMENTO DE BOLÍVAR".

Asunto: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes de agosto (01 al 31 de agosto de 2022)

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, acusamos recibo de la siguiente información: Comunicación ARCA-INT/ENT276-GER-099-22 con asunto; "Entrega Informe Mensual No.4" con radicado ENTerritorio No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022, mediante el cual, la interventoría remitió a la Entidad el informe mensual No.4 correspondiente al mes de agosto (01 al 31 de agosto de 2022) y mediante radicado ENTerritorio No.20224300349242 del 19/09/2022, atiende las observaciones informadas por la supervisión. Así las cosas, indicamos que, una vez ajustado el informe mensual, fue revisado por parte de la supervisión.

Atentamente,

Ing. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Cto. Interadministrativo 221005

Arq. ERIKA M. GUTIERREZ G.
Supervisora cto. 2220587

LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ
Supervisora Componente Social

Preparó: Erika Marcela Gutiérrez Gaitán -Supervisora
Revisó: Carlos Andrés Bravo -Gerente Cto. Interadministrativo 221005

Anexo: F-GG-07 Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220587				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
SUPERVISOR:	ERIKA MARCELA GUTIÉRREZ GAITÁN				
INFORME No.	**4**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**1-ago.-22**	**HASTA EL**	**31-ago.-22**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-10 - Control de personal	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-11 - Relación de correspondencia	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-12 - Acta de suspensión	N.A	N.A		
F-GG-13 - Acta de reinicio	N.A	N.A		
Otras actas suscritas durante el periodo.	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
2.2. ANEXO TECNICO				
F-GG-19 - Relación de documentos	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-20 - Relación de planos	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	N.A	N.A		
F-GG-27 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	N.A	N.A		
F-GG-22 - Control de equipos	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	N.A	N.A		
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N.A	N.A		
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	N.A	N.A		
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
Cumplimiento normatividad ambiental	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N.A	N.A		
OTROS				
Correspondencia interna	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
Estado del clima	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	
Bitacora	SI	SI	Remitido mediante radicado No. 20224300334212 del 07 de septiembre de 2022	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Erika Marcela Gutiérrez Gaitán

SUPERVISOR ENTerritorio

daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Interventoría Intradomiciliarias <intradomiciliariasarca@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de septiembre de 2022 10:40 a. m.
Para: Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>
Cc: Marcy Correa <marcy.correa@grupoarca.com.co>; Karen Martinez <KAREN.MARTINEZ@grupoarca.com.co>; Erika Marcela Gutiérrez Gaitán <egutier1@enterritorio.gov.co>
Asunto: GER103-E REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4. DE INTERVENTORÍA. PERIODO FACT. AGOSTO

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

[El texto citado está oculto]

20224300353992.pdf
9598K

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 21/09/2022
HORA: 2:52:01 p. m.
20224300354392

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 21 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-104-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME MENSUAL No. 2 - CONTRATISTA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y dando cumplimiento con nuestras obligaciones contractuales, acusamos recibo de la siguiente información:

- Comunicación CCR_CORDOBA_2220576_2022_072 con asunto; "Informe de Avance Mensual No. 2" del 26 de julio de 2022.

- Por correo electrónico hacen entrega de la Subsanación Informe de Avance Mensual No. 2 el 21 de septiembre del 2022.


Mediante los cuales, el contratista remitió a la Interventoría el informe mensual No. 2 correspondiente al mes de Junio (01 al 30 de junio de 2022) y atención a las observaciones informadas por la interventoría en correo electrónico del 08 de agosto de 2022.

El informe PGIO No. 2 fue radicado el día 08 de agosto del 2022 mediante oficio ARCA-INT/ENT276-GER-082-22 con radicado No. 20224300294962 este documento es un anexo del informe mensual No. 2 de Obra.

Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual ajustado fue revisado por parte de la interventoría, se evidencia que este atendió en su totalidad las observaciones presentadas y; en consecuencia, es aprobado.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 154 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 2

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD NRO. 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10
ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICOS, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.
ACTIVIDAD 4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2,3

INFORME MENSUAL NO 2.
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No: 2220576 DE 2022

OBJETO: "CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN ELMUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CORDOBA BOLIVAR – JUNIO DE 2022

ELABORÓ POR: **RONAL ANDRES BLANCO ARROLLO** Residente de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES	**REVISÓ POR:** **DUARTE JOSE PINEDO DURANGO** Director de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES
APROBÓ POR: **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ**	**V.B. POR:** **MARCY ALEJANDRA CORREA** Directora de Interventoría

Representante Legal CONSORCIO CONSTRUREDES	*CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ*

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....4
2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO 5
2.1 LÍMITES.....6
2.2 GEOGRAFÍA. 6
2.3 DEMOGRAFÍA. 6
3. CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 7
4. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO. 8
5. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO. 15
***5.1** PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.....16*
6. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO……...16
ANEXO No. 1.....63
ANEXO No. 2.....64
ANEXO No. 3.....65
ANEXO No. 4.....89
ANEXO No 5……120
ANEXO No. 6.....144
ANEXO No. 7.....145

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Resumen de la información general del Contrato, ...8
Tabla 2 Control Aspectos contractuales de garantías,.....10
Tabla 3 Control Aspectos Financieros, ...11
Tabla 4 Identificación de Beneficiarios 22

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Georreferenciación del Municipio de Córdoba 5
Ilustración 2 Georreferenciación del Barrio San Martin, Córdoba. Fuente (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral).

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de avance mensual No. 2 tiene como finalidad mostrar el seguimiento detallado que el contratista de obra ha realizado en el periodo del Día 1 de JUNIO al 31 de JUNIO de 2022,en la ejecución de la ***ACTIVIDAD NRO. 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10,*** *se entregaron los diseños y prototipos de las 4 casetas y de estructura de tanque para intervenciones tipo intervención.* ***DE LA ACTIVIDAD NRO. 2 DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLAN DE INTERVENCIÓN,*** *de las viviendas priorizadas que cuenten con las redes provisionales de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, certificada por parte de la Empresa prestadora COOSEPCOR LTDA. por ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Barrio San Martín, documentados, justificados y revisados por la interventoría para remisión de solicitud de aprobación a la Supervisión informando los resultados obtenidos de las encuestas, actas de vecindad, formatos PCI requeridos con su respectivo registro fotográfico como parte de los anexos del diagnóstico de los potenciales beneficiarios que fueron elaborados en campo en las respectivas visitas para dar cumplimiento con el alcance de la ejecución del CONTRATO DE OBRA 2220576 de 2022, el cual tiene como objeto "CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.*

DE LA ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. *El consorcio Construredes inicio a la ejecución de 48 intervenciones cumpliendo con las especificaciones técnicas de los diseños establecidos.* ***EN LA ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2,3 se han desarrollado las actividades correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el PGS.***

2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO.

Córdoba, comúnmente llamado Córdoba Tetón es uno de los 46 municipios del departamentode Bolívar en la región Caribe de Colombia. Ubicada al costado izquierdo del Río Magdalena y muy cerca de las estribaciones de los Montes de María. La posición geográfica del municipio de Córdoba (Bolívar) es de 9°35´15" de latitud Norte y 74° 49´ 46" ubicado en los montes de María, según datos de la Alcaldía Municipal



Ilustración 1 Georreferenciación del Municipio Córdoba- Bolívar.

2.1 *LÍMITES.*

Al norte con Zambrano al este con el rio magdalena, al sur con los municipios de Magangué, San pedro y Buenavista, al oeste con ovejas y el Carmen de bolívar.

2.2 *GEOGRAFÍA.*

Geográficamente el municipio se encuentra limitado al norte por el Arroyo Mancomojan, al oeste por Arroyo Mancomojan, al este por el río Magdalena y al sur por el carreteable que une Pueblo nuevo con Sincelejito y el Arroyo de Poncio.

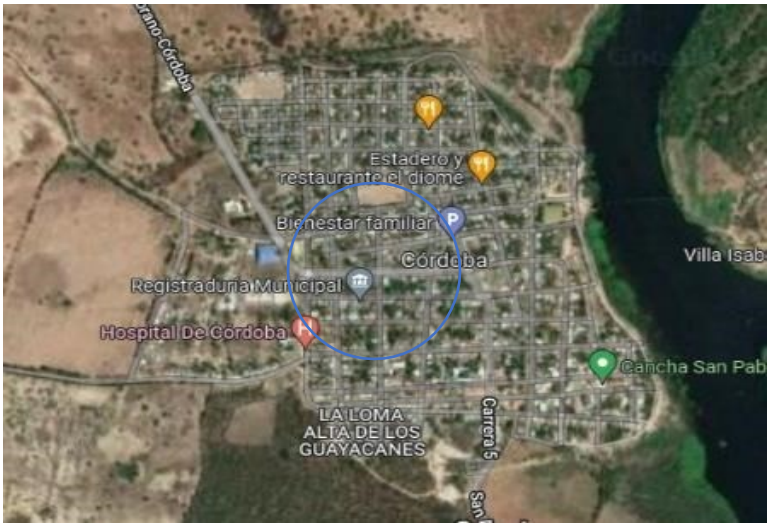


Ilustración 2 Georreferenciación barrio San Martin, Córdoba- Bolívar.

2.3 *DEMOGRAFÍA.*

El municipio de Córdoba la población Económicamente Activa (PAE) está conformada por alrededor del 45% de su población total, de la cual el 85% se dedica a la agricultura y la pesca, el 5% al comercio informal, el 5% a la ganadería y el 5% a otras actividades (Plan Básico Ordenamiento Territorial 2002-2009).
Teniendo en cuenta que más del 50% de la población es netamente rural, el municipio de Córdoba posee como una de las actividades económicas principales la producción agrícola,y se ha venido posicionando en el mercado como uno de los principales productores de ajonjolí en el ámbito nacional, de igual manera se presentan cultivos importantes de tabaco,maíz, algodón y ñame.

En la agricultura, que comparada con la ganadería es apenas una fuente económica secundaria, se destaca el municipio económicamente depende de las actividades primordiales del sector agropecuario, La producción de maíz, yuca, ñame y plátano.

3.CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	*2220576 DE 2022*
OBJETO:	*CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.*
LOCALIZACIÓN:	*MUNICIPIO CORDOBA-BOLIVAR*
CLIENTE:	*ENTerritorio – EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL*
FECHA DE INICIO:	*26 DE ABRIL DE 2022*
FECHA TERMINACIÓNSEGÚN CONVENIO:	*26 DE SEPTIEMBRE DE 2022*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	*26 DE SEPTIEMBRE DE 2022*
FECHA INICIO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	*N/A*
FECHA DE TERMINACIÓNFINAL DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	*N/A*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO CONSTRUREDES*
CONTRATANTE:	*ENTerritorio – EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL*
INTERVENTOR:	*ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA*
REPRESENTANTE LEGAL:	*FEDERICO CARDONA*
SUPERVISOR ENTerritorio:	*KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ*
PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	*Cinco (5) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO (26/04/2022 – 26/09/2022)*
VALOR INICIAL CONTRATO:	*MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CONNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.771.707.945,99) M/CTE.*
VALOR DEL ANTICIPO:	*20% del valor de la actividad N° 3*

ACLARACIÓN CONDICIÓN RESOLUTORIA:	
PLAZO INICIAL MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1:	
ACLARACIÓN CONDICIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	

Tabla 1 Resumen de la información general del Contrato.

4 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO.

El CONSORCIO CONSTRUREDES presenta un resumen de los aspectos contractualesdel contrato de obra, donde se relacionan las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual expedidas por la Compañía de Seguros del Estado
S.A. con sus respectivos amparos requeridos en el contrato de obra, el acta de inicio y lamodificación contractual No. 1 del contrato de la referencia:

Tabla 2. Control Aspectos contractuales de garantías.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 23/03/ 2022 – ANEXO 0			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	10 %N/A	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	15% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 31/03/ 2022 – ANEXO 1			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	N/A	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 01/04/ 2022 – ANEXO 2			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	N/A	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 16/03/2022 HASTA EL 16/08/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 19/04/ 2022 – ANEXO 3			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 19/04/ 2022 – ANEXO 4			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	N/A	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 18/04/2022 HASTA EL 18/09/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 27/04/ 2022 – ANEXO 6			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	10% N/A	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA RCE- 11-40-101046444 DE 13/05/ 2022 – ANEXO 7			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$177,170,794.60
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60
GASTOS MEDICOS	N/A	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA – MÍNIMO 1.00 SMMLV	DESDE 26/04/2022 HASTA EL 26/09/2022	$ 177,170,794.60

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA 11-45-101112033 DEL 24/03/2022 - ANEXO 0			
DESCRIPCION DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30% DEL VALOR DEL CONTRATO	16/03/2022 HASTA 16/ 04/ 2023	$ 354.450.914,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100% DEL VALOR DEL ANTICIPO	SÍ AMPARA 1 AÑO, 0 MESES Y 0 DÍAS	$ 177.170.794.60
CUMPLIMIENTO	5% DEL VALOR DEL CONTRATO	16/03/2022 HASTA 16/ 04/ 2023	$ 531.512.383.80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	16 / 03/ 2023 HASTA 16 /08/2025	$ 177.170.794.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30% DEL VALOR DEL CONTRATO S	SI AMPARA 3 AÑO, 0 MESES Y 0 DÍA	$ 531.512.383.80

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA 11-45-101112033 DEL 19/04/2022 - ANEXO 1			
DESCRIPCION DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA 11-45-101112033 DEL 19/04/ 2022 - ANEXO 2			
DESCRIPCION DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30% DEL VALOR DEL CONTRATO	18/04/2022 HASTA 19/ 05/ 2023	$ 354.450.914,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100% DEL VALOR DEL ANTICIPO	18/09/2022 HASTA 18/09/2023	$ 177.170.794.60
CUMPLIMIENTO	5% DEL VALOR DEL CONTRATO	18/04/2022 HASTA 19/ 05/ 2023	$ 531.512.383.80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	18/04/2022 HASTA 18/ 09/ 2025	$ 177.170.794.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30% DEL VALOR DEL CONTRATO S	18/09/2022 HASTA 18/09/2025	$ 531.512.383.80

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA 11-45-101112033 DEL 02/05/2022 - ANEXO 4			
DESCRIPCION DE AMPAROS	**% DE AMPAROS Y VIGENCIAS**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30% DEL VALOR DEL CONTRATO	26/04/2022 HASTA 27/05/2023	$ 354.450.914,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100% DEL VALOR DEL ANTICIPO	SÍ AMPARA 1 AÑO, 0 MESES Y 0 DÍAS	$ 177.170.794.60
CUMPLIMIENTO	5% DEL VALOR DEL CONTRATO	26/04/2022 HASTA 27/05/2023	$ 531.512.383.80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	26/04/2022 HASTA 26/09/2025	$ 177.170.794.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30% DEL VALOR DEL CONTRATO S	SÍ AMPARA 3 AÑO, 0 MESES Y 0 DÍAS	$ 531.512.383.80

4 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO.

El CONSORCIO CONSTRUREDES, presenta un resumen de los aspectos financieros del contrato delas actividades 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con la Programación Vs. Ejecución de obra a corte del 26 De abril al 30 de JUNIO de 2022.

Tabla 3. Aspectos Financieros

DESCRIPCIÓN	***VALOR TOTAL / INCIDENCIA***	***PROGRAMADO***	***EJECUTADO***	***FACTURADO***
ACTIVIDAD 1: *CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR – 10.*	*$ 5.140.026,35* *100.00 %*	*$ 5.140.026,35* *100,00 %*	*$ 5.140.026,35* *100,00 %*	*$ 0.0* *00,00 %*
ACTIVIDAD 2: *DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.*	*$ 39.313.349,11* *100 %*	*$ 39.313.349,11* ***100 %*** ***217 diagnósticos***	*$ 21.740.282,06* ***55,30 %*** ***120 diagnósticos***	*$ 0.0* *0,00 %* *0 diagnósticos*
ACTIVIDAD 3: *EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.*	*$ 1.727.254.570, 53* *100 %*	***$ 589.017.689,24*** ***34,1 %*** ***74 viviendas***	***$ 379.996.005,5166*** ***22 %*** ***48 viviendas***	***$0*** ***0 %*** ***0 viviendas***
ACTIVIDAD 4: *PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES1, 2 Y 3.*				

4.1 *PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA*

El plazo total previsto para la ejecución de la actividad 1 de chequeo y validación de diseñosfue de quince (15) días calendario (del 26 de abril al 11 de mayo de 2022) y de la actividad 2 de diagnóstico, validación preliminar, concertación y planeación de la intervención del contrato de obra de (59) días contados a partir del acta de inicio (del 26 de abril al 25 de junio de 2022), en el todo el barrio San Martín y de la actividad 3. ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras desde el 26 de junio de 2022 hasta el día 26 de septiembre del 2022 como plazo contractual establecido por el convenio para finalizar el contrato

4.2 FECHA DE SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO.

El contrato de obra se suscribió entre la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio y el Contratista - Consorcio Construredes el día 26 de abril de 2022, en la ciudad de Bogotá D.C.

5 *AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ELPROYECTO.*

El día 26 de abril de 2022 fue concertada el acta de inicio del proyecto, donde intervinieron el Contratista de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES, representado legalmente por el CARLOS GUTIERREZ y el Contratista de Interventoría – ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. representado legalmente por FEDERICO CARDONA, ante la Entidad Contratante la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, responsable directo del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad yTerritorio – Min Vivienda.

El desarrollo del Proyecto se divide en cuatro (4) actividades inherentes al Programa de conexiones intradomiciliarias – PCI, de las cuales se han realizado las dos primeras con el acompañamiento, control y seguimiento en campo de la Interventoría, entidad territorial municipal y demás entes involucrados (Prestador de servicios de acueducto y alcantarillado "COOSEPCOR LTDA"), de tal forma que la ejecución de las actividades del Proyecto se han definido condiciones mínimas de cumplimento por realizar el CONSORCIO CONSTRUREDES:

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.

El Consorcio Construredes presentó a fecha del 30 De mayo del contrato de Obra Nro. 2220576 DE 2022, los respectivos diseños estructurales de los prototipos de obra (Cumplimiento de la NSR – 10 enel Municipio de Córdoba Bolívar), teniendo en cuenta los esquemas y diseños arquitectónicos suministrados por ENTerritorio, los cuales serán los diseños a implementarse en el proyecto. El Contratista tendrá en cuenta, como mínimo, lo definido en el CAPÍTULO E.2 CIMENTACIONES. E.2.1 — GENERALIDADES. E.2.1.1 — INVESTIGACIÓN MÍNIMA de la

Norma sismo resistente NSR – 10 que se encuentran en revisión por parte de interventoría.

La validación estructural de los prototipos se realizó a partir de las especificaciones y medidas entregados por la Supervisión de ENTerritorio en los planos arquitectónicos, siendo radicados el día 27 de mayo de 2022 mediante Oficio CCR_CORDOBA_2220576_2022_036 del Consorcio Construredes. Así mismo, el Contratista tendrá en cuenta los materiales y acabados requeridos para la ejecución del proyecto, los cuales se pueden apreciar en los esquemas entregados por ENTerritorio.

en este numeral se incluyen los siguientes ajustes:

CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA (2)
Oficio Nro. CCR_CORDOBA_2220576_2022_045, De 06 de Junio del 2022

CARTA DE PROVEEDORES BLOQUE Y CALADO
Oficio Nro. CCR_CORDOBA_2220576_2022_053, De 16 de Junio del 2022

INFORME ESTRUCTURAL CASETA T # 2
Oficio Nro. CCR_CORDOBA_2220576_2022_056, De 22 de Junio del 2022

5.1 ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓNDE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

El Consorcio Construredes en este periodo mensual de obra realizó las siguientes actividades de diagnósticos, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la actividad de diagnósticos programados en viviendas visitadas diagnosticadas en el San Martin:

CLASIFICACIÓN	***BARRIO SAN MARTIN***
Viviendas visitadas más inclusiones	*50*
Viviendas efectivas	*50*
Viviendas No efectivas	*0*
Viviendas aprobadas por la Interventoría	*50*
Solicitud de inclusiones	*76*
Renuncias	*1*

El Contratista ha realizado a la fecha del 01 al 30 de junio de 2022, visita a cincuenta (50) viviendas, y recibido setenta y seis (76) solicitudes de inclusión, además, se cuenta con cincuenta (50) viviendas efectivas, cero (0) viviendas No efectivas, y un (1) diagnóstico corresponde a renuncia en el Barrio San Martín.

En cada una de las viviendas de los potenciales beneficiarios del Programa de conexiones intradomiciliarias se realizó una encuesta validada y ajustada que compila el insumo y de acuerdo con los resultados del diagnóstico y el esquema de intervención propuesto han sido entregados a la Interventoría (en medio impreso), quien determina el cumplimiento de los requisitos mínimos según el Programa de conexiones intradomiciliarias.

Por lo anterior, en la actividad 2 se han presentado atrasos técnicos administrativos en la entrega de los diagnósticos y los porcentajes negativos de los avances de dicha actividad, los cuales han sido informados a la Interventoría en los diferentes comités de seguimiento realizados hasta el día 4,10,15 , 16 y 29 de JUNIO del 2022; lo anterior teniendo en cuenta que los atrasos no han sido de los comité de aprobación, sino por parte del contratista de obra de acuerdo al cronograma establecido para la actividad N°2.

El plazo contractual inicial para la actividad N°2 se cuenta desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26 de junio (dos meses).

6.2.1. La acción implementada definida en el plan de trabajo inicial donde se hallevado a cabo el siguiente procedimiento:

- *Visita conjunta entre Contratista e Interventoría en la elaboración de los diagnósticos en el San Martin a partir del día 2/05/2022.*
- *Verificación y revisión mediante la encuesta y visita directa en cada vivienda, identificando las viviendas incluidas en los listados de la matriz del MinVivienda y de laAlcaldía Municipal, que tienen la necesidad potencial de intervención.*
- *Se realiza la elaboración de los diagnósticos desde el día 02/05/2022 en el Barrio San Martin de acuerdo a la evaluación técnica con base a las necesidades establecidas en*

el alcance de la intervención que se requiera en cada una de las viviendas diagnosticadas.

- *Elaboración de la documentación con formatos PCI para los diagnósticos de forma organizada en una carpeta tipo AZ y lo presenta semanalmente por entregas parcialesa la Interventoría para revisión y aprobación del equipo técnico y social.*
- *La Interventoría realiza la respectiva revisión y solicita mediante observaciones las respectivas correcciones y demás ajustes que se encuentren y requieran de modificaciones.*
- *Se han realizado Comités de aprobación de los diagnósticos los miércoles y comités de seguimiento de obras los días jueves de cada semana.*

6.2.2. Durante las visitas técnicas de diagnóstico y validación se realiza la elaboración de la información básica de cada vivienda y determina el alcance definitivo presentado a la Interventoría para su aprobación, previa realización de las siguientes actividades:

- *Verificación de datos básicos del potencial beneficiario en el listado de la Matriz del Barrio San Martín entregado por ENTerritorio por medio de la Interventoría.*
- *Determinación de las obras requeridas para cada vivienda diagnosticada una vez sea efectiva de acuerdo con el tipo de intervención concertado en el diagnostico final aprobado.*
- *Elaboración del plan de intervención, con esquemas y plano arquitectónico que permiten definir la necesidad de intervención de obra en cada vivienda efectiva.*
- *Elaboración del presupuesto de obra estimado inicialmente para cada vivienda según los formatos presupuestales de los diagnósticos.*
- *Toma de registro fotográfico antes de la intervención de las obras recolectadas en la visita técnica a cada una de las viviendas, donde se evidencian las condiciones de los aparatos sanitarios existentes (sanitario, lavamanos, ducha), lavaderos y lavaplatos existentes, especificando en el formato PCI-003 cuando se propone la reposición de losmismos por mal estado.*
- *Realizar la geo-referenciación por medio de la aplicación TimetampCam del registro fotográfico de los diagnósticos en el formato de esquemas producto del levantamiento a cada una de las viviendas diagnosticadas aprobadas como efectivas.*
- *Elaboración del formato PCI-009 - Acta de concertación de cada una de las viviendas diagnosticadas aprobadas como efectivas.*
- *Para un mayor control de las viviendas diagnosticadas el Contratista realizó la instalación de un adhesivo con el Logo del CONSORCIO CONSTRUREDES y el consecutivo de la vivienda visitada, colocado en un lugar visible en el acceso o puerta entrada a cada viviendacon el fin de identificarla como visita realizada en campo.*

Revisión de la lista de chequeo para diagnóstico: *Se han realizado las respectivascorrecciones en la elaboración de los formatos PCI requeridos al realizar el*

diligenciamiento de los formatos por algunos inconvenientes de interpretación técnica y social que fueron solicitados por la Interventoría al día 05 de mayo de 2022, de tal forma que el Consorcio Construredes ha cumplido con las subsanaciones de las correcciones requeridas por la Interventoría, las cuales contienen el listado de los requisitos para consolidar el diagnóstico definitivo de las viviendas, que hace parte integral del presenteestudio de la actividad 2.

6.2.3. El Consorcio presentó un informe de cada una de las viviendas con toda la documentación:

- *Listado del número de viviendas diagnosticadas totalmente en el cierre del Barrio del San Martin*
- *Fichas del PCI-010 y formatos requeridos para cada intervención de las conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, las cuales Contienen la información para el inicio de la intervención de obra.*

6.2.4. Comités de seguimiento y aprobación de Diagnósticos.

Los comités de seguimiento de las actividades de obra y de aprobación de diagnósticos realizados semanalmente han contado con la asistencia del Contratista de obra, Interventoría, representantes de Min vivienda y ENTerritorio, con una periodicidad semanallos días miércoles (seguimiento de obra) y viernes o sábado (aprobación de diagnósticos),donde se ha presentado el avance técnico y social del contrato, detallando los inconvenientes y problemas que se han presentado en la actividades de campo realizandolos respectivos Diagnósticos, concertación y gestión social y planeación de intervención delas viviendas diagnosticadas y aprobadas por la interventoría.
El objeto de los comités de seguimiento de obras y aprobación de diagnósticos ha sido poner en conocimiento de la Interventoría y la Supervisión la información levantada y procesada en campo de forma organizada de cada una de las viviendas diagnosticadas por el Consorcio Construredes, con el fin de concertar con la Interventoría el plan de intervención de cada vivienda aprobada como efectiva. Dicha información ha sido radicada a la Interventoría semanalmente para su revisión un día antes de la fecha de loscomités de aprobación.

En estos comités se ha revisado la documentación e información de campo elaborada porel Consorcio Construredes y en su momento la Interventoría realizó la revisión y la respectiva aprobación para la intervención de las viviendas diagnosticadas como efectivasque han cumplido con todos los criterios del Programa de conexiones intradomiciliarias – PCI.

Una vez la Interventoría ha aprobado los diagnósticos, con la concertación y elaboracióndel plan de intervención adelantado por el Consorcio Construredes, la misma autoriza el

inicio de la intervención a las viviendas que serán viables para ser beneficiadas con losrecursos del Programa de conexiones intradomiciliarias – PCI.

6.3 ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.

El Consorcio Construredes en este periodo mensual de obra realizó las siguientes actividades de ejecución de la construcción de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias,

CLASIFICACIÓN	***BARRIO SAN MARTÍN***
Viviendas iniciadas	*48*
Viviendas terminadas	*11*
Viviendas recibidas a satisfacción	*0*
Viviendas en ejecución	*37*

a) *Para la construcción de las conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado el Consorcio Construredes ha concertado su ejecución con el Prestador del servicio de acueducto y alcantarillado COOSEPCOR LTDA, del Municipio de Córdoba mediante la Certificación de autorización de intervención para la conexión de las acometidas domiciliarias.*

b) *Cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto con el prestador de servicios públicos de acueducto y alcantarillado – COOSEPCOR LTDA.*

c) *Elaboración del presupuesto de intervención de cada vivienda efectiva con el alcance del programa de conexiones intradomiciliarias estructurado de acuerdo con los ítems contractuales de la oferta económica del Contratista de Obra.*

d) *Elaboración del presupuesto de intervención de cada vivienda efectiva con el alcance del programa de conexiones intradomiciliarias estructurado de acuerdo con los ítems contractuales de la oferta económica del Contratista de Obra.*

e) *inicio de las actividades constructivas establecidas previamente en cada uno los presupuestos de cada intervención. Formato PCI 007 y PCI 008.*

6.4 ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3.

El equipo social del Consorcio Construredes presentó al inicio del contrato de obra el Plan de Gestión Social (PGS) como eje transversal que orienta el desarrollo de las actividades sociales enfocadas a la promoción de la participación de la comunidad y corresponsabilidad de las familias beneficiadas para sostenibilidad de las intervenciones.

Se implementó el Plan de Gestión Social con el apoyo y acompañamiento de las entidades involucradas en la ejecución del Programa en el Municipio de Córdoba con el fin de mitigary compensar los impactos derivados de la ejecución del Programa.

El Plan de Gestión social se ha ejecutado desde el inicio de las actividades 1 etapa de diseños, etapa 2 diagnosticos, etapa 3 ejecucion de actividade, donde se presentan los lineamientos y actividades que componen e implementan de manera articulada entre las entidades involucradas ENTerritorio, COOSEPCOR, Contratista de Obra e Interventoría en la ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias según las obligaciones, por lo cual se requiere verificar los roles y funciones donde se presentan las acciones específicas de cada uno delos actores que participan el programa, así como las acciones que se realizan en articulación con las entidades mencionadas.

7. FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA.

El Consorcio Construredes adjuntó COPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA como memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de la Interventoría de los conceptos delos especialistas, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto , de maneraque se logre la compresión general de la obra y el desarrollo de actividades realizadas en campo de acuerdo con la programación detallada presentado por el Contratista y avalada por la Interventoría del Contrato. ***Ver Anexo No. 3: "Fotocopia de la Bitácora de Obra".***

7.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.

El Consorcio Construredes elaboró una descripción detallada en el capitulo 3: AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS en la actividad 1: chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR–10; en la actividad 2 diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención, durante este periodo se realizaron 56 diagnostico los cuales fueron aprobados por la interventoria en los comite de aporbacion 2,3,4,5,6. actividad 3 ejecucion de donde se registra el avance de las actividade las obras de las conexiones intradomiciliaria y domiciliaria, durante el presente periodo se aralizaron las siguientes actividades: excavaciones para en las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios.

Sin embargo, el Contratista de Obra adjunta la relación de viviendas visitadas ydiagnosticadas en el Barrio San Martín.

Tabla 4 - Identificación de los beneficiarios.

CODIGO DE APROBACION	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DIRECCION	TIPO DE INTERVENCION
B-C-SM-MZ29-VE-001	ALCIDES MIGUEL VERGARA VERGARA	CRA 4A CL 9-10	ADECUACION
B-C-SM-MZ32-VE-002	DEIVIS DEL CARMEN HERNANDEZ ESCOBAR	CL 10 4A-33	CASETA T3
B-C-SM-MZ32-VE-003	EDUARDO LUIS VILLAMIZAR HERNANDEZ	CL 9 4A-5	CASETA T3
B-C-SM-MZ18-VE-004	AGUEDA MARIA ORTEGA MEDINA	CRA 3 CL 7-4	CASETA T3
B-C-SM-MZ22-VE-005	MERYS MARINA MEDINA MORANTE	CRA 4 CL 7-26	ADECUACION
B-C-SM-MZ34-VE-006	ROBIINSON RAFAEL BENITEZ PRIETO	CRA 9 11-34	ADECUACION
B-C-SM-MZ22-VE-007	ARMANDO DE JESUS ROSALES MERCADO	CRA 4 CL 7-44 APTO 1	ADECUACION
B-C-SM-MZ34-VE-008	ENITH MARIA FONSECA PALENCIA	CRA 4 CL 7-41	RECHAZO
B-C-SM-MZ22-VE-009	SEBASTIAN GONZALEZ ACOSTA	CRA 4 CL 7-70	CASETA T3
B-C-SM-MZ21-VE-010	ANICIA ISABEL BARRIOS ROMERO	CL 8 3-10	CASETA T3
B-C-SM-MZ22-VE-011	JOSE DE JESUS ANAYA HENAO	CL 8	ADECUACION
B-C-SM-MZ34-VE-012	MARCO RAFAEL HENAO MERCADO	CRA 4 CL 8-139	CASETA T3
B-C-SM-MZ21-VE-013	INGRIS JOHANA VILLAMIZAR HERNANDEZ	CRA 4 CL 8-42	ADECUACION
B-C-SM-MZ21-VE-014	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ESCOBAR	CRA 4 CL 8-34	CASETA T3
B-C-SM-MZ21-VE-015	LILIANA DIAZ MARTINEZ	CL 8 CRA 6-21	CASETA T3
B-C-SM-MZ21-VE-016	YEIRA LUCIA REGINO DIAZ	CL 9	CASETA T3
B-C-SM-MZ38-VE-017	ALVARO DE JESUS PEREZ ESCOBAR	CL 9 4-30	CASETA T3
B-C-SM-MZ24-VE-018	JESUS ANTONIO CANTILLO SANCHEZ	CRA 4 CL 9-13	CASETA T3
B-C-SM-MZ24-VE-019	DEIBIS DE JESUS PIÑA SIERRA	CRA 4 CL 9-23	ADECUACION
B-C-SM-MZ24-VE-020	FRANCISCO MIGUEL MEDINA RODRIGUEZ	CL 10 4-1	CASETA T3
B-C-SM-MZ85-VE-021	SIXTA TULIA ACUÑA ARIZA	CL 10 4-2	CASETA T3
B-C-SM-MZ85-VE-022	JOHN JAIRO RAMOS VASQUEZ	CL 10 4-26	CASETA T3
B-C-SM-MZ85-VE-023	TERESA DE JESUS BARBOSA RODRIGUEZ	CL 10 4-30	ADECUACION
B-C-SM-MZ29-VE-024	CARMEN EDITH ACOSTA LOPEZ	CL 10 4-57	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-025	MILTON VILLAMIL DAVILA	CL 10 4A-7	CASETA T3
B-C-SM-MZ31-VE-026	PETRONA EMILIA GUERRERO OSPINO	CL 10 4A-17	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-027	YOLANDA ESTHER MIRANDA FUNES	CL 10 CRA 4A-13	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-028	ISAAC DE LAS MERCEDES MIRANDA MARTINEZ	CL 10 4-25	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-029	BLASINA ISABEL RODRIGUEZ PIÑA	CL 10 4A-133	CASETA T3
B-C-SM-MZ31-VE-030	MANUEL DEL CRISTO PEREZ MEDINA	CL 10 4A-20	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-031	ELISA REYES VERGARA	CL 10 # 4A-51	CASETA T2
B-C-SM-MZ30-VE-032	JOSEFINA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVAREZ	CLL 10 # 4A-8	ADECUACION
B-C-SM-MZ44-VE-034	MANUEL DAVID CANTILLO MEZA	CLL 10 # 5A-2	ADECUACION
B-C-SM-MZ44-VE-035	HELEN DEL SOCORRO PINEDA CASERES	CLL 10 # 5A-24	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-038	ERASMO DE JESUS TORRES CASERES	CRA 6 # 9-30	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-039	YURANIS PAOLA GUERRA VILLAMIZAR	CRA 6 CL 9-50	ADECUACION
B-C-SM-MZ46-VE-040	JOSE DE JESUS MEJIA SANCHEZ	CL 9 5A-49	ADECUACION
B-C-SM-MZ45-VE-041	DORIS ISABEL JIMENEZ RAMIREZ	CL 10 5A-51	ADECUACION
B-C-SM-MZ21-VE-042	OLIVIA ESTER BOLAÑO PRIETO	CRA 4 CL 8-2	ADECUACION
B-C-SM-MZ31-VE-043	HECTOR MANUEL HENAO DIAZ	CL 9 4A-59	CASETA T3
B-C-SM-MZ145-VE-044	LUIS ROBERTO MERCADO TORRES	CALLE 11 #7A - 3	CASETA T3
B-C-SM-MZ55-VE-046	ARACELIS MARIA CANTILLO OVIEDO	CL 10A CRA 6-7	CASETA T3
B-C-SM-MZ55-VE-047	JORGE ELIECER BENITEZ PRIETO	CL 10 CRA 6-50	CASETA T2
B-C-SM-MZ145-VE-053	JAIME LUIS MOSILLO OCHOA	CL 11 CRA 7A-6	CASETA T3
B-C-SM-MZ91-VE-054	EMPERATRIZ ISABEL OCHOA HERRERA	CL 11 # 7A - 23	CASETA T2
B-C-SM-MZ56-VE-055	EDWIN SALVADOR ROSALES SIERRA	CL 10 6-29	
B-C-SM-MZ56-VE-055	EDWIN SALVADOR ROSALES SIERRA	CL 10 6-30	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-061	ALMA LUZ PALOMINO MARRUGO		ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-062	GILMA ORTEGA BOHORQUEZ	CL 10 # 6-61	CASETA T3
B-C-SM-MZ66-VE-067	HERIBERTO MANUEL DE LA ROSA RIVERA	CL 10 # 7-43	CASETA T3
B-C-SM-MZ66-VE-068	RAFAEL ENRIQUE MEDINA CAUSADO	CL 10 # 7-53	CASETA T3
B-C-SM-MZ66-VE-069	EMMA LUCIA MORENO REINA	CL 10 # 7-77	ADECUACION
B-C-SM-MZ75-VE-071	DONIDALDO DAVID FONSECA GONZALEZ	CRA 8 # 8-43	ADECUACION
B-C-SM-MZ75-VE-072	JUAN FEDERICO CAPELA AVILA	CL 10 # 8-1	CASETA T3
B-C-SM-MZ75-VE-073	JAVITH ENRRIQUE CAPELA HERNANDEZ	CRA 8 # 8-15	CASETA T3
B-C-SM-MZ75-VE-074	OSWALDO DEL CRISTO PIÑEREZ MENCO	CRA 8 # 8-10	CASETA T3
B-C-SM-MZ89-VE-084	BERANIA ISABEL MARTINEZ CANTILLO	CRA 6 # 11-43	CASETA T3
B-C-SM-MZ69-VE-085	ERMIDA ESTHER HENAO ESCOVAR	CL 6 CR 7 - 22	ADECUACION
B-C-SM-MZ69-VE-086	O	O	CASETA T3
B-C-SM-MZ69-VE-087	JOSE RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ	CL 6 CR 7 - 30	ADECUACION
B-C-SM-MZ69-VE-088	ARTURO EDUARDO ALVAREZ MEZA	CL 5 CR 6-5	ADECUACION
B-C-SM-MZ77-VE-094	SARA ESTHER FONSECA ROMERO	CR 8 CL 6 - 37	ADECUACION
B-C-SM-MZ68-VE-097	MOISES JOSE VERGARA VEGA	CR 7 # 7 - 75	CASETA T3
B-C-SM-MZ59-VE-099	URIEL JOSE BENITEZ VALETH	CL 5 CR2 - 93	ADECUACION
B-C-SM-MZ58-VE-100	PEDRO RAFAEL PORTO FONSECA	CL 7 CR 6 - 36	
B-C-SM-MZ58-VE-101	TERESA ISABEL PORTO FONSECA	CL 7 KR 6 - 18	ADECUACION
B-C-SM-MZ59-VE-102	JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO	CL 7 CR 6 - 35	
B-C-SM-MZ47-VE-103	PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE	CL 8 CR 5A - 1	ADECUACION
B-C-SM-MZ47-VE-104	TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ	CL 8 CR 5A - 23	ADECUACION
B-C-SM-MZ58-VE-107	FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA	CL 8 # 6 - 27	ADECUACION
B-C-SM-MZ47-VE-110	ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ	CL 7 CR 5A - 74	ADECUACION
B-C-SM-MZ47-VE-111	MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA	CL 7 CR 5A - 50	CASETA T3
B-C-SM-MZ47-VE-112	YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA	CL 7 5 - 50	ADECUACION
B-C-SM-MZ47-VE-113	JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA	CL 7 # 5A-22	ADECUACION
B-C-SM-MZ47-VE-114	MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA	CL 7 CR 5 - 20	CASETA T3
B-C-SM-MZ47-VE-115	ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO	CL 7 # 5A-10	CASETA T3
B-C-SM-MZ30-VE-120	DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA	CR 5A CL 10 - 32	CASETA T3
B-C-SM-MZ30-VE-121	AMALFI ESTHER NIETO REALES	CL 11 4A - 69	CASETA T3
B-C-SM-MZ30-VE-122	RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES	CL 11 4A - 59	CASETA T3
B-C-SM-MZ87-VE-124	FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ	CL 11 4A - 70	CASETA T3
B-C-SM-MZ3O-VE-125	JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES	CL 11 KR 4A - 19	CASETA T3
B-C-SM-MZ30-VE-126	MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ	CL 11 4A - 29	CASETA T3
B-C-SM-MZ87-VE-127	FELIPE MANUEL VERGARA VILLA	CL 11 4A-32	CASETA T3
B-C-SM-MZ87-VE-128	JOSE GREGORIO MARTINEZ MEZA	CR 4A 11 - 15	ADECUACION
B-C-SM-MZ87-VE-129	SANDRA PAOLA GUISADO FERNABDEZ	CL 12 4A - 27	CASETA T3
B-C-SM-MZ66-VE-131	ANDY XIOMARA ESCUDERO PEREZ	CRA 8 CL 9-3	CASETA T3
B-C-SM-MZ66-VE-134	MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO	CL 9 # 7 - 46	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-135	ERASMO MANUEL PEREZ DIAZ	CL 9 # 6 - 88	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-136	ALEJANDRO PEREZ PADILLA	CL 9 6-75	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-138	TOMAS FONSECA GONZALEZ	CL 9 6-58	ADECUACION
B-C-SM-MZ56-VE-139	OSCAR DAVID BECERRA RIVERA	CL 9 CRA 6-38	CASETA T3
B-C-SM-MZ56-VE-140	INES BENEDICTA PADILLA PALENCIA	CL 9 6-46	CASETA T3
B-C-SM-MZ31-VE-142	APOLER ROMAN CALVO HOYOS	CL 9 4A-39	ADECUACION
B-C-SM-MZ32-VE-143	EDWIN GABRIEL PUELLO CHAMORRO	CR 4A CL 8 - 45	CASETA T3
B-C-SM-MZ32-VE-144	JUAN ALVIS VERGARA	CR 4A CL 8 - 39	ADECUACION
B-C-SM-MZ87-VE-145	MANUELA SEGUNDA VILLA AYOLA	CL 12 # 4A - 3	CASETA T3
B-C-SM-MZ87-VE-146	FIDEL ENRIQUE HENAO ESCOBAR	CL 12 # 4A - 39	ADECUACION
B-C-SM-MZ87-VE-147	ANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ	CL 12 4A - 49	CASETA T3
B-C-SM-MZ87-VE-148	JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA	CR 5A 11- 48	CASETA T3
B-C-SM-MZ89-VE-149	ROBERT JAVITH VERGARA JEREZ	CL 12 5A-39	CASETA T3
B-C-SM-MZ89-VE-150	PABLO EMILIO CAUSADO SANCHEZ	CRA 6A 11-30	CASETA T3

7.2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

El Consorcio Construredes presenta a continuación un registro fotográfico de las actividades llevadas a cabo durante la ejecución de la actividad 3: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS en las viviendas intervenidas en el mes de JUNIO en el Barrio san Martín:

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ32-VE-002:

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción cajas registro de inspección y redes sanitarias.

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de muros en mampostería gris 0.1m

FOTOGRAFÍA No. 3



Trazado y replanteo

FOTOGRAFÍA No. 4



Fundida de viga cimiento 25cm x 30cm

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ21-VE-016:

FOTOGRAFÍA No. 1



Trazado y replanteo

FOTOGRAFÍA No. 2



Excavación viga cimiento

FOTOGRAFÍA No. 3



Fundida viga cimiento

FOTOGRAFÍA No. 4



Inicio de construcción muros 0.1 m

FOTOGRAFÍA No. 5



Construcción caja de inspección.

FOTOGRAFÍA No. 6



Conexión red domiciliaria

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ18-VE-004:

FOTOGRAFÍA No. 1



Conexiones hidrosanitarias

FOTOGRAFÍA No. 2



Fundida de columnetas 10cm x 20cm

FOTOGRAFÍA No. 3



Construcción de muros en mampostería 0.1m de caseta – unidad sanitaria.

FOTOGRAFÍA No. 4



Figuración de acero para estribos en barra # 3 para viga de soporte de placa para tanque elevado

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ32-VE-015:

FOTOGRAFÍA No. 1



FOTOGRAFÍA No. 2



Fundida de viga corona para confinamiento de columnas

FOTOGRAFÍA No. 3



Conexiones intradomiciliarias

FOTOGRAFÍA No. 4



Construcción de registro (caja de inspección)

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ21-VE-015:

FOTOGRAFÍA No. 1



Conexiones intradomiciliarias – instalación de tubería 4" para desagüe de aguas servidas

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de unidad sanitaria caseta tipo 3

FOTOGRAFÍA No. 3



Construcción de viga corona para confinamiento de columnas

FOTOGRAFÍA No. 4



Encofrado para fundida de columnetas

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ21-VE-013:

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de caja registro de inspección y redes sanitarias de aguas servidas.

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de placa de concreto para tanque elevado-instalación de lavadero

FOTOGRAFÍA No. 3



Excavación para construcción de registro (caja de inspección)

FOTOGRAFÍA No. 4



Corte de acero y figuración para cajas de inspección

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ32-VE-010:

FOTOGRAFÍA No. 1



Instalación de válvula de cierra para tanque elevado.

FOTOGRAFÍA No. 2



Vaciado concreto para columnas .

FOTOGRAFÍA No. 3



Excavación para viga cimiento 25cm x 30cm

FOTOGRAFÍA No. 4



Figurado de acero para viga cimiento

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ34-VE-006:

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de redes tubería de desagües de aguas servidas.

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de caja registro de inspección y reemplazo de tubería existente liviana a tubería pesada

FOTOGRAFÍA No. 3



Instalación de cerámica antideslizante y enchape de pared (adecuación)

FOTOGRAFÍA No. 4



Construcción estructura para tanque elevado

FOTOGRAFÍA No. 5



Recuperación de pañete y revoques en zona con humedad parcial

FOTOGRAFÍA No. 6



Fundida de losa en concreto para soporte de tanque elevado

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ22-VE-005:

FOTOGRAFÍA No. 1



Encofrado para fundida de estructura para tanque elevado.

FOTOGRAFÍA No. 2



Instalación de micromedidor con válvula de corte



Retiro de accesorios sanitarios en mal estado



Optimización de red intradomiciliaria (reemplazo de tubería ½" para ducha)

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ22-VE-007:

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de columna de soporte para tanque elevado

FOTOGRAFÍA No. 2



Conexión intradomiciliaria (reemplazo de tubería liviana)

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ22-VE-016:

FOTOGRAFÍA No. 1



FOTOGRAFÍA No. 2



Revoque de las casetas tipo 3

FOTOGRAFÍA No. 3



Construcción de registro (caja de inspección)

FOTOGRAFÍA No. 4



Reemplazo de tubería liviana

VIVIENDA No. B-C-SM-MZ31-VE-026

FOTOGRAFÍA No. 1



Preparación de concreto

FOTOGRAFÍA No. 2



Instalación de cerámica de piso

FOTOGRAFÍA No. 3



Encofrado para estructura de tanque elevado

FOTOGRAFÍA No. 4



Columna para soporte de estructura de tanque elevado.

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ22-VE-011**

FOTOGRAFÍA No. 1



Excavación y construcción para caja registro de inspección y redes tubería de desagües de aguas servidas.

FOTOGRAFÍA No. 2



Demolición y reemplazo de tubería liviana a tubería pesada

FOTOGRAFÍA No. 3



Encofrado para estructura de tanque elevado

FOTOGRAFÍA No. 4



Instalación de micromedidor

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ34-VE-012**

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de columnetas de confinamiento

FOTOGRAFÍA No. 2



Encofrado para columnas

FOTOGRAFÍA No. 3



Construcción de mampostería y columnetas en concreto de unidad sanitaria.

FOTOGRAFÍA No. 4



Construcción vigas de amarre en concreto de unidad sanitaria.

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ24-VE-019**

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de registro caja de inspección

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de zapata para estructura de tanque elevado

FOTOGRAFÍA No. 3



Instalación de red intradomiciliaria aguas servidas

FOTOGRAFÍA No. 4



Construcción de pañete allanado interior unidad sanitaria existente

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ24-VE-018**

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de mampostería unidad sanitaria

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de columnas para placa de tanque elevado

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ38-VE-017**

FOTOGRAFÍA No. 1



Relleno compactado para plantilla

FOTOGRAFÍA No. 2



Construcción de viga corona para confinamiento de columnas de unidad sanitaria

VIVIENDA No. **B-C-SM-MZ21-VE-014**

FOTOGRAFÍA No. 1



Construcción de viga corona para confinamiento de columnas.

FOTOGRAFÍA No. 2



Toma de muestras para ensayos de concreto

- ***RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.***

El Consorcio Construredes adjuntó la RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, donde se registra los datos básicos del personal administrativo, Profesionales, Especialistas y personal operativo requerido para la ejecución de la actividad 2 y 3:

PERSONAL ADMINISTRATIVO				
NO.	***CÉDULA***	***NOMBRES Y APELLIDOS***	***FECHA DE INGRESO***	***CARGO***
1	*1.093.752.620*	*NORELIS ANAYA*	*02/05/2022*	*TRABAJADORA SOCIAL*
2	*1.118.528.862*	*OSWALDO GARZÓN RÍOS*	*25/05/2022*	*PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICOS*
3	*74.346.826*	*RONAL BLANCO ARROYO*	*02/05/2022*	*RESIDENTE DE OBRA*
4	*1.022.389.113*	*JUAN CAMILO MORENO*	*02/05/2022*	*PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS*
5	*1.069.464.406*	*DUARTE JOSE PINEDO DURANGO*	*02/05/2022*	*DIRECTOR DE OBRA*
6	*1.049.453.183*	*SINDI PAOLA ESCOBAR VERGARA*	*02/05/2022*	*ASISTENTE ADMINISTRATIVA*
7	*1.007.128.185*	*RAFAEL CASTILLO LOBO*	*02/05/2022*	*AUXILIAR SISO*
8	*1.049.452.136*	*JAIME ALBERTO DIAZ PEREZ*	*02/05/2022*	*MAESTRO DE OBRA*
9	*1.055.452.446*	*RAMIRO RAUL ANDRADE POTES*	*02/05/2022*	*ESPECIALISTA ESTRUCTURAL*

Tabla 5 Relación personal empleado para la ejecución de la obra,

- ***INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.***

El Consorcio Construredes presentó a la Interventoría mediante correo un archivo magnéticoformato PDF independiente el INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para revisión y aprobación del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoría
ARCA ARQUITECURA E INGENIERIA S.A. donde se registra todos los temas de seguridad y salud en el trabajo de las actividades ejecutadas en la actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención de las viviendas priorizadas y diagnosticadas en cumplimiento del objeto del contrato. ***Ver Anexo No. 4: "Informe de seguridad y salud en el trabajo".***

- ***INFORME DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO.***

El Consorcio Construredes a la fecha presentó a la Interventoría mediante correo un archivo magnético formato PDF independiente el INFORME DE MANEJO AMBIENTAL con lasdiferentes actividades ambientales realizadas por el Consorcio Construredes en el periodo inicial para revisión y aprobación del Profesional Ambiental de la Interventoría - ARCA ARQUITECURA E INGENIERIA donde se registra todos los temas delcomponente ambiental de las actividades ejecutadas en la actividad 2: Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención de las viviendas priorizadas y diagnosticadas en cumplimiento del objeto del contrato. ***Ver Anexo No. 5: "Informe de manejo ambiental del proyecto".***

- ***INFORME DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES.***

El Consorcio Construredes presentó a la Supervisión de ENTerritorio el negocio fiduciario emitido por la fiduciaria FID 317678 CONSORCIO CONSTRUREDES con NIT 901568676-5 para el manejo e inversión de los recursos correspondientes al 20 % del valor total de la actividad No. 3 por valor de trecientos Cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta milnovecientos catorce coma once m/cte. ($ 345.450.914,11) para su respectiva revisión y aprobación del abogado jurídico de la Entidad Contratante.

Además, adjuntamos el Plan de inversión del anticipo con los datos específicos de pagos desalarios, compra de materiales y accesorios, contribución del impuesto de guerra debidamente suscrito por los representantes legal del Consorcio Construredes y del Interventor – arca arquitectura e ingeniería S, A. ***Ver Anexo No. 6: "Plan de inversión del anticipo".***

- ***INFORME DE GESTIÓN SOCIAL***

El Consorcio Construredes presentó a la Interventoría mediante correo un archivo magnéticoformato pdf independiente el INFORME DE GESTIÓN SOCIAL para revisión y aprobación del Profesional Social de la Interventoría - ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA donde se registra todos los temas de gestión social con la Alcaldía Municipal de Córdoba, Empresaprestadora de Servicios públicos de acueducto y alcantarillado – COOSEPCOR LTDA, Personería Municipal, Veedores de la Comunidad y Juntas de acción comunal del barrio SanMartin con respecto a todas las actividades ejecutadas en la actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención de las viviendas priorizadas y diagnosticadas en cumplimiento del objeto del contrato. ***Ver Anexo No. 7: "Informe de gestión social".***

- ***ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (NO APLICA).***

- ***ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES DEL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES***

En el ***Anexo No. 9*** *se presenta la CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LAS SEGURIDADESSOCIALES Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA – CONSORCIO CONSTRUREDES, además se adjuntan las planillas de pago de los aportescorrespondientes al personal administrativo.*

- ***CONTROL DE CAMBIOS.***

Versión No.	***Fecha***	***Descripción de los Cambios con respecto a laversión Anterior***
	N/A	*N/A*

Versión No.	***Fecha***	***Descripción de los Cambios con respecto a la versión Anterior***
	N/A	*N/A*

ANEXO No. 1
"RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DECALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS".


Los anexos de los ensayos de laboratorios se encuentran en el informe PGIO, anexo componente de calidad

ANEXO No. 2
"RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS".

Los anexos de los ensayos de laboratorios y certificado de calibración se encuentran en el informe PGIO, anexo componente de calidad

ANEXO No. 3
"COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA".

El Consorcio Construredes adjuntó COPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA como memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de la Interventoría de los conceptos de los especialistas, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto , de manera que se logre la compresión general de la obra y el desarrollo de actividades realizadas en campo de acuerdo con la programación detallada presentado por el Contratista y avalada por la Interventoría del Contrato. ***Ver Anexo No. 3: "Fotocopia de la Bitácora de Obra".***

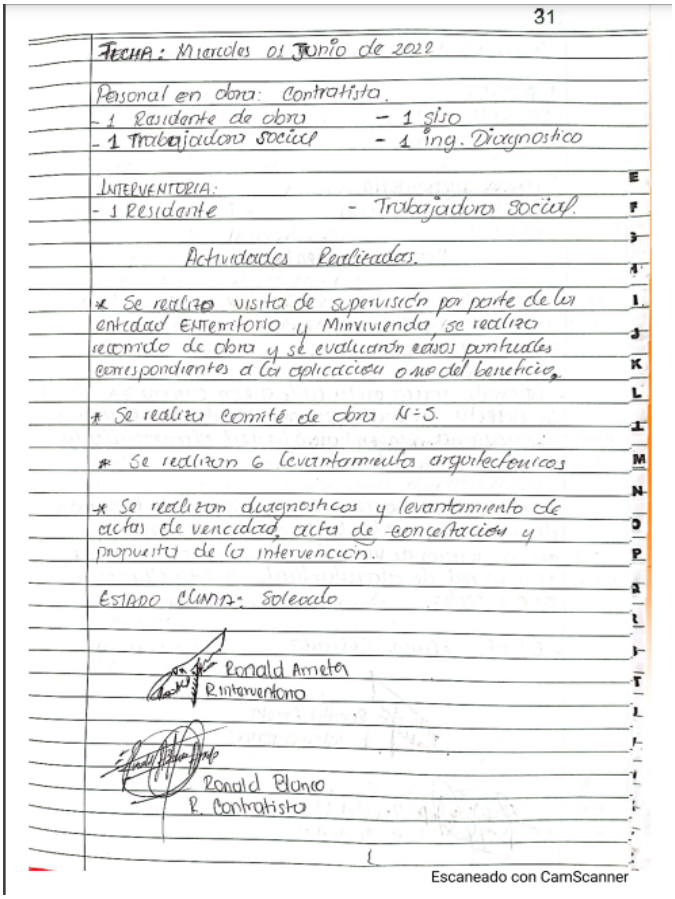

31

FECHA: Miercoles 01 Junio de 2022

Personal en obra: Contratista.
- 1 Residente de obra — 1 siso
- 1 Trabajadora Social — 1 Ing. Diagnostico

INTERVENTORIA:
- 1 Residente — Trabajadora Social.

Actividades Realizadas.

* Se realizo visita de supervisión por parte de la entidad Ente territorio y Minvivienda, se realizo recorrido de obra y se evaluaron ejes puntuales correspondientes a la aplicacion o uso del beneficio.

* Se realizo comité de obra N=5.

* Se realizan 6 levantamientos arquitectonicos


* Se realizan diagnosticos y levantamiento de actas de vencidad, acta de concertacion y propuesta de la intervencion.

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Ameth
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

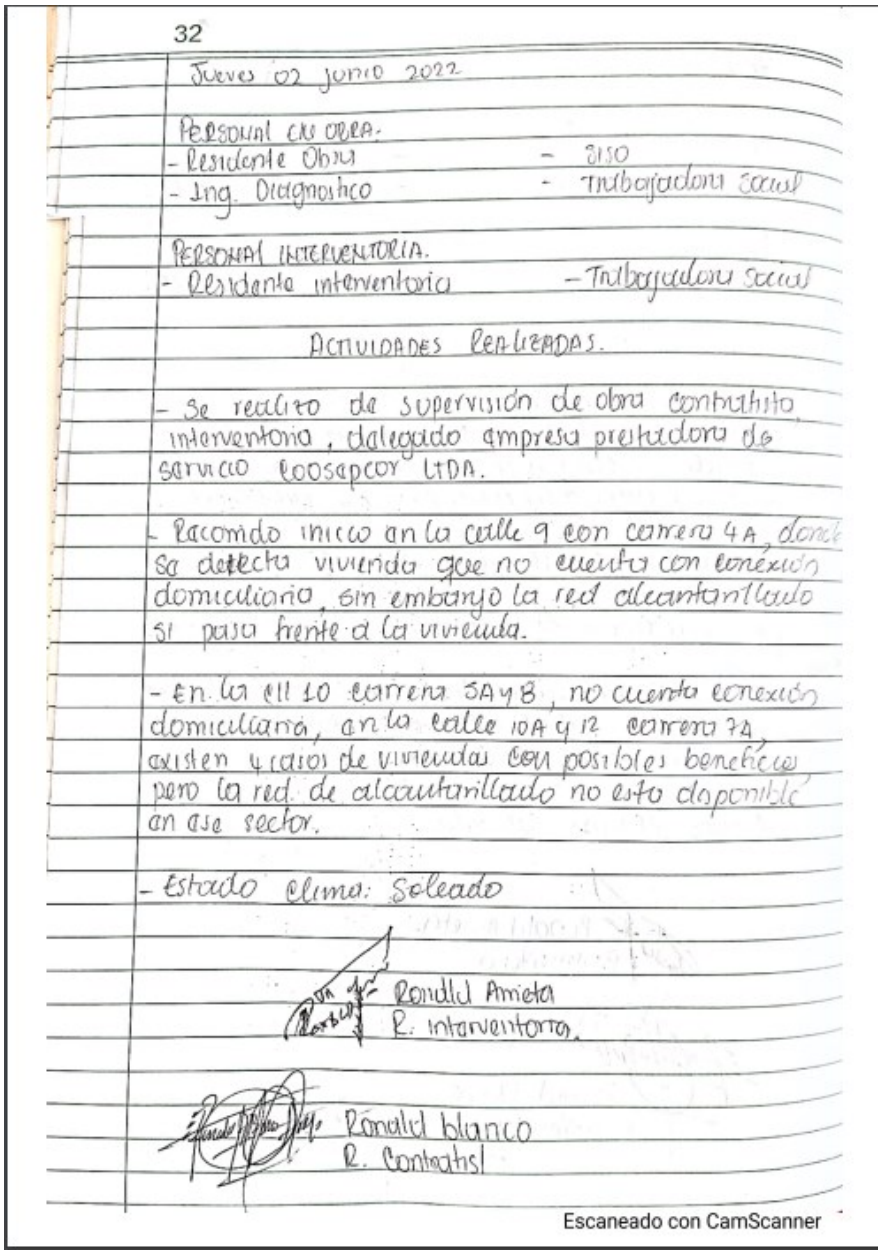

32

Jueves 02 junio 2022

PERSONAL EN OBRA:
- Residente Obra — SISO
- Ing. Diagnostico — Trabajadora social

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente interventoria — Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se realizo de supervisión de obra contratista, interventoria, delegado empresa prestadora de servicio EOOSEPCOT LTDA.

- Recorrido inicio en la calle 9 con carrera 4A, donde se detecta vivienda que no cuenta con conexión domiciliaria, sin embargo la red alcantarillado si pasa frente a la vivienda.


- En la cll 10 carrera 5A y 8, no cuenta conexión domiciliaria, en la calle 10A y 12 carrera 7A existen 4 casas de viviendas con posibles beneficios pero la red de alcantarillado no esta disponible en ese sector.

- Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. interventoria.

Ronald blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

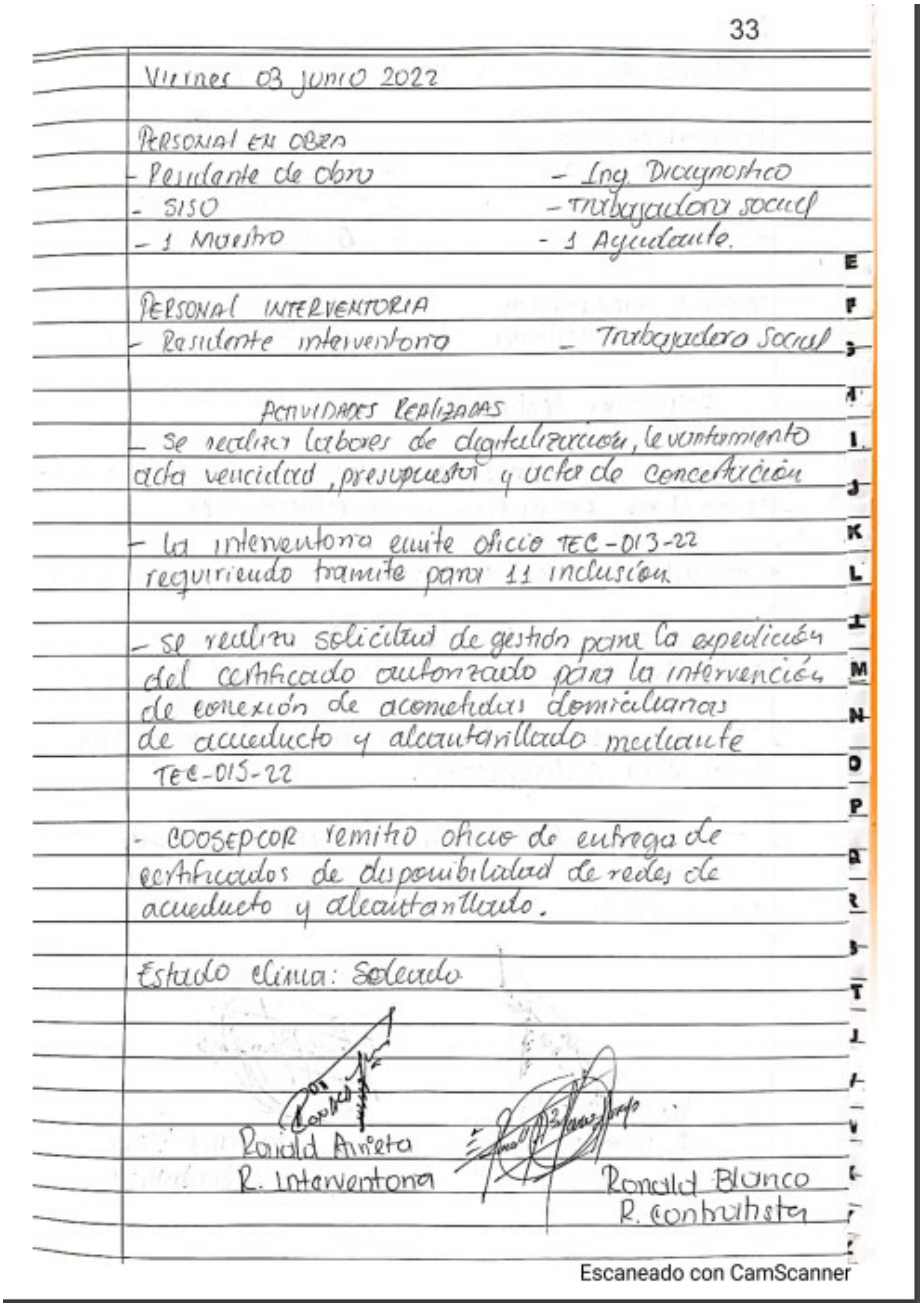

33

Viernes 03 junio 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente de obra — Ing. Diagnostico
- SISO — Trabajadora social
- 1 Maestro — 1 Ayudante.

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria — Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realizan labores de digitalizacion, levantamiento acta vecindad, presupuestos y acta de concertación
- La interventoria emite oficio TEC-013-22 requiriendo tramite para la inclusión
- Se realiza solicitud de gestion para la expedición del certificado autorizado para la intervención de conexión de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado mediante TEC-015-22
- COOSEPCOR remite oficio de entrega de certificados de disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado.

Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

34

Sabado 04 junio de 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente obra
- SISO
- 3 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 6 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se inicia con intervencion en las viviendas 002, 015 y 04
- Se realiza excavacion para cimentacion
- Armado de acero para vigas cimentacion y columnas
- Se realizo suministro de materiales en las 24 viviendas avaladas en el primer comite de aprobacion
- Se realizo comite de aprobacion mediante el cual se avalan 6 diagnosticos.
- Se sigue con las actividades de digitalizacion.

ESTADO CLIMA: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

35

Lunes 06 junio de 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente Obra — Ing. Diagnostico
- SISO — Trabajadores, social
- 3 maestros — 6 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente interventoria — Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se solicita diseño de mezcla por medio de oficio TEC-016-22, donde se debe especificar materiales, marca cemento y resistencia correspondiente
- Se avanza en instalacion de acero para vigas de cimentacion y columnetas en caseta tipo 3
- Se realiza actividades de digitalizacion.
- Se realiza excavacion para cimentacion de casetas tipo 3

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

36

Martes 07 junio 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente de obra — -Ing Diagnostico
- SISO — -Trabajadora Social
- 4 Maestros — - 7 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria — - Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza entrega diseño de mezclo, queda pendiente revisión y aprobación de interventoria.
- Se continua con actividades de obra, excavación figurado
- Se adelanto digitalización, elaboración de diagnostico levantamiento ficha vendidad.
- Se realizo excavación para caseta tipo 3

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

37

Miercoles 08 JUNIO 2022

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra — Ing. Diagnostico
- SISO — Trabajadora Social
- 4 Maestro — 10 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente de interventoria — Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza comite de obra N:6
- se realiza excavacion para caseta tipo 3
- Se realiza suministro de materiales a viviendas
- Se realiza vaciado de solado
- Se realiza armado de acero para viga de cimentacion y columetas
- Se realiza solicitud cuadro de avance de actividad ejecutada
- Se entrego respuesta oficio CCR_cordoba_220576 049

ESTADO CLIMA: SOLEADO

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

38

JUEVES 09 JUNIO 2022

PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 17 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria remite oficio de solicitud respuesta oficio TEC-001-22 informe tecnico especialista HSEQ N.º
- Construredes realiza solicitud por medio de oficio CCR_CORDOBA_2220576_2022-046
- Se realiza excavación para cimentación de casetas tipo 3.
- Se realiza figurado de acero para Vigas de cimentacion y columnas

Estado Clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

39

VIERNES 10 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Trabajadora social
- Ing. Diagnostico.
- 12 Ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente de interventoria
- Trabajo social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria realizo remisión de informe tecnico especialista reprogramacion y presupuesto N=8 y N=9 mediante TEC-007-22 y TEC-068-22

- Se realiza solicitud de informe mensual N=1 mediante EER-043-22

- Se realiza excavación para cimentacion y figurado de acero para vigas de cimentacion


- se realiza fundición de viga de cimentación para casetas tipo 3.

- Estado de clima: Soleado.

Ronal Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

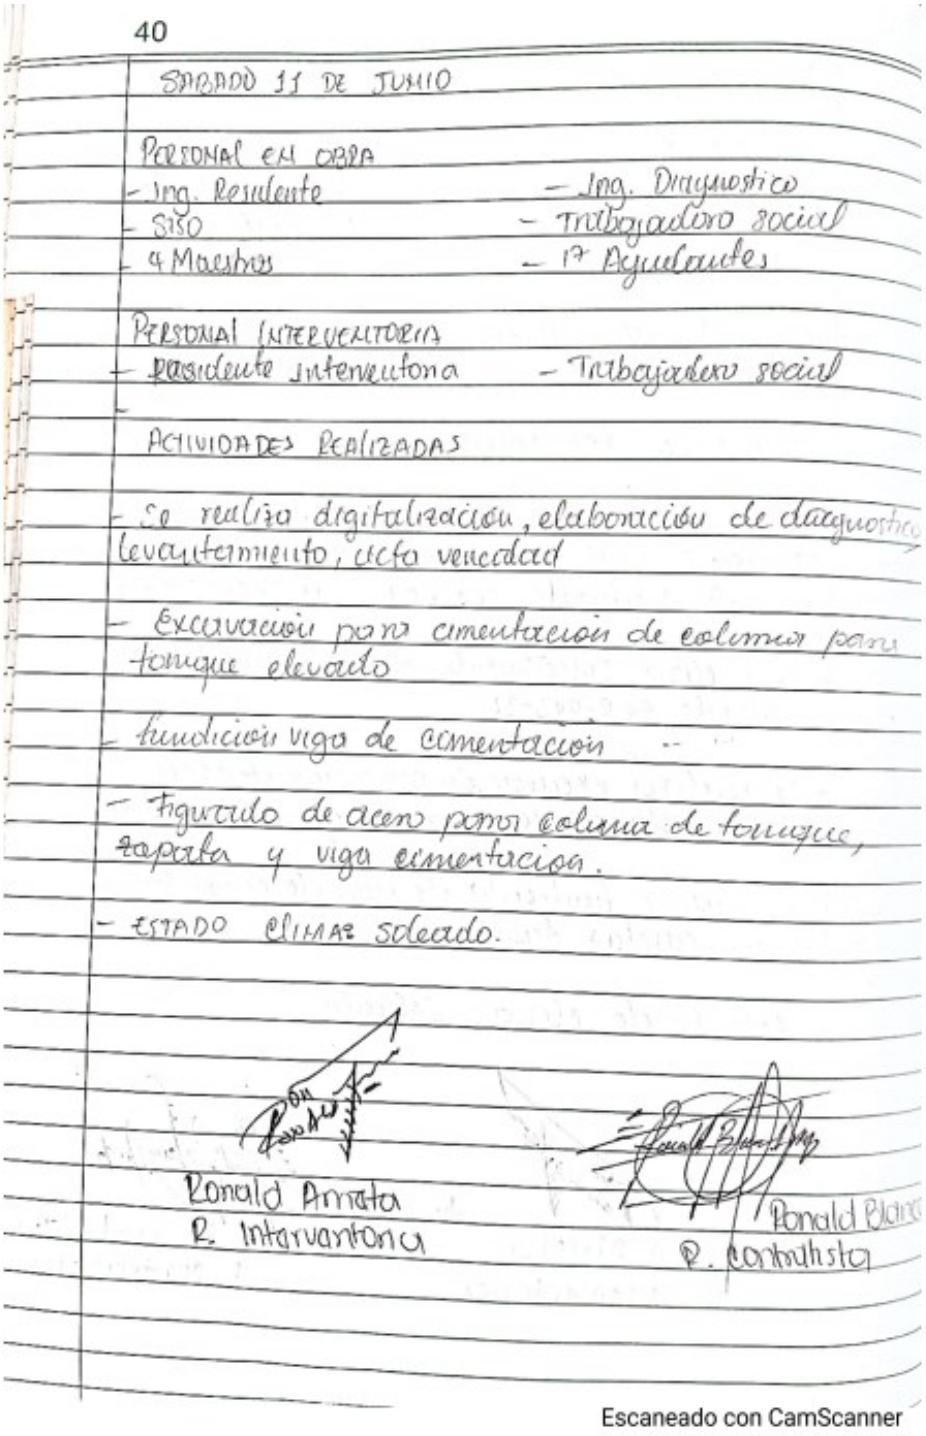

40

SABADO 11 DE JUNIO

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 17 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo digitalizacion, elaboracion de diagnostico levantamiento, ficha vencidad
- Excavacion para cimentacion de columna para tanque elevado
- fundicion viga de cimentacion
- figurado de acero para columna de tanque, zapata y viga cimentacion.
- ESTADO CLIMA: soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

41

LUNES 13 DE JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente
- SISO
- 4 maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza excavacion para viga cimentacion
- figurado de acero para vigas cimentacion
- Se realiza pega de bloque de sobrecimiento relleno y compactacion terreno para caseta tipo 3.
- Se realiza fundicion de solado para vigas de cimentacion.

Estado clima: Soleado.

Ronald Amiata
R Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

42

MARTES 19 DE JULIO 2022

PERSONAL DE OBRA.
- Ing. Residente de obra
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajo social
- 10 ayudante

ACTIVIDADES REALIZADAS

- la interventoria emite oficio TEE-022-22, solicitud entrega diagnostico como compromiso del comite de obra miercoles 06 de julio

- la interventoria solicita intensificacion de esfuerzos en la presentacion de diagnostico, ya que constituyen ruta critica de la programacion.

- se adelanta digitalizacion, elaboracion de diagnostico levantamiento.

- se realiza fundicion de viga de cimentacion

- se realiza figurado de acero para vigas de cimentacion y columnas.


- se realiza excavacion para columnas de tanque elevado.

Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

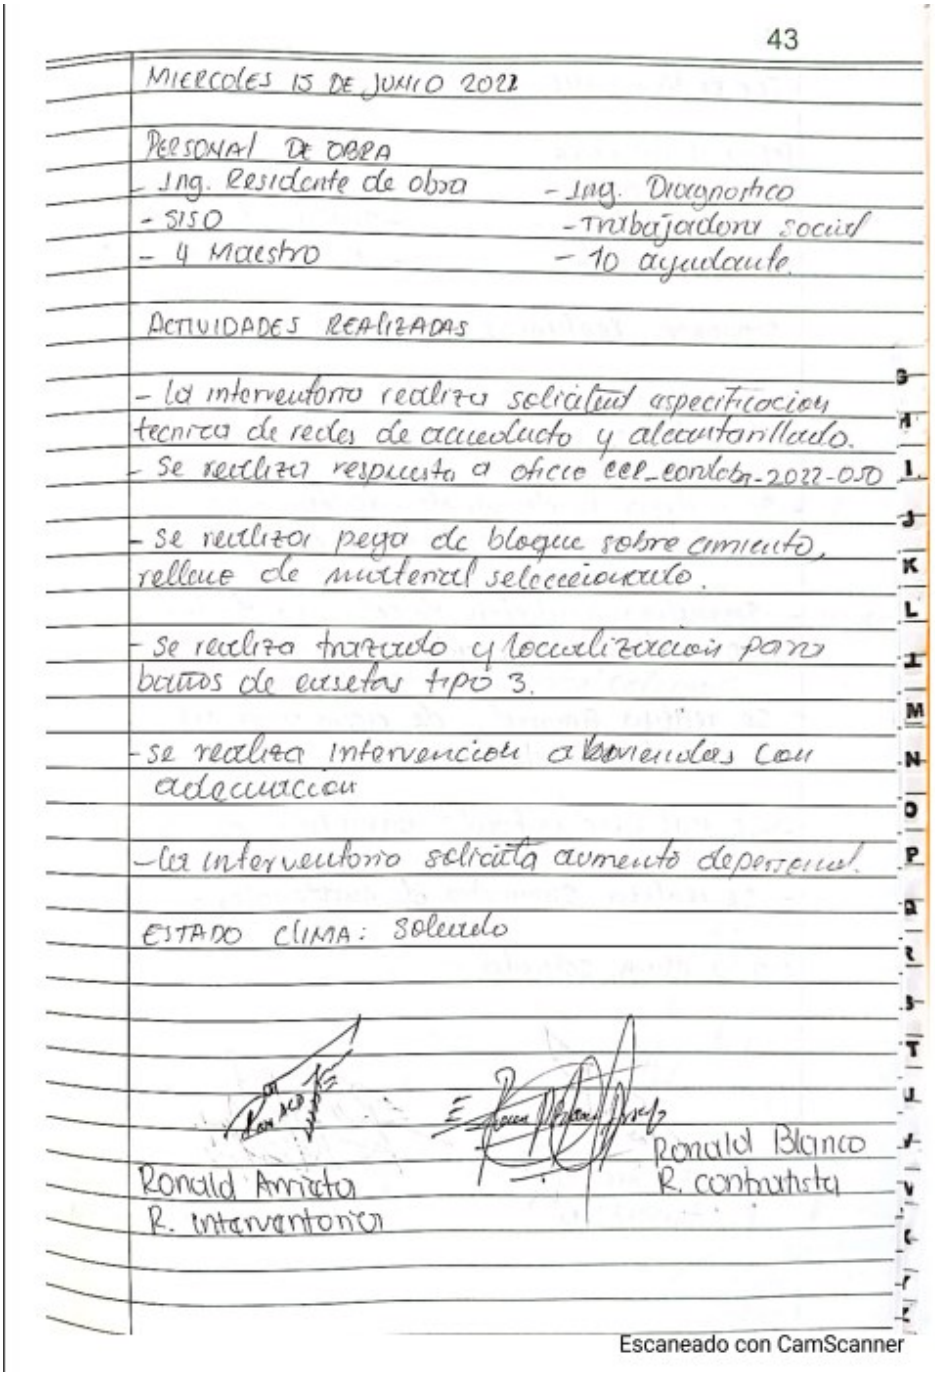

43

MIERCOLES 13 DE JULIO 2022

PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente de obra
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 10 ayudante

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria realiza solicitud especificacion tecnica de redes de acueducto y alcantarillado.
- Se realiza respuesta a oficio ccl_contdb-2022-050
- Se realizar pega de bloque sobre cimiento, relleno de material seleccionado.
- Se realiza trazado y localizacion para batios de cunetas tipo 3.
- Se realiza intervencion a viviendas con adecuacion
- La interventoria solicita aumento de personal.

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

44

JUEVES 16 - JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 ayudante

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo levantamiento de muro en caseta tipo 3
- Se realizo fundicion de zapata y pedestal en columna para tanque elevado.
- Se realizo fundicion de columna de tanque de para tanque elevado.
- Se realizo Agurado de acero para columnas y viga de cimentacion
- Se realizo encofrado para losa de columna
- Se realiza suministro de materiales a viviendas

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

45

VIERNES 17 - JULIO 2020

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 12 ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Se realiza levantamiento de muro en caseta tipo 3.
- Se realiza fundición de zapata y pedestal para tanque elevado.
- Se realiza fundición de columna para tanque
- se realiza encofrado para columna
- Se realiza levantamiento de muro
- Se realiza suministro de mallas a viviendas
- se realiza fundición de columnetas y columnas de casetas tipo 3

estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista.

Escaneado con CamScanner

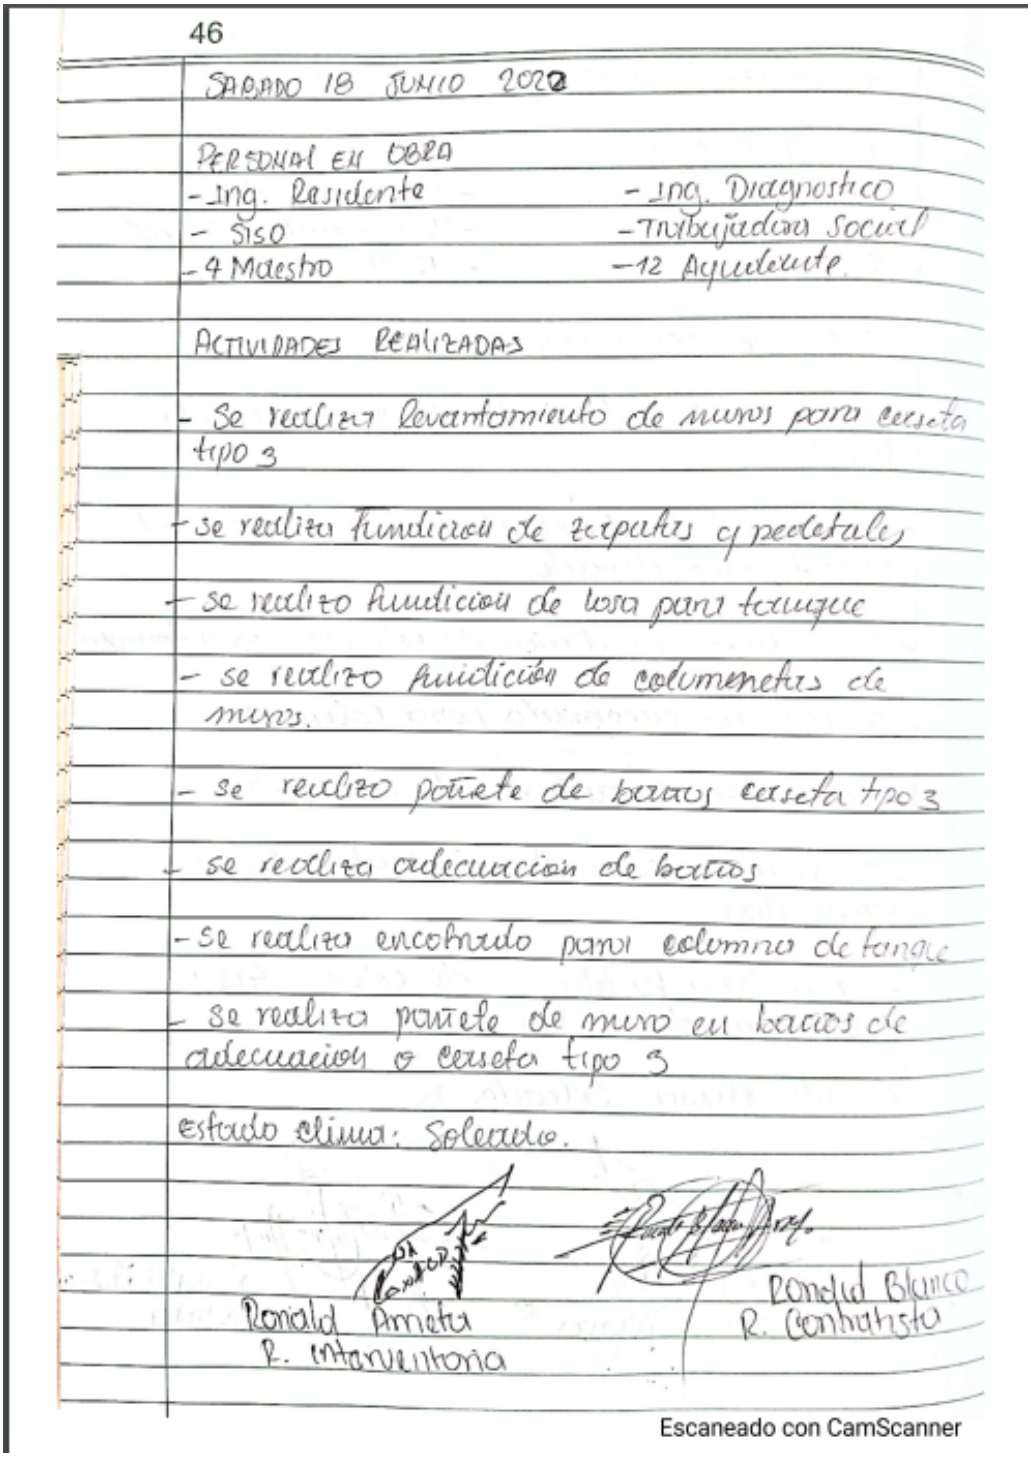

46

SABADO 18 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 Aqueducto

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levantamiento de muros para cerseta tipo 3
- se realiza fundicion de zapatas y pedestales
- se realizo fundicion de losa para tanque
- se realizo fundicion de columnetas de muros.
- se realizo pañete de baños cerseta tipo 3
- se realiza adecuacion de baños
- Se realizo encofrado para columna de tanque
- Se realiza pañete de muro en baños de adecuacion y cerseta tipo 3

estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

47

Martes 21 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.
- Ing. Residente
- SISO
- 5 Maestro
- Trabajadora Social
- Ing. Diagnostico
- 20 ayudantes

PERSONAL DE INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora Interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se integra al equipo de interventoria la ing. Diamy Sanchez para apoyo tecnico de interventoria.

- Se realiza levantamiento de muros para caseta tipo 3.

- Fundicion de columnas y columnetas de caseta tipo 3

- Fundicion de losas en columnas de terreno.

- Se realiza pañete de muros de caseta tipo 3 y columnetas.

- Se realiza cuadrillas para cubiertas

Estados. clima: Soleado.
En horas de la tarde se presento lluvia en horas 1:00 pm hasta 4:00 pm

I. Interventoria

R. contratista

Escaneado con CamScanner

48

Miercoles 22 junio 20220

Personal de obra
- Ing. Residente
- SISO
- 5 maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 ayudantes

Personal interventoria
- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

Actividades Realizadas


- Levantamiento de muro y pañete.
- Fundicion de columnetas, columnas de muro
- Fundicion de viga dintel, levante y encofrado para cubierta
- Fundicion de zapatas, pedestal, columnas y losa para tanque elevados
- Se realiza adecuacion de baños viviendas
- Se realiza encofrado para columna

Estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

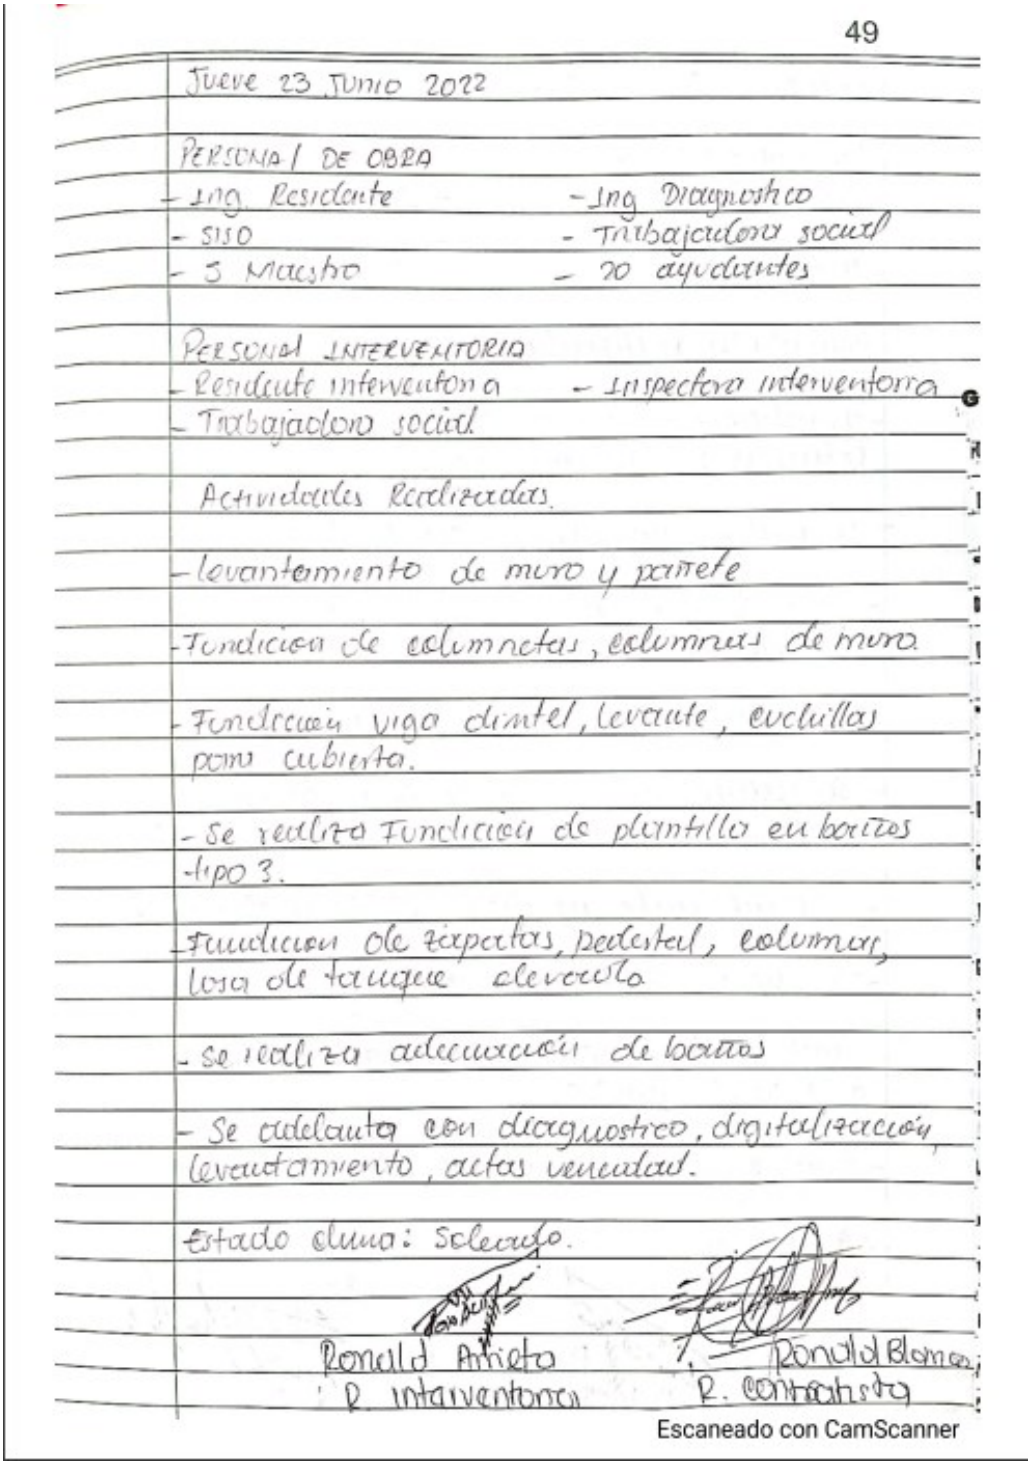

49

Jueve 23 JUNIO 2022

PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 3 Maestro
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Inspectora interventoria
- Trabajadora social

Actividades Realizadas.

- levantamiento de muro y pañete
- Fundicion de columnetas, columnas de muro
- Fundicion viga dintel, levante, evcluillas para cubierta.
- Se realiza Fundicion de plantilla en baños tipo 3.
- Fundicion de zapatas, pedestal, columna, losa de tanque elevado
- Se realiza adecuacion de baños
- Se adelanta con diagnostico, digitalizacion, levantamiento, actas vecindad.

Estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

50

VIERNES 24 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudantes

Actividades realizadas

- Fundicion de vigas dintel, columnetas, columnas en casetas tipo 3
- Se realiza pañete en caseta tipo 3
- Se realiza fundicion pedestal, columna para tanque elevado.
- Se realiza fundicion plantilla.
- Se realiza instalacion de ceramica para pared en adecuaciones y casetas tipo 3
- Se adelanta fundicion de cajas de registro
- Fundicion de tapa de registro
- Instalacion tuberia sanitaria, y conexion a caja de registro.
- Instalacion de tuberia de agua potable en baño

estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. interventoria

R. contratista

Escaneado con CamScanner

51

SABADO 25 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 19 ayudantes

PERSONAL DE INTERVENTORIA.
- Residente interventoria
- Trabajadora social.
- Inspectora interventoría


ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundicion de vigas dintel, columnetas, columna, en caseta tipo 3
- Se realizo panete tipo 3
- Se realiza fundicion pedestal, columna para tanque elevado, losa de tanque elevado
- Se realiza fundicion de plantilla
- Se realizo instalacion de ceramica para pared en ducheria y en caseta tipo 3
- Fundicion cajas de registro.
- Instalacion tuberia sanitaria y conexion a domiciliarias

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

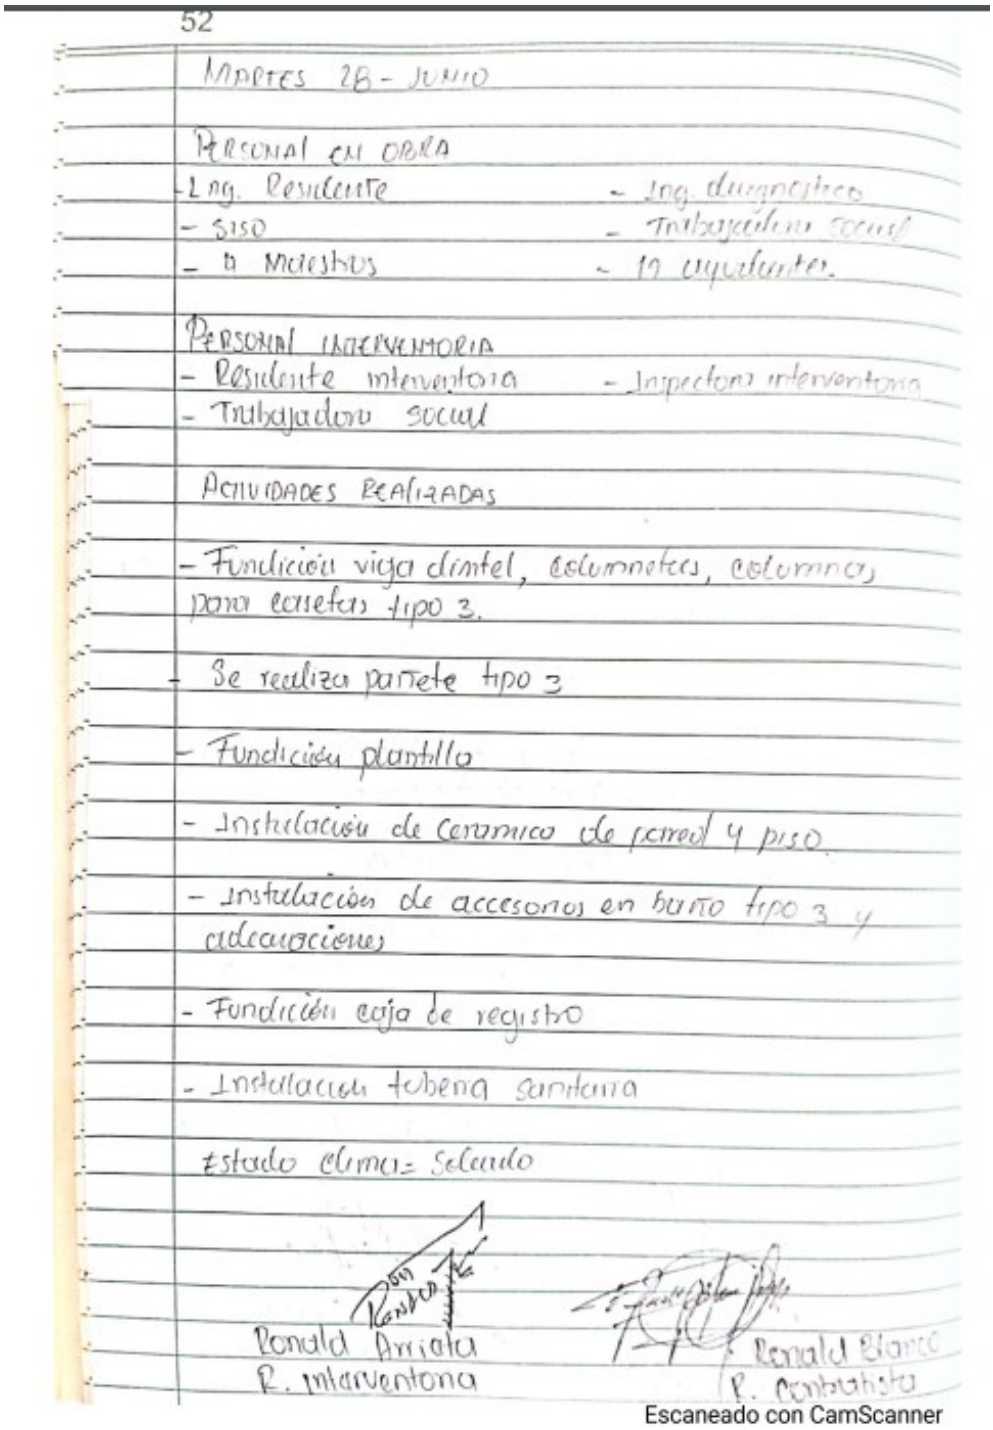

52

MARTES 28 - JUNIO

PERSONAL EN OBRA
- 2 Ing. Residente
- SISO
- 6 Maestros
- Ing. diagnostico
- Trabajadora social
- 10 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundicion viga dintel, columnetes, columnas para casetas tipo 3.
- Se realiza pañete tipo 3
- Fundicion plantilla
- Instalacion de ceramica de pared y piso.
- instalacion de accesorios en baño tipo 3 y adecuaciones
- Fundicion caja de registro
- Instalacion tuberia sanitaria

Estado clima= Soleado

Ronald Arrieta
R. interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

53

Miercoles 29- JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.
- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudante,

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora Social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Fundición viga dintel, columnetas, columnas para casetas tipo 3.
- Se realizo pañete tipo 3
- Fundición plantilla, e instalación de ceramica de piso.
- Instalación de ceramica en piso y pared en caseta tipo 3 y adecuacion.
- Fundicion caja de registro.
- Instalacción tubería sanitaria.
- instacción de accesorios

Estado clima: soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

R. contratista
Daniela Blanco

Escaneado con CamScanner

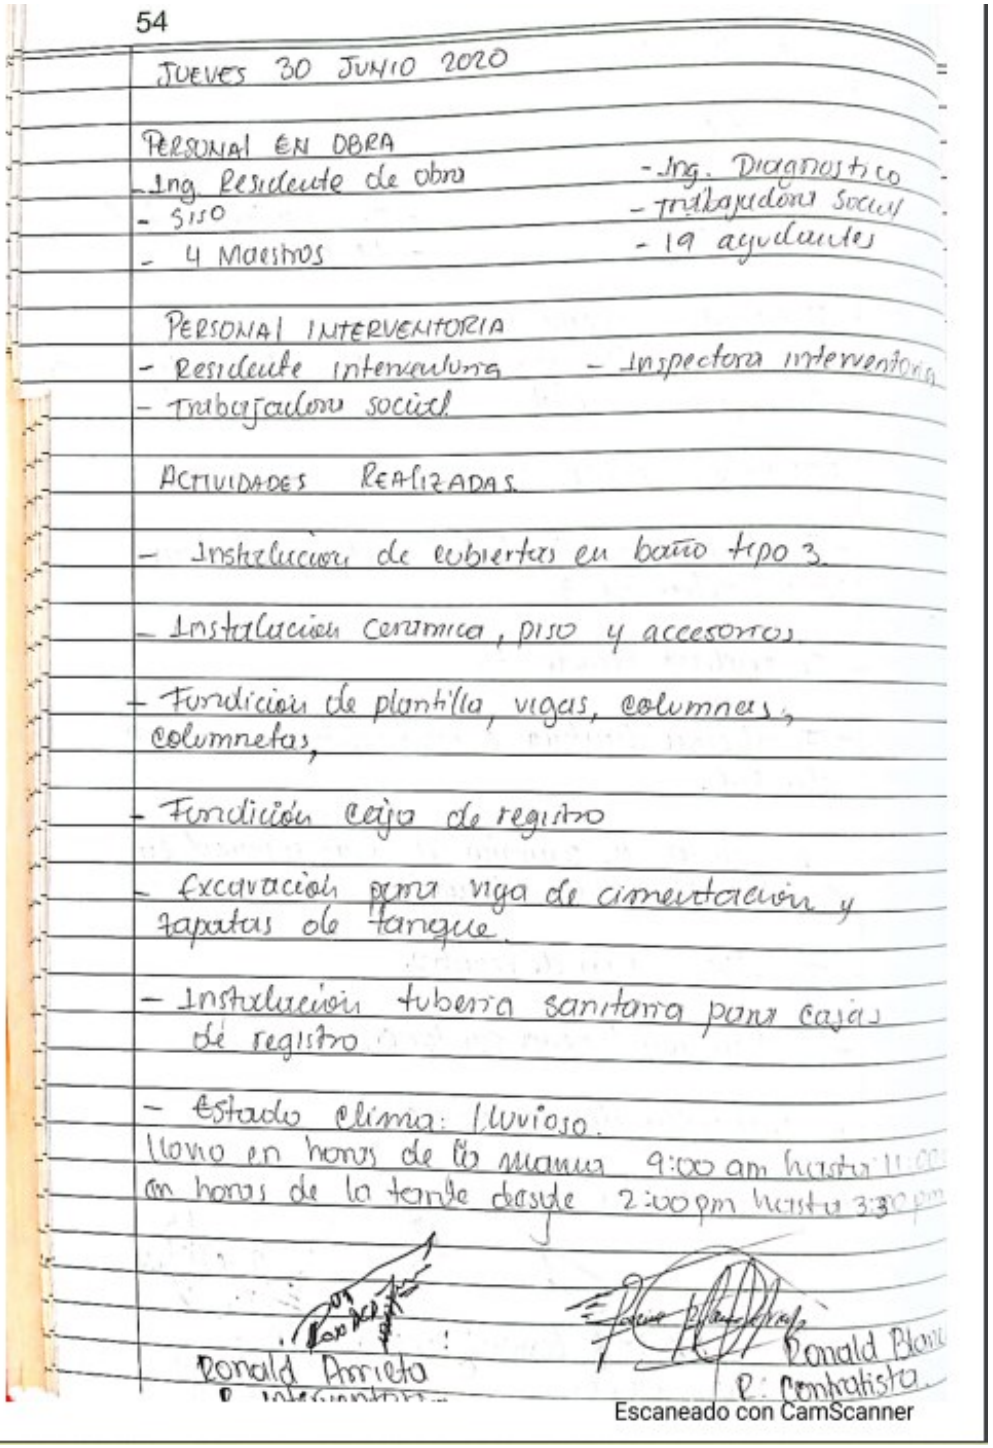

54

JUEVES 30 JUNIO 2020

PERSONAL EN OBRA
- Ing Residente de obra
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 19 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Instalacion de cubiertas en baño tipo 3.
- Instalacion ceramica, piso y accesorios.
- Fundicion de plantilla, vigas, columnes, columnetas,
- Fundicion caja de registro
- Excavacion para viga de cimentacion y zapatas ó tanque.
- Instalacion tubera sanitaria para cajas de registro
- Estado clima: lluvioso.

Llovio en horas de la mañana 9:00 am hasta 11:00 am horas de la tarde desde 2:00 pm hasta 3:30 pm

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

ANEXO No. 4
"INFORME DE BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO". YCOMPONENTE AMBIENTAL



	INFORME MENSUAL No. 1 **EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLAN DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD No. 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.** **CONTRATO No. 2**	
	OBJETO: "CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	**JUNIO**



PROGRAMA DE CONEXIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

INFORME MENSUAL # 2 JUNIO 2022

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	*Nombre*	*RAFAEL CASTILLO*
Inspector PGIO	*Firma*	
REVISÓ	*Nombre*	*PEDRO MANJARREZ*
Profesional HSEQ	*Firma*	
APROBÓ	*Nombre*	*DUARTE PINEDO*
Director de Obra	*Firma*	
Periodo de Entrega	*Fecha*	*30-JUNIO-2022*

Contenido

1. INTRODUCCIÓN..... 87
2. OBJETIVO..... 88
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 89
3.1. Localización..... 89
3.2. Descripción general del proyecto..... 89
4. CALIDAD..... 90
4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS..... 90
4.2. PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD..... 90
4.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES (CERTIFICADOS)..... 90
4.4. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 90
4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHADO..... 90
5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 91
5.1. INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA 91
5.2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y FIC..... 93
5.3. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD 93
5.4. RESUMEN Y PRESENTACION DE RECORRIDOS DE OBRA 94
5.5. SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 95
5.6. INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 96
*5.7. CHARLAS MENSUALES..... **¡Error! Marcador no definido.***
5.8. SEÑALIZACION Y DEMARCACION 96
5.9. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 96
5.10. PLAN DE EMERGENCIA 97
5.11. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA..... 97
*5.12. PMT..... **¡Error! Marcador no definido.***
5.13. MAQUINARIA – EQUIPOS – VOLQUETAS..... 97
6. GESTION AMBIENTAL 98
6.1. GESTIÓN RCD..... 98
6.2. PROGRAMA DE CONTROL DE SEDIMENTOS, EROSIÓN Y MANEJO DE CAPA VEGETAL. 98
6.3. PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS. 99
6.4. PROGRAMA DE RESIDUOS LIQUIDOS. 99
6.5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 99
6.6. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. 100
6.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CHARLAS AMBIENTALES. 100
6.8. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 100
6.9. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. 101
6.10. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS. 101
6.11. INCIDENTES AMBIENTALES..... 101

6.12. APROVECHAMIENTO IN SITU DE RCD. 101
6.13. INDICADORES RCD. 102
6.14. ESTADO DEL APLICATO DE AUTORIDAD AMBIENTAL 103
6.15. ORDEN Y ASEO. 104
7. ANEXOS 105

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los temas HSEQ, El presente informe tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento realizado de la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo y calidad, del proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO,CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, comprendiendo las medidas necesarias para prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar por el desarrollo del proyecto.

Este es la principal herramienta de gestión HSEQ del proyecto y requería del aporte de los encargados y profesionales que intervienen en la operación de la obra.

Incluye metodologías de recolección de información para la generación de indicadores y evaluaciones cuantitativas del tema HSEQ que podrán causar las actividades, así mismo se hizo en cuanto a gestión ambiental requerida en la ejecución del proyecto y la generación de registros que se debían presentar ante la entidad.

El presente informe contiene la información básica durante el desarrollo de las actividades, control y manejo HSEQ de acuerdo con el PGIO

Dicho informe resume todas las actividades realizadas en materia HSEQ dadas por la ejecución de la obra desde el mes de junio de 2022.

2. OBJETIVO

El informe de gestión HSEQ tiene como objetivo principal formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y calidad previstos en el desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto

Córdoba Tetón es un municipio de Bolívar (Colombia), ubicado en la subregión de Montes De María, según datos de la Alcaldía Municipal de Córdoba Tetón, se encuentra a una distancia de 195 kilómetros de la capital del Departamento, según el censo DANE de 2005 cuenta con una población de 12.207 habitantes al año 2013, y una superficie total de 150 Km2. El territorio está compuesto por importantes recursos hídricos, ya que pertenece a la cuenca alta del Rio Magdalena, tiene 2 subcuentas y 13 microcuencas, y está rodeado por un complejo de ciénagas (PNUD, 2015).
Limita con el municipio de Zambrano al norte, al Sur con los municipios de Magangué San Pedro y Buenas vista, al Oeste con Ovejas y el Carmen de Bolívar. Al Este con el rio Magdalena. La localización del municipio en el Departamento de Bolívar se observa en la siguiente ilustración (Alcaldía Municipal de Córdoba Tetón, Bolívar, 2012)

3.2. Descripción general del proyecto

- *Datos generales del proyecto*
- ***Entidad contratante:*** *En territorio Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial*
- ***Contratista:*** *consorcio Construredes*
- ***Fecha de inicio:*** *18 abril de 2022*
- ***Fecha de terminación:*** *01 octubre de 2022*
- ***Número del contrato:*** *2220576*
- ***Plazo de ejecución:*** *cinco (5) meses*
- ***Objeto del contrato:*** *"chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución delprograma de conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de Córdoba, del departamento de bolívar"*
- ***Razón social:*** *consorcio Construredes*
- ***Nit / C.C. No:****901568676-5*
- ***Domicilio:*** *cra 24 no. 15 - 17 centro san marcos - sucre*
- ***Teléfono: (****311 4143542)*

4. CALIDAD

4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo del mes de junio del 2022. Se realizaron las siguientes actividades.
Excavaciones y baseado de las cimentaciones, Levantamiento de columnas y paredes,
Instalaciones de baldosas y elementos sanitarios

4.2. PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD.

Durante el periodo ejecutado del presente mes de junio de 2022 las actividades ejecutadas fueron supervisadas por la interventoría, teniendo en cuenta las especificaciones de los diseños y los materiales utilizados.

4.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES (CERTIFICADOS)

Para el periodo del mes de junio del 2022 se realizaron la compra de los siguientes materiales **cemento, tuberías sanitarias y presión, accesorios para baños, materiales pétreos arena- grava)**

4.4. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.

Durante el mes de junio del 2022 se hace la entrega de los documentos de calibraciones de los equipos que realizan los ensayos de compresión.

4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHADO.

Durante el mes de junio se realizaron los registros fotográficos con respecto a las actividades realizadas. Anexo componente calidad 1.4 registro fotográfico.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.1.INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA

Se hace entrega de la documentación a la interventoría para permitir el ingreso del personal.
Se entrega los documentos;

- Copia de la cedula del trabajador.
- Copia del certificado de ARL.
- Copia de la Afiliación a EPS.
- Copia del Certificado a AFP
- Copia del examen médico ocupacional de ingreso apto para el cargo.

Tabla 1 Control de Personal

PROMEDIO DE INGRESO Y RETIRO DE TRABAJADORES POR MES		
MES	INGRESO	RETIRO
Junio	16	0

Anexo componente SST 01 INGRESO

5.2.PERSONAL EN OBRA

Durante el periodo ejecutado del mes de junio ingresaron 16 trabajadores para realizar las intervenciones a las baterías sanitarias de las viviendas.

Tabla 2 Seguimiento personal

N	CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	FECHA	ARL	EPS	PENSION
1	MAESTRO DE OBRA	SANCHEZ MEDINA	ALVARO ENRRIQUE	73.315.286	04/06/2022	SURA	MUTUAL SER	COLPENSIONES
2	AYUDANTE	VALETH ROMERO	ALVARO JAVIER	1.049.452.096	04/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
3	AYUDANTE	FLOREZ TAMARA	JOSE MIGUEL	1.049.452.936	04/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
4	MAESTRO DE OBRA	VERGARA TORRES	YULDOR RAFAEL	1.049.452.632	31/05/2022	SURA	MUTUAL SER	PROTECCION
5	AYUDANTE	GALVAN RODRIGUEZ	JAVIER EDUARDO	1.049.453.627	31/05/2022	SURA	MUTUAL SER	PROTECCION
6	AYUDANTE	RIVERA MARTINEZ	FEIVER DE JESUS	73.316.966	07/06/2022	SURA	MUTUAL SER	COLPENSIONES
7	OFICIAL DE OBRA	BLANCO MARTINEZ	EDGAR TOBIAS	15.672.359	08/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
8	MAESTRO DE OBRA	ALVAREZ PADILLA	GENKY SAIMER	10.774.359	08/06/2022	SURA	CAJA COPI	COLFONDO
9	AYUDANTE	PINEDA HENAO	HEIDER MANUEL	1.049.453.497	08/06/2022	SURA	CAJA COPI	PORVENIR
10	MAESTRO DE OBRA	ESCOBAR VERGARA	YEISON JOSE	1.049.452.239	08/06/2022	SURA	MUTUAL SER	COLFONDO
11	AYUDANTE	VALETH ANDRADE	JESUS MANUEL	1.049.453.345	08/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
12	AYUDANTE	GONZALES SANCHEZ	SANDRO DE JESUS	1.049.453.942	08/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PROTECCION
13	AYUDANTE	AHUMADA RODRIGUEZ	ELIECER	1.049.453.937	08/06/2022	SURA	CAJA COPI	PORVENIR
14	AYUDANTE	PEÑA CANTILLO	JOSE DE JESUS	72.253.038	08/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PROTECCION
15	MAESTRO DE OBRA	RIOS CORREA	LUIS MANUEL	3.956..970	14/06/2022	SURA	MUTUAL SER	COLFONDO
16	OFICIAL DE OBRA	RIOS MOLINA	PEDRO LUIS	10.884.740	14/06/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR

Anexo Componente SST 01 INGRESO

5.3.PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y FIC

Una vez pagada la planilla de la seguridad social de las personas que laboraron durante el mes de junio 2022 se realizará la presentación de la misma.

Tabla 3 Seguridad social

CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA
CONSORCIO CONSTRUREDES	21 JULIO 2022	
SUBCONTRATISTA	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA

Anexo componente SST 09 seguridad social

5.4.ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD

Durante el periodo del mes de junio de 2022 no se presentaron ningún tipo de accidente o incidente laboral.

Tabla 4 Accidentes

N°	NOMBRE TRABAJADOR Y CEDULA	CONTRATISTA	FECHA A.T.	A.T. Y/O I.T.	DESCRIPCIÓN ACCIDENTE
	0	0	0	0	0

Anexo componente SST 06 accidente laborales

Tabla 5 Tabla. Estadística de Accidentalidad IF-IS-ILI-TASA AT

MES	No TRABAJADORES	HORAS HOMBRE	No. DE CASOS	DIAS PERDIDOS	IF	IS	I.L.I.	TASA A.T
JUNIO	19	608	0	0	0,00	0,0	0,00	0 ,0%
TOTAL PROMEDIO AÑO								

Anexar componente SST 06 accidente laborales (*seguimiento de indicadores de acuerdo con la 312 del 2019, de igual manera los indicadores de Proceso, estructura y resultado*)

5.5. PERMISOS DE TRABAJO

Durante el mes de junio del 2022 solo se diligenciaron los ATS a las actividades ejecutada del proyecto.

Tabla 6 Permisos de Trabajos

TIPO DE PERMISO	ACUMULATIVO POR MES					
	Mayo 22	JUNIO				Total
Trabajo en Altura	0	0				0
Espacios Confinados	0	0				0
Trabajo en Caliente	0	0				0
ATS	0	39				39

Anexar registro de permisos

5.6.RESUMEN Y PRESENTACION DE RECORRIDOS DE OBRA

Durante el presente mes se realizaron varios recorridos a todas las actividades del proyecto, también se realizaron inspecciones al kit de equipo de emergencia.

Tabla 7 Inspecciones

TIPO DE INSPECCIÓN	ACUMULATIVO POR MES					
	MAYO	JUNIO				Total
Inspección de Obra	0	15				15
Inspección de EPP	0	1				1
Inspección herramientas	0	4				4
Pre operacionales	0	9				9
Inspecciones Kit de Emergencias	1	1				2

Anexo componente sst 08 matriz de riesgo

5.7.SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Tabla 8 Hallazgos

HALLAZGOS GENERADOS MENSUALMENTE					
ITEM	**HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CONTROL**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO**

5.8.INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

De acuerdo con lo programado en el cronograma de capacitaciones en el periodo del mes de junio de 2022 se realizaron capacitaciones al personal operativo en los siguientes temas.

Tabla 9 Capacitaciones

N°	TEMA	Fecha
1	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	08-JUNIO 2022
2	ORDEN Y LIMPIEZA	13 JUNIO 2022
3	MANEJO DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	13 JUNIO 2022

Anexo Componente SST 07 CRONOGRAMA SST

5.9.SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Durante el periodo del mes de Junio de 2022 se encuentran instalada las señalizaciones de rutas de evacuaciones y punto de encuentra en la oficina y lugar o campo de trabajo donde se están realizando las actividades de las baterías sanitarias.

Anexo componente sst 12Registro Fotográfico

5.10. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el mes de junio del 2022 se realizaron la entrega de los elementos de protección personal al personal operativo.

5.11. PLAN DE EMERGENCIA

Para el periodo del mes de junio se sigue haciendo la implementación del plan de emergencia con sus respectivas señalizaciones.

Tabla 10 Kit Emergencias:

ELEMENTO	CANTIDAD
Extintor	1
Botiquín Primeros Auxilios	1
Camilla Portátil	1
Señalización	9

5.12. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

Dando cumplimiento a las exigencias de la resolución 2013 de 1986 y al decreto 1072 del 2015 se realizó una reunión por parte de las directrices del consorcio y los trabajadores para hacer la conformación y elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajador y el comité de convivencia laboral.

ANEXO COMPONENTE SST 04 COPASST

5.13. MAQUINARIA – EQUIPOS – VOLQUETAS

Para el periodo del mes de junio de 2022 se utilizaron en obra los siguientes equipos menos (mezcladora, pulidoras) para realizar las actividades a ejecutar de las unidades sanitarias de las viviendas.

ANEXO COMPONENTE SST 08 MATRIZ DE RIESGO

Se recuerda la documentación y requisitos para el ingreso:

- Presentar los documentos del conductor: Copia de la Cedula, Copia del pase, copia de las afiliaciones cuando es nuevo en el registro, luego solo debe presentar la planilla de pago de aportes parafiscales al día. Adicionalmente deben ingresar con botas y casco de seguridad.
- Vehículo: Tarjeta de propiedad, SOAT al día, revisión técnico-mecánica.

Tabla 11 maquinaria- equipos- volquetas

EQUIPO	CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PERIODO
PULIDORA	CONSTRUREDES	CORTE DE HIERRO	JUNIO 2022
MEZCLADORA	CONSTRUREDES	PREPARACION DE MEZCLA PARA CIMENTACION	JUNIO 2022

6. GESTION AMBIENTAL

6.1.GESTIÓN RCD

Para el periodo del mes de junio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, se extrajeron 64 m3 los cuales fueron reutilizados para el relleno, compactación y nivelación de las zapatas de los tanques elevados y el alce de niveles en lugares muy bajos.

Tabla 12 Relación de los residuos retirados

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/ M3	PERIODO	LUGAR DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
MATERIAL COMUN	64 M3	JUNIO -22	En la misma construcción	N/A	N/A

Anexo componente ambiental 2,3 balances de escombro.

6.2.PROGRAMA DE CONTROL DE SEDIMENTOS, EROSIÓN Y MANEJO DE CAPA VEGETAL.

Durante el periodo del mes de junio de 2022 al momento de realizar las actividades de excavaciones se realizó la limpieza del terreno natural para hacer las intervenciones y así garantizar que el lugar de trabajo se encuentre limpio y esta óptimo para iniciar labores.

6.3.PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS.

Durante el mes de junio de 2022 al terminar la jornada laboral los trabajadores realizan actividad de orden y limpieza en su respectivo lugar de trabajo.

Tabla 13 Relación de los residuos retirados.

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/M3	PERIODO	LUGARA DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
BOLSAS DE CEMENTO	90 KG	JUNIO	PUNTO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCION DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICOS	N/A	N/A

ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL REGISTRO FOTOGRAFICO

6.4.PROGRAMA DE RESIDUOS LIQUIDOS.

Para el periodo del mes de junio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para relleno de la misma y Manejo de residuos líquidos y sólidos generados en la ejecución de obras del proyecto.

Anexo componente ambiental 2,5 registro de Certificados mantenimiento y disposición de residuos

6.5.PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Para el periodo del mes de junio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para relleno de la misma.

Tabla 14 Programa de gestión de residuos.

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/M3	PERIODO	LUGARA DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
MATERIAL COMUN	64 M3	JUNIO -22	En la misma construcción	N/A	N/A

Anexo componente ambiental 2,5 registro de Certificados disposición de residuos peligrosos.

6.6.PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.

Durante el me de junio del 2022 recibimos materiales pétreos del proyecto los cuales fueron transportador por el vehículo de carga RBJ 524 el cual cuenta con sus documento técnico-mecánica vigente.

6.7.PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CHARLAS AMBIENTALES.

De acuerdo con lo programado en el plan de capacitación ambiental, se realizó la siguiente capacitación a todo el personal operativo.

Tabla 15 Capacitaciones y charlas Ambientales.

N°	TEMA	PERIODO
1	Divulgación del plan de emergencia	13-06-2022
	Procedimiento seguro de excavación	*13-06-2022*

ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.8.PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Durante el mes de junio de 2022 se realizaron las compras de materiales pétreos (grava y arena) para la ejecución del proyecto.

Tabla 16 Manejo de Materiales

TIPO DE MATERIAL	TO/KG/M3	PERIODO	PROVEEDOR	CERTIFICADO DE SUMINISTRO	LICENCIA AMBIENTAL CANTERA
Grava	32	junio 2022	CONSTRUCTORES S.A.S	SI	KHE 08121
Arena	32	junio 2022	CONSTRUCTORES S.A.S	SI	KHE 08121

Anexar componente ambiental 2.4 Balance Materiales Pétreos.

6.9.PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS.

Durante el periodo ejecutado del mes de junio no se realizaron control de plaga ya que durante las actividades realizadas en obra no se generó ningún tipo de plaga.

6.10. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.

Durante el periodo del mes de junio del 2022 ya se encuentra implementado el plan de emergencia del proyecto.

6.11. INCIDENTES AMBIENTALES

En el presente mes de junio del 2022 no se presentaron incidentes ambientales.

6.12. APROVECHAMIENTO IN SITU DE RCD.

Para el periodo del mes de junio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para relleno de la misma.

Tabla 17 Aprovechamiento IN situ RCD

TIPO DE MATERIAL	TO/KG/M3	PERIODO	LUGAR DE APROVECHAMIENTO
Material común	64 m3	Junio 2022	En el mismo lugar de la construcción.

6.13. ORDEN Y ASEO.

Durante el periodo del mes de junio se realizaron actividades de orden y limpieza en todos los frentes de trabajo del proyecto.

Anexo componente SST Registro Fotográfico.

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido del mes de junio de 2022 se cumple satisfactoriamente con la implementación del PGIO realizado con el objetivo del contrato (conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba en el departamento de Cordoba). se encuentran en ejecución las actividades de intervención a las viviendas de las personas beneficiarias del proyecto, iniciando las actividades del proyecto como lo son excavaciones, vaciado de cimentaciones, vigas, columnas, vaciado de columnas del tanque elevado, adecuaciones internas de los baños e instalaciones de accesorios sanitarios.

8. ANEXOS

Registro fotográfico.
Anexos Control Operativo Calidad,
Anexos Control Operativo SST,
Anexos Control Operativo Ambiental, anexos relacionados por ítem de acuerdo con el PGIO.

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 25/07/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	27/06/2022	25/07/2022	28	3000		186,8	5	3210,3	107%
	VIGA	27/06/2022	25/07/2022	28	3000		173,5	5	3175,9	105,8%
	PLACA	27/06/2022	25/07/2022	28	3000		182,1	5	3280,3	109,3%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra "ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar"

REPRESENTANTE LEGAL

ARGOS

REPORTE CALIDAD CLIENTES

Planta: TOLUVIEJO
Dirección: VIA TOLUVIEJO
Teléfono:
Fecha: JUNIO DE 2022
Material: CEMENTO USO GENERAL - CEMENTO PORTLAND TIPO I NTC 121
Presentación: EMPACADO 1 KG - 5 KG- 25 KG - 50.0 KG

Fecha	Finura	Tiempo de fraguado (Minutos)		Resistencias a la Compresión (Mpa)				Especificaciones Quimicas	
Día	Blaine (cm2/g)	PF	FF	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días	MgO %	SO3 %
Especificacion NTC 121	-------	Min. 45	Máx. 420	-------	Min. 1160 (8,0)	Min. 2176 (15,0)	Min. 3480 (24,0)	-------	-------
Especificacion ARGOS	-------	Min. 45	Máx. 420	-------	Min. 1160 (8,0)	Min. 2176 (15,0)	Min. 3480 (24,0)	Max 6.0%	Max 3.5%
1/06/2022	5458	178	262	7,13	15,63	20,01	24,61	0,48	1,82
2/06/2022	5638	179	285	7,08	15,42	19,49	24,74	0,47	2,09
3/06/2022	5353	176	262	7,12	14,26	18,38	24,87	0,49	2,01
4/06/2022	5747	181	257	7,98	17,77	22,45	24,96	0,50	1,48
5/06/2022	5620	179	260	7,42	15,86	19,03	25,01	0,47	2,01
6/06/2022	5513	185	266	7,87	14,54	19,39	24,62	0,48	2,17
10/06/2022	5979	182	280	7,96	14,36	19,13	24,57	0,48	1,99
11/06/2022	5852	176	272	7,31	14,88	19,09	24,86	0,49	2,00
12/06/2022	6456	182	262	7,69	14,63	18,78	24,79	0,52	2,02
13/06/2022	6158	175	267	7,71	14,77	18,84	24,86	0,50	1,99
14/06/2022	5507	168	271	7,44	16,06	18,85	24,96	0,52	2,28
15/06/2022	5547	172	281	8,36	17,02	19,18	24,79	0,50	1,81
16/06/2022	5633	169	265	9,60	15,98	20,05	24,79	0,52	2,04
17/06/2022	6174	162	255	8,46	17,55	21,76	25,77	0,53	1,51
18/06/2022	5996	165	257	7,91	15,46	19,45	24,73	0,49	2,04
19/06/2022	5601	159	255	7,68	15,01	19,11	24,78	0,51	2,07
20/06/2022	5775	180	256	8,46	15,64	19,58	24,81	0,51	2,05
21/06/2022	6725	150	261	7,08	16,46	20,00		0,45	2,43
22/06/2022	6134	180	266	7,32	14,34	18,45	24,76	0,58	2,34
23/06/2022	6670	182	261	8,22	14,60	19,48	24,95	0,59	2,21
24/06/2022	5147	168	270	7,84	14,41	18,37	24,96	0,61	2,19
25/06/2022	5099	152	243	7,66	15,66	19,43	24,88	0,51	2,14
26/06/2022	5534	160	260	8,40	14,37	18,69	26,97	0,58	1,96
27/06/2022	5678	154	250	8,71	17,58	21,68	25,45	0,61	2,16
28/06/2022	6123	165	262	9,33	15,36	20,57	26,64		
29/06/2022	5577	143	255	9,25	17,68	21,21	25,26		
31/06/2022	5448	154	268	8,30	16,15	19,75			
Promedio	5783,04	169,48	263,30	7,97	15,61	19,64	25,06	0,52	2,03
Desv. Estd	413,61	11,78	9,33	0,69	1,12	1,06	0,59	0,05	0,22
% CV	7,15%	6,95%	3,54%	8,69%	7,20%	5,42%	2,35%	8,75%	10,78%
° DATOS	27	27	27	27	27	27	25	24	24
MAXIMO	6725,00	185,00	285,00	9,60	17,77	22,45	26,97	0,61	2,43
MINIMO	5099,00	143,00	243,00	7,08	14,26	18,37	24,57	0,45	1,48
RANGO	1626,00	42,00	42,00	2,52	3,51	4,08	2,40	0,16	0,95

Certificamos que este cemento cumple con las Normas Técnicas Colombianas 121 para CEMENTO UG Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana.

Los resultados en este informe se refieren a la muestra relacionada y al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

Firma: _____ **Cargo: Lider de calidad**
Ivon Ordoñez

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES Y LADRILLOS DE CONCRETO (PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL) NTC-4026**	**FC-20** **VER 02** **FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08-01-2019**

PARA:	CONSORCIO CONSTRUREDES		
OBRA:	CONECXIONES INTRADOMICILIARIAS		
SITIO:	CORDOBA - BOLÍVAR	**FECHA:**	20/06/2022

Los siguientes son los resultados obtenidos sobre los ensayos de resistencia a la compresión de bloques y/o ladrillos de mortero de concreto para uso en mamposteria estructural según densificación de la Norma técnica colombiana NTC-4026.

N°	DESCRIPCION	FECHA ROTURA	EDAD (DIAS)	LECTURA (KN)	ÁREA NETA (m^2)	Kg/cm^2	Mpa
1	BOLQUE 0,10	20/06/2022		180,5	248,5	73,88	7,4
2	BLOQUE 0,15	20/06/2022		202,5	248,5	82,89	8,2
3	BLOQUE CALADO 0,10	20/06/2022		175,9	248,5	72,00	7,2

La resistencia requerida para bloques y/o ladrillos de concreto para uso en mamposteria estructural debe ser como minimo los siguientes valores dependiendo de su clase:

- **Clase Alta: $(Rc_{28})^B$ = 11,0 Mpa (110 Kg/cm^2).**
- **Clase Baja: $(Rc_{28})^B$ = 7,0 Mpa (70 Kg/cm^2).**

los valores anteriores se encuentran estipulados en la norma NTC - 4076 Tabla No.3

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3

ING. JEFE

LABORATORISTA

Sello de Calidad

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 3722-3 (2012)

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non-smooth external surface, type B

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Certificado CSC - CER257554
Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-07-19
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-02-07
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2018-02-07
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-01-27
Expiration Date:

Fecha de Restauración: 2018-02-07
Restoration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION
Certification, ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Sello de Calidad

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2011)

Plásticos. Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC-0001-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1971-06-17	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-02-07
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2018-02-07	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2023-12-16
Fecha de Restauración: Restoration Date:	2018-02-07		

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION
Certification, ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

ALFAGRES S.A.®
EN REORGANIZACIÓN

NIT: 860032550-7
AVENIDA CARACAS No. 35-55
Teléfono: PBX: 3311515 FAX: 2884737
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
recepcion.electronica@alfa.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. N0175116

DATOS DEL CLIENTE

Nombre :	INMAQ
NIT o C.C. :	800216251
Domicilio :	Cra 24 # 15-17 br centro Teléfono : 2953041
Ciudad :	MONTERÍA
Obra :	INMAQ
Direccion :	Cra 24 # 15-17 br centro MONTERÍA Córdoba
Correo Electronico :	ingmarcouribe@yahoo.com;ingmarcouribe@yahoo.com

DATOS DE FACTURA

No. de Pedido :	0057809865
No. Orden de Compra :	
Fecha de Expedición :	25.06.2022 13:04:12
Fecha de Vencimiento :	25.06.2022
Condiciones de Pago :	Contado Anticipado Acuerdo mutuo

Cliente: 2642941
(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ÉSTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor : GARCIA ALEJANDRA | Ciudad : Montería | Telefono : 7816007 | Punto de venta :Tienda Sinú | E-mail : ALEJANDRA.GARCIA@ALFA.COM.CO

NO. ORDEN DE ENTREGA	REFERENCIA CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CAL	CANTIDAD	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0093856713	135026159	7.- TANQUE CAMPEON PLUS BLANCO 2238	94	1	50,00	19,00	837.461,86	88.153,880	4.407.694
0093856713	135019710	8.- TAZA CAMPEON BLANCO 4262-1	94	1	50,00	19,00	837.461,86	88.153,880	4.407.694
0093856713	135002411	9.- ASIENTO FANTASIA 9507 BCO-1	94	1	50,00	19,00	160.459,37	16.890,460	844.523
0093856713	135001190	10.- LAVAMANOS SHELBY BCO 5710-1	94	1	50,00	19,00	423.105,11	44.537,380	2.226.869
0093856713	135030036	11.- KIT LLAVE SENCILLA LAVAMANOS CROSS	94	1	50,00	19,00	163.656,5	17.227,000	861.350
0093856713	135030642	12.- ACC.CS41301BA 3 PIEZAS BCO	94	1	50,00	19,00	131.716,55	13.864,900	693.245

Total Nro Líneas: 6

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
* RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764021237137 2021-11-16 VENCE 2023-05-16
N01 DEL 70002 AL 100000
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES. DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10/12/2020." AUTORIZO A ALFAGRES S.A. PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE ESTA INFORMACION NO SERA REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN

SUB TOTAL	13.441.375,00
TRANSPORTE	0,00
IVA 19,00%	2.553.861
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
VALOR FACTURA	15.995.236,25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:
FIRMA AUTORIZADA

ALFA
Creamos Contigo

CUFE : 47def1e0d3ff7a9c3005334454318eac94ae7d6d34ef1341b133513a5d62f0ac4662c804e99c7851162f573524675e1e
Fecha Validación DIAN: 2022-06-25 13:06:18-05:00

LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA , Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA ENDOSARLA, DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013, ARTICULO 88.

	**INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD**

OBRA	INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
CONSTRUCTOR	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Fecha de inicio modificada (d/m/a)	01 DE JUNIO DE 2022	**Fecha de inicio original**	26 DE ABRIL 2022
Fecha de terminación modificada (dd/mm/aa)	30 DE JUNIO DE 2022	**Fecha de terminación original**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Duración proyectada	30	**Duración proyectada original**	5 MESES
Adición tiempo	0	**Director de Obra:**	**JOSE DUARTE**

Objetivos Estratégicos	ACTIVIDAD	INDICADORES	FRECUENCIA	Meta
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad para el proyecto.	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015.	Numerales de la norma 9001, implementados / Numerales aplicable	MENSUAL	100%
Desarrollar el proyecto de manera controlada	Minimizar los re-procesos	N° act re-procesadas / N° act	MENSUAL	10% máximo
Efectuar retroalimentación permanente con partes interesadas en todos los procesos del proyecto	Realizar mesas de trabajo periódicas, auditorías visibles, comunidad, autoridades competentes	reuniones programadas	MENSUAL	100%
Evitar el incremento de accidentes acorde a los peligros y riesgos	Tasa de accidentalidad	Total de accidentes * 100 / # total de trabajadores	MENSUAL	0,0%
	Tasa de severidad	Promedio dias de incapacidad (# días de incapacidad / # de accidentes) Meta de control de severidad	MENSUAL	100%

DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE REALIZAN LOS ENSAYOS

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

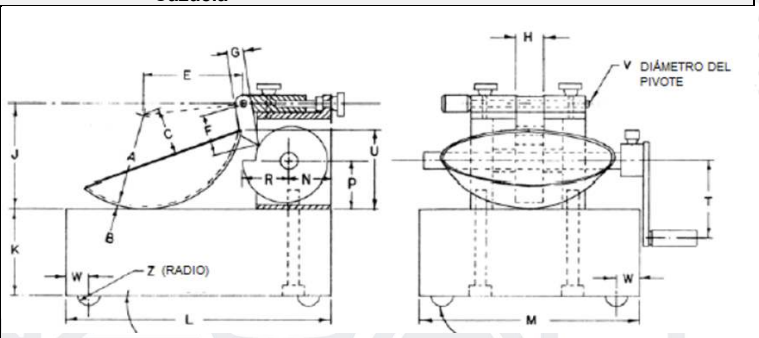

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	20,2	°C
	Final/*End*	21,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0	kN
	Resolución **(r)**	0,1	kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% =	0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% =	0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

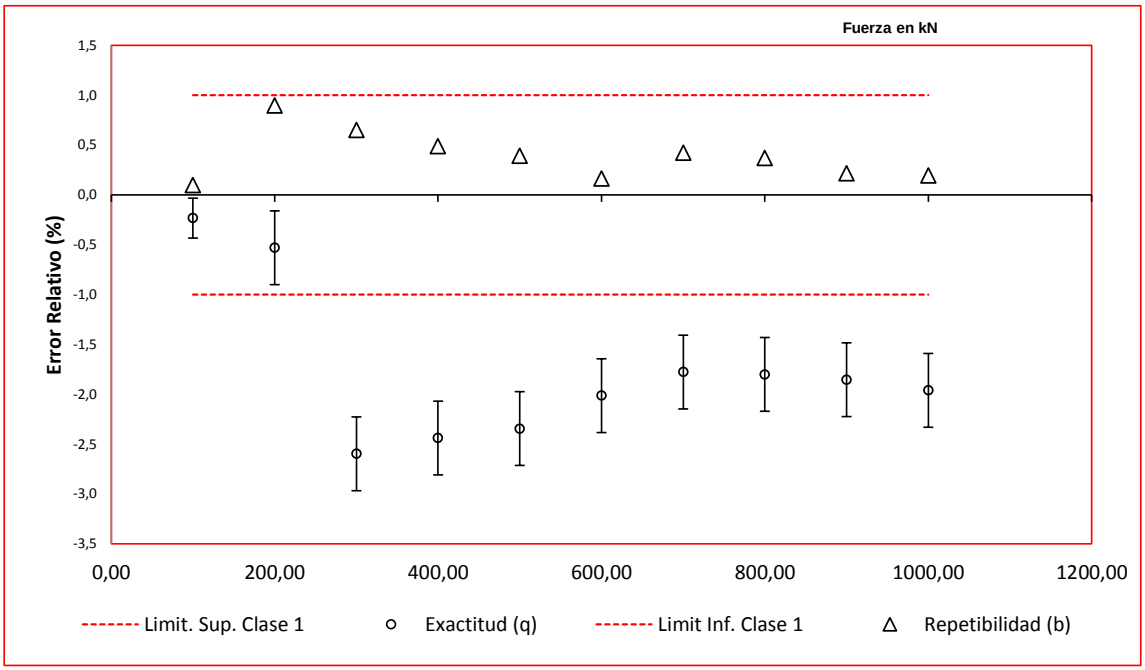

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

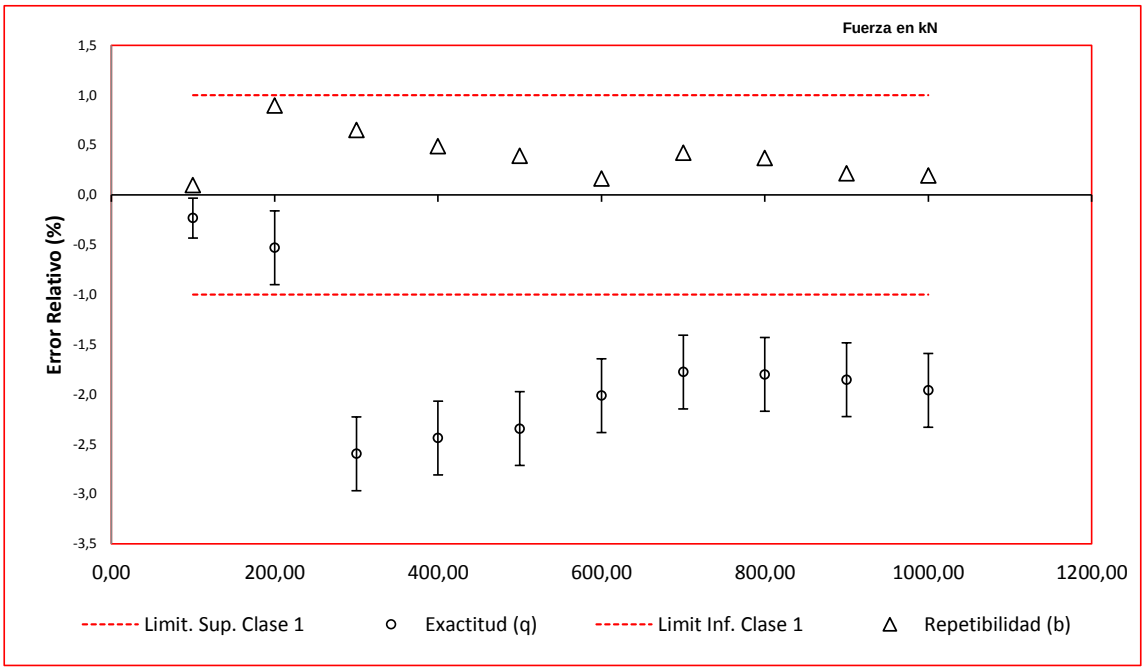

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ANEXO No. 5
"INFORME DE GESTIÓN SOCIAL".

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 2.
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTORÍA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

JULIO 22 DE 2022

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 2.

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Municipio	Córdoba	Contrato:		22200576	
Contratista de obra	Consorcio Construredes	Contratista de interventoría		Arca Arquitectura e Ingeniería S.A.	
Fecha:	Junio 22 de 2022	Elaboró:	Norelis Anaya Pérez Profesional Social – contratista	Revisó:	Fernanda Grijalba P. Social Interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 113
2. ANTECEDENTES 113
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 114
4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 114
4.1. Línea de Comunicación 114
4.1.1 Socializaciones: 115
4.1.3. Piezas de Divulgación: 118
4.2. Línea de Participación Comunitaria: 121
4.2.1. Conformación del Comité Veedor: 122
4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor 122
4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad: 123
4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS: 124
4.2.4. Buzón de PQRS: 129
4.2.5. Recorridos de obra 129
4.2.6. Otras reuniones 130
4.3. Línea de Capacitación 130
4.4. Reporte de Actividades Complementarias 131
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 131

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información del proyecto 6
Tabla 2 Material divulgativo 11
Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad 12

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe, se dan a conocer las actividades desarrolladas en cada uno de las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, que se ejecutaron en el marco del contrato de obra **N.º 2220576** cuyo objeto corresponde a "**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)"** en el periodo comprendido entre 1 al 30 de junio del 2022, en el cumplimiento de los parámetros establecidos por el **VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**, es importante mencionar que las actividades aquí plasmadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

2. ANTECEDENTES

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, es un programa del Ministerio de Vivienda y ejecutado por ENTerritorio, con el cual se busca garantizar el acceso a los servicios mencionados a poblaciones vulnerables que no cuenten con estos servicios. -

El municipio de Córdoba departamento de Bolívar, ha sido beneficiario en el marco de este programa, con la priorización de uno de sus barrios, cumpliendo con los criterios de focalización, el barrio San Martín, este se encuentra situado en el centro de la cabecera municipal, debido a su ubicación, este es un sector comercial, que es visitado diariamente por un gran número de personas en búsqueda de los productos y servicios que aquí se ofrecen, adicional, se cuenta con infraestructura vial en buen estado, que facilitan el tránsito vehicular y peatonal.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información más relevante del proyecto.

Tabla 18 Información del proyecto

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	**NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR**	**NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS**	**FECHA DE INFORME**	**N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO**	**N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO**
CORDOBA BOLIVAR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	Del 1 al 30 de junio de 2022	217	42

4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El componente de gestión social, se implementa desde el inicio del proyecto, bajo tres líneas estratégicas, este se encuentra enfocado en el trabajo directo con la comunidad, a través de actividades de socialización y participación, promoviendo la corresponsabilidad de las familias beneficiadas de los barrios focalizados.

4.1. Línea de Comunicación

Esta línea contempla una serie de actividades relacionadas con la transmisión y divulgación de la información del programa de Conexiones Intradomiciliarias a los potenciales beneficiarios del Barrio San Martín, en el marco de esta línea se pretende dar a conocer a través de estrategias comunicativas y metodologías participativas las particularidades del programa, en este sentido es vital que la comunidad conozca y se interese por solicitar información que promuevan el conocimiento y la apropiación de este programa.

Las actividades desarrolladas en el marco de esta línea de intervención, son vitales para la ejecución del programa, debido a que la comunidad contará con el conocimiento necesario, lo cual favorecerá el desarrollo de acciones de las demás líneas de acción. Por ello, es necesario la implementación de estrategias que contribuyan a la fácil comprensión de los objetivos del programa. Teniendo en cuenta la idea anterior, a continuación, se detallan las actividades realizadas bajo el enfoque de esta línea.

4.1.1 Socializaciones:

Se consideró necesario realizar una reunión sectorizada, para reforzar el conocimiento en la comunidad sobre el PCI. Esto se desarrolló el día martes 28 de junio, donde se contó con la participación de los miembros del Comité veedor, miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín, Miembros del Comité Veedor, Personero Municipal, entidad prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, actores relevantes de la comunidad, el ingeniero residente del contratista de obra, y las profesionales sociales del contratista de obra e interventoría, en total asistieron 21 personas, esto se ejecutó en las instalaciones de la Casa de la Cultura,

Se inicia la reunión por parte de las profesionales del equipo social del Contratista de obra e Interventoría, explicando el objetivo de la reunión, resaltando los temas a abordar, recordando los temas abordados durante los encuentros realizados los días 31 de mayo y 13 de junio del año en curso, el primero definido como el primer encuentro con los miembros del Comité Veedor y el segundo como respuesta a la PQRS número 12 de solicitud de información del proyecto. Luego se llevó a cabo el abordaje de los diferentes puntos como: ampliación del plazo de cierre de inclusiones hasta el día 30 de junio de 2022, recepción de hojas de vida en el punto de atención ubicado en la calle 3, carrera 5 barrio abajo, martes y jueves de 8 a.m. a 12 m. Línea telefónica: 3205747617, viviendas intervenidas hasta el momento, cantidad de personal vinculado de mano de obra local, compromisos que debe tener el personal para la calidad de las obras, información del proyecto características, se da a conocer que en la plataforma SECOP II pueden consultar información del contrato, requisitos para tener en cuenta en las inclusiones por parte del municipio y el prestador y trámite de cierre de inclusiones por parte del contratista de obra.
Se resalto que se estarán recibiendo solicitudes de inclusión hasta el día 30 de junio de 2022, indicando que

aquellas personas que consideren que sus viviendas tienen una necesidad sentida referente a la ausencia de unidad sanitaria, pueden dirigirse al punto de atención a realizar su petición los martes y jueves de 8 a.m. a 12 m. a su vez se reiteró que por parte del contratista de obra se están recibiendo hojas de vida de personal de mano de obra no calificada en el punto de atención, ubicado en la calle 3, carrera 5 barrio abajo, lo cual está sujeto a condiciones y disposiciones por parte del contratista.

Se dio a conocer que de acuerdo a los conceptos emitidos por el Municipio, el área social del proyecto se dirige a cada una de las viviendas con la finalidad de ar a conocer si su vivienda es favorable o no para la intervención y de esta forma dar por cerrado la PQRS solicitando la respectiva firma del peticionario, se menciona que se presentaron casos donde las personas que para su vivienda el concepto es no favorable, manifiestan no estar de acuerdo con la respuesta y mencionan que no firmaran el formato de cierre. Presentada esta situación se solicita al Comité Veedor brindar su acompañamiento para que ellos puedan conocer que el trámite por parte del Contratista se realiza conforme a los lineamientos del Ministerio de Vivienda, y que ellos como testigos se verifique tal situación y de esta forma continuar con el cierre de las PQRS.

Asimismo, se invitó a la comunidad, especialmente a los beneficiarios que frente a cualquier interrogante, dudas, queja e inquietud deben dirigirse al personal técnico y social y/o al punto de atención al ciudadano. También que la información del contrato de obra o el proyecto se encuentra registrada en la plataforma del Secop II, la cual es de acceso público, si se requiere de la documentación del mismo.

En este espacio el acuerdo establecido es por parte del Comité Veedor, brindar acompañamiento a las actividades requeridas por parte de la gestión social del proyecto. El único compromiso en esta reunión es que, el contratista entregará la información de las PQRS donde el concepto es No favorable y se tiene el inconveniente de inconformidad por parte de los residentes de aquellas viviendas.

Reuniones de Acercamiento y de socialización masiva	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de la actividad	Principales resultados	Ejecutó	Evidencias
Reunión socialización sectorizada	28/06/2022	San Martín	21	Casa de la Cultura	Informar sobre el PCI Informar sobre mecanismos utilizados para los	Contratista	Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico

					conceptos por parte del Municipio		

4.1.2 Visitas Casa a Casa:

Las actividades de visita casa a casa que se han desarrollado durante este periodo hacen referencia a:
-El día 3 de junio se realizó visita a los potenciales beneficiarios que han expresado rechazo voluntario al beneficio, debido a que en sus viviendas ya cuentan con todos los aparatos sanitarios ofertados por el PCI, por tanto, el equipo social visita a cada una de estas viviendas con el fin de constatar la información y diligenciar el acta de rechazo de potenciales beneficiarios. Cabe resaltar que previo a la firma del acta, se les otorgó información del proyecto, especialmente de los objetivos del mismo y que situaciones posibles se pueden generar frente al rechazo, posiblemente se podrá vincular a otra persona que no esté incluida en la matriz de beneficiarios.

-Debido a la importancia de recibir las percepciones por parte de los beneficiarios, se realizaron visitas a 13 viviendas intervenidas, debido a que algunos expresaron dudas referentes a la intervención, se les invita a dirigirse al personal técnico durante el trabajo de campo o el centro de atención, para recibir información relacionada con la intervención en la vivienda.

-En la actividad de establecer la debida identificación de las viviendas donde ya se han realizado los diagnósticos, el equipo social realiza visita casa a casa, con el fin de instalar los sticker, inicialmente, se socializa al beneficiario el objetivo de la actividad y se solicita el permiso correspondiente para su respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Cabe destacar que los beneficiarios se muestran prestos a colaborar y no manifiestan inconvenientes con este ejercicio. En su totalidad durante este periodo se han instalado 66 stikers, nueve (9) sticker, el día 7 de junio de 2022. Dicha identificación de las viviendas efectivas, se realiza de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ – VE – (001) y se continúa con esta actividad, el día 24 de junio de 2022, al realizar la instalación de los sticker de identificación de las viviendas efectivas, en este caso identificadas de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ – VE – (010).

4.1.3. Piezas de Divulgación:

- **Volantes y folletos**

Con el fin de darle cumplimiento a las actividades, se elaborarán dos (2) piezas comunicativas (oficio de invitación N°3 Y N°4), estas fueron revisadas y avaladas por Interventoría y posteriormente por ENterritorio, el contenido de cada una de estas corresponde a:

Oficios de invitación N° 3: este documento está dirigido a extenderle invitación cordial a los miembros del comité veedor, entidad prestadora y municipio, a un espacio de socialización el cual estuvo dirigido a dar a conocer información relacionada con las actividades que se están ejecutando en el marco del programa, definido para el día

Oficios de invitación N°4: dirigidos a interesados (Comité veedor, Junta de Acción Comunal, delegados del Municipio y Prestador y personero municipal, dar a conocer los avances del proyecto, sus características y requisitos, para el espacio de socialización llevado a cabo el 28 de junio de 2022.

Cabe resaltar que estas piezas informativas son elaboradas con el propósito de invitar a los miembros del comité veedor, entidad prestadora, municipio, y actores relevantes de la comunidad, luego de su revisión y aprobación por el ente supervisor, son entregadas a cada uno de ellos.

El día 10 de junio se hizo entrega del oficio de invitación (N° 3). A cada uno de los integrantes del comité veedor, delegada social del municipio, delegada social y representante legal de la entidad prestadora, a un espacio de socialización con el fin de entregar información del PCI, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en el barrio Abajo. Para ello, fue necesario dirigirse a cada una de las viviendas donde residen cada uno de ellos.

El día 23 de junio se hizo entrega del oficio de invitación N° 4 al espacio de socialización a cada uno de los integrantes del comité veedor, delegada social del municipio, delegada social y representante legal de la entidad prestadora, personero municipal y secretario de planeación, con el fin de entregar información del PCI, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en el barrio Abajo. Para ello, fue necesario dirigirse a cada una de las viviendas donde residen cada uno de ellos.

- **Valla Informativa**

La Valla Informativa, continúa instalada en un punto estratégico de la cabecera municipal; ubicada en la entrada del Barrio San Martín, específicamente a la entrada del municipio, por la vía que conduce al Municipio de Zambrano, Bolívar y se encuentra en estado favorable.

- **Perifoneo**

En cuanto a estas actividades se realiza:
-Transmisión de información de inclusiones, se realizó el 3 de junio a través de la emisora comunitaria, siendo este un medio de comunicación al cual las personas tienen fácil acceso y es sintonizada por la mayoría de la población Cordobés, el objetivo de esta actividad se relaciona con brindar información a la comunidad del barrio San Martín, acerca del proceso de inclusión al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, se da a conocer la fecha de cierre de recepción de solicitudes de los posibles beneficiarios, de igual manera se les informa que existe un punto de atención a la comunidad, donde se entrega información a las personas que lo requieran, de igual forma, se refiere que en el punto de atención se reciben las hojas de vidas para la oferta laboral de personal de mano de obra no calificada, se aclara, que esto está sujeto a verificaciones por parte del contratista de obra.

Una nueva transmisión se llevó a cabo, nuevamente el día 23 de junio de 2022, a través de la emisora comunitaria, teniendo en cuenta las particularidades de la población y la acogida de este medio de comunicación se procedió a otorgar información del proceso de inclusión del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, relacionada con la fecha de cierre de recepción de inclusiones, a su vez, se brindó información relacionada con la oferta laboral dirigida a personal de mano de obra no calificada y se extendió invitación a la comunidad del barrio San Martín a la reunión programada para el 28 de junio, la cual tiene la finalidad de retomar información del PCI y dar a conocer los avances del proyecto a la fecha, esta actividad estuvo a cargo del personal técnico y social del contratista de obra e interventoría.

- **Cartelera Informativa**

La cartelera informativa, se encuentra instalada en la alcaldía municipal, la cual contiene información de sumo interés en ella se consigna la información de las entidades encargada de desarrollar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, entre las que se encuentra el Ministerio de Vivienda, La Gobernación de Bolívar, El Municipio de Córdoba, el Consorcio CONSTRUREDES, Enterritorio, e Interventoría, entre otras, asimismo, los canales de atención a la comunidad y el puesto de atención físico, donde serán atendidos por el equipo de profesionales sociales de contratista de obra e interventoría, evidenciando la información que deben aportar los posibles beneficiarios y los criterios de focalización que contempla el programa.

-El día 8 de junio se realiza actualización de información en la cartelera que se encuentra ubicada en la Alcaldía Municipal, la cual contiene información básica del PCI, las piezas publicada se atribuye a la oferta laboral que el Contratista de obra da a conocer a la población (Maestros de obra, oficiales y ayudantes de construcción) esto debido a que la importancia de contar con talento humano de la zona, además que la generación de empleo se traduce en la mejora de calidad de vida para la población.

-El día 29 de junio se actualiza nuevamente la cartelera debido a que por condiciones del clima se deterioró, cabe resaltar que uno de los compromisos contemplados dentro del acta de instalación de la misma se atribuye a su cuidado y/o protección por parte del municipio. Actualmente, se halla instalada en el lugar estratégico que inicialmente se dispuso para su instalación.

De acuerdo en reunión con la Profesional Social de Enterritorio, se sugirió la instalación de una cartelera informativa en lugar de afluencia de personas en el Barrio San Martín, teniendo en cuenta esto, se solicita la autorización al propietario de la tienda ubicada en la Carrera 4 # 10 -13, donde se instala dicha información, en este espacio se da a conocer la información del Punto de Atención a la comunidad, características del programa, y la oferta laboral de mano de obra no calificada. Esta actividad se realizará el 30 de junio de 2022.

Tabla 19 Material divulgativo

Núm de pieza	Material Utilizado	Descripción medio de divulgación	Fecha de Divulgación	Relación Evidencias
1	Instalación valla informativa	Valla Instalada	29-06-2022	-Registro fotográfico
2	Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación 3 - respuesta PQR n° 12	10-06-2022	-Registro fotográfico -Planilla Entrega de información.
3	Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación 4 - Informativo PCI	24-06-2022	-Registro Fotográfico -Entrega de información.
4	Material Informativo y/o de convocatoria	Volante 3 Convocatoria personal mano de obra local.	08-06-2022	-Registro Fotográfico
5	Otras actividades de divulgación: perifoneo	Transmisión inclusiones PCI – aviso radial	03-06-2022	-Registro Fotográfico
6	Otras actividades de divulgación: perifoneo	Transmisión – aviso radial, información de interés comunitario.	23-06-2022	-Registro Fotográfico
7	Cartelera Informativa	Adecuación de Cartelera con la información del PCI, instalada en la Alcaldía Municipal de Córdoba, Bolívar.	8 y 29-06-2022	Registro fotográfico

4.2. Línea de Participación Comunitaria:

Esta línea tiene como objetivo incentivar la participación y responsabilidad ciudadana en la gestión del Control social sobre el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, por ello se han apoyado las actividades realizadas por los demás entes comprometidos e inmiscuidos con el programa. A continuación, se describen las actividades realizadas bajo el marco de esta línea de intervención.

4.2.1. Conformación del Comité Veedor:

A la fecha de corte del presente informe la Alcaldía Municipal no ha realizado la entrega de la copia de resolución de conformación del Comité Veedor.

4.2.1.1. Reuniones Comité Veedor

El día lunes 13 de junio, se llevó a cabo una reunión de socialización del PCI en respuesta de la PQRS Nº 12, (el día 18 de mayo de 2022, el Presidente de la JAC del Barrio San Martin entrega un oficio; invitación al Consorcio Construredes a asistir a una reunión que ya tenía programada con la comunidad para el día 20 de mayo, con el objetivo según el oficio, de que "nos socialicen el proyecto de redes domiciliarias y el listado de los posibles beneficiarios ya que se han presentado inconformidades en el sector"). Esta petición fue revisada entre Contratista, Interventoría y Enterritorio concluyendo la pertinencia de programar una reunión con los líderes del barrio San Martín, Comité Veedor y demás comunidad interesada, donde se dé a conocer el PCI y sus características.

Para el logro de esta reunión se realiza la invitación con anterioridad de manera oficial, entregando un comunicado para que las personas interesadas participen en este espacio.

Esta reunión se desarrolló el día 13 de junio de 2022, contando con la asistencia de trece (13) personas: miembros del Comité veedor (Rubén Alvis, Cristóbal Anaya, Orlando Teherán, Maira Rosales y Melissa Durango), miembros de la Junta de Acción Comunal (el presidente José Gregorio Martínez y demás miembros como, Diana Paternina Navarro, Raúl Alberto Ochoa Crúzate y la secretaria de la misma Doris Jiménez Ramírez), delegada social del prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, Yuranis Serrano el ingeniero residente, la profesional social del contratista de obra e interventoría, se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura, cabe anotar que, se le extendió la invitación a la delegada social del municipio, sin embargo, no asistió al espacio de socialización.

Caba aclarar que la propuesta de la reunión como respuesta a la PQRS se dio a conocer al peticionario quien estuvo de acuerdo, considerando que esta es la solución que se esperaba, para confirmación de esto dicha persona después de la reunión firma el formato de PQRS de cierre a satisfacción. Por tanto. La reunión se llevó a cabo de la siguiente forma:

En la fecha anteriormente mencionada (13 de junio de 2022) Se da inicio a la reunión por parte de las profesionales del equipo social del Contratista de obra e Interventoría, explicando el objetivo de la reunión, socializar el PCI y recordando los puntos relevantes mencionados el día 31 de marzo, (características e intervenciones del PCI), que fue el primer encuentro con los miembros del Comité Veedor. Seguidamente, se llevó a cabo el abordaje de los temas puntuales: Proceso de inclusiones, fecha de cierre, recepción de hojas de vida para interesados en laborar en el proyecto, viviendas intervenidas a la fecha, personal contratado). Se resaltó que el PCI, su fundamento es en pro de la comunidad, este proyecto proviene del Ministerio de Vivienda y supervisado por Enterritorio, se expresó que cualquier inquietud por parte de la comunidad deben invitarlos a que se dirijan al personal técnico y social y/o al punto de atención al ciudadano.

Se precisó que el contrato de obra o información del proyecto se encuentra registrado en la plataforma del Secop II, a la cual pueden acceder para obtener dicha información, ya que es de conocimiento público.

Algunas de las inquietudes de los asistentes fueron:

1. ¿Es posible ceder el beneficio a otra persona o familiar?

Se responde que el beneficio no es posible ceder, el programa está dirigido a las viviendas no a las personas.

2. ¿Cuántas personas hay vinculadas a la fecha?

Se responde que se encuentran laborando trece (13) personas de la cabecera municipal, adicional se comunica que las personas interesadas en laborar pueden hacer llegar su hoja de vida en el Punto de Atención a la Comunidad, se revisará los perfiles y de acuerdo a las necesidades del proyecto se contratará el personal requerido.

Nuevamente los acuerdos fueron por el Comité Veedor, asistir a las actividades que el proyecto requiera.

4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad:

El Punto de Atención a la comunidad, continúa ubicado en un lugar de fácil acceso para la ciudadanía, específicamente a la vía de acceso que conduce a la zona rural, ubicado en la Calle 3 Carrera 5 Barrio Abajo, cuenta con la debida identificación (Pendón), con los datos requeridos y el horario de atención establecido es de ocho (8) horas semanales, los días martes y jueves de 8 a.m. a 12.m.

Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas interesadas, se acerquen depositen sus dudas, quejas o soliciten información.

A continuación, se da a conocer la información del PAC.

Tabla 20 Punto de atención a la Comunidad

Dirección del Punto de Atención	**Barrio**	**Horarios de Atención**		**Línea Telefónica y correo**	**N° de Buzones Instalados**	**Relación de Evidencias**
		Día	Hora			
Calle. 3 Carrera 5. Córdoba —Bolívar	Barrio Abajo.	Martes Y Jueves	8:00 am a 12 m	320 5747617 ccontruredes@gmail.com	1	Registro Fotográfico

4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS:

Al realizar las visitas casa a casa, algunas personas se acercan al equipo social con el fin de exponer diferentes situaciones en algunos casos relacionadas con aspectos técnicos, por ende, se direcciona al área técnica y se le invita a acercarse al punto de atención al ciudadano. Si es relacionada con el área social se procede a brindar el acompañamiento oportuno para dar trámite al interrogante por parte del beneficiario. En el caso de las dudas referente al proceso de inclusión, se les invita a acercarse al punto de atención y realizar el respectivo trámite de inclusión al programa.

Durante el presente periodo se reciben 67 solicitudes de inclusión y una (1) petición.

En cuanto al envío de las solicitud de inclusiones a la Alcaldía Municipal y al Prestador del servicio, para su respectiva revisión y concepto, se han realizado en este periodo tres (3) entregas: 9 de junio veintidós (22) solicitudes, 16 de junio dieciocho (18) solicitudes y el 28 de junio trece (13) solicitudes. A la fecha de corte de este informe, no se ha recibido respuesta por parte de la Alcaldía.

Ver Evidencias

En cuanto a las PQRS recibidas en el mes de mayo, siendo once (11) se ha dado cierre a 8 de ellas, teniendo en cuenta que algunas personas manifiestan no estar de acuerdo con el concepto dado por la Alcaldía y otra persona no se encuentra en el municipio. Se espera que, en el próximo periodo se pueda remitir los respectivos cierres, la PQRS Nº 12, recibida en el mes de junio se realiza el cierre en este mismo periodo.

A continuación, se relaciona el estado de las PQRS.

Tabla 21 PQRS recibidas.

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
1	24/05/2022	Ana Esther Crúzate Daza	1.049.453.967	Cerrada
2	24/05/2022	Cielo del Carmen medina Fonseca	22.854.534	Abierto
3	24/05/2022	Delfina Elena Ochoa Romero	22.853.996	Abierto
4	26/05/2022	Islena Del Carmen Martínez Puerta	22.855.942	Cerrada
5	26/05/2022	José David Teherán Hernández	73.315.288	Cerrada
6	26/05/2022	Ana Rodríguez De Mendoza	22.854.276	Cerrada
7	26/05/2022	Tatiana Herrera Vergara	1.049.453.341	Cerrada
8	26/05/2022	Rosario Vergara Castro	22.855.153	Abierto
9	31/05/2022	Sol María Puerta Bohórquez	22.854.032	Cerrada
10	31/05/2022	Rosa Escobar de Ahumada	22.853.781	Cerrada
11	31/05/2022	María Ramos Vásquez	22.855.515	Cerrada
12	02/06/2022	José Gregorio Martinez Meza	73352002	Cerrada
13	02/06/2022	Donairo Escobar Romero	1.115.852.669	Abierto
14	02/06/2022	Maria Tejedor Pajaro	22.855.106	Abierto
15	02/06/2022	Beatriz Ochoa Piña	1.002.302.054	Abierto
16	02/06/2022	Ana Isabel Ortega Bohorquez	22.854.576	Abierto
17	02/06/2022	Digna Ortega Bohorquez	22.854.558	Abierto
18	02/06/2022	Luz Estela Paternina Escobar	22856876	Abierto
19	02/06/2022	Esther Idalvi Lozano Esquea	44.160.575	Abierto
20	02/06/202	Gregoria Paternina Escobar	22.855.753	Abierto

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
	2			
21	07/06/2022	Amalfi Esther Piña Acuña	22.854.624	Abierto
22	07/06/2022	Kellys Garcia Contreras	1.049.452.499	Abierto
23	07/06/2022	Ilsa Maria Sampayo de Torres	33.297.022	Abierto
24	07/06/2022	Argenida Rivera Cruzate	22.854.180	Abierto
25	07/06/2022	Margelis Jimenez Ramirez	22.854.946	Abierto
26	07/06/2022	Isabel Ramirez Quiroz	22.854.444	Abierto
27	07/06/2022	Rosa Escobar Fernandez	22.854.436	Abierto
28	07/06/2022	Sofia Maria Fonseca Gonzalez	22.854.294	Abierto
29	07/06/2022	Juan Carlos Ochoa Fonseca	1.049.453.664	Abierto
30	07/06/2022	Maritza Isabel Alvis Ballestas	22.854.450	Abierto
31	07/06/2022	Patricia Isabel Anaya Leguía	22.854.100	Abierto
32	07/06/2022	Alicia Esther Villamizar Rosales	22.854.828	Abierto
33	07/06/2022	José Gabriel Márquez Bolaño	3.831.517	Abierto
34	07/06/2022	Sixta Bibiana Ahumada Polo	22.854.025	Abierto
35	09/06/2022	Yesenia Marcela Escobar Madariaga	1.049.453.629	Abierto
36	09/06/2022	Elsy Estella Estrada Leguía	22.854.755	Abierto
37	09/06/2022	Justa Matilde Vergara Villa	22.853.742	Abierto
38	09/06/2022	Martín Manuel Lozano Rivera	12.587.120	Abierto
39	09/06/2022	Eliani del Carmen Flores Mendoza	22.856.909	Abierto
40	09/06/2022	Bermuil del Socorro Vergara Causado	22.854.230	Abierto

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
41	09/06/2022	Duberlis Torres Anaya	22.856.866	Abierto
42	09/06/2022	Sirley María Ortega Barboza	22.855.342	Abierto
43	09/06/2022	Josefina Fernández Anaya	22.855.756	Abierto
44	09/06/2022	Marina del Carmen Romero Villa	22.854.569	Abierto
45	09/06/2022	Miladis del Carmen Pérez Medina	22.854.417	Abierto
46	09/06/2022	Nulis Margoth Henao Causado	22.856.863	Abierto
47	13/06/2022	Orlando Miguel Teherán Hernández	9.092.547	Abierto
48	13/06/2022	Alfonso Manuel Romero Henao	73.315.070	Abierto
49	13/06/2022	Rosa Isabel de Avila Padilla	26.840.974	Abierto
50	13/06/2022	Angela del Socorro Martínez Flores	22.853.964	Abierto
51	14/06/2022	Pedro Pablo Romero Diaz	3.831.879	Abierto
52	14/06/2022	Yulieth Candelaria Villafañe Escobar	1.049.454.585	Abierto
53	14/06/2022	Astrid Margarita Medina Fonseca	22.855.439	Abierto
54	14/06/2022	José del Carmen Hena Romero	4.031.762	Abierto
55	14/06/2022	Rosiris escobar Romero	22.854.927	Abierto
56	14/06/2022	Braulio Alfonso Medina Torres	3.831.575	Abierto
57	15/06/2022	María Graciela Fernández Chamorro	22.855.851	Abierto
58	15/06/2022	Ana Ibis Hernández Fernández	1.049.452.719	Abierto
59	16/06/2022	Francisco Medina Romero	3.831.242	Abierto
60	16/06/2022	Pablo Roman Piña Ahumada	3.831.873	Abierto
61	17/06/202	Yecenia María Valeth Crúzate	22.854.432	Abierto

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
	2			
62	21/06/2022	Tulia Elena Ochoa Crúzate	22.854.199	Abierto
63	21/06/2022	Adolfo Rafael Pineda Cantillo	73.315.242	Abierto
64	22/06/2022	Gerardo Rivera Ballestas	3.831.333	Abierto
65	23/06/2022	Eulogio Amado Villamizar Sanes	3.831.698	Abierto
66	24/06/2022	Estefany Luz Rico González	1.049.452.865	Por Remitir
67	15/06/2022	Nelfis Del Carmen Torres Pérez		Por Remitir
68	30/06/2022	Elida María Rosales Escobar		Por Remitir
69	30/06/2022	Pabla Isabel Navarro de Serrano		Por Remitir
70	30/06/2022	Yesenia Valeth Cruzate		Por Remitir
71	30/06/2022	Petrona Medina de Crúzate		Por Remitir
72	30/06/2022	Sandra Cruzate Medina		Por Remitir
73	30/06/2022	Arelis María Villafañe Cantillo		Por Remitir
74	30/06/2022	Beatriz Elena Acuña Ariza		Por Remitir
75	30/06/2022	Pirma Pineda Cáceres		Por Remitir
76	30/06/2022	Maricela Vásquez Pineda		Por Remitir
77	30/06/2022	Rosiris Margoth Fernandez Anaya		Por Remitir
78	30/06/2022	Nellis Manjarrez Tovar		Por Remitir
79	30/06/2022	Yulisa Perez Romero		Por Remitir

	Punto de	PQRS	PQRS	PQRS	Producto	Observaciones

Barrios	información	recibidas	atendidas	pendientes o en trámite		
San Martín	Municipio					
	Empresa de servicios					
	Contratista	67	0	67	Inclusiones	Pendiente por respuesta de municipio
	TOTAL					

4.2.4. Buzón de PQRS:

Este buzón cumple una función importante porque a través de él todos los posibles beneficiarios del Programa de Conexión Intradomiciliarias, solicitan o exponen situaciones favorables o desfavorables, ante el Consorcio Construredes por razones de interés general o interés particular. Este mecanismo les permite para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas, cabe resaltar que se ha informado a los posibles beneficiarios, cuál es la función de este buzón de PQRS, que mediante él podía hacer relaciones, quejas, denuncias, etc., asimismo se abrió el espacio para indicarles cómo se debe hacer un procedimiento en el buzón PQRS.

A la fecha de este corte, se encuentra instalado el buzón de PQRS en el punto de atención y no se han recibido PQRS.

4.2.5. Recorridos de obra

El día 1 de junio se realizó un recorrido a algunas viviendas efectivas en acompañamiento de Minvivienda, ENTerritorio, Municipio, contratista de obra e interventoría.

El objetivo del recorrido se atribuye a la verificacion del avance de las obras, de igual forma se abordaron diferentes situaciones como por ejemplo la situacion de conexión a la red domicialiaria, esto se refiere a que algunas viviendas no cuentan con conexión a la red domiciliaria, por ende, para verificar esta situación e identificar las posibles situaciones a este inconveniente que se presenta en el municipio, acordaron llevar a cabo un recorrido por el barrio San Martín en el cual estuvo presente el municipio en apoyo con el prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para identificar estas situaciones y definir las posibles soluciones.

Adicional, en este recorrido se realizaron visitas a cinco viviendas en las cuales en dicho momento se les estaba proveniendo materiales de construcccion, cabe resaltar que durante estas visitas se recibieron inquietudes por parte del presidente de la Organización de Acción Comunal del barrio anteriormente mencionado.

4.2.6. Otras reuniones

El día 22 de junio de 2022 se realizó reunión en las instalaciones de la Casa de la Cultura, a las 10:00 a.m. con la participación de: Secretario de Planeación Municipal, ingeniero residente del contratista de obra, representante de la entidad prestadora y profesional social del contratista, con el fin de conocer los mecanismos de evaluación utilizados por el municipio y la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para determinar o emitir su respuesta, referente al proceso de inclusiones, su respuesta se encuentra enfocada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Córdoba Bolívar y realizan visitas con el fin de corroborar la ubicación de la vivienda, es decir si se encuentra dentro de los límites del barrio San Martín.

4.3. Línea de Capacitación

Los días 10, 11,13 y 23 de de junio se realizaron capacitaciones al personal de obra que está ejecutando las intervenciones en las viviendas priorizadas, las profesionales sociales con el fin de resaltar la importancia de la comunicación asertiva del personal de obra con los beneficiarios, la transmisión de información precisa y veraz del proyecto por parte de estos y el compromiso con la calidad de las obras, se resaltó la importancia de dirigir a los beneficiarios al personal técnico y social en caso de tener dudas, inquietudes o preguntas con relación a la intervención, todo ello con el fin de evitar transmitir información errada del proyecto y prevenir situaciones conflictivas con los beneficiarios, para ello fue necesario realizar durante 15 minutos a las 7: 00 antes de iniciar labores una socialización mediante la cual se les otorgó información relacionada con:

- ⇒ La importancia de consultar al propietario de la vivienda donde se desarrollan labores si se requiere de cualquier elemento o situación común.
- ⇒ Si el beneficiario requiere de información es necesario que se dirija al personal técnico o social del contratista de obra.

⇒ La importancia de ejecutar de manera eficiente las labores, lo cual se reflejará en la calidad de obras para la población.

4.4. Reporte de Actividades Complementarias

4.4.1 Generación de Empleo

Durante este periodo se vincula a 18 personas, perteneciendo el 50% a mano de obra Local.

Barrios	No. total de beneficiarios	No. de empleos generados
San Martín	217	18

4.5. Reporte de Informes

El día 16 de junio de 2022, se elaboró y se envió el informe quincenal N.º 3, de actividades a Interventoría, para su revisión, con el fin de determinar el correcto procedimiento del desarrollo del programa por parte de los Profesionales Sociales y de hacer las respectivas correcciones de ser el caso.

El día 30 de junio de 2022, se elaboró y se envió el informe quincenal N.º4 de actividades a Interventoría, para su revisión, con el fin de determinar el correcto procedimiento del desarrollo del programa por parte de los Profesionales Sociales y de hacer las respectivas correcciones de ser el caso.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social se han desarrollado de acuerdo al plan de trabajo y a los lineamientos y directrices entregados por ENTerritorio

Es preciso destacar que se han presentado diferentes situaciones que dificultan el desarrollo de actividades de entrega de información y diagnóstico, por ejemplo, en algunos casos los posibles beneficiarios no residen en las viviendas en las cuales fueron encuestados inicialmente.

La implementación del Plan de Gestión Social ha permitido que se generen estrategias de comunicación directa con la comunidad, permitiendo que la población directamente impactada se informe, reciba de

manera activa el programa y se apropie del proyecto, para esto se han dispuesto de espacios para la participación de la comunidad.

Dentro de las diferentes estrategias implementadas, se encuentra el Punto de Atención a la Comunidad, espacio destinado para que las personas soliciten información y/o depositen sus peticiones, quejas y demás, y de esta misma forma se realice el trámite pertinente para dar respuesta.

Por último, se pretende ejecutar o llevar a cabo las actividades consignadas en el cronograma de actividades teniendo en cuenta las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, definidas por el contratista de acuerdo a los tiempos definidos, considerando todas aquellas situaciones externas que se suelen presentar. Es importante que se tenga en cuenta por parte de las entidades correspondientes a aquellas viviendas que presentan condiciones desfavorables en relación al déficit de los aparatos hidrosanitarios para que se les realice una completa Conexión Intradomiciliaria, a fin de que sean beneficiadas de este programa.

El proceso de cierre de PQRS puede ser dificultoso teniendo en cuenta que algunos peticionario no quedan conformes con la respuesta entregada a ellos, donde el Municipio expresa que no son favorables de acuerdo a la revisión de aquellas solicitudes, para esto es imprescindible el trabajo mancomunado con esta Entidad, es de resaltar que las profesionales sociales de obra e Interventoría han dado a conocer su disposición frente a cualquier requerimiento.

ANEXO No. 6
"PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO"

No se solicitó anticipo en el periodo relacionado en este informe

ANEXO No. 7
"CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LAS SEGURIDADES SOCIALES Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA – CONSORCIO CONSTRUREDES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1570135165	9437869990	E	2022/07/21	2022/07/26	BANCOLOMBIA	5	$6,752,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1049453937	AHUMADA RODRIGUEZ ELIECER JULIO	230301	6	$200,000	$32,000	CCFC55	6	$200,000	$8,000	CCF41	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
2	CC 10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	23	$766,667	$122,700	CCFC55	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
3	CC 1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC 15672378	BLANCO MARTINEZ EDGAR TOBIAS	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
5	CC 1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
6	CC 73315075	CAPELA DE AVILA JOSE BELISARIO	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
7	CC 1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230201	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
8	CC 1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC 1049452239	ESCOBAR VERGARA YESON JOSE	231001	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
10	CC 1049453122	FLOREZ OCHOA FERNEY MAURICIO	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
11	CC 1049452936	FLOREZ TAMARA JOSE MIGUEL	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
12	CC 1049453627	GALVAN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
13	CC 1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC 1049453942	GONZALEZ SANCHEZ SANDRO DE JESUS	230201	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
15	CC 85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC 72253038	PEÑA CANTILLO JOSE DE JESUS	230201	1	$33,334	$5,400	EPS048	1	$33,334	$1,400	CCF41	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
17	CC 1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC 1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
19	CC 3956970	RIOS CORREA LUIS MANUEL	231001	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
20	CC 10884740	RIOS MOLINA PEDRO LUIS	230301	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
21	CC 73316966	RIVERA MARTINEZ FEIVER DE JESUS	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
22	CC 73315286	SANCHEZ MEDINA ALVARO ENRIQUE	25-14	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
23	CC 72431092	SANTOS NAVARRO JACOB	231001	2	$66,667	$10,700	EPS048	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC 1049452939	SERRANO OLANO JULIO RAFAEL	231001	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
25	CC 1049452096	VALETH ROMERO ALVARO JAVIER	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
26	CC 1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**				**$21,800,006**	**$3,488,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$1,518,200**		**$0**	**$0**

Página 1 de 2

2022/07/26 03:28 PM

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-105-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 19.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 19 correspondiente al periodo del 29 de agosto del 2022 al 04 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 5/10/2022
HORA: 7:54:42 a. m.
20224300373712

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 25 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 19

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3			

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$	1.771.707.945,99	
Valor actual	$	1.771.707.945,99	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	131		87,33%
Días remanentes del Contrato	22,00		14,67%
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 751.461.410,07		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$	202.479.313,00	
Valor actual	$	202.479.313,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	131		87,33%
Días remanentes del Contrato	22,00		14,67%
Acumulado a última acta pagada	$	32.396.690,09	
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 25 Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.166.770.861,14	65,86%	$ 916.327.349,67	51,72%	-$ 250.443.511,47	-14,14%
Durante el Periodo	$ 175.113.366,56	9,88%	$ 132.126.936,25	7,46%	-$ 42.986.430,31	-2,43%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.341.884.227,70**	**75,74%**	**$ 1.048.454.285,92**	**59,18%**	**-$ 293.429.941,79**	**-16,56%**


Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 75,74% frente a un ejecutado del 59,18% indicándonos un atraso de 16,56%


De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 17 el contratista el contratista se comprometió entregar 15 diagnósticos más producto de inclusiones para día martes 06 de septiembre.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 146 viviendas, de las cuales se han terminado 101 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

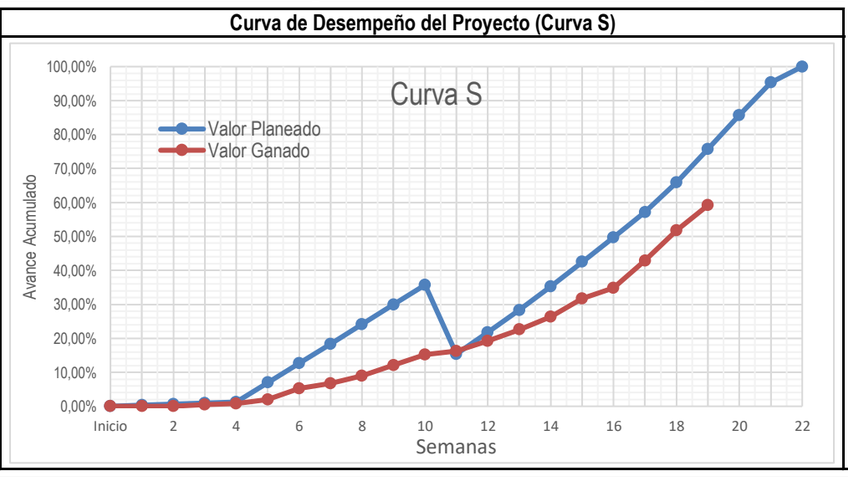

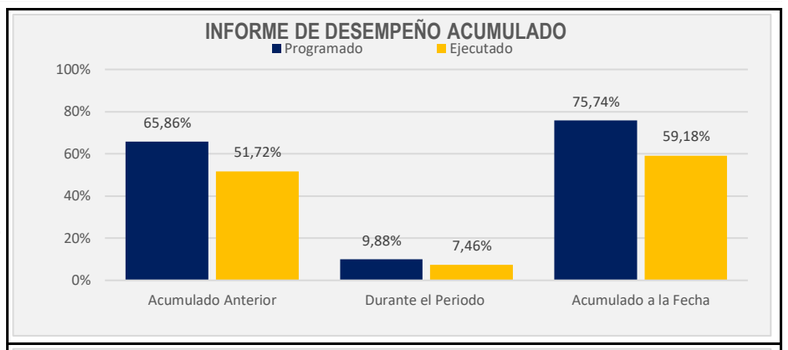

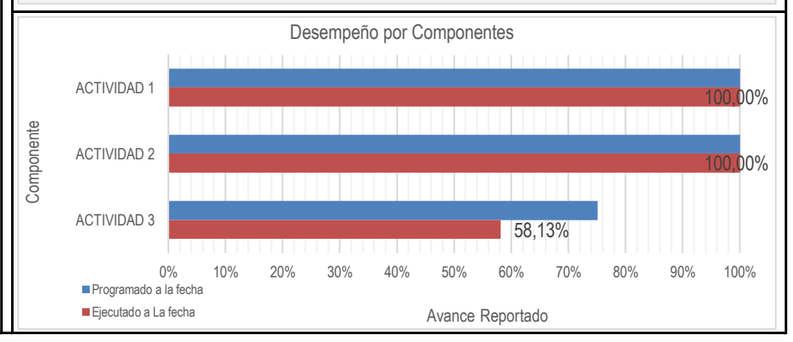


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	65,86%	51,72%	-14,14%	
Durante el Periodo	9,88%	7,46%	-2,43%	
Acumulado a la Fecha	**75,74%**	**59,18%**	**-16,56%**	

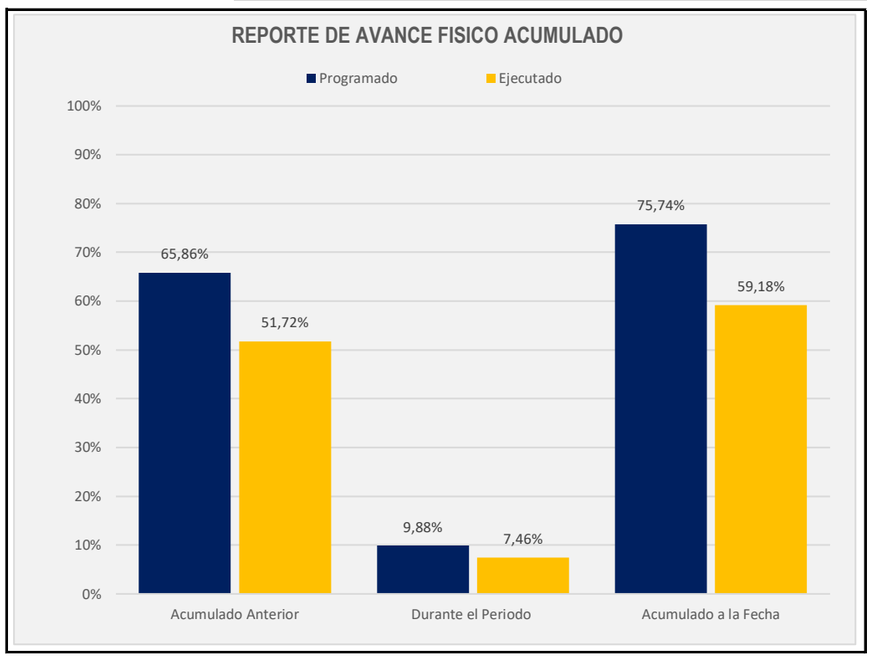


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1		0,00%		










AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 48.595.036,13	24,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 29/08/2022 al 4/09/2022 Fecha 4/09/2022

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítem debería estar con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del 22 al 28 de agosto se hicieron 14 aprobaciones de diagnósticos, completando 217, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, quedando pendiente por aprobación los diagnósticos de inclusiones hasta agotar el monto presupuestal del contrato.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 75,12% vs 58,13% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 16,99%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 146 viviendas de las cuales solo 101 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 45 más, el contratista cuenta con 24 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual de la actividad N° 3.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 152 viviendas terminadas, y se han intervenido 146 viviendas, de las cuales solo 101 están terminadas indicándonos un atraso de 51. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 05 al 11 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista debe seguir presentado los diagnósticos de las inclusiones para aprobación hasta que se agote la totalidad del monto presupuestal del contrato.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 174 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	27	5	32	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**27**	**5**	**32**	**100,00%**

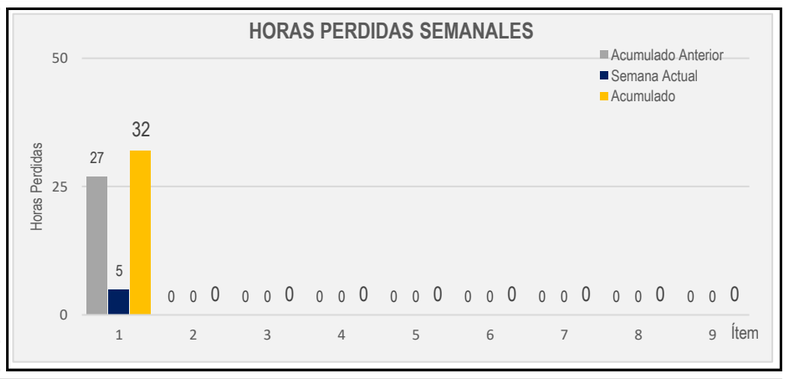

OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias torrenciales el día 30 de agosto 2022 (se adjunta rporte climatologico).

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	1/09/2022	Alcaldia Municipal	19,00	• Visitar al señor Cristóbal Anaya beneficiario del PCI. • Imprimir los documentos del Secop II para hacer entrega al señor Orlando Teherán Peticionario (N°136).	CONTRATISTA	
	2/09/2022	Barrio San martin	14,00	Almacenar, manipular, y hacer uso adecuado del agua potable, el uso adecuado del alcantarillado sanitario, el cuidado de los equipos y recomendaciones generales.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 213	ZAIDA MEDINA FONSECA	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 214	ENILDA ZUÑIGA DE HERRERA	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 215	FRANCISCO MEDINA RODRIGUEZ	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 216	OLIMPA MUÑOZ SANCHEZ	31/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 217	JASNARIS CHAMORRO BECERRA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 218	MISAEL YEPEZ SUAREZ	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 019

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **29/08/2022** al **4/09/2022** Fecha **4/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-055-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_083 mediante el cual realizamos entrega de aval para 10 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 016.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-056-22 con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SETENTA Y SEIS (76) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-057-22 con el asunto remisión para su debido tramite de Setenta y seis (76) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-058-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_088 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 017.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-059-22 con el asunto SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No. 3. Mediante el cual requerimos la entrega del informe mensual No. 3 correspondiente al mes de julio 2022 y el cual se debió radicar a la interventoría la primera semana del mes de agosto, el llamado es para cumplir con los tiempos establecidos dado que la interventoría debe revisar el informe antes que este sea radicado en la entidad Enterritorio supervisora del proyecto.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación
