Señores
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Cordial Saludo

Me permito en cumplimiento del artículo quinto de la resolución S2022060084715- 30 de junio de 2022 presentar el informe de obra y su finalización por el siguiente concepto discriminado de la siguiente manera.

COLEGIO PRESBITERO JESUS ANTONIO GOMEZ - Código Dañe; 205697000144
TIPO DE INTERVENCIÓN A REALIZAR.
En la lER Presbítero Jesús Antonio Gómez se pretende fortalecer los espacios generales, como restáurate escolar para el desarrollo de las clases, y fortalecer la permanencia escolar ya que se encuentran en mal estado presentando riesgos no solo físicos sino de salubridad para los estudiantes que atienden clase en esta sede.

VALOR INTERVENCIÓN: DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MLC $(18.194.312) PESOS ML

Propuesta De Inversión Recursos FOME- PRESUPUESTO PBRO JESUS ANTONIO GOMEZ					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.5	DESMONTE y REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS de colgar o sobreponer.	un	2,00	$ 22.640	$ 45.280
3.5	DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA (Piso y paredes)	m²	140,95	$ 20.037	$ 2.824.215
12.1	Suministro transporte y colocación de REVOQUE con mortero 1:4.	m²	16,27	$ 23.241	$ 378.131
13.1	Suministro transporte e instalación de ENCHAPE CERÁMICO ;incluye todo lo necesario para su correcta instalación Pared	m²	19,51	$ 75.050	$ 1.464.226
15.6	Suministro transporte y colocación de PISO EN GRES DE 30 x 30 cm. COLOR TRADICIÓN MORO Y TRADICIÓN SAHARA, ESPESOR DE 12 mm	m²	140,95	$ 77.390	$ 10.908.121
15.7	Suministro transporte y colocación de GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA GRES con una ALTURA DE 0,07 m. y un LARGO DE 0,30 m.	m	65,92	$ 15.125	$ 997.040
16.4	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tuberia RDE 21, 200 PSI	un	2,00	$ 59.700	$ 119.400
16.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2".	un	2,00	$ 80.300	$ 160.600
18.3	Suministro, transporte y colocación de ORINAL MEDIANO de colgar, color blanco incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	1,00	$ 474.100	$ 474.100
22.10	Mantenimiento de puertas metálicas y todo lo necesario para su correcto mantenimiento	un	7,00	$ 117.600	$ 823.200
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 18.194.312

ANTES




DESPUES





Contrato e información del Proveedor En SECOP II
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20959483&isFromPublicArea=True&isModal=False

ANTES

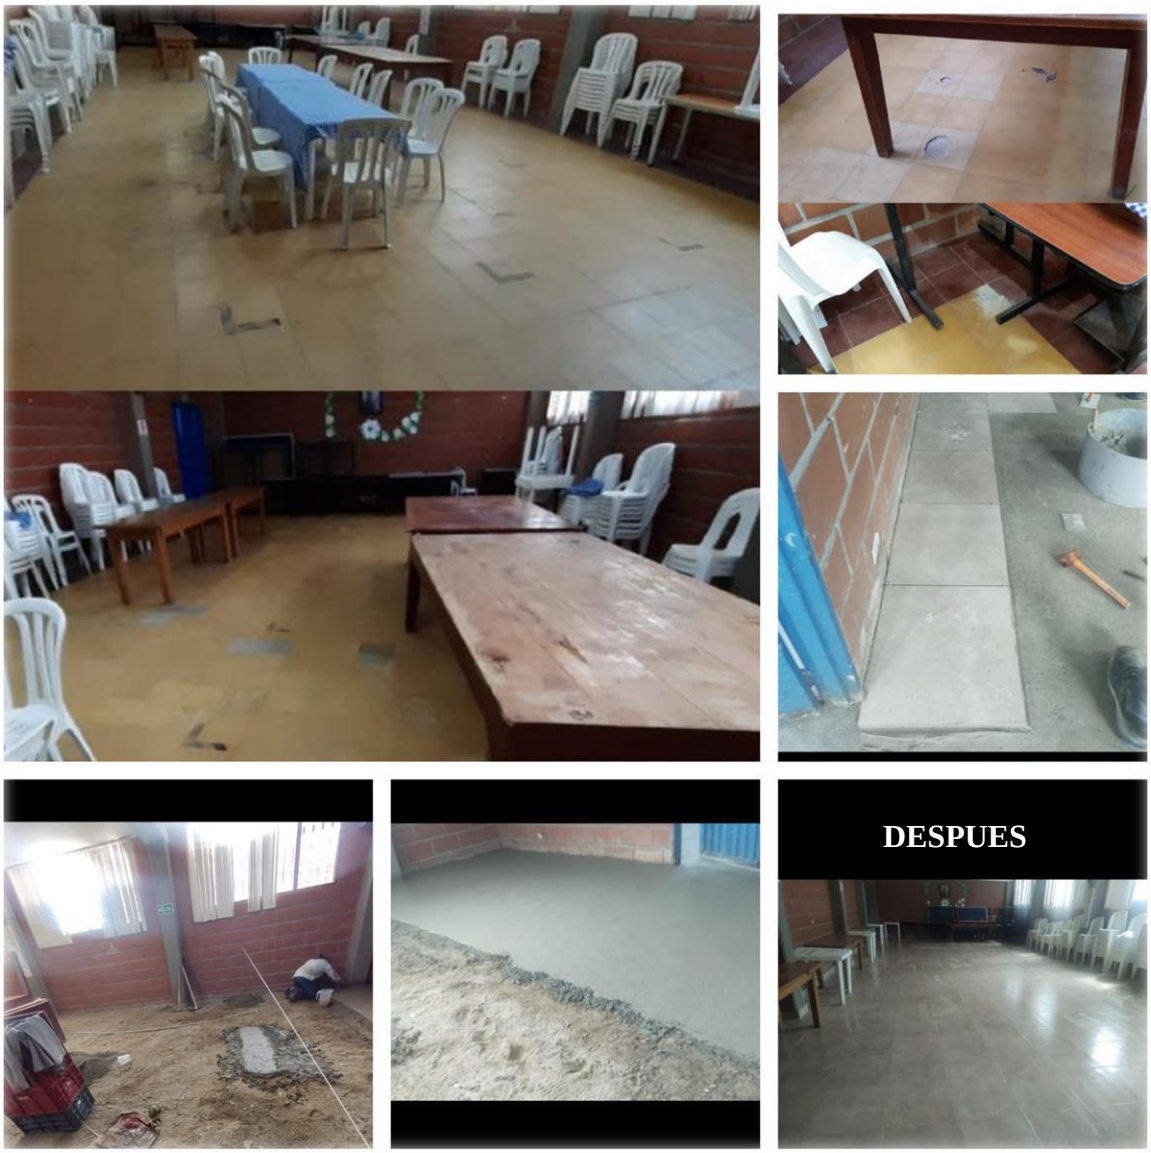

Contrato e información del Proveedor En SECOP II
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20959483&isFromPublicArea=True&isModal=False

DESPUES



Contrato e información del Proveedor En SECOP II
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20959483&isFromPublicArea=True&isModal=False







Contrato e información del Proveedor En SECOP II
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20959483&isFromPublicArea=True&isModal=False

LUZ DARY AGUDELO ECHEVERRI
Rectora
C.C. N. 39.441.079 de RIONEGRO
