LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO, identificado con **CC** No. **19399373**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 3010/2022**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 6.797.343,00 "SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Primer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
819422	C-3302-1603-10-0-3302018-02	A-02-02-02-008-003-09	$6.797.343,00
T O T A L			**$6.797.343,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 18 días del mes de octubre de 2022

MARCELA CRISTINA CUELLAR SANCHEZ
DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: MARCOS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de 2022


Señores

MINISTERIO DE CULTURA
ORNELLA GIANCOLA PIEDRAHITA
Ingeniera Civil del Taller de Diseño
Dirección de Patrimonio y Memoria
Casa Abadía, Calle 8 # 8A -31
Bogotá. D.C.

Ref. **CONTRATO No 3010 DE 2022, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004 2022, CON EL CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMUA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO."**

Yo ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO identificado con C.C No. 19.399.373 de Bogotá D.C., de acuerdo con lo señalado en artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes al sistema general de salud y pensiones, durante los últimos seis (6) meses calendario. Asimismo, declaro bajo la gravedad de juramento que no tengo personal a cargo, por lo tanto, NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,



Enrique Alonso Tovar Baquero
C.C. 19.399.373 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR ASIGNADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901149923	2	ATICCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 95-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1632840365	9439667296	E	2022/09/07	2022/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,195,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$155,100		$0	$0		$1,195,100
Centro de Trabajo: SURA I (3 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,900		$0	$0		$575,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,900		$0	$0		$575,900
1	CC	52956724	MORENO RUTH																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	1233492165	SALCEDO SHARON																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
3	CC	41753518	TOVAR NINNA																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$85,300
Centro de Trabajo: SURA V (2 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
4	CC	80074674	RODRIGUEZ JUAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	1002364950	TORRES ANGIE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total			**Afiliados(5)**																				$4,000,000	$640,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$155,100		$0	$0		$1,195,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901149923	2	ATICCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 95-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1632840365	9439667296	E	2022/09/07	2022/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,195,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$155,100	$0	$0	$155,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$155,100	$0	$0	$155,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$200,000	$0	$0	$200,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$200,000	$0	$0	$200,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				5	$1,195,100	$0	$0	$1,195,100

Certificado de Aportes

Se certifica que ABRAHAM RODOLFO YELA GARCIA identificado(a) con CC 1086724434 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARQUISAN S.A.S NI 900690767

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1610089139	9438837220	E	2022-08-19	X	X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	9	16%	$300,000	$48,000
ARL	ARL SURA	9	6.96%	$300,000	$20,900
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	9	4%	$300,000	$12,000
EPS	NUEVA E.P.S.	9	12.5%	$300,000	$37,500
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	3%	$300,000	$9,000
PARAFISCALES	SENA	9	2%	$300,000	$6,000

Este certificado se expide el día 2022-08-19 a las 08:44.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085310828		PANTOJA NOGALES BRIAM DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Maria Auxiliadora	TUMACO-NARIÑO	7274562	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1690206032	9440402594	I	2022/10/07	2022/10/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1085310828	PANTOJA BRIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

2022/10/05 10:08 AM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO”

24/09/2022

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS GENERALES 3
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 3
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 4
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 4
5. ACTIVIDADES DEL MES 5
5.1. Actividades por hitos. 6
5.2. Seguimiento al plan de compras 6
5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 6
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 7
5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 7
5.6 Informes semanales 7
5.4. Plan de Calidad 7
5.4.1. Control de inspección y ensayos: 7
5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo: 7
5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo: 8
5.6. Plan ambiental: 8
6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 8
7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES 8
8. CONTROL DE PERSONAL 8
9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 9
10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 10
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 11
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 12

INTRODUCCIÓN

El contrato objeto de la interventoría hace referencia a la CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TALLER EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. El proyecto se compone por 4 bloques (cocina tradicional, taller de joyería, salón de danza y computo, y cocina de emprendimiento), zonas comunes, y la conexión entre los bloques existentes y nuevos en estructura deck.

El tiempo establecido contractualmente para la ejecución de la obra es de cuatro (4) meses, contados a partir de 24 de agosto de 2022 fecha en que se suscribió el acta de inicio.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	24/09/2022	**INFORME No.**	**1**

PERIODO No.	1	**DEL**:	**24/08/2022**	**AL**:	**24/09/2022**

OBJETO DEL CONTRATO:	*"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	*MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO*

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	*3004-2022*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VYNSAP*
PLAZO INICIAL:	*CUATRO (4) MESES*
FECHA DE INICIO:	*24/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*24/12/2022*
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	*CUATRO (4) MESES*
PLAZO TRANSCURRIDO:	*UN (1) MES*

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR INICIAL:	*MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)*
VALOR ADICIONES:	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	*MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)*

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	*3010-2022*
CONTRATISTA:	*ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO*
PLAZO INICIAL:	*CINCO (5) MESES*
FECHA DE INICIO:	*24/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*30 DE DICIEMBRE DE 2022*
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	*CINCO (5) MESES*
PLAZO TRANSCURRIDO:	*UN (1) MES*
VALOR INICIAL:	*CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,*
VALOR ADICIONES:	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	*CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,*

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***	***Comité técnico / fiduciario donde se aprueba***
		N/A	*N/A*	
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*	
	Reinicio No. 1	*N/A*		


NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA			
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS			
ADICIONES	*N/A*	*N/A*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N/A*		

5. ACTIVIDADES DEL MES

Durante el presente mes se desarrollaron las actividades relacionadas con localización, replanteo y cimentación, sin embargo, se han presentado inconvenientes técnicos debido a la falta de definición de los componentes de estructura en deck y el diseño de los tanques de agua. Lo anterior, aun no incide en la programación propuesta por el consorcio que se encuentra a la espera de la subsanación de esta información por parte de la entidad para iniciar con los procesos constructivos relacionados con estas actividades.

Por otro lado, el contratista continúa cotizando el suministro e instalación de acero y madera, actividades que definen la ruta critica de la obra, no obstante, este mes finaliza sin la compra de estos, lo que puede generar posibles retrasos en la ejecución de la obra.

PROGRAMADO VS EJECUTADO

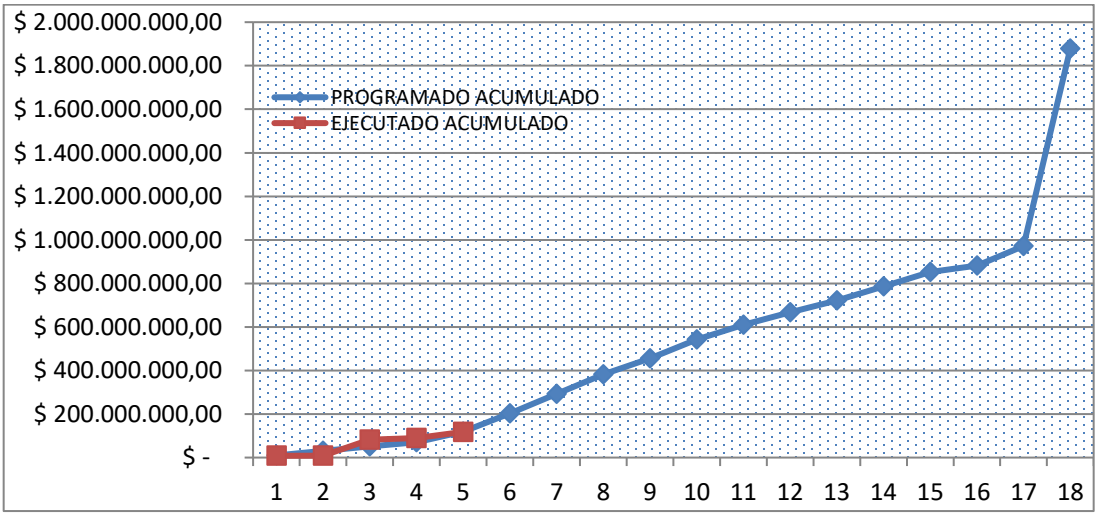

De acuerdo con la gráfica, se evidencia que en el corte hasta la semana 5 el contratista ha ejecutado lo programado inicialmente, contando con variaciones en las semanas anteriores. Es de aclarar que la programación recibida es tentativa debido a la falta de definición de algunos ítems.

5.1. Actividades por hitos.

MINISTERIO DE CULTURA — INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA — Página 6 de 9 — Código: F-GIN-098 — Versión: 4 — Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEMANA 5					
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00	83,12	$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	49,00	$ 2.052.267,00	100%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00	41,5	$ 7.137.792,50	0,48%	373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00	1,17	$ 657.246,33	0,04%	1,56	$ 876.328,44	77%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%	1,37	$ 511.712,81	31%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00	2,89	$ 1.551.360,67	0,10%	2,89	$ 1.551.360,67	18%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00	2228,72	$ 11.007.648,08	0,74%	2228,72	$ 11.007.648,08	76%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00	532,16	$ 2.628.338,24	0,18%	532,16	$ 2.628.338,24	29%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ 22.982.385,82**	**1,54%**		**$ 82.867.787,74**	
		COSTOS DIRECTOS		**%**	**$ 1.491.530.637,00**		**$ 22.982.385,82**	**1,54%**		**$ 89.933.366,22**	
		ADMINISTRACION		19,00%	$ 283.390.821,00		$ 4.366.653,31			$ 17.087.339,58	
		IMPREVISTOS		1,00%	$ 14.915.306,00		$ 229.823,86			$ 899.333,66	
		UTILIDAD		5,00%	$ 74.576.532,00		$ 1.149.119,29			$ 4.496.668,31	
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 14.169.541,00		$ 218.332,67			$ 854.366,98	
							$ 5.963.929,12			**$ 23.337.708,53**	
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 387.052.200**		**$ 28.946.314,94**			**$ 113.271.074,75**	
		TOTAL			**$ 1.878.582.837**		**$ 28.946.314,94**			**$ 113.271.074,75**	

Teniendo en cuenta el anterior cuadro, 5.1 Actividades por Hitos en donde se relacionan las cantidades ejecutadas hasta la semana 5, la interventoría evidencia que el valor ejecutado corresponde a $ 113.271.075 M/CTE, correspondientes a las actividades de preliminares y de cimentación, quedando pendiente por desarrollar los ítems (2.7- 2.9- 2.10).

5.2. Seguimiento al plan de compras

Desafortunadamente, no se ha podido cumplir a cabalidad el plan de compras, debido a la falta de definición en este periodo de los elementos metálicos que conforman la estructura de los bloques, ya que no ha sido posible conseguir algunas IPE en el mercado.

En cuanto a los componentes en madera de las fachadas, de la misma forma se han realizado cotizaciones por parte del contratista para cumplir con los requerimientos técnicos contratados.

5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Aunque el contratista cumplió con el envió de los documentos requeridos para el desarrollo del proyecto el cronograma presentado inicialmente, de acuerdo con la solicitud de la interventoría, es un referente ya que no se ha podido elaborar una programación definitiva teniendo en cuenta que el proyecto se inicia sin tener definidas actividades establecidas como ruta critica en el avance de la obra.

Lo anterior teniendo en cuenta que aun falta definir los diseños del tanque y la cimentación para la estructura del piso propuesto en Deck.

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Teniendo en cuenta la forma de pago del contrato a la fecha, de acuerdo con el avance reportado en este informe la interventoría inicia la gestión para el pago del primer corte de obra correspondiente a $113.271.076 M/CTE

5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De la misma manera que en el contrato de obra se radica el primer corte de obra de interventoría correspondiente al 6.28% determinado por el avance de la obra en este primer mes, el cual equivale $6.797.343 M/CTE.

5.6 Informes semanales

Se reportaron los siguientes informes semanales:

INFORMES SEMANALES	
No.	PERIODO
01	24 al 28 de agosto de 2022
02	29 de agosto al 04 de septiembre de 2022
03	05 al 11 de septiembre 2022
04	12 al 18 de septiembre de 2022
05	19 al 25 de septiembre de 2022

Se anexan los cinco informes semanales relacionados, completando 33 días de avance desde la firma del acta de inicio.

5.4. Plan de Calidad

Con respecto a este plan la interventoría ha hecho las respectivas verificaciones y aprobación de los materiales que se han utilizado hasta el momento, los cuales hacen referencia a cemento, material de cantera, madera y los aceros de refuerzo para los pilotes, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de los mismos.

5.4.1. Control de inspección y ensayos:

Con relación a las actividades hasta el momento desarrolladas, la interventoría solicita al contratista la toma de muestras de los concretos utilizados para la fabricación de pilotes y se encuentra a la espera de los resultados correspondientes a la resistencia de los concretos.

5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo:

Durante el presente mes, se utilizo en obra equipos de topografía para el levantamiento requerido y los equipos necesarios para la fundición del concreto para los pilotes. *(mezcladora, pulidora, taladro percutor y herramienta menor)*

5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

Este plan se encuentra revisado por el profesional de interventoría y se anexa el informe. .*(ver anexo)*

5.6. Plan ambiental:

La interventoría hace las respectivas verificaciones y observaciones en los informes semanales de acuerdo con el plan entregado inicialmente por el contratista.

6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Por encontrarse el sitio de la obra, dentro de la Escuela Taller, no se requiere la solicitud de ningún tipo de licencia para el desarrollo de la obra.

7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

En este primer mes no se han generado ni mayores cantidades, ni ítems no previstos, por lo cual no hay reporte hasta el momento en este sentido.

8. CONTROL DE PERSONAL

Se deja constancia de las hojas de vida aprobadas, teniendo en cuenta con lo establecido en los términos de referencia y/o documentos contractuales que soportan la contratación, las cuales se relacionan a continuación:

RELACION PERSONAL EN OBRA

	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Novedades Fecha de Afiliación	Retiro
	1.085.273.318	**CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO**	**POSITIVA**	**SANITAS**	**COLPENSIONES**	**RESIDENTE SST**	**1/09/2022**	
	87.945.740	**LUIS CARLOS OBANDO ROA**	**POSITIVA**	**NUEVA EPS**	**PORVENIR**	**RESIDENTE DE OBRA**	**1/09/2022**	
1	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO	1/09/2022	
2	87.940.844	HADER DITO ORTIZ RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	6/09/2022
3	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
4	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
5	1.087.197.263	NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	POSITIVA	EMSSANAR S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
6	1.193.034.536	MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	POSITIVA	ASMET SALUD EPS S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
7	1.004.616.384	BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	
8	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	7/09/2022	
9	1.004.574.705	ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	12/09/2022	
10	1.087.187.627	LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	20/09/2022	
11	1.087.112.705	HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	
12	1.087.794.597	KEVIN ANGULO FERRIN	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	

PERSONAL SUBCONTRATISTA - PILOTES

	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Novedades Fecha de Afiliación
1	1.087.117.765	ELIECER JAVIER ARBOLEDA QUIÑONEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
2	1.004.619.230	RICHARD FERNANDO RODRIGUEZ CASTILLO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
3	12.976.281	HILARIO RAMIREZ PERALTA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
4	12.795.392	FLABIO MARQUINES PALACIOS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
5	1.089.003.825	LUIS HERNANDO MONTAÑO AGUIRRE	POSITIVA	ASMETSALJUD	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
6	87.947.933	CRUZ MARIA ANGULO CORTES	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
7	1.085.315.060	PITER ANDRES SEGURA	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
8	13.014.311	ALFONSO MARQUINEZ PALACIOS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
9	1.087.108.450	BRAYAN ALEXANDER MARQUINES ROSERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
10	1.193.244.701	OSCAR ADRIAN PADILLA MARQUINEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
11	1.004.608.525	JOSE LEONARDO QUINTERO CAICEDO	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE DE CONTACTO	DIRECCIÓN OFICINA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Juan Carlos Rodríguez	CRA 47ª No.95-56	25%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Abraham Yela García	CRA 47ª No.95-56	100%
PROFESIONAL HSQ	Brian David Pantoja	CRA 47ª No.95-56	100%

9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Observaciones
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	24/08/2022-24/04/2023	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/08/2022-25/12/2025	$ 93.929.141.85	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 4 AÑOS, 4 MESES Y 2 DIAS	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Observaciones
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	25/07/2022-30/06/2023	$ 21.647.587,60	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022-30/12/2025	$ 5.411.896,90	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2022-30/12/2027	$ 21.647.587,60	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	24/08/2022-30/07/2023	$ 21.647.587,60	07/09/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/082022-29/01/2026	$ 5.411.896,90	07/09/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2023-29/01/2028	$ 21.647.587,60	07/09/2022	

10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
FECHA Y No ACTA	**TEMA**	**COMPROMISOS**
No 01 **2/09/2022**	1. Avance de obra y situación actual del proceso	• Definir cerramiento. • Remisión documentación pendiente previa al acta de inicio • Remisión documentos por parte del ministerio al contratista
No. 02 **09/09/2022**	2. Seguimiento de las actividades ejecutadas hasta el momento	• Envió de planimetría pendiente al contratista • Remitir diseño de estructura del deck al contratista • envía división catálogo de colores para divisiones de baños, documentación contractual pendiente • Instalación de valla informativa • Envió por parte de la interventoría del registro fotográfico a la fecha
No. 03 **16/09/2022**	3. Presentar situación actual del avance	• Remitir al consorcio el diseño ajustado de la estructura de sustentación del piso en deck • Entrega de documentación completa a la interventoría
No. 04 **23/09/2022**	4. Avance de la obra durante la semana	• Suscribir y enviar acta de comité No. 3 • Definir y realizar visita proveedor de madera • Envió registro fotográfico de valla informativa • Envió carta de comisiones a la supervisión
No. 05 **03/10/2022**	5. Situación general de la ejecución de la obra	• Envió de documentos subsanados para corte de obra 1 • Remitir resultados de ensayos de resistencia relacionados con los concretos.

Se anexan copia de actas de comités llevados a cabo en este periodo.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el seguimiento fotografico de las primeras actividades realizadas en la obra, relacionadas con los preliminares y cimentacion.



12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que, a partir del 24 de agosto, fecha que se suscribió el acta de inicio con algunos inconvenientes de orden técnico, el contratista inicia las actividades relacionadas con preliminares y cimentación.

A pesar que durante este primer mes se han venido avanzando aun no se ha podido definir el alcance real del contrato, por cuanto han existido falencia en los planos entregados por el ministerio, que no se han podido solucionar de manera efectiva hasta el momento.

Por lo tanto, la interventoría ha venido haciendo el requerimiento al ministerio en este sentido, para evitar que en algún momento estas falencias incidan en el normal desarrollo de los trabajos y una posible demora en la entrega de la obra.

En cuanto a las obligaciones contractuales del Consorcio Vynsap, de la misma manera se ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de ajusta los procesos sobre todo en lo referente a la consecución de materiales y la agilización de la compra de los mismos, dado que lo que tiene que ver con la estructura metaliza y la madera determina la ruta critica efectiva del proyecto, y hasta el momento no se ha podido evidenciar el cumplimiento de dichas observaciones.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior la interventoría viene realizando seguimiento al avance de la obra, sin embargo, al no definirse el alcance, no ha sido posible determinar una programación real que permita reportar el avance de ejecución vs lo programado desde un principio por el contratista.



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR ASIGNADO

ANEXOS:
Informes semanales de interventoría
Bitácoras

DOCUMENTO:	INFORME DE GESTIÓN SST
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE CULTURA
CONTRATISTA:	ENRIQUE ALFONSO TOVAR
CONTRATO DE OBRA N°:	3004 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO",
PERIODO INFORME:	24/AGO/2022 – 24/SEP/2022
RESPONSABLE DEL INFORME INTERVENTORIA SST OBRA	BRIAM PANTOJA

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3

2. OBJETIVO GENERAL..... ¡Error! Marcador no definido.

2.1 Objetivos espesificos ..... ¡Error! Marcador no definido.

3. GENERALIDADES DEL Contrato ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.1 Contrato: 3004 2022 ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.2 Descripción del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.

3.3 Localización del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.

3.4 Estructura organizacional de la obra..... ¡Error! Marcador no definido.

3.5 Politica SST y reglamento de higiene y seguridad industrial .....¡Error! Marcador no definido.

4. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL...¡Error! Marcador no definido.

5. Ingreso del personal ..... ¡Error! Marcador no definido.

6 Retiro del personal..... ¡Error! Marcador no definido.

7. INDICADORES DE GESTIÓN ..... ¡Error! Marcador no definido.

8. PROGRAMA DE INSPECCIONES 9

9. ANEXO ..... ¡Error! Marcador no definido.

10. CONCLUSIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCION

La empresa “CONSORCIO VYNSAP” en cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y la normatividad vigente, ha estructurado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST), a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Para su efecto, “CONSORCIO VYNSAP”, aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico por etapas cuyo principio se basa en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) Y que incluye una política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora.

Este informe describe las actividades realizadas durante el periodo del 24 agosto hasta el 24 de septiembre de 2022 en cumplimiento con los parámetros establecido y la normativa vigente.

2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades desarrolladas dentro del mecanismo de seguridad y salud en el trabajo respecto al desarrollo, verificación y seguimiento correspondiente del proceso desarrollado por el CONSORCIO VYNSAP, atendiendo las actividades establecidas dentro del SG-SST.

2.1 Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0312 de 2019 y lo correspondientes que apliquen dentro de lo establecido en el contrato 3004 de 2022

- Describir las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato 3004 de 2022 adelantadas durante el periodo comprendido 24 agosto hasta el 24 de septiembre de 2021

- Presentar documentación del personal, equipo y maquinaria que desarrolla actividades para el cumplimiento del contrato.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 Contrato:3004 de 2022

CONTRATO No 3004 DE 2022	
Objeto	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO
Contratista	*Consorcio VYNSAP NIT 901.608.766-2*
Representante legal	*HERLEY RINCON*
Dirección	Aeropuerto – Barrio la Florida
Estado actual	*Vigente*
Estado iniciación	*Agosto 24 de 2022*
Estado de terminación	*Diciembre 29 de 2022*

3.2 Descripción del proyecto

El proyecto de la ampliación de la Escuela Taller de San Andrés de Tumaco contempla una disposición espacial de 4 módulos de 1 piso. La nueva intervención atiende la ampliación de 3 módulos más de 1 piso conservando la fachada estética de los módulos existentes.

La Escuela Taller de San Andrés de Tumaco cuenta con módulos de 1 piso con áreas de formación en cocina y restaurante, orfebrería y danza. A treves del proceso de formación los cursos técnicos de construcción han aportado en la realización de la sede.

3.3 localización del proyecto




tomado de Google Maps

Datos del distrito especial San Andrés de Tumaco

- Departamento: Nariño
- Superficie: 3760 km 2
- Altitud promedio: 2 mts
- Temperatura: 28°
- Población: habitantes 257052
- Coordenadas: 1°48´24N – 78°45´53”O
- Distancia de la capital del departamento: 1100,7 km
- Gentilicio: Tumaqueño/a

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

3.4 Estructura de la obra

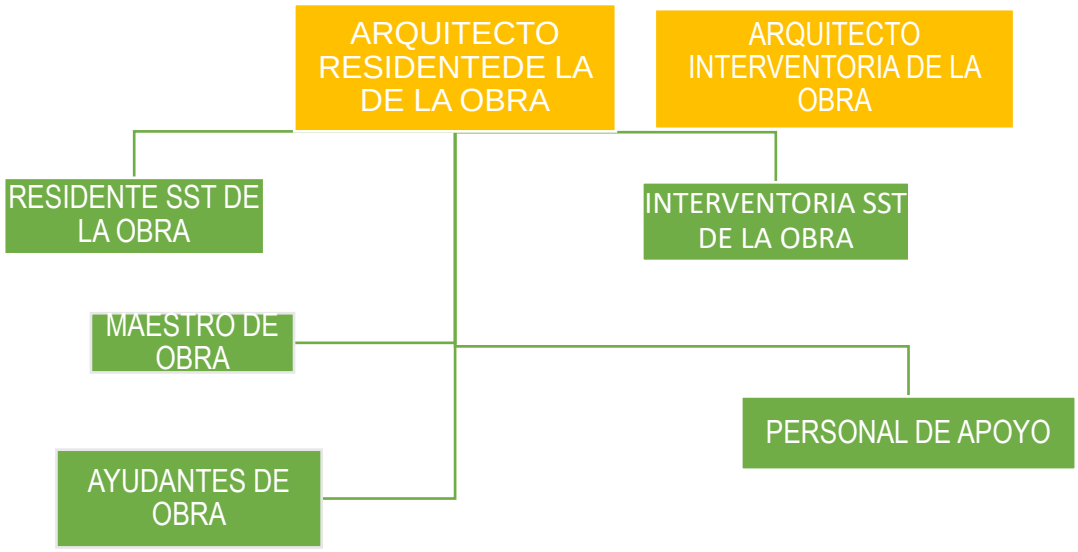

3.5 Política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial.

En este periodo se realizó la divulgación del SG-SST al personal en obra. Realizando la inducción al personal donde se divulgó la política integral y los lineamientos del SG-SST al personal.

Observación: la divulgación de la política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial se encuentra en la inducción del personal.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	


se realizaron las capacitaciones para todo el personal en obra, se dio inicio en el mes de septiembre.

Anexo 1. Registros de inducción.

A la fecha no se ha generado ninguna alteración en el ambiente laboral.

4. AFILICACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Durante este periodo se realizó la verificación de contratación del personal necesario para la realización de las actividades iniciales de esta etapa de ejecución de obra, acorde a la normativa vigente.

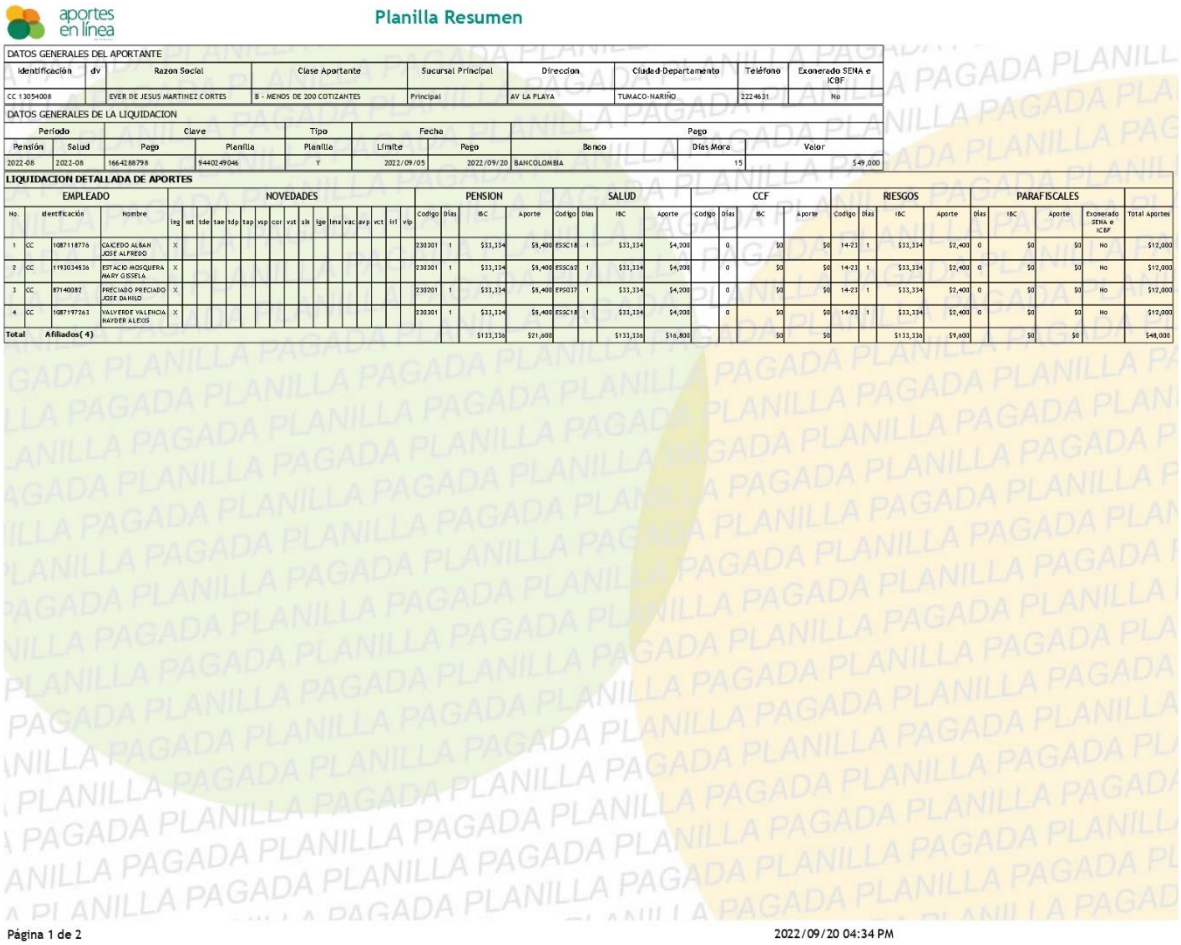

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13054008		EVER DE JESUS MARTINEZ CORTES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	AV LA PLAYA	TUMACO-NARIÑO	2224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1664288798	944024046	Y	2022/09/05	2022/09/20	BANCOLOMBIA	15	$49,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp																					
1	CC	1087118776	CACEDO ALBAN JOSE ALFREDO	X																	230301	1	$33,334	$4,000	ESSC18	1	$33,334	$4,000	0		$0	$0	14-23	1	$33,334	$2,400	0	$0	$0	No	$12,000
2	CC	1193034836	ESTACIO MOSQUERA MARY GISSELA	X																	230301	1	$33,334	$4,000	ESSC62	1	$33,334	$4,000	0		$0	$0	14-23	1	$33,334	$2,400	0	$0	$0	No	$12,000
3	CC	87140082	PRECIADO PRECIADO JOSE DANILO	X																	230201	1	$33,334	$4,000	EPS037	1	$33,334	$4,000	0		$0	$0	14-23	1	$33,334	$2,400	0	$0	$0	No	$12,000
4	CC	1087197263	VALVERDE VALENCIA NAYDER ALEXIS	X																	230301	1	$33,334	$4,000	ESSC18	1	$33,334	$4,000	0		$0	$0	14-23	1	$33,334	$2,400	0	$0	$0	No	$12,000
Total	Afiliados(4)																					$133,336	$16,000			$133,336	$16,000			$0	$0			$133,336	$9,600		$0	$0		$48,000

Página 1 de 2 2022/09/20 04:34 PM

Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

5. INGRESO DEL PERSONAL

A continuación, se presenta la relación del personal que ingresó en este periodo y se registra la información pertinente

	RELACION PERSONAL EN OBRA						Novedades	
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Fecha de Afiliación	Retiro
	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST	1/09/2022	
	87.945.740	LUIS CARLOS OBANDO ROA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA	1/09/2022	
1	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO	1/09/2022	
2	87.940.844	HADER DITO ORTIZ RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	6/09/2022
3	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
4	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
5	1.087.197.263	NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	POSITIVA	EMSSANAR S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
6	1.193.034.536	MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	POSITIVA	ASMET SALUD EPS S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
7	1.004.616.384	BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	
8	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	7/09/2022	
9	1.004.574.705	ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	12/09/2022	
10	1.087.187.627	LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	20/09/2022	
11	1.087.112.705	HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	
12	1.087.794.597	KEVIN ANGULO FERRIN	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	

Anexo 3. Ingreso del personal

	PERSONAL SUBCONTRATISTA - PILOTES						Novedades
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Fecha de Afiliación
1	1.087.117.765	ELIECER JAVIER ARBOLEDA QUIÑONEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
2	1.004.619.230	RICHARD FERNANDO RODRIGUEZ CASTILLO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
3	12.976.281	HILARIO RAMIREZ PERALTA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
4	12.795.392	FLABIO MARQUINES PALACIOS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
5	1.089.003.825	LUIS HERNANDO MONTAÑO AGUIRRE	POSITIVA	ASMETSALJUD	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
6	87.947.933	CRUZ MARIA ANGULO CORTES	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
7	1.085.315.060	PITER ANDRES SEGURA	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
8	13.014.311	ALFONSO MARQUINEZ PALACIOS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
9	1.087.108.450	BRAYAN ALEXANDER MARQUINES ROSERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
10	1.193.244.701	OSCAR ADRIAN PADILLA MARQUINEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022
11	1.004.608.525	JOSE LEONARDO QUINTERO CAICEDO	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE CONSTRUCCION	22/09/2022

Anexo 4. Personal para puesta de pilotes

6. RETIRO DEL PERSONAL

Durante este periodo del informe se realizó el retiro de (1) trabajador, el señor Hader Dito Ortiz Rodríguez ayudante de obra.

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

A continuación, se encuentra subrayado en rojo.

	RELACION PERSONAL EN OBRA						Novedades	
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Fecha de Afiliación	Retiro
	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST	1/09/2022	
	87.945.740	LUIS CARLOS OBANDO ROA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA	1/09/2022	
1	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO	1/09/2022	
2	87.940.844	HADER DITO ORTIZ RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	6/09/2022
3	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
4	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
5	1.087.197.263	NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	POSITIVA	EMSSANAR S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
6	1.193.034.536	MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	POSITIVA	ASMET SALUD EPS S.A.S.	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	
7	1.004.616.384	BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	1/09/2022	
8	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	7/09/2022	
9	1.004.574.705	ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	12/09/2022	
10	1.087.187.627	LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	20/09/2022	
11	1.087.112.705	HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	
12	1.087.794.597	KEVIN ANGULO FERRIN	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	21/09/2022	

Anexo 5. Retiro del personal.

7. INDICADORES DE GESTIÓN

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de agosto al 24 de septiembre **No** se presentaron ausentismo por enfermedad laboral.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de agosto al 24 de septiembre **No** se presentaron Accidentes laborales.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de agosto al 24 de septiembre **No** se presentaron incidentes laborales.

CONSORCIO VYNSAP	CONSORCIO VINSAP NIT. 901608766 -2	VERSION 1
	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:30/08/2022
	25. CONSOLIDADO INDICADORES – EC	AÑO: 2022

INDICADOR	FORMULACION	SEGUIMIENTO												
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								TOTAL
No. DE CASOS REPORTADOS COMO ENFERMEDAD COMUN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No. DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD COMUN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TASA DE ENFERMEDAD COMUN (P.P.G.E.L.)	TEC= No. EC / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
INDICE DE FRECUENCIA DE EC	IF EC= (No. TOTAL DE EC EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE SEVERIDAD DE EC	IS EC = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN EC AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR EC	ILI EC= IF EC * IS EC/1000	0,00												

Página 1

CONSORCIO VYNSAP	CONSORCIO VINSAP NIT. 901608766 -2	SST -FR
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
	8. CONSOLIDADO DE INDICADORES – AT	FECHA: 30/08/2022

INDICADOR	FORMULACION	SEGUIMIENTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
No. DE ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No. DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TASA DE ACCIDENTALIDAD	TA= No. AT / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	IF AT= (No. TOTAL DE AT EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO	IS AT = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN AT AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR AT	ILI AT= IF AT * IS AT/1000	0,00												
LETALIDAD AT	L AT= No. AT MORTALES / No. AT AÑO*100	#¡DIV/0!												

Página 1

Anexo 6. Indicadores de gestión

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

8. PROGRAMA DE INSPECCION

En este periodo se realizaron las correspondientes inspecciones de: locativas, preoperacional de maquinaria y equipos, equipos de emergencia y elementos de protección personal establecidos dentro del programa de inspecciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Inspección de obra (señalización)	Acopio de material

	
Uso correcto de los EPP	Manejo de herramientas eléctricas (pulidora, cierra circular)

Anexo 7. Registro de inspecciones

9. ANEXOS

Anexo 1. Inducción

Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social

Anexo 3. Ingreso del personal

Anexo 4. Ingreso del personal puesta de pilotes

Anexo 5. Retiro del personal

Anexo 6. Indicadores de gestión

Anexo 7. Registro de inspecciones

10. CONCLUSIONES

Todo el personal cuenta con afiliaciones de seguridad social.

Todo el personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)

Se realizan registro de asistencia y se tiene desarrollando las actividades de seguridad industrial y de higiene, de la misma forma se evidencio la accidentalidad llegando al cumplimiento de cero lo que indica los controles de implementados en el SST.

Durante este periodo no se presentaron ausentismo por accidentes o enfermedad laborales.

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 1 — 24/08/2022 — 28/08/2022		
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**		
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3. Descripción Obras ejecutadas

EN LA SEMANA 1 COMPRENDIDA ENTRE EL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022, SE REALIZARON OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA PILOTES, FUNDICION DE LOS MISMOS, DEL BLOQUE COCINA RESTAURANTES, DESCAPOTE DE TERRENO, IGUALMENTE LOCALIZACION Y REPLANTEO, POR PARTE DE LA ESCUELA TALLER SE REALIZA EL CORTE DE DOS ARBOLES QUE SE ENCONTRABAN EN LAS AREAS DE INTERVENCION.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	5	**4%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 9.762.565,0**	**0,52%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 8.203.224,1**	**0,44%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 1.559.340,94**	**0,08%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	1
	HERREROS	2
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**15**


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,44%	0,44%
2	1,10%	1,62%		
3	1,09%	2,71%		
4	1,07%	3,78%		
5	2,56%	6,34%		
6	4,42%	10,76%		
7	4,81%	15,57%		
8	7,75%	23,32%		
9	3,92%	27,24%		
10	4,66%	31,90%		
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 8.203.224	$ 8.203.224,06
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00		
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00		
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00		
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00		
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00		
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00		
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00		
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00		
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00		
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

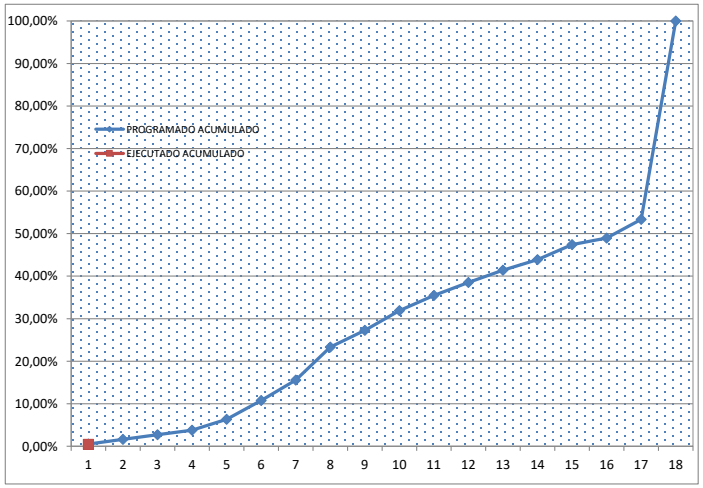

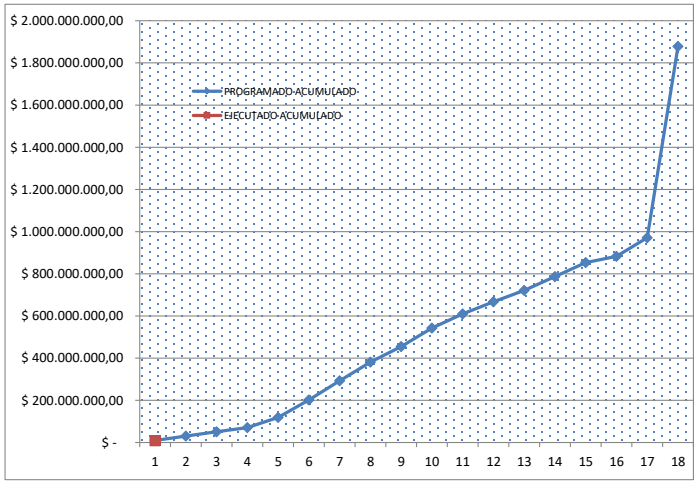

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	24/08/2022	28/08/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



durante la presente semana se inicio con el corte de madera para la fabricacion de las formalestas de los pilotes



Se comienzan a amarrar los hierros de acuerdo con las especificaciones tecnicas para las zapatas y los pedestales

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Se comienza a llevar a cabo la disposicion de los escombros de concreto de las estructuras que requirieron ser demolidas inicialmente. **Nota:** esta actividad fue realizada por el personal de la escuela taller.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No aplica para esta semana

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

No aplica

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en el aljibe para el uso adecuado en las diferentes actividades que se presentan en la obra.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



Debido a la necesidad de terminar los espacios en donde se van a llevar a cabo las diferentes activbidades, fue necesario, por intermedio de la escuela, solicitar la tala de dos arboles que se encontraban precisamente en las areas a intervenir.
NOTA: Esta actividad genera un impacto negativo ya que es una práctica que agota nuestra biodiversidad, como la perdida de hábitat de diferentes especies de animales. Sin embargo, desafortunandamente esta intervencion fue necesaria realizarla por medio del personal de la escuela taller.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	24/08/2022	28/08/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

	SI	NO
La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO, AGREGADOS, MADERA

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

	SI	NO
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____	x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, SIERRA CIRCULAR

3. ENSAYOS

	SI	NO
La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____		

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Aun este tipo de verificacion no se lleva acabo, teniendo en cuenta que las actividades realizadas hasta el momento no requieren ningun tipo de analisis o ensayos tecnicos.

























MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	24 DE AGOSTO HASTA 28 DE AGOSTO	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	1	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEMANA 1					
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00	393,12	$ 4.386.039,84	0,29%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00	320	$ 2.127.040,00	0,14%	320,00	$ 2.127.040,00	79,38%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 6.513.079,84**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -	0,00%		$ -	0%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553.00			0,00%			
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514.00			0,00%			
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA										
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488.00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617.00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canoeras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 5: MUROS										
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera s=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lamina fenolica (incluye instalación) h=1.50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 6: PISOS										
6.1	Sobrepiso en concreto y sellador	M2	235,12	$ 86.639,00	$ 20.370.562,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 20.370.562,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 7: REDES HRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCION										
7.1	Redes hidrosanitarias para aguas lluvias, en tuberia PVC.	GL	1,00	$ 14.549.857,00	$ 14.549.857,00		$ -	0,00%		$ -	0%
7.2	Redes eléctricas y de iluminación internas y externas	GL	1,00	$ 146.514.022,00	$ 146.514.022,00		$ -	0,00%		$ -	0%
7.3	Redes de gas, incluye bodega para almacenamiento de cilindros	GL	1,00	$ 8.803.082,00	$ 8.803.082,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 169.866.961,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 8: ZONAS COMUNES										
8.1	Iluminacion general, incluye poste en tuberia galvanizada. Lamparas antimosquitos y lamparas LED 70W	GL	1,00	$ 772.824,00	$ 772.824,00		$ -	0,00%		$ -	0%
8.2	Arborizacion, con plantas y arboles autoctonos de la region	GL	1,00	$ 16.897.250,00	$ 16.897.250,00		$ -	0,00%		$ -	0%
8.3	Construccion sistema de proteccion antibasuras, area del manglar, incluye recoleccion, desalojo y disposicion final de desechos	ML	200,00	$ 215.583,00	$ 43.116.600,00			0,00%			
8.4	Sistema de evacuacion y contraincendios	GL	1,00	$ 93.932.073,00	$ 93.932.073.00		$ -	0,00%		$ -	0%
8.5	Sistema de almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, incluye base en concreto reforzado y suministro 6 tanques de 2000 lts.	GL	1,00	$ 123.434.195,00	$ 123.434.195,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 278.152.942,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 9: SISTEMA PISO DECK										
9.1	Localizacion y replanteo	M2	763,00	$ 10.816,00	$ 8.252.608.00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavacion, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros)	ML	127,00	$ 165.163,00	$ 20.975.701,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.3	Demolicion cabeza de pilotes	M3	0,65	$ 561.754,00	$ 365.140,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.4	Concreto de limpieza (2000psi) e=0,10m	M3	3,75	$ 370.781,00	$ 1.390.429.00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	19,81	$ 536.805,00	$ 10.634.107,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.830,00	$ 14.150.934,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.7	Columna WPC 0.30m X 0.30	ML	108,80	$ 324.200,00	$ 35.272.960,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.8	Viga WPC 0.05 x 0.15	ML	185,00	$ 213.073,00	$ 39.418.505,00		$ -	0,00%		$ -	0%
9.9	Vigueta WPC 0.02 x 0.13	ML	555,00	$ 162.304,00	$ 90.078.720,00			0,00%		$ -	0%
9.10	Listón para piso WPC 0.03x 0.15	M2	763,00	$ 173.911,00	$ 132.694.093,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 353.233.197,00**		**$ -**			**$ -**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**		**$ 1.491.530.637,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 6.513.079,84**	**0,00%**
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 283.390.821,00		$ 1.237.485,17			$ 1.237.485,17	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.915.306,00		$ 65.130,80			$ 65.130,80	
	UTILIDAD		5,00%		$ 74.576.532,00		$ 325.653,99			$ 325.653,99	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 14.169.541,08		$ 61.874,26			$ 61.874,26	
							$ 1.690.144,22			**$ 1.690.144,22**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 387.052.200**		**$ 8.203.224,06**			**$ 8.203.224,06**	
	TOTAL				**$ 1.878.582.837**		**$ 8.203.224,06**			**$ 8.203.224,06**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**1**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	24/08/2022	**Y EL**	28/08/2022	**PLAZO:**	5 DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE																								4	4	4	4					
MAESTRO DE OBRA																								1	1	1	1					
OFICIAL																								1	1	1	1					
AYUDANTE																								2	2	4	5					
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**10**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **37**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	1 1 1 1	4	10,81%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	3 3 3 3	12	32,43%	
De fuera de la región	1 1 1 1	4	10,81%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región	2 2 2 2	8	21,62%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

En esta primera semana el contratista cumple con la contratacion de personal no calificado de la region, como con los profesionales requeridos contractualmente
La interventiria realiza la respectiva verificacion de la afiliacion de todo el personal contratado al sistema de seguridad social de ley.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRAS	%
LUIS CARLOS OBANDO	RESIDENTE DE OBRAS	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
HADER DITO ORTIZ RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**

FECHA:	Semana: 2 — 29/08/2022 — 4/09/2022		
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**		
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA PILOTES, OTRA CUADRILLA PROSIGUE CON LA FUNDICION DE LOS MISMO EN EL BLOQUE DE COCINA Y RESTAURANTE, SE TERMINA EL DESCAPOTE, LA LOCALIZACION Y REPLANTEO.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	12	**10%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 30.467.733,0**	**1,62%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 9.210.780,1**	**0,49%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 30.467.733,00**	**1,13%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	4
	OFICIALES	2
	HERREROS	2
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**15**


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,44%	0,44%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,49%
3	1,09%	2,71%		
4	1,07%	3,78%		
5	2,56%	6,34%		
6	4,42%	10,76%		
7	4,81%	15,57%		
8	7,75%	23,32%		
9	3,92%	27,24%		
10	4,66%	31,90%		
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 8.203.224	$ 8.203.224,06
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556	$ 9.210.780,06
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00		
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00		
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00		
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00		
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00		
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00		
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00		
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00		
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

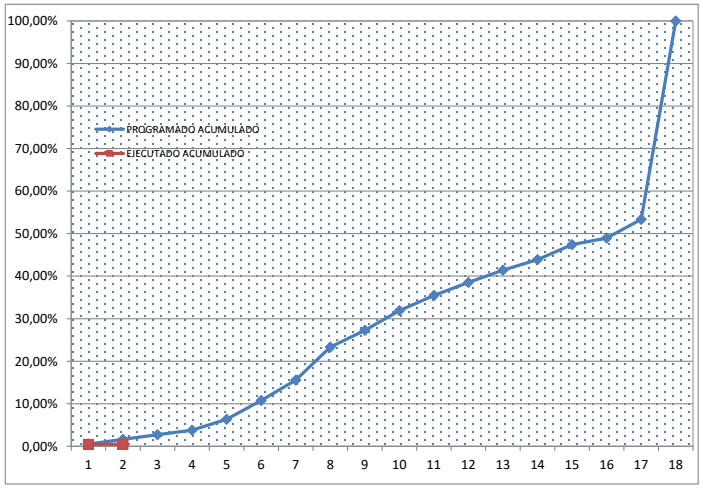

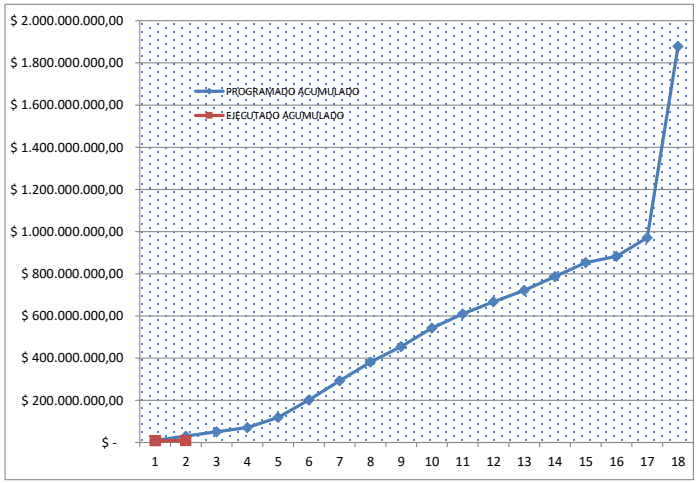

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	2	
Perido de Informe:	29/08/2022	4/09/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS





2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA





3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No aplica para esta semana

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

No aplica

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en el aljibe para el uso adecuado en las diferentes actividades que se presentan en la obra.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:





<E de

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	2	
Perido de Informe:	29/08/2022	4/09/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, SIERRA CIRCULAR

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

En esta semana se realizaron actividades relacionadas con la fundida de los primeros pilotes de contrecto, La interventoria solicita al contratista sacar las respectivas muestras del concreto para su posterior analisis en laboratorio, con el fin de verificar la resistencia de acuerdo con los resquerimientos establecidos en el contrato.























MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	29 DE AGOSTO HASTA 04 DE SEPTIEMBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	2	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES						SEMANA 1			SEMANA 2				
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00	393,12	$ 4.386.039,84	0,29%				393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00	320	$ 2.127.040,00	0,14%				320	$ 2.127.040,00	79,38%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 6.513.079,84**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION													
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	19,1	$ 799.965,30	0,05%	19,10	$ 799.965,30	39%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0,10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 799.965,30**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS													
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00			0,00%			0,00%			
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00			0,00%			0,00%			
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00			0,00%			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA													
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canoeras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 5: MUROS													
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera s=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lamina fenolica (incluye instalación) h=1,50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 6: PISOS													
6.1	Sobrepiso en concreto y sellador	M2	235,12	$ 86.639,00	$ 20.370.562,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 20.370.562,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 7: REDES HRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCION													
7.1	Redes hidrosanitarias para aguas lluvias, en tuberia PVC.	GL	1,00	$ 14.549.857,00	$ 14.549.857,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.2	Redes eléctricas y de iluminación internas y externas	GL	1,00	$ 146.514.022,00	$ 146.514.022,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.3	Redes de gas, incluye bodega para almancenamiento de cilindros	GL	1,00	$ 8.803.082,00	$ 8.803.082,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 169.866.961,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 8: ZONAS COMUNES													
8.1	Iluminacion general, incluye poste en tuberia galvanizada. Lamparas antimosquitos y lamparas LED 70W	GL	1,00	$ 772.824,00	$ 772.824,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.2	Arborizacion, con plantas y arboles autoctonos de la region	GL	1,00	$ 16.897.250,00	$ 16.897.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.3	Construccion sistema de proteccion antibasuras, area del manglar, incluye recoleccion, desalojo y disposicion final de desechos	ML	200,00	$ 215.583,00	$ 43.116.600,00			0,00%			0,00%			
8.4	Sistema de evacuacion y contraincendios	GL	1,00	$ 93.932.073,00	$ 93.932.073,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.5	Sistema de almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, incluye base en concreto reforzado y suministro 6 tanques de 2000 lts.	GL	1,00	$ 123.434.195,00	$ 123.434.195,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 278.152.942,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 9: SISTEMA PISO DECK													
9.1	Localizacion y replanteo	M2	763,00	$ 10.816,00	$ 8.252.608,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros)	ML	127,00	$ 165.163,00	$ 20.975.701,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.3	Demolicion cabeza de pilotes	M3	0,65	$ 561.754,00	$ 365.140,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.4	Concreto de limpieza (2000psi) e=0,10m	M3	3,75	$ 370.781,00	$ 1.390.429,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	19,81	$ 536.805,00	$ 10.634.107,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.830,00	$ 14.150.934,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.7	Columna WPC 0.30m X 0.30	ML	108,80	$ 324.200,00	$ 35.272.960,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.8	Viga WPC 0.05 x 0.15	ML	185,00	$ 213.073,00	$ 39.418.505,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.9	Vigueta WPC 0.02 x 0.13	ML	555,00	$ 162.304,00	$ 90.078.720,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.10	Listón para piso WPC 0.03x 0.15	M2	763,00	$ 173.911,00	$ 132.694.093,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 353.233.197,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
		COSTOS DIRECTOS		**%**	**$ 1.491.530.637,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 7.313.045,14**	
		ADMINISTRACION		19,00%	$ 283.390.821,00		$ 1.237.485,17			$ 151.993,41			$ 1.389.478,58	
		IMPREVISTOS		1,00%	$ 14.915.306,00		$ 65.130,80			$ 7.999,65			$ 73.130,45	
		UTILIDAD		5,00%	$ 74.576.532,00		$ 325.653,99			$ 39.998,27			$ 365.652,26	
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 14.169.541,00		$ 61.874,26			$ 7.599,67			$ 69.473,93	
							$ 1.690.144,22			**$ 207.591,00**			**$ 1.897.735,21**	
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 387.052.200**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 9.210.780,35**	
		TOTAL			**$ 1.878.582.837**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 9.210.780,00**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BOQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**2**		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	29/08/2022 **Y EL** 4/09/2022 **PLAZO:** 12 dias		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP	**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE	4	4	4																										4	4	4	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1																										1	1	1	
OFICIAL	2	2	2																										2	2	2	
AYUDANTE	4	4	4																										4	4	4	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO** **66**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	3 3 3 3 3 3	18	27,27%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1	6	9,09%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	2 2 2 2 2 2	**12**	**18,18%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES	1 1 1 1 1 1			
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia que la cantidad de trabajadores esta acorde con las actividades que se estan desarrollando

La interventoria realiza la verificacion del cumplimiento de las condiciones contractuales y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con los programas presentados por el contratista.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRAS	%
LUIS CARLOS OBANDO	RESIDENTE DE OBRAS	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	OFICIAL DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	OFICIAL DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 3 — 5/09/2022 — 11/09/2022		
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**		
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA PILOTES, FUNDICION DE LOS MISMOS, SE INICIA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y CON EL HINCADO DE LOS PILOTES EXISTENTES EN OBRA PARA EL EL BLOQUE DE COCINA. ,

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	19	**16%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 50.855.888,0**	**2,71%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 82.056.318,2**	**4,37%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 31.200.430,18**	**-1,66%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	0,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	2
	HERREROS	2
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**16**


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,44%	0,44%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,49%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,37%
4	1,07%	3,78%		
5	2,56%	6,34%		
6	4,42%	10,76%		
7	4,81%	15,57%		
8	7,75%	23,32%		
9	3,92%	27,24%		
10	4,66%	31,90%		
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
	4,37%	53,34%		
	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 8.203.224	$ 8.203.224,06
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556	$ 9.210.780,35
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.845.538	$ 82.056.318,18
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00		
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00		
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00		
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00		
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00		
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00		
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00		
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

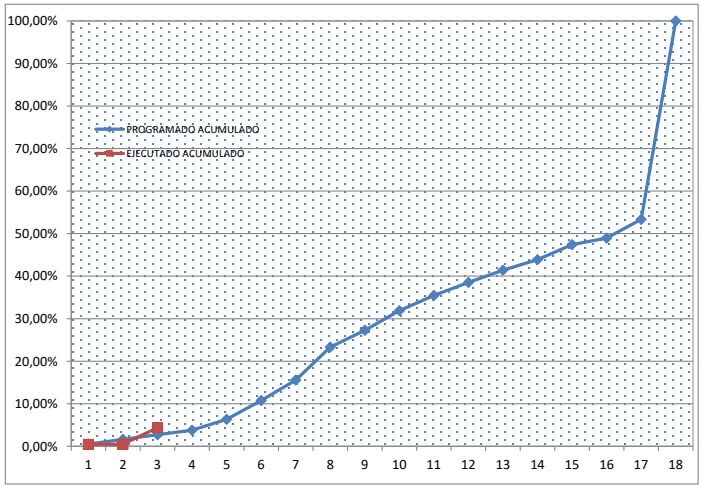

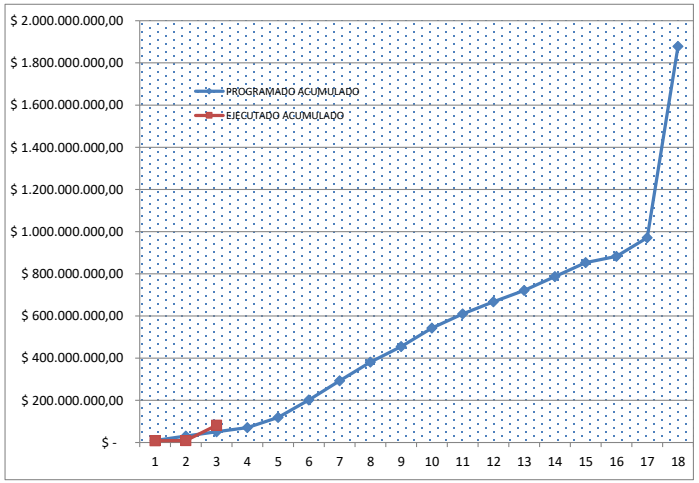

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	3	
Perido de Informe:	5/09/2022	11/09/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



Se continua fabricando formaletas para la fundicion de pilotes



Se inicia con la actividad relacionada con el corte y el figura del hierro, para el armado de las parrillas para las zapatas

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Una vez demolidas las estructuras existentes en las areas de intervnecion, la escuela taller realiza la evacuacion de los escombros generados.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

El contratista tiene el suficiente stock de materiales de cantera y madera para desarrollar las labores que se estan llevando a cabo, las cuales tienen que ver con el capitulo de cimentacion.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

No aplica

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se continua con el bombeo de agua mediante electrobomba en pozo profundo, para la fabricacion del concreto de los pilotes

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



En el periodo que se comprende desde el 05 de septiembre hasta el 10 de septiembre 2022 se realizó la actividad de desalojo de los escombros de tala de arboles.

Nota: Actividad realizada por la escuela taller.

Como impacto positivo se puede resaltar el orden y aseo para continuar con las siguientes actividades de la obra.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	3	
Perido de Informe:	5/09/2022	11/09/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

	SI	NO
La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO, TRITURADO, MADERA

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

	SI	NO
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____	x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA

3. ENSAYOS

	SI	NO
La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____		

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

La interventoria continua a la espera que el contratista envie el resultado de los ensayos de los concretos utilizados en la fundicion de los pilotes.

















MINISTERIO DE CULTURA	**SECRETARIA GENERAL** **MINISTERIO DE CULTURA** **FORMATO DE PRESUPUESTO**

INFORMACION BASICA			
FECHA REC.	**05 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE**	**DEPARTAMENTO**	**NARIÑO**
SEMANA No.	**2**	**OBJETO**	**PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL**
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		**ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES						**SEMANA 1**			**SEMANA 2**			**SEMANA 3**				
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00	393,12	$ 4.386.039,84	0,29%					$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	401,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00	320	$ 2.127.040,00	0,14%					$ -	0,00%	320	$ 2.127.040,00	79,38%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 6.513.079,84**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION																
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	19,1	$ 799.965,30	0,05%		$ -	0,00%	19,10	$ 799.965,30	39%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	332	$ 57.102.340,00	3,83%	332,00	$ 57.102.340,00	80%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,39	$ 219.082,11	0,01%	0,39	$ 219.082,11	10%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0,10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,38	$ 515.447,94	0,03%	1,38	$ 515.447,94	31%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (Incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.372,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.949,00	$ 5.437.472,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 57.836.870,05**	**3,88%**		**$ 58.636.835,35**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS																
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	1912,80	$ 10.791,00	$ 206.377.553,00			0,00%			0,00%			0,00%			
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00			0,00%			0,00%			0,00%			
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.472,00			0,00%			0,00%			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA																
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canceras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 5: MUROS																
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.629.019,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera a=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.471,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywal	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lámina fenólica (incluye instalación) h=1,90 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 6: PISOS																
6.1	Sobrepiso en concreto y alisador	M2	235,12	$ 86.639,00	$ 20.370.562,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 20.370.562,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 7: REDES HIRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCION																
7.1	Redes hidrosanitarias para aguas lluvias, en tuberia PVC.	GL	1,00	$ 14.549.857,00	$ 14.549.857,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.2	Redes eléctricas y de iluminación internas y externas	GL	1,00	$ 146.514.027,00	$ 146.514.027,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.3	Redes de gas, incluye bodega para almacenamiento de cilindros	GL	1,00	$ 8.803.082,00	$ 8.803.082,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 169.866.961,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 8: ZONAS COMUNES																
8.1	Iluminacion general, incluye poste en tuberia galvanizada. Lamparas antimosquitos y lamparas LED 70W	GL	1,00	$ 772.824,00	$ 772.824,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.2	Arborizacion, con plantas y arboles autoctonos de la region	GL	1,00	$ 16.897.250,00	$ 16.897.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.3	Construccion sistema de proteccion antibasuras, area del manglar, incluye recoleccion, desalojo y disposicion final de desechos	ML	200,00	$ 215.983,00	$ 43.116.600,00			0,00%			0,00%			0,00%			
8.4	Sistema de evacuacion y contraincendios	GL	1,00	$ 93.932.073,00	$ 93.932.073,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.5	Sistema de almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, incluye base en concreto reforzado y suministro 6 tanques de 2000 lts.	GL	1,00	$ 123.434.195,00	$ 123.434.195,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 278.152.942,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 9: SISTEMA PISO DECK																
9.1	Localizacion y replanteo	M2	763,00	$ 10.816,00	$ 8.252.608,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros)	ML	127,00	$ 165.163,00	$ 20.975.701,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.3	Demolicion cabeza de pilotes	M3	0,65	$ 561.754,00	$ 365.140,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.4	Concreto de limpieza (2000psi) e=0,10m	M3	3,75	$ 370.781,00	$ 1.390.429,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	19,81	$ 536.805,00	$ 10.634.107,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.830,00	$ 14.150.934,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.7	Columna WPC 0,30m X 0,30	ML	108,80	$ 324.200,00	$ 35.273.960,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.8	Viga WPC 0,05 x 0,15	ML	185,00	$ 213.073,00	$ 39.418.505,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.9	Vigueta WPC 0,02 x 0,13	ML	555,00	$ 162.304,00	$ 90.078.720,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.10	Listón para piso WPC 0,03x 0,15	M2	763,00	$ 173.911,00	$ 132.694.093,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 353.233.197,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**		**$ 1.491.530.637,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 57.836.870,05**	**3,88%**		**$ 65.149.915,19**	
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 283.390.821,00		$ 1.237.485,17			$ 151.993,41			$ 10.989.005,31			$ 12.378.483,89	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.915.306,00		$ 65.130,80			$ 7.999,65			$ 578.368,70			$ 651.499,15	
	UTILIDAD		5,00%		$ 74.576.532,00		$ 325.653,99			$ 39.998,27			$ 2.891.843,50			$ 3.257.495,76	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 14.169.541,00		$ 61.874,26			$ 7.599,67			$ 549.450,27			$ 618.924,19	
							$ 1.690.144,22			**$ 207.591,00**			**$ 15.008.667,78**			**$ 16.906.402,99**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$**	**387.052.200**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 72.845.537,83**			**$ 82.056.318,18**	
	TOTAL			**$**	**1.878.582.837**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 72.845.537,83**			**$ 82.056.318,00**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR VAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**3**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	5/09/2022	**Y EL**	11/09/2022	**PLAZO:**	19 DIAS
CONTRATISTA:	NSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																												OBSERVACIONES
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE																																
MAESTRO DE OBRA																																
OFICIAL																																
AYUDANTE																																
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **0**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**#¡DIV/0!**	
En proceso de reinserción social		0	#¡DIV/0!	
En condición de desplazamiento		0	#¡DIV/0!	
MUJERES		**0**	**#¡DIV/0!**	
Mano de Obra no Calificada		0	#¡DIV/0!	
Mano de Obra Calificada		0	#¡DIV/0!	
Profesionales - Técnicos		0	#¡DIV/0!	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRAS	25%
LUIS CARLOS OBANDO	RESIDENTE DE OBRAS	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	OFICIAL DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	OFICIAL DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 4 — 12/09/2022 — 18/09/2022		
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**		
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3. Descripción Obras ejecutadas

EN LA SEMANA 4 , SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES,

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	26	**22%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 71.003.551,0**	**3,78%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 89.091.348,0**	**4,75%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 18.087.796,99**	**-0,97%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	0,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	7
	OFICIALES	2
	HERREROS	2
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**18**


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,44%	0,44%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,49%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,37%
4	1,07%	3,78%	0,37%	4,75%
5	2,56%	6,34%		
6	4,42%	10,76%		
7	4,81%	15,57%		
8	7,75%	23,32%		
9	3,92%	27,24%		
10	4,66%	31,90%		
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
	4,37%	53,34%		
	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 8.203.224,06	$ 8.203.224,06
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556	$ 9.210.780,36
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.845.538	$ 82.056.318,18
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.035.029,81	$ 89.091.347,99
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00		
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00		
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00		
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00		
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00		
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00		
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

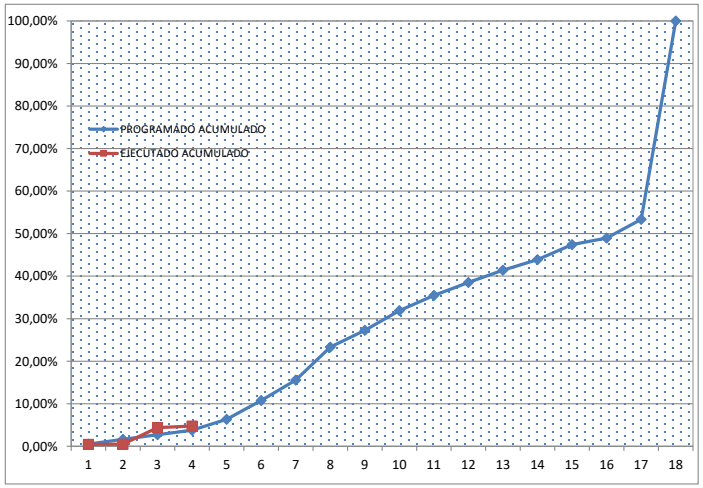

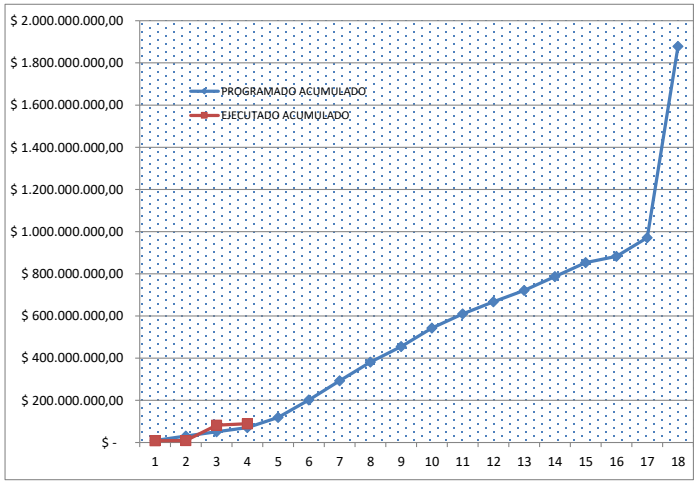

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	4	
Perido de Informe:	12/09/2022	18/09/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS





2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se realizó la adquisición de materiales para relleno, se uso el mismo material de obra.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

No aplica

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en el aljibe para el uso adecuado en las diferentes actividades que se presentan en la obra.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:





ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	4	
Perido de Informe:	12/09/2022	18/09/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

	SI	NO
La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

	SI	NO
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____	x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO

3. ENSAYOS

	SI	NO
La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE CULTURA

FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA

FECHA REG.	**12 DE SEPTIEMBRE HASTA 18 DE SEPTIEMBRE**	**DEPARTAMENTO**	**NARIÑO**
SEMANA No.	**4**	**OBJETO**	**PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL**
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		**ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNET	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
						SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4					
CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES																				
1.1	Localizacion y replanteo	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00	393,12	$ 4.386.039,84	0,00%					$ -	0,00%		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.438,00	320	$ 2.127.040,00	0,14%					$ -	0,00%		$ -	0,00%	320	$ 2.127.040,00	79,38%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 6.513.079,84**	
CAPITULO 2: CIMENTACION																				
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	19,1	$ 799.965,30	0,05%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	19,10	$ 799.965,30	39%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%	332	$ 57.102.340,00	3,83%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	332,00	$ 57.102.340,00	80%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%	0,39	$ 219.082,11	0,01%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,39	$ 219.082,11	19%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%	1,38	$ 515.447,94	0,03%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,38	$ 515.447,94	31%
2.5	Zarja o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premezclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	9,44	$ 1.846.602,32	0,13%	9,44	$ 1.846.602,32	73%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	357,00	$ 1.170.543,00	0,08%	357,00	$ 1.170.543,00	8%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaletaado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	4355,05	$ 2.568.428,17	0,13%	4355,05	$ 2.568.428,17	78%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.976,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 57.836.870,05**	**3,88%**		**$ 5.585.573,49**	**0,37%**		**$ 64.227.466,84**	
CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS																				
3.1	Concreto losa maciza	M3	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	191.20,80	$ 10.791,00	$ 206.332.552,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura de	LT	1255,50	$ 5.494,00	$ 1.230.273,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 4: CUBIERTA																				
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.654.617,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canoneta en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 5: MUROS																				
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,60	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera e=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación impirmante para protección de muros, puertas y ventanas en madera sapan.	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Reil en acero para puerta - ventana plegable (incluye reil superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lamina hirolica (incluye instalación) 2m-1.50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 6: PISOS																				
6.1	Sobrepiso en concreto y sellador	M2	234,12	$ 86.639,00	$ 20.370.562,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 20.370.562,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 7: REDES HRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCION																				
7.1	Redes hidrosanitarias para aguas lluvias, en tuberia PVC.	GL	1,00	$ 14.549.857,00	$ 14.549.857,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.2	Redes eléctricas y de iluminación internas y externas	GL	1,00	$ 140.514.029,00	$ 140.514.029,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.3	Redes de gas, incluye bodega para almacenamiento de cilindros	GL	1,00	$ 8.803.082,00	$ 8.803.082,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 169.866.961,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 8: ZONAS COMUNES																				
8.1	Iluminacion general, incluye poste en tuberia galvanizada. Lamparas antimosquitos y lamparas LED 70W	GL	1,00	$ 772.824,00	$ 772.824,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%				0%
8.2	Arborizacion, con plantas y arboles autoctonos de la region	GL	1,00	$ 16.897.250,00	$ 16.897.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
8.3	Construccion sistema de proteccion antibarusnas, area del manglar, incluye recoleccion, desalojo y disposicion final de desechos	ML	200,00	$ 215.583,00	$ 43.116.600,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
8.4	Sistema de evacuacion y contraincendios	GL	1,00	$ 93.932.073,00	$ 93.932.073,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
8.5	Sistema de almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, incluye base en concreto reforzado y suministro 6 tanques de 2000 lts.	GL	1,00	$ 123.434.195,00	$ 123.434.195,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 278.152.942,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
CAPITULO 9: SISTEMA PISO DECK																				
9.1	Localizacion y replanteo	M2	763,00	$ 10.816,00	$ 8.252.608,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros)	ML	127,00	$ 165.163,00	$ 20.975.701,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.3	Demolicion cabeza de pilotes	M3	0,65	$ 561.754,00	$ 365.140,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.4	Concreto de limpieza (2000psi) e=0,10m	M3	3,25	$ 570.781,00	$ 1.865.479,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.5	Zarja o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premezclado de 3000psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	19,81	$ 536.805,00	$ 10.634.107,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.830,00	$ 14.150.934,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.7	Columna WPC 0,30m X 0,30	ML	198,80	$ 324.200,00	$ 35.272.960,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.8	Viga WPC 0,05 x 0,15	ML	185,00	$ 213.073,00	$ 39.418.505,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.9	Vigueta WPC 0,02 x 0,12	ML	955,00	$ 192.304,00	$ 46.036.720,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
9.10	Cielo raso piso WPC 0,01x 0,10	M2	763,00	$ 173.911,00	$ 132.694.093,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 353.233.197,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**		**$ 1.491.530.637,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 57.836.870,05**	**3,88%**		**$ 5.585.573,49**	**0,37%**		**$ 70.735.488,68**	
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 283.390.821,00		$ 1.237.685,17			$ 151.993,42			$ 10.989.005,31			$ 1.061.258,96			$ 13.439.742,85	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.915.306,00		$ 65.130,80			$ 7.999,65			$ 578.368,70			$ 55.855,74			$ 707.354,89	
	UTILIDAD		5,00%		$ 74.576.532,00		$ 325.653,99			$ 39.998,27			$ 2.891.843,50			$ 279.278,67			$ 3.536.774,43	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 14.169.541,00		$ 61.874,26			$ 7.599,67			$ 549.450,27			$ 53.062,95			$ 671.987,14	
							$ 1.690.344,23			**$ 207.591,00**			**$ 15.008.667,78**			**$ 1.449.456,32**			**$ 18.355.859,31**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$**	**387.052.200**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 72.845.537,83**			**$ 7.035.029,81**			**$ 89.091.347,99**	
	TOTAL			**$**	**1.878.582.837**		**$ 8.203.224,06**			**$ 1.007.556,30**			**$ 72.845.537,83**			**$ 7.035.029,81**			**$ 89.091.348,00**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**4**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	12/09/2022	**Y EL**	18/09/2022	**PLAZO:**	26 DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																													OBSERVACIONES
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE																																
MAESTRO DE OBRA																																
OFICIAL																																
AYUDANTE																																
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **0**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**#¡DIV/0!**	
De la región		0	#¡DIV/0!	
De fuera de la región		0	#¡DIV/0!	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**#¡DIV/0!**	
En proceso de reinserción social		0	#¡DIV/0!	
En condición de desplazamiento		0	#¡DIV/0!	
MUJERES		**0**	**#¡DIV/0!**	
Mano de Obra no Calificada		0	#¡DIV/0!	
Mano de Obra Calificada		0	#¡DIV/0!	
Profesionales - Técnicos		0	#¡DIV/0!	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRAS	%
LUIS CARLOS OBANDO	RESIDENTE DE OBRAS	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	OFICIAL	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	OFICIAL	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 5	19/09/2022	25/09/2022	
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**			
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010	
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES, Y FUNDIDA DE DADOS

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	33	**28%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 71.003.551,0**	**3,78%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 89.086.643,6**	**4,75%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 160.090.194,60**	**-0,97%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	0,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	8
	OFICIALES	2
	HERREROS	2
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**19**


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,44%	0,44%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,49%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,37%
4	1,07%	3,78%	0,37%	4,75%
5	2,56%	6,34%	1,54%	6,29%
6	4,42%	10,76%		
7	4,81%	15,57%		
8	7,75%	23,32%		
9	3,92%	27,24%		
10	4,66%	31,90%		
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
	4,37%	53,34%		
	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 8.203.224,06	$ 8.203.224,06
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556,30	$ 9.210.780,36
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.840.833,43	$ 82.051.613,79
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.035.029,81	$ 89.086.643,60
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00	$ 28.946.314,94	$ 118.032.958,54
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00		
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00		
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00		
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00		
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00		
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

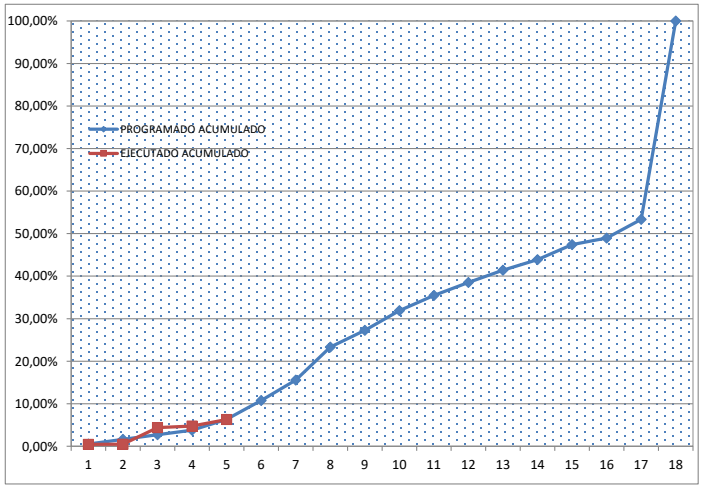

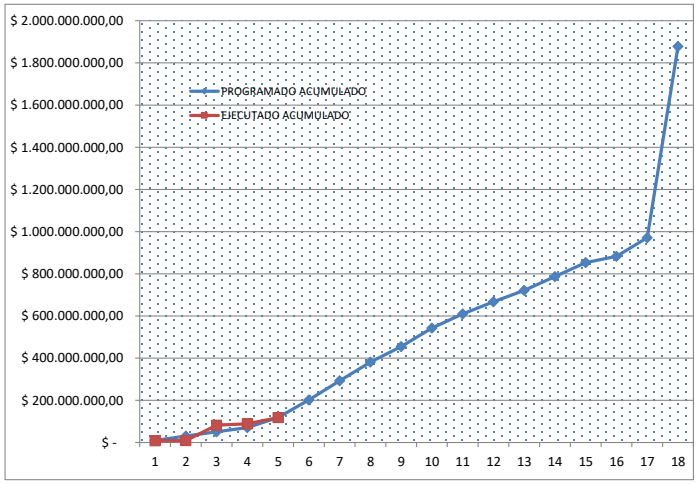

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	5	
Perido de Informe:	19/09/2022	25/09/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS





2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se realizó la adquisición de materiales para relleno, se uso el mismo material de obra.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

No aplica

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en el aljibe para el uso adecuado en las diferentes actividades que se presentan en la obra.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:





ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	5	
Perido de Informe:	19/09/2022	25/09/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

	SI	NO
La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

	SI	NO
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____	x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO

3. ENSAYOS

	SI	NO
La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____	x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA RAD.	10 DE SEPTIEMBRE HASTA 25B DE SEPTIEMBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
RADICADO No.	5	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Página 6 de 9

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 5					
1.1	Localización y replanteo	M2	393,12	$ 11.537,00	$ 4.386.040,00	393,12	$ 4.386.040,00	0,26%					$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno en 0.20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00	320	$ 2.127.040,00	0,14%					$ -	0,00%		$ -	0,00%	83,12	$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.539,84	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 7.065.579,00		$ 6.513.079,84	0,44%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 7.065.579,68	
	CAPITULO 2: CIMENTACION																						
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.830,00	$ 2.050.367,00	39,9	$ -	0,00%	19,1	$ 799.965,30	0,05%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	49,00	$ 2.050.367,06	100%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 6000kgs, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	392	$ 67.102.340,00	3,88%		$ -	0,00%	43,0	$ 7.137.392,50	0,38%	379,00	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,00	$ 551.749,00	$ 1.134.723,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 219.092,13	0,00%		$ -	0,00%	1,17	$ 607.240,00	0,03%	1,66	$ 870.328,64	77%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.113,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,37	$ 511.712,81	0,03%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,37	$ 511.712,81	31%
2.5	Zarpa o dados en concreto para anclarse de pilotes hincados en concreto premezclado de 3000psi (Incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.865,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,44	$ 1.846.602,39	0,13%	7,95	$ 1.551.365,67	0,10%	7,95	$ 1.551.365,67	18%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.930,00	$ 14.439.282,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	337,00	$ 1.170.543,00	0,08%	1559,72	$ 11.007.648,68	0,78%	1559,72	$ 11.007.648,68	76%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleta y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,93	$ 2.568.438,37	0,13%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.930,00	$ 9.059.885,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	637,16	$ 2.628.268,28	0,19%	637,16	$ 2.628.268,28	29%
3.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5537,46	$ 5.693,00	$ 31.304.144,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 167.418.131,00		$ -	0,00%		$ 799.965,30	0,05%		$ 57.833.134,92	3,88%		$ 5.585.573,49	0,37%		$ 22.982.385,82	1,54%		$ 89.933.366,22	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS																						
4.1	Concreto losa maciza	M3	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.837,00	$ -	-	0,00%		$ -	0,00%		0	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	1012,80	$ 10.791,00	$ 10.931.021,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
4.3	Acero placa maciza	KG	2761,60	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
5.4	Aplicación de mortero de nivelacion y revestimiento para empotre columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.071,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 259.019.365,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 4: CUBIERTA																						
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil Industrio PHR S=12cm x 6cm	ML	429,38	$ 76.948,00	$ 33.200.417,84		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canoneras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosiva y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 85.750.646,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 5: MUROS																						
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.218,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera e=1.5cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación impirmante para protección de muros, puertas y ventanas en madera sapan.	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana doseble (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.626,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Suministro de puertas, incluye y ventana, en lamina tambor incluye instalación h=1.90	GL	1,00	$ 90.985.335,00	$ 90.985.335,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 150.653.254,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 6: PISOS																						
6.1	Sobrepiso en concreto y reflador	M2	235,12	$ 86.639,00	$ 20.370.562,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 20.370.562,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 7: REDES HIRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCION																						
7.1	Redes hidrosanitarias para aguas lluvias, en tuberia PVC	GL	1,00	$ 14.549.657,00	$ 14.549.657,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.2	Redes de gas, incluye tuberia para almacenamiento	GL	1,00	$ 146.543.652,00	$ 146.543.652,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
7.3	Redes de gas, incluye tuberia para almacenamiento de cilindros	GL	1,00	$ 8.803.082,00	$ 8.803.082,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 169.866.961,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 8: ZONAS COMUNES																						
8.1	Iluminación general, incluye poste en tubería galvanizada Lamparas antimosquitos y lamparas LED 70W	GL	1,00	$ 772.824,00	$ 772.824,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.2	Arborización, con plantas y arboles autoctonos de la region	GL	1,00	$ 16.807.250,00	$ 16.807.250,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.3	Construccion sistema de proteccion antibasuras, area del manglar, incluye nivelacion, desalojo y disposicion final de directos	ML	200,00	$ 215.583,00	$ 43.116.600,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
8.4	Sistema de evacuacion y contraincendios	GL	1,00	$ 93.932.073,00	$ 93.932.073,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
8.5	Sistema de almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, incluye base en concreto reforzado y suministro 8 tanques de 2000 lts.	GL	1,00	$ 123.434.195,00	$ 123.434.195,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 278.152.942,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
	CAPITULO 9: SISTEMA PISO DECK																						
9.1	Localizacion y replanteo	M2	763,00	$ 10.816,00	$ 8.253.608,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 6000kgs, Bentonita, cargue y retiro de escombros)	ML	127,00	$ 165.163,00	$ 20.975.701,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.3	Demolición cabeza de pilotes	M3	0,65	$ 551.749,00	$ 367.169,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.4	Concreto de limpieza (2000psi) e=0.10m	M3	3,75	$ 370.781,00	$ 1.390.429,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.5	Zarpa o dados en concreto para anclarse de pilotes hincados en concreto premezclado de 3000psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	19,81	$ 536.865,00	$ 10.634.187,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.930,00	$ 14.439.282,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.7	Columna WHC 0.30m X 0.30	ML	189,00	$ 324.200,00	$ 61.273.800,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.8	Viga WHC 0.30 x 0.30	ML	189,00	$ 324.200,00	$ 61.273.800,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.9	Vigueta WPC 0.02 x0.13	ML	550,00	$ 162.304,00	$ 89.267.200,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
9.10	Listón para piso WPC 0.03 X 0.2	M2	763,00	$ 173.661,00	$ 132.494.043,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				$ 353.253.197,00		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	

	COSTOS DIRECTOS		**%**	**$ 1.491.530.437,00**		**$ 6.513.079,84**	**0,44%**		**$ 799.965,30**	**0,05%**		**$ 57.833.134,92**	**3,88%**		**$ 5.585.573,49**	**0,37%**		**$ 22.982.385,82**	**1,54%**		**$ 89.933.366,22**	
	ADMINISTRACION		19,00%	$ 283.390.821,00		$ 1.237.485,17			$ 151.993,41			$ 10.988.295,63			$ 1.061.258,96			$ 4.366.653,31			$ 17.087.399,68	
	IMPREVISTOS		1,00%	$ 14.917.396,00		$ 65.162,60			$ 7.998,05			$ 578.331,36			$ 55.855,73			$ 229.823,86			$ 899.319,49	
	UTILIDAD		5,00%	$ 74.576.532,00		$ 325.813,00			$ 39.988,27			$ 2.891.658,75			$ 279.278,67			$ 1.149.119,28			$ 4.496.659,50	
	IVA SOBRE U UTILIDAD		19,00%	$ 14.169.541,00		$ 61.874,10			$ 7.598,27			$ 549.415,16			$ 53.062,94			$ 218.357,27			$ 854.164,05	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 387.052.300**		**$ 1.690.144,32**			**$ 207.591,98**			**$ 15.007.698,51**			**$ 1.449.456,32**			**$ 5.963.928,12**			**$ 23.337.708,53**	
						$ 8.203.224,06			**$ 1.007.556,30**			**$ 72.840.833,43**			**$ 7.035.029,81**			**$ 28.946.314,94**			**$ 113.271.074,75**	
	TOTAL			**$ 1.878.582.837**																			

$ 118.032.958,54

ENRIQUE ALONSO TOVAR ENQUIRO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRAS	%
LUIS CARLOS OBANDO	RESIDENTE DE OBRAS	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	OFICIAL	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	OFICIAL	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%


INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

AGOST. 24 2022

SE INICIA LA OBRA CON LA ELABORACION DE LOS ESTRIBOS O FLEJES.

R#3



DETALLES. PILOTES. 25x25.

FLEJES. 3/8.

1 MAESTRO EVER MARTINEZ

2 OBREROS Ó AYUDANTES PRACTICOS. * ALFREDO CAICEDO

* JOSE PEREIRA.

RESIDENTE DE OBRA.


Asist. Interventoria

AGOST. 25 2022

SE ARMA EL PRIMER ESQUELETO DE ACERO. CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS., CON EL FIN DE DAR UN PANORAMA ESPACIAL CON FORMALETA Y DETERMINAR EL SITIO DE FUNDICION.


R#4

1/2

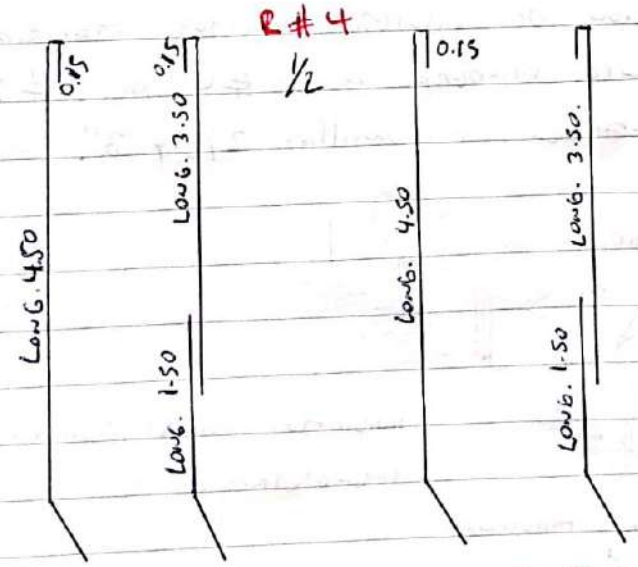

DESPIECE DE BARRAS DE ACERO #4

Escaneado con CamScanner

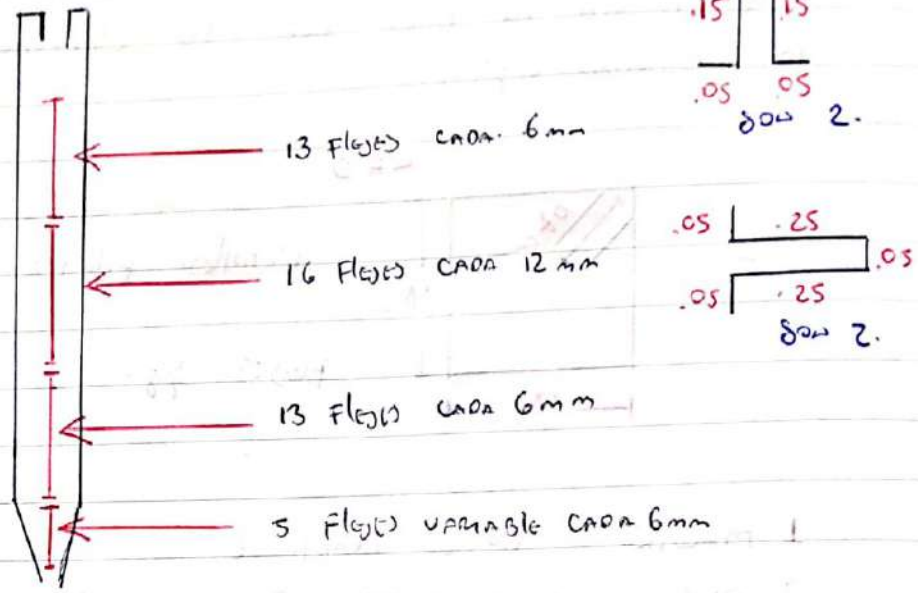

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ


4 AYUDANTES PRACTICOS. ALFREDO CAICEDO.
JOSE PRECIADO.
XAMIR ROSERO
JADER ORTIZ.

RESIDENTE DE OBRA.

Res. Interventoría

AGOST. 26. 2022

YA SE CUENTA CON 10 ESQUELETOS DE ACERO PARA FUNDICION DE PILOTES, TENEMOS MATERIALES COMO: CEMENTO, MADERA, ACERO #4, ACERO #3, ALAMBRE DE AMARRE, Y PUNTILLAS. 2½ y 3".

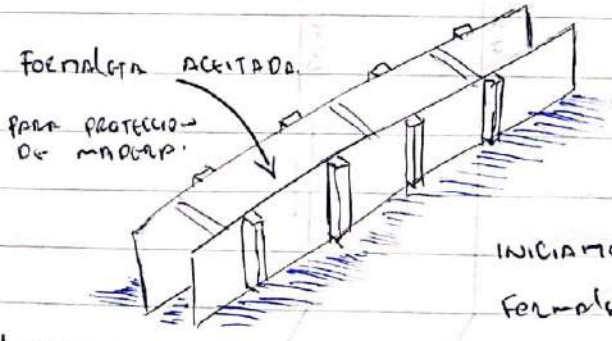

INICIAMOS CON EL ARMADO DE FORMALETA.

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ

4 AYUDANTES. PRACTICOS ALFREDO. CAICEDO.
JOSE PRECIADO.
XAMIR ROSERO
JADER ORTIZ.

RESIDENTE DE OBRA


Res. Interventoría

Escaneado con CamScanner

AGOST. 27 2022

SE SIGUE ARMANDO LOS ESQUELETOS DE ACERO. Y LA FORMALETA PARA FUNDICION, SE ENTRO TARDE A LA OBRA POR CUESTIONES CLIMATICAS. LLOVIO TODA LA NOCHE HASTA 8:40 AM. APROX.

INICIAMOS CON EL TOPOGRAFO PARA LA UBICACION DE LOS BLOQUES, PUNTOS Y EJES.

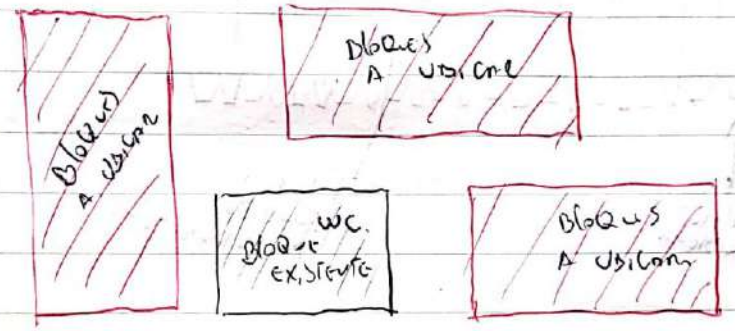

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ

6 AYUDANTES PRACTICOS

ALFREDO CANCEDO.
JOSE PRECIADO
XAMIR ROJAS.
JADER ORTIZ.
MARK ESTACIO.
NAIDER VALVERDE.

1 TOPOGRAFO. JORGE MARIN

AYUDANTE WHASHINTON QUIÑONES

SE UBICO LOS PUNTOS PARA LOS EJES DE CADA BLOQUE CON EL TOPOGRAFO, AUNQUE HACE FALTA TERMINAR YA EN UN 50%. LEVANTAMIENTO. SE ALCANZO A FUNDIR 10 PILOTES.

RESIDENTE DE OBRA

Res. Interventoría

AGOSTO 29 2022


SE INICIA LA JORNADA CON LA META DE FUNDIR 9 PILOTES, QUE SON LOS ESPACIOS QUE NOS QUEDA ENTRE PILOTES FUNDIDOS

Escaneado con CamScanner

AGOST. 27 2022

SE SIGUE ARMANDO LOS ESQUELETOS DE ACERO. Y LA FORMALETA PARA FUNDICION, SE ENTRO TARDE A LA OBRA POR CUESTIONES CLIMATICAS. LLOVIO TODA LA NOCHE HASTA 8:40 AM. APROX.

INICIAMOS CON EL TOPOGRAFO PARA LA UBICACION DE LOS BLOQUES, PUNTOS Y EJES.

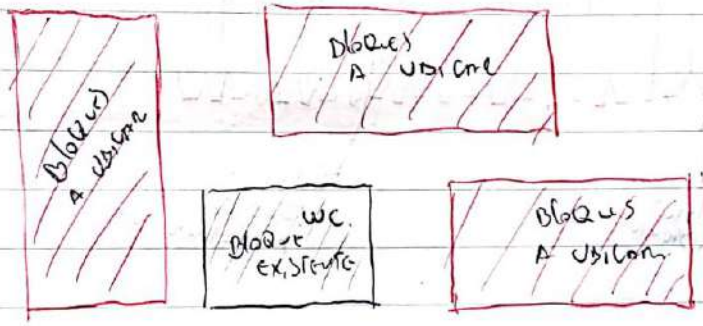

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ

6 AYUDANTES PRACTICOS. ALFREDO CARCEDO.
JOSE PRECIADO.
XAMIR ROJERO.
DAORA ORTIZ.
MARY ESTACIO.
NAIDER VALVERDE.

1 TOPOGRAFO. JORGE MARIN.

AYUDANTE WHASHINTON QUIÑONES

SE UBICO LOS PUNTOS PARA LOS EJES DE CADA BLOQUE CON EL TOPOGRAFO, AUNQUE HACE FALTA TERMINAR. VA EN UN 50%. LEVANTAMIENTO DE ALCANZO A FUNDIR. 10 PILOTES.

RESIDENTE OBRA.


Res. Interventoría

AGOSTO 29 2022

SE INICIA LA JORNADA CON LA META DE FUNDIR 9 PILOTES, QUE SON LOS ESPACIOS QUE NOS QUEDA. ENTRE PILOTES FUNDIDOS

Escaneado con CamScanner

SE SIGUE ARMANDO LOS ESQUELETOS DE LOS PILOTES, SE DESENCOFRAN LOS PILOTES FUNDIDOS. PARA ALTURA DE LOS 9, Y DAR INICIO A LA FUNDICIÓN DE CONCRETO.

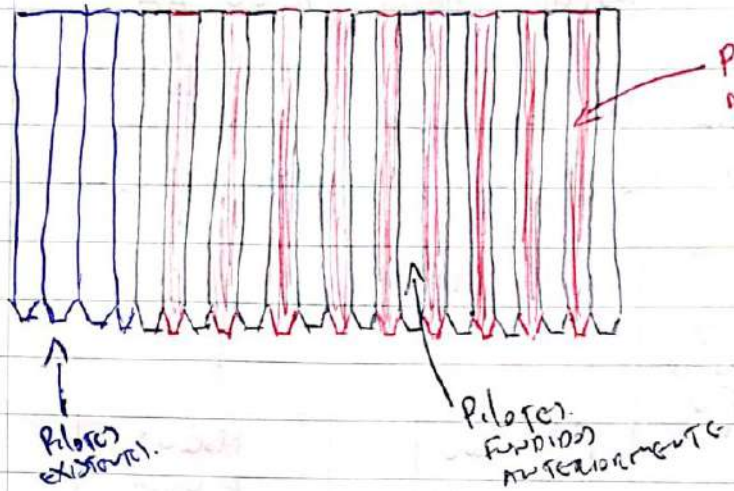

1 MAESTRO EVER MARTINEZ
5 AYUDANTES. PRACTICOS. JOSE PLEITADO.
PERMISO → ALFREDO CANCERO.
MARY ESTACIO
NAIDER VALVERDE.
NESTOR CANCERO.
WILIAN CUGNÚ

RESIDENTE DE OBRA

Residente Interventoría

AGOSTO 30 2022

SE SIGUE ARMANDO ESQUELETO EN ACERO PARA PILOTES, SE ADECUA LA FORMALETA PARA OTRO LADO. EN LA FUNDICION DE CONCRETO, SE UBICA EL LUGAR PARA ARMAR FORMALETA Y FUNDIR.
CONTRATOS CON DISO EN OBRA

CAMILA TELLO.

SE DEJO ARMADO PARA FUNDICION 7 PILOTES.

RESIDENTE DE OBRA

Residente de Interventoría

Escaneado con CamScanner

AGOSTO 31 2022

SE VA A INICIAR A FUNDIR PERO EXISTE UN EVENTO EN ESCUELA TALLER, DE LOS CUALES NOS INFORMAN NO HACER RUIDO CON LA REVOLVEDORA, EN UN PERIODO DE TIEMPO, POR LO TANTO NOS RETRAZA UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA A LA DURACION DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, DESPUES DEL MEDIO DIA, NO SE PUDO FUNDIR PILOTES. EL DIA DE HOY.

- Se Solicita al Contratista la Instalación inmediata de la Valla en la obra, Se recomienda en el lugar mas Visible para apreciación de toda la Comunidad.

- Se Solicita en obra los planos, el paquete completo; ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DETALLES ETC. con FIRMA o CARTA DE RESPONSABILIDAD.

RESIDENTE OBRA

Residente Interventoria

SEPTIEMBRE 01 2022.

EL DIA AMANECIO CON LLUVIA E IMPIDE TRABAJAR EN OBRA, 8:05AM: INICIAMOS CON LA FUNDICION DE PILOTES. QUE SE HABIAN ARMADO EL DIA 31 AGOSTO. Y QUE NO SE PUDO REALIZAR ESA ACTIVIDAD POR UN EVENTO QUE TUVO ESCUELA TALLER. POR EL RUIDO DE LA REVOLVEDORA, ESTO RETRAZA UN DIA EN LA INCADA DE PILOTES POR EL TIEMPO DE FRAGUADO. AFECTANDO CON UN DIA LA RUTA CRITICA O CUADRO DE PROGRAMACION. SE FUNDIERON 7 PILOTES. Y SE PROCEDE A ARMAR. 6. MAS. EN EL TRANSCURSO DEL DIA; EN LA TARDE TIPO 3:30. SE INICIA FUNDICION DE 6 PILOTES MAS PARA UN TOTAL 13 PILOTES. FUNDIDOS.

- Se Solicita en obra los planos, el paquete

Escaneado con CamScanner


Completo; ARQUITECTONICO, ESTRUCTURALES, DETALLES. ETC. con Firma o CARTA DE RESPONSABILIDAD.

Res. Interventoría

Residente de obra

Septiembre 02 2022

Se sigue ARMANDO los ESQUELETOS DE ACERO para PILOTES y se PROGRAMA el CERRAMIENTO DE OBRA en TELA VERDE ya QUE ESCUELA TALLER se COMPROMETIO, PERO HASTA la FECHA va LENTO el CUMPLIMIENTO a las ACTIVIDADES en ACUERDO.

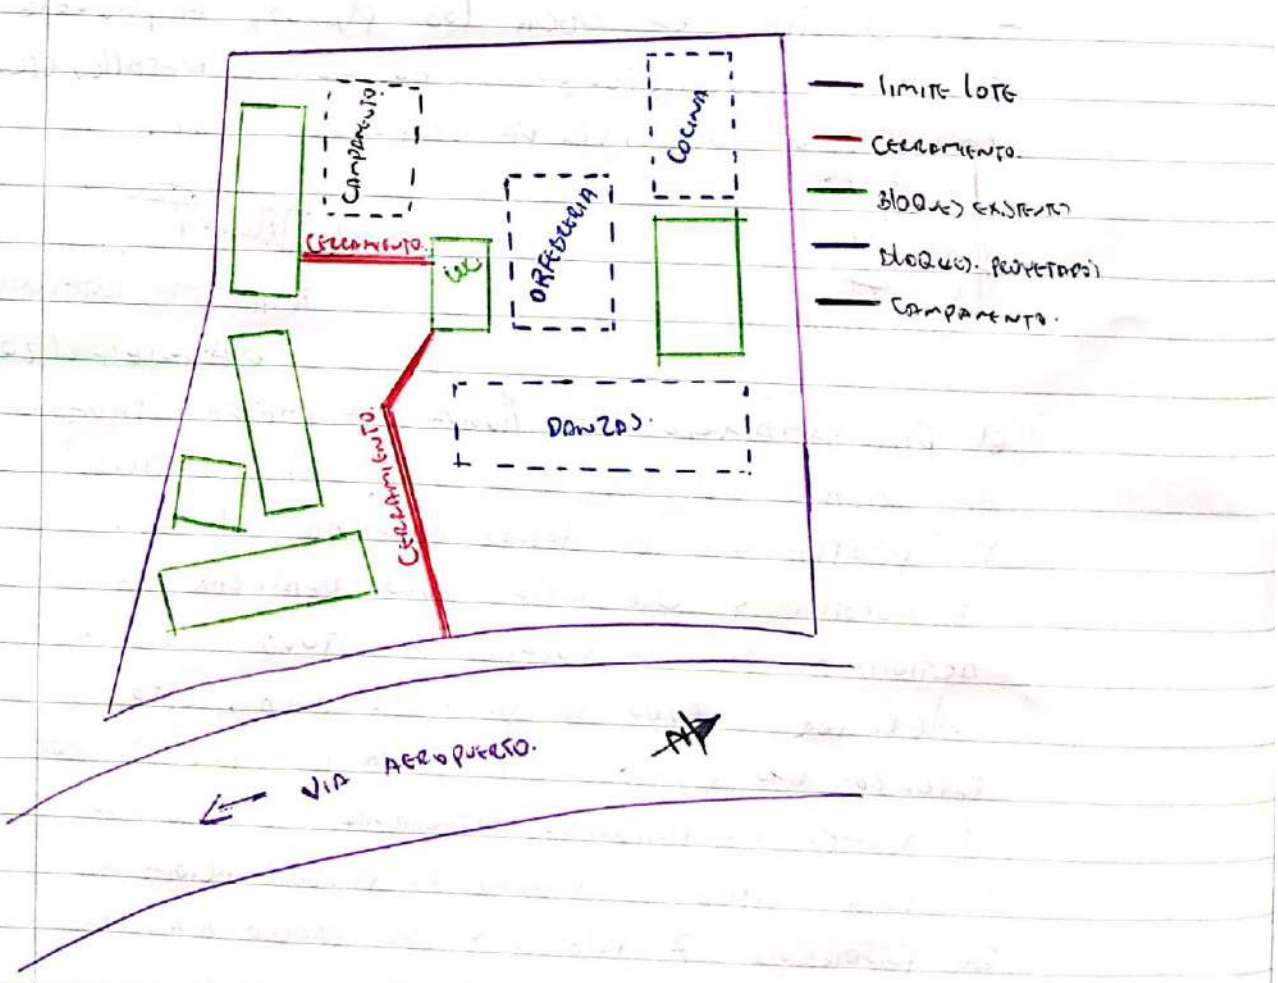

- Actualmente se presenta un cierre temporal de la Vía Tumaco-Pasto. por parte de los indiguenas hasta el momento No ha afectado un tema de Suministro de materiales, Sin embargo de prolongarse


completo; arquitectonico, estructurales, detalles etc. con firma o carta de responsabilidad.

Res. Interventoría

Gerente de obra

Septiembre 02 2022

Se sigue armando los esqueleto de acero para pilotes y se programa el cerramiento de obra en tela verde ya que escuela taller se comprometio, pero hasta la fecha ya lento el cumplimento a las actividades en acuerdo.

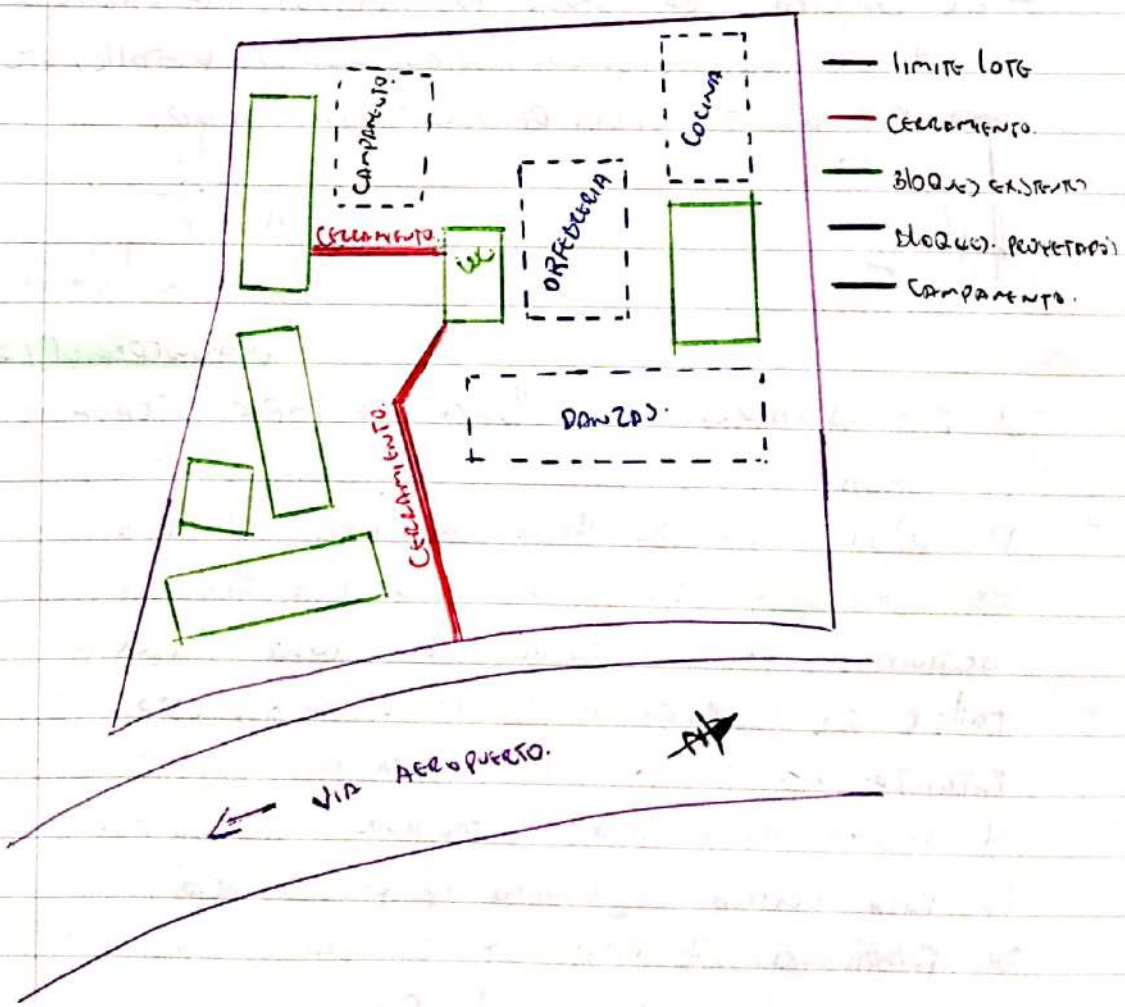

- Actualmente se presenta un cierre temporal de la Via tumaco-pasto. por parte de los indigenas hasta el momento No ha afectado un tema de Suministro de materiales, Sin embargo de prolongarse

mas día afectaría, esto paro se presenta cerca al Km .80 Tumaco - pasto.

- SE FUNDIERON 12 pilotes rm el DIA DE Hoy.
- SE Solicita los planos, el paquete completo; ARQUITECTONICO, ESTRUCTURALES, detalles ETC. con FIRMA O CARTA DE RESPONSABILIDAD.

RESIDENTE DE OBRA

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 03 2022

SE SIGUE ARMANDO los ESQUELETOS PARA PILOTES, AMARRE Y CORTE DE VARILLAS.

- SE Solicita los planos, el paquete completo; ARQUITECTONICO, ESTRUCTURALES, detalles ETC. con FIRMA O CARTA DE RESPONSABILIDAD.

RESIDENTE DE OBRA

Res. Interventoría

SEPTIEMBRE 05 2022

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ

4 AYUDANTES PRACTICOS. ALFREDO CAICEDO
JOSE PRECIADO.
ALEXIS VALVERDE
BRAYAN CADENAS.

1 SISO. CAMILA TELLO.

SE SEGUIRA ARMANDO los ESQUELETOS DE ACERO. PARA PILOTES.

-NOTA:

DESDE EL DIA 24 DE AGOSTO HASTA Hoy. 5 DE SEPTIEMBRE VAN 11 DIAS, los CUALES NO SEA TERMINADO el COMPROMISO DE ESCUELA TALLER DE EVACUAR Y EFECTUAR las ACTIVIDADES COMO.

• Demolición y Desmonte de la Bodega.
• Tala de Arboles y Extracción de los Cortes.
• Cerramiento de la Obra.
De los Cuales Hicimos el Cierre en Polisombra, Desmantelamos la Bodega pero Demolimos y Aun Hay Escombro. y el Dia 3 de Sept. Talaron los Arboles pero Dejaron los Cortes Allí, Esto Nos Retrasa ya Que el Topografo No Ha podido Terminar de Ubicar los Puntos.

- Se Toma muestra de Cilindros.
- 3.21 pm. llego la pajarita para Remover los Restos de los Arboles y Ramas; de Pozo. Removie Todo el Escombro.

* Se Continua realizando el corte y figurado de acero. de pilotes.
Amarre de Castillos de pilotes.
Nota: Aun se encuentran los escombros de los arboles Cortados, Ramas y demas. se esta pendiente el retiro de este material por parte de la escuela taller, igualmente el maestro de la obra arma un pequeño Campamento para el corte, amarre de hierro al lado de la Bateria Sanitaria existente.

- A la Fecha ya se encuentra dividida con una polisombra Verde la area tanto de escuela taller, como nuestra area de trabajo. Se cuenta Con accesos independientes.
- Antes del medio dia Se hace la fondición de 4 pilotes un Concreto Reforzados.

→ Se Solicita Nuevamente al Contratista la instalación un lugar Visible, la Valla de la obra.

- SE SOLICITA LOS PLANOS EN OBRA; PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DETALLES ETC. CON FIRMA O CARTA DE RESPONSABILIDAD.

Residente de obra

SEPTIEMBRE 6 2022

SE SIGUE ARMANDO LOS ESQUELETOS DE ACERO DE LOS PILOTES PARA DEJAR LISTO TODO LO QUE HACE FALTA PARA ASI FUNDIR.
SE FUNDIERON 10 PILOTES MAS.
AYER EN HORA DE LA MAÑANA CERRARON ALGUNAS DE LAS VIAS PRINCIPALES DE TUMACO.

Residente de obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 7 2022

SE SIGUE ARMANDO ESQUELETOS DE REFUERZO DE ACERO PARA PILOTES., DESDE MUY TEMPRANO CERRARON LAS VIAS PRINCIPALES DE TUMACO, SECTOR LA PLAYA PUENTE, D/ HERRERA, LAS CUALES NO HA PODIDO INGRESAR EL MAESTRO Y UN TRABAJADOR A LA OBRA POR QUE NO HAY PASO.
TAMBIEN LA VIA PUNTO TUMACO SE ENCUENTRA CERRADA EN ILOCENTE.
EL MAESTRO LOGRO PASAR POR CAMINANDO EL RESTO.
- YA SE APROBO LA VALLA INFORMATIVA EN BOGOTA.
- SE NECESITA LOS PLANOS EN OBRA; ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES DETALLES ETC.
SE FUNDIERON 10 PILOTES MAS. SOLO FALTAN 4 PARA FINALIZAR PILOTES DE (illegible).

Residente de obra

NKA

Septiembre 08 2022

Hoy se finaliza fundacion de pilotes de los blaques cocina, orfebreria y danzas. (4 pilotes).
Se inicia nuevamente el replanteo de los bloques con el topografo, ya que contamos que ya talaron y sacaron (2 compases pendientes).

1 Topografo. Jorge Mann
1 Ayudante. Washington Quiñonez

Residente obra

Residente Interventoría

Septiembre 09 2022

Se termina de ubicar los bloques a construir con el topografo con sus respectivos ejes, se hace demarcacion con el rastreo de localizacion.
- Se solicitan los planos en obra, el paquete completo. Estructurales, arquitectonicos, detalles etc. Para un mejor avance.

Residente obra

Residente Interventoría

Septiembre 10 2022

Se inicia con la localizacion y replanteo del primer bloque, con el trazado de los ejes.
Y corte de varilla de refuerzo #5 para parrilla de zapata, se hace el armado de la parrilla para la zapata triangular con el fin de ver el armado y figuerado.

Residente obra

Res. Interventoría

SEPTIEMBRE 12 2022

SE CUENTA CON MANO PERSONAL EN OBRA, PARA EL ARMADO Y FIGURADO, LOCALIZACION DE ZAPATAS PARA EJECUCION DE EXCAVACIONES.

1 MAESTRO. EVER MARTINEZ.

7 AYUDANTES PRACTICOS.


ALFREDO	CAICEDO
JOSE	PRECIADO
MARI	ESTACIO
NAIDER	VALVERDE
BRAYAN	CACERES
CARLOS	JIMENEZ
ELIER	GRANJA.

Clima: Soleado.

Nota: Se encontro tuberia de 4 pulgadas las Cuales atraviezan algunas zapatas del bloque de Cocina, Se Solicita al Contratista realizar el Apu. de desviacion de tuberia de 4" para su posterior revision y/o aprobacion.

Rep. Interventoria. RESIDENTE DE OBRA


-SE REALIZA LA PARRILLA DE LA ZAPATA TRIANGULAR EN CONJUNTO CON INTERVENTORIA. Y SE DEFINE EL ARMADO DE 3 BASTONES R#6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 3 BASTONES R#6 EN LA PARTE INFERIOR.

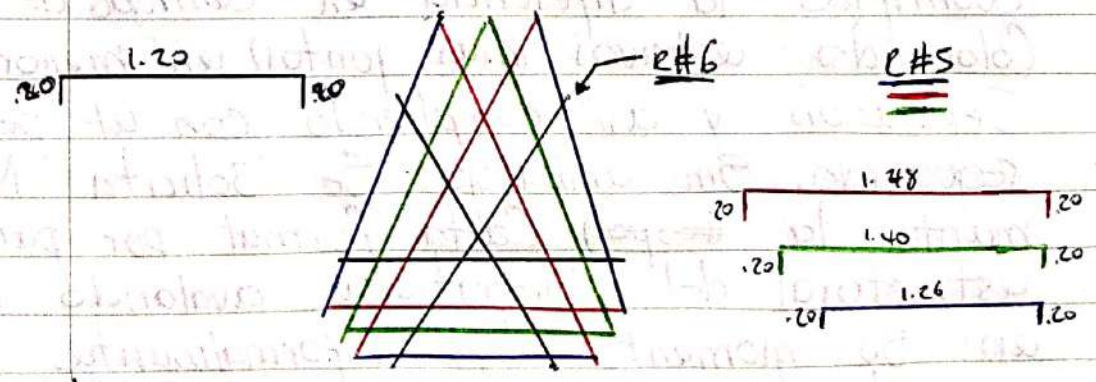

RESIDENTE DE OBRA.

SEPTIEMBRE 13 2022

SE SIGUE ARMANDO PARRILLAS, SE DIAGRAN LAS EXCAVACIONES. TENEMOS FORMALETA (MADERA YA PARA ARMAR). SE NECESITAN PLANOS EN OBRA YA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON PANTALLAS SOLO EN EL CALCULO Y PARA EN DEFINIR CIERTOS DETALLES, ALGUNOS YA ESTAN EN MANCHA. O EJECUCION.

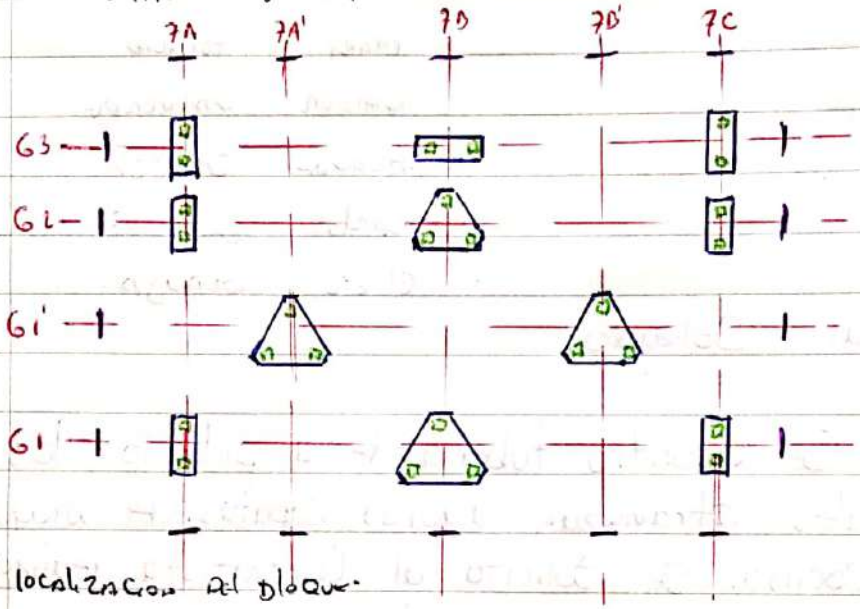

SE HIZO LA INSPECCIÓN DE BLOQUE VECINO POR LA PARTE EXTERNA, PORQUE ESTABA CERRADO, Y SIEMPRE PERMANECE ASI ENTRE SEMANA.

Nota: Teniendo encuenta que el Acero de refuerzo para los estribos utilizado en los pilotes ~~Ut~~utilizado fue de 8.5 mm, y Segun lo estipulado en los diseños es de 3/8, para lo cual Se Cuantifico la diferencia en Cantidad de peso. Colocando estribos mas juntos en menor Separación. y asi cumpliendo con el peso. requerido. Sin embargo Se Solicita Nueva mente la ~~(respon)~~ Carta formal por parte del estructural del Contratista avalando lo que en Su momento dijo informalmente.

Residente Interventoria.

Residente de obra

SEPTIEMBRE 16 2022.

La mañana de Hoy, no se trabajo. por visita de la Vicepresidente en la Escuela Taller motivo. (Desayuno + Reunion el Equipo de seguridad nos informe con Dias anticipados que no podiamos Realizar Actividades.

En Horas de la tarde se inician Labores. se Arce Excavacion de zapata para colocar parrillas, se sigue armando Refuerzo (Estribos de Acero.), corte y doblado de varilla.

Residente Interventor

Residente Cosa.

SEPTIEMBRE 17 2022.

El Dia de Hoy, se Realiza Informacion sobre los Baños ya Construidos. los cuales no pidan verificar medidas. en el Baño para mujeres la Ubicacion de los Drenajes, solo se pudo. Hacer en el Baño de mujeres. porque el Baño de Hombres. esta cerrado con candado, lo tienen como bodega, no se ha podido verificar medidas porque Hoy no trabajan.

- se solicita planos en obra.
- se sigue trabajando por medio de pantallazos. en medios digitales.
- se deja listo block para soldado. y despues fundir zapata en el (block cocina).

Residente de obra.

SEPTIEMBRE 19 2022

DESDE LA NOCHE ANTERIOR LLUVIA, POR LO QUE EL DIA DE HOY AMANECE LLUVIOSO. SON LAS 7:30 Y BAJO UN POCO PERO SIGUE SE TRABAJA A MEDIA MAQUINA, LO HA LLEGADO TODO EL PERSONAL, LLEGARON EN TOTAL 5 CON EL MAESTRO, SE ARMARON 7 PARRILLAS. DE ZAPATAS INTERIORES Y SUPERIOR CON PEDESTALES. DE LAS CUALES SE FUNDIERON 4.

- SE SOLICITA PLANOS EN OBRA SE SIGUE TRABAJANDO CON PARRILLAS.
- SE ENVIARON MEDIDAS DE LOS DAÑOS EXISTENTES, LAS DIVISIONES DE LOS BAÑOS DEBIERON VENIR. LOS QUE VAN A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD.

Residente de obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 20 2022

SE INICIA EXCAVACION DEL BLOQUE BAÑOS Y A SU VEZ SE SIGUE TRABAJANDO EN LAS ZAPATAS DEL MODULO DE COCINA.

- LLUVIO A LAS 9:00 am HASTA LAS 10.00 am PERO DURO, POR FUERTE QUE NO SE PUDO REALIZAR NADA DURANTE ESA HORA, EL DIA ESTUVO SOLEADO DESPUES CUANDO TERMINO DE LLOVER. HIZO SOL AL INSTANTE.

SE INICIA EL PROCESO DE FUND. CON DE ZAPATAS A LAS 2 pm. HASTA LAS 4.30 pm. SE FUNDIERON 7 ZAPATAS.

Residente de obra

SEPTIEMBER 21 2022

EL DIA DE HOY AMANECIO LLUVIOSO. SON LAS 8:30 Y AUN SIGUE NO HA PARADO DE LLOVER LAS ACTIVIDADES NO SE APLAZAN SE ESTA TRABAJANDO PERO LENTO. SIN PRISA, PARO UN POCO DE LLOVER A LAS 9.35 am PERO SIGUE NUBLADO.

Son las 10:58 q vuelve la lluvia no
con tan fuerte pero va lento el avance.
Afortunadamente mejoro el clima en la
tarde y se pudo trabajar mejor.
Se inicia localizacion de zapatas en el
bloque enfermeria; se retiran las
excavadoras en el bloque de danza, pero
existia un poco ciclopeo y roca demolida.
para habilitar zapatas del bloque.

Nota: Nuevamente se le Solicita al Contratista los resultados de laboratorio de los Cilindros realizado en obra. correspondiente a los pilotes en donde la resistencia Solicitada: es 3500 psi. Sin embargo el Contratista hasta la Fecha No ha presentado diseño de Mezcla. Tampoco resultados de laboratorio por lo Cual la Interventoria No puede Constatar Su resistencia. Hasta No Contar con el documento Tecnico que lo Soporte. por tal razon la Interventoria. Solicita al Contratista, Suspender Toda Actividad de Concretos. hasta tanto. No Contar con los resultados de laboratorio.

Con esto Garantizamos la estabilidad del proyecto. Cabe resaltar el Avance y esfuerzo del Contratista Al querer rendir y Avanzar en la ejecucion Sin embarg debemos Cuidarnos en Salud. Garantizando que lo ejecutado hasta el momento cumpla con todas las especificaciones determinadas.

Att: Abraham Vela Garcia.
Residente de Interventoría

Residente de obra.


SEPTIEMBRE 22 2022

Se inicia pilotes. A las 11 am esto es por la marea alta con el fin de suministro de agua de mar para la inyección de pilotes, se localiza los ejes de referencia. se corta acero para flejes, ya se envió a hacer la ruptura de cilindros. A espera de los resultados.

- Se solicita planos en obra, ESO se están trabajando por pantallazo no funciona.



Flejes para cocina
viga




Flejes para danza
viga.

Estos son los flejes que se hacen para las vigas de los bloques de cocina y de danza.



Residente de obra.



Res. Interventoría.

SEPTIEMBRE 23 2022

El día 21 se llevaron los cilindros para ensayo, por inconvenientes de pago, ya que en el laboratorio no estaba disponible el pago por transferencia y toco hacer en efectivo. Y eso hizo que se atrasara un poco, el día 22 de sept. ya de pago y se quedo a la espera del laboratorista ya que el no se encontraba en la ciudad.

Se hace la localización de bajantes en el bloque de recepción y hay un obstáculo. De una caja de inspección a lo mismo.

Q. UNA TUBERIA ELECTRICA EN UNA DE LAS ZAPATAS DEL EJE A DE PANZA

Personal en obra.

1 MAESTRO FUAD MARTINEZ
1 OFICIAL HECTOR GUERRERO
9 AYUDANTES. JOSE ALFREDO CARCEDO
JOSE PRECIADO
NAYDER VALVERDE
MARK ESTACIO
BRAYAN CARDENAS.
CARLOS JIMENEZ
ELIN GRANJA
LUIS CHINGAL
KEVIN ANGULO.

EXCAVACIONES. Y CORTE DE ACERO Y PLEGADO PARA VIGAS.
LAS EXCAVACIONES SON DEL EJE A DE REFERENCIA, SE ARMO FORMALETA DE ZAPATAS.

Residente de obra.

Res. Interventoria

SEPTIEMBRE 24 2022

SE ESTA REALIZANDO LA CAJA DE INSPECCION (TRAMPA DE GRASA). SE SIGUE ARMANDO FORMALETA DE PEDESTALES, TAMBIEN SE SIGUE CORTANDO VARILLA 3/8 PARA FIGURAR LOS FLEJES DE VIGAS.
SON LAS 8.30 Y SE INICIA EL HINCADO DE PILOTES, LA TERMINACION DE LOS 10 PILOTES FALTANTES EN EL BLOQUE DE PANZA Y SE SIGUE EN EL BLOQUE DE REFERENCIA

Residente de obra

Res. Interventoría

Septiembre 26 2022

Se arman las parrillas inferiores del bloque de pantalla, se continua con la formaleta de pedestales y con el corte y figurado de estribos o fleyes de vigas.

Se continua trabajando por medio de imagenes o pantallazos, no se cuenta con planos en obra.

- Se solicita planos en obra en su totalidad.

Llovizna a las 11 am pero se pudo trabajar lluvia. no pudo practicamente imposible trabajar inicio desde la 1:50 pm para de llover 3:01 pm. se fundio concreto de limpieza. (Solado).

Residente de obra

Ros. Interventoria

Septiembre 27 2022

Amanece con lluvia. son las 7.00 am y hay una llovizna molesta que no deja trabajar en forma, llovio hasta (pm). 8.30 pm

- Se tiene armado las formaletas de los pedestales Sin embargo hasta el momento. Falta la Instalacion de esquineros. ademas como las formaletas es en madera, No garantiza un buen acabado teniendo encuenta que es la union de dos tablas. Se le recomienda al Contratista Forrar las formaletas en triplex u otro elemento que Garantise un acabado homogeneo. teniendo encuenta que es concreto a la Vista.
- De acuerdo con lo que solicita Interventoria en ninguna especificacion o en memorias de calculo Habla de que el concreto es a la vista, ya que llevaria una formaleta especial. pero si estan dispuestos a asumir el costo con mucho gusto se procedera

EN UN PROCESO ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL CONCRETO A LA VISTA, SE TIENEN EN LA FORMALETA LOS BISELES AUN NO ESTAN PARA LA FORMALETA. PORQUE ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION PARA ENTREGA.

RESIDENTE DE OBRA.

SEPTIEMBRE 28 2022

SE SIGUE CON EL CORTE DE ACERO PARA MURO. PARRILLAS DE ZAPATAS., FIGURADO. DE VIGAS; A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS PARA PROCEDER A FUNDICIONES DE PEDESTALES.
SE UBICAN PEDESTALES CON PARRILLA INFERIOR DE ZAPATA Y PARRILLA SUPERIOR EN EL BLOQUE PAUTA.

Maestro de obra Taller. Solicita ingreso con personal estudiantil. realiza entrega de comprobante de Radicacion de Afiliación ARL positiva. de Estudiantes; A la obra hace el ingreso de 6 estudiantes. mas el maestro Jose Quiñones.
Se Autoriza el ingreso a obra teniendo en cuenta las medidas de Seguridad y uso obligatoro de elementos de Protección Personal.
Camilo Trello
SST obra

RESIDENTE DE OBRA

SEPTIEMBRE 29 2022

SE SIGUE TRABAJANDO SIN PLANOS, HASTA LA FECHA NO CONTAMOS CON PLANOS EN OBRA, TRABAJAMOS SOLO CON PANTALLAZOS.

- SE SOLICITA PLANOS COMPLETOS, FIRMADOS O CON CARTA DE RESPONSABILIDAD, EL PERSONAL SE PREPARA PARA FUNDICION DE DADOS O ZAPATAS DEL BLOQUE DE DANZAS.

SE FUNDIERON ZAPATAS DEL BLOQUE DE DANZAS.

RESIDENTE DE OBRA

SEPTIEMBRE 30 2022

SE INICIA A ARMAR FORMALETAS DE PEDESTALES. Y REEXCAVACION PARA ARMAR PARRILLAS DE ZAPATAS EN EL BLOQUE DE OFRENDAS QUE FALTA.

HOY SE HARAN TRABAJOS MANUALES POQUE NO HAY FLUIDO ELECTRICO EN TODO TUMACO. HUBO UN DAÑO EN LA VIA PASTO - TUMACO POR JUNIN EL CUAL COMPROMETE LA LINEA 115 KV, QUE ES LA QUE SUMINISTRA TODO TUMACO.

SE RESTABLECIO EL FLUIDO ELECTRICO. AL MEDIO DIA, SE TERMINO DE FUNDIR ZAPATAS SE FUNDIO SOLADO EN EL BLOQUE OFRENDAS Y SE FUNDEN 3 PEDESTALES.

RESIDENTE DE OBRA

Octubre 01 2022

- Se Continua con el armado de formaletas de pedestales y Reexcavacion para la Instalacion de parrilla en sitio.

- Se Continua con ul figurado de acero de parrillas Zapatas. y amarre de los mismos.
- Se Encontro uno Caja de Inspeccion existente en Sitio la Cual obstaculiza Con una zapata Rectangular del bloque de orfebreria, por lo Tanto. Se ordeno la demolicion de la misma, y El Contratista debera Realizar los Apu. para mayores Cantidades obra, teniendo en cuenta que esta No esta dentro del presupuesto. Igualmente dicha Caja Se reubicara a un punto donde No obstaculice la Ejecucion de Obras Futuras. En estos momento No se puede realiza teniendo Encuenta que falta ul diseño Estructural del Soporte del deck


- Se fundieron 8 pedestales de 0,35 x 0,35 en el bloque de la cocina

Jorge A Delazd M.
Residente Obra.

Octubre 03 - 2022

- Se fundieron 2 pedestales en concreto de 0,35 x 0,35 m en el bloque de la Cocina
- Se cuantifico los medidas de la Caja de concreto existente que se va a demoler para realizar los APU.
- Se inicio el armado de las parrillas de las zapatas del bloque de orfebreria.
- Se continua con el corte y figurado del acero de refuerzo
- Se solicita revisión del acero de refuerzo de las vigas aereas del bloque de cocina
- Se esta trabajando con planos no definitivos sin firmar


Jorge L. Salazar Mb.
Residente Obra.



Octubre 04 - 2022

- Se continuo con el armado de las parrillas de las zapatas del blogue de orfebreria
- Se preparó, se transportó y se vacio la mezcla de Concreto en las zapatas del blogue de orfebreria
- Se le solicito a la interventoria aumentar el espesor de la zapata de 35 cm a 40 cm para un mayor recubrimiento del acero,
- La Interventoria autorizó el aumento del espesor de la zapata a 40 cm en este blogue de orfebreria.
- Se fundieron 7 zapatas del blogue de orfebreria
- Se realizarón cilindros de concreto para la prueba de resistencia del concreto a la compresión,
- Durante el vaciado del concreto en las zapatas en construcción se vibró la mezcla utilizando un equipo a gasolina.

Jorge L. Salazar Mb
Residente Obra.



Octubre 05 - 2022

- Se desencofro los pedestales del blogue de cocina, se limpio la formaleta, y se le agrego acpm.
- Se inicio a encofrar los pedestales de las aulas de dauza
- Se suspendio momentoneamente el armado de los castillos de las vigas aereas del blogue de la cocina.
- Con la revisión entre la Interventoria y el Contratista se encuentra que el detalle del despiece del hierro

de la viga aerea según el plano no comple con la longitud de confinamiento de acuerdo al espesor del elemento estructural como lo contempla la NSR-10.

- Por lo tanto se cambia la cantidad de estribos de 8E@0,07m a 12E@0,07m cumpliendo asi con la NSR-10 que dice que la distancia minima de confinamiento debe ser el doble del peralte o espesor de la viga.
- Se solicito a la interventoria realizar una excavación para poder desplazar una tuberia electrica conduit, la cual está interfiriendo en el encofrado y posterior fundición del pedestal esquinero del bloque de dauza.
- La Interventoria autoriza la excavación manual para realizar el desplazamiento de la tuberia conduit.
- Se le informa a la Interventoria que de los elementos estructurales no está contratado como concreto a la vista, ni la formaleta no contempla esquineros "Biseles" por lo tanto el concreto y la formaleta sera normal sin ninguna esquinero o algun material en especial.

Jorge L. Salazar Hb.
Residente Obra

Octubre 06-2022

Certificado
Bancario

Martes, 26 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO identificado(a) con CC 19399373, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	21963845992	2010/10/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833758062

(415)7707212489984(8020) 000001483375806 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 9 3 7 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 9 9 3 7 3	1 9 7 8 1 1 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOVAR	BAQUERO	ENRIQUE	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 119 50 50 IN 5 AP 303

42. Correo electrónico: TOVARQUITECTO@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 7 8 7 1 1 3	6 0 1 8 0 3 4 3 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 3 1 1 0 1	4 3 1 1	1 9 9 3 1 1 0 1	4 3 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 15 : 16: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
CC: 19399373

Bogotá D.C. CARRERA 47A # 95-56 Of. 501
Teléfono 8051341
Correo Electrónico arqetb@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

E 7

RESOLUCION DIAN 18764031672375 FECHA 26-07-2022 AL 26-01-2023 NUMERACION AUTORIZADA CON PREFIJO E QUE HABILITA DESDE EL NUMERO 02 AL 100
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica

Cliente: MINISTERIO DE CULTURA | **NIT:** 830034348 - 5
Dirección: CARRERA 8 No. 8 - 55
Ciudad: Bogotá D.C. | **Teléfono:** 3424100
Fecha: 07/10/2022 | **Vencimiento:** 07/11/2022 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	01	INTERVENTORIA DE PROYECTOS	und	1	5.712.053	0	19	1.085.290	5.712.053
2	15	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA	und	1	0	0	19	0	0
3	16	DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS	und	1	0	0	19	0	0
4	17	UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO	und	1	0	0	19	0	0

CUFE: 514b1b19d2669b08b3d1bd8e181c84f2ca001d6cf0bc190154ee00aaf4237a5b990ad37c4f8e653417a3d95116f7d836--Expedición:10/10/2022 02:19 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

CC: 19399373

Bogotá D.C. CARRERA 47A # 95-56 Of. 501
Teléfono 8051341
Correo Electrónico arqetb@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

E 7

RESOLUCION DIAN 18764031672375 FECHA 26-07-2022 AL 26-01-2023 NUMERACION AUTORIZADA CON PREFIJO E QUE HABILITA DESDE EL NUMERO 02 AL 100
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
5	18	EN NARIÑO CORRESPONDIENTE AL 6.28% DESDE EL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	und	1	0	0	19	0	0

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRÉS PESOS

Favor Consignar en la cuenta de ahorros No 219-638459-92 De BANCOLOMBIA a nombre de ENRIQUE A. TOVAR BAQUERO

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 5.712.053**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.085.290
TOTAL OPERACION	$ 6.797.343
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.797.343**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2022-10-07 09:07:50

CUFE: 514b1b19d2669b08b3d1bd8e181c84f2ca001d6cf0bc190154ee00aaf4237a5b990ad37c4f8e653417a3d95116f7d836--Expedición:10/10/2022 02:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
