INFORME DE INTERVENTORÍA N° 09

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

La Jagua de Ibirico - Cesar

2022

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL....4
1.1. CONTRATO DE OBRA....4
1.1.1. INFORMACION GENERAL....4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA....5
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL....5
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA....6
2.1. FORMA DE PAGO....6
2.2. ANTICIPO....6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA....6
3.1. FORMA DE PAGO....6
3.2. ANTICIPO....7
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....7
5. ANTECEDENTES....9
6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN....10
7. AVANCE DE OBRA....16
7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA....17
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS....17
7.2.1. ADMINISTRATIVAS....17
7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS....17
6.2.3. TECNICAS....17
7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA....18
8. GARANTIAS....20
8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA....20
8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA....20
9. POLIZAS....20
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.....20
11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES....20
12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19....20

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS 21
13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales. 21
13.2. Avance en la ejecución de las viviendas. 22
14. CONTROLES TECNICOS 59
14.2. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados. 59
14.3. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 60
14.4. Chequeo de refuerzo de mampostería. 60
14.5. Chequeo de tapones de estructuras metálicas. 61
14.6. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio. 61
15. CONTROL DE EQUIPO 62
16. CONTROL DE PERSONAL 63
17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS. 64
18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS 65
18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8’ SOLDADAS 65
19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS 66
ANEXOS 67

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoría.

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato con un pago anticipado del 40% ($251.471.935,59) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.



Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios y viviendas intervenidas.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE FEBRERO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10
5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271

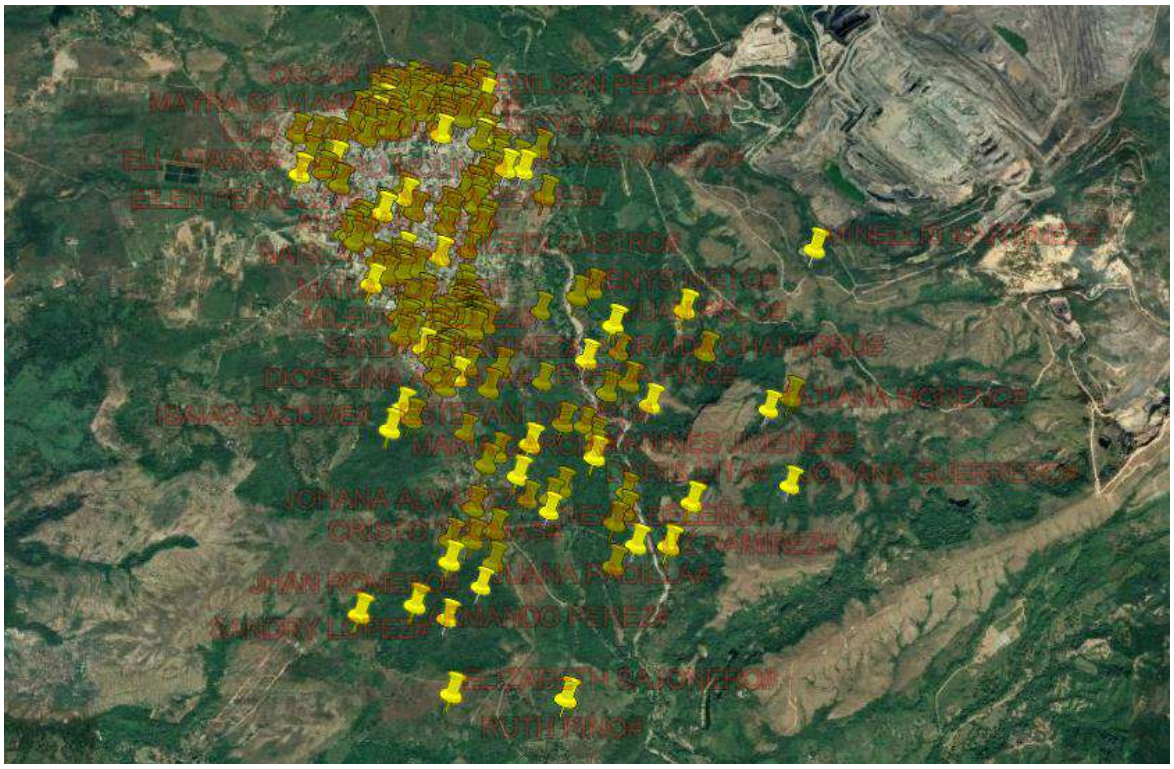


Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021
CONTRATO 089	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021

6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	VIVIENDAS COMPLETADAS O AVANZADAS	FALTANTES
I.	PRELIMINARES REALIZADOS	82	189
1.1	DESCAPOTE MANUAL	74	197
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	82	189
1,3	CORTE, RELLENO O ENTABLADO	74	197
II.	CIMENTACIONES FUNDIDAS	74	197
2,1	EXCAVACION MANUAL	74	197
2,2	ZAPATAS	74	197
2,3	VIGAS	74	197
2,4	PLANTILLA	60	211
2,5	ACERO DE REFUERZO	74	197
2,6	ESTRUCTURA METALICA	74	197
III.	MAMPOSTERIAS LEVANTADAS	72	199
3,1	MUROS	72	199
3,2	PAÑETES DE BAÑO Y COCINA	49	222
IV.	CUBIERTAS INSTALADAS	60	211
4,1	LAMINAS DE FIBRO CEMENTO	60	211
4,2	CABALLETE	60	211
V.	PISOS Y ENCHAPES	49	222
5,1	PISO CERAMICO PARA BAÑO Y COCINA	49	222
VI.	INSTALACIONES ELECTRICAS	46	225
6,1	ACOMETIDA GENERAL	60	211
6,2	POLO DE TIERRA	46	225
6,3	TABLERO MONOFASICO	46	225
6,4	ILUMINACION	46	225
6,5	INTERRUPTORES SENCILLOS	46	225
6,6	INTERRUPTORES DOBLE	46	225
6,7	TOMA CORRIENTE NORMAL	46	225
6,8	TOMA CORRIENTE CON PROTECCION	46	225
6,9	TOMA COAXIAL PARA TV	46	225
VII.	PUERTAS Y VENTANAS	46	225
7,1	PUERTA METALICA	46	225
7,2	PUERTAS DE MADERA	38	233
7,3	VENTANA	46	225
VIII.	INSTALACIONES SANITARIAS	63	208
8,1	RED GENERAL	63	208
8,2	CAJA DE INSPECCION	63	208
8,3	EXCAVACION MANUAL	63	208
IX.	INSTALACIONES HIDRAULICAS	63	208
9,1	PUNTO HIDRAULICA	63	208
9,2	RED DE SUMINISTRO	63	208
X.	ACCESORIOS	42	229
10,1	LLAVE DE CONTROL	42	229
10,2	LAVAPLATOS	42	229
10,3	LAVAMANOS	42	229
10,4	SANITARIO	42	229
10,5	DUCHA	42	229
10,6	REJILLA SOSCO	42	229
10,7	INSCRUSTACIONES PORCELANATO	42	229
10,8	LAVADERO	42	229
XI.	ACABADOS	54	217
11,1	PASTA SOBRE MUROS	50	221
11,2	GRANIPLAST FACHADA	50	221
11,3	YESO PINTURA	54	217
XII.	TANQUE DE AGUA	39	232
12,1	TANQUE DE 500LT	39	232
12,2	PLACA EN CONCRETO	59	212

Ilustración 3 Resumen de actividades ejecutadas.

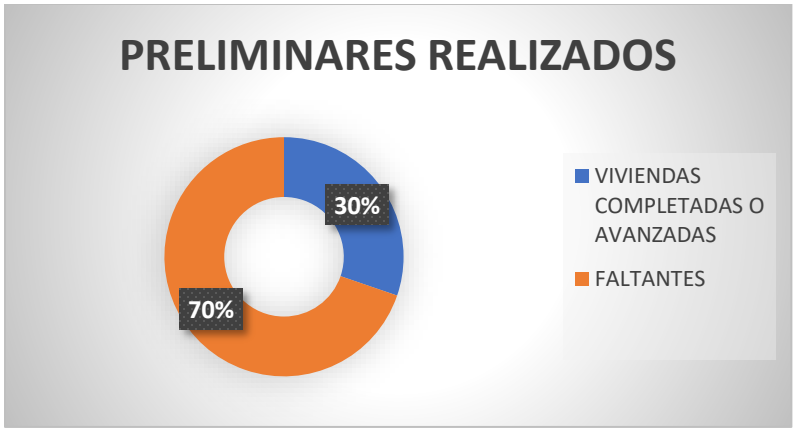


Gráfico 1 Porcentaje de preliminares realizados

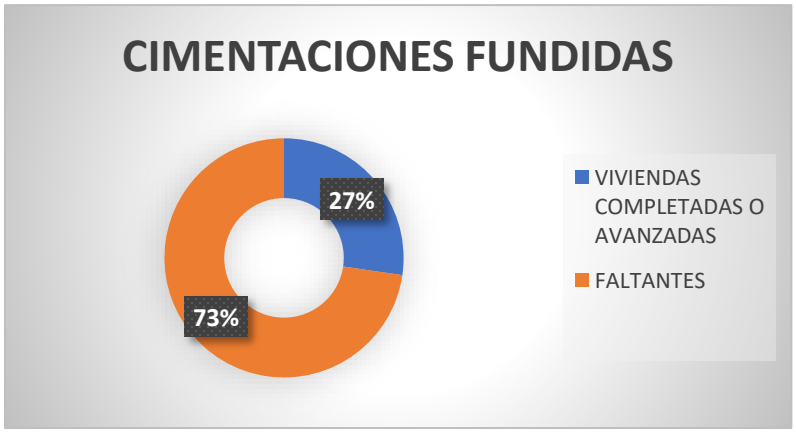


Gráfico 2 Porcentaje de cimentaciones fundidas

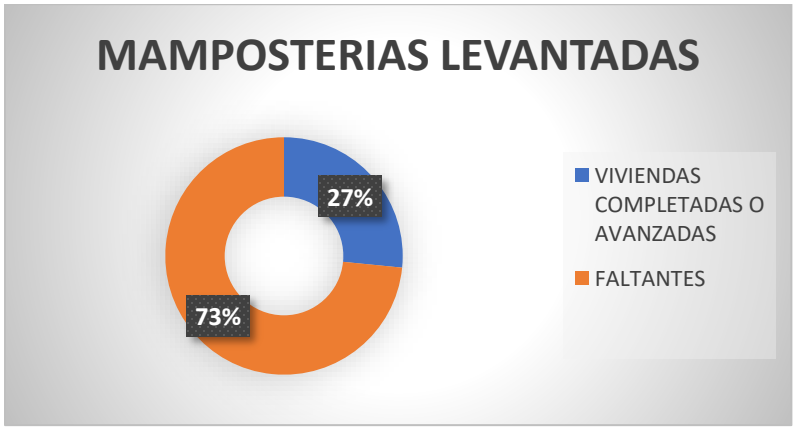


Gráfico 3 Porcentaje de mamposterías levantadas

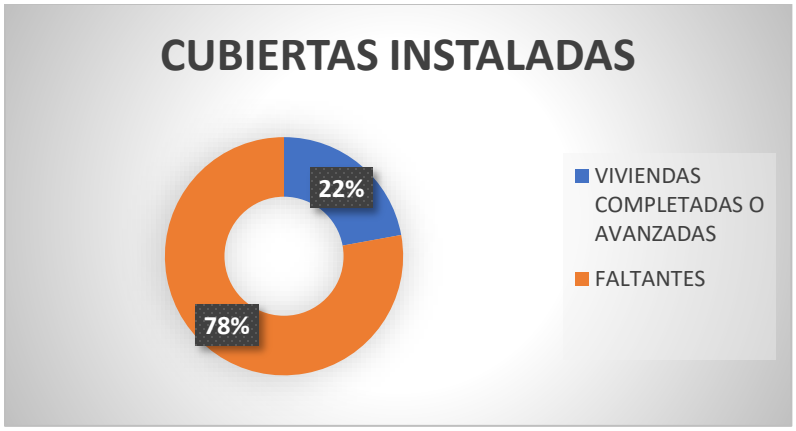


Gráfico 4 Porcentaje de cubiertas instaladas

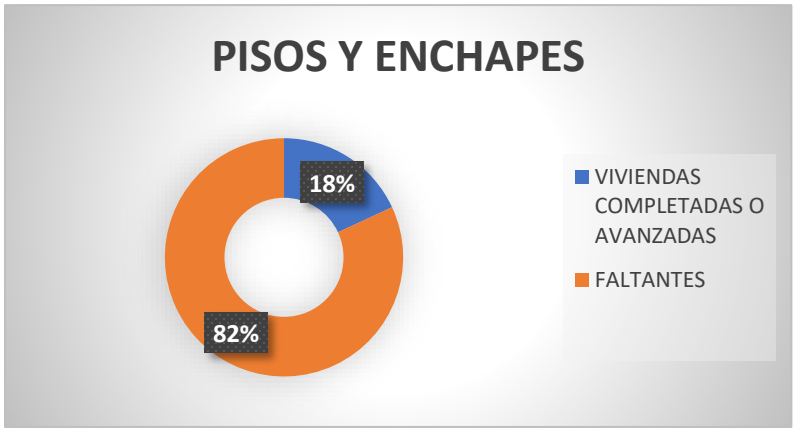


Gráfico 5 Porcentaje de enchapes instalados.

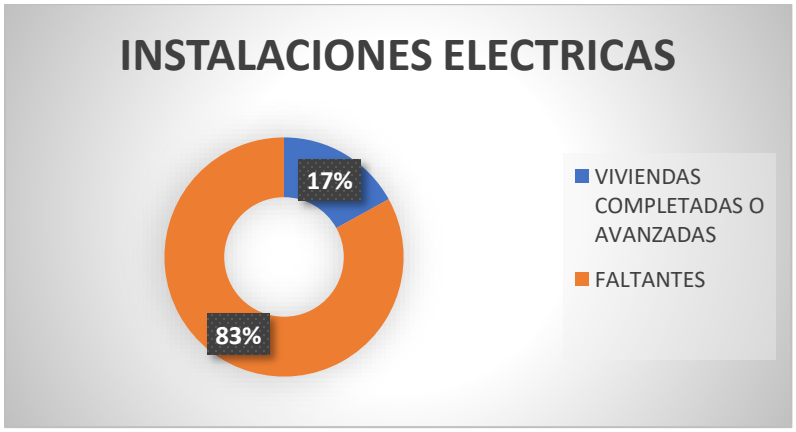


Gráfico 6 Porcentaje de instalaciones eléctricas instaladas.

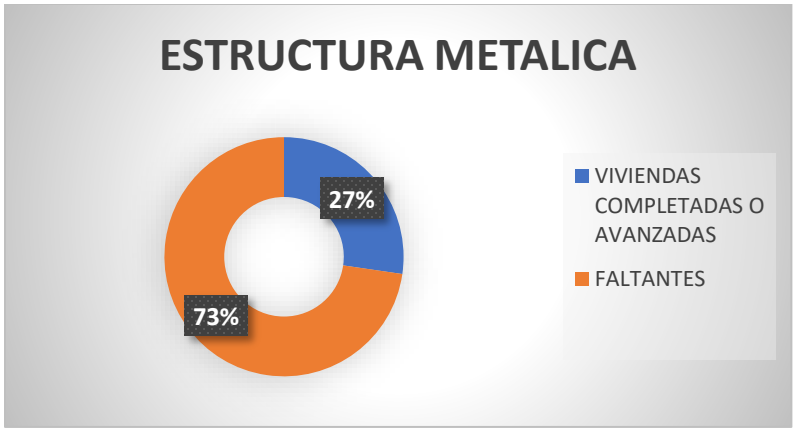


Gráfico 7 Porcentaje de estructuras metálicas levantadas.

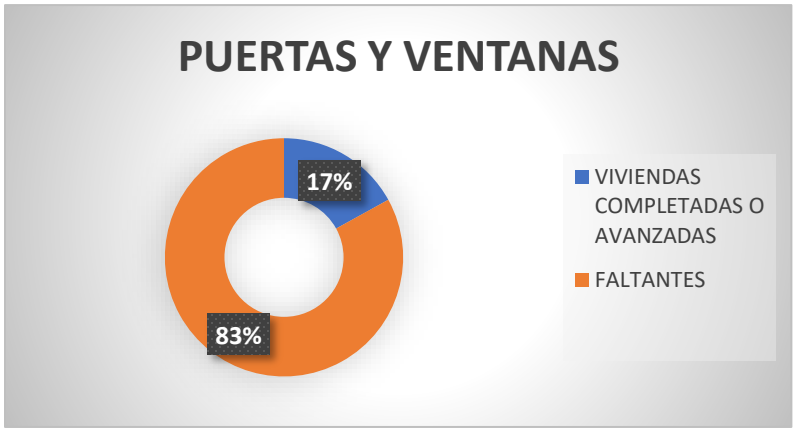


Gráfico 8 Porcentaje de puertas y ventanas instaladas.

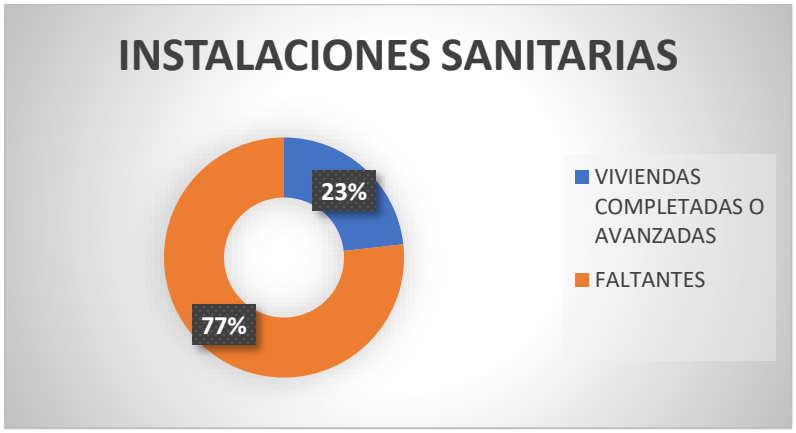


Gráfico 9 Porcentaje de instalaciones sanitarias instaladas.

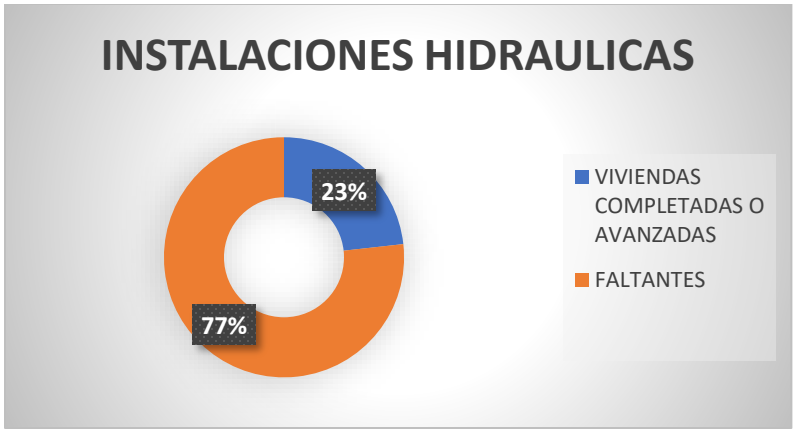


Gráfico 10 Porcentaje de instalaciones hidráulicas instaladas.

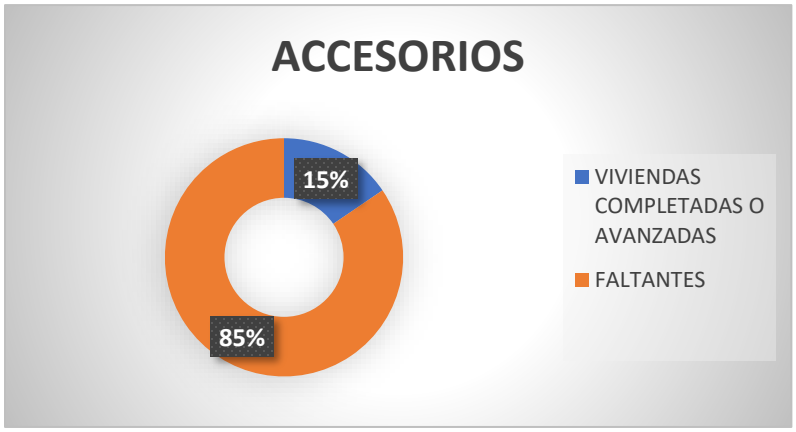


Gráfico 11 Porcentaje de accesorios instalados.

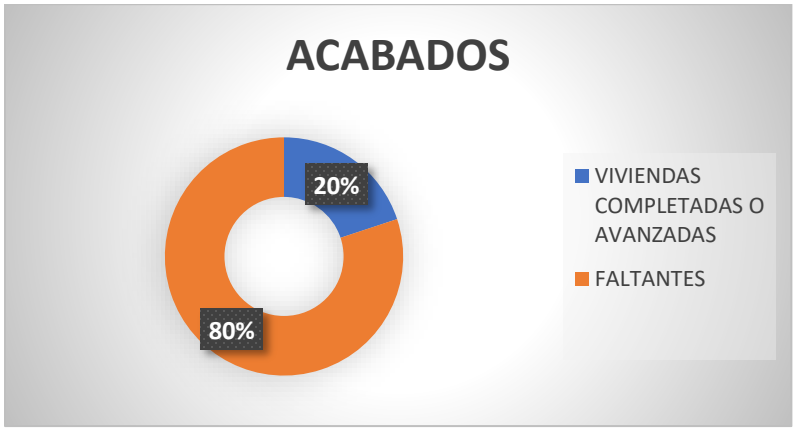


Gráfico 12 Porcentaje de acabados avanzados o terminados.

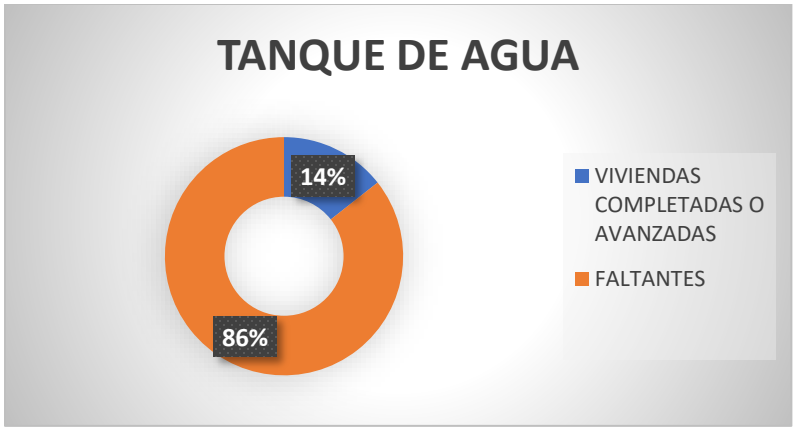


Gráfico 13 Porcentaje de tanques de agua instalados.

7. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (días):	549
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 31 de febrero	**286 días**
Porcentaje de avance en tiempo	**52,09%**
Porcentaje de ejecución	**26,62%**
Porcentaje programado	**34,67%**
Porcentaje de retraso	**8,05%**
Porcentaje ejecutado en el mes	**2,43%**

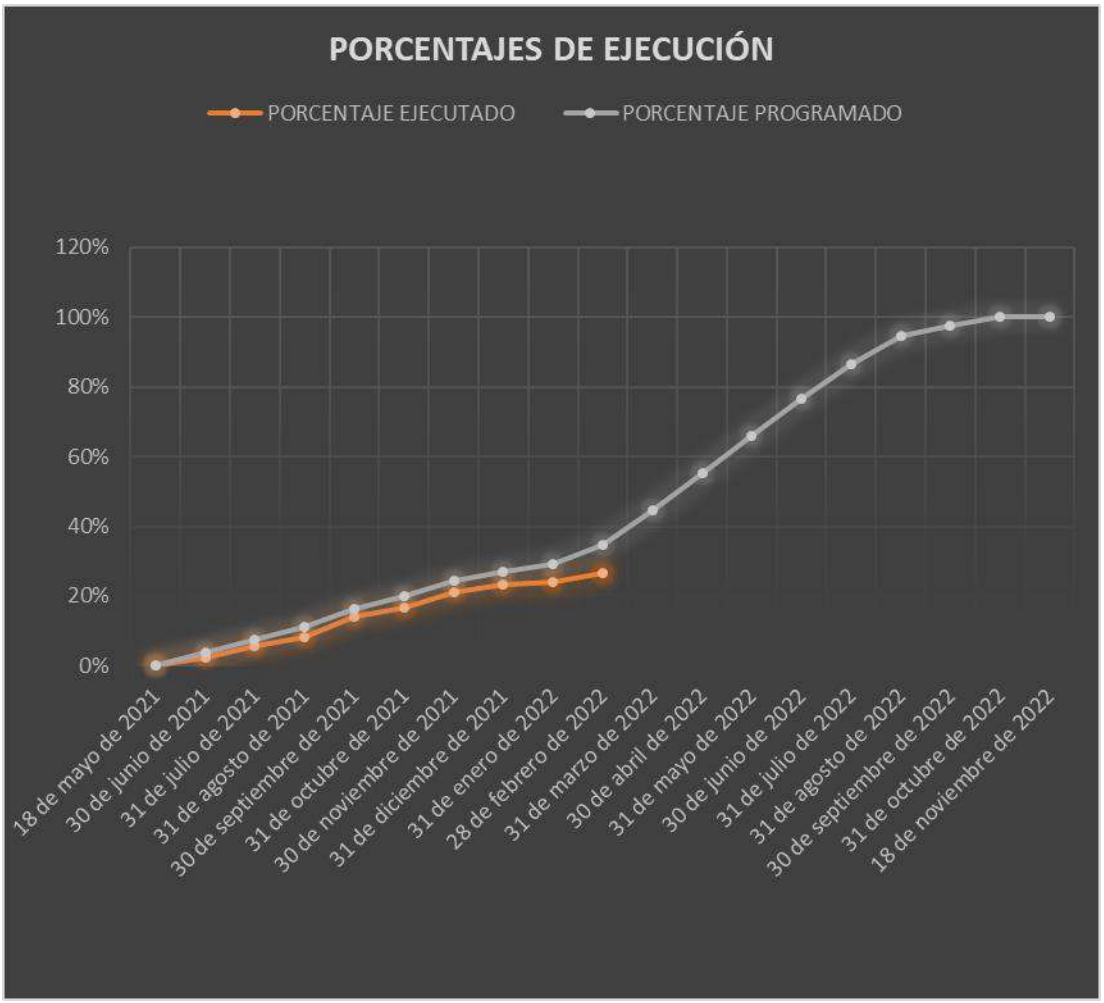


Ilustración 4 Grafica de porcentajes de ejecución VS metas propuestas.

7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80
ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.

b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

c. Revisión de las labores y actividades contratadas.

d. Revisión de la programación de la obra.

7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto ejecutado

VALOR TOTAL	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 4.697.771.440,35
VALOR EJECUTADO SOLO EN EL MES DE FEBRERO 2021	$ 429.474.524,91

ITEM	DESCRIPCION		28 DE FEBRERO: 286 DIAS DE 549 DIAS			52,09%
I.	REALIZAR PRELIMINARES		CASAS	Vr. PARCIAL	% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
1.1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT		74	$ 23.652.869,32	0,134%	27,31%
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO		82	$ 15.123.002,26	0,085%	30,26%
1,3	CORTE, Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRACEO DE LOTES H.PROM 40CM CON MATERI		74	$ 30.768.330,47	0,175%	27,31%
			SUB TOTAL	$ 69.544.202,05	0,393%	
II.	FUNDIR CIMENTACION					
2,1	EXCAVACION MANUAL		74	$ 9.728.238,02	0,055%	27,31%
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		74	$ 34.251.458,26	0,194%	27,31%
2,3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20		74	$ 148.944.003,67	0,844%	27,31%
2,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.06m		60	$ 119.056.953,60	0,675%	22,14%
2,5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI		74	$ 195.602.648,22	1,109%	27,31%
2,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.		74	$ 1.118.345.029,79	6,335%	27,31%
			SUB TOTAL	$ 1.625.928.331,57	9,211%	
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
3,1	MURO DE .10 DE ESPESOR EN ladrillo Hueco de 10.0 x 20 x 30 -MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO		72	$ 362.503.363,03	2,054%	26,57%
3,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 (EN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA)		49	$ 16.129.437,58	0,092%	18,08%
			SUB TOTAL	$ 378.632.800,62	2,146%	
IV.	INSTALAR CUBIERTA					
4,1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO		60	$ 103.636.681,80	0,587%	22,14%
4,2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO		60	$ 10.505.307,60	0,060%	22,14%
			SUB TOTAL	$ 114.141.989,40	0,646%	
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES					
5,1	PISO PARED EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M. Y COCINA H=0.40M, TIPO CORONA O SIMILAR.		49	$ 16.778.082,12	0,096%	18,08%
			SUB TOTAL	$ 16.778.082,12	0,096%	
VI.	INSTALAR PARTE ELÉCTRICAS INTERNA					
6,1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE EMERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.		60	$ 2.940.781,20	0,018%	22,14%
6,2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION		46	$ 9.264.959,82	0,053%	16,97%
6,3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE 3 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20 A		46	$ 5.970.818,40	0,034%	16,97%
6,4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V		46	$ 21.426.292,16	0,122%	16,97%
6,5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		46	$ 10.030.750,80	0,056%	16,97%
6,6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		46	$ 5.307.567,40	0,031%	16,97%
6,7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		46	$ 21.126.813,30	0,121%	16,97%
6,8	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		46	$ 12.142.203,24	0,070%	16,97%
6,9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO APLIQUE Y TUBERIA CONDUIT PVC)		46	$ 1.166.172,68	0,007%	16,97%
			SUB TOTAL	$ 89.376.359,00	0,510%	

Ilustración 5 Avance de presupuesto pt1.

VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS					
7,1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.90*2, INCLUYE , CERRADURA Y ANTICORROSIVO	46	$	32.029.210,28	0,182%	16,97%
7,2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA	38	$	49.877.825,68	0,283%	14,02%
7,3	VENTANA EN ALUMINIO 5020-VIDRIO NATURAL 4MM	46	$	83.227.762,87	0,472%	16,97%
		SUB TOTAL	$	165.134.798,83	0,937%	
VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA					
8,1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	63	$	13.190.458,81	0,074%	23,25%
8,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	63	$	4.969.080,27	0,028%	23,25%
8,3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	63	$	18.855.251,10	0,107%	23,25%
8,4	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	63	$	41.913.027,37	0,237%	23,25%
8,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	63	$	32.999.652,00	0,186%	23,25%
8,6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	63	$	27.166.604,85	0,153%	23,25%
8,7	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 6"	63	$	41.372.728,43	0,235%	23,25%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE Ø 8"X 6"	63	$	16.277.838,57	0,093%	23,25%
		SUB TOTAL	$	196.744.641,40	1,114%	
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA					
9,1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2".	63	$	12.481.805,70	0,070%	23,25%
9,2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	63	$	18.365.054,40	0,105%	23,25%
		SUB TOTAL	$	30.846.860,10	0,174%	
X.	INSTALAR ACCESORIOS					
10,1	LLAVE CONTROL DE 1/2"	42	$	4.831.515,36	0,028%	15,50%
10,2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR	42	$	6.781.839,12	0,039%	15,50%
10,3	LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	42	$	3.057.727,26	0,017%	15,50%
10,4	SANITARIO BLANCO	42	$	6.091.275,54	0,034%	15,50%
10,5	DUCHA ECONOMICA	42	$	1.582.123,62	0,009%	15,50%
10,6	REJILLAS SOSCO 3X 2	42	$	782.079,06	0,005%	15,50%
10,7	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	42	$	1.416.839,76	0,008%	15,50%
10,8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO	42	$	5.714.318,82	0,033%	15,50%
		SUB TOTAL	$	30.257.718,54	0,172%	
XI.	APLICAR ACABADOS					
11,1	PASTA SOBRE MURO EN ACRONAL, A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATECOL, AMONIACO Y NATRASOL (DOS MANOS)	50	$	87.084.148,80	0,493%	18,45%
11,2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA	50	$	19.585.079,08	0,111%	18,45%
11,3	YESO PINTURA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	54	$	159.939.475,56	0,000%	19,93%
		SUB TOTAL	$	266.608.703,44	0,603%	
XII.	INSTALAR TANQUE DE AGUA					
12,1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	39	$	18.389.364,63	0,104%	14,39%
12,2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10 M	59	$	14.624.539,07	0,083%	21,77%
		SUB TOTAL	$	33.013.903,70	0,186%	
TOTAL COSTO DIRECTO			$	3.017.008.390,76		
ADMINISTRACION			$	543.061.510,34		
IMPREVISTO			$	30.170.083,91		
UTILIDAD			$	150.850.419,54		
TOTAL COSTO INDIRECTO			$	724.082.013,78		
TOTAL COSTO NETO			$	3.741.090.404,54		
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA		28	$	12.516.583,80		
IMPLEMENTACIÓN PMA - BIOSEGURIDAD			$	72.536.641,64		
VALOR SUBTOTAL (EJECUTADO POR EL CONTRATISTA)			$	3.826.143.629,98	23,95%	
INTERVENTORIA			$	327.508.987,15		
GERENCIA INTEGRAL			$	327.508.987,15		
ACTIVIDAD 17: APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			$	216.609.836,07		
VALOR TOTAL		Acumulado	$	4.697.771.440,35		
		Mes	$	429.474.524,91		
		% Ejecutado:	26,62%			
		% Mes:	2,43%			

Ilustración 6 Avance de presupuesto pt2.

8. GARANTIAS

8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoría

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

9. POLIZAS

9.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

9.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales.

- Se realizo la cuarta supervisión técnica al proyecto de la mano con comfacesar, la alcaldía municipal, interventoría y el contratista.
  - Anexos, actas de supervisión a cada vivienda.

- Siguiendo la solicitud del municipio de darle prioridad a la construcción de la vivienda de la beneficiaria Nolvis Zambrano del barrio Camilo Torres, dado que la beneficiaria y su familia presentan una situación de salud muy delicada; el contratista realizó la socialización del proyecto con todos los beneficiarios del barrio de la mano con el municipio e interventoría. Donde se les explicó que únicamente será intervenida la vivienda de la beneficiaria Nolvis dado que hay barrios ya socializados esperando por intervención; a lo que los beneficiarios estuvieron de acuerdo.



Ilustración 7 Socialización barrio Camilo Torres

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

13.2.1. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE (Identificada como la vivienda #11)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.2. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JESUS ALBERTO PEREZ REAL (Identificada como la vivienda #13)



Ilustración 8 Levantamiento de mampostería.

13.2.3. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ (Identificada como la vivienda #14)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.4.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANGELICA MARIA CARO GOMEZ (Identificada como la vivienda #15)



Ilustración 9 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 10 Instalación de combo sanitario.



Ilustración 11 Definición de acabados.



Ilustración 12 Instalación de tanque de agua.

13.2.5. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ (Identificada como la vivienda #27)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.6. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES (Identificada como la vivienda #28)



Ilustración 13 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.7. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUBY SANCHEZ (Identificada como la vivienda #29)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.8. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #32)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.9. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CONSUELO BALLENA CLAVIJO (Identificada como la vivienda #35)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA (Identificada como la vivienda #38)



Ilustración 14 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 15 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 16 Definición de acabados.

13.2.11. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ (Identificada como la vivienda #39)



Ilustración 17 Instalación de enchape.



Ilustración 18 Instalación de accesorios.



Ilustración 19 definición de acabados internos.



Ilustración 20 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 21 Instalación de tanque.

13.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DIANA CAROLINA SUAREZ USMA (Identificada como la vivienda #40)



Ilustración 22 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 23 Definición de acabados internos.



Ilustración 24 Instalación de enchape.



Ilustración 25 Instalación de cableado eléctrico.

13.2.13. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ORLANDO NIETO GARCIA (Identificada como la vivienda #41)

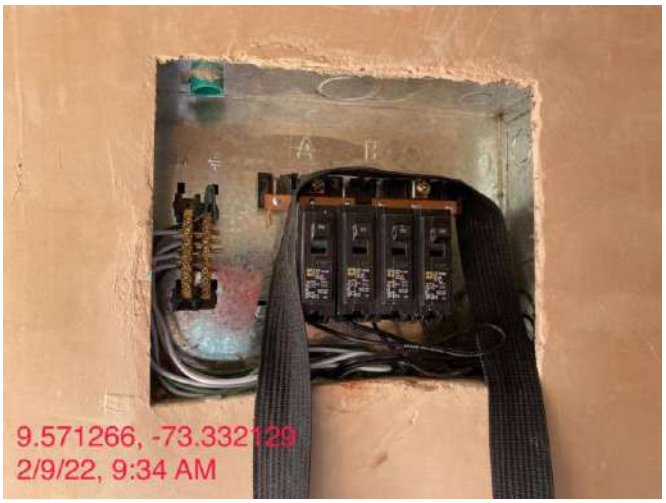


Ilustración 26 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 27 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 28 Instalación de combo sanitario.

13.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JORGE ENRIQUE GELVIS (Identificada como la vivienda #42)



Ilustración 29 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 30 Definición de acabados internos.

13.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA (Identificada como la vivienda #43)



Ilustración 31 Definición de acabados internos.



Ilustración 32 Instalación de accesorios.

13.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DELFINA MENDOZA LLANES (Identificada como la vivienda #44)



Ilustración 33 Instalación de enchape.



Ilustración 34 Instalación de puertas y ventanas.

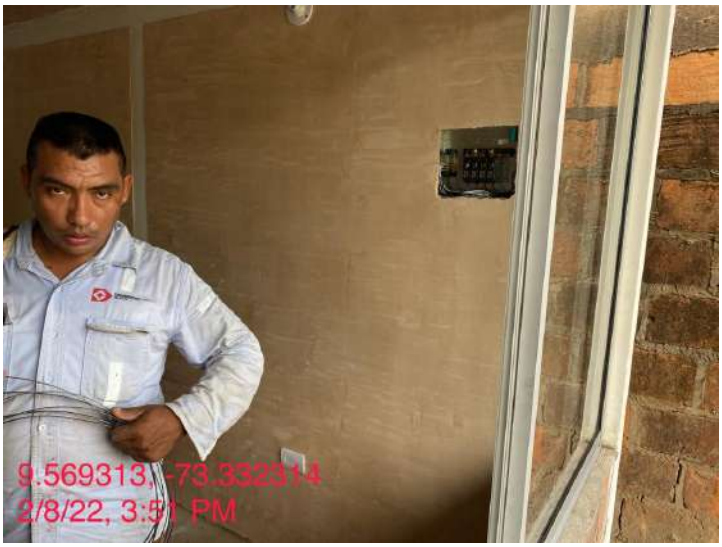


Ilustración 35 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 36 Instalación de accesorios.



Ilustración 37 Instalación de tanque.

13.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE (Identificada como la vivienda #45)



Ilustración 38 Definición de acabados de fachada.



Ilustración 39 Instalación de cableado eléctrico.



Ilustración 40 Definición de acabados internos.

13.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO (Identificada como la vivienda #46)



Ilustración 41 Instalación de red eléctrica.



Ilustración 42 Definición de acabados de fachada.



Ilustración 43 Instalación de accesorios.

13.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA (Identificada como la vivienda #47)



Ilustración 44 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DENIS CECILIA JIMENEZ ANDRADE (Identificada como la vivienda #48)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES DAMIAN ABRIL (Identificada como la vivienda #49)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ (Identificada como la vivienda #50)



Ilustración 45 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUCINDO MONTERO SALDAÑA (Identificada como la vivienda #51)



Ilustración 46 Instalación de tanque elevado.



Ilustración 47 Instalación de combo sanitario.



Ilustración 48 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 49 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 50 Instalación de cableado eléctrico.

13.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JHON FREDY RIOS GARCIA (Identificada como la vivienda #52)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILMER RIOS SANCHEZ (Identificada como la vivienda #53)



Ilustración 51 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 52 Definición de acabados en la parte interna de la vivienda.

13.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TRINIDAD ANTONIA RODRIGUEZ ARENGAS (Identificada como la vivienda #54)



Ilustración 53 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 54 Definición de acabados en la parte interna de la vivienda.

13.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LINA MARCELA SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #55)



Ilustración 55 Levantamiento de mampostería.

13.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDILSON PEDROZA ROBLES (Identificada como la vivienda #56)



Ilustración 56 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria AMALIA MORA ARDILA (Identificada como la vivienda #57)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YANIS MABEL THOMAS SAMPAYO (Identificada como la vivienda #58)



Ilustración 57 Levantamiento de muros.

13.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALBA YASMIN CRUZ PAEZ (Identificada como la vivienda #59)



Ilustración 58 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MELIZA PADILLA MANCERA (Identificada como la vivienda #60)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.33. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ESPERANZA ISABEL BELEÑO DELGADO (Identificada como la vivienda #61)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.34. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MINELLIS CECILIA MARTINEZ MEJIA (Identificada como la vivienda #62)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

13.2.35. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEOMAR YIGETH VILLAREAL PERTUZ (Identificada como la vivienda #63)



Ilustración 59 Levantamiento de muros.

13.2.36. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS (Identificada como la vivienda #64.

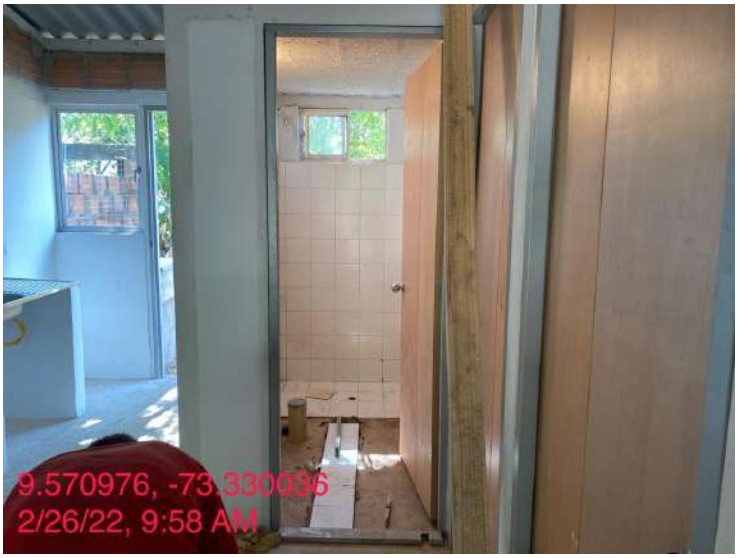


Ilustración 60 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 61 Instalación de accesorios.



Ilustración 62 Definición de acabados en la parte interna de la vivienda.

13.2.37. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES (Identificada como la vivienda #65)



Ilustración 63 Cableado eléctrico de la vivienda.



Ilustración 64 Definición de la parte interna de la vivienda.



Ilustración 65 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.38. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ (Identificada como la vivienda #66



Ilustración 66 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 67 Definición de acabados al interior de la vivienda.



Ilustración 68 Cableado eléctrico de la vivienda.

13.2.39. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEUBID JUDITH RAMOS MELENDEZ (Identificada como la vivienda #67)



Ilustración 69 Levantamiento de muros.

13.2.40. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIBETH MARTINEZ VEGA (Identificada como la vivienda #68)



Ilustración 70 Levantamiento de muros.

13.2.41. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ (Identificada como la vivienda #69)



Ilustración 71 Definición de acabados en la parte interna de la vivienda.

13.2.42. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ROSA ELENA PEREZ ESTRADA (Identificada como la vivienda #70)



Ilustración 72 Levantamiento de muros.

13.2.43. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARMEN ELENA VEGA TORRES (Identificada como la vivienda #71)



Ilustración 73 Instalación de red hidrosanitaria.

13.2.44. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CINDY PAOLA JIMENEZ LUGO (Identificada como la vivienda #72)



Ilustración 74 Levantamiento de muro.



Ilustración 75 Instalación de red hidrosanitaria.

13.2.45. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES HURTADO GALVAN (Identificada como la vivienda #73)



Ilustración 76 Levantamiento de muros.

13.2.46. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARLOS EFRAIN USTATE MARTINEZ (Identificada como la vivienda #74)



Ilustración 77 Levantamiento de muros.

13.2.47. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIAN PAOLA MORENO REGALADO (Identificada como la vivienda #75)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de febrero.

14. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

14.1. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 78 Chequeo de perfiles metálicos.

14.2. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.

Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.



Ilustración 79 Chequeo de nivel de perfiles metálicos.

14.3. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.

Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 80 Chequeo de mampostería.

14.4. Chequeo de refuerzo de mampostería.

Se revisa y garantiza que en el levantamiento de muros este presente el refuerzo de una varilla de ¼" cada dos hiladas.



Ilustración 81 Chequeo de refuerzo de mampostería.

14.5. Chequeo de tapones de estructuras metálicas.

Una vez levantadas las estructuras metálicas, se verifica que se coloquen los tapones en los lugares donde se requiera para evitar la infiltración de agua al interior de los perfiles metálicos.



Ilustración 82 Chequeo de tapones.

14.6. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio.

- Anexos

15. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles mayor resistencia a las bases de la vivienda:

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.
- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.
- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

16. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

16.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: EDUARDO CAYON
- Maestro General: FRANCO LUIS MEJIA RAMOS, C.C: 19.516.430
- Inspector de Obra: RAMIRO SEGUNDO DE LA HOZ OROZCO, C.C:1.081.913.176
- Residente de obra: Dairo Pimienta
- Residente SISO: LORENZA CASTILLA NOVIA, C.C: 35.518.565
- Cuadrillas de mampostería:
- Hector Pineda
- Richard Bolaño
- Luis Atencio
- Cuadrilla de enchape:
- Yorky Morales
- Ruben Gamez
- Cuadrilla de electricidad:
- Wilmer Estrada
- Duvan Florez
- Epimenio Herrera
- Filos en ventanas y varios:
- Fernando Rapalino
- Motocarga:
- Javier Morales
- Dainer Navarro
- Plomero:
- Gustavo Colina
- Equipo de pintura y acabados:
- Edgar Artiaga
- Fernando Navarro
- Jhonatan Robles

16.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoría: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoría: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS.

En la última semana del mes de diciembre del 2021 en el marco de las festividades por cumpleaños del municipio se realizó la primera entrega de viviendas, una vez revisadas y recibidas por interventoría: comfacesar y la alcaldía municipal. En esta primera protocolización, se les entregó la vivienda a veintiocho (28) beneficiarios, los cuales son los siguientes:

Tabla 10. Relación de viviendas protocolizadas.

No. VIVIENDA	BENEFICIARIO	BARRIO
1	EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES	BELLO HORIZONTE
2	YARELYS CUBILLOS ARDILA	BELLO HORIZONTE
3	CRISTO HUMBERTO RIOS	BELLO HORIZONTE
4	MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO	BELLO HORIZONTE
5	YORAIMA POLO ROJANO	BELLO HORIZONTE
6	JOSE DAVID URRUTIA	BELLO HORIZONTE
7	VIVIANA MENDIBIL GUEVARA	BELLO HORIZONTE
8	MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ	BELLO HORIZONTE
9	RUTH MARINA PEREZ RAMOS	BELLO HORIZONTE
10	JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	BELLO HORIZONTE
11	DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA	BELLO HORIZONTE
12	MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ	EL PROGRESO
13	YENIFER ARRIETA BUSTOS	EL PROGRESO
14	ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ	EL PROGRESO
15	YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO	EL PROGRESO
16	LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS	EL PROGRESO
17	MILEIDYS YONARIS RAMIREZ MENDOZA	EL PROGRESO
18	LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	EL PROGRESO
19	JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ	BRISAS DEL NORTE
20	ANYLUZ DAZA CARREÑO	BRISAS DEL NORTE
21	JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA	BRISAS DEL NORTE
22	LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ	BRISAS DEL NORTE
23	LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO	BRISAS DEL NORTE
24	OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON	BRISAS DEL NORTE
25	ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA	VILLA ESPERANZA
26	CARMEN ALICIA GARCIA RODRIGEZ	VILLA ESPERANZA
27	CECILIA RIOS RAVELO	VILLA ESPERANZA
28	INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO	VILLA ESPERANZA

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS

A lo largo de la ejecución del proyecto se han realizado diversas modificaciones a lo establecido en los planos por distintas razones. Ya sea por las condiciones únicas de la ubicación del lote de cada beneficiario, por facilidad y mayor seguridad o por incongruencias que se han encontrado en los diseños establecidos.

Las modificaciones que se han realizado a lo largo del proyecto son las siguientes:

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS

En la ejecución del proyecto se presentaron viviendas en las cuales la estructura metálica se levantó con columnas unidas mediante cordones de soldadura y en todas las viviendas se han utilizado flanches (los cuales transmiten la carga de las columnas a las cimentaciones) con soportes de varillas de 3/8' corrugadas soldadas por debajo del elemento, en vez de utilizar un sistema apernado. Ante lo cual, el municipio manifestó su preocupación, por lo que el contratista decidió solicitar el concepto de un ingeniero especialista en estructuras para aclarar si era necesario cambiar estos elementos o su funcionamiento sigue cumpliendo su propósito bajo las condiciones dadas. Dicho concepto fue revisado por interventoría y por COMFACESAR los cuales le otorgaron validez.

- Anexo. Concepto estructural con anexo de aprobación interventoría y COMFACESAR.

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- En el mes de febrero no se presentaron contratiempos por mal estado del tiempo o cualquier otro evento de fuerza mayor.

En total, desde que inició el proyecto hay un total de **142.5** horas perdidas por fuerza mayor.

ANEXOS


Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

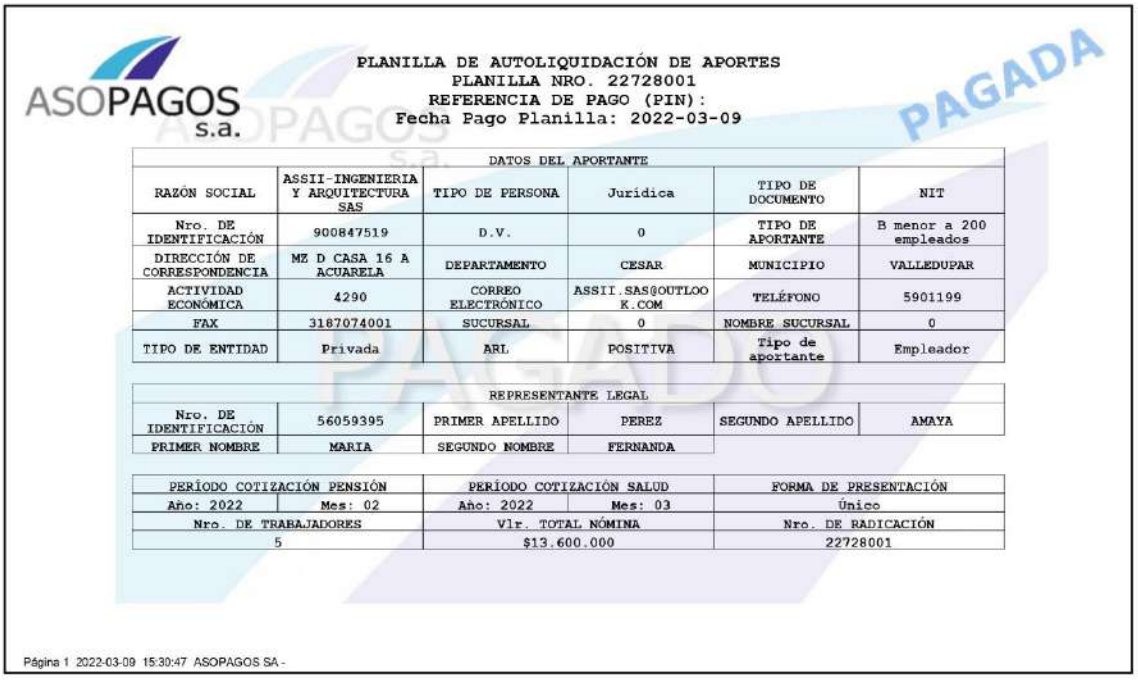

ASOPAGOS s.a.

PAGADA


PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22728001
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-03-09

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900847519	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ D CASA 16 A ACUARELA	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ASSII.SAS@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	5901199
FAX	3187074001	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	56059395	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$13.600.000		22728001

Página 1 2022-03-09 15:30:47 ASOPAGOS SA -

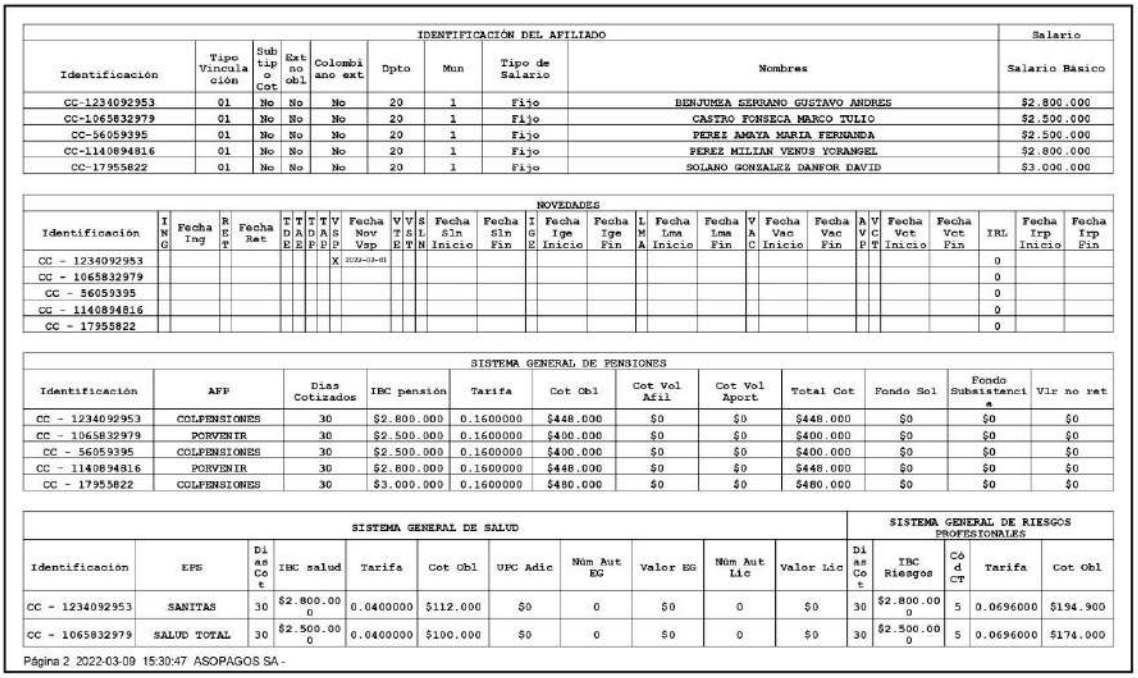

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obligado	Colombiano en el exterior	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1234092953	01	No	No	No	20	1	Fijo	BENJUMEA SERRANO GUSTAVO ANDRES	$2.800.000
CC-1065832979	01	No	No	No	20	1	Fijo	CASTRO FONSECA MARCO TULIO	$2.500.000
CC-56059395	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	$2.500.000
CC-1140894816	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ MILIAN VENUS YORANGEL	$2.800.000
CC-17955822	01	No	No	No	20	1	Fijo	SOLANO GONZALEZ DANFOR DAVID	$3.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1234092953									X	2022-02-01																			0		
CC - 1065832979																													0		
CC - 56059395																													0		
CC - 1140894816																													0		
CC - 17955822																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1234092953	COLPENSIONES	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 1065832979	PORVENIR	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 56059395	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1140894816	PORVENIR	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 17955822	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1234092953	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	5	0.0696000	$194.900
CC - 1065832979	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5	0.0696000	$174.000

Página 2 2022-03-09 15:30:47 ASOPAGOS SA -

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 56059395	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5	0.0696000	$174.000
CC - 1140894816	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	5	0.0696000	$194.900
CC - 17955822	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0052200	$15.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1234092953	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065832979	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-56059395	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1140894816	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17955822	COMFACESAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1.328.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.328.000
PORVENIR	2	$848.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$848.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$220.000	$0	0	$0	0	$0	$220.000	0	$0	$0	$220.000	$0	0	$0	$0	$220.000	$0	$0	$220.000
SALUD TOTAL	1	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000
SANITAS	2	$224.000	$0	0	$0	0	$0	$224.000	0	$0	$0	$224.000	$0	0	$0	$0	$224.000	$0	$0	$224.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	$753.500	0	$0	$0	$753.500	0	$0	$753.500	0	$0	$7.535	$753.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	5	$544.000	0	$0	$544.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$544.000
PENSIONES	2	$2.176.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$753.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$544.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com


TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.017.500

Página 5 2022-03-09 15:30:47 ASOPAGOS SA -

A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

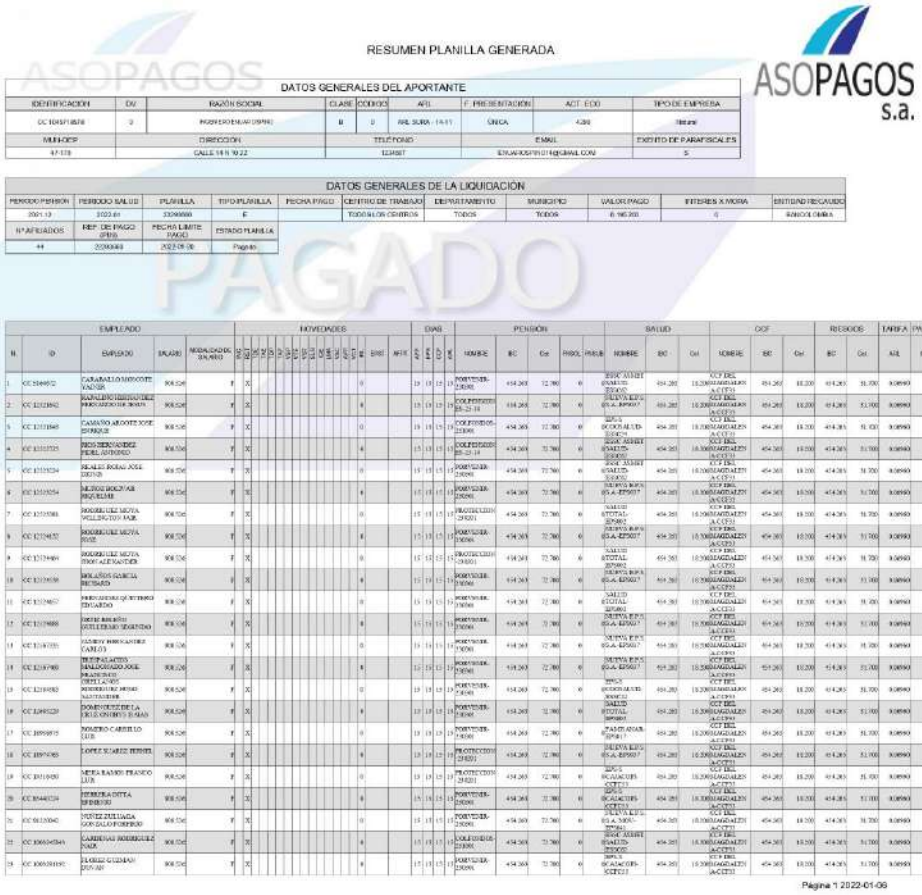

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1065754878	0	INGENIERO MAURICIO [illegible]	B	0	ARL SURA - 14-01	ÚNICA	4390	Natural
MULTI-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
47-170		CALLE 16 B 19 22		3234567		ESCARGOSPINTE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2022-01	33296888	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	$ 140.000	0	BANCO OMEGA


N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
44	203000849	2022-01-06	Pagado

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		CAJA	PVP/AF	SENA	ICBF	ESAP	MEN			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INCAP	LICR	LNR	LMAT	VACR	VACL	AFC	AFP	APO	VDP	NOMBRE	IBC	Cot	PRES	PMUL	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tarifa	Sal. Trabajo	Total	Factor de Pensionado
1	CC 1064652	CARABALLO MONTERO XAVIER	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC ASMET SALUD-EPSI05	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
2	CC 1222862	CAPACHO HERNANDEZ PRISCILA DEL [illegible]	908.526	F	X																0			COLPENSIO-05-23-10	454.263	72.700	0		SALUD TOTAL-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
3	CC 1231845	CASIANO ARDOTT JOSE ENRIQUE	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC SOCIEDAD-EPSC14	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
4	CC 1231725	RIOS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO	908.526	F	X																0			COLPENSIO-05-23-10	454.263	72.700	0		EPSC ASMET SALUD-EPSI05	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
5	CC 1233234	REALES ROSA JOSE DAVID	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC ASMET SALUD-EPSI05	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
6	CC 1233254	MEJIDO BOLIVAR MIGUELINA	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
7	CC 1233586	RODRIGUEZ MOYA WELLINGTON RAUL	908.526	F	X																0			PROTECCION-24031	454.263	72.700	0		SALUD TOTAL-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
8	CC 1234632	RODRIGUEZ MOYA RAUL	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
9	CC 1233464	RODRIGUEZ MOYA ISAAC ALEXANDER	908.526	F	X																0			PROTECCION-24031	454.263	72.700	0		SALUD TOTAL-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
10	CC 1231 [illegible]	ROLANDO GARCIA RICHARD	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
11	CC 1233467	[illegible] QUINTERO EDUARDO	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		SALUD TOTAL-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
12	CC 1231888	ORTIZ ROJAS GUILLERMO SEGUNDO	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
13	CC 1231555	[illegible] BARRANTES CARLOS	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
14	CC 1231980	TRESPALACIOS MALDONADO JOSE FRANCISCO	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
15	CC 1231982	[illegible] MOSQUERA [illegible]	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC SOCIEDAD-EPSC14	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
16	CC 1233229	DOMINGUEZ DE LA CRUZ ANTONIO JUAN	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		SALUD TOTAL-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
17	CC 1233515	ROMERO CARRILLO LUIS	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		FAMISANAR-CCF01	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
18	CC 1234765	LOPEZ SUAREZ ISMAEL	908.526	F	X																0			PROTECCION-24031	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
19	CC 1231430	MEJIA RAMOS FRANCO LUIS	908.526	F	X																0			PROTECCION-24031	454.263	72.700	0		EPSC SOCIEDAD-EPSC14	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
20	CC 1044 [illegible]	HERRERA OTTA [illegible]	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC SOCIEDAD-EPSC14	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
21	CC 1233040	NUÑEZ ZULUAGA GONZALO FEDERICO	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		NUEVA EPS-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
22	CC 1065 [illegible]	CARDENAS RODRIGUEZ NAIA	908.526	F	X																0			COLPENSIO-05-23-10	454.263	72.700	0		EPSC ASMET SALUD-EPSI05	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1
23	CC 1065 [illegible]	PEREZ CUADRADO [illegible]	908.526	F	X																0			FONTIVIDR-24040	454.263	72.700	0		EPSC SOCIEDAD-EPSC14	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA A-CCF01	454.263	18.200	454.263	31.700	0,00500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	140.000	1

EMPLEADO					NOVEDADES		DIAS				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	IRL	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Fondo de Pensiones
24	CC [illegible]	PIMIENTA SIERRA DAIRO	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA EPS S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
25	CC [illegible]	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA EPS S.A. MOV-EPSS41	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
26	CC [illegible]	GARCIA IBARRA SANDRY LORENA	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
27	CC [illegible]	IBAÑEZ EUCLIDES	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
28	CC [illegible]	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	COLFONDOS-231001	454.263	72.700	SALUD TOTAL-EPS002	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
29	CC [illegible]	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
30	CC [illegible]	RAMOS ROSADO [illegible]	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PROTECCION-230201	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
31	CC [illegible]	VEGA MOJICA EDWIN JOSE	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
32	CC [illegible]	ROMERO LOZANO JORGE LEONARDO	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
33	CC [illegible]	MARIN RIOS RICARDO ANDRES	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
34	CC [illegible]	BALLENA QUINTERO JHOVERS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
35	CC [illegible]	PEREZ RHUAS JOSE MIGUEL	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	SALUD TOTAL-EPS002	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
36	CC [illegible]	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
37	CC [illegible]	COLINA COLINA GUSTAVO JAVIER	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PROTECCION-230201	454.263	72.700	SALUD TOTAL-EPS002	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
38	CC [illegible]	ARIAS CABARCAS JUAN ERNESTO	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
39	CC [illegible]	SENCIAL VIDES NELIO LUIS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PROTECCION-230201	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
40	CC [illegible]	RUDA JIMENEZ DANIEL DE JESUS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
41	CC [illegible]	MERCADO SUAREZ PEDRO PABLO	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
42	CC [illegible]	PIMIENTA RADA JAVIER DE JESUS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	NUEVA EPS S.A. MOV-EPSS41	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
43	CC [illegible]	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S
44	CC [illegible]	CRIADO GUERRERO JUAN CARLOS	908.526	F	X	0	15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	EPS-S COOSALUD-ESSC24	454.263	18.200	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	454.263	18.200	454.263	31.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	140.800	S

Página 2 2022-01-06

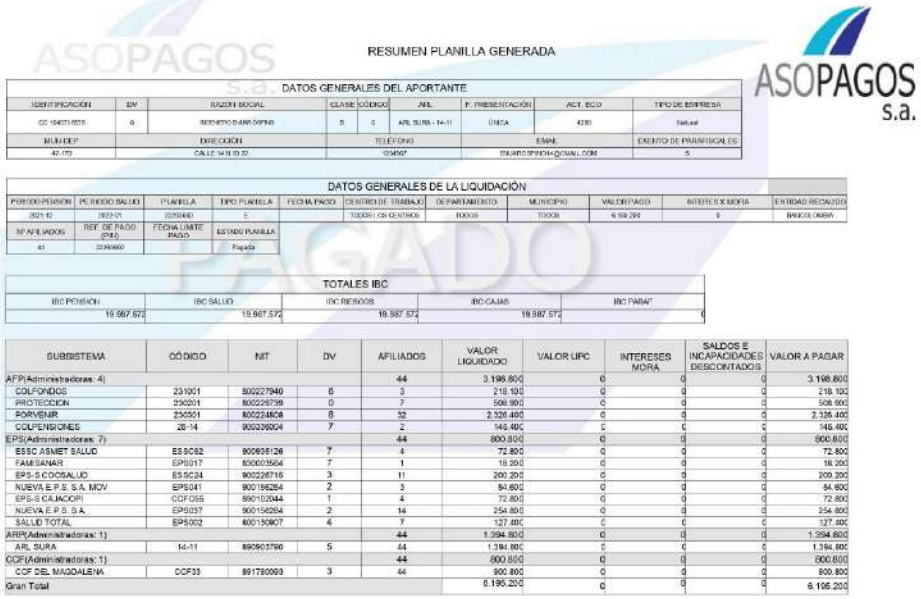

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1643715578	0	BENEDITO AMPUDIA	5	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Natural

MUNDEP	DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
47-170	CALLE 14 N 15 32	1234567	EDUARDOPINTO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2022-01	2259460	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.195.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
44	2259460		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.987.572	19.987.572	19.987.572	19.987.572	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				44	3.196.800	0	0	0	3.196.800
COLFONDOS	230301	800227940	6	3	218.100	0	0	0	218.100
PROTECCION	230201	800256739	0	7	508.900	0	0	0	508.900
PORVENIR	230501	800224808	8	32	2.326.400	0	0	0	2.326.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	145.400	0	0	0	145.400
EPS(Administradoras: 7)				44	800.800	0	0	0	800.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	4	72.800	0	0	0	72.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	18.200	0	0	0	18.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	11	200.200	0	0	0	200.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	54.600	0	0	0	54.600
EPS-S CAJACOPI	COFOS5	890102044	1	4	72.800	0	0	0	72.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	14	254.800	0	0	0	254.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	127.400	0	0	0	127.400
ARP(Administradoras: 1)				44	1.394.800	0	0	0	1.394.800
ARL SURA	14-11	860903790	5	44	1.394.800	0	0	0	1.394.800
CCF(Administradoras: 1)				44	800.800	0	0	0	800.800
CCF DEL MAGDALENA	CCF33	891780093	3	44	800.800	0	0	0	800.800
Gran Total					6.195.200	0	0	0	6.195.200

A3- PÓLIZAS CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR
VALLEDUPAR
CESAR
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCGO07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CJP189

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGO05-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CJ0189

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CJ 0189.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

A4- PÓLIZAS INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.089 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red. · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101520061730 5(3900)0000068881 39(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061730-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 089 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSI-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-40-101005082

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0	MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8	CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101520061732 1(3900)000000453677(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

A5- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Abril de 2020	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN.....	4
1	INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.....	5
2	OBJETIVOS.....	8
3	ALCANCE.....	8
4	DEFINICIONES.....	8
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S.....	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.....	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA.....	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S	16
9	MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION EN INTERVENTORÍAS.....	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS....	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS.....	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora "ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoría Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoría de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoría con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoría que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoría.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.

➢ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoria.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoría y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoría que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoría.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoría en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**., proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoría
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoría
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoría se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoría
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoría se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoría

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehículo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoría se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoría

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorías y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoría, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoría (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoría se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoría

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

reportarán al director de interventoría y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
  19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoría, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.

- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.

- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoría con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoría avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoría, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.

assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
  seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
  generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
  organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoría descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoría en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoría para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoría.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoría, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoría.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo  Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Gerente Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

A6- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

LA JAGUA DE IBIRICO,
JUNIO 2021.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Junio 2021	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	4
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	5
2	OBJETIVOS	8
3	ALCANCE	9
4	DEFINICIONES	9
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DEL CONSORCIO VIVIENDA VIVEURB 2021	16
9	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de
bioseguridad de la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2020", ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	901.481.526 - 3
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	5901119
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Cayón Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas	V

1.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar

Actualmente se encuentra adelantando obras de construcción de 271 soluciones de viviendas del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado "CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDAS URBANA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m, para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la obra.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la obra.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y desinfección.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de obra y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personaspositivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
- Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de

construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra.

1.4.6. Proveedor

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las obras en construcción por parte del CONSORCIO VIVEURB 2021, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo al decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DEFINICIONES

***Aislamiento*:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

***Hipoclorito*:** es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de dos (2) carteleras informativa en el área de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse laboca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la obra se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Obra
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de obra
5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Obra
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y	Permanente	Supervisor de Obra

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.		
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Obra
5.14.	El vehículo operativo de la obra solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de obra
5.15.	En la obra se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Obra
5.16	Se dispondrá en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de obra
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST
5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la obra, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONAVIRUS y seráa quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la obra se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de obra

6. **MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES**

- **CONSORCIO VIVEURB 2021** cumplirá con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19

7. La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algúntrabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
8. Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
9. Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la obra se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
10. Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
11. No se realizarán reuniones innecesarias en la obra, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
12. Los Supervisores y Líderes de Áreas en las obras garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
13. Los Líderes de Obras estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos, se comunicarán en la Re-inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re-inicio de las actividades en la obra.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar las actividades necesarias en la obra, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.
- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Obras y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se les informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

La totalidad de los trabajadores de CONSORCIO VIVERURB 2021, deben de implementar lassiguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DE CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias paraminimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de la obra se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a la obra

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se reportarán al director de obra y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.
- Todas las personas que ingresen a la obra deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de la Obra:

- Todo personal al salir de la obra debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.
- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra.
- La entrega de información será efectuada por el director de la de obra, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.
- Cada zona de la obra contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la obra con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la obra avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.
- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.
- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de obra, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.
- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA OBRA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Obra, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.

- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología
- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de CONSORCIO VIVEURB 2021, se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN OBRA Y ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas a seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la obra descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de obra en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a obra para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la obra.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de obra, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la obra a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de obra.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por:	**Revisado y aprobado por:**
César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	Luis Eduardo Cayón Medina MP N° 25202-280053 CND
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Firma Fecha: Junio de 2021	Representante Legal Firma: Fecha: Junio de 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A7- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.**, en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.**, in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ANSI ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION

DIACO S.A.		**Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**	
Anexo Certificado *Certificate*	**CSR - CER269688**		
Fecha de Aprobación: *Approval Date:*	**2013-09-27**	**Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:*	**2018-03-09**
Fecha de Renovación: *Renewal Date:*	**2016-08-17**	**Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:*	**2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	**Consecutivo Nº:**	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	**Remisión:**	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	**Cliente:**	HIERROS HB S.A-SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmX6m	**N° Orden:**	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, mín.
50	0,25	1,35	0,035	0,04	275	380	16

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000318391
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA)

FECHA 26.02.2021
PAG. 1 DE 1

MATERIAL: 110941 - Metaltub N 100x100-4.0 6000 A500C						
NORMA DE CALIDAD: ASTM A500/NTC 4526 GRADO C						
LOTE No	0006909195					
COLADA No	538407					
PESO	2.557,800 kg					
PORCENTAJE DE CARBONO	0,160 %					
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,880 %					
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,020 %					
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %					
LÍMITE ELÁSTICO	443 MPa					
RESISTENCIA MÁXIMA	602 MPa					
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	25 %					

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6829 - CEL. 300 810 17 92

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:**	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACION DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	**LOCALIZACIÓN:**	
		COLOR:	ANARANJADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	**NOTA:**	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ma	Kg	3,534	3,604	3,621	3,572	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,506	6,501	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,210	0,236	0,245	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,30	11,82	12,34	11,96	11,78
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmáx	N	89600	83500	74500	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49381	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2897000	2942000	2908000	2893000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	198	200	195	196	198	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14611,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,61	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIt. 900891457-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

icontec
Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PLACAS ONDULADAS DE FIBRO CEMENTO

Fabricado por **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, en la **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

Manufactured by **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, in the **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4694 (2002)

Placas onduladas de fibrocemento para cubiertas y revestimientos

Fiber-cement corrugated sheets for covering and sheaating

SECTOR ICS 91.100.40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER326441
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2014-08-08	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2020-08-14
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2017-07-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2023-08-07

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ES-I-PD-04-F-con Versión 3

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A8- AFILIACIÓNES DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

*La empresa **CONSORCIO VIVEURB 2021** identificada con Nit nro 901.481.526-3 con número de afiliación **9006465**, se encuentra afiliada con la ARL AXACOLPATRIA, desde el 0**7 de Julio** y que el personal relacionado a continuación se encuentra afiliado bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, según se describe a continuación:*

IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE INICIO	TASA DE RIESGO
12550976	CC	EDUARDO	JOSÉ	CAYON	MARQUEZ	7/07/2021	6,960%
15704553	CC	LUIS	ALBERTO	VERGARA	CARRASCAL	7/07/2021	6,960%
1065589300	CC	CLARA	INES	CAYON	OCHOA	7/07/2021	6,960%
1006105497	CC	ANDREA	CAROLINA	SANCHEZ	ROJAS	7/07/2021	6,960%
1065607433	CC	GILBERTO	ANTONIO	IBARRA	MEDINA	7/07/2021	6,960%

La presente se expide a solicitud de la empresa, a seis (06) días del mes de julio de 2021.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, con gusto será suministrada en nuestro centro de atención al cliente, 4235757 opción 4



Dirección Operativa
Administradora de Riesgos Laborales
AXA COLPATRIA
Elaborado por DIVE.



ARL | sura

Medellín, 08 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	05/10/2021		22917623	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes.C10457185782206775555

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2022 20:59:15
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



ARL | sura

Medellín, 08 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C12534536	BOLAÑO GARCIA RICHARD	09/03/2022		21214623	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2022 20:56:39
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



ARL | sura

Medellín, 08 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización	6,96 %
C1064120798	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	09/03/2022		2301-6013	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2022 20:57:42.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



ARL | sura

Medellín, 08 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	05/10/2021		22917623	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782206775555

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2022 20:59:16
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A9- BITACORA DE OBRA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

BITACORA DE OBRA.

Datos de la obra:

Objeto: Construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio.

Localización: Cabecera municipal de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Contrato de Obra: No. 088 de 2021.
Valor: $15.977.378.542.00.
Duración: Dieciocho (18) meses.
Fecha de inicio: Dieciocho (18) de Mayo de 2021
Fecha de conclusión: Dieciocho (18) de Noviembre de 2022

Datos del contratista:

Nombre: Consorcio Vivienda 2021 La Jagua de Ibirico
Dirección: Carrera 11 # 15 - 66 / Edificio Granaherrar / Oficina 505
Telefono: 5901119
Representante Legal: Luis Eduardo Cayón Medina.

Datos del interventor:
Nombre: ASSII - Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
Dirección: Manzana D Casa 16 A / Conjunto Cerrado Acuarela
Telefono: 3004403421
Gerente General: Maria Fernanda Perez Amaya.

Responsables de Obra:
Director de Obra: Jorge Luis Medina :

Residente de interventoria: Gustavo Andres Benjumea Serrano: Gustavo Benjumea

Residente de Obra: Luis Vergara :

Escaneado con CamScanner

Nota No.0001 Fecha: 28/05/2021

Hoy, viernes 28 de mayo de 2021 siendo las 7:30am se da apertura a la bitacora de obra. En la cual se expondrá las actividades realizadas en la construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la zagua de Ibirico, departamento del Cesar. Dicho proyecto tiene como meta contratada el inicio y la finalización en un plazo no mayor a 18meses.

Gustavo Bayuelo

Nota No.0002 Fecha: 28/05/2021

Con esta nota se hace constancia que entre las 8:00am y las 9:00am el contratista realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios del barrio Bello Horizonte. Donde, además, estuvieron presente representantes de la alcaldía municipal, el presidente de la junta de acción comunal y la interventoría.

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0003	Fecha: 31/05/2021 Personal del contratista, empezó a visitar a los beneficiarios en sus respectivos lotes propios a la altura de las 9:30am. Donde se les pide llenar un acta de poder para que COMFACESAR adelante el proceso de las escrituras del predio. Ademas, el contratista verifica que el lote cumpla con los requisitos, recolecta información general del lote y realiza las actas de vecindad correspondientes. Cristian Bayona
Nota No.0004	Fecha 31/05/2021 El lote de la beneficiaria Maria Angelica Coro cumple con las dimensiones para la construcción de la vivienda. Sin embargo, la beneficiaria manifiesta que no quiere demoler una sección del predio correspondiente a cocina, habitación, baño y patio; debido que está construido en material. Lo que deja un area disponible para construir en el predio de 7,20m de ancho por 4.30m de fondo, lo que implicaría un nuevo diseño para esta vivienda en especifico. Cristian Bayona
Nota No.0005	Fecha 01/06/2021 El vecino al este del beneficiario Eudaldo Escobar no permite el ingreso a los alrededores de su predio para la realización de las actas de vecindad. Cristian Bayona
Nota No.0006	Fecha 02/06/2021 Con esta nota se hace constancia que a las 11:00 AM llegaron los materiales requeridos para empezar la construcción de la casa modelo. A la vez empezó el trabajo de nivelado del terreno el cual fue suspendido a las 2:00PM por lluvia.


Escaneado con CamScanner

4

Nota No. 0007 Fecha: 04/06/2021

A las 10:00 AM inició la socialización con los beneficiarios del barrio El Progreso y al terminar se procedió a caracterizar a los beneficiarios en sus respectivos lotes. Donde se encontró que la beneficiaria Andrea Pangel cuenta con un lote que no cumple las dimensiones requeridas (En el Dibujo No. 1 se plasman las dimensiones del lotes). Por otro lado, el trazado en la casa modelo quedó listo y se iniciaron las excavaciones.

Gustavo Bejarano

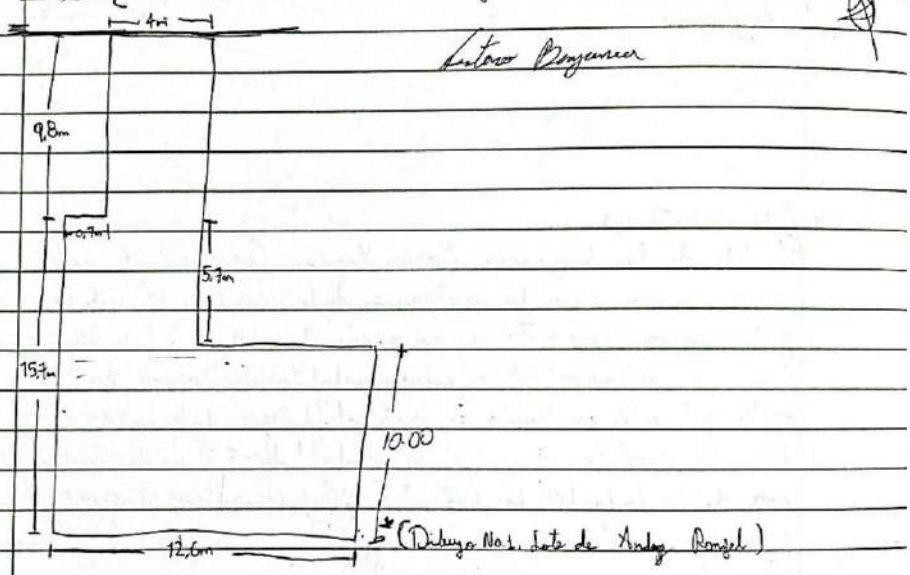

(Dibujo No. 1. Lote de Andrea Pangel)

Nota No. 0008 Fecha: 09/06/2021 Estado del tiempo: Llovia desde la 1:00PM hasta las 2:30 PM

A las 2:30 P.M. se inició a fundir el concreto correspondiente a las cimentaciones de la casa modelo. Una vez ya verificados los medidos y niveles requeridos.

Gustavo Bejarano

Nota No. 0009 Fecha: 10/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores

Actividades: Corte del material correspondiente a las columnas, relleno de material excavaciones y trazados.

Gustavo Bejarano

Nota No. 0010 Fecha: 11/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores.

Actividades: Trazados, Excavaciones, Rellenos.

Gustavo Bejarano

Escaneado con CamScanner

Nota No 0011 Fecha: 11/06/2021
se le realizó una charla de seguridad al personal en obra. Ademas, se hizó entrega de conos de seguridad, tapabocas, guantes tipo ingenieros gafas de seguridad y todos en buen estado.
Cristian Bonjumea

Nota No 0012 Fecha: 12/06/2021, Estado del tiempo: lluvia hasta las 3:30 pm
Personal en Obra: 4 cuadrillas, Equipos y herramientas: Volqueta, equipo soldadura, mezclador de concreto y herramientas menores.
Actividades: vaciado de cimentaciones y relleno de material
Cristian Bonjumea

Nota No 0013 Fecha: 13/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 1 Cuadrilla
Equipos y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores
Actividades: Instalación de perfiles metalicos.
Cristian Bonjumea

Nota No 0014 Fecha: 15/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, Vibrocompactadores, herramientas menores
Actividades: Instalación de vigas metalicas, excavaciones manuales y compactación
Cristian Bonjumea

Nota No. 0015 Fecha: 16/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Vibrocompactadores, Equipo de soldadura, trompo mezclador y herramientas menores
Actividades: En las horas de la mañana se nivela y compacta el lote del beneficiario Cristo Rios, se continua el proceso de soldadura de vigas metalicas, se culminaron detalles de soldadura en el refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las cimentaciones correspondientes a una vivienda.
Cristian Bonjumea

Nota No 0016 Fecha: 16/06/2021
Entre las 2:00pm y las 3:30pm no hubo fluido electrico en la zona de trabajo.
Cristian Bonjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0017	Fecha: 17/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, herramientas menores. Actividades: Trazado y nivelación, soldadura y montaje de estructura, vaciado de cimentaciones. Gustavo Bayonca
Nota No 0018	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores. Actividades: Se realizó trazado y excavaciones en 3 viviendas y se hizo trabajos de montura de estructura en 2 viviendas. Gustavo Bayonca
Nota No. 0019	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Lluvioso. El trabajo en Obra fue suspendido a las 4:00PM por lluvia. Gustavo Bayonca
Nota No 0020	Fecha 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, talquete, carretanque, herramientas menores. Actividades: Se hizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se realizó trazado y excavaciones en 2 viviendas y se fundió una base de concreto ciclopeo en la vivienda del beneficiario Cristo Humberto, esto para el día de tener un mejor soporte para las cimentaciones. Gustavo Bayonca
Nota No 0021	Fecha 21/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores. Actividades: Se realizaron trabajos de soldadura, trazado, nivelación y excavaciones. Gustavo Bayonca
Nota No 0022	Fecha 22/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, talquete, Mezclador de concreto y herramientas menores. Actividades: Se realizo trabajo de soldadura en 1 Vivienda, se fundieron las cimentaciones de 1 Vivienda y se adelantó trabajo de trazado y excavaciones en 2 Viviendas. Gustavo Bayonca

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0023 Fecha 23/06/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 5 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, retroexcavadora, mezcladora de concreto y herramientas menores
Actividades: Se realizó trabajo de trazado, nivelación y excavaciones en una vivienda, se fundió la cimentación de una vivienda, se realizó trabajo de soldadura en una vivienda y se inició la instalación del techo de la casa modelo.
Cristian Benjumea

Nota No. 0024 Fecha 24/06/2021
A partir de las 6:00AM iniciaron fuertes lluvias hasta las 7:30AM. A partir de ahí permanecio en rango de intensidad moderado hasta las 10:00AM.
El resto del día permaneció parcialmente nublado.
Cristian Benjumea

Nota No. 0025 Fecha 25/06/2021
En la ubicación del lote de la beneficiaria Ana moriel arrieta se presentó la señora Yeanis Vera quien dice ser quien vendió esos lotes. La señora vera asegura que el lote de la beneficiaria esta corrido 1 metro hacia la derecha, por lo que la construcción de la vivienda esta invadiendo 1 metro del lote de la izquierda que pertenecia al familiar fallecido Ana Moriel, quien seria su madre, luego de hablar con la beneficiaria y los hermanos se acordó que en la sucesión del lote el metro invadido será otorgado a la beneficiaria. Por lo que se decidio continuar con la construcción.
Cristian Benjumea

Nota No. 0026 Fecha 26/06/2021. Estado del tiempo: nublado. Personal en Obra: 5 cuadrillas.
Equipo y herramientas: Herramientas menores y equipo de soldadura.
Actividades: Se terminaron los preparativos en el lote de la beneficiaria Ana arrieta para fundir las cimentaciones y se inicio el trabajo de excavaciones en el lote de Luis Camargo. Mientras que en el lote de Jose Urrutia se inició la instalación de la estructura metalica.
Cristian Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No.0027 Fecha 28/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, amoladora de concreto, herramienta menor
Actividades: Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Viviana Mendivil, Excavación
en la vivienda de Luis Camargo, Pega de bloques de amampostería en la
vivienda de Eudaldo Escobar, trazado en el barrio el progreso, nivelación
en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez. Gustavo Bayuelo

Nota No.0028 Fecha 29/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, amoladora de concreto, vibrocompactadores,
herramientas menores y Talquetes.
Actividades: vaciado de cimentaciones en la vivienda de Luis Camargo,
compactación en la vivienda de Mayra Silva, compactación y relleno en la
vivienda de Yoraima Polo, levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo
Escobar, levantamiento de estructuras en la vivienda de Viviana mendivil, pintura
de corrosor en la vivienda de Juan Diaz.
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0029 Fecha 30/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Herramienta menores, vibrocompactador, talquete
Actividades: Se continua con el levantamiento de muros en la casa modelo,
relleno y compactación en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez y se
realizaron las preparativos para fundir las cimentaciones en la vivienda
de Juan Perez.
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0030 Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra, 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar,
trazado en la vivienda de Mayra Silva, relleno en las viviendas de Mileidys Ramirez
y Madelina Hernandez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Juan Perez
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0031 Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones
El vaciado de las cimentaciones en la vivienda de Juan perez, fue suspendido
a la 4:15PM por fuertes lluvias.
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0032 Fecha 01/07/2021
Al rededor de las 4:30PM inicio la socialización del barrio
Brisas del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para protegerse
de la lluvia. Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0033 Fecha 02/07/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipos y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores, motocarro.
Actividades: Se termino de fundir las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continuo el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Gestora Bonfumeo

Nota No.0034 Fecha 03/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramientas menores.
Actividades: Se inicio la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria Yuliffer Arrieta para fundir cimentaciones. Gestora Bonfumeo

Nota No.0035 Fecha 06/07/2021 Estado del tiempo: Nublado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Taladro, herramientas menores.
Actividades: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y Yuneidis Cabillos, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yenifer Arrieta, brozado y Excavaciones en la vivienda de Doris Martinez.

Gestora Bonfumeo

Nota No.0036 Fecha 06/07/2021
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por mantenimiento a las 9:00 AM. Se informo que volverá el servicio a las 5:00PM, por lo que no se puede avanzar con los trabajos relacionados con soldadura.

Gestora Bonfumeo

Nota No.0037 Fecha 06/07/2021
Inicio el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Horizonte, el cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios.

Gestora Bonfumeo

Escaneado con CamScanner

Nota No 0038 | Fecha: 07/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores
Actividades: se realizaron excavaciones en la vivienda de doris martinez y madelein hernandez, levantamiento de muros en las viviendas de yenelis Castillos y juan diaz y trazado en la vivienda de Andrey Rangel
Gustavo Benjumea

Nota No 0039 | Fecha: 08/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, volqueta, herramientas menores.
Actividades: Excavaciones en la vivienda de Andrey Rangel, instalaciones de estructuras metalicas en la vivienda de yenifer Acosta, Pellenado en la vivienda de Madelein Hernandez y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Doris Martinez.
Gustavo Benjumea

Nota No. 0040 | Fecha: 09/07/2021, Estado del tiempo: Despejado; Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, herramientas menores
Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Doris martinez, relleno y nivelación en la vivienda de Luz Jimenez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Andrey Rangel, Levantamiento de muros en la vivienda de Juan Diaz
Gustavo Benjumea

Nota No 0041 | Fecha: 10/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, volqueta y herramientas menores.
Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Andrey Rangel, Excavaciones en la vivienda de Yuris Granados y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Madelein Hernandez, lo cual se suspendió posteriormente en el mezclador de concretos.
Gustavo Benjumea

Nota No. 0042 | Fecha: 12/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Volqueta, equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto y herramientas menores.
Actividades: Se continuó con la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Andrey Rangel, con la fundición del concreto de cimentación en la vivienda de Madelein Hernandez, Pellenado y Compactación y trazado en la vivienda de Luz Jimenez y levantamiento de muros en la vivienda de Gustavo Rios
Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No.0043 Fecha: 12/07/2021,
Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Villa Esperanza a la altura de las 5:30PM
Gustavo Bayonne

Nota No.0044 Fecha: 13/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yuris Granados y madelsina Hernandez, se rellenó y compacto el lote de Yorsima Polo y Nilcidys Ramirez, Excavaciones en la vivienda de Ley Jimenez y se continuó con el levantamiento de muros. Tambien, se fundió concreto ciclopeo en la vivienda de Ley.
Gustavo Bayonne

Nota No.0045 Fecha: 14/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se realizaron las excavaciones en la vivienda de Nilcidys Ramirez, Josefina Ortiz y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Ley Jimenez. De igual forma, se continuó con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0046 Fecha: 15/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Ley Jimenez y se avanza en relleno de lotes y excavaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Nilcidys Ramirez. Tambien se encontró que las tuberias de aguas residuales se estaban colocando de forma erronea. Se siguió avanzando el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0047 Fecha: 16/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Nilcidys Ramirez, se avanzó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Josefina Ortega.
Gustavo Bayonne

Nota No.0048 Fecha: 17/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se avanza en las excavacion de la vivienda de Yorsima Polo y Oscar Roldan. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Roldan y se continuó avanzando con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0049 Fecha: 19/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se fundió un solado para que sirva de base para las cimentaciones de Yorsima Polo, se avanza en relleno de lotes, levantamiento de muros y estructura.
Gustavo Bayonne

Escaneado con CamScanner

Nota No 0050 Fecha: 20/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranzo en relleno de lotes, levantamiento de muros y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Yoraima Polo.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0051 Fecha: 21/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranzo en trabajos de relleno y compactación de lotes, se inicio el levantamiento de muros en la vivienda de Mayra Silva y Ruth Perez. Tambien se inicio el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yoraima Polo, se encontró que el dimensionamiento de los retanos no es el que corresponde a los planos, se preparo el lote de Luis Avila para ser fundido al dia siguiente, con excavaciones y refuerzos listos.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0052 Fecha 22/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranzó el trabajo de relleno y compactación en el barrio Brisas del Norte, se arranzó el levantamiento de muros en las viviendas de Mayra Silvia, Jose Urrutia, Juan Diaz y Cristo Rios. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yoraima Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0053 Fecha: 23/07/2021
Se arranzó el trabajo de relleno, compactación y trazado en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Juan Gutierrez y se arranzó el levantamiento de muros en las viviendas de Cristo Rios, Viviana Mendivil, Mayra Silvia y Jose Urrutia
Gustavo Bejarano

Nota No. 0054 Fecha: 26/07/2021, Clima: Despejado
El dia sabado 24 de julio se dejaron excavaciones arranzadas y una estructura metalica mas elevada. Sin embargo, durante el fin de semana hubieron fuertes lluvias lo que daño las excavaciones y arreglarlas nuevamente incurre en medio dia de retrazo aproximadamente.
Gustavo Bejarano

Escaneado con CamScanner

Nota No.0055 Fecha: 26/07/2021, Hora: Despejado
Se avanzó en trabajos de trazado, nivelación y excavación. El equipo de soldadura retomó estructuras ya levantadas para la instalación de los correas y se avanzó en el levantamiento de muros.
Gustavo Bayomeo

Nota No.0056 Fecha: 26/07/2021
Mediante esta nota se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo Jose Cayon Marquez.
Gustavo Bayomeo

Nota No.0057 Fecha: 27/07/2021
Se avanzó en trabajos de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y la instalación de correas en estructuras faltantes. En el barrio Brisas del Norte se fundió como base de cimentaciones un concreto ciclopeo para dos viviendas. Adicionalmente se pintó con anticorrosivo las correas de algunas viviendas.
Gustavo Bayomeo

Nota No.0058 Fecha: 27/07/2021
Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron al menos 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñado.
Gustavo Bayomeo

Nota No.0059 Fecha: 28/07/2021, Hora: Despejado
Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Brisas del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de correas y levantamiento de muros en Brisas del Norte.
Gustavo Bayomeo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0060 Fecha: 29/07/2021, Clima: Unviso
Se arranjó con el levantamiento de 2 estructuras metalicas en el barrio Brisas Del Norte junto con el trazado de una nueva vivienda, se arranjó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se entabló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.
Cristian Bayona

Nota No.0061 Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se arranjaba de igual forma en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.
Cristian Bayona

Nota No.0062 Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado
Este día sabado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de brisas del Norte
Cristian Bayona

Nota No.0063 Fecha 02/08/2021, Clima: Despejado
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldaduras, levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se entabló una vivienda del barrio Villa Esperanza.
Cristian Bayona

Nota No.0064 Fecha 03/08/2021, Clima: Unviso
Se continuó con trabajos de excavaciones y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias.
Cristian Bayona

Nota No.0065 Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado
se levantó la estructura metalica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban, Excavaron y entablaban otros 3 lotes del mismo barrio.
Cristian Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No.0060 Fecha: 29/07/2021, Clima: Unviso
se avanzó con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el trazado de una nueva vivienda, se avanzó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se entabló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.
Cristian Bejarano

Nota No.0061 Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado
se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se avanzaba de igual forma en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.
Cristian Bejarano

Nota No.0062 Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado
Este día sabado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de Brisas del Norte
Cristian Bejarano

Nota No.0063 Fecha 02/08/2021, Clima: Despejado
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldadura ni levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se entabló una vivienda del barrio Villa Esperanza.
Cristian Bejarano

Nota No.0064 Fecha 03/08/2021, Clima: Unviso
Se continuó con trabajos de excavaciones y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias
Cristian Bejarano

Nota No.0065 Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado
se levantó la estructura metálica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban, Excavaban y entablaban otros 3 lotes del mismo barrio.
Cristian Bejarano

Escaneado con CamScanner

Acta N. 006 Fecha: 05/08/2021 Clima: Despejado
Se avanzó en la instalación de la red hidrosanitaria de las viviendas de Yarlis Cubillos y Eudaldo Escobar, junto con la instalación de los antenos de la vivienda y la fundida de la losa del baño. Por otro lado, se fundió concreto ciclopeo en el barrios Brisas del Norte y Construcción en Villa esperanza
Gestor Bryner

Acta N. 007 Fecha: 06/08/2021 Clima: Lluvioso
Se empezaron a realizar las instalación eléctricas en las viviendas de Yarlis Cubillos y Eudaldo Escobar, junto con el vaciado de concreto para la plantilla de las viviendas. También se avanzo en trabajo de relleno y Excavaciones de latas. Sin embargo, las actividades fueron suspendidas a las 2:30PM por fuerte lluvias.
Gestor Bryner

Acta N. 008 Fecha: 07/08/2021, Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en la vivienda de Wilso Sanchez y se levantaron estructuras metalicas en el barrios Brisas del Norte
Gestor Bryner

Acta N. 009 Fecha: 09/08/2021, Clima: Despejado
Se continuó la instalación de correas metalicas en estructuras del barrio el progreso y se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte.
Gestor Bryner

Acta N 0010 fecha 10/08/2021 — Clima despejado.
→ en el dia de hoy se presento manifestaciones por parte de la Comunidad, presidente de la Acciones Comunales de los Barrios Barrio Horizonte, 12 de febrero, vida esperanza donde alegan que el Consorcio vive una vez no está Cumpliendo con el Compromiso de ofrecer trabajos a los habitantes del Sector ó Municipio de la Jagua, tambien manifiestan que los predios entre el consorcio y los trabajadores

Escaneado con CamScanner

no es justo y digno para ellos, tal el motivo ellos tomaron la decisión de parar todo tipo de trabajo de obra, que esta realizando el Consorcio Vive Ues en los barrio Bello Horizonte y el progreso, Brisa del norte, Villa esperanza al punto se llegue a una reunion entre las partes para Conciliar todas peticiones hechas por ellos.

nota: el ing. eduardo Cayon les manifesto por vía telefonica que se realizara un acta donde ellos (comunidad) paran las obras por los motivos expuestos para así no Afectar la programacion y ejecucion de las actividades, donde ellos no Aceptaron firmar ningun acta, pero manifestaron que no dejaran trabajar a ninguno del Consorcio hasta que se presente la reunion y tengan un Concilio entre ces partes.

Ing. Luis Vanegas C.
C. Vive UES V

Nota No 0071 Fecha: 12 de agosto de 2021, Estado del tiempo: lluvioso
Las actividades en campo fueron retomadas hoy fueron a partir de las 7:00AM. Con la novedad de la renuncia del residente de obra. Por lo que momentaneamente la dirección y/o ejecución de la obra esta a cargo del inspector de la obra Ramiro de la Hoz y el director de la obra Eduardo Cayon.

Ramiro de la Hoz

Escaneado con CamScanner

Ob No.0072 Fecha: 12/08/2021, Clima: Lluvias
En el día de hoy se retomaron actividades correspondientes a relleno, compactación y excavaciones en los barrios Brisas del Norte y Villa Esperanza. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanza con el trabajo de las instalaciones eléctricas y se fundieron plantillas en 2 viviendas. Sin embargo, las actividades se suspendieron a las 3:30 PM por fuertes lluvias.

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Ob No.0073 Fecha: 13/08/2021, Clima: Despejado
Por razones de lluvia del día anterior, se dañaron todas las excavaciones de las viviendas que estaban listas para fundir por lo que se tuvo que realizar el trabajo de nuevo. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanzó en los acabados de dos viviendas

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Ob No.0074 Fecha: 17/08/2021, Clima: Despejado
Por causa de las lluvias durante el fin de semana se tuvo que volver a iniciar las actividades de excavaciones por lo que no se ha podido fundir cimentaciones.

Gestora Bonjorno

Ob No.0075 Fecha: 18/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
En el barrio Bella Horizonte se adelantó trabajo de redes de aguas en algunas viviendas, fundición de losa del baño y se realizaron excavaciones y trazados en el barrio 17 de febrero.

Gestora Bonjorno

Ob No.0076 Fecha: 19/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
se fundieron las primeras cimentaciones de la semana en el barrio Villa Esperanza, mientras en el barrio Bella Horizonte se continuo con la instalación de aguas negras, fundición de losas de baño y registros

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0077 | Fecha: 20/08/2021, Clima: Despejado

se avanzó en el trabajo de instalación de techados en el barrio Bello horizonte. Se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte. Se hanto estructuras metalicas y cerramientos en el barrio Villa Esperanza. De igual forma, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Villa esperanza y en el barrio el progreso se adelanto el trabajo de fundación de losas de baño.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No.0078 | Fecha:23/08/2021, Clima: Despejado

En el barrio Bello horizonte se avanzo en trabajo de instalación de puertas y ventanas, pintura de perfiles metalicos y levantamiento de muros. De igual forma, en el barrio El Progreso se avanzo en levantamiento de muros y la instalación de techados. Se fundieron tambien las cimentaciones de la beneficiaria Julia Tobaño.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No.0079 | Fecha: 24/08/2021, Clima: Despejado

Se fundió la plantilla del beneficiario Cristo Rios, tambien se avanzó con la instalación de puertas y ventanas en Bello Horizonte, levantamiento de muros en el barrio El Progreso y trazado, relleno y compactación en el barrio 17 de febrero. Ramiro de la hoz.O

Gustavo Bayuelo

Nota No.0080 | Fecha: 25/08/2021, Clima: Nublado

se instalaron puertas y accesorios sanitarios en el barrio Bello Horizonte, se fundieron cimentaciones y se trazaron lotes en el barrio 17 de febrero y en el barrio el progreso se continuó levantando muros e instalando techos.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No. 0081 | Fecha: 26/08/2021.

Se realizó la primera supervisión del avance de obra del proyecto en conjunto entre la alcaldía, Comfacesar, el contratista e interventoría.

Gustavo Bayuelo Comfacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0082 Fecha: 27/08/21, Clima: Despejado
Se realizaron rellenos y excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se le hicieron retoques a los acabados de la casa modelo y se fundió plantilla en otras viviendas. En el barrio El progreso y Brisas del Norte se avanzó en el trabajo de levantamiento de muros.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0083 Fecha: 28/08/21, Clima: Despejado
Con esta nota se da constancia de que el día 26 de agosto de 2021 se realizó la socialización del barrio Luis Carlos Galan en el parque de dicho barrio y con la participación de todos los beneficiarios y el contratista.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0084 Fecha 30/08/21, Clima: Nublado
En el barrio Bello Horizonte se inicia la definición de acabados del beneficiario Cristo Rios, la instalación del techado de la beneficiaria Doris Martinez. Mientras que en el barrio 17 de febrero se avanzó con el relleno y compactación de lotes, excavaciones y se fundieron los cimientos de una vivienda.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No 0085 Fecha 31/08/21, Clima: Nuriosa
Se adelantaron las excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se instalaron redes electricas y se fundió plantilla de una vivienda.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

20

N Nota No 0086 Fecha: 01/09/21, Clima: Humoso
se adelanto el trabajo de levantamiento de muros en los barrios Brisas del Norte y el progreso. Mientras que en Bello Horizonte se fundió una plantilla y se adelanto los acabados de una vivienda

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No 0087 Fecha: 02/09/21, Clima: Despejado
1 En el barrio Bello Horizonte se fundió plantilla en una vivienda mientras que en otras se adelanto el trabajo de acabados. En demas barrios, se continuó el levantamiento de muros. No se han fundido cimentaciones ni levantado nuevas estructuras

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

N Nota No 0088 Fecha: 03/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se continuó fundiendo plantilla en demas viviendas junto con redes hidrosanitarias y electricas mientras, en los demas barrios intervenidos se continua con
N. el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No 0089 Fecha: 06/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se avanza en la instalación de puntos definición de acabados y fundición de plantilla. Mientras que
N. en el barrio el progreso se instalaron redes hidrosanitarias y electricas y en los demas barrios se continuo el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No 0090 Fecha: 07/09/21, Clima: Humoso
En el barrio El progreso se adelantó la instalación de redes
N hidrosanitarias y electricas, definición de acabados y fundición de plantilla. De igual forma, el contratista avanzó de manera significativa en la aplicación de anticorrosivo en los sucheles de la estructura y la instalación de los tejados para proteger las estructuras

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No.0091 Fecha: 07/09/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en obra fueron suspendidos al rededor de las 3:00PM por fuertes lluvias.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0092 Fecha: 08/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el trabajo de levantamiento de estructuras metalicas en el barrio Villa Esperanza. Con las viviendas de Blibdis Galvis, Lucas Mier y Julia Ibañez. Esta ultima la cual habia sido suspendida por desplazarse en el lote. Sin embargo, la alcaldia de la mano de Miguel Rivera dieron el aval para construir la vivienda.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0093 Fecha: 09/09/21, Clima: Despejado
Se continuó el levantamiento de muros en los barrios Villa Esperanza, 17 de febrero y Brisas del Norte. Se fundió plantilla en el barrio El progreso y Villa esperanza. En el barrio Bello Horizonte se continua con la difinición de acabados y la instalación de puertas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0094 Fecha: 10/09/21, Clima: Despejado
Se continuó con la instalación de techos, redes hidrosanitarias electricas y la fundicion de placas de baño.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0095 Fecha: 13/09/21, Clima: Despejado
En los barrios bello horizonte y el progreso se trabajo acabados y empapetado al igual que en los barrios Brisas del norte y Villa esperanza

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0096 Fecha: 13/09/21
Durante todo el dia no hubo fluido electrico en la ciudad, lo que atrasó todo el cronograma de actividades de la obra, debido a que se dependía en gran medida de los soldadores.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No.0097 | Fecha: 14/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó levantando muros en todos los barrios donde se está trabajando, a excepción del 17 de febrero donde se fundieron cimentaciones. En el barrio Bella Horizonte se fundió una plantilla.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0098 | Fecha: 15/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó el levantamiento de muros. En otros frentes de trabajo se encuentran fundiendo plantillas y por otros fundiendo cimentaciones a la vez, se arranco en la definición de alcabados.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0099 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Despejado
En el dia de hoy solo se adelantó el trazado y excavación de una vivienda en el 17 de febrero, se aplicó pintura a algunos acabados y perfiles metalicos.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0100 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Lluvioso
Durante toda la jornada de la tarde no fue posible trabajar en campo debido a fuertes lluvias.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0101 | Fecha: 17/09/2021, Clima: Despejado
En el barrio El Paraiso avanzó el trabajo de definición de acabados, enchape de zocalos humedos y la instalacion de cableado eléctrico. Mientras que, en Brisas del Norte se adelantó y fundió la plantilla de una vivienda.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Nota No.00102 | Fecha: 20/09/2021, Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en el barrio 17 de febrero, donde tambien se levantó una estructura, Mientras que en los barrios Villa Esperanza y Brisas del Norte se enchapaban zocalos humedos y se levantaban muros.

Gustavo Bayameo Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No.0100 Fecha: 21/09/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Angelica Caro, la cual tardó porque no había demolido su vivienda hasta que personal de la alcaldía se lo solicitó. En otros frentes de trabajo se fundió plantilla, enchape zonas humedas y se instaló cableado electrico.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0104 Fecha: 22/09/21. Clima. Despejado
En el barrio Bello Horizonte se y el progreso se instalaron puertas y ventanas. Mientras que en el 17 de febrero se trazó y excavó una vivienda y se levantó la estructuras de obras. En Bello Horizonte se fundió la plantilla de Doris Martinez

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz o

Nota No.0105 Fecha: 23/09/21 Clima: Despejado
En el barrio 17 de febrero se fundió una cimentación. En Bello Horizonte y El Progreso se instalaron puertas y ventanas. En Brisas del Norte y Villa Esperanza se enchapó zonas humedas y se trabajó en la definición de acabados.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0106 Fecha: 24/09/21. Clima: Nuviosos (no aplotó)
Se avanzó con la instalación de puertas en el progreso. En el 17 de febrero se trazó y excavó otra vivienda y en Brisas del Norte se continuó levantando muros y se fundió una plantilla.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz o

Nota No.0107 Fecha: 25/09/21, Clima: Despejado
Se avanzó el trabajo de pinturas con anticorrosivo en perfiles metalicos.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0108 Fecha: 27/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Villa Esperanza se avanzó con la definición de acabados, enchapado e instalación de accesorios. En el 17 de febrero se fundió una cimentación

Gestores Bayumeo

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0109 Fecha: 28/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Brisas del norte se continuó el levante de muros y fundición de plantillo. En el 17 de febrero se trajo y excavo un lote.
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No 0110 Fecha: 29/09/21, Clima: Lluvioso
se fundieron cimentaciones en el 17 de febrero. Donde también se rellenó una lote y se empezó levante de muros. En el barrio Brisas del Norte se fundió plantillo y en Villa Esperanza se arreglaron los acabados e instalación de accesorios.
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0111 Fecha: 29/09/21, Clima: Lluvioso
Las actividades en la jornada de la tarde se suspendieron por fuertes lluvias.
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0112 Fecha: 30/09/21, Clima: Despejado
Se trajo y excavo en el barrio 17 de febrero 2 viviendas. Se fundió cimentación.
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0113 Fecha: 04/10/21, Clima: Despejado
No se registraron actividades en campo durante el día
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0114 Fecha: 05/10/21, Clima: Despejado
Durante el día se hizo un recorrido vivienda a vivienda recogiendo basura dyada. También se trabajo en el levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte, 17 de febrero y Brisas del Nor
Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 0115 Fecha: 06/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz. O
Se trabajó únicamente levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero y trabajo de acabados en el barrio Bella Horizonte en la vivienda de Doris Martinez

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No 0116 Fecha: 07/10/21, Clima: Despejado
Durante la jornada completa se trabajó (Continuó) en las mismas actividades y viviendas del día anterior.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No 0117 Fecha: 11/10/21, Clima: Despejado
Durante los días 08, 09, 10, No se realizaron actividades en campo por falta de material. El día de hoy solo se reanudó el trabajo de levantamiento de muros en el 17 de febrero.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No 0118 Fecha: 12/10/21, Clima: Lluvioso
Se realizó el trazado y excavaciones en la vivienda de Orlando Nieto (17 de febrero) y Wilmer Rios (El Golán). También se levantó el sistema estructural metalico de las viviendas de Lizeth Sayeth y Katherine Karo (17 de febrero). Las actividades en Campo se suspendieron a las 3:40PM por lluvias.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No 0119 Fecha: 13/10/21, Clima: Lluvioso
En el barrio el progreso se fundieron cajillos de inspección. Mientras que en el 17 de febrero se continuó levantando mamposteria y se fundieron las cimentaciones de Orlando Nieto. Se firmó el acta de vecindad que permite construir la vivienda de Tonio Jimenez pegada de orden. Se suspendieron actividades a las 4:00PM por lluvia.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0120 Fecha: 14/10/21 Clima: Despejado Ramiro de la hoz. O

Se levantó la estructura metalica de la beneficiaria Ana Damian en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galán se trasportaron, Excavaron y fundieron 2 viviendas.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0121 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se le realizó 3 suspensiones puntuales al contratista. Primero, tuvo mas estética y precauciones al momento de soldar los elementos metalicos y fundir las cimentaciones. Segundo, Utilizar ladrillos debidamente reciclados. Tercero, Utilizar el nivel correcto para fundir las viviendas y evitar inundaciones.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. O


Nota No. 0122 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se levantaron 2 estructuras metalicas y se trasportaron, excavaron/entablaron y fundieron 2 viviendas. Se continua el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero junto con las losas de baño.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No 0123 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se presentó una particularidad en el lote de la beneficiaria Tania Jimenez en el barrio Luis Carlos Galan. Donde la vivienda tipo casa está diseñada no cabe en el lote.

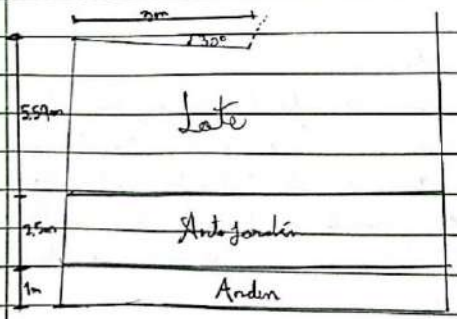

* El dibujo no está a escala

Ramiro de la hoz. O

Gestora Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0124 Fecha: 16/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones del beneficiario Edilson Pedroza ubicado en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota No. 0125 Fecha: 19/10/21, Clima: Despejado
se trabajó en los acabados de los beneficiarios de Yuris Granado y Luis Avila en el barrio El Progreso. Además, se continuó el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galan, se fundieron las cimentaciones de 2 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota No. 0126 Fecha: 20/10/21, Clima: Lluvioso
Se trabajó en los acabados de la beneficiaria Josefina Ortega, se le instaló la ventanería a la vivienda de Martha Dominguez. En el barrio 17 de febrero se continuó el levantamiento de muros y se trazaron, excavaron y entablaron 3 viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Se suspendieron las actividades entre las 2:00PM y 3:30PM por lluvia.
Gustavo Benjumea

Nota No. 0127 Fecha: 21/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se fundieron las cimentaciones de los beneficiarios Alba Cruz y Melisa padilla, se trazó y excavó la vivienda de esperanza bultrón. Se le instalaron las ventanas a Martha Dominguez y se le instaló el tablero electrico a Josefina Ortega. En el barrio 17 de febrero se trabajo en el levantamiento de muros y en Villa esperanza se trabajó en los acabados.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota No 128 | Fecha: 22/10/21, Clima: Despejado
Se trajo y excavó la vivienda de Ramon Villareal y se fundieron las cimentaciones de esperanza Salazar. Alanya se encargó con el levantamiento de muros en el barrio El Golan.

Gestores Bayonas Ramiro de la hoz. O

Nota No. 129 | Fecha: 23/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Mirellis Martinez y a la vez se continuó el levantamiento de muros en el barrio El Golán.

Gestores Bayonas Ramiro de la hoz. O

Nota No. 130 | Fecha: 25/10/21, Clima: Despejado
Mediante esta nota se hace constar que tanto como el contratista, como interventoría y personal de la alcaldía; le hicieron saber a la beneficiaria Leidy Manotas que no demoliera su vivienda hasta que se definiera su situación, ya que el lote no cumple con las medidas. Sin embargo, la beneficiaria demolió su vivienda por sugerencia de un concejal llamado "Victor Ballena". Actualmente, la beneficiaria se encuentra pagando arriendo.

Gestores Bayonas Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0131 | Fecha: 26/10/21, Clima: Despejado
Se trabajo unicamente en el levantamiento de muros en los barrios 17 de febrero y el golan. Ademas, se reportio material de relleno en los puntos donde se requeria

Gestores Bayonas Ramiro de la hoz. O

Nota No 0132 | Fecha: 27/10/21, Clima: Nuriosa
Se continuó el trabajo de levantamiento de Muro en el barrio El Golan, donde tambien se rellenaron varias viviendas (lotes). Se instaló el techo de Luciado Montes y en el barrio el progreso se trabaja en acabados y se instaló un cableado electrico que habia sido hurtado.

Gestores Bayonas

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0133 Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en campo estuvieron suspendidos por la mañana debido a fuertes lluvias.

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0134 Fecha: 28/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Leomar Villareal del barrio Luis Carlos Galán. Donde también, se rellenaron y compactaron 4 distintos lotes.

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0135 Fecha: 29/10/21, Clima: Despejado
Se continuó con el relleno y compactación de diferentes viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Donde también se realizaron excavaciones.

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0136 Fecha: 30/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Estiv Pabuyo y en el barrio bella horizonte se arregló con el trabajo de la instalación de manto drill y la instalación de tanque de agua. También, se fundió las cimentaciones de Gloricelth Jimenez.

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0137 Fecha: 02/11/21, Clima: Despejado
El mismo trabajo registrado en campo fue la instalación de techos en el barrio 17 de febrero y la instalación de manto drill en el barrio Bella Horizonte

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0138 Fecha: 03/11/21, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado en campo fue la conexión de detalles en losas de baño de algunas viviendas y se instaló el cableado de una vivienda en Villa Esperanza.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota N 0139 Fecha: 09/11/21, Clima: Despejado
se adelantó trabajos de instalación de acometida electrica y se fundió la plantilla de una beneficiaria en el barrio Bello Horizonte.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0140 Fecha: 10/11/21, Clima: Despejado
Se avanzó con la instalación de techos de viviendas que ya estaban levantados en estructura y se preparaban otras viviendas para fundir plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0141 Fecha: 11/11/21, Clima: Despejado
se trazó la primera vivienda del barrio Juan Pablo, mientras que en el barrio el Golan se levantaron dos estructuras metalicas y se fundió una plantilla en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0142 Fecha: 12/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
En el barrio Villa Esperanza se fundieron la plantilla de una vivienda. En el barrio El Golan se fundió la cimentación de una vivienda y se levantaron la estructura metalica de 2 viviendas. Tambien, se inició el levantamiento de muro en 5 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0143 Fecha: 13/11/21, Clima: Despejado
Se levantó la estructura metalica de 3 viviendas en el barrio El Golan y se instaló el techado de 1 vivienda

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0144 Fecha: 16/11/21 Clima: Despejado
Se instalaron dos techados en el barrio el golan. y se fundió una plantilla en el barrio el golan. Donde tambien se rellenó y se cernió otra vivienda.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz o

Nota No. 0145 Fecha: 17/11/21 Clima: Despejado
Se inició el levantamiento de muros en dos nuevas viviendas y se fundió una cimentación en el barrio El Golan y otra en el barrio Juan Ramon, donde tambien se trazó y cernió otra vivienda.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0146 Fecha: 18/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
Se fundio una plantilla en el barrio Villa Esperanza. En el golan se levantaron dos estructuras metalicas y se entecharon 3 viviendas y tambien se fundieron 3 losas de baños y una cimentación.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz o

Nota No. 0147 Fecha 19/11/21, Clima: Despejado
Se fundió una cimentación en el barrio Juan Ramon y otra en el Juan Carlos Golan, se instalaron 2 techados y la rest hidrosanitario de otra vivienda. y se levantó una estructura metalica

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0148 Fecha 22/11/21, Clima: Lluvioso
Durante la mañana se replantearon 2 viviendas para fundir cimentaciones y 1 para plantilla pero los trabajos se suspendieron por fuertes lluvias en la tarde.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz o

Escaneado con CamScanner

Nota No 149 Fecha: 22/11/21
han llegado reportes de que todos los lotes del barrio Villa Shalay tienen un ancho de frente de entre 5.5 - 6.1 m lo que no es suficiente para la construcción de la vivienda.

Gestora Bonjemes. Ramiro de la hoz.o

Nota No.0150 Fecha: 23/11/21. Clima: Despejado
Se continuó el enchape de nuevas viviendas y se fundió una plantilla del barrio 17 de febrero. Además, se arregló en la pintura de la fachada de las primeras viviendas.

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0151 Fecha: 24/11/21
se realizó la socialización al barrio Pedro Castro

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No 0152 Fecha: 24/11/21, Clima: Despejado.
Se continuó con la pintura de las primeras viviendas y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero y se fundió una cimentación en el barrio Juan Roman.

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0153 Fecha: 25/11/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una vivienda en el barrio Juan Román y una plantilla en el barrio 17 de febre

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0154 Fecha: 29/11/21.
Se realizó la segunda supervisación técnica a las primeras 22 viviendas que están entre un 95% y 98% de ejecución. En conjunto con el supervisor de Comfacesar y la alcaldía.

Gestora Bonjemes

Supervisor Comfacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No.0155 Fecha: 30/11/21, Clima: Despejado
Se fundieron dos plantillas (1 en el 17 de febrero y otra en el galan). También se levantó una estructura metalica en el galan y otra en Juan Ramon. Ademas, se trabajó en subsanar los detalles pendientes de las primeras viviendas.

Gustavo Bayenes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0156 Fecha: 01/12/21, Clima: Despejado
Se inició el relleno del lote de una beneficiaria faltante en el barrio Brisas del Norte y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Bayenes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0157 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
Se levantaron 2 estructuras metalicas en el barrio Juan Ramon. Se instalaron puertas y ventanas en los barrios Brisas del Norte y Bella Horizonte. En el barrio 17 de febrero se fundió una plantilla.

Gustavo Bayenes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0158 Fecha: 03/12/21, Clima: Despejado
se fundió una plantilla en el barrio bella horizonte. Oficialmente, el contratista decidió no fundir mas viviendas.

Gustavo Bayenes Ramiro de la hoz.o

Nota No. 159 Fecha: 06/12/21, Clima: Despejado
Se avanzó en el trabajo de acabados de las primeras viviendas que habian quedado atras, junto con la instalación de puertas, ventanas, lavaderos y accesorios. Se fundio una plantilla en Bella Horizonte.

Gustavo Bayenes Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 160	Fecha: 10/12/21, Clima: Despejado Se soldaron viendas en el barrio Villa Esperanza, donde tambien se corrigieron algunos detalles de acabados. Se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero. Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 161	Fecha: 13/12/21, Clima: Despejado se fundieron 2 plantillas en el barrio el galan. Tambien se replantearon estan 2 viendas mas para fundir plantilla Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 162	Fecha: 14/12/21, Clima: Despejado En el barrio el galan, se fundieron 2 plantillas. Mientras que, en el barrio Brisas del Norte se trabajo en acabados de 2 Viviendas. Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 163	Fecha: 15/12/21, Clima: Despejado En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. Tambien se realizaron los ultimos correcciones en las primeras viendas que se desean entregar Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 164	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado En el barrio El Galan se fundieron 2 plantillas. Se continuó el trabajo de acabados en Brisas del Norte. Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 165	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado Oficialmente, la interventoria le recibió 23 viendas listas para entregar al contratista Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.

Escaneado con CamScanner

Nota No.166 Fecha: 29/12/21, Clima: Despejado:
De la mano del alcalde del municipio Otelio Jimenez, se realizo la protocolización de 24 viviendas a los beneficiarios que correspondian. Quedaron restando 4 viviendas de beneficiarios que no fue posible contactar

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No.167 Fecha: 21/01/22, Clima: Despejado
Durante los recientes dias del mes de enero se ha trabajado en la definición de los acabados de la parte interna y externa de las viviendas, junto con las actividades necesarias para instalar el cableado de las viviendas

Gestora Benjumea Dario Pinilla

Nota No.168 Fecha: 24/01/22
se identificaron dos problematicas durante la ejecución del proyecto. En primer lugar, en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sanchez se presentó el levantamiento de una vivienda al lado derecho, lo cual impedirá la difinición de los acabados de esta. En segundo lugar, la beneficiaria Bleidis Galan pasotó toda la vivienda, ensuciando aún todo la perfileria y modificando los acabados de la vivienda.

Gestora Benjumea Dario Pinilla

Nota No.169 Fecha: 28/01/22
Se realizó la supervisacion en los anexo 1 y anexo 2 de la mano con comfacesar y la alcaldia y esto se realizó entre los dias 27 y 28 de enero.

Gestora Benjumea Dario Pinilla

Escaneado con CamScanner

Nota No 170 Fecha: 31/01/22
Se ha avanzado en el levantamiento de muros en una vivienda de Juan Ramon y 1 en el galpón. Se avanzó en la fundición de cajas de inspección, e instalación de tuberías.

Gestora Benjumea Pedro Pelaez

Nota No. 171 Fecha: 01/02/22, Clima: Despejado
Se ha estado trabajando en el levantamiento de muros en los barrios Juan Ramón y El Galán. En el barrio 17 de febrero se ha avanzado en la definición de acabados interiores de las viviendas.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 172 Fecha: 02/02/22, Clima: Despejado
En el barrio Juan Ramón hay 1 cuadrilla levantando muros y otra instalando tuberías. En el barrio 17 de febrero hay 4 cuadrillas definiendo acabados y el galpon 1 y otras 3 de imposter

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 173 Fecha: 03/02/22, Clima: Despejado
se continuó el trabajo de levantamiento de muros y definición de acabados

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 174 Fecha: 07/02/22, Clima: Despejado
se retomó el trabajo de la instalación de cableado eléctrico y se continuó la difinición de acabados en el 17 de febrero.

Gestora Benjumea
Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 175 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metalicas y rentanas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y se instaló el cableado de 2 viviendas en el mismo barrio.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz o

Nota No. 176 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metalicas y rentanas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y a la vez se les instaló el cableado electrico.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz o

Nota No. 177 Fecha: 10/02/2022, Clima: Despejado
Se trabajó en el levantamiento de muros en 3 viviendas del barrio Juan Ramon. En el barrio Bello Horizonte se instaló las puertas, rentanas y red electrica de una vivienda. En el barrio El Codori se trabajo en el levante de muros de dos viviendas.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz o

Nota No. 178 Fecha: 15/02/2022, Clima: Despejado
Se instalaron las puertas, rentanas y red electrica de 3 viviendas mas, a la vez, se empezó el trabajo de definición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz o

Nota No. 179 Fecha: 16/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas, rentanas y redes electricas de 3 viviendas y de igual forma se trabajó en la definición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz o

Escaneado con CamScanner

Nota No 180	Fecha: 17/02/2022, Clima: Despejado Se enchapó la zona humedo de 3 viviendas y se instaló el combo sanitario y redes electricas de dos viviendas. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o
Nota No. 181	Fecha: 18/02/2022, Clima: Despejado El unico trabajo registrado es la instalación del enchape de zonas humedas de dos viviendas Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o
Nota No. 182	Fecha: 21/02/2022, Clima: Despejado Se enchapó la zona humedo de dos viviendas, se instaló el combo sanitario de dos mas. Tambien se trabajo en el levantamiento de muros de dos viviendas en el barrio el galan Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o
Nota No. 183	Fecha: 22/02/2022, Clima: Despejado Se instaló los puertas y ventanas de dos viviendas y la instalación de tanque de agua de 10 viviendas Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o
Nota No. 184	Fecha: 26/02/2022, Clima: Despejado Se enchapó los viviendas restantes del barrio 17 de febrero y 4 del barrio El Galan. Tambien se instalaron los accesorios y demas accesorios como combo sanitario a las mismas viviendas. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Visita No. 185 Fecha: 28/02/2022, Clima Despejado
Se retocaron los perfiles metalicos y se retocaron almas detalles de acabados para realizar entrega de viviendas.

Gestora Bayuncas Ramiro de la hoz-0

Visita No. 186 Fecha: 01/03/2022 Clima: Despejado
Interventoria recibio 6 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gestora Bayuncas

Visita No. 187 Fecha: 02/03/2022, Clima: Nuboso
Interventoria recibio 4 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gestora Bayuncas Ramiro de la hoz 0

Visita No. 188 Fecha: 02/03/2022
se presentaron fuertes precipitaciones entre las 2:30 y 5:00 pm.

Gestora Bayuncas. Ramiro de la hoz 0

Escaneado con CamScanner

A10 – CONCEPTO ESTRUCTURAL CON DEBIDAS APROBACIONES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR
Estamos cumpliendo sueños

Valledupar, 02 de septiembre de 2021.

Ingeniera.
MARYCARMEN OSPINA GUERRA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Referencia: ANEXO No.1 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 616-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PRENOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Cordial saludo

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los compromiso del acta # 02, nos permitimos adjuntar el concepto estructural por parte del ingeniero especialista sobres los cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de la vivienda propuesta en el contrato de obra 088 del 2021, junto con el aval de la interventoría de obra.

Esta gerencia avala el concepto emitido por parte de la interventoría de las viviendas que han sido intervenidas hasta la fecha, sin embargo se dará instrucciones al constructor e interventoría que solo se utilizara elementos continuos sin uniones de soldadura para las estructura de pórticos.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

DEIMER A. PEREZ SOLANO
Coordinador de Proyectos de Vivienda
Comfacesar

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

La Jagua de Ibirico, 31 de agosto de 2021

Señores,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, COMFACESAR
Ingeniero DEIMER PEREZ SOLANO
Coordinador Técnico de Vivienda.
Valledupar- Cesar

Con respecto al concepto estructural presentado por el ingeniero civil, DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO, especialista en estructuras. Me permito informar lo siguiente:

Luego de comprobar de que las credenciales del ingeniero especialista estuvieran vigentes, se comprobó que en efecto el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010, NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2. estipula bajo que condiciones y/o especificaciones es viable la utilización de soldadura tipo Filete en elementos metálicos. De igual forma, la norma establece las siguientes limitaciones o indicaciones para el uso de este tipo de soldadura:

F.2.10.2.2.2 — *Limitaciones* — El tamaño de una soldadura de filete no deberá ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni menor que el mínimo según la tabla F.2.10.2-4. Estos requisitos no se aplican a soldaduras de filete usadas como refuerzo de soldaduras acanaladas de penetración parcial o completa.

Tabla F.2.10.2-4
Tamaño Mínimo de Soldaduras de Filete

Espesor de la parte más delgada a unir, mm	Tamaño Mínimo de la Soldadura de Filete[a] mm
Hasta 6.4 inclusive	3
mayor que 6.4 a 12.7	5
mayor que 12.7	6
mayor que 19.1	8

[a] Dimensión del lado de la soldadura de filete. Debe aplicarse en una sola pasada.
Nota: Véase el numeral F.2.10.2.2.2 para el máximo tamaño de soldaduras de filete.

El tamaño máximo de las soldaduras de filete será:

(a) A lo largo de los bordes de un material con espesor menor que 6 mm: el espesor del material.
(b) A lo largo de los bordes de un material con espesor de 6 mm o más: el espesor del material menos 1.6 mm; excepto cuando la soldadura se haya detallado en los planos para obtener el espesor completo de la garganta. En la soldadura ejecutada, se permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 1.6 mm siempre y cuando el tamaño de la soldadura sea claramente verificable.

Ilustración 1 Limitaciones de soldadura tipo Filete. Tomado de: NSR-10

Luego de realizar el estudio del concepto y verificar todo lo relacionado, como interventoría se concluye que los cambios propuestos y avalados por el ingeniero especialista son viables y no contraria lo estipulado en la NSR-10 Titulo F sección

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

2.10.2. por lo que no sería necesario el cambio de estos elementos metálicos. Sin embargo, a partir de la fecha, se recomienda la no utilización de elementos estructurales unidas por cordones de soldadura. Tales como; columnas, vigas y correas en futuras viviendas a construir para garantizar un extra de seguridad.

Atentamente,

Gustavo Benjumea

Ing. Gustavo Andres Benjumea Serrano
Residente de Interventoría

- Se anexo Copia del Concepto Técnico del Especialista

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
ASSI – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Atn
Gustavo Benjumea.

CONS.VIVIURB-INTERVENTORIA-002

REFERENCIA: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PERNOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Mediante la presente, solicito la revisión y aprobación de los siguientes cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de las casas propuestas en el contrato de obra 088 de 2021, con el objeto de construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Adjunto los siguientes documentos:

- Concepto estructural por parte del ingeniero especialista.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Título F, sección 2.10.2 y sección 2.2.3.5.
- Tarjeta profesional, ingeniero especialista.
- Registro fotográfico.

Atentamente

Luis Eduardo cayón Medina
Representante legal

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
CONSORCIO VIVE URB 2021
Atn
Ingeniero Luis Eduardo Cayon Medina

Con respecto a la revision del cambio del sistema de conexión apernado a conexión por soldadura, me permito informar lo siguiente:

1. La soldadura permite la correcta transmisión de cargas en los elementos estructurales, es un método de unión avalado por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en su título F sección 2.10.2.

2. El estado límite de resistencia para elementos sometidos a compresión axial pura está controlado en general por la fluencia a la compresión o por el pandeo de la sección. El pandeo a compresión depende a su vez de factores como la esbeltez del elemento, las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva, la excentricidad y variabilidad de la carga, y la resistencia a la fluencia y variabilidad de esfuerzos residuales en la sección, condiciones que se garantizan cuando se unen dos elementos estructurales que presentan similitud en los materiales, dado que al ser materiales similares se garantiza la continuidad del material y sus propiedades mecánicas y químicas.

Dicho esto, concluimos que no es necesario reemplazar los elementos estructurales tipo columnas que presenten este tipo de uniones, ya que estas al igual que las no soldadas garantizan la transmisibilidad de cargas y la continuidad de las propiedades estructurales del elemento.

Este mismo concepto aplica para justificar el cambio del sistema de conexión apernado entre la columna, la platina y las zapatas de cimentación, por el sistema soldado entre ellas.

Atentamente,

Ing.Diego Fernando Quiroga Santiago
Mp N°: 68202092070 STD
CC: 13861922 de Bucaramanga

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONEXIÓN POR SOLDADURA

F.2.2.3.5 — ***Diseño de conexiones*** — Los elementos de conexión deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales F.2.10 y F.2.11. Las fuerzas y deformaciones usadas en el diseño deben ser consistentes con el funcionamiento esperado de la conexión y con las suposiciones formuladas en el análisis estructural. Se admiten deformaciones autolimitadas en las conexiones. En sus puntos de apoyo, las vigas y armaduras deberán estar restringidas contra la rotación alrededor de su eje longitudinal, excepto cuando mediante análisis se puede demostrar que dicha restricción no es necesaria.

F.2.10.2 — SOLDADURAS — Se deben cumplir todas las provisiones del Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1, excepto que se aplicarán los siguientes requisitos del Capítulo F.2 en lugar de las secciones del código AWS correspondientes:

Numeral F.2.10.1.6 en lugar de AWS D1.1 — Sección 5.17.1
Numeral F.2.10.2.2.1 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2.3.2
Tabla F.2.10.2-2 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.1
Tabla F.2.10.2-5 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.3
Tabla F.2.17-1 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.4
Numerales F.2.2.3.10 y F.2.17 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2, Parte C
Numeral F.2.13.2.2 en lugar de AWS D1.1 — Secciones 5.15.4.3 y 5.15.4.4

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA



ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

MP. 682020-92070 STD

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1: Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 3: Conexión por soladura Columna-Zapata.



Imagen 2:Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 4:Columna de acero

A11 – RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A.G.M.

LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 c/No. 21 - 129 URBANIZACION BOSCAL
VALLEDUPAR, CESAR TEL. 3114172661

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410-07 / NTC 673 / ASTM C-39
EQUIVALENTES: ASTM C-39, AASHTO T 22, INCONTEC 673

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
OBRA Y LOCALIZACION: VALLEDUPAR
LA JAGUA DE IBIRICO

CONCRETO HECHO EN OBRA
(GRAVA Y ARENA DE LA GUAYPA
DESPROPORCIONADO)

P.S.I. 3000 Kg/cm2
Mpa 21.0 Mpa
Kg/cm2 210 P.S.I.

FECHA: 27/09/2021

CILINDRO No	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	ASENTAMIENTO REQUERIDO	DIAMETRO CILINDRO	LECTURA CARGA MAXIMA	RESISTENCIA P.S.I.	RESISTENCIA MPa	PORCENTAJE DE RESISTENCIA (P50)	Kg/cm2	MPa	TIPO DE ROTURA	PROYECCION A LOS 28 DIAS P.S.I.	MPa	Kg/cm2
1	CIMENT 1: EUDALDO RAFAEL ESCOBAR	09-jun-21	07-jul-21	28	3000		6,00	495,0	3459	23,8	115,3	242,1	24,2	D	3317	23,1	235,0
2	CIMENT 2: YARELYS CUBILLOS AROLA	12-jun-21	10-jul-21	28	3000		6,00	499,0	3411	23,5	113,7	238,8	23,9	D	3316	22,8	231,7
3	CIMENT 3: JUAN ANIBAL DIAZ NUÑEZ	16-jun-21	14-jul-21	28	3000		6,00	499,0	3411	23,5	113,7	238,8	23,9	D	3316	22,8	231,7
4	CIMENT 10: RUTH MARINA PEREZ	17-jun-21	15-jul-21	28	3000		6,00	493,0	3449	23,7	114,9	241,0	24,1	D	3316	23,2	235,2
5	CIMENT 3': CRISTO HUMBERTO RIOS	22-jun-21	20-jul-21	28	3000		6,00	497,0	3475	24,0	115,8	243,2	24,3	D	3319	23,4	237,3
6	CIMENT 8: MARTHA LIGIA DOMINGUEZ	25-jun-21	21-jul-21	28	3000		6,00	482,0	3515	24,2	117,2	246,0	24,6	D	3378	23,8	240,1
7	CIMENT 12: VIVIANA MERCADAL	29-jun-21	26-jul-21	31	3000		6,00	483,0	3499	24,1	116,6	244,9	24,5	D	3439	23,7	240,3
8	CIMENT 9: JOSE DAVID URRUTIA	29-jun-21	02-ago-21	7	3000		6,00	333,3	2660	18,3	88,3	185,5	18,6	D	3002	26,2	266,1
9	CIMENT 14: ANA MAGELARBRETA	29-jun-21	5-jul-21	7	3000		6,00	342,0	2718	18,7	90,6	190,4	19,0	D	3072	26,9	273,1
10	CIMENT 11: LUIS ALBERTO CAMARGO	29-jun-21	13-jul-21	14	3000		6,00	378,0	2942	20,3	98,1	206,0	20,6	D	3436	23,7	240,8
11	CIMENT 13: JESUS ALBERTO PEREZ	01-jul-21	08-jul-21	7	3000		6,00	321,0	2552	17,6	85,6	179,7	17,9	D	3401	26,2	266,3
12	CIMENT 6: MAYRA ALEJANDRA SILVA	02-jul-21	9-jul-21	7	3000		6,00	362,0	2401	16,6	80,9	168,1	16,8	D	3412	23,8	241,1
13	CIMENT 16: YENIFER ARRIETA BUSTOS	06-jul-21	03-ago-21	28	3000		6,00	438,0	3483	23,5	113,4	238,2	23,8	D	3434	23,5	239,3
14	CIMENT 4: DORIS HALDA MARTINEZ	08-jul-21	5-ago-21	7	3000		6,00	314,0	2497	17,2	83,2	174,8	17,5	D	3312	24,7	252,7
15	CIMENT 17: ANDRY JOHANA RANGEL	08-jul-21	05-ago-21	28	3000		6,00	442,0	3519	24,2	117,2	246,0	24,6	D	3311	24,2	246,0

CLASIFICACION DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO (CUNDO NO VIENE)

TIPO DE ROTURA																	
TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E									

CONSISTENCIA		SECA	SEMI SECA	MEDIA	SEMIMEDIA
ASENTAMIENTO		20 - 35	35 - 50	50 - 100	100 - 150

OBSERVACIONES:

ANTONIO GARCIA M.
INGENIERO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A.G.M.
LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 #No. 21 -123 URBANIZACION RIVACAL
VALLEDUPAR, CESAR. TEL. 3114172081

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA USADA NTC 673
ECUYVALENTES ASTM C39, AASHTO T22, INVCONTEC 673

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
OBRA Y LOCALIZACION: VALLEDUPAR
LA JAGUA DE IBIRICO

CONCRETO HECHO EN OBRA
RESIST. CONTRACTUAL A COMPRESION

P.S.I. Kg/cm2 3000
Mpa Mpa 21.0
Kg/cm2 P.S.I. 210

FECHA: 27/09/2021

CILINDRO No.	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD EN DIAS	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	ASENTAMIENTO REQUERIDO	DIAMETRO DEL MOLDE	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA		PORCENTAJE DE RESISTENCIA (PSI)	Kg/cm2	MPa	TIPO DE ROTURA	PROYECCION A LOS 28 DIAS		
									P.S.I.	MPa					P.S.I.	MPa	Kg/cm2
16	CIMENT 16 MADELENES HERNANDEZ	13-jul-21	27-jul-21	14	3000		6,00	359,0	2655	18,7	96,2	190,8	26,0	D	3334	23,0	233,4
17	CIMENT 21 YURIS MARETH GRANADO	13-jul-21	14-jul-21	7	3000		6,00	397,0	2441	16,8	81,4	170,9	17,1	D	3331	22,3	226,1
18	CIMENT 16 LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	14-jul-21	11-ago-21	28	3000		6,00	427,0	3335	23,4	113,2	237,7	23,8	D	3335	22,4	227,7
19	CIMENT 20 MILEIDYS YONARIS RAMIREZ	15-jul-21	29-jul-21	14	3000		6,00	379,0	3014	20,8	100,5	210,9	21,1	D	3330	24,3	248,4
20	CIMENT 23 JOSEFINA ORTEGA	16-jul-21	30-jul-21	14	3000		6,00	328,0	2898	18,8	87,2	183,1	18,3	D	3836	21,1	213,8
21	CIMENT 24 OSCAR DE JESUS ROLONA	17-jul-21	24-jul-21	7	3000		6,00	362,0	2401	16,6	80,0	168,1	16,8	D	3445	23,8	241,1
22	CIMENT 7 YORAMA POLO ROJANO	20-jul-21	17-ago-21	28	3000		6,00	438,0	3403	23,5	113,4	238,2	23,8	D	4832	33,7	341,7
23	CIMENT 22 LUIS ALFONSO AVILA	22-jul-21	05-ago-21	14	3000		6,00	380,0	3037	20,8	101,2	212,6	21,3	D	3346	24,5	248,3
24	CIMENT 20 JUAN CARLOS GUTIERREZ	23-jul-21	30-jul-21	7	3000		6,00	310,0	2481	17,1	82,7	173,7	17,4	D	3559	24,5	248,1
25	CIMENT 26 HERNIS YOHANNA NUÑEZ	24-jul-21	31-ago-21	14	3000		6,00	382,0	3157	21,5	103,0	216,3	21,6	D	3641	25,1	254,8
26	CIMENT 29 RUBY SANCHEZ	28-jul-21	4-ago-21	7	3000		6,00	324,0	2617	16,7	85,6	179,2	16,8	D	3448	23,8	242,7
27	CIMENT 33 CECILIA ROSTRAVELO	29-jul-21	12-ago-21	14	3000		6,00	382,0	2799	19,3	98,3	186,9	19,6	D	3329	22,5	229,0
28	CIMENT 30 LUZ MARIA RODRIGUEZ	30-jul-21	13-ago-21	14	3000		6,00	385,0	3037	20,9	101,2	212,6	21,3	D	3348	24,5	248,3
29	CIMENT 27 YARLIZA BEATRIZ CRUZ	31-jul-21	14-ago-21	14	3000		6,00	342,0	2779	18,7	95,8	198,4	19,0	D	3176	21,0	222,3
30	CIMENT 34 CARMEN AUCIA GARCIA	03-ago-21	10-ago-21	7	3000		6,00	318,0	2593	17,3	83,9	175,9	17,6	D	3461	24,9	262,3

TIPOS DE ROTURA

TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E

CLASIFICACION DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO (NTC 396)

CON RETENCION		SECA		SECA	
ASENTAMIENTO		SECA	0 - 2	SECA	0 - 2
		PLASTICA	3 - 5	PLASTICA	3 - 5
		FLUIDA	6 - 9	FLUIDA	6 - 9

OBSERVACION:

ANTONIO GARCIA M.
INGENIERO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A12 – ACTAS DE TERCERA SUPERVISACION TECNICA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Julio Ibañez		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	01	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:		No. DE SUPERVISION EN CAMPO				

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:		NO:	X	NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS							
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X	
		NO:			NO:		

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA							
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:
	NO:	X		NO:	X		NO: X

11. ACABADOS DE LA FACHADA							
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:
	NO:			NO:			NO:

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES
* Faltante Combo de baño Estuco, Enchape, Tanque Elevado, Instalación de Lavadero y Pintura en Fachadas.

Gustavo Bayuelo FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA	FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR	FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

YoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: TULIA IBAÑEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA							ASSII
BENEFICIARIO:	Orlando Nieto	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	02	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO		

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	✓	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	✓	CUMPLE NIVEL:	SI:	✓	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	✓	
	NO:			NO:			NO:		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	✓	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	✓	
	NO:			NO:		

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	✓	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	✓	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	✓	
	NO:			NO:			NO:		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS						
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	✓
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	✓
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	✓
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	✓	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	✓	
	NO:			NO:		

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	✓	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	✓	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	✓
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	✓
	NO:	✓		NO:	✓		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	✓	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	✓	
	NO:			NO:	✓		NO:		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	✓		NO:	✓		NO:	✓

11. ACABADOS DE LA FACHADA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	✓		NO:	✓		NO:	✓

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

Faltante En Cumbre de Baño, Estuco, Enchape, Instalación de Tanque Elevado, Instalación de Lavadero y Platinas En Fachada.

Gustavo Barrera
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Vale

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: ORLANDO NIETO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Lucinda Montero		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	03	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO		

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS						
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	X	
	NO:			NO:	X		NO:		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Falta de Cambio de Bajos, Estuco Enchape, Instalacion de Tuqui Elevado, Lavadero y Pintura en Fachada.

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA	FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR	FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: LUZMILA MONTERO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA							ASSII
BENEFICIARIO:	Dixone Arcuri	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	04	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO		

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE								
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS							
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X	
		NO:			NO:		

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:		

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	X	
	NO:			NO:	X		NO:		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Falleta Cambio de Boro, Enchapes, Estuco, Instalación de Tanque, Lavadero y Pintura En fachada.

Cesario Barrientos
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Vobo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: DIANA SUAREZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Mauricio Mendoza		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	05	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO		
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI: X	NO:		NIVEL CUMPLE:		SI: X	NO:		
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI: X / NO:		CUMPLE NIVEL:	SI: X / NO:		PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI: X / NO:		
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI: X / NO:		TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:				SI: X / NO:		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI: X / NO:		LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI: X / NO:		TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI: X / NO:		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:		SI: X / NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI: X / NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:		SI: X / NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI: X / NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:		SI: X / NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:		SI: X / NO:		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:			SI: X / NO:		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:		SI: X / NO:		
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI: ✓ / NO:		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI: X / NO:		CUENTA CON PENDIENTE:	SI: X / NO:		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI: X / NO:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI: X / NO:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI: X / NO:		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: X / NO:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: / NO: X		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI: X / NO:		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: / NO: X		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: / NO: X		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI: X / NO:		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: / NO: X		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: / NO: X		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI: X / NO:		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									
* Faltante En Cambios de Bajantes, Enchapes, Estuco, Instalacion de Tragos, Cuadros, y Pintura En Fachadas.									
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA				FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA					
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR				FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA					

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: MARIO MENDOZA.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica




1.5 Habitación.



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

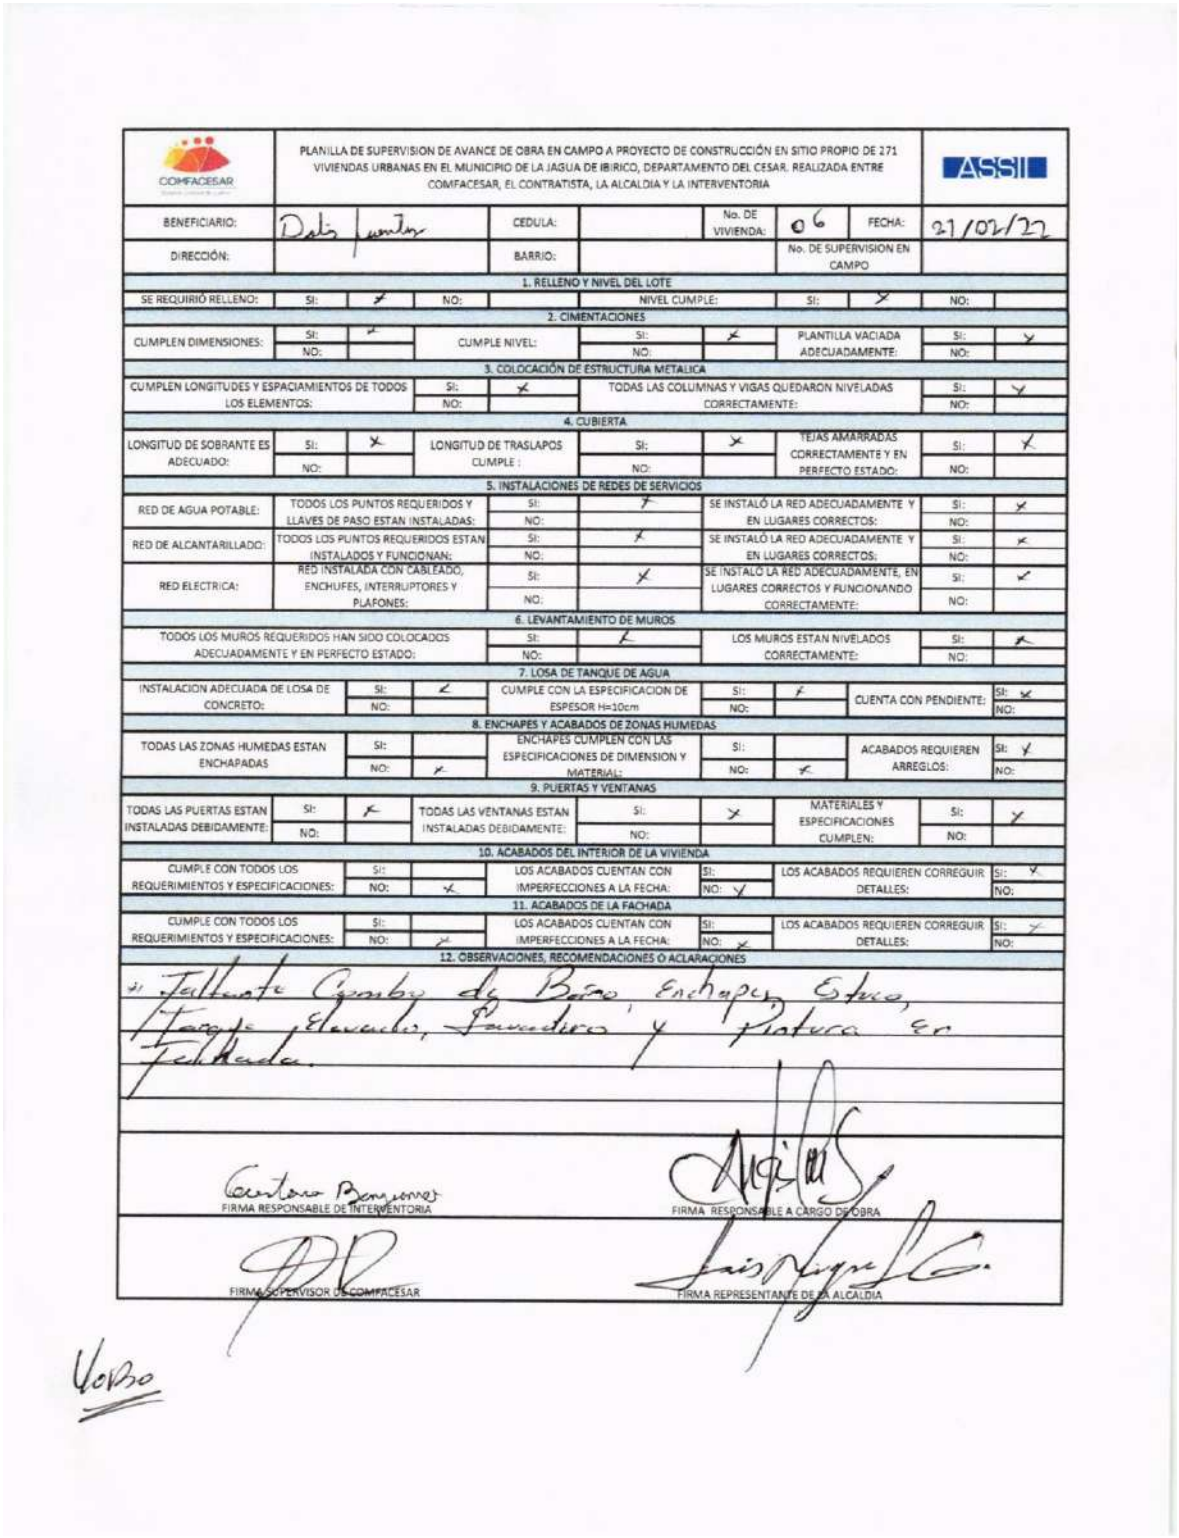

COMFACESAR

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Dalis [illegible]	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	06	FECHA:	21/02/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:		No. DE SUPERVISION EN CAMPO			

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

Si Faltante Cambio de Baño, Enchapes, Estuco, Tarrajeo, Revoque, Lavadero, y Pintura en Fachada.

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

VoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: DOLIS FUENTES.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

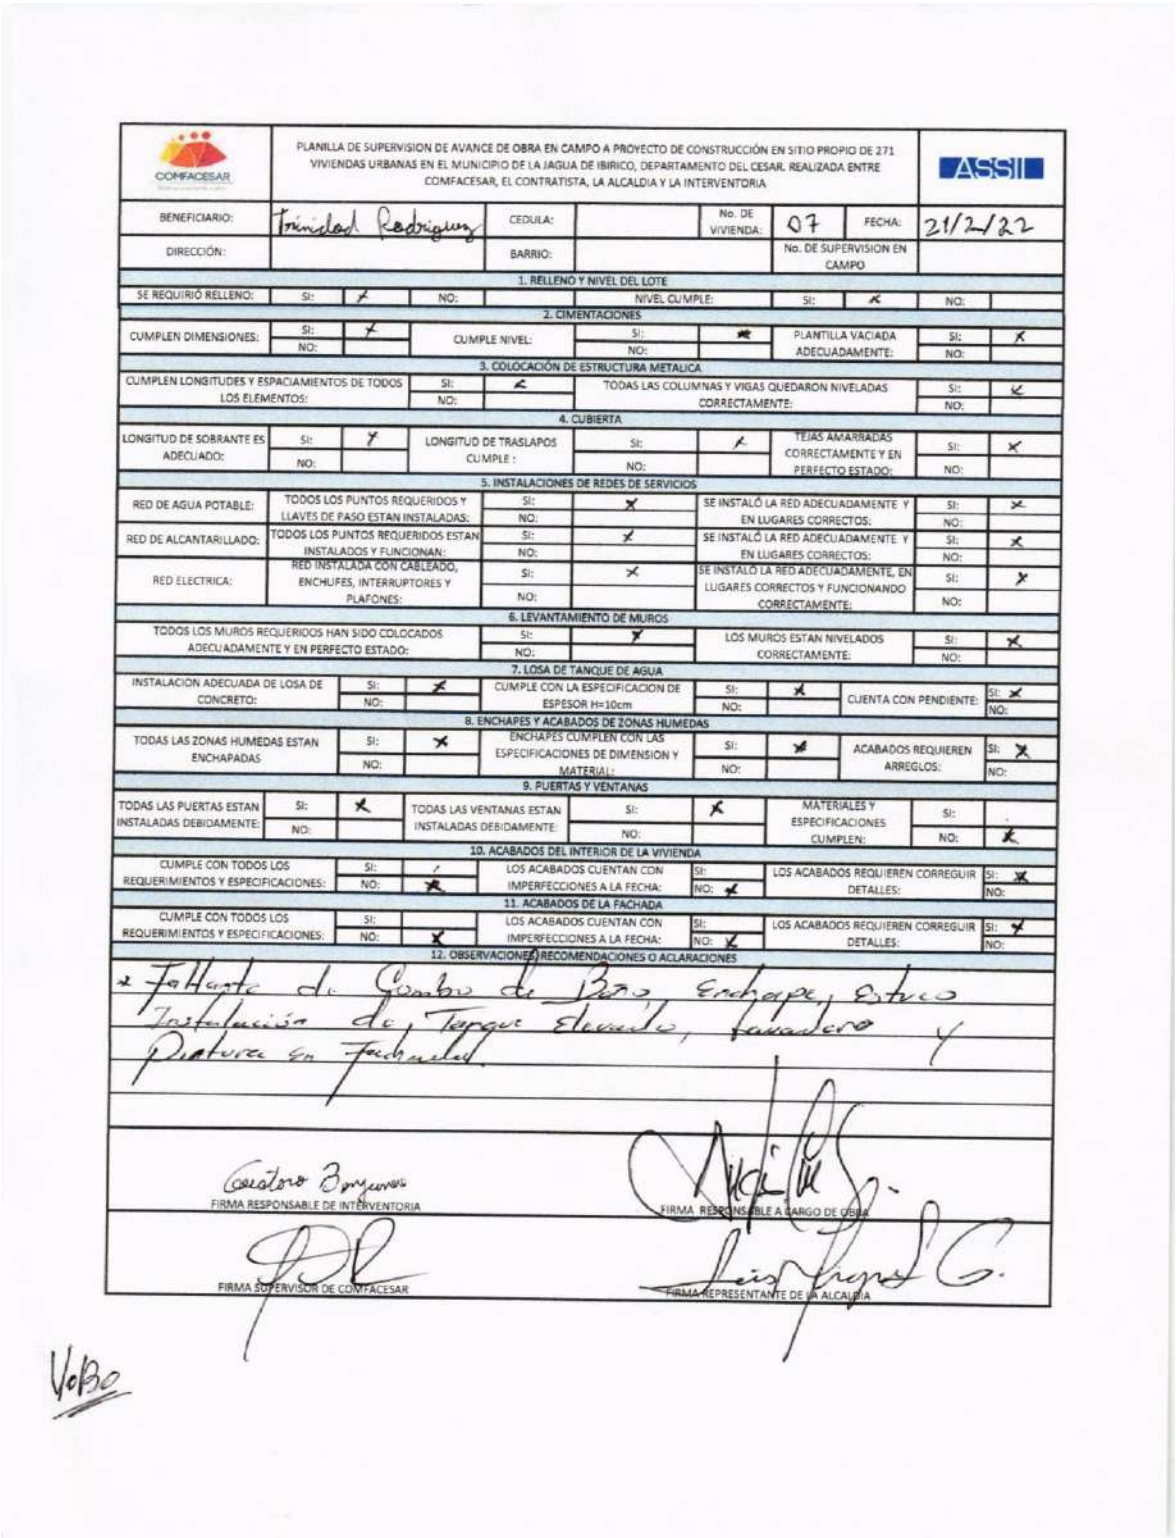

COMFACESAR

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Trinidad Rodriguez	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	07	FECHA:	21/2/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO	

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI: X	NO:	NIVEL CUMPLE:	SI: X	NO:		

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI: X / NO:	CUMPLE NIVEL:	SI: X / NO:	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI: X / NO:		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI: X / NO:	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:		SI: X / NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI: X / NO:	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI: X / NO:	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI: X / NO:		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI: X / NO:	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI: X / NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI: X / NO:	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI: X / NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI: X / NO:	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI: X / NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI: X / NO:	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:		SI: X / NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI: / NO: X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI: X / NO:	CUENTA CON PENDIENTE:	SI: X / NO:		

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI: X / NO:	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI: X / NO:	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI: X / NO:		

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: X / NO:	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: X / NO:	MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI: / NO: X		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: / NO: X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: / NO: X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI: X / NO:		

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: / NO: X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: / NO: X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI: X / NO:		

12. OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

- Falta de Cambio de Baño, Enchape, Estuco Instalación de Tanque Elevado, Lavadero y Pintura en Fachada.

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

VoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: TRINIDAD RODRIGUEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

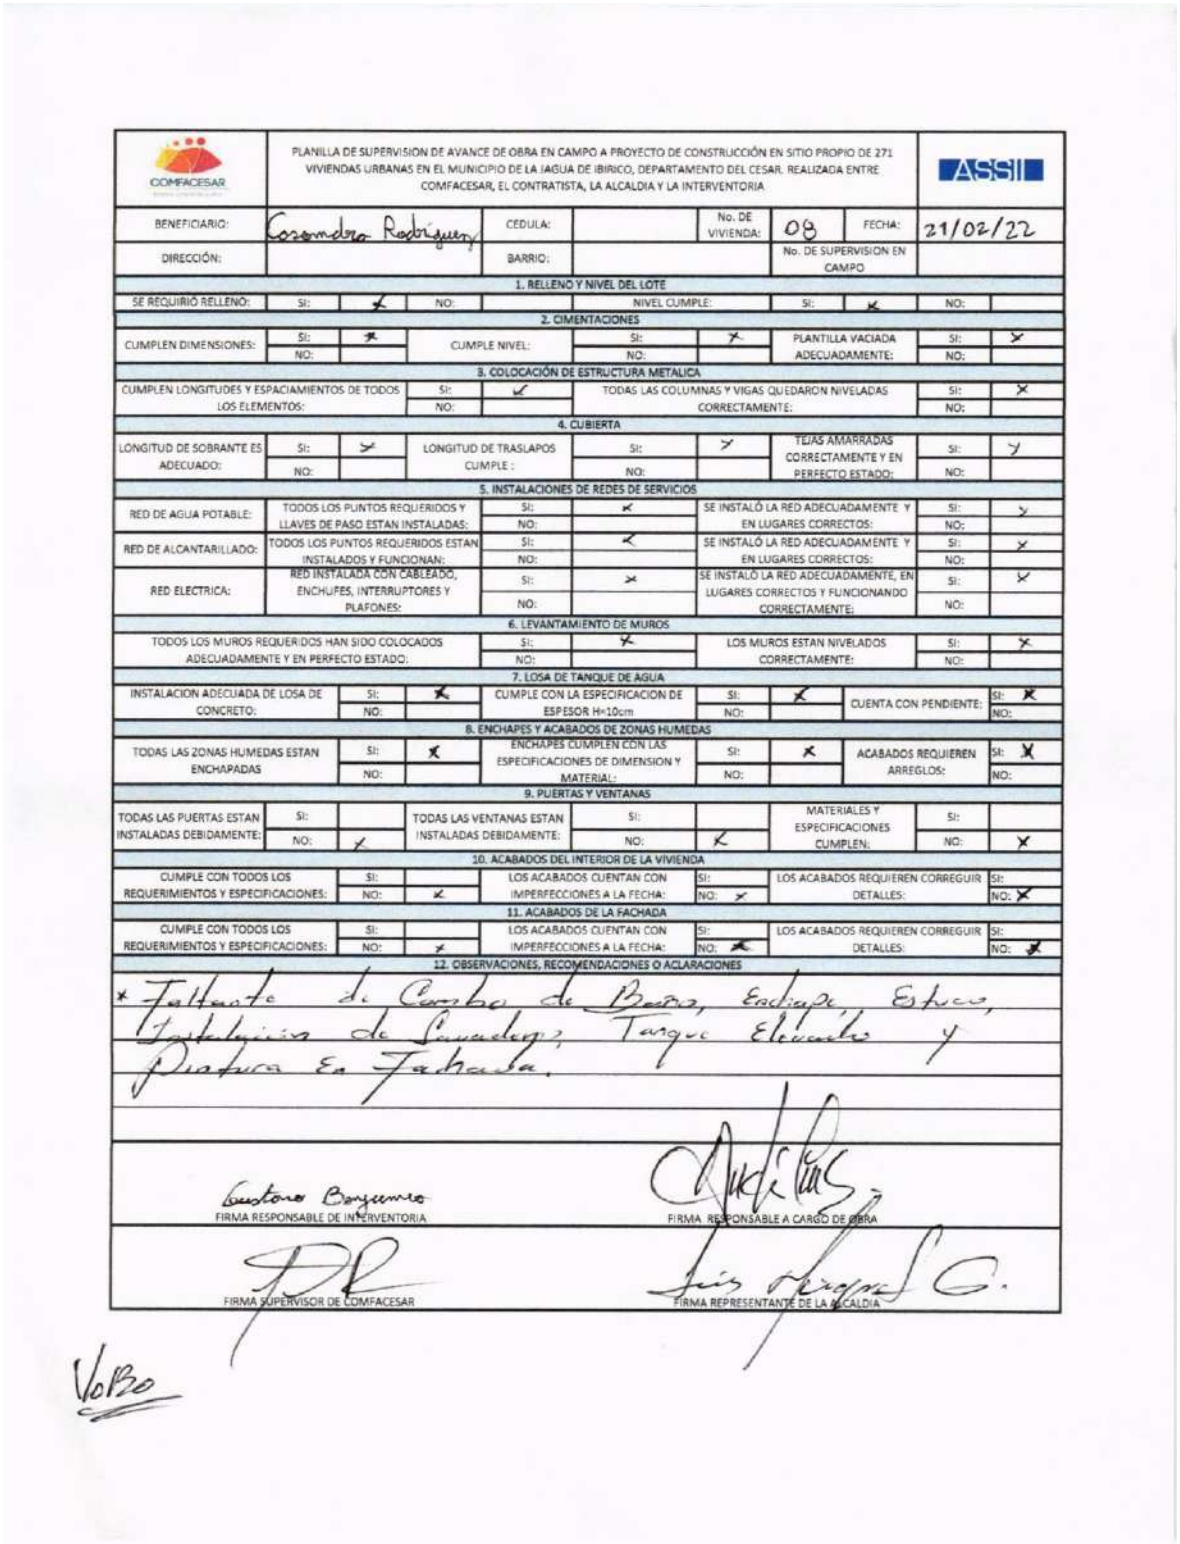

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA	ASSII

BENEFICIARIO:	Cosomdra Rodriguez	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	08	FECHA:	21/02/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:		No. DE SUPERVISION EN CAMPO			

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:		SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:		SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:		SI:	X
	NO:				NO:	

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :		SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS						
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:		SI:	X
	NO:				NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS								
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:
	NO:	X		NO: X		NO: X

11. ACABADOS DE LA FACHADA						
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:
	NO:	X		NO: X		NO: X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Faltante de Cerramiento de Bastos, Enchape, Estuco, Instalación de Lavamanos, Tanque Elevado y Pintura En Fachada.

Gustavo Barrientos
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

VoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: CASANDRA RODRIGUEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

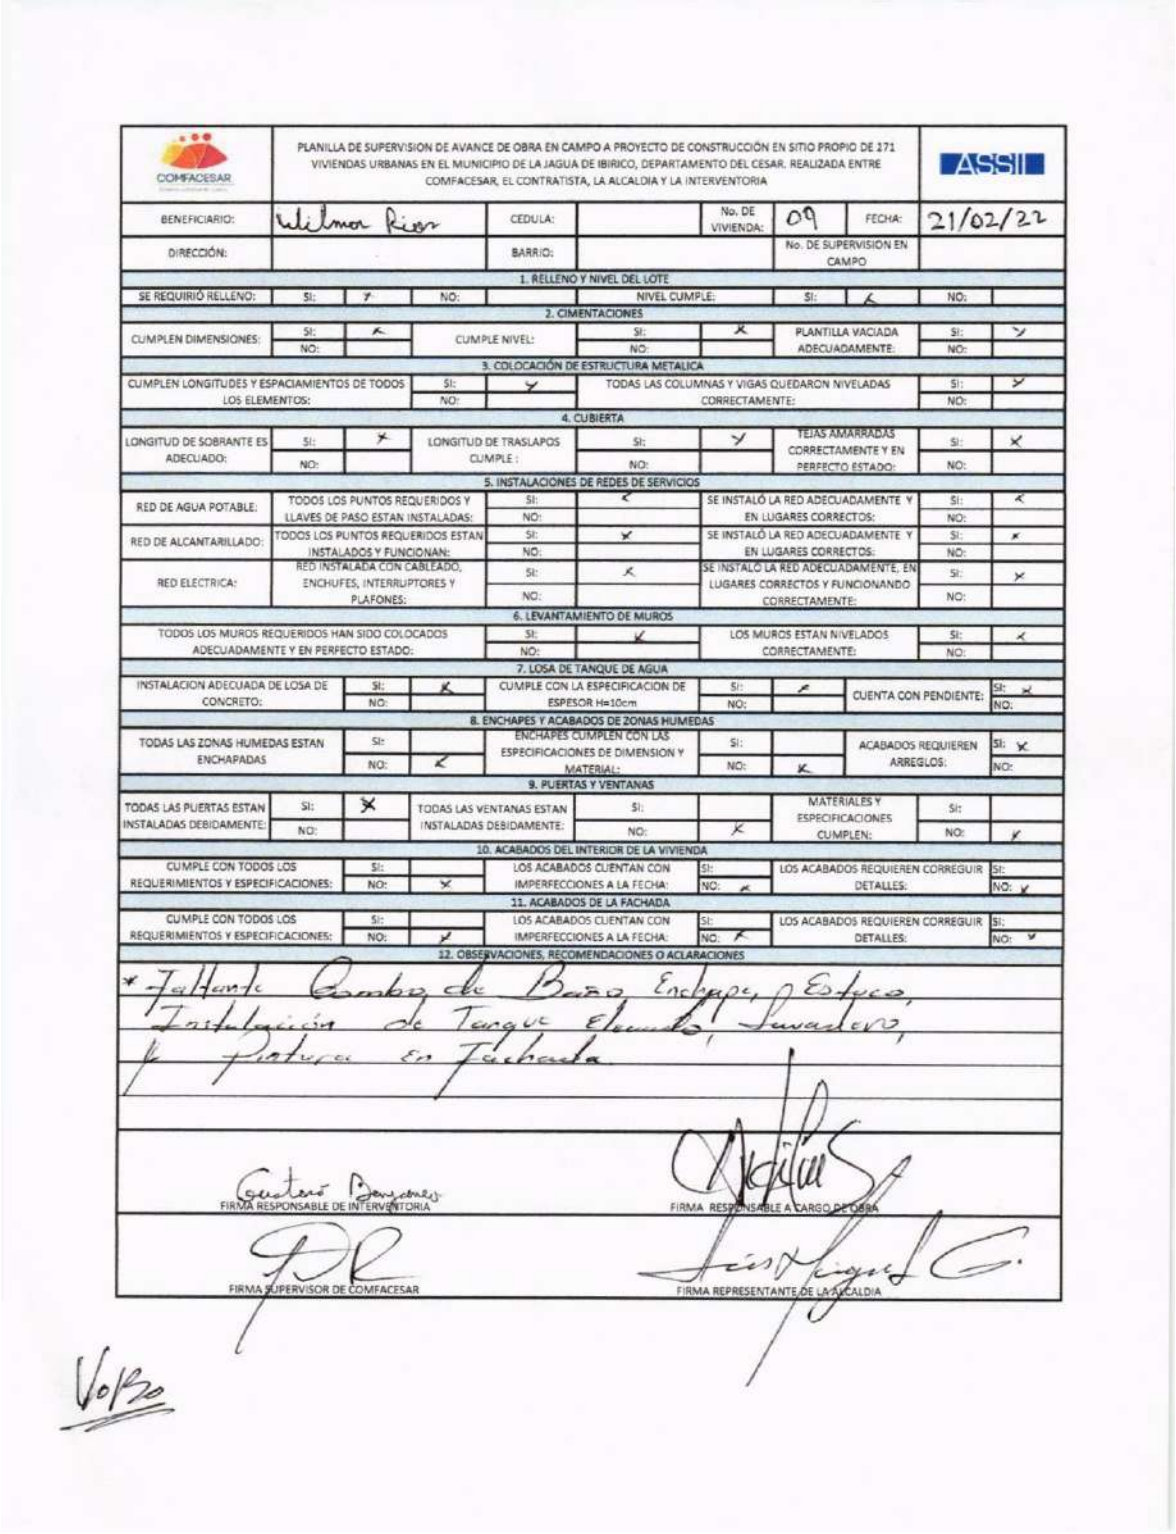

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA	ASSII

BENEFICIARIO:	Wilmar Rios	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	09	FECHA:	21/02/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:		No. DE SUPERVISION EN CAMPO			

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:			NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Falhante Cambio de Baño, Enchape, Estuco, Instalación de Tanque Elevado, Lavadero, y Pintura en Fachada

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA	FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR	FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

VoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: WILMAR RIOS.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

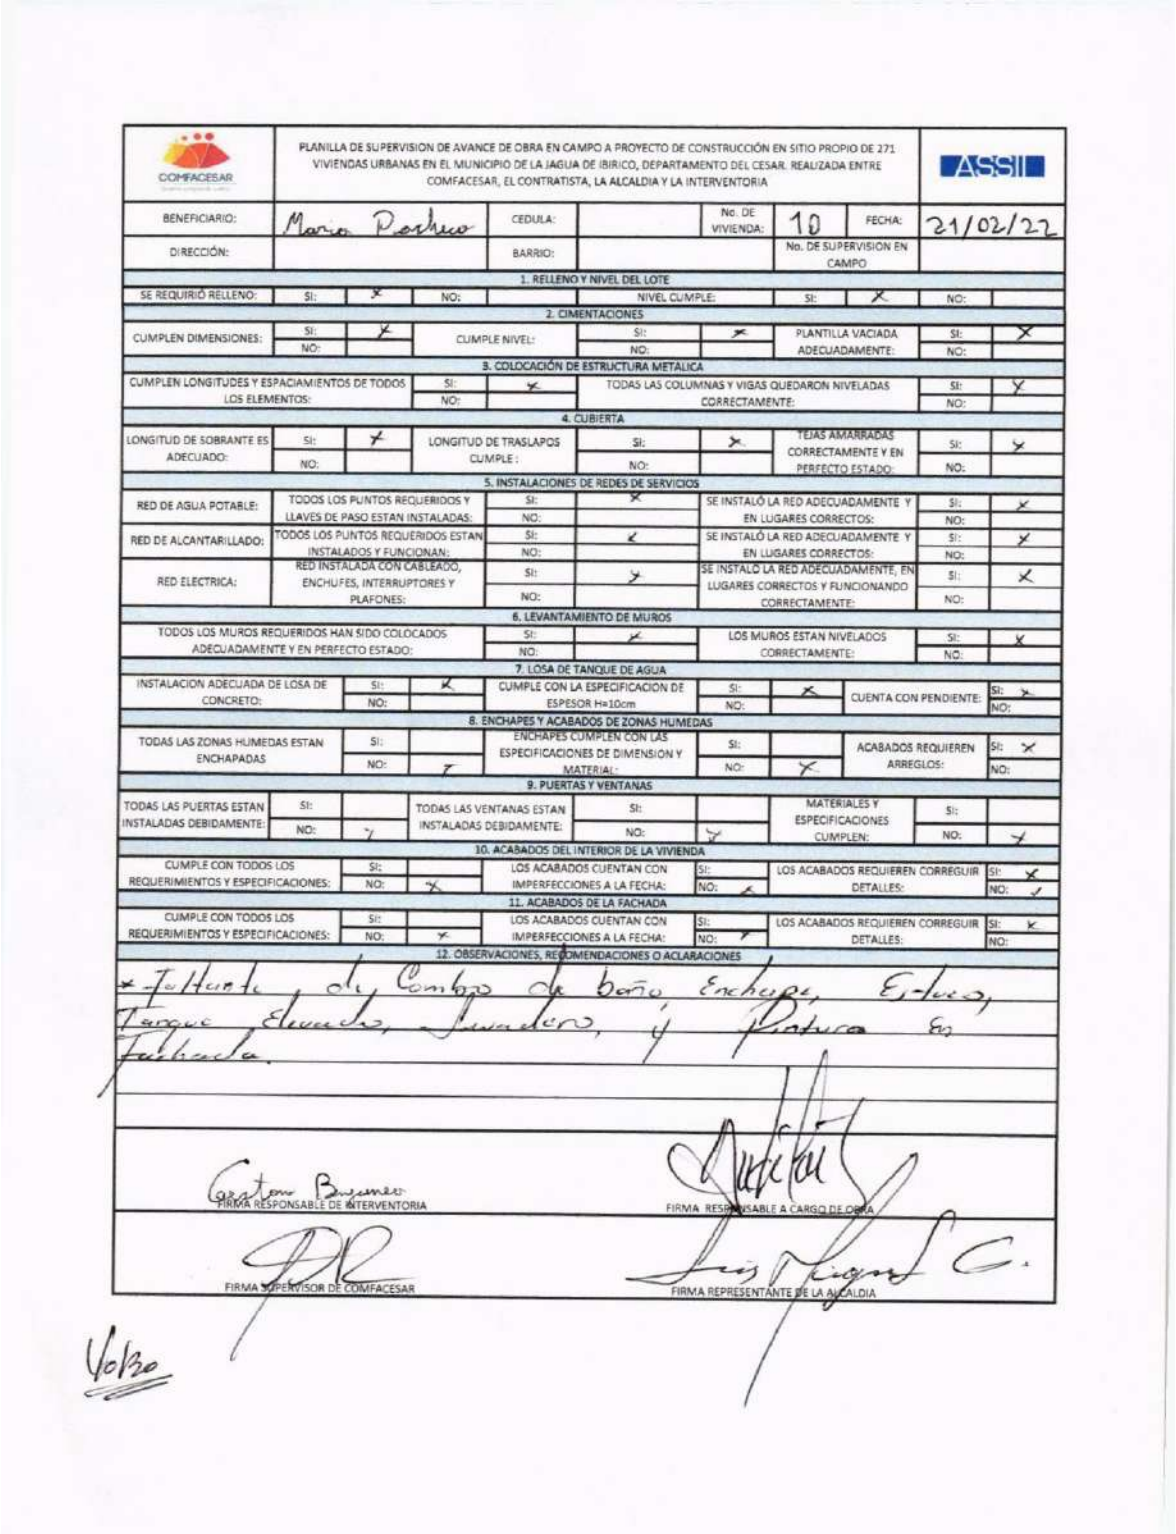

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA	ASSII

BENEFICIARIO:	Maria Pacheco	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	10	FECHA:	21/02/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:		No. DE SUPERVISION EN CAMPO			

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Falta el Combo de baño, Enchapes, Estuco, Tanque, Elevados, Lavadero, y Pintura en Fachada.

Gaston Buenaventura
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: MARIO PACHECO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Jorge Ojeda		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	11	FECHA:	21/02/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO		

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:		SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:		SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA						
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS						
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS						
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS								
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

Faltante Combo de Baño, Enchapes Estuco Tanque Elevado, Lavadero y Pintura en Fachada.

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA


REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: JORGE GELVIS.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

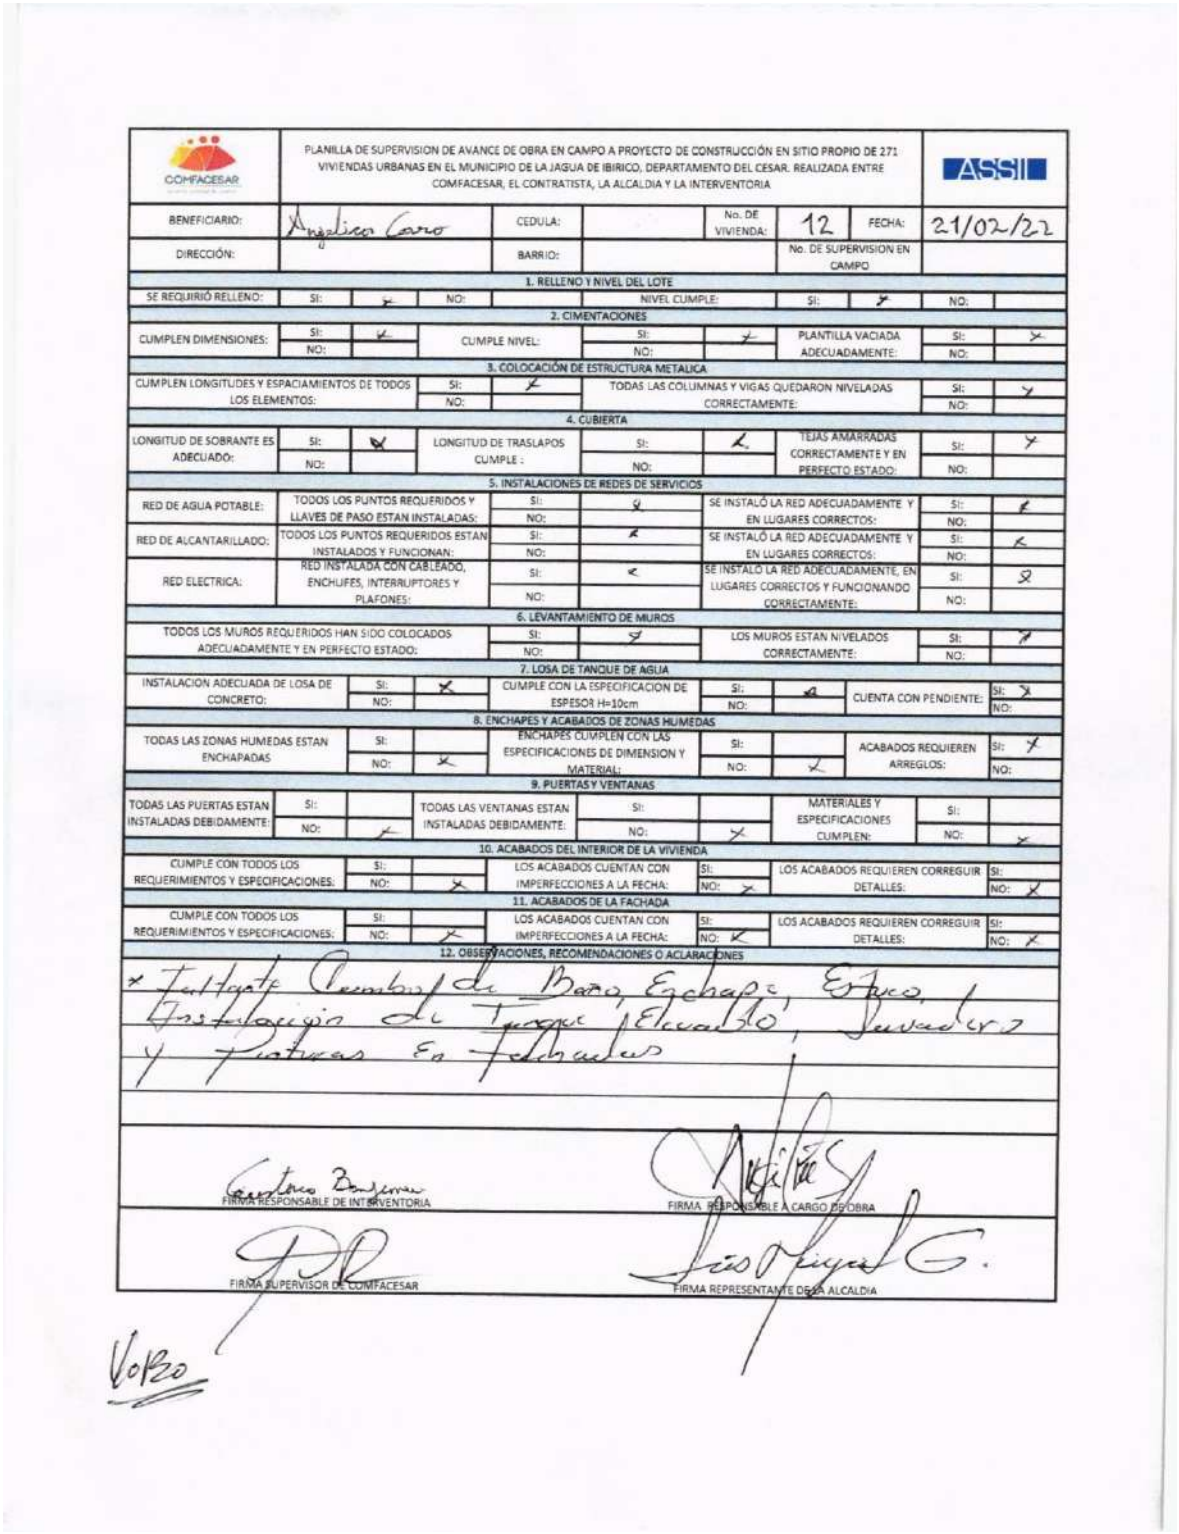

COMFACESAR

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Angelica Cano	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	12	FECHA:	21/02/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO	

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE :	SI:	X	TEJAS AMARRADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:	X		NO:	X		NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

* Falta de Cambio de Baño, Enchape, Estuco, Instalacion de Tuqui Eleva 80, Lavadero y Puertas En Fabricadas

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

VoBo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: ANGELICA CARO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal 	1.2 Fachada Posterior 
1.3 Cocina 	1.4 Estructura Metálica 
1.5 Habitación. 	1.6 Baño 

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A13 – INFORME SOCIAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A14 – INFORME DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A15 – INFORME AMBIENTAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORME DE GESTION AMBIENTAL

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (IMPLEMENTACION DEL P.M.A)

CONSORCIO VIVE URBE 2021

PERIODO: Febrero del 2022

ELABORÓ

ING. AMBIENTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
FEBRERO 2022

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO

1. INTROUCCION.....4

2. OBJETIVOS.....5

2.1 GENERAL 5
2.2. ESPECIFICOS.....5

3. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.....6

4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA.....6

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO.....7

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.....8

6.1. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL.....8
6.2. ENGANCHE DE PERSONAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA.....9
6.3. MANEJO DE CAMPAMENTO TRANSITORIO.....10
6.4. MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE MATERIAL DE CORTE.....11
6.5. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12
6.6. MANEJO Y USO ADECUADO DEL RECURSO AGUA. 13
6.7. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 14

7. CONCLUSION.....15

8. ANEXOS.....16

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTROUCCION

La presente versión de la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de Infraestructura Vial, responde a las necesidades de incorporar los recientes cambios en la normativa y en las políticas ambientales del país, así como de acoger las directrices de la actualización de la política ambiental de INVIAS y de adoptar las mejores prácticas en planificación, diseño y construcción que contribuyan a disminuir el riesgo frente a desastres naturales.

La gestión ambiental sectorial es responsabilidad no solamente de los actores institucionales, sino de los ejecutores privados a través de quienes se realizan los proyectos, por esta razón cobra especial vigencia la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado y los particulares para asumir la planeación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura con una visión innovadora y proactiva, orientada a disminuir la afectación del patrimonio natural y cultural, y a promover efectivamente un desarrollo sostenible, por lo cual se establece como criterio institucional avanzar en la estructuración integral de los contratos, para atender tanto las necesidades técnicas del corredor como de su entorno más próximo, con lo cual además de promover la sostenibilidad de las inversiones, se contribuye a prevenir la ocurrencia de hechos de la naturaleza con consecuencias altamente costosas para el Estado.

En este contexto, además de promover buenas prácticas de ingeniería y de aplicar las medidas de manejo adecuadas previstas en las especificaciones generales de construcción, los proyectos civiles pueden ser promotores de la conservación ambiental.
Bajo esta iniciativa, se han adecuado las medidas de manejo ambiental para el proyecto denominado.

NOMBRE PROYECTO: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

De esta manera y acordadas las condiciones, la ejecución de obras debe ceñirse a los más estrictos estándares de calidad del proceso constructivo, con explícita prohibición de extraer o depositar materiales, o realizar cualquier otra actividad que afecte el equilibrio ambiental de la zona.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Seguir Implementando todas las actividades encaminadas a Mitigar, Reducir, y/o Compensar las posibles afectaciones al Ambiente en la CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021.

2.2. ESPECIFICOS

- Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo donde se presente generación de residuos sólidos.
- Priorizar los factores de Ambientales que se presenten afectación y colocarlos en plan de mejora.
- Capacitar al personal sobre la importancia del ambiente y sus componentes.
- Hacer cumplir el uso permanente en obra de los puntos ecológicos.
- Atender las solicitudes realizadas por la interventoría y corregir.
- Realizar jornadas de limpiezas semanales.

CONSORCIO
RECREODEPORTIVO 2021

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Para contrarrestar los posibles impactos potenciales el contratista viene implementando por medio de su profesional ambiental en campo un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y abandono.

Con el fin de darle un buen control a lo plasmado en el (**P.M.A**) se viene implementando un sistema que consta de una serie de fichas de seguimiento ambiental, estas serán las principal herramienta de gestión ambiental del proyecto, comprende las medidas de manejo necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y/o controlar los impactos negativos que se puedan presentar por el desarrollo del proyecto.

Para la determinación de las áreas de influencia se tomó como base los siguientes aspectos.

- Actividades a desarrollar con la ejecución del proyecto.
- División político administrativa del municipio.
- Actividades socioeconómicas pertenecientes al área de influencia del proyecto.
- Análisis de trascendencia de los posibles impactos por la ejecución de las actividades a desarrollar.


4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

- SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL.
- ENGANCHE DE PERSONAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA.
- MANEJO DE CAMPAMENTO TRANSITORIO.
- MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE MATERIAL DE CORTE.
- MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- TRABAJO CORDINADO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS.
- MANEJO Y USO ADECUADO DEL RECURSO AGUA.
- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y JORNADA DE ASEO.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida.

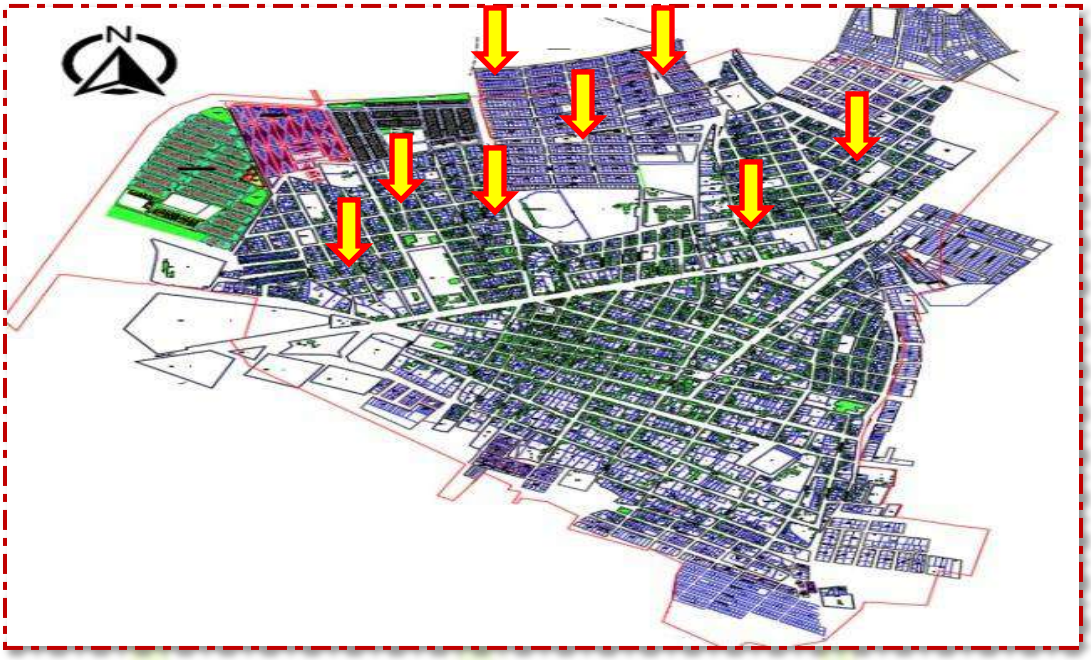

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24’ de latitud norte y 73º20’ de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

6.1. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL.

Consiste en la preparación y realización de un programa de sensibilización y capacitación ambiental dirigido a todo el personal que labora en la empresa tanto al área de campo como administrativa.

Para lograr la concienciación del personal de obra, se están implementando unas capacitaciones permanentes, con el objetivo de sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se ejecuta el proyecto.



Las jornadas de educación y capacitación se realizarán sin costo económico alguno para el trabajador. Se están realizando en espacios abiertos y ventilados, dotados de los materiales y de las comodidades básicas para los trabajadores asistentes.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.2. ENGANCHE DE PERSONAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA.

Uno de los objetivos de este proyecto es no generar la migración de población residente en otros municipios al AID para vincularse laboralmente al proyecto, puesto que el incremento de población foránea puede generar impactos de naturaleza negativa, que tendrán como resultado final el desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes.

La línea de base del componente socioeconómico y cultural debe indicar la dinámica del empleo, los perfiles laborales que hay en el área y en fin conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.
Con esta información, el contratista viene haciendo uso de la contratación de mano de obra local.







El Contratista difundió en la socialización inicial como sería el procedimiento para la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Las actividades definidas se concentrarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano para el recibo de las hojas de vida de los aspirantes.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.3. MANEJO DE CAMPAMENTO TRANSITORIO.

Este programa contempla las medidas mínimas que se están implementando para la instalación, el funcionamiento y el desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal que se construyeron para la ejecución de las obras del proyecto y los lineamientos mínimos implementados tanto para las actividades de instalación, funcionamiento como de desmantelamiento de las plantas que demandará el proyecto.



El descapote se realizará sólo en el área estrictamente necesaria para la construcción de la infraestructura – vivienda, almacén, talleres – El material retirado será utilizado para cubrir en lo posible zonas erosionadas aledañas al sitio.

Se instalarán en el campamento y patio de almacenamiento, sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites – cunetas, sedimentadores, trampa de grasas conforme lo establece el programa de Gestión hídrica.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.4. MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE MATERIAL DE CORTE.

Esta actividad consiste en disponer los materiales sobrantes generados durante la obra en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Esto incluye la disposición temporal y el manejo dentro de la obra.

En algunos casos mediante solicitud y llenado de formato de solicitud se regala en relleno a habitantes cercanos al área de donde se está construyendo la obra, con el compromiso de hacer uso del mismo lo más pronto posible para evitar incidentes o accidentes con las personas que por ahí transitan.



En lo posible, las obras no deben producir escombros ni sobrantes de materiales de construcción; estos pueden ser reutilizados, reciclados o, en último caso, dispuestos en sitios adecuados sin causar deterioro sobre el ambiente.

Para dar una adecuada disposición de estériles y escombros se requiere considerar, desde la etapa de planificación de la construcción del proyecto, los conceptos de localización, diseño, construcción, manejo y adecuación de las escombreras o sitios de disposición final, para prevenir y controlar los impactos propios de esta actividad.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.5. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras.



Los materiales en esta obra no se almacenan en áreas cercanas a los frentes de obra para evitar que obstaculicen la realización de los trabajos, estos se vienen almacenando en forma adecuada en los sitios seleccionados en común acuerdo con la interventoría, de este modo debe confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material que el contratista defina y que la Interventoría apruebe también, con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.6. MANEJO Y USO ADECUADO DEL RECURSO AGUA.

Este programa, se compone de dos líneas:

a) medidas ambientales para el manejo de las aguas superficiales.

b) adecuado manejo a los residuos líquidos tanto domésticos como industriales, que se generen por las actividades propias de cada proyecto.



Acciones que se vienen realizando:

- ✓ En las actividades del proyecto cercanas a cuerpos de agua se vienen tomando las medidas necesarias para la protección y aislamiento de estas corrientes, con el objeto de evitar el aporte de materiales.

- ✓ se viene Supervisando en forma permanente durante la construcción de las actividades del proyecto los cruces de quebradas y/o ríos con la vía, con el objeto de detectar la contaminación de estos cuerpos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.7. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Para el manejo integrado de los residuos sólidos generados en la obra se inicia a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, esto es, en el sitio donde se producen; se tiene claro el tipo de residuo que se genera y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables.







En la entrada de la obra se disponen canecas con bolsas de basura que diariamente se recogen y se acopiarán en el campamento o en el sitio que se haya dispuesto para tal fin.

Durante esta etapa de recolección y almacenamiento temporal, el contratista implementa capacitaciones al personal calificado y no calificado sobre el manejo integral de residuos sólidos, de manera que se garantice el cumplimiento de la política integral de los mismos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. CONCLUSION.

- Para este periodo se adelantaron todas las acciones necesarias que nos permitan mitigar/ prevenir/ controlar y/o compensar los impactos generados por el desarrollo de las actividades propias del proyecto.

- Se ha venido avanzando en la implementación del P.M.A con el firme objetivo de estar en armonía con el ambiente y el entorno familiar cerca de la obra.

- Se sigue implementando las charlas de seguridad tanto para trabajadores de campo como para los de oficina ya que todos podemos contribuir con el buen ambiente de la obra.

- Se sigue trabajando de la mano de la interventoría acatando e implementando las correcciones necesarias para tratar de mitigar/ prevenir/ controlar y/o compensar los impactos generados.

- El personal profesional de la obra seguirá comprometido con el buen funcionamiento de la obra sin escatimar ningún esfuerzo necesario.

CONSORCIO
RECREODEPORTIVO 2021

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8. ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONTROL DE RESIUDOS SOLIDOS

FECHA	NO RECICABLES		RECICLABES					
	RESIDUOS ORDINARIOS		PAPEL CARTON		PLASTICO		CHATARRA	
	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG
FEBRERO	4	3	3	4	2	2	0	0
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								

CONSORCIO
RECREODEPORTIVO 2021

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO


Valledupar – Cesar.

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CONSORCIO VIVE URBE 2021

PERIODO: Febrero del 2022

ELABORO:



LIZETH KARINA MORENO
INSPECTORA HSE

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
FEBRERO 2022

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....3

2. OBJETIVOS.....4

2.1. Objetivos específicos. 4
2.2. Objetivos específicos. 4

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 5

4. MARCO JURIDICO Y LEGAL. 6

5. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....7

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....7

6.1. Señalización. 8
6.2. Desvió de tráfico vehicular. 9
6.3. Capacitación y/o charlas de seguridad industrial. 9
6.4. Cronograma de charlas y/o capacitaciones diarias. 10
6.5. Identificación de peligros, evaluación de riesgos. 10

7. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 12

7.1. Actividades de promoción y prevención 12
7.2. Entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (epp). 13
7.3. Reporte e investigación de accidentes laborales 13
7.4. Uso adecuado de elementos de protección personal (epp). 14

8. CONCLUSIÓN.....14

9. ANEXOS.....16

9.1. FORMATOS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO. 16
9.2. FORMATO INSPECCIONES DE CONDICIONES INSEGURAS 28
9.3. FORMATO DE LAVADO DE MANOS. 36
9.4. FORMATO ENTREGA DE EPP. 42
9.5. FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD. 48

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCION.

Las obras civiles generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de salud y seguridad ocupacional (Siso-Ambiental). La calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

El presente documento constituye el informe mensual del seguimiento y control a cada componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S.I.S.O) realizado por el **CONSORCIO VIVEURB 2021,** el cual ha sido muy riguroso en el cumplimiento de lo establecido por la ley.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos específicos.

Realizar el informe mensual y plasmar las actividades realizadas de seguridad industrial y salud ocupacional ejecutadas en el proyecto **“**CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR


2.2. Objetivos específicos.

- ✓ Determinar las condiciones laborales de los trabajadores del proyecto.
- ✓ realizar encintados de seguridad en el área de trabajo y finalizada la jornada.
- ✓ Realizar dotación de campamento.
- ✓ realizar entrega de elementos de protección personal.
- ✓ Determinar los impactos positivos que generan las charlas o capacitaciones.
- ✓ Escuchar las sugerencias y correctivos hechas por la interventoría.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida.

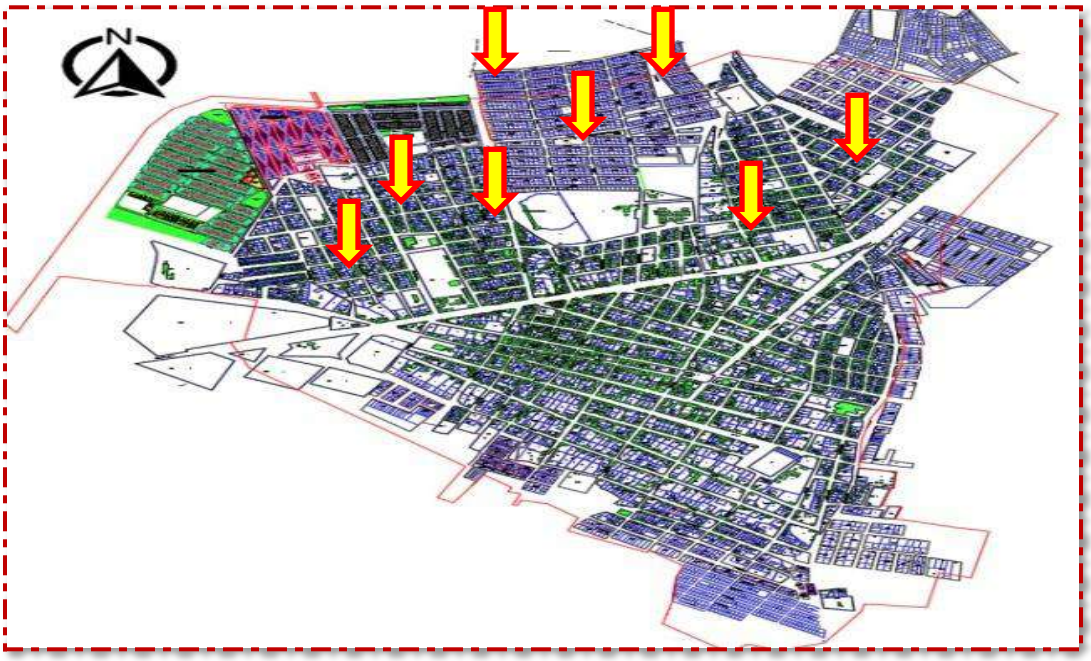

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24’ de latitud norte y 73º20’ de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4. MARCO JURIDICO Y LEGAL.

⇨ Dentro de las leyes se encuentran:

Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud en el Trabajo y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema de Riesgos Laborales

⇨ Los decretos referentes a este sistema son:

Decreto 614 de 1984: por el que se determinan las bases para la organización y administración de la Salud en el Trabajo.

Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 1771 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994

Decreto 1772 de 1994: Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 1832 de 1994: determinan las tablas de enfermedades laborales

Decreto 2100 de 1995: Por la cual se establece la clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 2566 de 2009: Por la cual se adopta la tabla de enfermedades laborales.

Decreto 1443 de 2014: Establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto 1477 de 2014: Actualización de la Tabla de Enfermedades Laborales.


carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social.

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El consorcio recreodeportivo 2021, establece dentro de sus prioridades la implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyado a nivel Gerencial y el cual va encaminado a velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores y contratistas ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales para bien de la organización y de los Trabajadores.

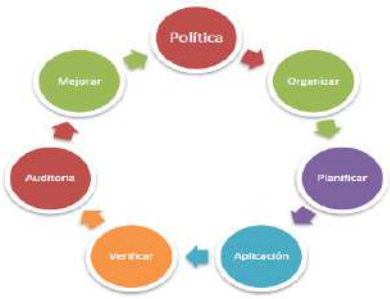

<u>Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son:</u>


- ✓ Responder, por parte de todos los trabajadores, por su seguridad, la del personal bajo su cargo.
- ✓ Priorizar el control de cualquier riesgo en el desarrollo de actividades de cualquier trabajo.
- ✓ Tener en cuenta los riesgos presentados en la matriz y tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar su materialización de forma contundente.
- ✓ Actualización y socialización de la política a todos los contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes y demás personal comprometido con la actividad que desarrolla.
- ✓ Promover el mejoramiento continuo, como estrategia que involucra todos los niveles de la organización y fortalece los procesos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.1. Señalización.

Estas actividades de prevenir accidentes laborales y de terceros se viene evitando mediante el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de la obra.

Se Implementa el uso de señales preventivas, reglamentarias e informativas durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.

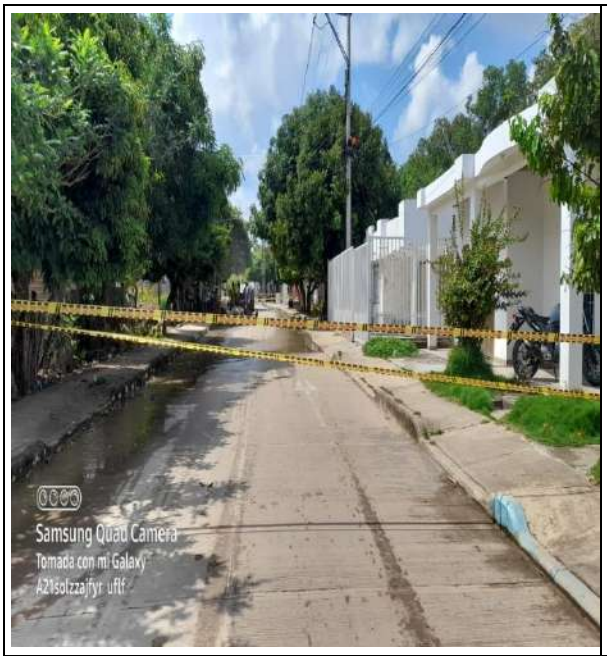	
SEÑALIZACION	**SEÑALIZACION**

El Contratista viene demarcando el perímetro de la obra, para evitar incomodidades a la comunidad por las actividades de construcción.

En la noche se colocan avisos refractivos, luminosos o intermitentes. Desvíos y funcionamientos viales vehiculares o peatonales deben contar con avisos y vallas explicativas en cuadras anteriores y utilizar bandereros debidamente uniformados cuando sea necesario.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.2. Desvió de tráfico vehicular.

Se viene programando adecuadamente el manejo y operación del tráfico vehicular, dentro de las zonas urbanas que cubre el perímetro de la obra en ejecución.

Si es imprescindible la intervención de la red vial en las obras de acueducto , se garantiza la protección contra los riesgos creados tanto para los trabajadores y equipos dentro de la zona de trabajo, como para las personas y vehículos que utilizan la vía, procurando el mínimo de interrupciones en la circulación normal de la zona.

	
DESVIO VEHICULAR	**DESVIO VEHICULAR**

En los sectores en donde se limite el peso del vehículo, o el peso por eje permitido, además de utilizar las señales reglamentarias correspondientes, en la medida de lo posible se habilitará un desvío para los vehículos que excedan los límites señalados para el tramo sometido a la realización de las obras.

La función principal del control de tráfico, en este tipo de obras, es la de dirigir la circulación en forma segura y rápida a través de zonas de trabajo y alrededor de ellas, lo que obliga a la imposición de límites de velocidad, controles, dirección de tráfico y disposiciones especiales.

6.3. Capacitación y/o charlas de seguridad industrial.

Antes del inicio de las actividades diarias se realiza la oración a DIOS todo poderoso

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

para recargarnos espiritualmente y charlas de seguridad.

Consiste en la preparación y realización de sensibilización y capacitación dirigido a todo el personal que labora en la empresa tanto al área de campo como administrativa.
Todos los trabajadores antes de ingresar a laborar en la obra (oficinas y campo) pasan por el programa de inducción. El Contratista de la obra, diseñó un programa de inducción en entrenamiento en seguridad industrial y salud ocupacional.

	
CHARLAS	**CAPACITACION**

6.4. Cronograma de charlas y/o capacitaciones diarias.

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE CHARLA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022				HORA:06;30 am	
MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES
1	2	3	4	5	7
La prevención de los actos inseguros	Manipulación segura del extinguidor de fuego	El peligro inminente en SST	Actos y condiciones inseguras	Que es un riesgo laboral	Habitos alimenticios
8	9	10	11	12	14
Investigacion de accidentes	Proteccion de los pies	Herramientas manuales	Riesgo electrico	Proteccion de brazoz y manos	Equipios de proteccion para la cara y ojos
15	16	17	18	19	21
Trabajar correctamente	Manejo de escombros	Habitos saludables	Pausas activas	Objectos que caen	Levantamiento de carga
22	23	24	25	26	28
Elementos de proteccion personal	Primeros auxilios	cuidado con las manos	Manejo de desechos peligrosos	Demarcacion a puntos criticos	Excavaciones
Nota: Todos los dias se socializara tema relacionado al covid-19, lavado de manos y distanciamiento social.					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

Con el objetivo de Prevenir accidentes laborales y a terceros se está implementando el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de las obras.

Se realizó la identificación de los peligros de las actividades de coordinación de diseño por tareas, y se identifica que los más recurrentes son los riesgos psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y físicos.



Los controles existentes corresponden a capacitaciones, pausas activas, actividades de bienestar, inspecciones de seguridad, adecuaciones mediante el control del reflejo en las oficinas. Se hace necesario con este diagnóstico realizar la evaluación del riesgo para establecer las medidas de intervención.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

El Programa de Salud Ocupacional, consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas.

7.1. Actividades de promoción y prevención

Se viene implementando actividades de promoción y prevención que permiten mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados. Así mismo se tienen identificados algunos lugares donde los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales están latentes a su vez son controlados con estas acciones mencionadas anteriormente se ha logrado beneficios como: Se mejora la calidad del ambiente laboral, se logra mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora también la productividad y la calidad de los productos y servicios.

	
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	**ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa con la participación de los trabajadores.

Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. Debe actualizarse como mínimo una vez al año, según se presenten cambios en los factores de riesgo o en los procesos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.2. Entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (epp).

Elemento de Protección Personal (Abreviatura: EPP): Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

Disposición final: Hace referencia a la eliminación definitiva conforme normas ambientales, de los EPP que han cumplido su vida útil, bien sea por deterioro o por caducidad.

	
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE EPP

El profesional en campo que tiene el contratista viene haciendo entrega de elementos de protección personal que ingresa en la obra, así mismo viene realizando cambio de aquellos que ya cumplieron su tiempo de uso aquellos que están deteriorados.
Se deja evidencia fotográfica de las actividades realizadas así como una planilla donde se deja constancia de la fecha y la persona que se le entregan los epp.

Se viene acatando las sugerencias por la interventoría y sus profesionales de campo y se hacen las respectivas correcciones.

7.3. Reporte e investigación de accidentes laborales

Durante el mes febrero 2022, no se presentaron accidentes laborales, debido a los

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

controles operacionales implementados y ejecutados por la profesional en campo del contratista.

7.4. Uso adecuado de elementos de protección personal (epp).

Los EPP se suministran a los funcionarios al momento de ser contratados, según las actividades que cada funcionario y contratista realicen, según la matriz de identificación de peligros de la entidad y matriz de elementos de protección personal; mediante los profesionales en campo del contratista e interventoría se hace seguimiento a los trabajadores para que hagan uso adecuado de estos elementos de protección.

	
USO ADECUADO DE EPP	**USO DE EPP**

Mediante las charlas se les hace a los trabajadores crear conciencia del porque y para que deben usar correctamente estos elementos de protección personal.

Aquellos trabajadores que sean sorprendidos realizando actividades en campo y no porten los epp se les llamarán la atención, si persisten en no usar los elementos serán suspendidos y se les pasara un memorando y en caso extremo se dará por terminado su contrato laboral, esto con el fin de evitar posibles accidentes y mantener una obra protegida y segura siempre.

8. CONCLUSIÓN

- El Consorcio VIVEURB 2021 por medio de sus profesionales viene realizando

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

continuamente planes de mejoras, así mismo viene haciendo inspecciones de trabajos con el objetivo de reducir al máximo los posibles accidentes laborales.

- Se viene realizando jornadas de capacitaciones tanto a los trabajadores como a los habitantes aledaños al proyecto este último con el fin de generar sentido de pertenencia por la obra construida y también para que eviten que sus familiares entre todos los niños no hagan ingreso a la obra y se expongan en peligro.

- Se está cumpliendo con las metas de tener cero incidente y cero accidente laboral gracias a la buena implementación del sistema de gestión SG- que a diario hace la profesional siso del CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9. ANEXOS.

9.1. FORMATOS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Izeth K. Moreno C.	FECHA	01	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Luis Atencio	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	2		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, pala, cortadora, nivel, balde		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Blogue	Caidas	Generación de	uso de Epp.
2	Hilo.	Cortaduras	Desidos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Golpes.	Generacion de	Ecologico.
4	Mezda.	Machacores	Material para-	Proteger los
5	Inicio Pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Blogue.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Carlos Rafael Perez	Carlos PEREZ
3	Leopoldo Alvarez	Leopoldo Alvarez C
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Luis Atencio
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	01	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Juan Carlos Criados	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Soldadura.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Equipo de soldadura, Martillo.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado de los	Cortaduras	Generacion de	Uso de EPP.
2	Perfiles.	Hachucones	Residuos.	Uso de punto
3	Armar Estructuras	Raspones.	Generacion de	Ecologico.
4	Inicio de	Caidas	Material punti-	
5	Soldar Estructu-		culado.	
6	ra.			
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Duban Florez.	Duban Florez.
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — Juan Carlos criado — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C	FECHA	01	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Richar Bolaño.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	2		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, Balde, pala, cortadora, nivel.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	Uso de EPP.
2	Hilo.	Machucones	Residuos	Uso punto
3	Preparacion de la	Raspones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Cortaduras	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de	Golpes	lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Edgar Ruidiaz	Edgar Ruidiaz
3	Manuel Mercado	Manuel Enrique
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — Richar Bolaño — 12524538 — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

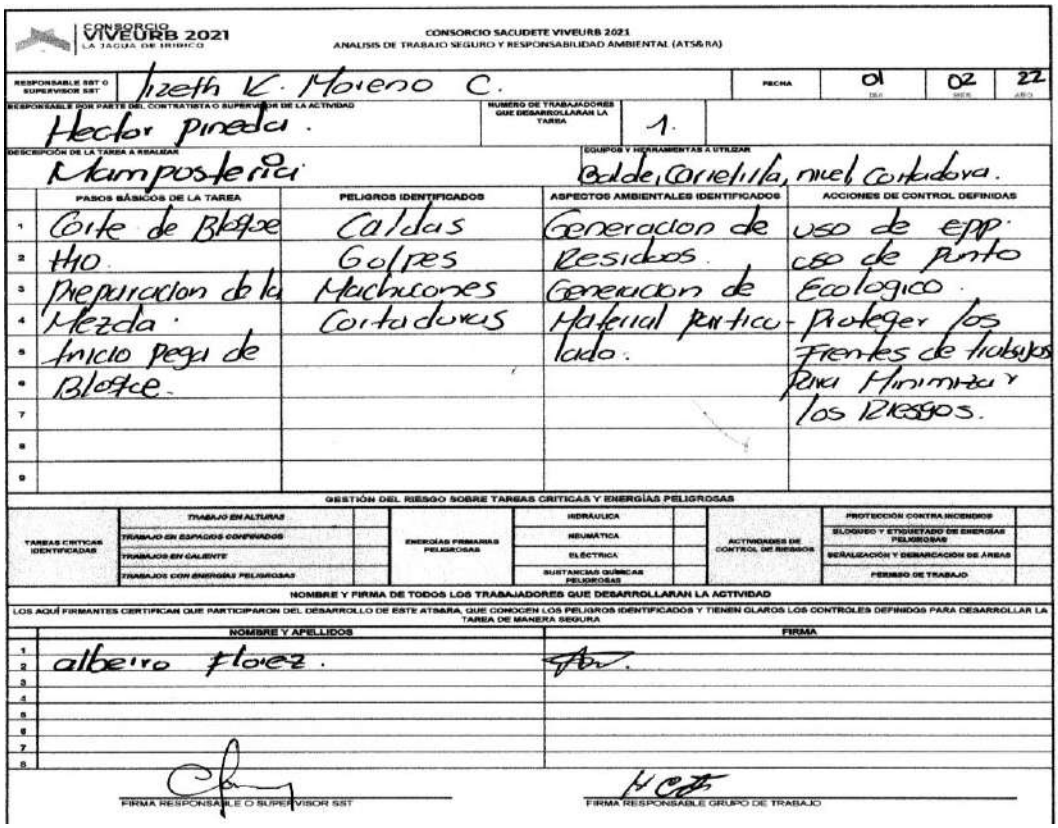

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: lizeth K. Moreno C. — FECHA: 01 (DIA) 02 (MES) 22 (AÑO)

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Hector pineda. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, Cornetilla, nivel, Cortadora.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de epp.
2	Hilo.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezda.	Cortadoras	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS


TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRÁULICA			PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMÁTICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELÉCTRICA			SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS	
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	albeiro Florez.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

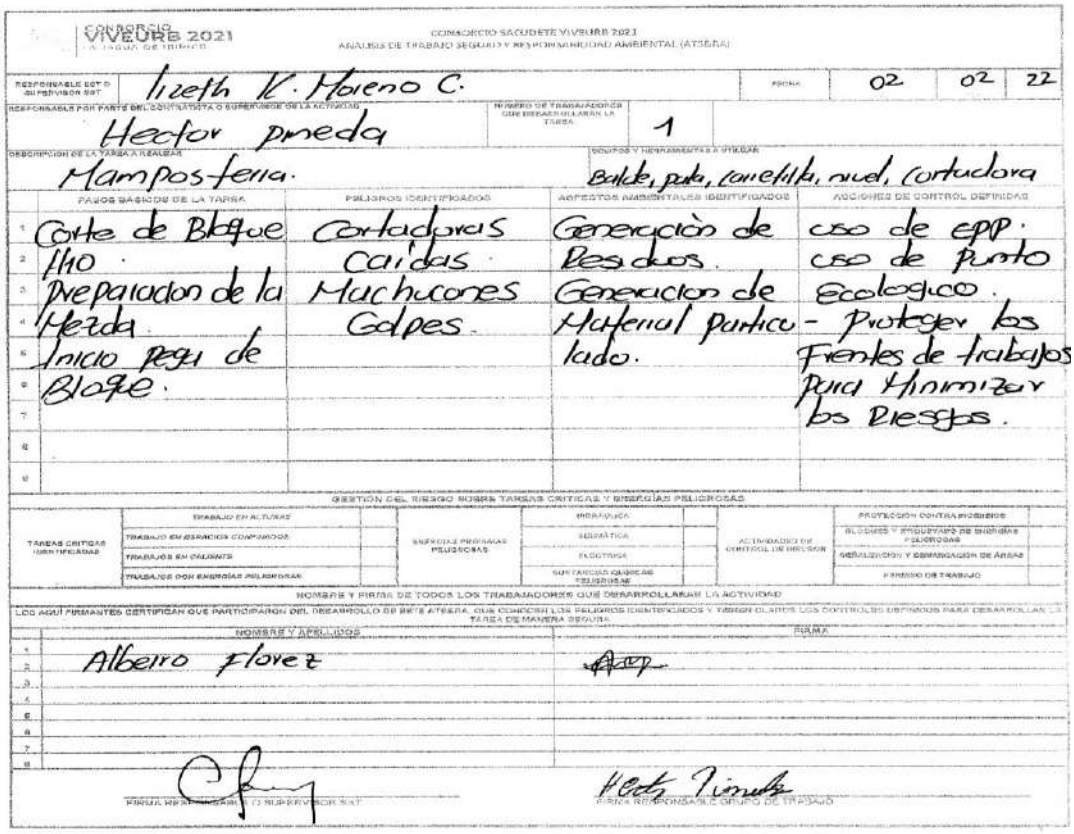

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: lizeth K. Moreno C. — FECHA: 02 (DIA) 02 (MES) 22 (AÑO)

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Hector pineda — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, pala, cornetilla, nivel, Cortadora

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortadoras	Generación de	uso de epp.
2	Hilo.	Caidas.	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezda.	Golpes.	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Albeiro Florez	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

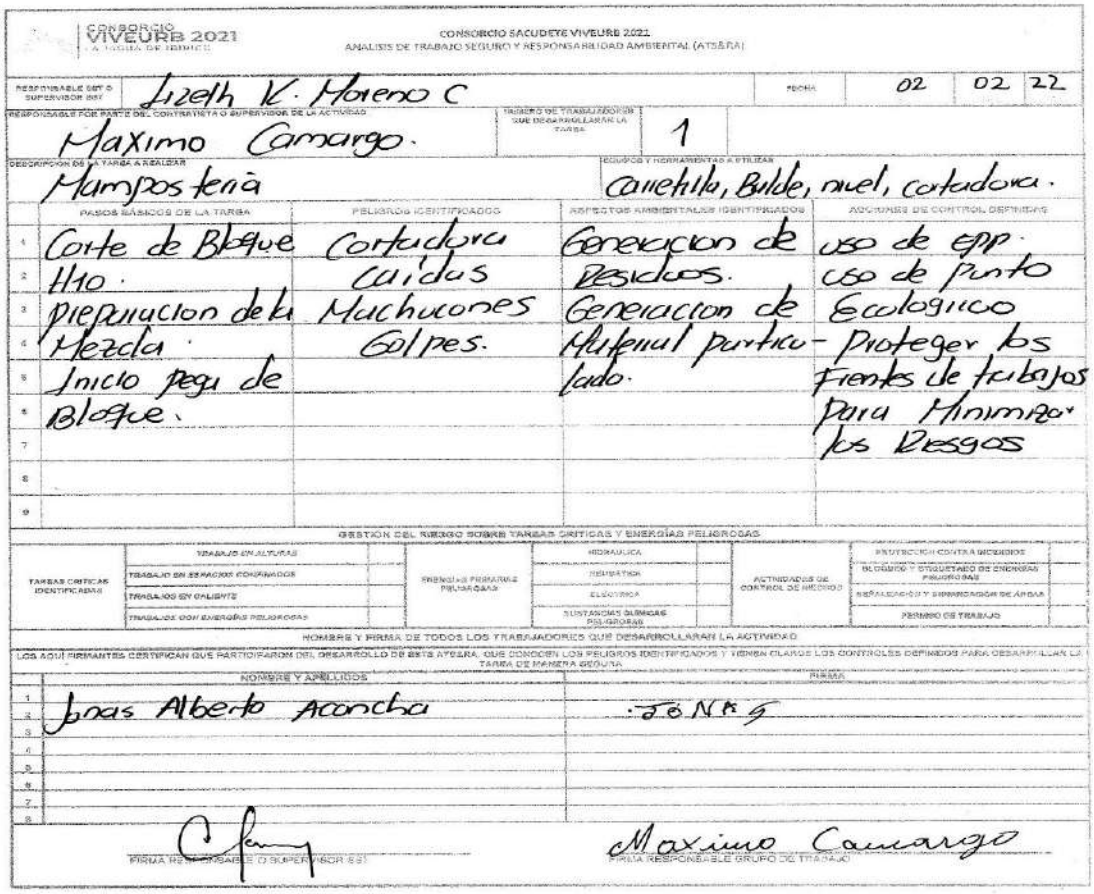

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Izeth V. Moreno C — FECHA: 02 02 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Maximo Camargo. — TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mampostería — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: carretilla, Balde, nivel, cortadora.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortadora	Generacion de	uso de EPP.
2	Hilo.	caidas	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	Mezcla.	Golpes.	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; RESPIRATORIA; ELECTRICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO: INSTRUCCION CONTRA INCENDIOS; BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Jonas Alberto Acoscha	JONAS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Maximo Camargo
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

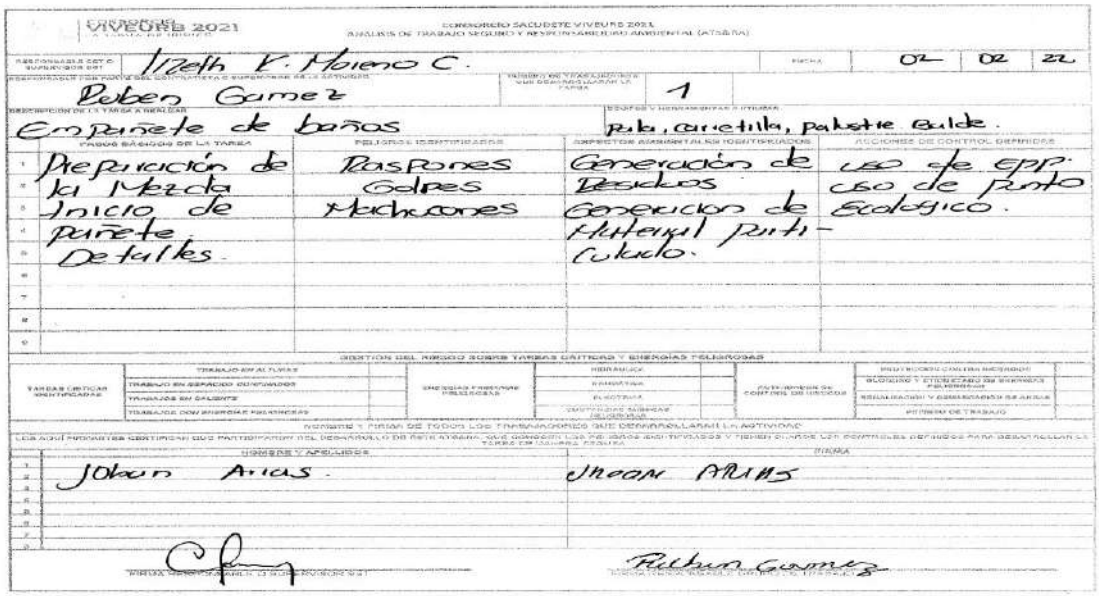

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Izeth V. Moreno C. — FECHA: 02 02 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Ruben Gamez — TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Empañete de baños — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, carretilla, palustre Balde.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Preparación de	Raspones	Generación de	uso de EPP.
2	la Mezcla	Golpes	Residuos	uso de punto
3	Inicio de	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	pañete.		Material particu-	
5	Detalles.		lado.	
6				
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; RESPIRATORIA; ELECTRICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO: INSTRUCCION CONTRA INCENDIOS; BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Johan Arias.	JHOAN ARIAS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Ruben Gamez
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

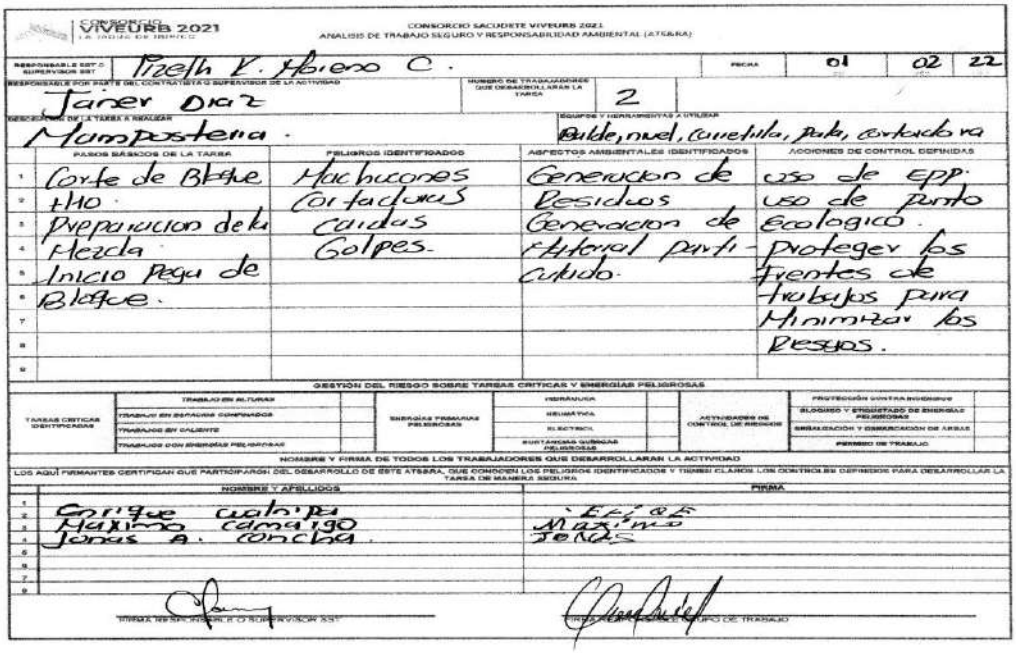

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 01 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Javier Diaz — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 2

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, nivel, carretilla, palu, cortadora

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
2	H2O.	Cortaduras	Residuos	uso de punto
3	Preparacion de la	caidas	Generacion de	Ecologico.
4	Mezda.	Golpes.	Material partic-	Proteger los
5	Inicio pega de		ulado.	Frentes de
6	Bloque.			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS


TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUIMICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Enrique Valoyes	Enrique
2	Maximo Camargo	Maximo
3	Jonas A. Concha	Jonas
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE O GRUPO DE TRABAJO

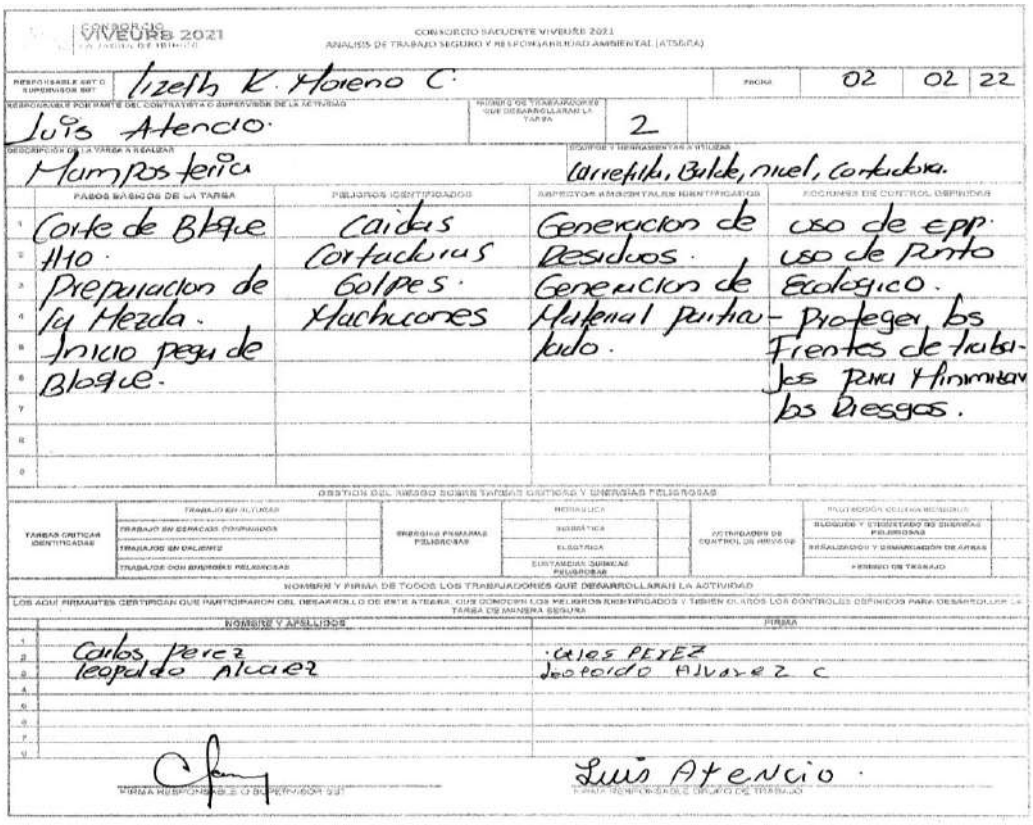

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 02 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Luis Atencio. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 2

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretilla, Balde, nivel, Cortadora.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	caidas	Generacion de	uso de epp.
2	H2O.	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de	Golpes.	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezda.	Machucones	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabaj-
6	Bloque.			os para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUIMICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Carlos Perez	Carlos Perez
2	Leopoldo Alvarez	Leopoldo Alvarez C
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — Luis Atencio. — FIRMA RESPONSABLE O GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 03 02 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Luis Atencio — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 2

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Balde, Carretilla, nivel, cortadora

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque.	Cortaduras	Generación de	uso de EPP.
2	H10..	Caídas	Desidos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Muchucones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Golpes.	Material partia-	proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajo
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; NEUMATICA; ELECTRICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS: BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Carlos Perez	Carlos
3	Leopoldo Alvarez	Leopoldo A C
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: Luis Atencio.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 03 02 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Jon E. Arias — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 2

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Resane. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: nivel, Balde, Pala, Carretilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Armar Andamios	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Preparacion de la	Muchucones	Desidos.	uso de punto
3	Mezcla.	Resbalones	Generacion de	Ecologico.
4	Inicio de Resane	Cortaduras.	Material parti-	
5	de columnas.		colado.	
6				
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; NEUMATICA; ELECTRICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS: BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Oban Florez	Oban Flora
3	Jorge Mejia.	Jorge Mejia
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: Juan Andres Arias

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

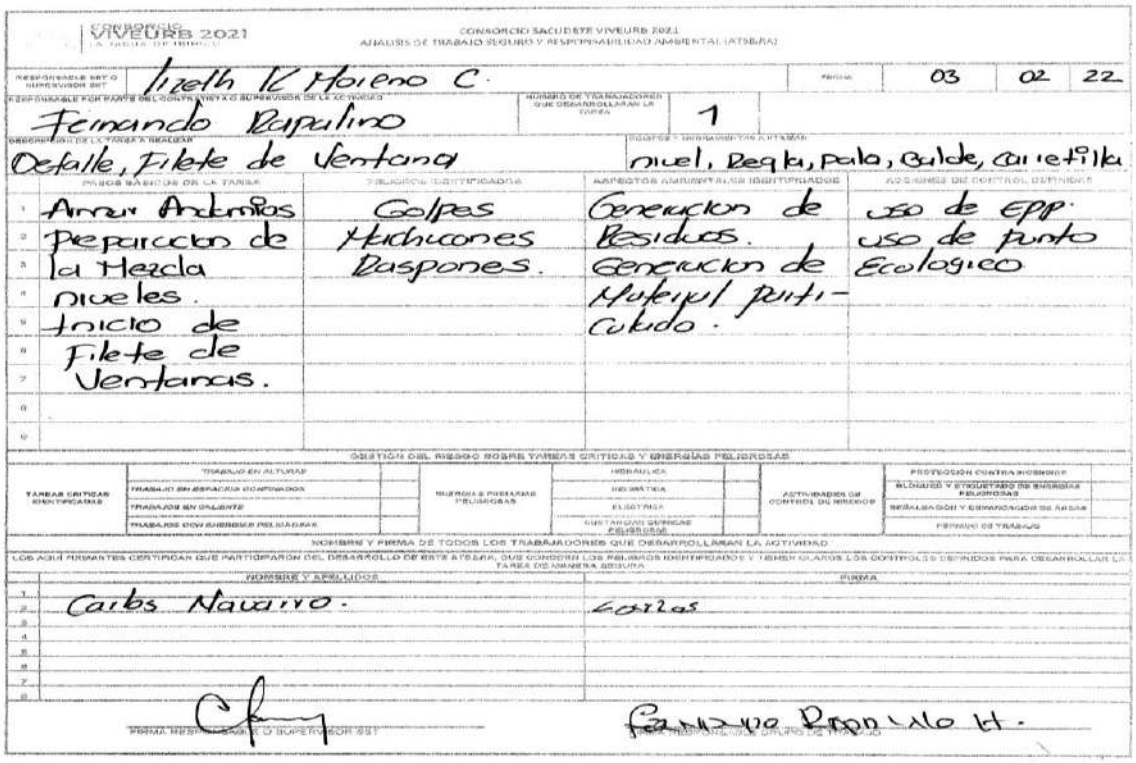

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C. — Fecha: 03 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA OBRA: Fernando Rapalino — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Detalle, Filete de Ventana — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: nivel, Regla, pala, Balde, cuchilla

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Armar Andamios	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Preparacion de	Muchicones	Residuos.	uso de punto
3	la Mezcla	Daspones.	Generacion de	Ecologico
4	niveles.		Material punti-	
5	Inicio de		culado.	
6	Filete de			
7	Ventanas.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS


TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Carlos Navarro.	Carlos
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: Fernando Rapalino H.

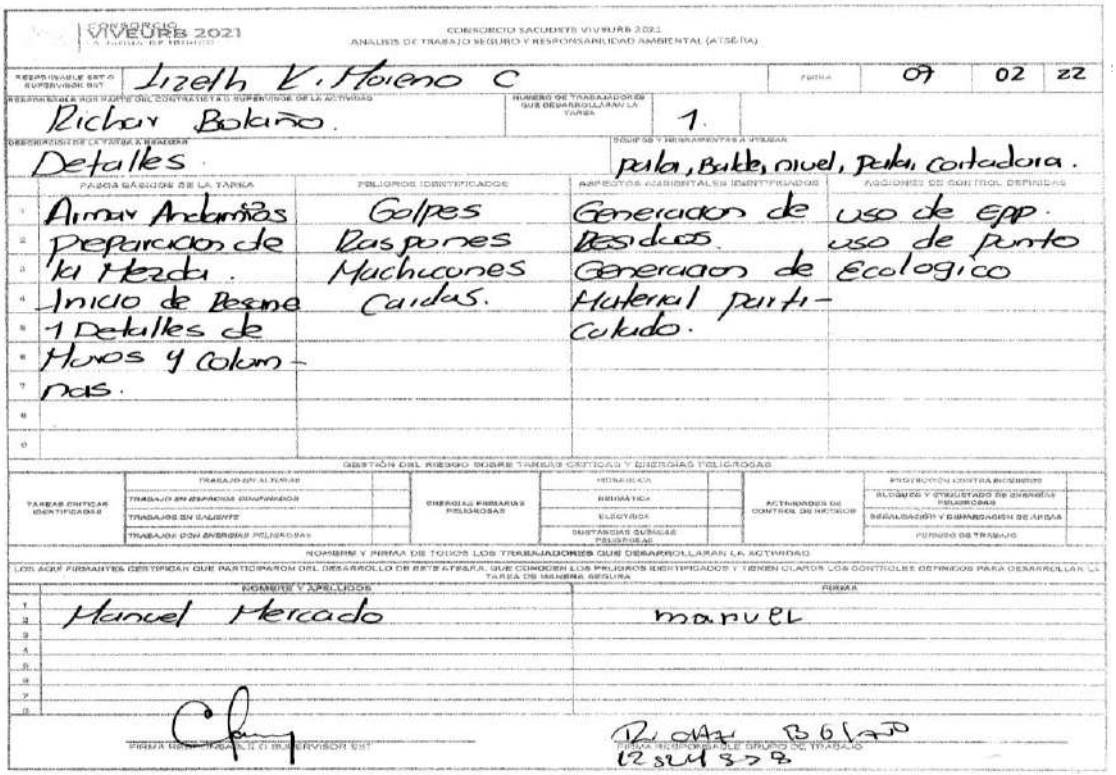

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C — Fecha: 09 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA OBRA: Richar Bolaño. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Detalles. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, Balde, nivel, Regla, Cortadora.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Armar Andamios	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Preparacion de	Daspones	Residuos.	uso de punto
3	la Mezcla.	Muchicones	Generacion de	Ecologico
4	Inicio de Pegue	Caidas.	Material punti-	
5	1 Detalles de		culado.	
6	Muros y Colum-			
7	nas.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Manuel Mercado	manuel
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: Richar Bolaño 12 sept 8 > 8

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

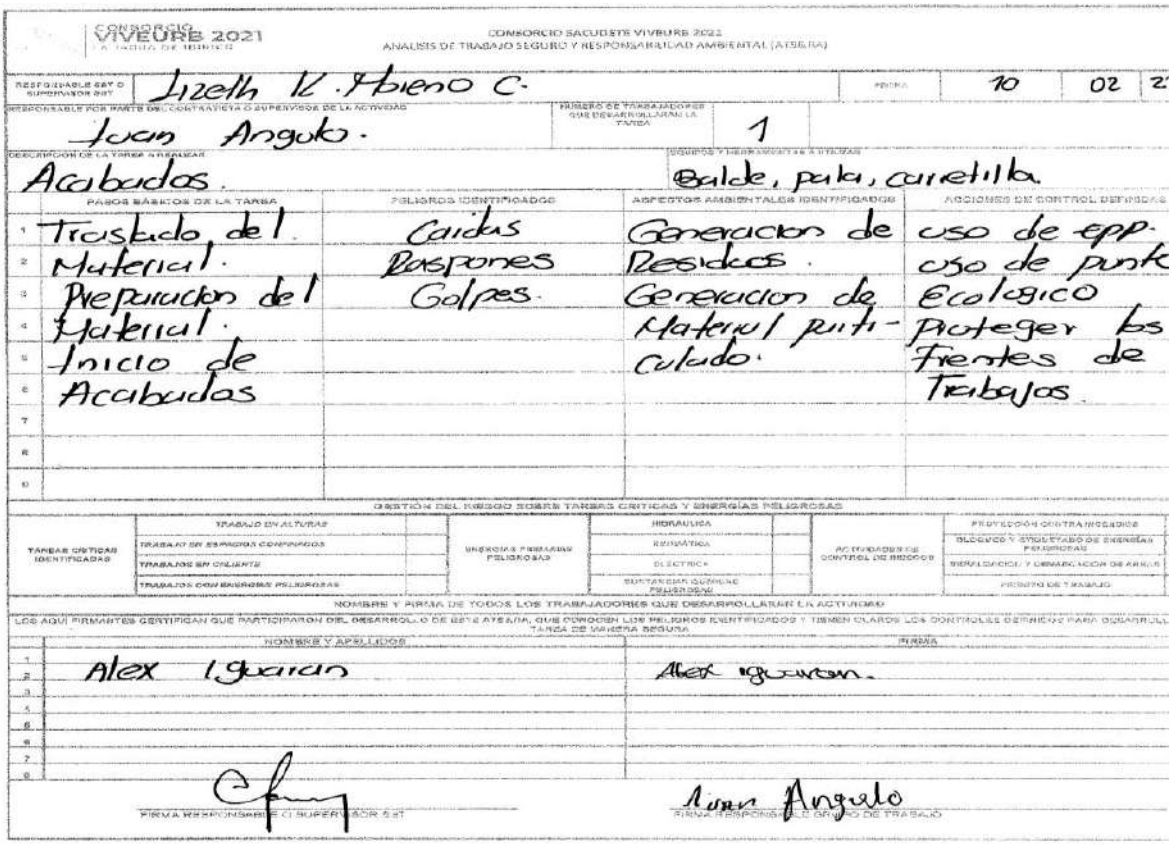

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDESTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C. — FECHA: 10 / 02 / 2

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Juan Angulo. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Acabados. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, pala, carretilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado del	Caidas	Generacion de	uso de epp.
2	Material.	Raspones	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion del	Golpes.	Generacion de	Ecologico
4	Material.		Material punti-	proteger los
5	Inicio de		Culado.	frentes de
6	Acabados			Trabajos.
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS


TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		PERMISO DE TRABAJO
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Alex Iguaran	Alex Iguaran.
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO: Juan Angulo

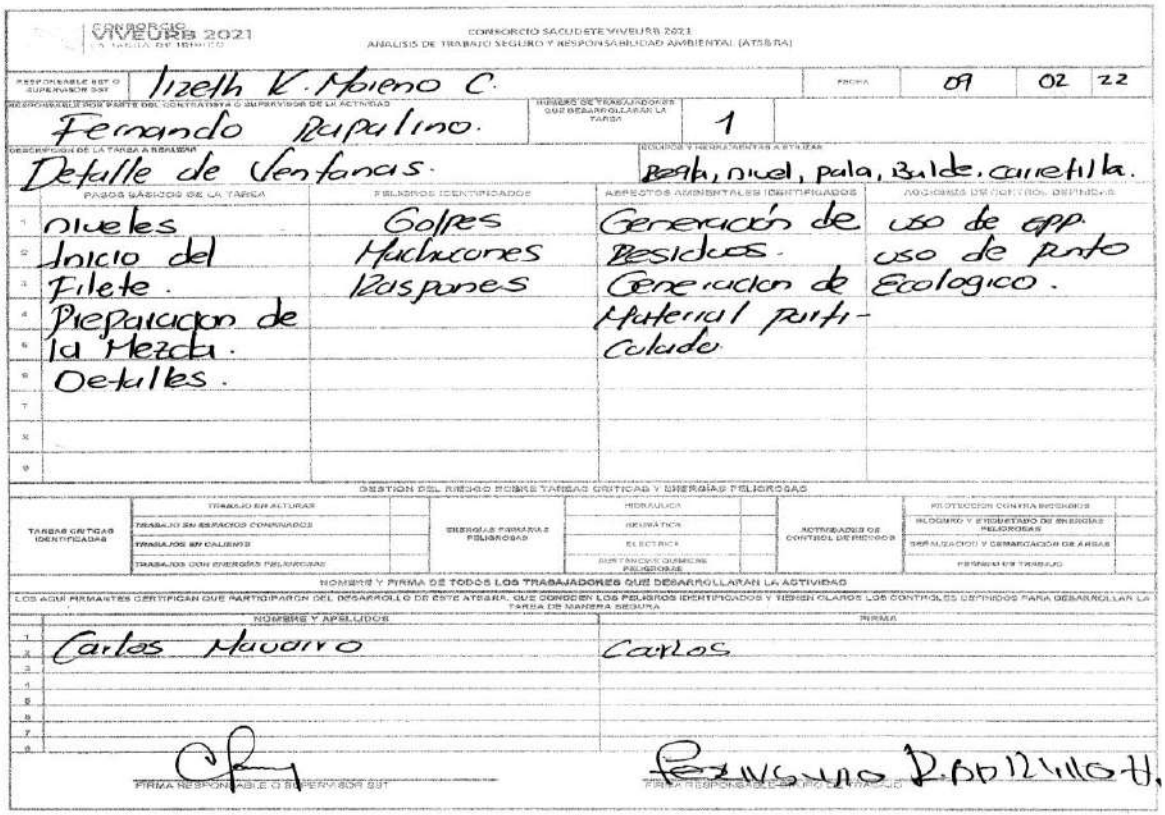

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDESTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C. — FECHA: 09 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Fernando Rapalino. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Detalle de Ventanas. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pesa, nivel, pala, Balde, carretilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Nivele s	Golpes	Generación de	uso de epp.
2	Inicio del	Machacones	Residuos.	uso de punto
3	Filete.	Raspones	Generacion de	Ecologico.
4	Preparacion de		Material punti-	
5	la Mezcla.		Culado	
6	Detalles.			
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		PERMISO DE TRABAJO
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Carlos Maduro	Carlos
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO: Fernando Rapalino

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	16	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Hector Pineda	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR	Mampostevia	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, Pala, Balde, nivel, cortadora.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generación de	uso de epp.
2	H10.	Machucones	Desechos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Raspones	Generación de	Ecologico.
4	Mezcla.	Golpes	Material particula-	Proteger los
5	Inicio pega de	Cortadoras	do.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Alberto Florez	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	14	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Juan Arias	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR	Resane.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, nivel, Pala. Carretilla.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Armar Andamios	Raspones	Generación de	uso de EPP.
2	Preparación de	Golpes	Desechos.	uso de punto
3	la Mezcla.	Caidas	Generacion de	Ecologico
4	Inicio del		Material parti-	
5	Resane de		culado.	
6	Columnas.			
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Jorge Mejia	JORGE MEJIA
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

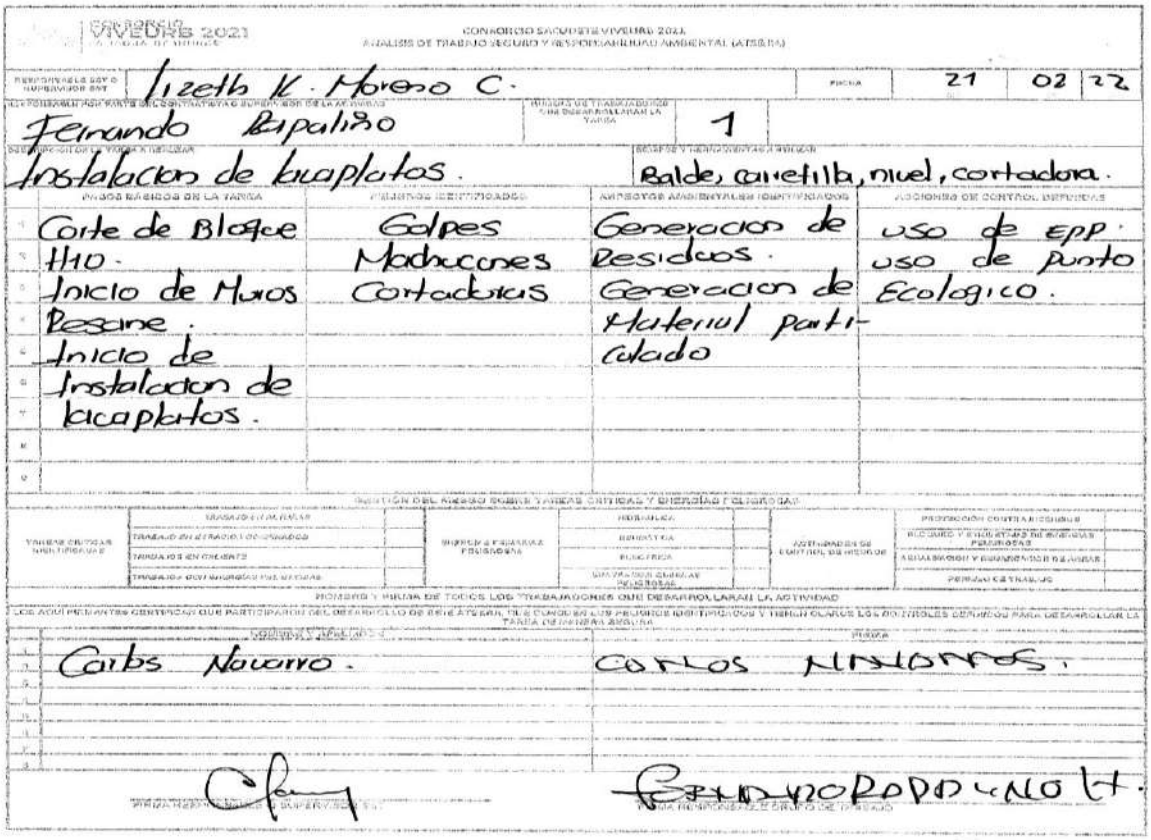

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDISTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 21 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Fernando Bapaliso — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de bacaplatos. — DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, carretilla, nivel, cortadora.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL ESPERADAS
1	Corte de Bloque H10.	Golpes	Generacion de Residuos.	uso de EPP.
2	Inicio de Muros	Machucones	Generacion de Material Particulado	uso de punto Ecologico.
3	Resane.	Cortaduras		
4	Inicio de Instalacion de bacaplatos.			
5				
6				
7				
8				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJOS EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; NEUMATICA; ELECTRICA; GRAVITACIONAL CINETICA; QUIMICAS PELIGROSAS


ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS: PROTECCION CONTRA INCENDIOS; RECURSOS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIAS PELIGROSAS; AGUA BASICOS Y EQUIPAMIENTOS DE LABORES; PERSONAL CERTIFICADO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA TAREA, FUE CONDUCIDA CON PRUDENCIA IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS DOMINIOS DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	Carlos Navarro.	CARLOS NAVARRO.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: FERNANDO BAPALIZO

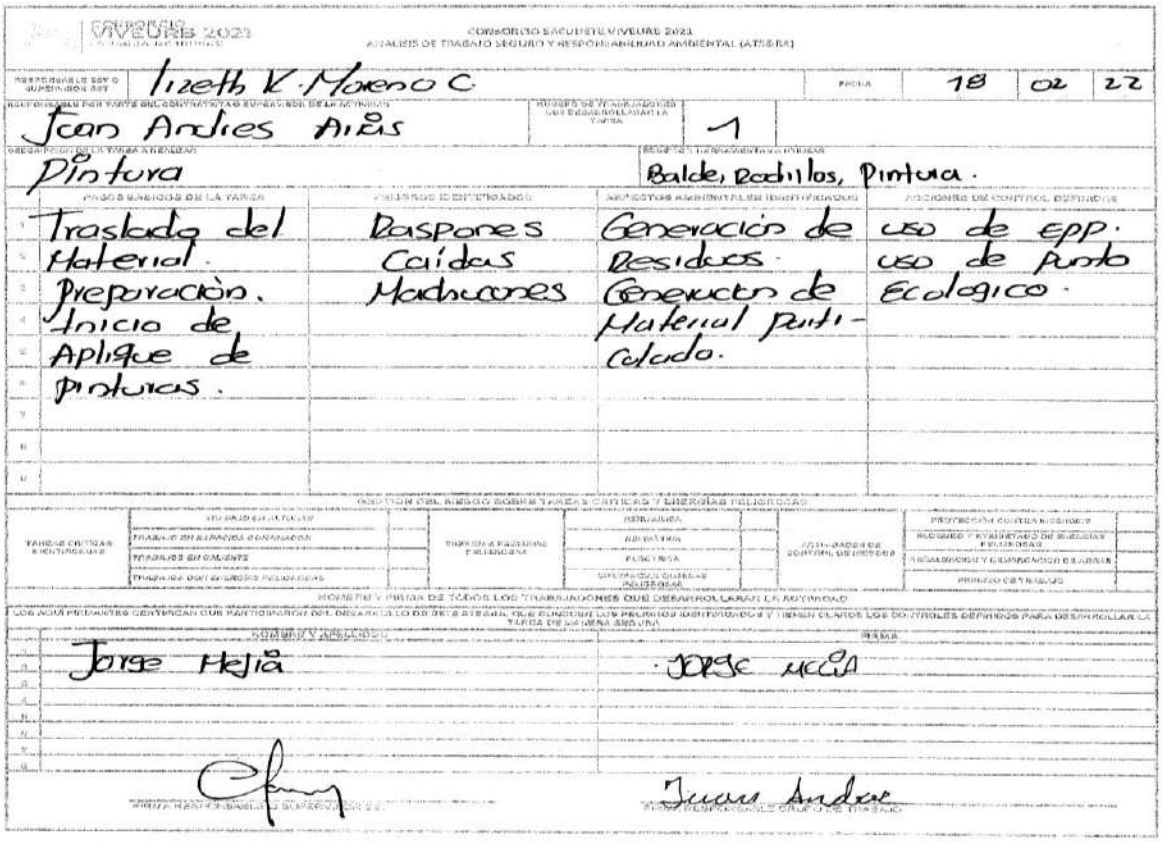

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDISTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 18 / 02 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Jean Andres Arias — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Pintura — DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, Rodillos, Pintura.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL ESPERADAS
1	Traslado del Material.	Raspones	Generacion de Residuos.	uso de EPP.
2	Preparacion.	Caidas		uso de punto Ecologico.
3	Inicio de Aplique de pinturas.	Machucones	Generacion de Material Particulado.	
4				
5				
6				
7				
8				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJOS EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: HIDRAULICA; NEUMATICA; ELECTRICA; GRAVITACIONAL CINETICA; QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS: PROTECCION CONTRA INCENDIOS; RECURSOS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIAS PELIGROSAS; AGUA BASICOS Y EQUIPAMIENTOS DE LABORES; PERSONAL CERTIFICADO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA TAREA, FUE CONDUCIDA CON PRUDENCIA IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS DOMINIOS DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	Jorge Mejia	JORGE MEJIA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO: Juan Andres

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUD STE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS/RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	23	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR DE LA ACTIVIDAD	Jaime Solorzano.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalación de Puertas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Martillo, sincel, cortadora, Remachadora

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado de	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
2	Puertas.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Verificacion del	Raspones	Generacion de	Ecologico.
4	Material.	Cortaduras	Material particulado.	
5	Inicio de la			
6	Instalación.			
7	Besane.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ELEMENTOS ELECTRICOS

ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS: HIDRAULICA; INERCIA; PNEUMATICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

CONTROLES DE RIESGOS: PROTECCION CONTRA CAIDAS; BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Samir. Mercado.	Samir Mercado
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Jaime Solorzano
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUD STE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS/RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	28	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR DE LA ACTIVIDAD	Fernando Rapalino	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1.		

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mampostería.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, pala, coretilla, nivel.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de EPP.
2	Tho.	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezda.	Golpes.	Material particu-	proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de
6	Bloque.			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ELEMENTOS ELECTRICOS

ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS: HIDRAULICA; INERCIA; PNEUMATICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

CONTROLES DE RIESGOS: PROTECCION CONTRA CAIDAS; BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS; SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS; PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Carlos Navarro.	Carlos Navarro 2.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FERNANDO R.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUD EYE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lineth K. Moreno C.	FECHA	25	02	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Juan Ernesto Arias	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Acabados.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, carretilla,		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Preparacion del Material.	Raspones Machucones	Generacion de Residuos.	uso de epp. uso de punto
2	Aplique	Golpes	Generacion de Material	Ecologico.
3			particulado.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y VIDEOTAPEO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA


	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Jorge Mejia.	Jorge Mejia
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9.2. FORMATO INSPECCIONES DE CONDICIONES INSEGURAS

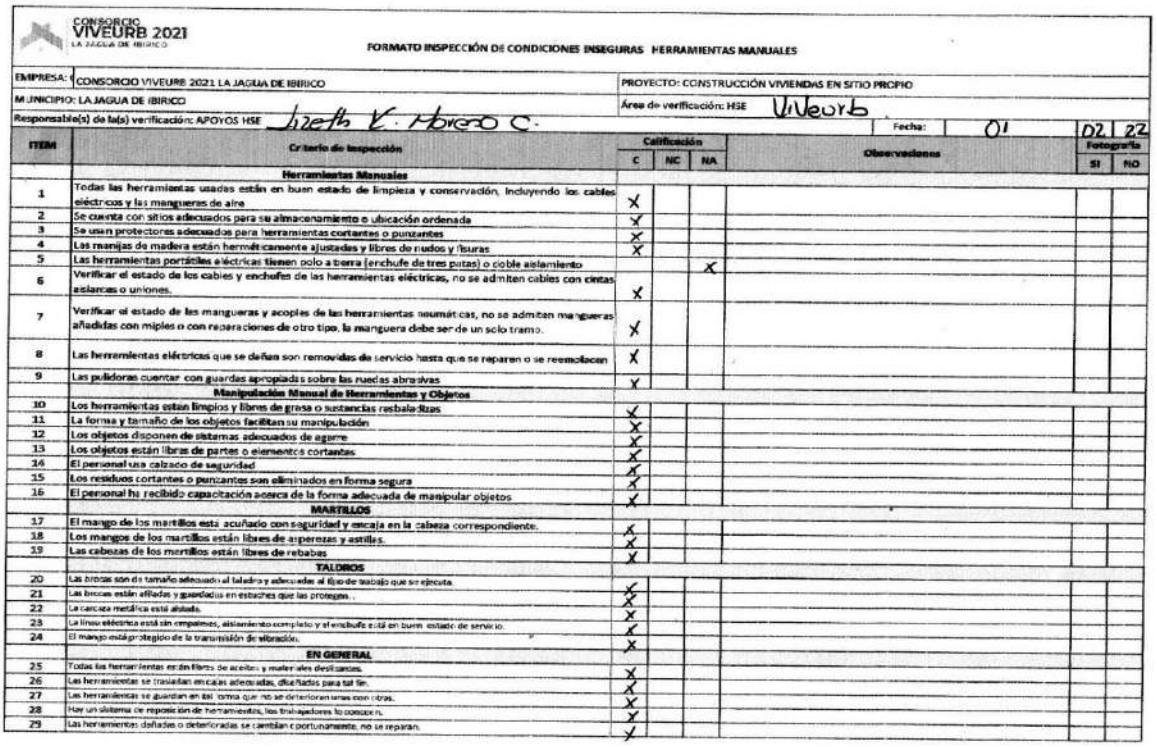

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO


FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 01 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres putas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

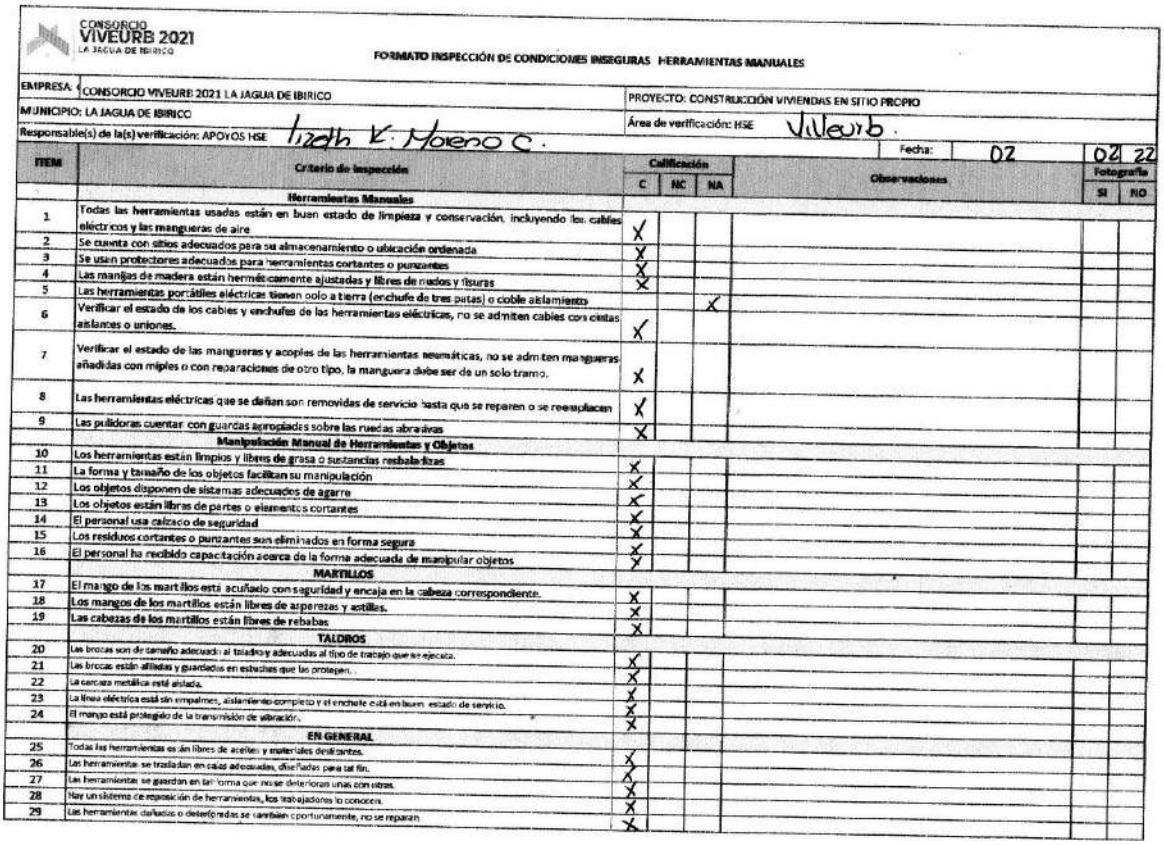

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 02 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres putas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO
Área de verificación: HSE Viveurb
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Herero C.
Fecha: 03 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.						
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.						
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO
Área de verificación: HSE Viveurb
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Herero C.
Fecha: 04 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	X					

GTH-F-105

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 07 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoplas de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mipios o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal use calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.						
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 08 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoplas de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mipios o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal use calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.						
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	X					

GTH-F-105

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Meth V. Moreno C. — Fecha: 10 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermét camente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbala lizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libras de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de las martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioren unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Meth V. Moreno C. — Fecha: 10 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermét camente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbala lizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libras de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de las martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioren unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

GTH-F-305

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE VIVEURB

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Lizeth K. Moreno C. — Fecha: 11 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Las herramientas están limpias y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta						
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración .	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.						
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE VIVEURB

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Lizeth K. Moreno C. — Fecha: 14 02 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Las herramientas están limpias y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.						
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración .	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

GTH-F-105

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 17 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixtos o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 15 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixtos o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

GTH-F-305

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 21 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalosas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientos, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE ViVeurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 18 02 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalosas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientos, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

GTH-F-105

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Lizeth K Moreno C. — Fecha: 28 / 02 / 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Las herramientas están limpias y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

GTH-F-105

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9.3. FORMATO DE LAVADO DE MANOS.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 01-02-22, la jagua de ibirico.
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Atencio	17.913.347	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis
2	Carlos Perez	12.524.281	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	carlos
3	leopoldo Alvarez	88.738.160	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	leopoldo A
4	Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Richar
5	Edgar Zuleta	79.690.732	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Edgar
6	Manuel Mercado	1069109.052	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	manuel
7	Juan Carlos Criados	1.092.390.133	Soldador	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan criado
8	Victor Gomez	18.931.017	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
9	alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
10	Hector Pineda	1069.120.798	Maestro	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
11	Javier Diaz.	12.523.087	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
12	Enrique walpipa	1069.713.198	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	ENRIQUE
13	Maximo Camargo	77.019.829	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Maximo
14	Jonas alberto Corcha	12.524.132	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JONAS
15							
16							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 02-02-22, la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Carlos Perez	12.524.281	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	carlos
2	luis Atencio	17.913.347	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis
3	leopoldo Alvarez	88.738.160	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	leopoldo A
4	Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Richar
5	Manuel Mercado	1069.109.502	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	manuel
6	Carlos Navarro	79.518.995	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Carlos
7	Fernando Papilino	12.521.642	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernando
8	Maximo Camargo	77.019.829	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Maximo C
9	Jonas A. Acorcha	12.524.132	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JONAS
10	Hector Pineda.	1069.120.798	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Hector
11	alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
12	Juan Angulo	1.006.859.125	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Angulo
13	Alex Iguaran	77.109.920	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Alex iguaran
14	Juan Arias	1.069.12.928	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan
15	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JORGE MEJIA
16	Ruben Gomez	79.600.778	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Gomez
17	Johan Arias	1.069.116.656	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Johan Arias
18	Duban Florez	1.003.291.192	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	DUVAN FLOREZ
19							
20							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 03-02-22 la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Juan E. Arias	1069.121.428	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
2	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jorge mejia
3	Duban Florez	1003.291.192	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Duban Florez
4	Fernando Papulino	12.521.642	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernando P.
5	Carlos Navarro	19.518.985	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Carlos
6	Luis Atencio	17.413.347	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis
7	Carlos Perez	12.529.281	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Carlos
8	leopoldo Alvarez	88.138.160	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Leopoldo A.
9	Jonas A. Concha	12.529.132	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JONAS
10	Maximo Camargo	77.014.879	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
11	Alberto Florez	1003.291.198	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Alberto florez
12	Hector Pineda	1069.120798	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Hect
13	Edgar Pardiaz	91.690.732	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Edgar
14	Manel Mercado	1069.109052	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	manuel
15	Richar Bolaño	12.529.538	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Richar
16	Enrique Valnipar	1.069.13.148	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Enrique
17	Cristian Garcia	1069.129.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
18							

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 04-02-22 la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Duban Florez	1003 291 192	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Duban Florez
2	Hector Pineda	1069 120 798	Maestro	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Hector
3	Alberto Florez	1003 291 198	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
4	Carlos perez	12.529.281	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Carlos
5	Luis Atencio	17.413.347	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis A
6	leopoldo Alvarez	88.138.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	leopoldo A
7	Juan Andres Arias	1069 121 098	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan
8	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge
9							
10							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 07-02-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavados de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Juan Andres Arias	1069.121.428	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan. A
2	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jorge
3	Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
4	Johan Arias	1069.116.636	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Johan A.
5	Ruben Gomez	19.600.778	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Gom
6							
7							
8							
9							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 10-02-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Ricbar Bolaño	12.524.538	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
2	Edgar Roldan	19.690.732	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
3	Cristian García	1069.129.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
4	Maximo Camargo	77.104.829	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Maxime
5	Jonas A. Arocha	12.524.132	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JONAS
6	Javier Diaz.	12.523.887	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
7	Luis Atencio	77.413.397	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis
8	Leopoldo Alcocer	86.738.160	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Leopoldo A.
9	Carlos perez.	12.524.281	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Carlos
10	Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
11	Hector Pineda	1069.120.778	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Hector
12	Epimenio Herrera	12.542.691	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Epimenio
13	Juan A. Arias	1.069.121.428	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan
14	Jorge Mejia.	12.500.126	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jorge mejia
15	Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	[illegible]
16	Carlos Navarro	19.518.995	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Carlos
17							
18							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 11-02-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
2	Juan Andres Arias	1069.121.928	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan
3	Jorge Mejia.	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge
4	Johan Arias S	1069.116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A.
5	Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G.
6							
7							
8							
9							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 14-02-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Juan Andres Arias	1069.121.928	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan.
2	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge
3	Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R
4	Johan Arias	1069.116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A.
5	Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G.
6							
7							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 15-02-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Jorge Mejia.	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge.
2	Juan Arias	1069.121.928	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan A
3	Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R
4	Johan Arias.	1.069.116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A.
5	Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G.
6							
7							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 16-02-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Juan Andres Arias	1069.121.428	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan A
2	Jorge Mejia.	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00 pm	05:00pm	Jorge
3	Ruben Gomez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G
4	Johan Arias	1069116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A.
5	Fernando Bapulino	12.521.642	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando B.
6							
7							
8							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 18-02-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Fernando Bapulino	12.521.642	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando A
2	Johan Arias	1.069.116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A
3	Ruben Gomez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G
4	Juan Andres Arias	1069.121.428	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan A.
5	Jorge Mejia.	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge.
6							
7							
8							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 21-02-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Ruben Gomez.	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben G
2	Johan Arias	1069.116.656	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jhoan A
3	Fernando Bapulino	12.521.642	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando
4	Jorge Mejia	12.500.126	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge M
5	Juan A. Arias	1069.121.428	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan A
6							
7							
8							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 23-02-22 la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Fernando Rapalino	12.521.642	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
2	Jose Perez	1002805996	Oficial	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
3	David Quintero	1.127.659.524	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
4	Edgar Ruidiaz	19.690.732	Oficial	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
5	Victor Gamez	78.931.017	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
6	Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
7	Jose Maestre	1.064.116.415	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
8	Geovanny Calzeta	78.915.915	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
9	Jhonatan Robles	77.105.958	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
10	Henry Delgado	79.609.771	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
11	Daniel Acosta	77.109.760	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
12	William Estrada	18.990.128	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
13	Adalberto Hurtado	1.069.689.082	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
14							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 23-02-22 la jagua de ibirico.
OBJETIVO/TEMA: lavado de manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Fernando Rapalino	12.521.642	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
2	Johan Arias	1.064.116.656	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
3	Ruben Gamez	19.600.778	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
4	Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
5	Hector Pineda	1.064.120.798	Maestro	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
6	Edgar Ruidiaz	19.690.732	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
7	Richar Bolaño	12.529.538	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
8	Leopoldo Alvarez	88.138.281	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
9	Luis Atencio	17.413.347	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
10	Carlos perez	12.529.281	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
11	Jonatan Robles	77.105.958	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
12	Henry Delgado	79.609.771	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
13	Daniel Acosta	77.109.760	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
14	William Estrada	18.990.128	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
15	Adalberto Hurtado	1.069.689.082	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 28-02-22 la jagua de ibirico.
OBJETIVO/TEMA: lavado de manos.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Ruben Gamez	19.600.778	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
2	Johan Arias	1.064.116.656	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
3	Fernando Rapalino	12.521.642	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
4	Luis Atencio	17.413.347	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
5	Carlos Perez	12.529.281	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
6	Leopoldo Alvarez	88.138.281	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
7	Richar Bolaño	12.529.538	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
8	Edgar Ruidiaz	19.690.732	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
9	Jonatan Robles	77.105.958	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
10	Henry Delgado	79.609.771	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
11	Hector Pineda	1.064.120.798	Maestro	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
12	Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
13							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9.4. FORMATO ENTREGA DE EPP.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Carlos Perez		
CÉDULA:	12.524.281	OCUPACIÓN:	Aydante
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	08-02-22	2
2	Gafas de seguridad	08-02-22	3
3	Tapabocas.	08-02-22	5
4	Kit de desinfección.	08-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	15-02-22	3
6	Tapabocas.	15-02-22	6
7	Guantes tipo ingeniero.	22-02-22	5
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

C.C. CARLOS PEREZ 12 524 281

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luis Atencio		
CÉDULA:	77.413.397	OCUPACIÓN:	Maestro.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-02-22.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes de seguridad, tipo ingeniero	08-02-22	2
2	Gafas de seguridad	08-02-22	2
3	Tapabocas.	08-02-22	5
4	Kit de desinfección	08-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	15-02-22	3
6	Tapabocas.	15-02-22	5
7	Guantes tipo ingeniero	22-02-22	5
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

C.C. Luis Atencio 77413397

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Leopoldo Alvarez		
CÉDULA:	88.138.160	OCUPACIÓN:	Ofidal
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	08-02-22	2
2	Guantes tipo ingeniero	08-02-22	2
3	Tapabocas	08-02-22	5
4	Kit de desinfección	08-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	15-02-22	3
6	Tapabocas.	15-02-22	5
7	Guantes tipo ingeniero	22-02-22	5
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permitan minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA:

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Leopoldo Alvarez
CC 88 138.160

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Richar Bolaño		
CÉDULA:	12.524.538	OCUPACIÓN:	Muestro.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	08-02-22	3
2	Gafas de seguridad	08-02-22	2
3	Tapabocas.	08-02-22	5
4	Kit de desinfección	08-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	15-02-22	4
6	Tapabocas.	15-02-22	3
7	Guantes tipo ingeniero	22-02-22	5
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA:

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Richar Bolaño
CC 12.524.538

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Hector Pineda.		
CÉDULA:	1.064.120.798.	OCUPACIÓN:	Maestro.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	08-02-22	3
2	Gafas de seguridad.	08-02-22	3
3	Tapabocas.	08-02-22	5
4	Kit de desinfeccion	08-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	16-02-22	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Hector Pineda
C.C. 1.064.120.798

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Carlos Criados.		
CÉDULA:	1.092.390.123	OCUPACIÓN:	Oficial.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	08-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	14-02-22	3
2	Gafas de seguridad.	14-02-22	3
3	Tapabocas.	14-02-22	6
4	Kit de desinfeccion	14-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	21-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Juan Carlos Criados.
C.C. 1.092.390.123.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edgar Ruidiaz.		
CÉDULA:	19.690.732	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	08-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Tapabocas.	14-02-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	14-02-22	3
3	Gafas de seguridad	14-02-22	3
4	Kit de desinfección.	14-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	21-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Edgar Ruiz Diaz
CC 19.690.732

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Duban Flores		
CÉDULA:	1.003.291.192	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	08-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	14-02-22	3
2	Gafas de seguridad.	14-02-22	3
3	Tapabocas.	14-02-22	3
4	Kit de desinfección	14-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	21-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Duban Flores
CC 1.003.291.192.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Janer Diaz		
CÉDULA:	12.523.087	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	22-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	25-02-22	3
2	Tapabocas.	25-02-22	3
3	Kit de desinfección.	25-02-22	1
4	Gafas de seguridad.	25-02-22	3
5	Guantes tipo ingeniero.	28-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Janer diaz
CC 12.523.087.

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Maximo Camargo.		
CÉDULA:	77.014.829.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
AREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	22-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Tapabocas.	25-02-22	3
2	Kit de desinfección.	25-02-22	1
3	Guantes tipo ingeniero.	25-02-22	4
4	Gafas de seguridad.	25-02-22	3
5	Guantes tipo ingeniero	28-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Maximo. Camargo.
CC 77.014.829

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Victor Gamez.		
CÉDULA:	18.931.0A.	OCUPACIÓN:	Auxiliar.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	22-02-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	25-02-22	3
2	Gafas de seguridad.	25-02-22	3
3	Tapabocas.	25-02-22	3
4	Kit de desinfección	25-02-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	28-02-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.


FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Victor Gamez
C.C. 19.931.017.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.


9.5. FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD.

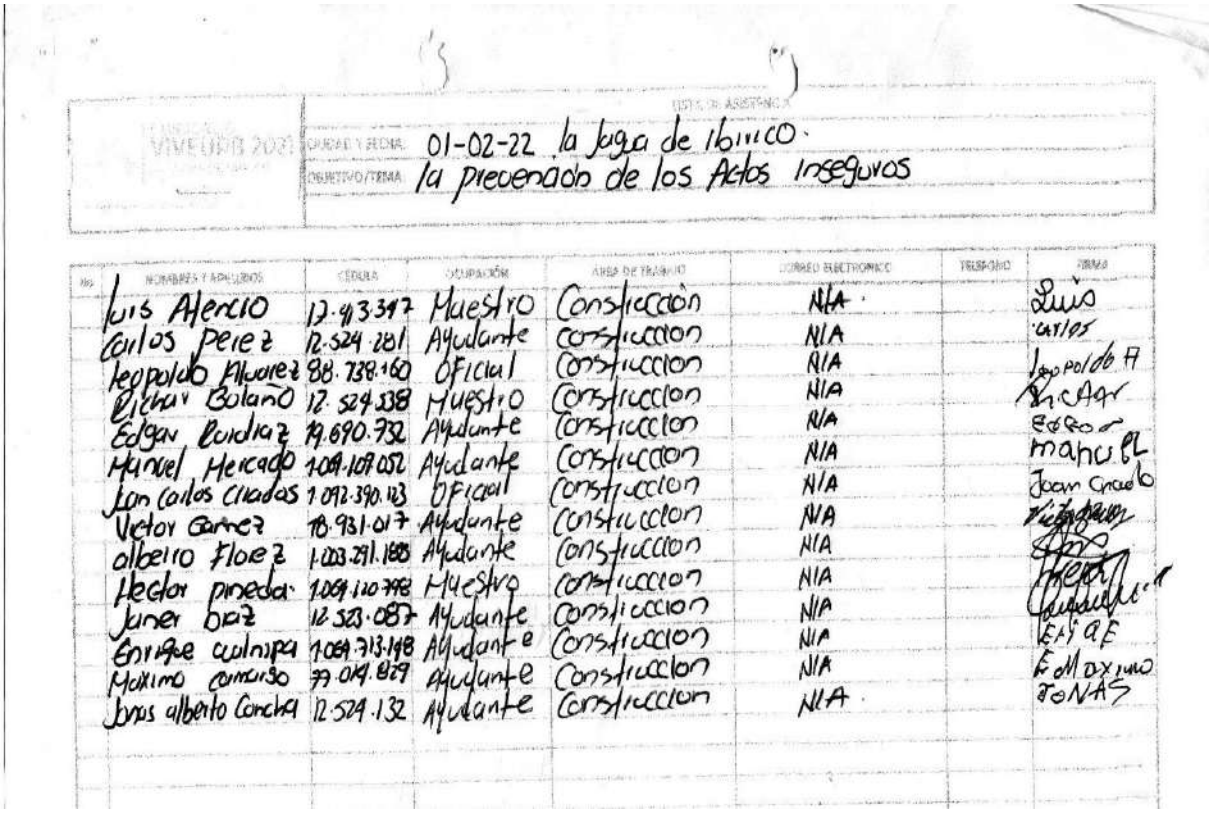

LISTA DE ASISTENCIA

LUGAR Y FECHA: 01-02-22 la Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: la prevencion de los Actos Inseguros

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	luis Atencio	12.913.317	Maestro	Construccion	NA		Luis
	Carlos Perez	12.524.281	Ayudante	construccion	NIA		carlos
	leopoldo Alvarez	88.138.160	Oficial	Construccion	NIA		Leopoldo A
	Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	Construccion	NIA		RicAar
	Edgar Bonilla	19.690.732	Ayudante	Construccion	NIA		edgar
	Manuel Mercado	1.069.109.052	Ayudante	Construccion	NIA		manu PL
	Juan Carlos Criados	1.092.390.143	Oficial	Construccion	NIA		Juan Criado
	Victor Gamez	18.931.017	Ayudante	Construccion	NIA		
	alberto Florez	1.003.291.188	Ayudante	Construccion	NIA		
	Hector pineda	1.069.120.778	Maestro	construccion	NIA		
	Javier Diaz	12.523.087	Ayudante	Construccion	NIA		
	Enrique wulnipa	1.069.313.198	Ayudante	Construccion	NIA		
	Maximo camargo	77.019.829	Ayudante	Construccion	NIA		
	Jonas alberto Concha	12.524.132	Ayudante	Construccion	NIA		

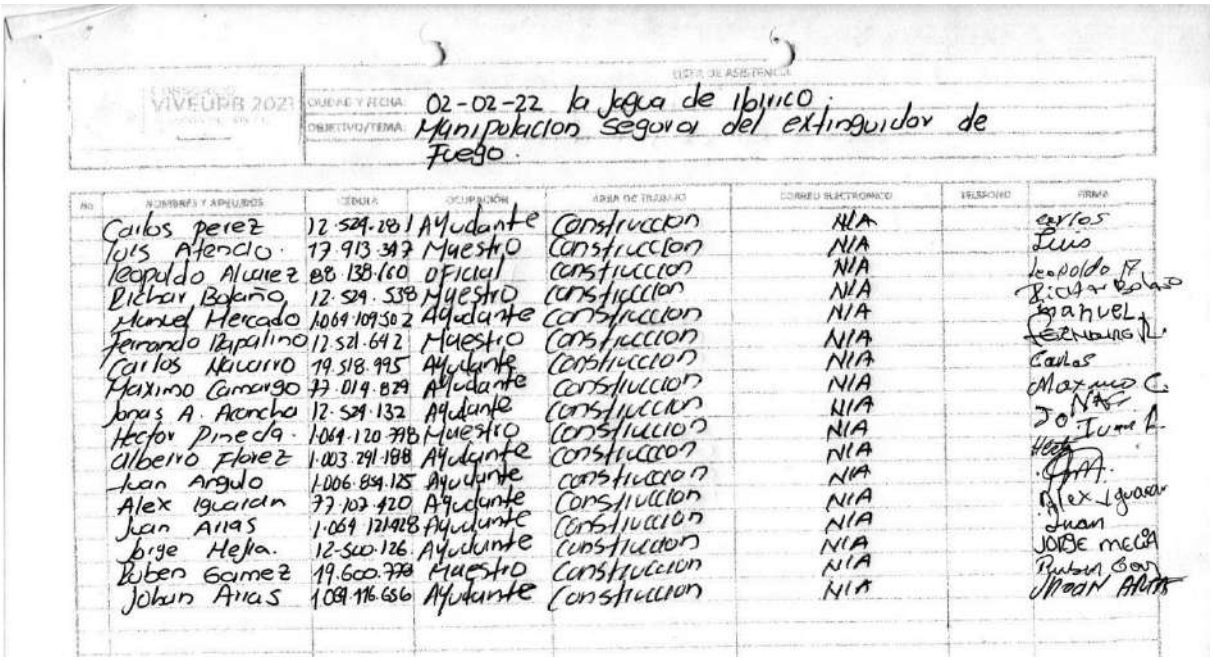

LISTA DE ASISTENCIA

LUGAR Y FECHA: 02-02-22 la Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Manipulacion segura del extinguidor de Fuego.

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Carlos perez	12.524.281	Ayudante	Construccion	NIA		carlos
	luis Atencio	17.913.317	Maestro	Construccion	NIA		Luis
	leopoldo Alvarez	88.138.160	Oficial	construccion	NIA		leopoldo A
	Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	construccion	NIA		Richar Bolaño
	Manuel Mercado	1.069.109.502	Ayudante	Construccion	NIA		manuel
	Fernando Izquierdo	12.521.642	Maestro	Construccion	NIA		FERNANDO
	Carlos Navarro	19.518.995	Ayudante	Construccion	NIA		Carlos
	Maximo Camargo	77.019.829	Ayudante	construccion	NIA		Maximo C.
	Jonas A. Acencha	12.524.132	Ayudante	Construccion	NIA		JONAS
	Hector Pineda	1.069.120.778	Maestro	Construccion	NIA		
	alberto Florez	1.003.291.188	Ayudante	Construccion	NIA		
	Juan Argulo	1.006.859.125	Ayudante	construccion	NIA		
	Alex Iguaran	77.107.420	Ayudante	Construccion	NIA		Alex Iguaran
	Juan Arias	1.069.121928	Ayudante	Construccion	NIA		Juan
	Jorge Mejia.	12.500.126	Ayudante	construccion	NIA		JORGE MEJIA
	Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	Construccion	NIA		Ruben Gam
	Johan Arias	1.069.116.656	Ayudante	Construccion	NIA		Johan Arias

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.




LISTA DE ASISTENCIA

VIVEURB 2021

LUGAR Y FECHA: 03-02-22 la Jagua de Ibirico.

OBJETIVO/TEMA: El Peligro Inminente en SST.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Jan E. Arias	1069-121-428	Ayudante	Construccion	NIA		Juan
	Jorge Mejia	12-500-126	Ayudante	Construccion	NIA		Jorge mejia
	Duban Florez	1003-291-192	Ayudante	Construccion	NIA		DUBAN FLOREZ
	Fernando Papalino	12-521-642	Oficial	Construccion	NIA		Fernando
	Carlos Navarro	19-518-995	Ayudante	Construccion	NIA		Carlos
	Luis alendo	17-413-347	Maestro	construccion	NIA		Luis
	Carlos Perez	12-524-281	Ayudante	construccion	NIA		Carlos
	leopoldo Alvarez	88-138-160	Oficial	Construccion	NIA		leopoldo A
	Jonas A. Aconcha	12-524-132	Ayudante	construccion	NIA		JONAS
	Maximo Camargo	77-014-829	Ayudante	construccion	NIA		
	alberto Florez	1003-291-188	Ayudante	construccion	NIA		
	Hector pineda	1.064-120-798	Maestro	construccion	NIA		
	Dichar Bolaño	19-690-732	Maestro	construccion	NIA		
	enrique walnipan	1.064-713-148	Ayudante	construccion	NIA		
	Edgar Roidiaz	19-690-734	oficial	construccion	NIA		
	Manuel Mercado	1064-119-052	Ayudante	construccion	NIA		manuel
	Cristian Garcia	1064-119-615	Ayudante	construccion	NIA		

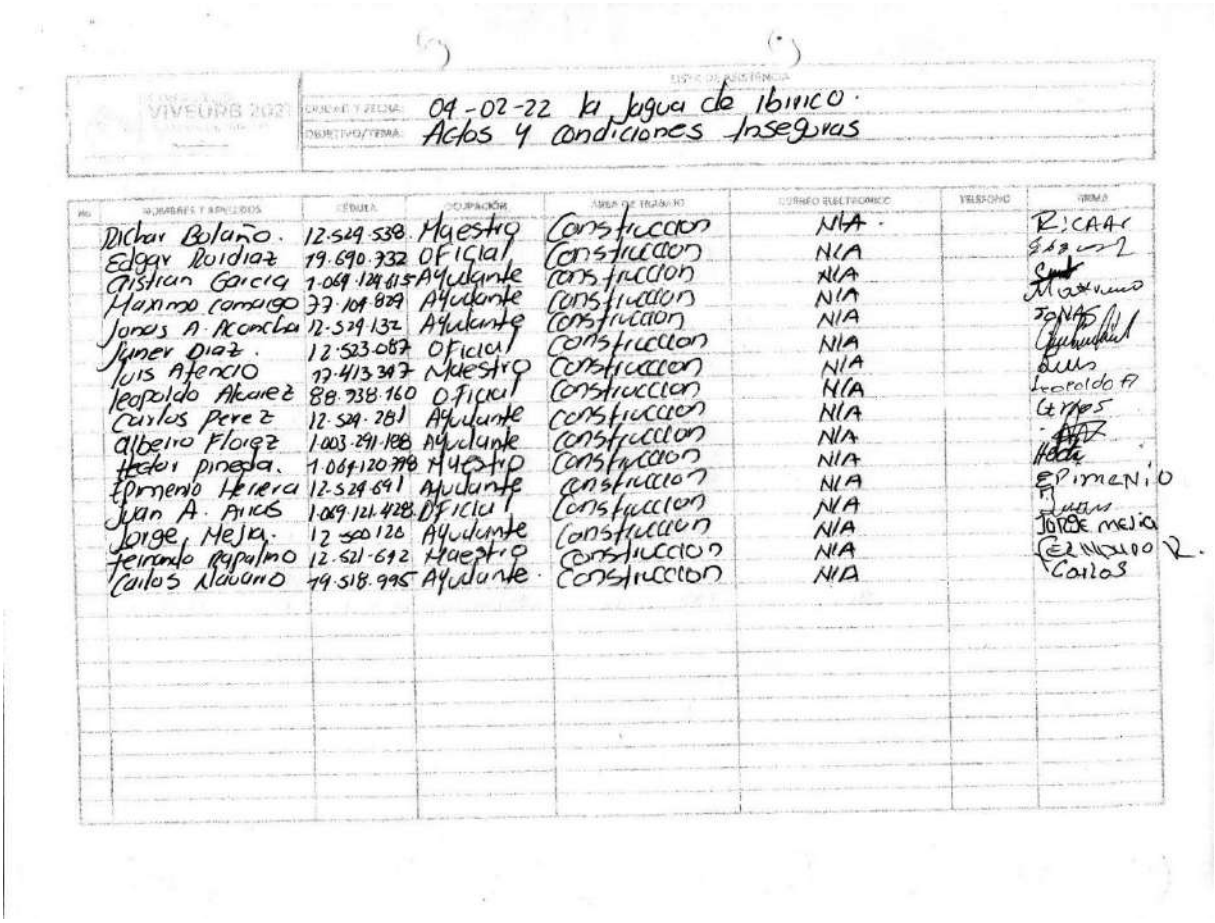

LISTA DE ASISTENCIA

VIVEURB 2021

LUGAR Y FECHA: 04-02-22 la Jagua de Ibirico.

OBJETIVO/TEMA: Actos y condiciones Inseguras

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Dichar Bolaño.	12-524-538	Maestro	Construccion	NIA		RICAAr
	Edgar Roidiaz	19-690-732	OFICIAL	Construccion	NIA		
	Cristian Garcia	1-064-119-615	Ayudante	construccion	NIA		
	Maximo camargo	77-104-829	Ayudante	construccion	NIA		Maximo
	Jonas A Aconcha	12-524-132	Ayudante	construccion	NIA		JONAS
	Yuner Diaz.	12-523-087	Oficial	construccion	NIA		
	Luis Atencio	17-413-347	Maestro	Construccion	NIA		Luis
	leopoldo Alvarez	88-138-160	Oficial	Construccion	NIA		leopoldo A
	Carlos Perez	12-524-281	Ayudante	construccion	NIA		Carlos
	alberto Florez	1003-291-188	Ayudante	construccion	NIA		
	Hector pineda.	1.064-120-798	Maestro	Construccion	NIA		Hector
	Eprmenio Herera	12-524-691	Ayudante	construccion	NIA		EPIMENIO
	Juan A. Arias	1.064-121-428	Oficial	Construccion	NIA		
	Jorge, Mejia.	12-500-126	Ayudante	Construccion	NIA		JORGE MEJIA
	fernando papalino	12-521-642	Maestro	construccion	NIA		Fernando R.
	Carlos Navarro	19-518-995	Ayudante	Construccion	NIA		Carlos

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

VIVEURB 2021

LUGAR Y FECHA: 07-02-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Habitos Alimenticios.


NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Duban florez	1.003.791.192	Ayudante	Construccion	N/A		DUVAN FLOREZ
	Hector Pineda	1.064.120.778	Maestro	Construccion	N/A		Hec
	Alberto Florez	1.003.791.198	Ayudante	construccion	N/A		
	Carlos Perez	12.524.281	Ayudante	construccion	N/A		Carlos
	Luis Atencio	17.913.397	Maestro	construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	88.138.160	Oficial	construccion	N/A		leopoldo A.
	Juan Andres Arias	1.064.121.098	Ayudante	construccion	N/A		Juan A
	Jorge Mejia	12.500.126	Ayudante	construccion	N/A		Jorge

VIVEURB 2021

LUGAR Y FECHA: 10-02-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Herramientas Manuales


NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Juan Andres Arias	1.064.121.920	Ayudante	Construccion	N/A		Juan
	Fernando Izquierdo	17.521.642	Maestro	construccion	N/A		
	Didier Gomez	19.600.338	Maestro	construccion	N/A		
	Jobson Arias	1.064.116.656	Ayudante	construccion	N/A		Jhoan Arias
	Jorge Mejia	12.500.126	Ayudante	construccion	N/A		Jorge

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

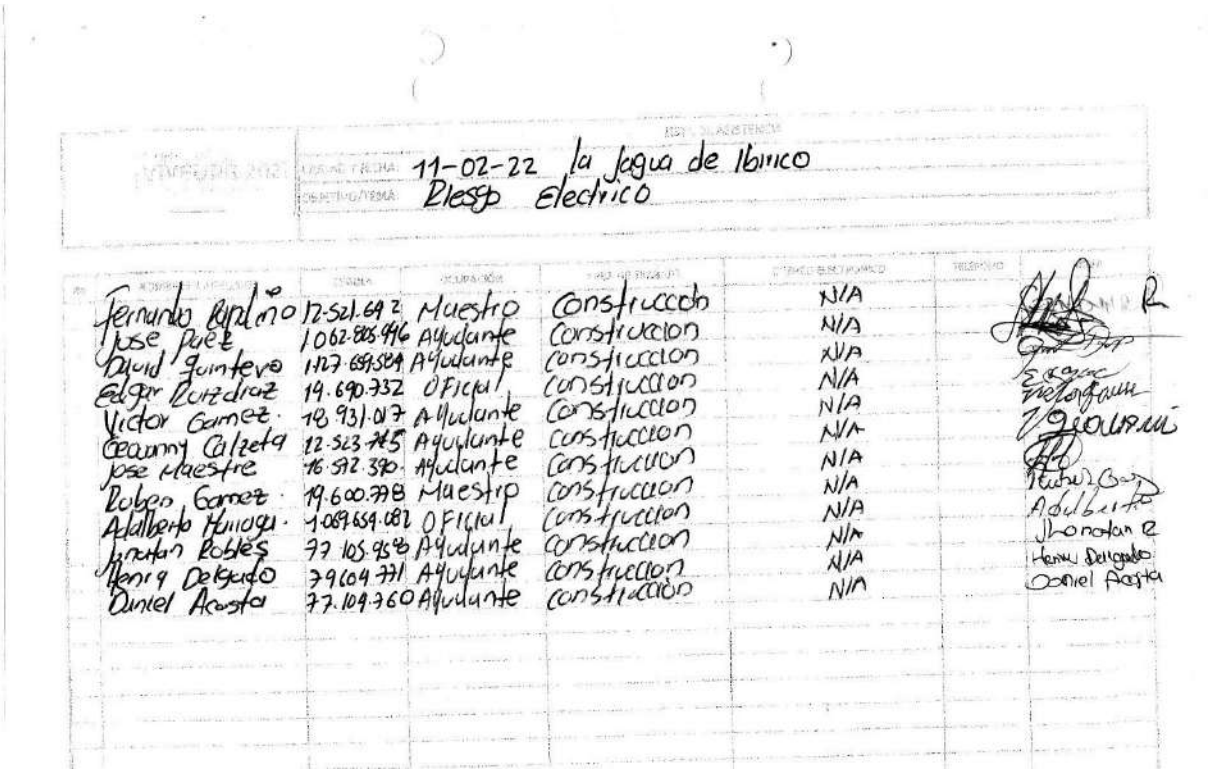

11-02-22 la jagua de Ibirico
Riesgo electrico


Fernando Rapalino	12-521-692	Maestro	Construccion	N/A	
Jose Paez	1062-805-946	Ayudante	Construccion	N/A	
David Quintero	1127-659-509	Ayudante	Construccion	N/A	
Edgar Ruiz diaz	14.690.732	Oficial	Construccion	N/A	
Victor Gomez	18.931.017	Ayudante	Construccion	N/A	
Ceaumy Calzeta	12-523-745	Ayudante	Construccion	N/A	
Jose Maestre	16-592-320	Ayudante	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19.600.778	Maestro	Construccion	N/A	
Adalberto Hurtado	1-089-659-082	Oficial	Construccion	N/A	
Jonatan Robles	77 105 958	Ayudante	Construccion	N/A	
Henry Delgado	79604 771	Ayudante	Construccion	N/A	
Daniel Acosta	77.109.760	Ayudante	Construccion	N/A	

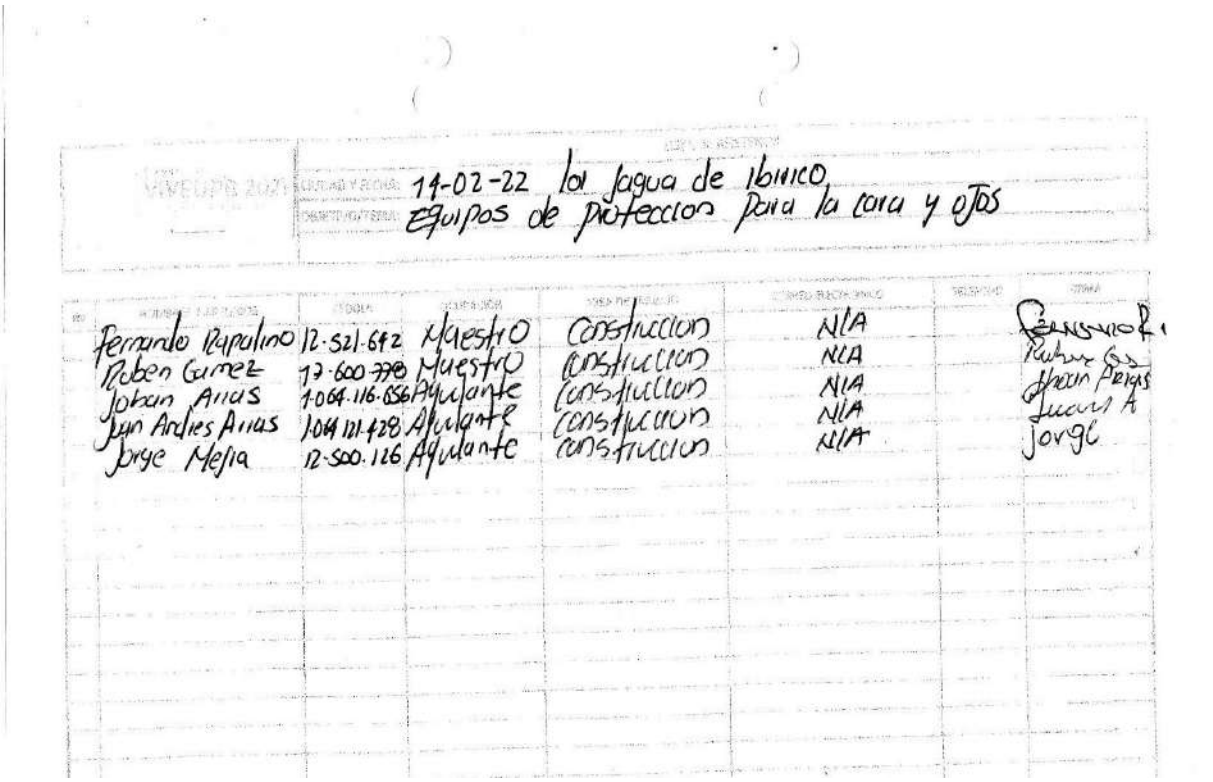

14-02-22 la jagua de Ibirico
Equipos de proteccion para la cara y ojos


Fernando Rapalino	12-521-692	Maestro	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19-600-778	Maestro	Construccion	N/A	
Johan Arias	1-064-116-656	Ayudante	Construccion	N/A	
Juan Andres Arias	1064 121 428	Ayudante	Construccion	N/A	
Jorge Mejia	12-500-126	Ayudante	Construccion	N/A	

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

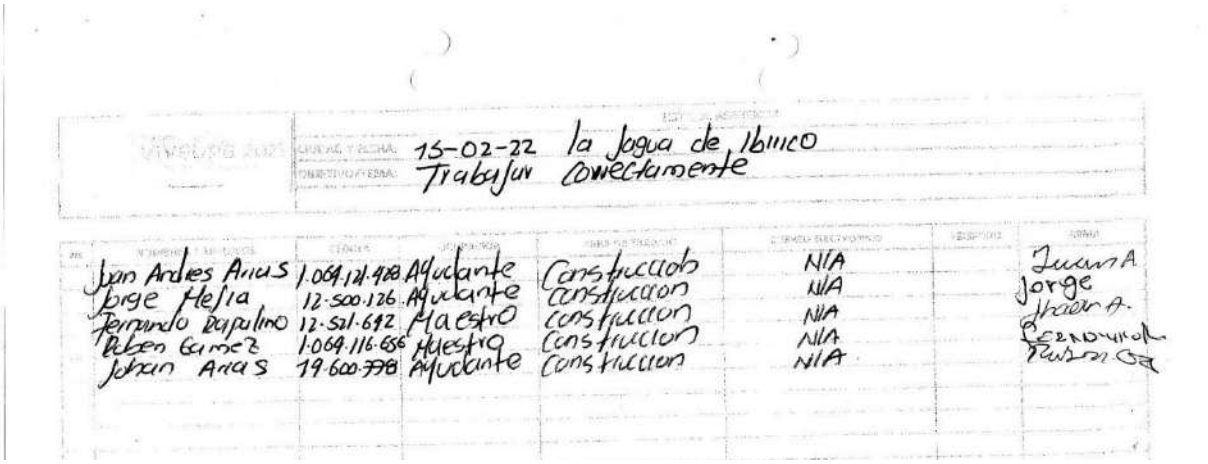


15-02-22 la Jagua de Ibirico
Trabajar Correctamente

Juan Andres Arias	1.069.121.488	Ayudante	Construccion	NIA	
Jorge Mesa	12.500.126	Ayudante	Construccion	NIA	
Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	1.069.116.656	Maestro	Construccion	NIA	
Johan Arias	19.600.798	Ayudante	Construccion	NIA	

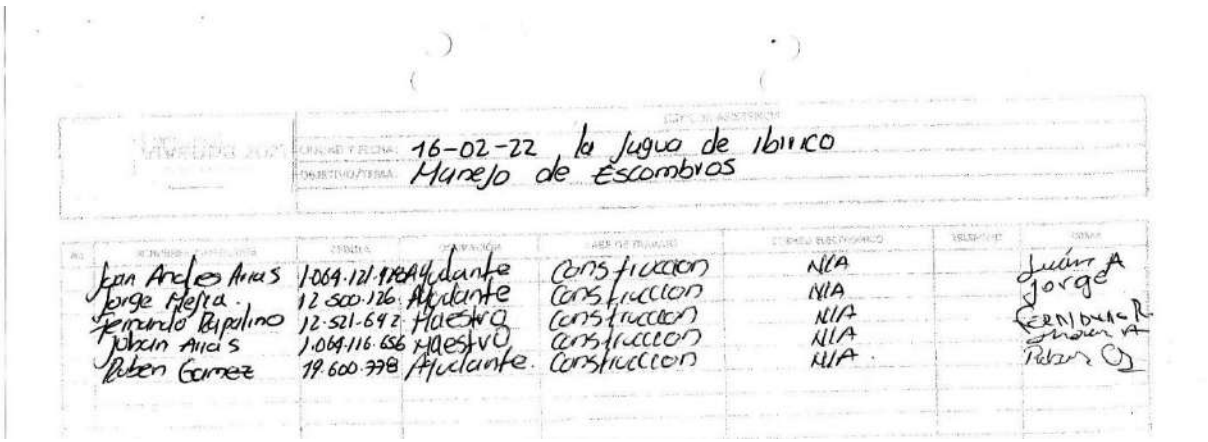

16-02-22 la Jagua de Ibirico
Manejo de Escombros


Juan Andres Arias	1.069.121.488	Ayudante	Construccion	NIA	
Jorge Mesa	12.500.126	Ayudante	Construccion	NIA	
Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	Construccion	NIA	
Johan Arias	1.069.116.656	Maestro	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	19.600.798	Ayudante	Construccion	NIA	

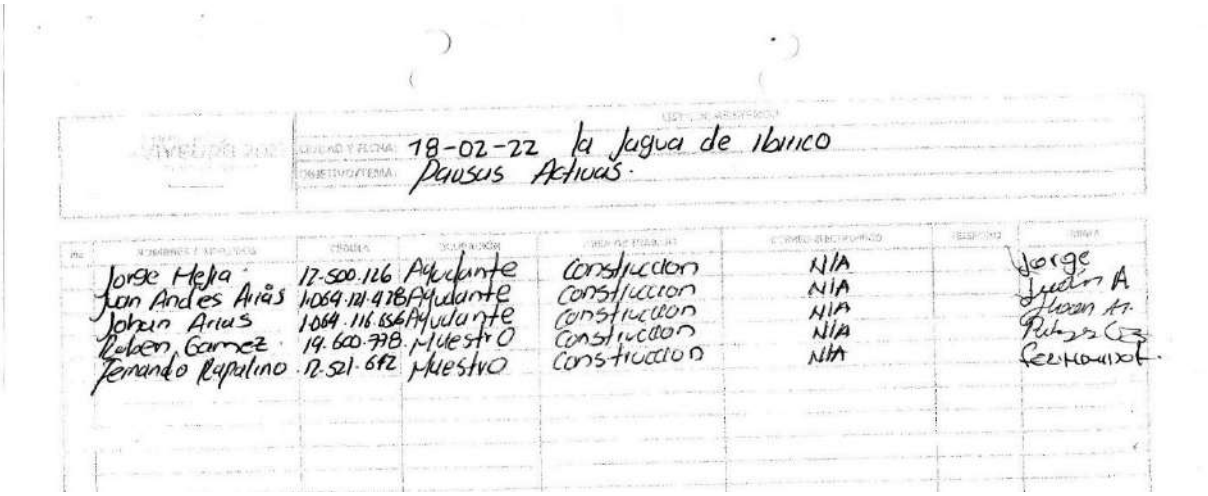

18-02-22 la Jagua de Ibirico
Pausas Activas.


Jorge Mesa	12.500.126	Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Andres Arias	1.069.121.488	Ayudante	Construccion	NIA	
Johan Arias	1.069.116.656	Ayudante	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	19.600.798	Maestro	Construccion	NIA	
Fernando Rapalino	12.521.692	Maestro	Construccion	NIA	

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

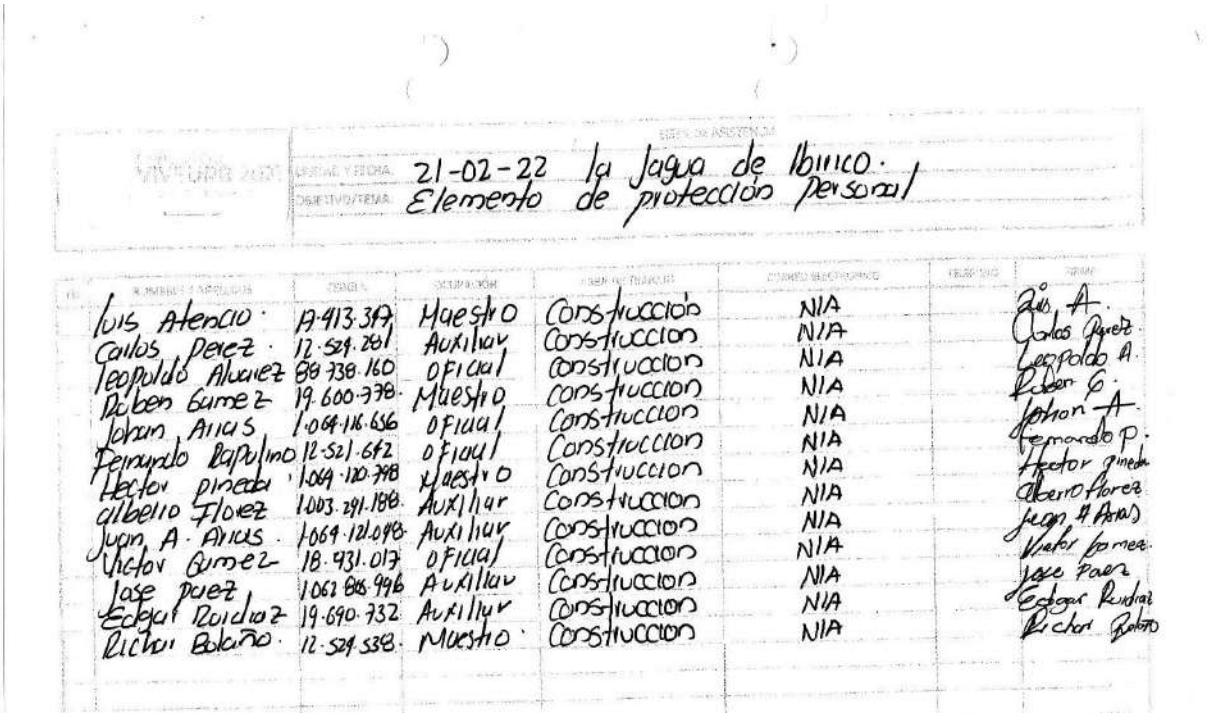

21-02-22 la Jagua de Ibirico.
Elemento de protección personal


Luis Atencio	17.913.347	Maestro	Construcción	NIA		
Carlos Perez	12.529.261	Auxiliar	Construccion	NIA		
Leopoldo Alcocer	88.738.160	Oficial	Construccion	NIA		
Ruben Gomez	19.600.778	Maestro	Construccion	NIA		
Johan Arias	1.069.116.656	Oficial	Construccion	NIA		
Fernando Rapalino	12.521.642	Oficial	Construccion	NIA		
Hector pineda	1.069.120.798	Maestro	Construccion	NIA		
Gilberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	Construccion	NIA		
Juan A. Arias	1.069.121.098	Auxiliar	Construccion	NIA		
Victor Gomez	18.931.017	Oficial	Construccion	NIA		
Jose Perez	1062 868 996	Auxiliar	Construccion	NIA		
Edgar Roldan	19.690.732	Auxiliar	Construccion	NIA		
Richar Bolaño	12.529.538	Maestro	Construccion	NIA		

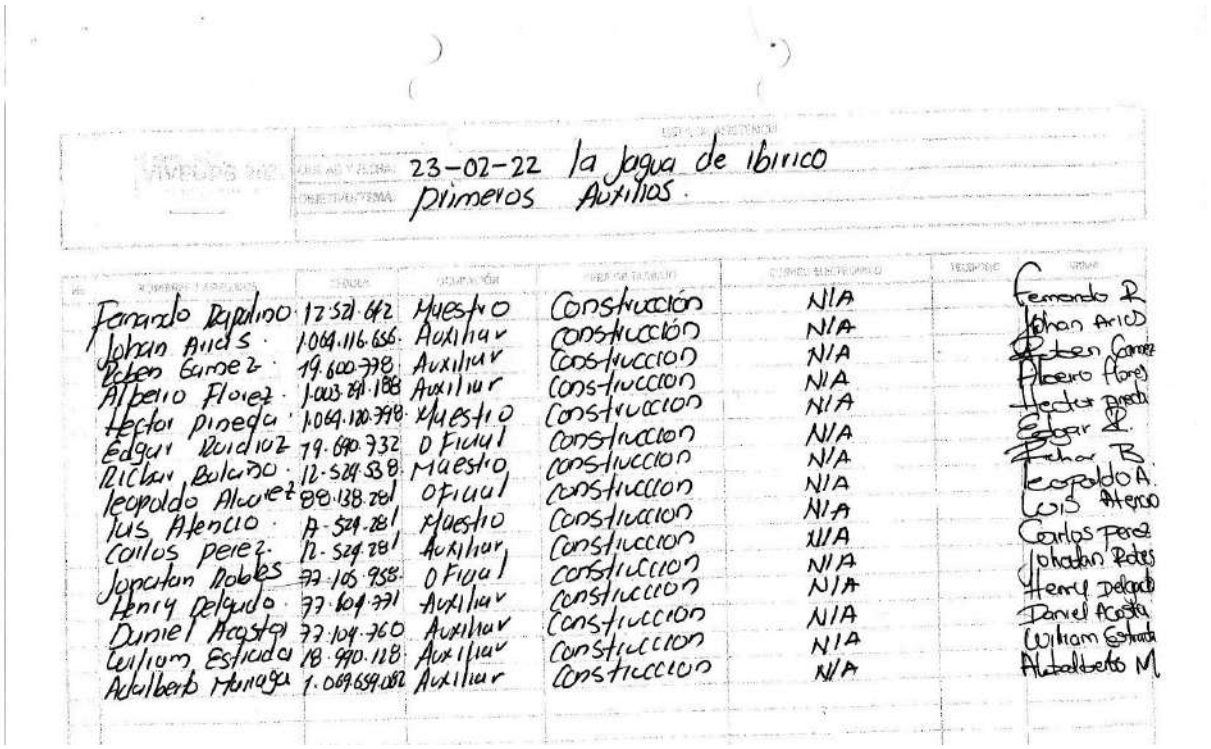

23-02-22 la Jagua de Ibirico
primeros Auxilios.


Fernando Rapalino	12.521.642	Maestro	Construcción	NIA		
Johan Arias	1.069.116.656	Auxiliar	Construcción	NIA		
Ruben Gomez	19.600.778	Auxiliar	Construccion	NIA		
Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	Construccion	NIA		
Hector pineda	1.069.120.798	Maestro	Construccion	NIA		
Edgar Roldan	19.690.732	Oficial	Construccion	NIA		
Richar Bolaño	12.529.538	Maestro	Construccion	NIA		
Leopoldo Alcocer	88.138.281	Oficial	Construccion	NIA		
Luis Atencio	A.529.281	Maestro	Construccion	NIA		
Carlos perez	12.529.281	Auxiliar	Construccion	NIA		
Jonathan Robles	77.105.958	Oficial	Construccion	NIA		
Henry Delgado	77.109.771	Auxiliar	Construccion	NIA		
Daniel Acosta	77.109.760	Auxiliar	Construccion	NIA		
William Estrada	18.990.128	Auxiliar	Construccion	NIA		
Adalberto Maraga	1.069.659.082	Auxiliar	Construccion	NIA		

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

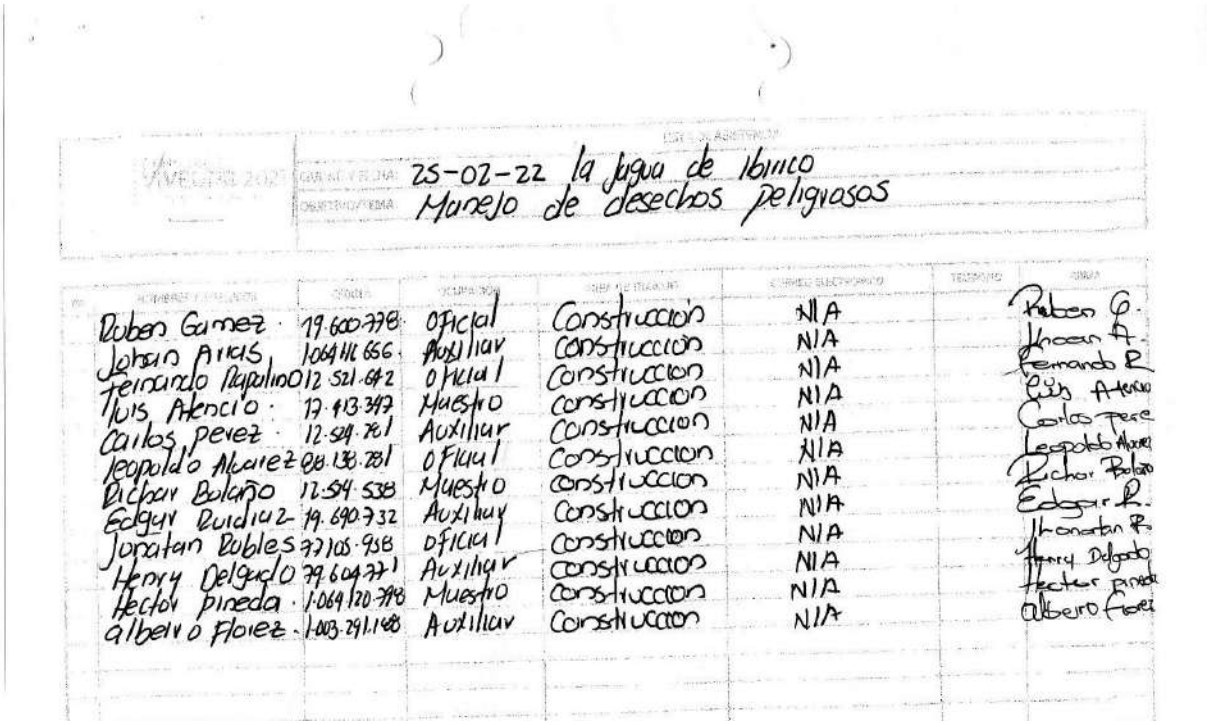

25-02-22 la Jagua de Ibirico
Manejo de desechos peligrosos

Ruben Gamez	19.600.778	Oficial	Construccion	NIA	Ruben G.
Johan Arias	1.069.116.656	Auxiliar	Construccion	NIA	Johan A.
Fernando Papalino	12.521.642	Oficial	Construccion	NIA	Fernando R.
Luis Atencio	17.913.347	Maestro	Construccion	NIA	Luis Atencio
Carlos Perez	12.529.281	Auxiliar	Construccion	NIA	Carlos Perez
Leopoldo Alvarez	88.138.281	Oficial	Construccion	NIA	Leopoldo Alvarez
Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	Construccion	NIA	Richar Bolaño
Edgar Bolaño	19.690.732	Auxiliar	Construccion	NIA	Edgar R.
Jonatan Dubles	77.105.958	Oficial	Construccion	NIA	Jhonatan R.
Henry Delgado	79.604.771	Auxiliar	Construccion	NIA	Henry Delgado
Hector pineda	1.069.120.798	Maestro	Construccion	NIA	Hector pineda
Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	Construccion	NIA	Alberto Florez

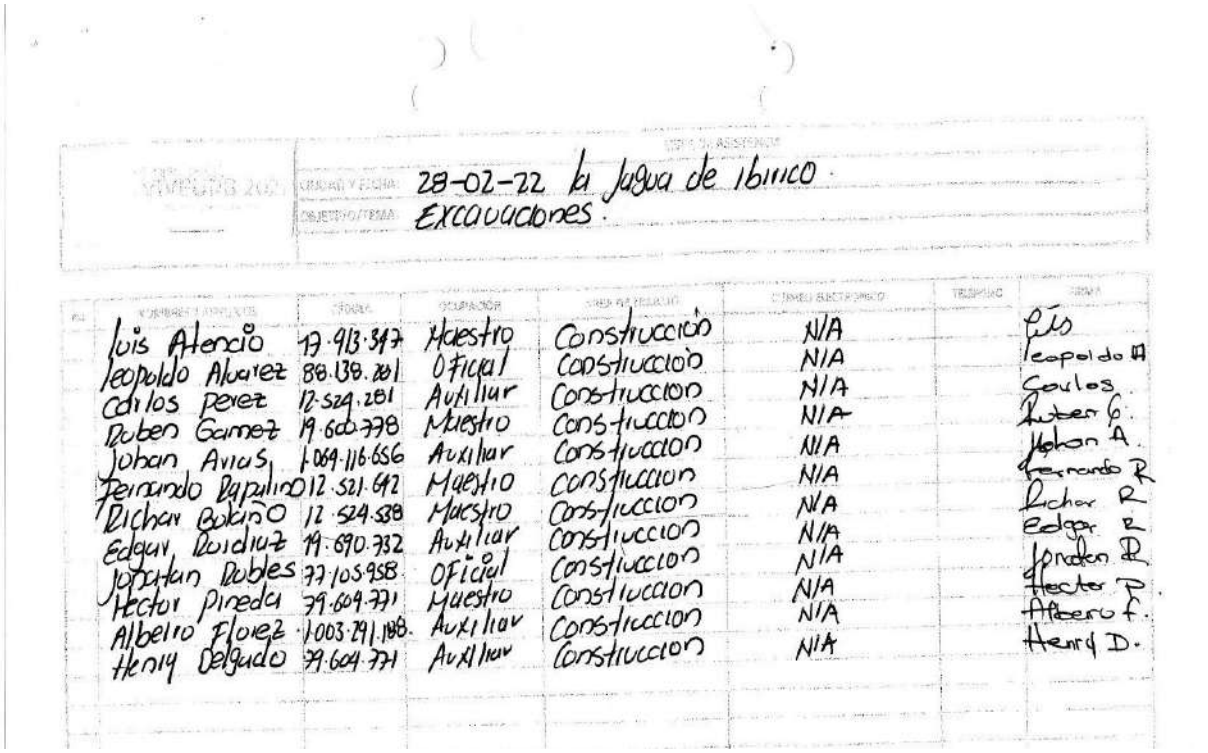

28-02-22 la Jagua de Ibirico
Excavaciones.

Luis Atencio	17.913.347	Maestro	Construccion	NIA	Luis
Leopoldo Alvarez	88.138.281	Oficial	Construccion	NIA	Leopoldo A
Carlos Perez	12.529.281	Auxiliar	Construccion	NIA	Carlos
Ruben Gamez	19.600.778	Maestro	Construccion	NIA	Ruben G.
Johan Arias	1.069.116.656	Auxiliar	Construccion	NIA	Johan A.
Fernando Papalino	12.521.642	Maestro	Construccion	NIA	Fernando R
Richar Bolaño	12.524.538	Maestro	Construccion	NIA	Richar R
Edgar Bolaño	19.690.732	Auxiliar	Construccion	NIA	Edgar R
Jonatan Dubles	77.105.958	Oficial	Construccion	NIA	Jonatan R.
Hector Pineda	79.604.771	Maestro	Construccion	NIA	Hector P.
Alberto Florez	1.003.291.188	Auxiliar	Construccion	NIA	Alberto F.
Henry Delgado	79.604.771	Auxiliar	Construccion	NIA	Henry D.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

FEBRERO-2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de febrero el area social caracterizó y realizó priorizacion de vivienda en el barrio camilo torres del municipio de la jagua de ibirico, con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reunión de socialización con la beneficiaria, en acompañamiento con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visitas a domicilio casa por casa para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN BARRIO CAMILO TORRES

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el día de hoy 17 de febrero de 2022, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion y priorizacion de vivienda realizada en el barrio camilo torres , en conjunto con la beneficiaria y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer a los beneficiarios datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las políticas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por su bienestar así mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorías visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion de priorizacion en vivienda de aplicación
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- La beneficiaria junto con el presindente del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se tomo asistencia de la beneficiaria.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**OBJETO**: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	
	CONTRATANTE:	CONFACESAR
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.**

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		**DIRECCION:**	
EDAD:		**BARRIO:**	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**PARENTEZCO**	**EDAD**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

_____

C.C.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLICIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"*****,** por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____**,** ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ **(**_____ **M2)** y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura pública de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

LA JAGUA - CESAR			FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA	MES	AÑO	
ACTA DE VECINDAD			OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO			**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**		
Nombre			**Nombre**		
Cedula			**Cedula**		
Dirección			**Dirección**		
Celular / Tel. fijo			**Celular / Tel. fijo**		
C. Electrónico			**C. Electrónico**		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C C.	C C.	C C.
T P.	T P.	

ANEXOS LISTA DE ASISTENCIA

CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO
CONTRATANTE: CONFACESAR
CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO: Centro Ibirico

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Nelvis Zambrano Ramirez	1064961650	Beneficiario	Apolo Torres Calle 16 # 8-94	3136686111	Beneficiarios	
	Gustavo Benjumea Pitre Cotes	12340 92953 1065919800	Ing Civil Ing Social	Comisión Técnica Comité Ibirico	3008337469 3005416959	Interventoria Contratista	









ANEXO


CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD **OBRA**: Construcción de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

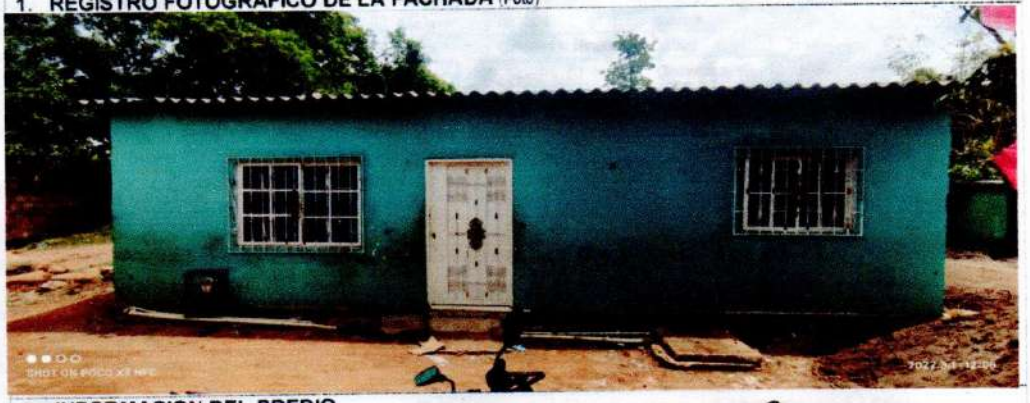

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	X Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Camilo Torres	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	X Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	X Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Derwis E. Peinado G.
Cedula	1.065.667.308
Dirección	
Celular / Tel. fijo	3215422923
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

			Observaciones
Electricidad	X Si	☐ No	
Gas domiciliario	X Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	X Si	☐ No	
Acueducto	X Si	☐ No	
Alcantarillado	X Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	X No	
Televisión cable	☐ Si	X No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	X No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	X No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	X No
Antejardín	☐ Si	X No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☒ No				
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No			

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Humedad	☒ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☐ **No**	**Grietas y fisuras**	☒ **Si**	☐ **No**			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No			
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No			

7. OBSERVACIONES GENERALES

En la habitación principal cuenta con cielo raso en poliestireno en regular estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.		Doreen Peinado
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1.065 667 308
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA. 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	**FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES**
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construcción de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Camilo Torres		
Dirección						
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☒ Otro: Vivienda abandonada	
Longitud de frente	Mts.		**Numero de niveles (pisos)**			

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Vivienda Abandonada Sin Información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C C.	C C.	C C.
T P.	T P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

ELABORO:



LIZETH KARINA MORENO
INSPECTORA HSE

LA JAGUA DE IBIRICO

FEBRERO
2022.

CONTENIDO.

1. INTRODUCCION 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 5

2.1. Centros de trabajo 5

2.2. Descripción de las actividades 5

3. OBJETIVOS 6

3.1. Objetivo general. 6

3.2. Objetivos específicos. 6

4. ALCANCE. 7

5. MARCO NORMATIVO 7

6. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021. 8

7. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES. 8

8. PLAN DE TRABAJO PAPSO 9

8.1. Medidas que deben adoptar los trabajadores al ingresar. 9

8.2. Medidas de control durante la jornada laboral. 10

8.3. Medidas de control para la salida de la obra. 11

9. CONCLUSIÓN..... 13

1. INTRODUCCION

Debido a los hechos de salud pública registrados en los últimos días por el brote del coronavirus conocido como COVID-19 y en donde se ha visto afectada la población colombiana con la implementación del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, imposibilitando el normal funcionamiento de los sectores económicos que se dedican a la construcción a surge la necesidad de Implementar un protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, con el fin de reducir el riesgo de la propagación y transmisión del virus.

El protocolo de bioseguridad para las actividades propias de la obra de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR proyecta orientar a sus trabajadores hacia la implementación de procedimientos de protección para minimizar el contagio del COVID-19, mediante prácticas sanas y seguras durante el desarrollo del seguimiento y control en la jornada laboral.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

RAZÓN SOCIAL	VIVEURB 2021
NIT.	NIT. 901.457.886-9
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	3106404017
REPRESENTANTE LEGAL	Gilberto Antonio Ibarra Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Karina Paola Mina Centena
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

2.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	construcción de viviendas de interés social en sitio propio en el municipio la jagua de ibirico, departamento del cesar	V

2.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción del escenario recreo deportivo en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Horario de trabajo.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m., para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general.

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID – 19).

3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrerodel 2020.

- ✓ Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- ✓ Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación.

4. ALCANCE.

Es aplicable al proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR" a los trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes en el cumplimiento de las fases en que se encuentra el proyecto y hasta la entrega del mismo.

5. MARCO NORMATIVO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación delCOVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos hasta el 31 de mayo de 2020".

Que el referido acto administrativo, ordenó a los jefes y representantes legales de centros laborales públicos y privados, adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19, además de impulsar la máxima prestación del servicio a través del teletrabajo, en el entendido que le corresponde a las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias que permitan la adopción de una cultura de prevención y la minimización del riesgo.

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por término de treinta (30) días" con el fin de adoptar todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la Circular 021 del 17

de marzo de 2020, se señaló que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”, razón por la cual dicho Ministerio previó una serie de mecanismos con el fin de protegerlo y garantizar la actividad productiva.

6. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021.

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

7. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.

El CONSORCIO VIVEURB 2021 viene cumpliendo con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19.

	
USO DE TAPA BOCAS	**ENTREGA DE TAPA BOCAS**

Se están implementando estrategias como de AUTOCUIDADO Y CUIDADO GRUPAL, las cuales se refuerzan en las charlas diarias de seguridad, se vela por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.

8. PLAN DE TRABAJO PAPSO

El **Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO)** debe entenderse como un programa detallado de estrategias y actividades que estarán sujetas a evaluación por entidades de control. De esta manera es importante planear de manera adecuada las actividades y que estas sean coherentes con el tamaño y complejidad de cada una de las obras en sus diferentes etapas.

De esta manera, el equipo interno debe tener no solo el PAPSO, sino además los soportes de su diseño e implementación, de tal manera que pueda ser validado y justificado.


En la etapa de diseño se deben tener los análisis que justifiquen el actuar y la programación de las actividades allí plasmadas. En la validación, se debe llevar de forma sistemática y continua los soportes de la realización de las actividades, como registros de control, actas y evaluaciones.

8.1. Medidas que deben adoptar los trabajadores al ingresar.

Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.

Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.

Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.

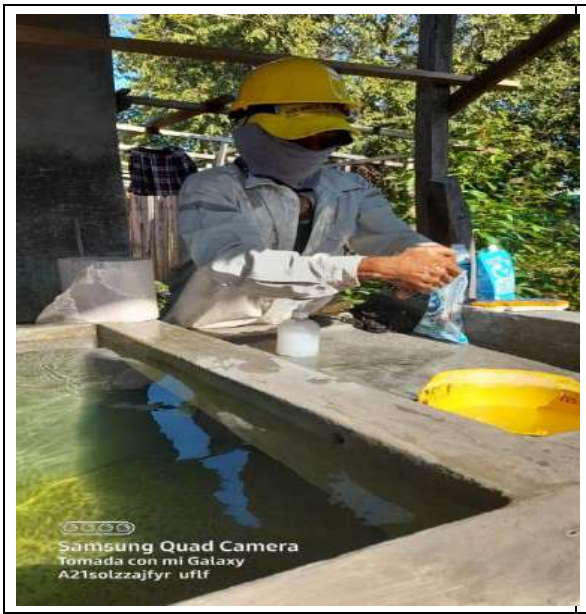	
CONTROLES DE INGRESO	**CONTROLES DE INGRESO**

Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.

Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.


8.2. Medidas de control durante la jornada laboral.

Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.

Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior.

Se recomienda hacer tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19.

Tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previos y posteriores a la reunión. Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores o jefes de cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias.

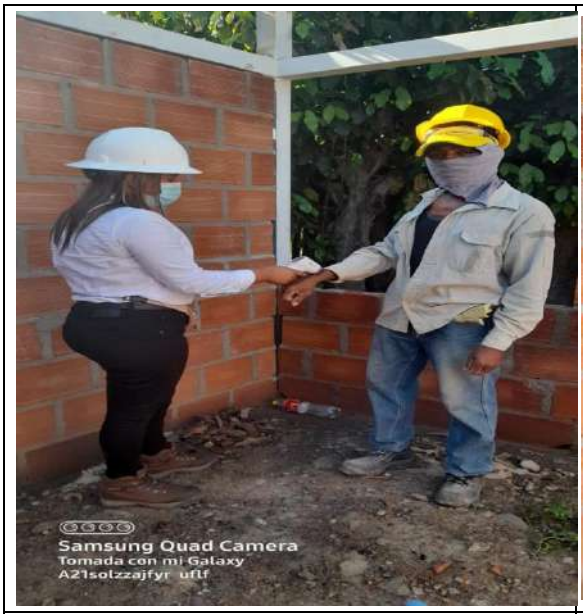	
CONTROLES DURANTE EL DIA	**CONTROLES DURANTE EL DIA**

8.3. Medidas de control para la salida de la obra.

El siguiente listado de medidas debe contemplarse durante la salida del personal de obra:

- ✓ Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- ✓ Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- ✓ Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.
- ✓ En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, desinfectarlos antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de limpieza de manos a la subida de las personas.
- ✓ Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que

el propio trabajador manipule sus elementos.

	
CONTROLES DE SALIDA	**CONTROLES DE SALIDA**

- ✓ Desarrollar un modelo de sectorización de áreas o actividades, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas (2 metros para tener grupos aislados).

- ✓ Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores. Turnos diurnos y nocturnos, si es posible. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta.

- ✓ Establecer una programación y gestión de actividades que evite cruces de personal, así como tareas, áreas o labores que agrupen la fuerza de trabajo. Para esto se deberá dividir a las cuadrillas de trabajo en grupos que aseguren

9. CONCLUSIÓN

En general se viene implementando todas las medidas de bioseguridad de manera rigurosa por parte de los profesionales de obra y el gran acompañamiento que nos ha hecho la interventorías, secretaria de salud entre otras entidades.

Hasta el momento no hemos tenido ningún caso de covid-19 lo que nos hace pensar que se viene haciendo un excelente trabajo.

El consorcio VIVEURB 2021 seguirá estableciendo canales entre los profesionales de campo y los trabajadores con el fin de establecer cada vez más medidas que nos permitan seguir con este firme objetivo.

Se seguirá acogiendo e implementando las solicitudes realizadas por la interventoría y demás entidades que no ayuden a estar siempre en plan de mejora.
