INFORME DE INTERVENTORÍA N° 13

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

La Jagua de Ibirico - Cesar

2022

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
1.1. CONTRATO DE OBRA 4
1.1.1. INFORMACION GENERAL 4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 5
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA 6
2.1. FORMA DE PAGO 6
2.2. ANTICIPO 6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA 6
3.1. FORMA DE PAGO 6
3.2. ANTICIPO 7
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. ANTECEDENTES 9
6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN 10
7. AVANCE DE OBRA 16
7.1. BALANCE DEL CONTRAT DE OBRA 17
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 17
7.2.1. ADMINISTRATIVAS 17
7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS 17
6.2.3. TECNICAS 17
7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA 18
8. GARANTIAS 20
8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA 20
8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA 20
9. POLIZAS 20
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 20
11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES 20
12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19 20

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS 21

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales. 21

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas. 22

14. CONTROLES TECNICOS 38

14.1. Chequeo de trazados. 38

14.2. Chequeo de dimensiones y niveles en cimentaciones. 39

14.3. Chequeo de acero de refuerzo de cimentaciones 40

14.5. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados. ... 41

14.6. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 41

14.7. Chequeo de refuerzo de mampostería. 42

14.8. Chequeo de tapones de estructuras metálicas 42

14.9. Chequeo de nivel de plantilla. 42

14.10. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio 42

15. CONTROL DE EQUIPO 43

16. CONTROL DE PERSONAL 44

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS 45

17.1. Actas de habitabilidad de viviendas entregadas.**¡Error! Marcador no definido.**

17.2. Actas de recibo a satisfacción de las viviendas.**¡Error! Marcador no definido.**

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS 47

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS 47

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS 48

ANEXOS 49

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoría.

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato con un pago anticipado del 40% ($251.471.935,59) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.



Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios y viviendas intervenidas.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE JUNIO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10
5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271

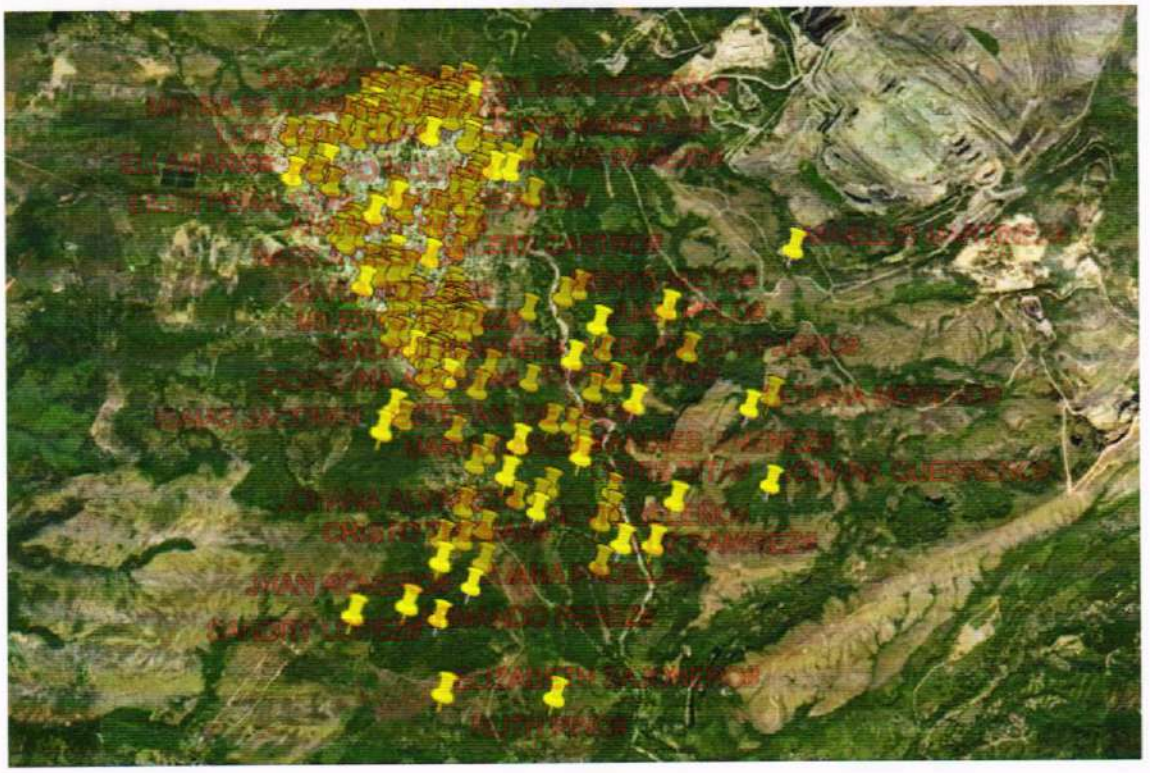


Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE JUNIO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO 089	5 DE JUNIO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE JUNIO DE 2021

6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	VIVIENDAS COMPLETADAS O AVANZADAS	FALTANTES
I.	PRELIMINARES REALIZADOS	121	150
1.1	DESCAPOTE MANUAL	11	260
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121	150
1,3	CORTE, RELLENO O ENTABLADO	111	160
II.	CIMENTACIONES FUNDIDAS	111	160
2,1	EXCAVACION MANUAL	111	160
2,2	ZAPATAS	111	160
2,3	VIGAS	111	160
2,4	PLANTILLA	73	198
2,5	ACERO DE REFUERZO	111	160
2,6	ESTRUCTURA METALICA	96	175
III.	MAMPOSTERIAS LEVANTADAS	84	187
3,1	MUROS	84	187
3,2	PAÑETES DE BAÑO Y COCINA	77	194
IV.	CUBIERTAS INSTALADAS	87	184
4,1	LAMINAS DE FIBRO CEMENTO	87	184
4,2	CABALLETE	87	184
V.	PISOS Y ENCHAPES	72	199
5,1	PISO CERAMICO PARA BAÑO Y COCINA	72	199
VI.	INSTALACIONES ELECTRICAS	72	199
6,1	ACOMETIDA GENERAL	73	198
6,2	POLO DE TIERRA	72	199
6,3	TABLERO MONOFASICO	72	199
6,4	ILUMINACION	72	199
6,5	INTERRUPTORES SENCILLOS	72	199
6,6	INTERRUPTORES DOBLE	72	199
6,7	TOMA CORRIENTE NORMAL	72	199
6,8	TOMA CORRIENTE CON PROTECCION	72	199
6,9	TOMA COAXIAL PARA TV	72	199
VII.	PUERTAS Y VENTANAS	72	199
7,1	PUERTA METALICA	72	199
7,2	PUERTAS DE MADERA	72	199
7,3	VENTANA	72	199
VIII.	INSTALACIONES SANITARIAS	73	198
8,1	RED GENERAL	73	198
8,2	CAJA DE INSPECCION	73	198
8,3	EXCAVACION MANUAL	73	198
IX.	INSTALACIONES HIDRAULICAS	72	199
9,1	PUNTO HIDRAULICA	72	199
9,2	RED DE SUMINISTRO	72	199
X.	ACCESORIOS	72	199
10,1	LLAVE DE CONTROL	72	199
10,2	LAVAPLATOS	72	199
10,3	LAVAMANOS	72	199
10,4	SANITARIO	72	199
10,5	DUCHA	72	199
10,6	REJILLA SOSCO	72	199
10,7	INSCRUSTACIONES PORCELANATO	72	199
10,8	LAVADERO	72	199
XI.	ACABADOS	72	199
11,1	PASTA SOBRE MUROS	72	199
11,2	GRANIPLAST FACHADA	72	199
11,3	YESO PINTURA	72	199
XII.	TANQUE DE AGUA	72	199
12,1	TANQUE DE 500LT	72	199
12,2	PLACA EN CONCRETO	75	196

Ilustración 3 Resumen de actividades ejecutadas.



Gráfico 1 Porcentaje de preliminares realizados



Gráfico 2 Porcentaje de cimentaciones fundidas



Gráfico 3 Porcentaje de mamposterías levantadas



Gráfico 4 Porcentaje de cubiertas instaladas



Gráfico 5 Porcentaje de enchapes instalados.



Gráfico 6 Porcentaje de instalaciones eléctricas instaladas.

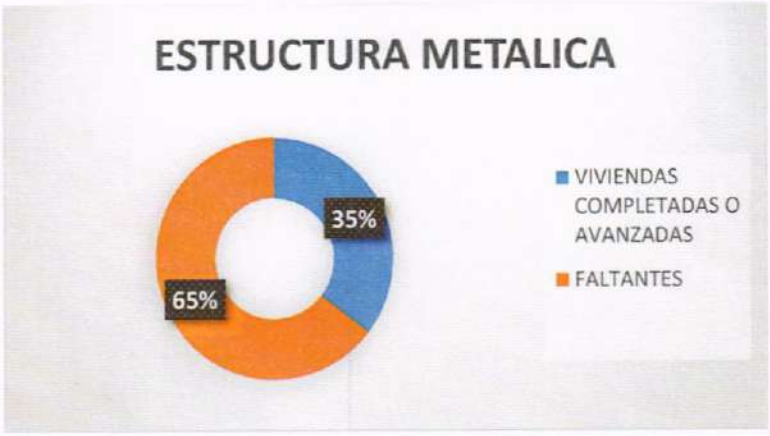


Gráfico 7 Porcentaje de estructuras metálicas levantadas.



Gráfico 8 Porcentaje de puertas y ventanas instaladas.



Gráfico 9 Porcentaje de instalaciones sanitarias instaladas.



Gráfico 10 Porcentaje de instalaciones hidráulicas instaladas.



Gráfico 11 Porcentaje de accesorios instalados.



Gráfico 12 Porcentaje de acabados avanzados o terminados.



Gráfico 13 Porcentaje de tanques de agua instalados.

7. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (días):	**549**
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 30 de junio:	**408 días**
Porcentaje de avance en tiempo:	74,32%
Porcentaje de ejecución de la obra:	**32,43%**
Porcentaje programado:	47,60%
Porcentaje de retraso:	**15,17%**
Porcentaje ejecutado en el mes:	1,64%
Porcentaje de avance total del proyecto (incluyendo gerencia, interventoría y supervisión):	**36,40%**



Ilustración 4 Grafica de porcentajes de ejecución VS metas propuestas.

7.1. BALANCE DEL CONTRAT DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80
ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.

b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

c. Revisión de las labores y actividades contratadas.

d. Revisión de la programación de la obra.

7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto general ejecutado del proyecto

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 6.424.804.461,27
VALOR EJECUTADO SOLO EN EL MES DE JUNIO 2022:	$ 353.146.936,53

ITEM	DESCRIPCION	30 DE JUNIO: 408 DIAS DE 549 DIAS			74,32%
		CASAS	Vr. PARCIAL	% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
I.	REALIZAR PRELIMINARES				
1,1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT	111	$ 35.479.303,98	0,201%	40,96%
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	121	$ 22.315.649,67	0,125%	44,65%
1,3	CORTE, Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRACEO DE LOTES H.PROM 40CM CON MATERI	111	$ 46.152.495,71	0,262%	40,96%
		SUB TOTAL	$ 103.947.449,36	0,588%	
II.	FUNDIR CIMENTACION				
2,1	EXCAVACION MANUAL	111	$ 14.592.357,04	0,082%	40,96%
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	111	$ 51.377.187,38	0,291%	40,96%
2,3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	111	$ 223.416.005,51	1,266%	40,96%
2,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.06m	73	$ 144.852.626,88	0,822%	26,94%
2,5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	111	$ 293.403.972,33	1,663%	40,96%
2,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.	96	$ 1.450.825.984,60	8,218%	35,42%
		SUB TOTAL	$ 2.178.468.133,74	12,341%	
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES				
3,1	MURO DE .10 DE ESPESOR EN ladrillo Hueco de 10.0 x 20 x 30 -MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	84	$ 422.920.590,20	2,396%	31,00%
3,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 (EN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA)	77	$ 25.346.259,06	0,145%	28,41%
		SUB TOTAL	$ 448.266.849,27	2,541%	
IV.	INSTALAR CUBIERTA				
4,1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	87	$ 150.273.188,61	0,851%	32,10%
4,2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	87	$ 15.232.696,02	0,087%	32,10%
		SUB TOTAL	$ 165.505.884,63	0,937%	
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				
5,1	PISO PARED EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M. Y COCINA H=0.40M, TIPO CORONA O SIMILAR.	72	$ 24.653.508,42	0,141%	26,57%
		SUB TOTAL	$ 24.653.508,42	0,141%	
VI.	INSTALAR PARTE ELÉCTRICAS INTERNA				
6,1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE EMERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.	73	$ 3.577.950,46	0,022%	26,94%
6,2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION	72	$ 14.501.676,24	0,082%	26,57%
6,3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE 3 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20 A	72	$ 9.345.628,80	0,053%	26,57%
6,4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	72	$ 33.536.805,12	0,191%	26,57%
6,5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	72	$ 15.700.305,60	0,088%	26,57%
6,6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	72	$ 8.307.496,80	0,048%	26,57%
6,7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	72	$ 33.068.055,60	0,189%	26,57%
6,8	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	72	$ 19.005.187,68	0,109%	26,57%
6,9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO APLIQUE Y TUBERIA CONDUIT PVC)	72	$ 1.825.313,76	0,011%	26,57%
		SUB TOTAL	$ 138.868.420,06	0,792%	

Ilustración 5 Avance de presupuesto pt1.

VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS					
7,1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.90*2, INCLUYE , CERRADURA Y ANTICORROSIVO	72	$	50.132.676,96	0,284%	26,57%
7,2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA	72	$	94.505.353,92	0,537%	26,57%
7,3	VENTANA EN ALUMINIO 5020-VIDRIO NATURAL 4MM	72	$	130.269.541,89	0,739%	26,57%
		SUB TOTAL	$	274.907.572,77	1,560%	
VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA					
8,1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	73	$	15.284.182,43	0,086%	26,94%
8,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	73	$	5.757.823,17	0,032%	26,94%
8,3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	73	$	21.848.148,10	0,124%	26,94%
8,4	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	73	$	48.565.888,86	0,275%	26,94%
8,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	73	$	38.237.692,00	0,215%	26,94%
8,6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	73	$	31.478.764,35	0,178%	26,94%
8,7	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 6"	73	$	47.939.828,18	0,272%	26,94%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE Ø 8"X 6"	73	$	18.861.622,47	0,108%	26,94%
		SUB TOTAL	$	227.973.949,55	1,290%	
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA					
9,1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2".	72	$	14.264.920,80	0,080%	26,57%
9,2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	72	$	20.988.633,60	0,120%	26,57%
		SUB TOTAL	$	35.253.554,40	0,199%	
X.	INSTALAR ACCESORIOS					
10,1	LLAVE CONTROL DE 1/2"	72	$	8.282.597,76	0,048%	26,57%
10,2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR	72	$	11.626.009,92	0,066%	26,57%
10,3	LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	72	$	5.241.818,16	0,029%	26,57%
10,4	SANITARIO BLANCO	72	$	10.442.186,64	0,058%	26,57%
10,5	DUCHA ECONOMICA	72	$	2.712.211,92	0,016%	26,57%
10,6	REJILLAS SOSCO 3X 2	72	$	1.340.706,96	0,008%	26,57%
10,7	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	72	$	2.428.868,16	0,013%	26,57%
10,8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO	72	$	9.795.975,12	0,056%	26,57%
		SUB TOTAL	$	51.870.374,64	0,295%	
XI.	APLICAR ACABADOS					
11,1	PASTA SOBRE MURO EN ACRONAL, A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATECOL, AMONIACO Y NATRASOL (DOS MANOS)	72	$	125.401.174,27	0,709%	26,57%
11,2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA	72	$	28.202.513,88	0,159%	26,57%
11,3	YESO PINTURA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	72	$	213.252.634,08	0,000%	26,57%
		SUB TOTAL	$	366.856.322,23	0,869%	
XII.	INSTALAR TANQUE DE AGUA					
12,1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	72	$	33.949.596,24	0,191%	26,57%
12,2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10 M	75	$	18.590.515,76	0,105%	27,68%
		SUB TOTAL	$	52.540.112,00	0,296%	
TOTAL COSTO DIRECTO			$	4.069.112.131,07		
ADMINISTRACION			$	732.440.183,59		
IMPREVISTO			$	40.691.121,31		
UTIUDAD			$	203.455.606,55		
TOTAL COSTO INDIRECTO			$	976.586.911,46		
TOTAL COSTO NETO			$	5.045.699.042,52		
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA		72	$	32.185.501,20		
IMPLEMENTACIÓN PMA - BIOSEGURIDAD			$	103.478.845,41		
VALOR SUBTOTAL (EJECUTADO POR EL CONTRATISTA)			$	5.181.363.389,14	32,43%	
INTERVENTORIA			$	467.215.618,03		
GERENCIA INTEGRAL			$	467.215.618,03		
ACTIVIDAD 17: APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			$	309.009.836,07		
VALOR TOTAL		Acumulado	$	6.424.804.461,27		
		Mes	$	353.146.936,53		
		% Ejecutado:	36,40%			
		% Mes:	2,00%			

Ilustración 6 Avance de presupuesto pt2.

8. GARANTIAS

8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoría

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

9. POLIZAS

9.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

9.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales.

- El día 23 de junio en horas de la tarde se realizó la socialización del barrio San José. En compañía del presidente de la junta de acción comunal del barrio, personal del contratista e interventoría.



Ilustración 7 Socialización del barrio San José.

- El miércoles 29 de junio se realizó una visita técnica a la obra por parte de la gerencia, los supervisores del municipio e interventoría.

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

13.2.1. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JHON FREDY RIOS GARCIA (Identificada como la vivienda #52)



Ilustración 8 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.2. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARLOS EFRAIN USTATE MARTINEZ (Identificada como la vivienda #74)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.3. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DIANA MARTINEZ (Identificada como la vivienda #75)



Ilustración 9 Levantamiento de mampostería de la vivienda.

13.2.4. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEOVIGILDO FLORES (Identificada como la vivienda #76)



Ilustración 10 Levantamiento de mampostería de la vivienda.



Ilustración 11 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.5. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZDARI MARTINEZ (Identificada como la vivienda #77)



Ilustración 12 Levantamiento de estructura metálica.

13.2.6. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DINA OLAYA (Identificada como la vivienda #84)



Ilustración 13 Levantamiento de mampostería de la vivienda.

13.2.7.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JUAN PICON (Identificada como la vivienda #85)



Ilustración 14 Levantamiento de mampostería de la vivienda.

13.2.8.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARELIS GOMEZ (Identificada como la vivienda #86)



Ilustración 15 Levantamiento de mampostería de la vivienda.



Ilustración 16 Levantamiento de tejado de la vivienda.



Ilustración 17 Vaciado de concreto de losa de baño.

13.2.9. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MENDOZA (Identificada como la vivienda #87)



Ilustración 18 Levantamiento de muro de la vivienda.



Ilustración 19 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JESICA BERRIO (Identificada como la vivienda #88)



Ilustración 20 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.11. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YEIMIR TRILLOS (Identificada como la vivienda #89)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YULIS MORENO (Identificada como la vivienda #90)



Ilustración 21 Levantamiento de estructura metálica.

13.2.13. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria BERTA TAPIA (Identificada como la vivienda #91)



Ilustración 22 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NORAIDA CHAPARRO (Identificada como la vivienda #92)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEIDER RIOS (Identificada como la vivienda #93)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALVARO BELTRAN (Identificada como la vivienda #94)



Ilustración 23 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JULIETH AGUDELO (Identificada como la vivienda #95)



Ilustración 24 Levantamiento de muros de la vivienda.

13.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEIDY ROLON (Identificada como la vivienda #96)



Ilustración 25 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALBERTH BAQUERO (Identificada como la vivienda #97)



Ilustración 26 Levantamiento de muros de la vivienda.



Ilustración 27 Instalación de tejado de la vivienda.

13.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARGARITA ROCHA (Identificada como la vivienda #98)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MILEIDY TELLEZ (Identificada como la vivienda #99)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JAVIER SANCHEZ (Identificada como la vivienda #100)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ENEIDA PINO (Identificada como la vivienda #101)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARLENIS BELTRAN (Identificada como la vivienda #102)



Ilustración 28 Levantamiento de estructura metálica de la vivienda.

13.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NOLVIS ZAMBRANO (Identificada como la vivienda #103)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CELSA CASERES (Identificada como la vivienda #104)



Ilustración 29 Levantamiento de estructura metálica.

13.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CRISTO HUMBERTO THOMAS (Identificada como la vivienda #105)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZ ZULETA (Identificada como la vivienda #106)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA ALEJANDRA GARCIA (Identificada como la vivienda #107)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA GUETTE (Identificada como la vivienda #108)



Ilustración 30 Vaciado de concreto de cimentaciones.

13.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANGELICA CAÑIZARES (Identificada como la vivienda #109)



Ilustración 31 Excavaciones.



Ilustración 32 Vaciado de concreto de cimentaciones.

13.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ESMERALDA CORDOBA (Identificada como la vivienda #110)



Ilustración 33 Excavaciones en la vivienda.

13.2.33. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA GONZALEZ (Identificada como la vivienda #111)



Ilustración 34 Vaciado de concreto de cimentaciones.

13.2.34. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MIRIAN ABRIL (Identificada como la vivienda #112)

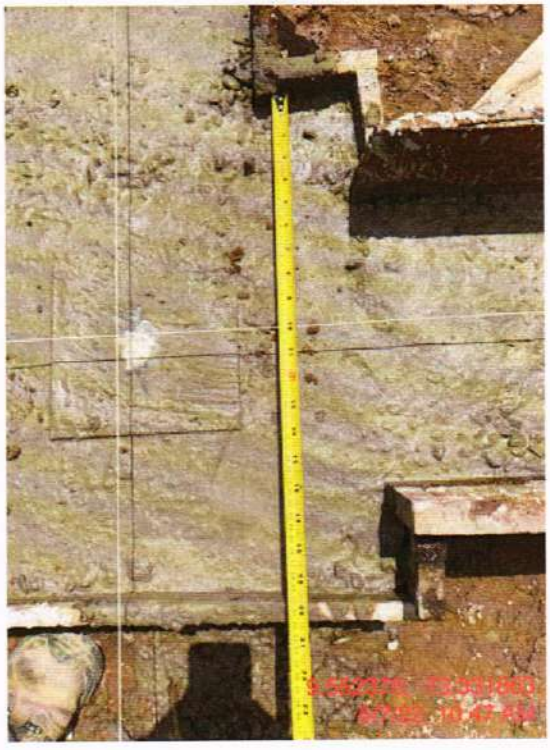


Ilustración 35Vaciado de concreto de cimentaciones.

13.2.35. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria VIRGINIA MORA (Identificada como la vivienda #113)



Ilustración 36 Excavaciones en el lote.

13.2.36. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LESLIE CAROL SANCHEZ RIVAS (Identificada como la vivienda #114)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de junio.

13.2.37. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MENY NIETO (Identificada como la vivienda #115)

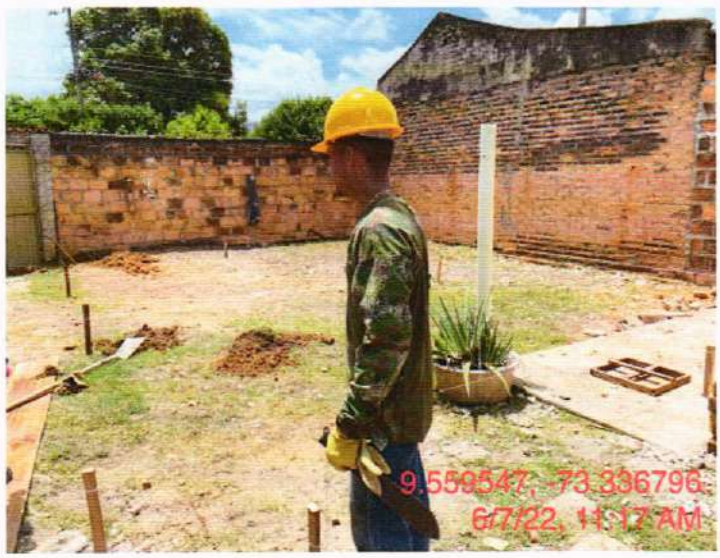


Ilustración 37 Trazado de la vivienda.



Ilustración 38 Entablado y armado de las cimentaciones.

14. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

14.1. Chequeo de trazados.

Una vez trazado todo el esquema correspondiente a las cimentaciones, se chequean las medidas entre ejes y la escuadra del trazado.



Ilustración 39 Chequeo de trazados.

14.2. Chequeo de dimensiones y niveles en cimentaciones.

Una vez fundidas las cimentaciones, se chequea que las vigas y zapatas cumplan con las dimensiones especificadas y con los niveles adecuados.



Ilustración 40 Chequeo de cimentaciones.

14.3. Chequeo de acero de refuerzo de cimentaciones.

Previamente a fundir las cimentaciones se chequea que el acero de refuerzo puesto para las mismas sea el especificado. Revisando diámetros, traslapos y todo lo relacionado con el tema.



Ilustración 41 Chequeo de acero de refuerzo.

14.4. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:

14.5. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.

Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.



14.6. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.


Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 42 Chequeo de mampostería.

14.7. Chequeo de refuerzo de mampostería.

Se revisa y garantiza que en el levantamiento de muros este presente el refuerzo de una varilla de ¼" cada dos hiladas.

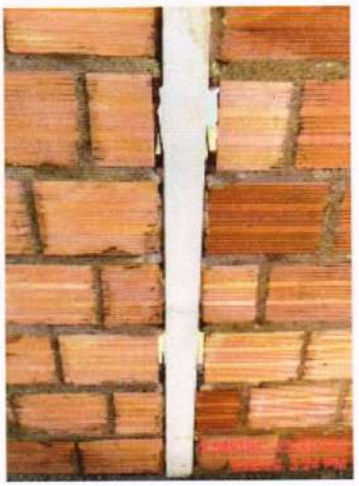

14.8. Chequeo de tapones de estructuras metálicas.

Una vez levantadas las estructuras metálicas, se verifica que se coloquen los tapones en los lugares donde se requiera para evitar la infiltración de agua al interior de los perfiles metálicos.

14.9. Chequeo de nivel de plantilla.

Una vez fundida la plantilla de las viviendas, se chequea que la altura libre hasta la viga sea la correcta.



Ilustración 43 Chequeo de altura libre.

14.10. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio.

- Anexos

15. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles junior resistencia a las bases de la vivienda:

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.
- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.
- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

16. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

16.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: EDUARDO CAYON
- Inspector de Obra: RAMIRO SEGUNDO DE LA HOZ OROZCO, C.C:1.081.913.176
- Residente de obra: Dairo Pimienta

Tabla 10. Personal activo en el mes de junio 2022.

LISTADO DEL PERSONAL DE VIVEURB ACTIVO MES DE JUNIO	
NOMBRES	CEDULA
JAVITH BUSTAMANTE ROMERO	77.167.877
JESUS ANDRES TURBAY OSPINO	1.079.659.212
JAVIER MORALES VIÑA	13.499.010
WILMER JOSE ESTRADA	1.063.593.203
FERNEL LOPEZ SUAREZ	18.974.763
EPIMENIO HERRERA DITTA	85.440.724
YAINER CARABALLO	5.164.672.
JOSE ENRIQUE CAMAÑO ARGOTE	12.521.843
FERNANDO RAPALINO HERNANDEZ	12.521.642
JUAN ERNESTO ARIAS CABARCAS	1.064.121.822
HECTOR ENRIQUE PINEDA	1.064.120.718
JAVIER PIMIENTA RADA	1.079.655.084
MEDARDO JESUS SIERRA	1.063.287.421
EDWIN JOSE VEGA MOJICA	1.064.109.526
IVAN JOSE ANGULO MENDOZA	1.006.854.125
DANIEL RUDA JIMENEZ	1.065.586.802
DUVAN FLOREZ GUZMAN	1.003.291.192
RUBEN DARIO GAMEZ	19.600.678
JUAN JOSE ANGULO MENDOZA	1.068.348.049
YORQUIS JOSE MORALES	8,3657E+14
ALVEIRO GUZMAN FLOREZ	1.003.291.188
DAIMER NAVARRO NAVARRO	1.128.150.086
JUAN ADRES ARIAS CABARCAS	1.064.123.135
LUIS ATENCIO	5.893.028
YEISER ARLEY VASQUEZ	1.063.490.774
LEOPOLDO ALVAREZ	88.138.160
JORGE ARICHARICO	
EDINSON PABA CLAVIJO	1.064.109.835
STIVEN CALDERON FLOREZ	1.193.534.100

16.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoría: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoría: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS.

En el mes de mayo de 2022 se protocolizaron 20 viviendas adicionales a las 52 viviendas ya protocolizadas, una vez revisadas y recibidas por interventoría, comfacesar y la alcaldía municipal. En total, los 72 beneficiarios que han recibido ya su vivienda por parte del municipio son los siguientes:

Tabla 11. Relación de viviendas protocolizadas.

No. Vivienda	BENEFICIARIO	BARRIO	ESTADO	No. DE ENTREGA
1	EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
2	YARELYS CUBILLOS ARDILA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
3	CRISTO HUMBERTO RIOS	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
4	MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
5	YORAIMA POLO ROJANO	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
6	JOSE DAVID URRUTIA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
7	VIVIANA MENDIBIL GUEVARA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
8	MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
9	RUTH MARINA PEREZ RAMOS	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
10	JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
11	DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
12	MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
13	YENIFER ARRIETA BUSTOS	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
14	ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
15	YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
16	LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
17	MILEIDYS YONARIS RAMIREZ MENDOZA	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
18	LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
19	JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
20	ANYLUZ DAZA CARREÑO	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
21	JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
22	LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
23	LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
24	OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
25	ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
26	CARMEN ALICIA GARCIA RODRIGEZ	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
27	CECILIA RIOS RAVELO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
28	INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1

29	DIANA CAROLINA SUAREZ USMA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
30	DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
31	LUCINDO MONTERO SALDAÑA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
32	MARIA DELFINA MENDOZA LLANES	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
33	ORLANDO NIETO TORRES	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
34	JORGE ENRIQUE GELVIS	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
35	TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	2
36	ANGELICA MARIA CARO GOMEZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	2
37	CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
38	MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
39	TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ ARENGAS	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
40	WILMER CARO GOMEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
41	KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
42	LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
43	EDILSON PEDROZA ROBLES	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
44	EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
45	GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
46	MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
47	RUBY SANCHEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	3
48	HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	3
49	BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	3
50	NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
51	ALBA YASMIN CRUZ PAEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
52	CONSUELO BALLENA CLAVIJO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	3
53	ESPERANZA ISABEL BELEÑO DELGADO	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
54	MELIZA PADILLA MANCERA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
55	MINELLIS CECILIA MARTINEZ MEJIA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
56	AMALIA MORA ARDILA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
57	ANA MERCEDES HURTADO GALVAN	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
58	DENIS CECILIA JIMENEZ HURTADO	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	4
59	CARMEN ELENA VEGA TORRES	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
60	CINDY PAOLA JIMENEZ LUGO	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
61	LILIBETH MARTINEZ VEGA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
62	YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	4
63	ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
64	WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	4
65	YANIS MABEL THOMAS SAMPAYO	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
66	LINA MARCELA SANCHEZ IGUARAN	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
67	ANA MERCEDES DAMIAN ABRIL	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	4
68	LEUBITH JUDITH RAMOS MELENDEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4

69	ROSA ELENA PEREZ ESTRADA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
70	JESUS ALBERTO PEREZ REAL	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
71	LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
72	LEOMAR YIGETH VILLAREAL PERTUZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS

A lo largo de la ejecución del proyecto se han realizado diversas modificaciones a lo establecido en los planos por distintas razones. Ya sea por las condiciones únicas de la ubicación del lote de cada beneficiario, por facilidad y junior seguridad o por incongruencias que se han encontrado en los diseños establecidos.

Las modificaciones que se han realizado a lo largo del proyecto son las siguientes:

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS

En la ejecución del proyecto se presentaron viviendas en las cuales la estructura metálica se levantó con columnas unidas mediante cordones de soldadura y en todas las viviendas se han utilizado flanches (los cuales transmiten la carga de las columnas a las cimentaciones) con soportes de varillas de 3/8' corrugadas soldadas por debajo del elemento, en vez de utilizar un sistema apernado. Ante lo cual, el municipio manifestó su preocupación, por lo que el contratista decidió solicitar el concepto de un ingeniero especialista en estructuras para aclarar si era necesario cambiar estos elementos o su funcionamiento sigue cumpliendo su propósito bajo las condiciones dadas. Dicho concepto fue revisado por interventoría y por COMFACESAR los cuales le otorgaron validez.

- Anexo. Concepto estructural con anexo de aprobación interventoría y COMFACESAR.

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- El día 3 de junio se suspendieron las actividades en obra por fuertes lluvias en horas de la tarde. Se perdieron **4** horas de trabajo.
- El día 8 de junio se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche lo cual afecto las excavaciones realizadas previamente. Debido a esto, se perdieron **3** horas de trabajo en readecuaciones.
- El día 9 de junio se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche lo cual afecto las excavaciones realizadas previamente. Debido a esto, se perdieron **3** horas de trabajo en readecuaciones.
- El día 14 de junio se suspendieron las actividades en obra por fuertes lluvias en horas de la tarde. Se perdieron **3** horas de trabajo.
- El día 17 de junio se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche lo cual afecto las excavaciones realizadas previamente. Debido a esto, se perdieron **3** horas de trabajo en readecuaciones.
- El día 21 de junio se suspendieron las actividades en obra por fuertes lluvias en horas de la mañana. Se perdieron **4** horas de trabajo.
- El día 24 de junio se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche lo cual afecto las excavaciones realizadas previamente. Debido a esto, se perdieron **3** horas de trabajo en readecuaciones.
- El día 30 de junio se suspendieron las actividades en obra por fuertes lluvias a la 1:00PM. Se perdieron **4** horas de trabajo.

En total, en el mes de junio se perdieron **27 horas** de trabajo.

En total, desde que inició el proyecto hay un total de **335** horas perdidas por fuerza junior.

MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA

GERENTE GENERAL

ANEXOS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23572417
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-06-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900847519	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ D CASA 16 A ACUARELA	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ASSII.SAS@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	5901199
FAX	3187074001	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	56059395	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$14.600.000		23572417

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1234092953	01	No	No	No	20	1	Fijo	BENJUMEA SERRANO GUSTAVO ANDRES	$2.800.000
CC-1065832979	01	No	No	No	20	1	Fijo	CASTRO FONSECA MARCO TULIO	$2.500.000
CC-56059395	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	$2.500.000
CC-1140894816	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ MILIAN VENUS YORANGEL	$2.800.000
CC-17955822	01	No	No	No	20	1	Fijo	SOLANO GONZALEZ DANFOR DAVID	$3.000.000
CC-49606791	01	No	No	No	20	1	Fijo	SOLANO GONZALEZ KELYS SUGEIS	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1234092953																													0		
CC - 1065832979																													0		
CC - 56059395																													0		
CC - 1140894816																													0		
CC - 17955822																													0		
CC - 49606791																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1234092953	COLPENSIONES	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 1065832979	PORVENIR	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 56059395	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1140894816	PORVENIR	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 17955822	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 49606791	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1234092953	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	5	0.0696000	$194.900
CC - 1065832979	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5	0.0696000	$174.000
CC - 56059395	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5	0.0696000	$174.000
CC - 1140894816	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	5	0.0696000	$194.900
CC - 17955822	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0052200	$15.700
CC - 49606791	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1234092953	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065832979	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-56059395	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1140894816	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17955822	COMFACESAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-49606791	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1.328.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.328.000
PORVENIR	3	$1.008.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.008.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$220.000	$0	0	$0	0	$0	$220.000	0	$0	$0	$220.000	$0	0	$0	$0	$220.000	$0	$0	$220.000
SANITAS	2	$224.000	$0	0	$0	0	$0	$224.000	0	$0	$0	$224.000	$0	0	$0	$0	$224.000	$0	$0	$224.000
SALUD TOTAL	2	$140.000	$0	0	$0	0	$0	$140.000	0	$0	$0	$140.000	$0	0	$0	$0	$140.000	$0	$0	$140.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$823.100	0	$0	$0	$823.100	0	$0	$823.100	0	$0	$0	$823.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	6	$584.000	0	$0	$584.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$584.000
PENSIONES	2	$2.336.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$823.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$584.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.327.100

A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23771019
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-07-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGENIERO ENUAR OSPINO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1045718578	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 N 10 22	DEPARTAMENTO	MAGDALENA	MUNICIPIO	CHIBOLO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ENUAROSPINO14@GMAIL.COM	TELÉFONO	1234567
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
48		$43.866.674		23771019

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-77104760	01	No	No	No	20	400	Fijo	ACOSTA NIETO ALFREDO	$1.000.000
CC-88138160	01	No	No	No	20	400	Fijo	ALVAREZ CAMPO LEOPOLDO	$1.000.000
CC-1006854125	01	No	No	No	20	400	Fijo	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	$1.000.000
CC-1068348049	01	No	No	No	20	400	Fijo	ANGULO MENDOZA JUAN JOSE	$1.000.000
CC-12510294	01	No	No	No	20	400	Fijo	ANICHARICO JORGE	$1.000.000
CC-1064123135	01	No	No	No	20	400	Fijo	ARIAS CABARCAS JUAN ANDRES	$1.000.000
CC-1064121822	01	No	No	No	20	400	Fijo	ARIAS CABARCAS JUAN ERNESTOR	$1.000.000
PT-5893028	01	No	No	No	20	400	Fijo	ATENCIO URDANETA LUIS VENANCIO	$1.000.000
CC-1064796350	01	No	No	No	20	400	Fijo	BELENO DE LA HOZ NOLIS	$1.000.000
CC-12524538	01	No	No	No	20	400	Fijo	BOLAÑO GARCIA RICHARD	$1.000.000
CC-77167877	01	No	No	No	20	400	Fijo	BUSTAMANTE ROMERO JAVIT	$1.000.000
CC-12521843	01	No	No	No	20	400	Fijo	CAMAÑO ARGOTE JOSE ENRIQUE	$1.000.000
CC-5164672	01	No	No	No	20	400	Fijo	CARABALLO MOSCOTE YAINER	$1.000.000
PT-5818159	01	No	No	No	20	400	Fijo	CONTRERAS CONTRERAS JOSE GREGORIO	$1.000.000
PT-5418953	01	No	No	No	20	400	Fijo	CORTEZ CAMARILLO JESUS	$1.000.000
CC-1193114032	01	No	No	No	20	400	Fijo	DE CASTRO ACUÑA BRAINER JOSE	$1.000.000
CC-1081913176	01	No	No	No	20	400	Fijo	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	$1.000.000
CC-19604771	01	No	No	No	20	400	Fijo	DELGADO VILLA HENRY JOSE	$1.000.000
CC-12685229	01	5	No	No	20	400	Fijo	DOMINGUEZ DE LA CRUZ ONOBYS ISAIAS	$1.000.000
CC-1063593203	01	No	No	No	20	400	Fijo	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	$1.000.000
CC-1003291188	01	No	No	No	20	400	Fijo	FLOREZ GUZMAN ALVEIRO	$1.000.000
CC-1003291192	01	No	No	No	20	400	Fijo	FLOREZ GUZMAN DUVAN	$1.000.000
CC-19600678	01	No	No	No	20	400	Fijo	GAMEZ BENAVIDEZ RUBEN DARIO	$1.000.000
CC-19518574	01	No	No	No	20	400	Fijo	GUETTE GARCIA JESUS RAFAEL	$1.000.000
CC-85440724	01	No	No	No	20	400	Integral	HERRERA DITTA EPIMENIO	$1.000.000
CC-5074902	01	No	No	No	20	400	Fijo	JIMENEZ BELTRAN DOMINGO ANTONIO	$1.000.000
CC-77104806	01	No	No	No	20	400	Fijo	LOPEZ RAVELO YOHON JAIRO	$1.000.000
CC-18974763	01	No	No	No	20	400	Fijo	LOPEZ SUAREZ FERNEL	$1.000.000
CC-1064113796	01	No	No	No	20	400	Fijo	MARIN RIOS RICARDO ANDRES	$1.000.000
CC-1064121698	01	No	No	No	20	400	Fijo	MEJIA OSPINO JORGE ROMARIO	$1.000.000
CC-19516430	01	No	No	No	20	400	Fijo	MEJIA RAMOS FRANCO LUIS	$1.000.000
CC-1064789296	01	No	No	No	20	400	Fijo	MOJICA ROMERO YURI JOSE	$1.000.000
PE-836570022061979	01	No	No	No	20	400	Fijo	MORALES YORQUIS JOSE	$1.000.000
CC-13499018	01	No	No	No	20	400	Fijo	MORALES VIÑAS JAVIER	$1.000.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1128150086	01	No	No	No	20	400	Fijo	NAVARRO NAVARRO DAIMER	$1.000.000
CC-1085225934	01	No	No	No	20	400	Fijo	NAVARRO NAVARRO FERNANDO	$1.000.000
CC-1079655084	01	No	No	No	20	400	Fijo	PIMIENTA RADA JAVIER DE JESUS	$1.000.000
CC-1004092782	01	No	No	No	20	400	Fijo	PIMIENTA SIERRA DAIRO	$1.000.000
CC-1064120798	01	No	No	No	20	400	Fijo	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	$1.000.000
CC-1127659584	01	No	No	No	20	400	Fijo	QUINTERO MORENO DAVID ANTONIO	$1.000.000
CC-12521642	01	No	No	No	20	400	Fijo	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	$1.000.000
CC-12522725	01	No	No	No	20	400	Fijo	RIOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	$1.000.000
CC-77105958	01	No	No	No	20	400	Fijo	ROBLES PACHECO JHONATAN JOSE	$1.000.000
CC-1065586802	01	No	No	No	20	400	Fijo	RUDA JIMENEZ DANIEL DE JESUS	$1.000.000
CC-1063287421	01	No	No	No	20	400	Fijo	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	$1.000.000
CC-1079659212	01	No	No	No	20	400	Fijo	TURBAY OSPINO JESUS ANDRES	$1.000.000
CC-1063490774	01	No	No	No	20	400	Fijo	VASQUEZ RAMOS YEISER ARLEIS	$1.000.000
CC-1064109526	01	No	No	No	20	400	Fijo	VEGA MOGICA EDWIN JOSE	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 77104760																													0		
CC - 88138160	X	2022-05-18																											0		
CC - 1006854125																													0		
CC - 1068348049																													0		
CC - 12510294	X	2022-05-18																											0		
CC - 1064123135																													0		
CC - 1064121822																													0		
PT - 5893028	X	2022-05-18																											0		
CC - 1064796350			X	2022-05-25																									0		
CC - 12524538	X	2022-05-01	X	2022-05-25																									0		
CC - 77167877																													0		
CC - 12521843																													0		
CC - 5164672																													0		
PT - 5818159																													0		
PT - 5418953			X	2022-05-25																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1193114032																													0		
CC - 1081913176																													0		
CC - 19604771																													0		
CC - 12685229	X	2022-05-18																											0		
CC - 1063593203																													0		
CC - 1003291188																													0		
CC - 1003291192																													0		
CC - 19600678																													0		
CC - 19518574																													0		
CC - 85440724																													0		
CC - 5074902	X	2022-05-01																											0		
CC - 77104806																													0		
CC - 18974763																													0		
CC - 1064113796			X	2022-05-25																									0		
CC - 1064121698																													0		
CC - 19516430			X	2022-05-25																									0		
CC - 1064789296																													0		
PE - 836570022061979																													0		
CC - 13499018																													0		
CC - 1128150086																													0		
CC - 1085225934																													0		
CC - 1079655084																													0		
CC - 1004092782																													0		
CC - 1064120798																													0		
CC - 1127659584																													0		
CC - 12521642																													0		
CC - 12522725			X	2022-05-25																									0		
CC - 77105958																													0		
CC - 1065586802																													0		
CC - 1063287421																													0		
CC - 1079659212																													0		
CC - 1063490774	X	2022-05-18																											0		
CC - 1064109526																																

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 77104760	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 88138160	PROTECCION	13	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1006854125	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1068348049	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12510294	COLPENSIONES	13	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1064123135	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1064121822	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
PT - 5893028	PROTECCION	13	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1064796350	PORVENIR	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 12524538	PORVENIR	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 77167877	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12521843	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 5164672	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
PT - 5818159	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
PT - 5418953	PORVENIR	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 1193114032	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1081913176	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 19604771	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12685229	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1063593203	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1003291188	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1003291192	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 19600678	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 19518574	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 85440724	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 5074902	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 77104806	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 18974763	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1064113796	PORVENIR	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 1064121698	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 19516430	PROTECCION	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 1064789296	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
PE - 836570022061979	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13499018	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1128150086	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1085225934	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1079655084	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1004092782	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1064120798	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1127659584	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12521642	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12522725	COLPENSIONES	25	$833.334	0.1600000	$133.400	$0	$0	$133.400	$0	$0	$0
CC - 77105958	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1065586802	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1063287421	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1079659212	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1063490774	PROTECCION	13	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1064109526	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 77104760	COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 88138160	FAMISANAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	13	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1006854125	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1068348049	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 12510294	EPS-S COOSALUD	13	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	13	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1064123135	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1064121822	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
PT - 5893028	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	13	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1064796350	SALUD TOTAL	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12524538	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100
CC - 77167877	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 12521843	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 5164672	ESSC ASMET SALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
PT - 5818159	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
PT - 5418953	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100
CC - 1193114032	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1081913176	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 19604771	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 12685229	SALUD TOTAL	13	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	13	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1063593203	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1003291188	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1003291192	EPS-S CAJACOPI	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 19600678	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 19518574	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 85440724	EPS-S CAJACOPI	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 5074902	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 77104806	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 18974763	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1064113796	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1064121698	ESSC ASMET SALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 19516430	EPS-S CAJACOPI	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100
CC - 1064789296	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
PE - 836570022061979	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 13499018	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1128150086	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1085225934	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1079655084	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1004092782	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1064120798	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1127659584	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 12521642	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 12522725	ESSC ASMET SALUD	25	$833.334	0.0400000	$33.400	$0	0	$0	0	$0	25	$833.334	1	0.0696000	$58.100
CC - 77105958	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1065586802	EPS-S CAJACOPI	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1063287421	SALUD TOTAL	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1079659212	EPS-S COOSALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600
CC - 1063490774	SALUD TOTAL	13	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	13	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1064109526	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0696000	$69.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-77104760	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88138160	COMFACESAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006854125	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1068348049	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12510294	COMFACESAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064123135	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064121822	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5893028	COMFACESAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064796350	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12524538	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77167877	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12521843	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5164672	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5818159	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5418953	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193114032	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081913176	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19604771	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12685229	COMFACESAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063593203	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003291188	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003291192	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19600678	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-19518574	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-85440724	COMFACESAR	30	$700.000	0.0400000	$28.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5074902	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77104806	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18974763	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064113796	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064121698	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19516430	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064789296	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PE-836570022061979	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13499018	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1128150086	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085225934	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079655084	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004092782	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064120798	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127659584	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12521642	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12522725	COMFACESAR	25	$833.334	0.0400000	$33.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77105958	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065586802	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063287421	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079659212	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063490774	COMFACESAR	13	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064109526	COMFACESAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	4	$640.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$640.000
PROTECCION	10	$1.301.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.301.600
COLPENSIONES	4	$522.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$522.800
PORVENIR	29	$4.533.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.533.600
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S CAJACOPI	4	$153.400	$0	0	$0	0	$0	$153.400	0	$0	$0	$153.400	$0	0	$0	$0	$153.400	$0	$0	$153.400
SALUD TOTAL	10	$348.200	$0	0	$0	0	$0	$348.200	0	$0	$0	$348.200	$0	0	$0	$0	$348.200	$0	$0	$348.200
FAMISANAR	3	$97.400	$0	0	$0	0	$0	$97.400	0	$0	$0	$97.400	$0	0	$0	$0	$97.400	$0	$0	$97.400
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$330.800	$0	0	$0	0	$0	$330.800	0	$0	$0	$330.800	$0	0	$0	$0	$330.800	$0	$0	$330.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	$346.800	$0	0	$0	0	$0	$346.800	0	$0	$0	$346.800	$0	0	$0	$0	$346.800	$0	$0	$346.800
COOSALUD	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
EPS-S COOSALUD	8	$297.400	$0	0	$0	0	$0	$297.400	0	$0	$0	$297.400	$0	0	$0	$0	$297.400	$0	$0	$297.400
ESSC ASMET SALUD	3	$113.400	$0	0	$0	0	$0	$113.400	0	$0	$0	$113.400	$0	0	$0	$0	$113.400	$0	$0	$113.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	48	$3.074.800	0	$0	$0	$3.074.800	0	$0	$3.074.800	0	$0	$30.748	$3.074.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	48	$1.755.400	0	$0	$1.755.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	9	$1.767.400
PENSIONES	5	$6.998.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.074.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.755.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.595.600

A3- PÓLIZAS CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR
VALLEDUPAR
CESAR
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0046620 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR
CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
: 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCGO07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGO05-000I

Berkley Colombia Seguros
La Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Linea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

VIGILADO

OMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

CJP189

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGO05-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CJ 0189.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGG05-0001

A4- PÓLIZAS INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.080 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 999595/4361 LA 14 Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario

Carulla éxito Gana Gana CODISCOPOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101520061730 5(3900)0000006888139(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061730-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.847.519-0
DIRECCIÓN: MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO: 3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR		NIT: 892.399.989-8
DIRECCIÓN: CARRERA 9 NRO.16 A 48	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO 5857777
BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 089 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSI-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ ******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-40-101005082

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0	MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8	CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 9595964361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101520061732 1 (3900) 000000453677 (96) 20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

A5- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Abril de 2020	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN.....	4
1	INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.....	5
2	OBJETIVOS.....	8
3	ALCANCE.....	8
4	DEFINICIONES.....	8
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S.....	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.....	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA.....	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S	16
9	MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION EN INTERVENTORÍAS.....	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS....	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS.....	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora "ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoría Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoría de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoría con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoría que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoría.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

jornada, incluyendo los traslados.

- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoría.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoría y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoría que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoría.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoría en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**, proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoría
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoría
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoría se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoría
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoría se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoría

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehículo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoría se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoría

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoria para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorías y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoría, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoría (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoria se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoría

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

reportarán al director de interventoría y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
  19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoría, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.

- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.

- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoría con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoría avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoría, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
  seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
  generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
  organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoría descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoría en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoría para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoría.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoría, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoría.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Gerente Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

A6- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

LA JAGUA DE IBIRICO,
JUNIO 2021.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Junio 2021	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	4
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	5
2	OBJETIVOS	8
3	ALCANCE	9
4	DEFINICIONES	9
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DEL CONSORCIO VIVIENDA VIVEURB 2021	16
9	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS	26

98
Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de
bioseguridad de la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2020", ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

99
Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	901.481.526 - 3
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	5901119
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Cayón Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas	V

1.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar

Actualmente se encuentra adelantando obras de construcción de 271 soluciones de viviendas del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado "CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDAS URBANA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m, para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la obra.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la obra.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y desinfección.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de obra y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personaspositivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
- Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra.

1.4.6. Proveedor

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las obras en construcción por parte del CONSORCIO VIVEURB 2021, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo al decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de dos (2) carteleras informativa en el área de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse laboca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la obra se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Obra
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de obra
5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Obra
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y	Permanente	Supervisor de Obra

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.		
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Obra
5.14.	El vehículo operativo de la obra solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de obra
5.15.	En la obra se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Obra
5.16	Se dispondrá en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de obra
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST
5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la obra, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONAVIRUS y seráa quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la obra se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o cicias) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de obra

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- **CONSORCIO VIVEURB 2021** cumplirá con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19

7. La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algúntrabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
8. Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
9. Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la obra se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
10. Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
11. No se realizarán reuniones innecesarias en la obra, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
12. Los Supervisores y Líderes de Áreas en las obras garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
13. Los Líderes de Obras estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos, se comunicarán en la Re-inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re-inicio de las actividades en la obra.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar las actividades necesarias en la obra, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.
- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Obras y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se les informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

La totalidad de los trabajadores de CONSORCIO VIVERURB 2021, deben de implementar lassiguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DE CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias paraminimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de la obra se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a la obra

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se reportarán al director de obra y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.
- Todas las personas que ingresen a la obra deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de la Obra:

- Todo personal al salir de la obra debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.
- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentàr el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra.
- La entrega de información será efectuada por el director de la de obra, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.
- Cada zona de la obra contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la obra con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la obra avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.
- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.
- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de obra, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.
- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA OBRA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Obra, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología
- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo
- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de CONSORCIO VIVEURB 2021, se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN OBRA Y ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas a seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la obra descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de obra en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.
- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a obra para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la obra.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de obra, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la obra a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de obra.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** Luis Eduardo Cayón Medina MP N° 25202-280053 CND
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Firma Fecha: Junio de 2021	Representante Legal Firma: Fecha: Junio de 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A7- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.,** en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.,** in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ACREDITADO ONAC
ANSI

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. — **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado / *Certificate*: **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: / *Approval Date:* **2013-09-27** — **Fecha Última Modificación:** / *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: / *Renewal Date:* **2016-08-17** — **Fecha de Vencimiento:** / *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	**Consecutivo Nº:**	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	**Remisión:**	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	**Cliente:**	HIERROS HB S.A-SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmX6m	**N° Orden:**	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, min.
50	0,25	1,35	0,035	0,04	275	380	16

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000318391
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA)

FECHA 26.02.2021
PAG. 1 DE 1

MATERIAL: 110941 - Metaltub N 100x100-4.0 6000 A500C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A500/NTC 4526 GRADO C

LOTE No	0006909195					
COLADA No	538407					
PESO	2.557,800 kg					
PORCENTAJE DE CARBONO	0,160 %					
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,880 %					
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,020 %					
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %					
LÍMITE ELÁSTICO	443 MPa					
RESISTENCIA MÁXIMA	602 MPa					
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	25 %					

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6829 - CEL. 300 810 17 92

Ingeniería civil

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:**	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACION DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	**LOCALIZACIÓN:**	
		COLOR:	ANARANJADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	**NOTA:**	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ma	Kg	3,534	3,604	3,621	3,572	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,506	6,501	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,210	0,236	0,245	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,30	11,82	12,34	11,96	11,78
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmáx	N	89600	83500	74500	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49381	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2897000	2942000	2908000	2893000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	198	200	195	196	198	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14611,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,61	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIT. 900891457-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

icontec
Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PLACAS ONDULADAS DE FIBRO CEMENTO

Fabricado por **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, en la **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

Manufactured by **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, in the **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4694 (2002)

Placas onduladas de fibrocemento para cubiertas y revestimientos

Fiber-cement corrugated sheets for covering and sheaating

SECTOR ICS 91.100.40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER326441
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2014-08-08	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2020-08-14
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2017-07-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2023-08-07

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID 4977
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ES-I-PD-04-F-001 Versión 1

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A8- AFILIACIÓNES DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

La empresa ***CONSORCIO VIVEURB 2021*** *identificada con Nit nro 901.481.526-3 con número de afiliación* ***9006465****, se encuentra afiliada con la ARL AXACOLPATRIA, desde el 07* ***de Julio*** *y que el personal relacionado a continuación se encuentra afiliado bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, según se describe a continuación:*

IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE INICIO	TASA DE RIESGO
12550976	CC	EDUARDO	JOSÉ	CAYON	MARQUEZ	7/07/2021	6,960%
15704553	CC	LUIS	ALBERTO	VERGARA	CARRASCAL	7/07/2021	6,960%
1065589300	CC	CLARA	INES	CAYON	OCHOA	7/07/2021	6,960%
1006105497	CC	ANDREA	CAROLINA	SANCHEZ	ROJAS	7/07/2021	6,960%
1065607433	CC	GILBERTO	ANTONIO	IBARRA	MEDINA	7/07/2021	6,960%

La presente se expide a solicitud de la empresa, a seis (06) días del mes de julio de 2021.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, con gusto será suministrada en nuestro centro de atención al cliente, 4235757 opción 4

Dirección Operativa
Administradora de Riesgos Laborales
AXA COLPATRIA
Elaborado por DIVE.

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliació
9006465 correspondiente a la empresa Consorcio Viveurb 2021.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal CONSORCIO VIVEURB 2021

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
DAIRO STIVEN PIMIENTA SIERRA	C.C.	1,004,092,782	16/12/2021	RIESGO V	6.960	CONSORCIO VIVEURB 2021

Cordialmente,

NANCY SEQUERA VERGARA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Wednesday December 15 2021 a las

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra linea nacional i en Bogotá 4235757.

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales des as fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase d iesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizant
C18974763	LOPEZ SUAREZ FERNEL	05/10/2021		u1954272	DEPENDIENT

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente codigo único de generación válido por un mes:C104571857822083611163

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su de
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERI

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de Riesgo 5, Porcentaje de cotización 6,96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C19518574	GUETTE GARCIA JESUS RAFAEL	19/01/2022		B1119627	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C104571857822095311150

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su di
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMER

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO EN JAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transaccion	Tipo Cotizante
C1005854125	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	05/10/2021		b4721924	DEPENDIENTE

Para verificar usted que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782209531190

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafi
importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:50.
Las inconsistencias relacionadas con la oportuna afiliación, bajas o novedades de retiro.

Línea de atención: 604 319 3727 *6 47 57

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ARL | sura

Medellin, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1003291192	FLOREZ GUZMAN DUVAN	05/10/2021		R1831271	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C104571857822095314442

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafili
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:44:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.16, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR [illegible] que su empresa ENMORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de [illegible] Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
[illegible]	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	05/10/2021		2038525	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C1025718572[illegible]

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafi
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICA

VIGILADO SUPERSALUD

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:14
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.188.193.239, 192.230.184.19, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 05 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENOAR que se encuentra EN MORA

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
Z83657002206 1979	MORALES YORQUIS	06/04/2022		199e3835	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado es válido para fechas de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafilia
La información del contenido en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:55:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.153.239, 192.230.164.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 05 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Codigo de transacción	Tipo Cotizante
[illegible]	[illegible] PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotizacion:	6,96 %	
[illegible]	CORTEZ JESUS	06/04/2022		9113745*	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafi
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICA

[illegible] de datos el 05/04/2022 08:52:05 .

[illegible] para coberturas pendientes de retiro

[illegible] 104.10, 172.16.42.97

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desc
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR
OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase d
riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizant
C1066054125	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	05/10/2021		b4721924	DEPENDIEN

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes.C104571857822095311 90

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SUR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ [illegible] que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1085225934	NAVARRO NAVARRO FERNANDO	06/04/2022		206LF184	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desaf
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERIC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:41:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR [illegible] que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de [illegible] con un [illegible] de cotización 6,96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1063593203	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	05/10/2021		18821113	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C104571857822095314 36

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A, así como para su des
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERIC

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:43:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

[illegible] de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA. Clase de riesgo: I, Porcentaje de cotización 6,96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
[illegible]	05/10/2021		R1831271	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782209531442

Atentamente,

[illegible] de Afiliaciones y Recaudos

[illegible] afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su [illegible] validez para efectos de afiliación del trabajador puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAME[illegible]

[illegible] información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:44:02.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Bodega, 25 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1064127690	MEJIA OSPINO JORGE	15/03/2022		13344233	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí consignada es real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C10457185782209532951

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.

Esta información fue generada de la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 09:09:11.

Los empleadores con afiliados (*) con afiliados fechas indicadas.

Los empleadores con afiliados (**) con coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.239.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1120156066	NAVARRO NAVARRO DAIMER	06/04/2022		25322137	DEPENDIENTE

aall

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliac
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:37:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	05/10/2021		22917623	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782209531142

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su des
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERIC

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 14 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1064120798	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	09/03/2022		23014013	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782207373636

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafil
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/03/2022 20:27:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 08 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desc las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizant
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C12524538	BOLAÑO GARCIA RICHARD	09/03/2022		21214623	DEPENDIENT

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su d
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAME

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2022 20:56:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 14 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales de las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAI OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizar
C85440724	HERRERA DITTA EPIMENIO	05/10/2021		22825115	DEPENDIEI

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782207373626

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para :
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/03/2022 20:27:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 14 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064123135	ARIAS JUAN	15/03/2022		b149UX25	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su de
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERI

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/03/2022 20:23:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales des las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizan
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotizacion:		6.96 %
CC154472	CARABALLO YAINER	25/03/2022		21818118	DEPENDIEN

null

Atentamente,

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su impresion. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAM

Este certificado fue generado con la identidad registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:01:11

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes

Los trabajadores marcados con dos asteriscos (**) son cotizantes pensionados de retiro

Dirección IP: 191.109.153.239, 192.239.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C5074902	JIMENEZ BELTRAN DOMINGO ANTONIO	25/03/2022		134241W2	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su de
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMER

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:11:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000002 - PUEBLO PRIMERO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1193114032	DE CASTRO BRAINER	25/03/2022		210h2532	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C104571857822095299991

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:19:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 05 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
X5418953	CORTEZ JESUS	06/04/2022		9113745*	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliaci
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA :

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:52:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 05 de Abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1064121822	ARIAS CABARCAS JUAN	05/10/2021		20624496	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C10457185782209531146

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2022 08:39:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C5154672	CARABALLO YAINER	25/03/2022		21818118	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:01:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064109526	VEGA MOJICA EDWIN JOSE	25/03/2022		40v22747	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:02:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos astenscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C1063287421	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	25/03/2022		17517516	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:20:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA. Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12521843	CAMAÑO ARGOTE JOSE	05/10/2021		31124c23	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782208361376

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:02:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas. a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12522725	RIOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	05/10/2021		31220250	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782208364828

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:00:28.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 24 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C12521843	CAMAÑO ARGOTE JOSE	05/10/2021		31124c23	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782208365559

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafil
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:12:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064796350	BELENO NOLYS	25/03/2022		218201Yw	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:10:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C19600678	GAMEZ DARIO RUBEN DARIO	25/03/2022		14216510	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:02:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de Marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1065586802	RUDA JIMENEZ DANIEL	05/10/2021		17721223	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782208364854

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafil
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:00:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 PUEBLO PRIMERO		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1079659212	TURBAY JESUS	25/03/2022		216°2031	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:08:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1003291188	FLORES GUZMAN ALBEIRO	25/03/2022		HoEu2385	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliaci
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 17:58:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 PUEBLO PRIMERO		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1068346049	ANGULO MENDOZA JUAN JOSE	25/03/2022		19416518	DEPENDIENTE

nul

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación/ legalización. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 16:12:00
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pensionales de retiro

Dirección IP: 191.106.153.230, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 24 de marzo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 PUEBLO PRIMERO	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C77167877	BUSTAMENTE ROMERO JAVITH EMILIO	25/03/2022		254WA235	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliació
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2022 18:04:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.153.239, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

A9- BITACORA DE OBRA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

BITACORA DE OBRA.

Datos de la obra:

Objeto: Construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio.

Localización: Cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Contrato de Obra: No 088 de 2021.
Valor: $15.977.378.542.00.
Duración: Dieciocho (18) meses.
Fecha de inicio: Dieciocho (18) de Mayo de 2021
Fecha de conclusión: Dieciocho (18) de Noviembre de 2022

Datos del contratista:

Nombre: Consorcio Vivienda 2021 La Jagua de Ibirico
Dirección: Carrera 11 # 15 - 66 / Edificio Granaherrar / Oficina 505
Telefono: 5901119
Representante Legal: Luis Eduardo Cayón Medina.

Datos del interventor:
Nombre: ASSII - Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
Dirección: Manzana D Casa 16 A / Conjunto Cerrado Acuarela
Telefono: 3004403421
Gerente General: Maria Fernanda Perez Amaya.

Responsables de Obra:
Director de Obra: Jorge Luis Medina :
Residente de interventoria: Gustavo Andres Benjumea Serrano: Gustavo Benjumea
Residente de Obra: Luis Vergara :

Escaneado con CamScanner

Nota No.001 Fecha: 28/05/2021

Hoy, viernes 28 de mayo de 2021 siendo las 7:30am se da apertura a la bitacora de obra. En la cual se expondrá las actividades realizadas en la construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la zagura de Tamalameque, departamento del Cesar. Dicho proyecto tiene como meta contratada, el inicio y la finalización en un plazo no mayor a 18meses.

Gustavo Bayuelo

Nota No.002 Fecha: 28/05/2021

Con esta nota se hace constancia que entre las 8:00am y las 9:00am el contratista realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios del barrio Bello Horizonte. Donde, además, estuvieron presente representantes de la alcaldía municipal, el presidente de la junta de acción comunal y la interventoría.

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.003 Fecha: 31/05/2021
Personal del contratista, empezó a visitar a los beneficiarios en sus respectivos lotes propios a la altura de las 9:30am. Donde se les pide llenar un acta de poder para que COMFACESAR adelante el proceso de las escrituras del predio. Ademas, el contratista verifica que el lote cumpla con los requisitos, recolecta información general del lote y realiza las actas de vecindad correspondientes.
Cristian Bayona

Nota No.0004 Fecha 31/05/2021
El lote de la beneficiaria Maria Angelica Coro cumple con las dimensiones para la construcción de la vivienda. Sin embargo, la beneficiaria manifiesta que no quiere demoler una sección del predio correspondiente a cocina, habitación, baño y patio, debido que está construido en material. Lo que deja un area disponible para construir en el predio de 7,20m de ancho por 4.30m de fondo, lo que implicaría un nuevo diseño para esta vivienda en especifico.
Cristian Bayona

Nota No.0005 Fecha 01/06/2021
El vecino al este del beneficiario Eudaldo Escobar no permite el ingreso a los alcobas de su predio para la realización de las actas de vecindad.
Cristian Bayona


Nota No.0006 Fecha 02/06/2021
Con esta acta se hace constancia que a las 11:00 AM llegaron los materiales requeridos para empezar la construcción de la casa modelo. A la vez empezo el trabajo de nivelado del terreno el cual fue suspendido a las 2:00PM por lluvia.

Escaneado con CamScanner

Nota No 0007 Fecha: 04/06/2021

A las 10:00 AM inició la socialización con los beneficiarios del barrio El Progreso y al terminar se procedió a caracterizar a los beneficiarios en sus respectivos lotes. Donde se encontró que la beneficiaria Yudy Pamela cuenta con un lote que no cumple las dimensiones requeridas (En el Dibujo No 1 se plasman las dimensiones del lote). Por otro lado, el trazado en la casa modelo quedó listo y se iniciaron las excavaciones.

Gustavo Bayona

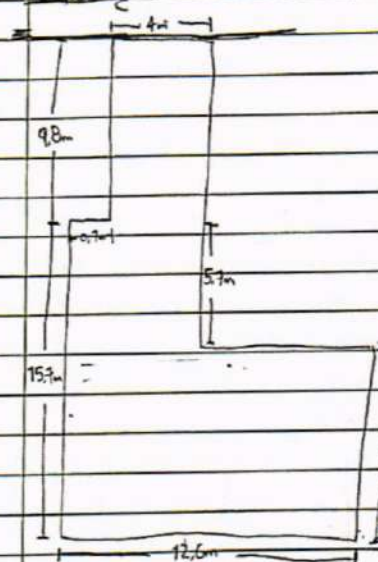

(Dibujo No 1. Lote de Yudy Pamela)

Nota No. 0008 Fecha: 09/06/2021 Estado del tiempo: Lluvia desde la 1:00PM hasta las 2:30 PM

A las 2:30 P.M. se inició a fundir el concreto correspondiente a las cimentaciones de la casa modelo. Una vez fundidas las medidas y niveles requeridos.

Gustavo Bayona

Nota No 0009 Fecha: 10/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores

Actividades: Corte del material correspondiente a las columnas, relleno de material excavaciones y trazados.

Gustavo Bayona

Nota No 0010 Fecha: 11/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores

Actividades: Trazados, Excavaciones, Rellenos.

Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No 0011 Fecha: 11/06/2021
se le realizó una charla de seguridad al personal en obra. Adicional se hizó entrega de cascos de seguridad, tapabocas, guantes tipo ingeniero, gafas de seguridad y todos en buen estado.
Gustavo Bonjemes

Nota No 0012 Fecha: 12/06/2021, Estado del tiempo: lluvia hasta las 3:30 pm
Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipos y herramientas: Volqueta, equipo soldadura, mezclador de concreto y herramientas menores.
Actividades: vaciado de cimentaciones y relleno de material
Gustavo Bonjemes

Nota No 0013 Fecha: 13/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 1 Cuadrilla
Equipos y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores.
Actividades: Instalación de perfiles metalicos.
Gustavo Bonjemes

Nota No 0014 Fecha: 15/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, Vibrocompactadores, herramientas menores
Actividades: Instalación de vigas metalicas, excavaciones manuales y compactación
Gustavo Bonjemes

Nota No. 0015 Fecha: 16/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipos y herramientas: Vibrocompactadores, Equipo de soldadura, trompo mezclador y herramientas menores
Actividades: En las horas de la mañana se nivela y compacta el lote del beneficiario Cristo Rios, se continua el proceso de soldadura de vigas metalicas, se culminaron detalles de soldadura en el refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las cimentaciones correspondientes a una vivienda.
Gustavo Bonjemes

Nota No 0016 Fecha: 16/06/2021,
Entre las 2:00pm y las 3:30pm no hubo fluido electrico en la zona de trabajo.
Gustavo Bonjemes

Escaneado con CamScanner

Nota No 0017	Fecha: 17/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, herramientas menores Actividades: Trazado y nivelación, soldadura y montaje de estructuras, vaciado de cimentaciones. Gustavo Bayona
Nota No 0018	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizó trazado y excavaciones en 3 viviendas y se hizo trabajo de montura de estructuras en 2 viviendas. Gustavo Bayona
Nota No 0019	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Lluvioso El trabajo en Obra fue suspendido a las 4:00PM por lluvia Gustavo Bayona
Nota No 0020	Fecha 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, volqueta, cava tanque, herramientas menores. Actividades: Se hizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se realizó trazado y excavaciones en 2 viviendas y se fundió una base de concreto ciclopeo en la vivienda del beneficiario Gusto Humberto, esto para el fin de tener un mejor soporte para las cimentaciones. Gustavo Bayona
Nota No 0021	Fecha 21/06/2021 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizaron trabajos de soldadura, trazado, nivelación y excavaciones. Gustavo Bayona
Nota No 0022	Fecha 22/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, volqueta, Mezclador de concreto y herramientas menores. Actividades: Se realizo trabajo de soldadura en 1 Vivienda, se fundieron las cimentaciones de 1 Vivienda y se adelantó trabajo de trazado y excavaciones en 2 Viviendas. Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0023 Fecha 23/06/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra; 5 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, taladro, mezclador de concreto y herramienta menor.
Actividades: Se realizó trabajo de trazado, nivelación y excavaciones en una vivienda, se fundió la cimentación de una vivienda, se realizó trabajo de soldadura en una vivienda y se inició la instalación del techo de la casa modelo.
Gustavo Bonjumea

Nota No. 0024 Fecha 24/06/2021
A partir de las 6:00AM iniciaron fuertes lluvias hasta las 7:30AM. A partir de ahí permanecía en zona de intensidad moderada hasta las 10:00AM. El resto del día permaneció parcialmente nublado.
Gustavo Bonjumea

Nota No. 0025 Fecha 25/06/2021
En la ubicación del lote de la beneficiaria Ana maciel arrieta. se presentó la señora Yesris Vera quien dice ser quien vendió ese lotes. La señora vera asegura que el lote de la beneficiaria esta corrido 1 metro hacia la derecha, por lo que la construcción de la vivienda esta invadiendo 1 metro del lote de la izquierda. que pertenecia al familiar fallecido Ana Maciel, quien seria su madre, luego de hablar con la beneficiaria y los hermanos se acordó que en la sucesión del lote el metro invadido será otorgado a la beneficiaria. Por lo que se decidio continuar con la construcción.
Gustavo Bonjumea

Nota No. 0026 Fecha 26/06/2021. Estado del tiempo: nublado. Personal en Obra: 5 cuadrillas
Equipo y herramientas: Herramientas menores y equipo de soldadura
Actividades: Se terminaron los preparativos en el lote de la beneficiaria Ana arrieta para fundir las cimentaciones y se inicio el trabajo de excavaciones en el lote de Luis Camargo. Mientras que en el lote de Jose Urrutia se inició la instalación de la estructura metalica.
Gustavo Bonjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No.0027 Fecha 28/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, herramienta menor,
Actividad: Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yaiana Martinez, Excavaciones
en la vivienda de Luis Camargo, Pega de bloques de mampostería en la
vivienda de Eudaldo Escobar, trazado en el barrio el progreso, relleno
en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez. Gustavo Bayuelo

Nota No.0028 Fecha 29/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, vibrocompactador,
herramientas menores y Taladro.
Actividad: Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Luis Camargo,
compactación en la vivienda de Mayra Silva, compactación y relleno en la
vivienda de Yaneima Polo, levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo
Escobar, levantamiento de estructuras en la vivienda de Yaiana martinez, pintura
de corrosa en la vivienda de Juan Diaz.
Gustavo Bayuelo

Nota No.0029 Fecha 30/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Herramienta menores, vibrocompactador, taladro
Actividad: Se continua con el levantamiento de muros en la casa modelo,
relleno y compactación en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez y se
realizaron la preparativos para fundir las cimentaciones en la vivienda
de Juan Perez.
Gustavo Bayuelo

Nota No.0030 Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra, 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar,
trazado en la vivienda de Mayra Silva, relleno en las viviendas de Mileidys Ramirez
y Madelaine Hernandez, Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Juan Perez.
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0031 Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones
El vaciado de las cimentaciones en la vivienda de Juan perez fue suspendido
a la 4:15PM por fuertes lluvias.
Gustavo Bayuelo

Nota No. 0032 Fecha 01/07/2021
Al rededor de las 4:30PM inició la socialización del barrio
Brisas del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para protegerse
de la lluvia. Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0033 Fecha 02/07/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores,
motocarro.
Actividades: Se termino de fundir las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez,
se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continuo
el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0034 Fecha 03/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramientas menores.
Actividades: Se inicio la instalación de la estructura metalica en la vivienda
de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la
vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria
Yenifer Arrieta para fundir cimentaciones. Gustavo Benjumea

Nota No. 0035 Fecha 06/07/2021. Estado del tiempo: Nublado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Taladro, herramientas menores
Actividades: Levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y
Yurelis Cabillo, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yenifer Arrieta,
trazado y excavaciones en la vivienda de Doris Martinez

Gustavo Benjumea

Nota No. 0036 Fecha 06/07/2021
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por racionamiento
a las 9:00 AM, se informa que volverá el servicio a las 5:00PM,
por lo que no se puede avanzar con los trabajos relacionados
con soldadura.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0037 Fecha 06/07/2021
Inició el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Horizonte, el
cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios

Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0038	Fecha: 07/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: se realizaron excavaciones en la vivienda de doris martinez y madelin hernandez, levantamiento de muros en las viviendas de yuris castillo y juan diaz y trazado en la vivienda de Andrey Rangel Cristian Bayonne
Nota No.0039	Fecha: 08/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, rolqueta, herramientas menores. Actividades: Excavaciones en la vivienda de Andrey Rangel, instalaciones de estructuras metalicas en la vivienda de yuris Granados, Pilotes en la vivienda de Madelin Hernandez y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Doris Martinez. Cristian Bayonne
Nota No.0040	Fecha: 09/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, herramientas menores Actividades: levantamiento de estructuras en la vivienda de Doris martinez, y, pilotes y instalación en la vivienda de Jorge Jimenez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Andrey Rangel, levantamiento de muros en la vivienda de Juan Diaz. Cristian Bayonne
Nota No.0041	Fecha: 10/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto, rolqueta y herramientas menores. Actividades: levantamiento de estructuras en la vivienda de Andrey Rangel, Excavaciones en la vivienda de Yuris Granados y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Madelenis Hernandez, la cual se suspendió para dar en el mezclador de concreto. Cristian Bayonne
Nota No.0042	Fecha: 12/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: rolqueta, equipo de soldadura, andamios, mezclador de concreto y herramientas menores. Actividades: se continuó con la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Andrey Rangel, con la fundición del concreto de cimentación en la vivienda de Madelene Hernandez, Pilotes, Compactación y trazado en la vivienda de Jorge Jimenez y levantamiento de muros en la vivienda de Carlos Rios Cristian Bayonne

Escaneado con CamScanner

Nota No.0043 Fecha: 12/07/2021.
Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Villa Esperanza a la altura de las 5:30PM
Gustavo Bayonne

Nota No.0044 Fecha: 13/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yuris Granados y Madelaine Hernandez, se rellenó y compactó el lote de Yoraima Polo y Nilidys Ramirez, excavaciones en la vivienda de Luz Jimenez y se continuó con el levantamiento de muros. Tambien, se fundió columneta sintpesa en la vivienda de Luz.
Gustavo Bayonne

Nota No.0045 Fecha: 14/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se realizaron las excavaciones en la vivienda de Nilidys Ramirez, Josefina Ortega y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luz Jimenez. De igual forma, se continuó con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0046 Fecha: 15/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Luz Jimenez y se avanzo en relleno de lotes y excavaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Nilidys Ramirez. Tambien se encontró que las tuberias de aguas residuales se estaban colocando de forma erronea. Se siguió avanzando el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0047 Fecha: 16/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Nilidys Ramirez, se avanzó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Josefina Ortega.
Gustavo Bayonne

Nota No.0048 Fecha: 17/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se avanzo en las excavaciones de la vivienda de Yoraima Polo y Oscar Roldan. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Roldan y se continuó avanzando con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No.0049 Fecha: 19/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se fundió un cabezal para que sirva de base para las cimentaciones de Yoraima Polo, se avanzo en relleno de lotes, levantamiento de muros y estructura.
Gustavo Bayonne

Escaneado con CamScanner

Nota No 0050	Fecha: 20/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranza en relleno de lotes, levantamiento de muros y se fundieron las zapatas en la vivienda de Yorsina Polo. Gustavo Bayona
Nota No. 0051	Fecha: 21/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranza en trabajos de relleno y compactación de lotes, se inicio el levantamiento de muros en la vivienda de Mayra Nidia y Ruth Perez. Tambien se inicio el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo, se encontró que el levantamiento de los muros no es el que corresponde a los planos, se preparo el lote de Luis Avila para ser fundido el dia siguiente, con excavaciones y refuerzos listos. Gustavo Bayona
Nota No. 0052	Fecha 22/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranzó el trabajo de relleno y compactación en el barrio Brisas del Norte, se arranzó el levantamiento de muros en las viviendas de Mayra Nidia, Jose Urrutia, Juan Diaz y Cristo Rios. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila. Gustavo Bayona
Nota No. 0053	Fecha: 23/07/2021 Se arranzó el trabajo de relleno, compactación y trazados en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Juan Gutierrez y se arranzó en el levantamiento de muros en las viviendas de Cristo Rios, Yirsina Mendivil, Mayra Nidia y Jose Urrutia Gustavo Bayona
Nota No. 0054	Fecha: 26/07/2021, Clima: Despejado El dia sabado 24 de julio se dejaron excavaciones arregladas y una estructura metalica mas alzada. Sin embargo, durante el fin de semana hubieron fuertes lluvias lo que daño las excavaciones y arreglados nuevamente incurre en medio dia de retraso aproximadamente. Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No.0055 Fecha: 26/07/2021. Clima: Despejado
Se arregló en trabajos de trazado, nivelación y excavación. El equipo de soldadura retomó estructuras ya levantadas para la instalación de los correas y se arregló en el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonea

Nota No.0056 Fecha: 26/07/2021
Mediante esta nota se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo José Cayon Marquez.
Gustavo Bayonea

Nota No.0057 Fecha: 27/07/2021
Se arregló en trabajos de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y la instalación de correas en estructuras faltantes. En el barrio Brisas del Norte se fundió como base de cimentaciones un concreto ciclopeo para dos viviendas. Adicionalmente se pintó con anticorrosivo las correas de algunas viviendas.
Gustavo Bayonea

Nota No.0058 Fecha: 27/07/2021
Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron el menos 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñada.
Gustavo Bayonea

Nota No.0059 Fecha: 28/07/2021, Clima: Despejado
Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Brisas del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de correas y levantamiento de muros en Brisas del Norte.
Gustavo Bayonea

Escaneado con CamScanner

Nota No.0060 Fecha: 29/07/2021, Clima: Lluvioso
Se arregló con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el trazado de una nueva vivienda, se arregló el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se entabló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.
Carlos Bayona

Nota No 0061 Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se arreglaba de igual forma en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.
Carlos Bayona

Nota No.0062 Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado
Este día sábado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de Brisas del Norte
Carlos Bayona

Nota No 0063 Fecha 02/08/2021, Clima: Despejado
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldaduras o levantamiento de muros. solo se adelantaron excavaciones y se entabló una vivienda del barrio Villa Esperanza.
Carlos Bayona

Nota No.0064 Fecha 03/08/2021, Clima: Lluvioso
Se continuó con trabajos de excavaciones y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias.
Carlos Bayona

Nota No.0065 Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado
se levantó la estructura metalica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban. Excavaban y entablaban otros 3 lotes del mismo barrio.
Carlos Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0060	Fecha: 29/07/2021, Clima: Nuriosa Se avanzó con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el traspaldo de una nueva vivienda, se avanzó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se entabló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio. Cristian Bayona
Nota No. 0061	Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se avanzaba de igual forma en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes. Cristian Bayona
Nota No. 0062	Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado Este día sabado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de brisas del Norte Cristian Bayona
Nota No. 0063	Fecha 02/08/2021, Clima: Despejado Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldaduras ni levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se entabló una vivienda del barrio Villa Esperanza. Cristian Bayona
Nota No. 0064	Fecha 03/08/2021, Clima: Nuriosa Se continuó con trabajos de excavaciones y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias Cristian Bayona
Nota No. 0065	Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado se levantó las estructuras metalicas en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban, Excavaban y entablaban otras 3 lotes del mismo barrio. Cristian Bayona

Escaneado con CamScanner

Acta N. 0067 Fecha: 05/08/2021. Clima Despejado
Se avanzó en la instalación de la red hidrosanitaria de las viviendas de Yarelis Castillo y Eudaldo Escobar, junto con la instalación de los aforos de la vivienda y la fundida de la losa del baño. Por otro lado, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Brisas del Norte y Construcción en Villa esperanza

Gaston Bayuelo

Acta N. 0068 Fecha: 06/08/2021 Clima: Lluvioso
Se empezaron a realizar las instalaciones eléctricas en las viviendas de Yarelis Castillo y Eudaldo Escobar, junto con el vaciado de concreto para la plantilla de las viviendas. También se avanza en trabajo de pelleteo y excavaciones de latas. Sin embargo, las actividades fueron suspendidas a las 2:30PM por fuertes lluvias.

Gaston Bayuelo

Acta N. 0069 Fecha: 07/08/2021, Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en la vivienda de Wilso Hornday y se levantaron estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte.

Gaston Bayuelo

Acta N. 0070 Fecha: 09/08/2021. Clima: Despejado
Se continuó la instalación de correas metálicas en estructuras del barrio el progreso y se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte.

Gaston Bayuelo

Acta N. 0070 fecha 10/08/2021 — Clima despejado.
→ en el día de hoy se presento manifestaciones por parte de la Comunidad, presidente de la Acciones Comunales de los Barrios Barrio Horizonte, 17 de febrero, villa esperanza donde alegan que el Consorcio vive veces no está Cumpliendo con el Compromiso de ofrecer trabajos a los habitantes del Sector ó Municipio de la Jagua, también manifiestan que los pactos entre el consorcio y los trabajadores

Escaneado con CamScanner

no es justo y dignos para ellos, tal el motivo ellos tomaron la decisión de parar todo tipo de trabajo de obra, que este realizando el Consorcio Vive Ver en los barrio Bello Horizonte y el progreso, Brisa del Monte, Villa esperanza al punto se llegue a una reunion entre las partes para Conciliar todas peticiones hechas por ellos.

Nota: el ing. eduardo Cayon les manifesto por vía telefonica que se realizara un acta donde ellos (comunidad) paran las obras por los motivos expuestos para así no Afectar la programacion y ejecución de las actividades, donde ellos no Aceptaron firmar ningun acta, pero manifestaron que no dejaran trabajar a ninguno del consorcio hasta que se presente la reunión y tungan un Concilio entre ces partes.

Arq. Luis Vergara C.
C. Vive Ver S.

Nota No 0071 Fecha: 12 de agosto de 2021. Estado del tiempo: Lluvioso
Las actividades en campo fueron retomadas hoy fueron a partir de las 7:00 AM. Con la novedad de la renuncia del residente de obra. Por lo que momentaneamente la dirección y/o ejecución de la obra esta a cargo del inspector de la obra Rosario de la Hoz y el director de la obra Eduardo Cayon.

Rosario de la Hoz.

Escaneado con CamScanner

Ficha N.0072 Fecha: 12/08/2021, Clima: Lluvioso
En el día de hoy se retomaron actividades correspondientes a relleno, compactación y excavaciones en los barrios Brisas del Norte y Villa Esperanza. Por otro lado, en el barrio Bello Horizonte se avanza con el trabajo de las instalaciones eléctricas y se fundieron plantillas en 2 viviendas. Sin embargo, las actividades se suspendieron a las 3:30 PM por fuertes lluvias.

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Ficha N.0073 Fecha. 13/08/2021. Clima: Despejado
Por razones de lluvia del día anterior, se dañaron todas las excavaciones de las viviendas que estaban listas para fundir por lo que se tuvo que realizar el trabajo de nuevo. Por otro lado, en el barrio Bello Horizonte se avanzó en los acabados de dos viviendas

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Ficha N.0074 Fecha: 17/08/2021, Clima: Despejado
Por causa de las lluvias durante el fin de semana se tuvo que volver a iniciar las actividades de excavaciones por lo que no se ha podido fundir cimentaciones.

Gestora Bonjorno

Ficha N.0075 Fecha: 18/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
En el barrio Bello Horizonte se adelantó trabajo de redes de aguas en algunas viviendas, fundición de losa del baño y se realizaron excavaciones y trazado en el barrio 17 de febrero.

Gestora Bonjorno

Ficha N.0076 Fecha: 19/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
se fundieron las primeras cimentaciones de la semana en el barrio Villa Esperanza, mientras en el barrio Bello Horizonte se continuo con la instalación de aguas negras, fundición de losas de baño y registros

Gestora Bonjorno Ramiro de la hoz.0

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0077 | Fecha: 20/08/2021, Clima: Despejado
se avanzó en el trabajo de instalación de techos en el barrio Bello horizonte. Se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte. Se hanto estructuras metálicas y excavaciones en el barrio Villa Esperanza. De igual forma, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Villa esperanza y en el barrio el progreso se adelanto el trabajo de fundición de losas de techo.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0078 | Fecha: 23/08/2021, Clima: Despejado
En el barrio Bello horizonte se avanza en trabajos de instalación de puertas y ventanas, pintura de perfiles metálicos y levantamiento de muros. De igual forma, en el barrio El Progreso se avanza en levantamiento de muros y la instalación de techos. Se fundieron tambien las cimentaciones de la beneficiaria Tulia Tobon.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0079 | Fecha: 24/08/2021, Clima: Despejado
Se fundió la plantilla del beneficiario Cristo Rios, tambien se avanzó con la instalación de puertas y ventanas en Bello Horizonte, levantamiento de muros en el barrio El Progreso y trazado, relleno y compactación en el barrio 17 de febrero. Ramiro de la hoz.o

Gustavo Bayuelo

Nota No. 0080 | Fecha: 25/08/2021, Clima: Nublado
se instalaron puertas y accesorios sanitarios en el barrio Bello Horizonte, se fundieron cimentaciones y se trazaron lotes en el barrio 17 de febrero y en el barrio el progreso se continuó levantando muros e instalando techos.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0081 | Fecha: 26/08/2021
Se realizó la primera supervisión del avance de obra del proyecto en conjunto entre la alcaldía, Comfacesar, el contratista e interventoría.

Gustavo Bayuelo
Comfacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0082 Fecha: 27/08/21, Clima: Despejado
Se realizaron rellenos y excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se le hicieron retoques a los acabados de la casa modelo y se fundió plantilla en otras viviendas. En el barrio El progreso y Brisas del Norte se avanzó en el trabajo de levantamiento de muros.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0083 Fecha: 28/08/21, Clima: Despejado
Con este nota se da constancia de que el día 26 de agosto de 2021 se realizó la socialización del barrio Luis Carlos Galan en el parque de dicho barrio y con la participación de todos los beneficiarios y el contratista.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0084 Fecha 30/08/21, Clima: Nublado
En el barrio Bello Horizonte se inicia la fabricación de acabados del beneficiario Cristo Rios, la instalación del techado de la beneficiaria Doris Martinez. Mientras que en el barrio 17 de febrero se avanzó con el relleno y compactación de lotes, excavaciones y se fundieron los cimientos de una vivienda.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0085 Fecha 31/08/21, Clima: Lluvioso
No se adelantaron las excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se instalaron redes eléctricas y se fundió plantilla de una vivienda.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 0086 Fecha: 01/09/21. Clima: Humoso
Se adelanto el trabajo de levantamiento de muros en los barrios Brisas del Norte y el progreso. Mientras que en Bello Horizonte se fundió una plantilla y se adelanto los acabados de una vivienda

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Nota No 0087 Fecha: 02/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se fundió plantilla en una vivienda mientras que en otras se adelanto el trabajo de acabados. En dimas barrios se continuó el levantamiento de muros. No se han fundido cimentaciones ni levantado nuevas estructuras

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Nota. No 0088 Fecha: 03/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se continuó fundiendo plantilla en dimas viviendas, junto con redes hidrosanitarias y eléctricas mientras, en los dimas barrios intervenidos se continua con el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Nota. No 0089 Fecha: 06/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se avanza en la instalación de puntos definición de acabados y fundición de plantilla. Mientras que en el barrio el progreso se instalaron redes hidrosanitarias y eléctricas y en los dimas barrios se continuo el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Nota No 0090 Fecha: 07/09/21, Clima: Humoso
En el barrio El progreso se adelantó la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, definición de acabados y fundición de plantilla. De igual forma, el contratista avanzo de manera significativa en la aplicación de anticorrosivos en los sucheles de la estructura y la instalación de los tejados para proteger las estructuras

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0091 Fecha: 07/09/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en obra fueron suspendidos alrededor de las 3:00PM por fuertes lluvias.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz o

Nota No 0092 Fecha: 08/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el trabajo de levantamiento de estructuras metálicas en el barrio Villa Esperanza. Con las viviendas de Bibiana Galan, Lucas Mieres y Julia Ibañez. Esta última la cual había sido suspendida por desplantarse el lote. Sin embargo, la alcaldía de la mano de Miguel Rivera dieron el aval para construir la vivienda.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz o

Nota No 0093 Fecha: 09/09/21, Clima: Despejado
se continuó el levantamiento de muros en los barrios Villa Esperanza, 17 de febrero y Brisas del Norte. Se fundió plantilla en el barrio El progreso y Villa esperanza. En el barrio Bello Horizonte se continuo con la difinición de acabados y la instalación de puertas.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz o

Nota No. 0094 Fecha: 10/09/21, Clima: Despejado
Se continuó con la instalación de techador, redes hidrosanitarias eléctricas y la fundición de placas de baño.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. o

Nota No 0095 Fecha: 13/09/21, Clima: Despejado
En los barrios bello horizonte, el progreso se trabajo acabados y empapelería al igual que en los barrios Brisas del norte y Villa esperanza

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. o

Nota No 0096 Fecha: 13/09/21
Durante todo el día no hubo fluido electrico en la ciudad, lo que atrasó todo el cronograma de actividades de la obra, debido a que se dependía en gran medida de los soldadores.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz. o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0097 | Fecha: 14/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó levantando muros en todos los barrios donde se está trabajando, a excepción del 17 de febrero donde se fundieron cimentaciones. En el barrio Bella Horizonte se fundió una plantilla.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0098 | Fecha: 15/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó el levantamiento de muros. En otros frentes de trabajo se encuentran fundiendo plantillas y por otros fundiendo cimentaciones a la vez, se arranca en la definición de alcantarillados.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0099 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Despejado
En el día de hoy solo se adelantó el trazado y excavación de una vivienda en el 17 de febrero, se aplicó pintura a algunos acabados y perfiles metálicos.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0100 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Lluvioso
Durante toda la jornada de la tarde no fue posible trabajar en campo debido a fuerte lluvias.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0101 | Fecha: 17/09/2021, Clima: Despejado
En el barrio El Progreso avanzó el trabajo de definición de acabados, enchape de zonas humedas y la instalación de cableado eléctrico. Mientras que, en Brisas del Monte se adelantó y fundió la plantilla de una vivienda.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Nota No. 00102 | Fecha: 20/09/2021, Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en el barrio 17 de febrero donde también se levantó una estructura, Mientras que en los barrios Villa Esperanza y Brisas del Monte se enchapaban zonas humedas y se levantaban muros.

Gustavo Bayomez Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 0104 Fecha: 21/09/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la peluquería Angelica Cano, la cual fraudó porque no había demolido su vivienda hasta que personal de la alcaldía se lo solicitó. En otros frentes de trabajo se fundió plantilla, enchape zonas humedas y se instaló cableado eléctrico.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No 0105 Fecha: 22/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bella Horizonte se y el progreso se instalaron puertas y ventanas. Mientras que en el 17 de febrero se trazó y excavó una vivienda y se levantó la estructura de otra. En Bella Horizonte se fundió la plantilla de Doris Martinez

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No 0105 Fecha: 23/09/21 Clima: Despejado
En el barrio 17 de febrero se fundió una cimentación. En Bella Horizonte y El Progreso se instalaron puertas y ventanas. En Brisas del Norte y Villa Esperanza se enchapó zonas humedas y se trabajó en la definición de acabados.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No 0106 Fecha: 24/09/21. Clima: Nuriviosa (no aplicó)
Se avanzó con la instalación de puertas en el progreso En el 17 de febrero se trazó y excavó otra vivienda y en Brisas del Norte se continuó levantando muros y se fundió una plantilla.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No 0107 Fecha: 25/09/21, Clima: Despejado
Se avanzó el trabajo de pintura con antioxidante en perfiles metalicos.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.O

Nota No 0108 Fecha: 27/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Villa Esperanza se avanzó con la definición de acabados, enchapado e instalación de accesorios. En el 17 de febrero se fundió una cimentación

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0109 Fecha: 28/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Brisas del norte se continuó el levante de muros y fundición de plantillo. En el 17 de febrero se trazó y excavo un lote.
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Nota No.0110 Fecha: 29/09/21, Clima: Lluvioso
se fundieron cimentaciones en el 17 de febrero. Donde también se rellenó una lote y se empezó levante de muros. En el barrio Brisas del Norte se fundió plantillo y en Villa Esperanza se empezaron los acabados e instalación de accesorios.
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Nota No.0111 Fecha: 29/09/21, Clima: Lluvioso
las actividades en la jornada de la tarde se suspendieron por fuerte lluvias.
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Nota No.0112 Fecha: 30/09/21, Clima: Despejado
Se trazo y excavo en el barrio 17 de febrero 2 viviendas, se fundió cimentacion.
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Nota No.0113 Fecha: 04/10/21, Clima: Despejado
No se registraron actividades en campo durante el dia
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Nota No.0114 Fecha: 05/10/21, Clima: Despejado
Durante el dia se hizó un recorrido vivienda a vivienda recogiendo basura dejada. Tambien se trabajo en el levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte, 17 de febrero y Brisas del Nor
Gustavo Bayonne Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Ota No 0115 Fecha: 06/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se trabajó únicamente levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero y trabajo de acabados en el barrio Bella Horizonte en la vivienda d. Dora Montes

Gerstore Benjumea Ramiro de la hoz.O

Ota No 0116 Fecha: 07/10/21, Clima: Despejado
Durante la jornada completa se trabajó (continuó) en las mismas actividades y viviendas del día anterior

Gerstore Benjumea Ramiro de la hoz.O

Ota No 0117 Fecha: 11/10/21, Clima: Despejado
Durante los días 09, 09, 10 de se realizaron actividades en campo por falta de material. El día de hoy solo se reanudó el trabajo de levantamiento de muros en el 17 de febrero.

Gerstore Benjumea Ramiro de la hoz.O

Ota No 0118 Fecha: 12/10/21, Clima: Lluvioso
Se realizó el trazado y excavaciones en la vivienda de Orlando Nieto (17 de febrero) y Wilmer Pico (El Golán). También se levantó el sistema estructural metálico de las viviendas de Dizze Sagith y Katherine Karo (17 de febrero). Las actividades en campo se suspendieron a las 3:40PM por lluvias.

Gerstore Benjumea Ramiro de la hoz.O

Ota No 0119 Fecha: 13/10/21, Clima: Lluvioso
En el barrio el progreso se fundieron cajillas de inspección. Mientras que en el 17 de febrero se continuó levantando mamposteria y se fundieron las cimentaciones de Orlando Nieto. Se firmó el acta de vecindad que permite construir la vivienda de Tania Jimenez y pegada al orden. Se suspendieron actividades a la 4:00PM por lluvias.

Gerstore Benjumea Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0120 Fecha: 14/10/21 Clima: Despejado Ramiro d. la hoz. O

Se levantó la estructura metalica de la beneficiaria Nora Darian en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galán se trazaron, Excavaron y fundieron 2 viviendas.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O

Nota No 0121 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se le realizó 3 supervisiones puntuales al contratista. Primero, tuvo mas estética y precaucion al momento de soldar los elementos metalicos y fundir las cimentaciones. Segundo, utilizar ladrillos debidamente cocidos. Tercero, Utilizar el nivel correcto para fundir las viviendas y evitar inundaciones.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O


Nota No. 0122 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se levantaron 2 estructuras metalicas y se trazaron, excavaron, entablaron y fundieron 2 viviendas. Se continua el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero junto con las losas de base.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O

Nota No 0123 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se presentó una particularidad en el lote de la beneficiaria Tania Jimenez en el barrio Luis Carlos Galan. Donde la vivienda tal cual está diseñada no cabe en el lote.

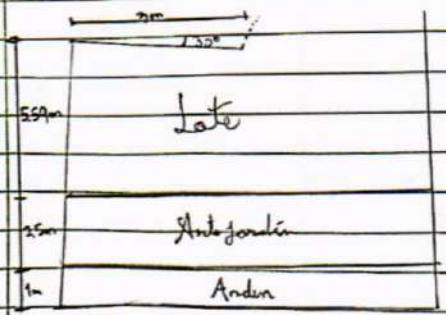

* El dibujo no está a escala

Ramiro de la hoz. O

Gestora Benjumea

Escaneado con CamScanner

Bitácora No.0124 Fecha: 16/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones del beneficiario Edilser Pedraza ubicada en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Bitácora No.0125 Fecha: 19/10/21, Clima: Despejado
Se trabajó en los acabados de los baños de Yuris Granado y Luis Trillo en el barrio El Progreso. Además se continuó el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galan, se fundieron las cimentaciones de 2 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Bitácora No.0126 Fecha: 20/10/21, Clima: Lluviano
Se trabajó en los acabados de la beneficiaria Josefina Ortega. Se le instaló la ventanería a la vivienda de Martha Dominguez. En el barrio 17 de febrero se continuó el levantamiento de muros y se trazaron, excavaron y entablaron 3 viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Se suspendieron las actividades entre las 2:00PM y 3:30PM por lluvia.
Gustavo Benjumea

Bitácora No.0127 Fecha: 21/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se fundieron las cimentaciones de los beneficiarios Alba Cruz y Mely padilla, se trazó y excavó la vivienda de esperanza Bulbo. Se le instalaron los dinteles a Martha Dominguez y se le instaló el cableado electrico a Josefina Ortega. En el barrio 17 de febrero se trabajo en el levantamiento de muros y en Villa esperanza se trabajó en los acabados.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota No 129 | Fecha: 22/10/21, Clima: Despejado
Se trabajó y excavó la vivienda de Ramon Villareal y se fundieron las cimentaciones de esperanza Velasco. Allí se mezcló con el levantamiento de muros en el barrio El Golfo.

Gestores Bayuncos Ramiro de la hoz. O

Nota No 129 | Fecha: 23/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Mirellis Martinez y a la vez se continuó el levantamiento de muros en el barrio El Golfo.

Gestores Bayuncos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 130 | Fecha: 25/10/21, Clima: Despejado
Mediante esta nota se hace constar que tanto como el contratista, como interventoría y personal de la alcaldía; le hicieron saber a la beneficiaria Leidy Montes que no demolieran su vivienda, hasta que se definiera su situación, ya que el lote no cumple con las medidas. Sin embargo, la beneficiaria demolió su vivienda por sugerencia de un conocido llamado "Victor Ballena". Actualmente, la beneficiaria se encuentra pagando arriendo.

Gestores Bayuncos Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0131 | Fecha: 26/10/21, Clima: Despejado
Se trabajo unicamente en el levantamiento de muros en los barrios 17 de febrero y el golfo. Además, se repartió material de relleno en los puntos donde se requería

Gestores Bayuncos Ramiro de la hoz. O

Nota No 0132 | Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso
Se continuó el trabajo de levantamiento de Muros en el barrio El Golfo donde también se rellenaron varias viviendas (Lotes). Se instaló el techado de Luciada Montes y en el barrio el progreso se trabaja en acabados y se instaló una cubierta electrica que habia sido hurtada.

Gestores Bayuncos

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0133 Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en campo estuvieron suspendidos por la mañana debido a fuertes lluvias

Gestores Bonjeros Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0134 Fecha: 28/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Ismar Villareal del barrio Luis Carlos Galán. Donde también se rellenaron y compactaron 4 distintos lotes.

Gestores Bonjeros Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0135 Fecha: 29/10/21, Clima: Despejado
Se continuó con el relleno y compactación de diferentes viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Donde también se realizaron excavaciones.

Gestores Bonjeros Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0136 Fecha: 30/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Edna Pabuyo y en el barrio bella horizonte se arranjó con el trabajo de la instalación de manto drill y la instalación de tanque de agua. También se fundió las cimentaciones de Gloriath Jimenez.

Gestor Bonjeros Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0137 Fecha: 02/11/21, Clima: Despejado
El viso trabajo registrado en campo fue la instalación de techos en el barrio 17 de febrero y la instalación de manto drill en el barrio Bella Horizonte

Gestores Bonjeros Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No.0139 Fecha: 03/11/21, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado en campo fue la conversión de detalles en losas de baño de algunas viviendas y se avanzó el cableado de una vivienda en Villa Esperanza.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0139 Fecha: 09/11/21, Clima: Despejado
se adelantó trabajo de instalación de acometida electrica y se fundió la plantilla de una beneficiaria en el barrio Bello Horizonte.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoza

Nota No.0140 Fecha: 10/11/21, Clima: Despejado
Se avanzó con la instalación de techos de viviendas que ya estaban levantados en estructuras y se preparaban otras viviendas para fundir plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.0141 Fecha: 11/11/21, Clima: Despejado
Se trazó la primera vivienda del barrio Juan Pablo, mientras que en el barrio el Golan se levantaron dos estructuras metalicas y se fundió una plantilla en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Benjumea

Nota No.0142 Fecha: 12/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
En el barrio Villa Esperanza se fundieron la plantilla de una vivienda. En el barrio El Golan se fundió la cimentación de una vivienda y se levantaron la estructura metalica de 2 viviendas. Tambien, se inició el levantamiento de muros en 5 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoza

Escaneado con CamScanner

Acta No.0143 Fecha: 13/11/21, Clima: Despejado
Se levantó la estructura metalica de 3 viviendas en el barrio El Golan y se instaló el techo de 1 vivienda

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Acta No.0144 Fecha: 16/11/21 Clima: Despejado
Se instalaron dos techos en el barrio el golan. y se fundió una plantilla en el barrio el golan. Donde tambien se rellenó y se vaciaó otra vivienda.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Acta No.0145 Fecha: 17/11/21, Clima: Despejado
Se inició el levantamiento de muros en dos nuevas viviendas y se fundió una cimentación en el barrio El Golan y otra en el barrio Juan Ramon, donde tambien se trozó y vaciaó otra vivienda.

Gustavo Bonjorno

Acta No.0146 Fecha: 18/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
Se fundio una plantilla en el barrio Villa Esperanza. En el golan se levantaron dos estructuras metalicas y se entecharon 3 viviendas y tambien se fundieron 3 losas de baño y una cimentación.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Acta No.0147 Fecha 19/11/21, Clima. Despejado
Se fundió una cimentación en el barrio Juan Ramon y otra en el barrio Jardin Golan. Se instalaron 2 techos y la red hidrosanitaria de otra vivienda. y se levantó una estructura metalica

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Acta No.0148 Fecha 22/11/21, Clima: Nuriaes
Durante la mañana se replantearon 2 viviendas para fundir cimentaciones y 1 para plantilla pero los trabajos se suspendieron por fuertes lluvias en la tarde.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 149 Fecha: 22/11/21
han llegado reporte de que todos los lotes del barrio Villa alday tienen un ancho de frente de entre 5.5-6.1m lo que no es suficiente para la construcción de la vivienda.

Gestora Bonjemes. Ramiro de la hoz.o

Nota No.0150 Fecha: 23/11/21. Clima: Despejado
se continuó el enchape de nuevas viviendas y se fundió una plantilla del barrio 17 de febrero. Además se avanzó en la pintura de la fachada de las primeras viviendas.

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0151 Fecha: 24/11/21
se realizó la socialización al barrio Pedro Castro

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0152 Fecha: 24/11/21, Clima: Despejado.
se continuó con la pintura de las primeras viviendas y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero y se fundió una cimentación en el barrio Juan Roman.

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0153 Fecha: 25/11/21, Clima: Despejado
se fundieron las cimentaciones de una vivienda en el barrio Juan Román y una plantilla en el barrio 17 de febre

Gestora Bonjemes Ramiro de la hoz.o

Nota No.0154 Fecha: 29/11/21.
se realizó la segunda supervisación técnica a las primeras 22 viviendas que estan entre un 95% y 98% de ejecución. En compañía con el supervisor de Comfacesar y la alcaldía.

Gestora Bonjemes

Supervisor Comfacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No.0155 Fecha: 30/11/21, Clima: Despejado
Se fundieron dos plantillas (1 en el 17 de febrero y otra en el galan). También se levantó una estructura metalica en el galan y otra en Juan Ramon. Ademas, se trabajó en subsanar los detalles pendientes de las primeras viviendas.

Gestores Bayuncas Ramiro de la hoz.o

Nota No.0156 Fecha: 01/12/21, Clima: Despejado
Se inició el relleno del lote de una beneficiaria faltante en el barrio Brisas del Norte y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gestores Bayuncas Ramiro de la hoz.o

Nota No.0157 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
Se levantaron 2 estructuras metalicas en el barrio Juan Ramon. Se instalaron puertas y ventanas en los barrios Brisas del Norte y Bella Horizonte. En el barrio 17 de febrero se fundió una plantilla.

Gestores Bayuncas Ramiro de la hoz.o

Nota No.0158 Fecha: 03/12/21, Clima: Despejado
se fundió una plantilla en el barrio bella horizonte. Oficialmente, el contratista decidió no fundir mas cimentaciones.

Gestores Bayuncas Ramiro de la hoz.o

Nota No.159 Fecha: 06/12/21, Clima: Despejado
Se avanzó en el trabajo de acabados de las primeras viviendas que habian quedado atras. Junto con la instalación de puertas, ventanas, lavaderos y accesorios. Se fundio una plantilla en Bella Horizonte

Gestores Bayuncas Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No.160 Fecha: 10/12/21, Clima: Despejado
Se sobtuvieron viviendas en el barrio Villa Esperanza, donde también se corrigieron algunos detalles de acabados. Se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.161 Fecha: 13/12/21, Clima: Despejado
se fundieron 2 plantillas en el barrio el galan. También se replantearon otras 2 viviendas mas para fundir plantilla

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.162 Fecha: 14/12/21, Clima: Despejado
En el barrio el galan, se fundieron 2 plantillas. Mientras que, en el barrio Brisas del Norte se trabajo en acabados de 2 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.163 Fecha: 15/12/21, Clima: Despejado
En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. También se realizaron las ultimas correcciones a las primeras viviendas que se desean entregar

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.164 Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado
En el barrio El Galan se fundieron 2 plantillas. Se continuó el trabajo de acabados en Brisas del Norte.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No.165 Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado
Oficialmente, la interventoria le recibió 29 viviendas listas para entregar al contratista

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 166 Fecha: 29/12/21, Clima: Despejado:
De la mano del alcalde del municipio Orlio Jimenez, se realizo la protocolizacion de 24 viviendas a los beneficiarios que correspondes, Quedaron restando 4 viviendas de beneficiarios que no fue posible contactar

Gestores Bonjemos Ramiro de la hoz. O

Nota No 167 Fecha: 21/01/22, Clima: Despejado
Durante los recientes dias del mes de enero se ha trabajado en la definicion de los acabados de la parte interna y externa de las viviendas, junto con las actividades necesarias para instalar el cableado de las viviendas

Gestores Bonjemos Pedro Pinilla

Nota No 168 Fecha: 24/01/22
se identificaron dos problematicas durante la ejecucion del proyecto, En primer lugar, en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sanchez se presentó el levantamiento de una vivienda al lado derecho, lo cual impediria la definicion de los acabados de esta, En segundo lugar, la beneficiaria Bleidis Galvan pasaba todo la vivienda, ensuciando aún todo la perfileria y modificando los acabados de la vivienda

Gestores Bonjemos Pedro Pinilla

Nota No 169 Fecha: 28/01/22
Se realizó la supervision a los anexo 1 y anexo 2 de la mano con compañeros y la alcaldia y esto se realizó entre los dias 27 y 28 de enero.

Gestores Bonjemos Pedro Pinilla

Escaneado con CamScanner

Nota No.170 Fecha: 31/01/22
Se ha avanzado en el levantamiento de muros en una vivienda de Juan Ramon y 1 en el galeón. Se avanzó en la fundición de cajas de inspección, e instalación de tuberías.

Gestora Benjumea Pedro Picota

Nota No. 171 Fecha: 01/02/22, Clima: Despejado
Se ha estado trabajando en el levantamiento de muros en los barrios Juan Ramón y El Galeón. En el barrio 17 de febrero se ha avanzado en la definición de acabados internos de las viviendas.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 172 Fecha: 02/02/22, Clima: Despejado
En el barrio Juan Ramón hay 1 cuadrilla levantando muros y otra instalando tuberías. En el barrio 17 de febrero hay 4 cuadrillas definiendo acabados y el galeón 1 y otras 3 de exteriores

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 173 Fecha: 03/02/22, Clima: Despejado
se continuó el trabajo de levantamiento de muros y definición de acabados

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 174 Fecha: 07/02/22, Clima: Despejado
se retomó el trabajo de la instalación de cableado eléctrico y se continuó la definición de acabados en el 17 de febrero.

Gestora Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 175 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metálicas y rejas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y se instaló el cableado de 2 viviendas en el mismo barrio.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota No. 176 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metálicas y rejas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y a la vez se le instaló el cableado eléctrico.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota No. 177 Fecha: 10/02/2022, Clima: Despejado
Se trabajó en el levantamiento de muros en 3 viviendas del barrio Juan Ramon. En el barrio Bello Horizonte se instaló las puertas, rejas y red eléctrica de una vivienda. En el barrio El Cedro se trabajo en el levante de muros de dos viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota No. 178 Fecha: 15/02/2022, Clima: Despejado
Se instalaron las puertas, rejas y red eléctrica de 3 viviendas mas, a la vez, se empezó el trabajo de afinición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota No. 179 Fecha: 16/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas, rejas y redes eléctricas de 3 viviendas y de igual forma se trabajó en la afinición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Escaneado con CamScanner

Nota No 180 | Fecha: 17/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó la zona humedo de 3 viviendas y se instaló el combo sanitario y redes destinos de dos viviendas.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 181 | Fecha: 18/02/2022, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado es la instalación del enchape de zonas humedas de dos viviendas

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 182 | Fecha: 21/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó la zona humedo de dos viviendas, se instaló el combo sanitario de dos mas. Tambien se trabajo en el levantamiento de muros de dos viviendas en el barrio el galan

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 183 | Fecha: 22/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló los puertas y ventanas de dos viviendas y la instalación de tanque de agua de 10 viviendas

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Nota No. 184 | Fecha: 26/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó las viviendas restantes del barrio 17 de febrero y 4 del barrio El Galan. Tambien se instalaron los accesorios y duros accesorios como combo sanitario a las mismas viviendas.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 185 Fecha: 28/02/2022, Clima Despejado
Se retocaron los perfiles metalicos y se retocaron ultimos detalles de acabados para realizar entrega de viviendas.

Gerardo Barquero Ramos de la hoz.o

Nota No. 186 Fecha: 01/03/2022. Clima: Despejado
Se levantó inventario recibo 6 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gerardo Barquero

Nota No. 187 Fecha: 02/03/2022, Clima: Nublado
Entramos recibio 4 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios.

Gerardo Barquero Ramiro de la hoz o

Nota No. 188 Fecha: 02/03/2022
Se presentaron fuertes precipitaciones entre las 2:30 y 5:00 PM.

Gerardo Barquero. Ramiro de la hoz o

Nota No. 189 Fecha: 03/03/2022. Clima: Despejado
Se trabaja en la instalación de puertas internas de las viviendas y remate de detalles de acabados en el barrio 17 de febrero.

Gerardo Barquero Dilio Pinilla

Nota No. 190 Fecha: 08/03/2022, Clima: Despejado
Durante los ultimos dias se ha enfocado el trabajo en las 42 viviendas a entregar, en los barrios 17 de febrero, Luis Carlos Galan y Brisas del Norte.

Gerardo Barquero Dilio Pinilla

Escaneado con CamScanner

Fecha: 10/03/22
Nota No. 191 → Clima: Despejado.
Se verificó la correcta instalación de los puertos y ventanas en el barrio Brisas del Norte. También se chequeo el correcto endrape en el barrio Villa Esperanza.

Gustavo Benjumea Dino Pinto

Fecha: 11/03/22
Nota No. 192 → Clima: Despejado.
Se verificó la correcta instalación de puertos internos en el barrio Villa Esperanza al igual que los acabados de las viviendas del mismo barrio.

Gustavo Benjumea Dino Pinto

Fecha: 15/03/22
Nota No. 193 → Clima: Despejado
Se verificó los correctos instalación de puertos y ventanas en el barrio Brisas del Norte, al igual que el endrape y los acabados de las viviendas. De igual forma en el 17 de febrero

Gustavo Benjumea Dino Pinto

Fecha: 15/03/22
Nota No. 194 → Clima: Despejado
Se empezó en intervenir la primera vivienda del barrio Pedro Castro. Se le realizó el trazado.

Gustavo Benjumea Dino Pinto

Fecha: 16/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 195
Se excavó y fundió los primeros cimentaciones del barrio Pedro Castro. Mientras que en los posteriores 12 viviendas a entregar se le verificó que tengan las acometidas correctamente instaladas.

Gustavo Benjumea Dino Pinto

Escaneado con CamScanner

Fecha: 17/03/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 196 Se trazó, excavó y fundió la segunda cimentación en el barrio Pedro Castro. En los demas barrios se instaló trazador y se instalo acerros en los viviendo faltante.

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Fecha: 18/03/22 → Clima: Despejado
Nota No 197 En el barrio Pedro Castro se trazó y fundio la tercera cimentacion. Se le recibieron 12 viviendo terminadas al contratista

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Fecha: 22/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 198 Se trazó, Excavó y fundió la cuarta cimentacion en el barrio Pedro Castro. Se empezaron los trabajos para terminar las primeras 12 viviendo priorizadas en el barrio 17 de febrero y el golan.

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Fecha: 23/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 199 Se fundió una plantilla en el barrio Juan Carlos Galan y a la vez se intensifico el trabajo de acabados en el mismo barrio. En Pedro Castro, se fundieron 2 cimentacion

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Fecha: 24/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 200 Se fundió una plantilla en el barrio el golan. Tambien se reparó la plantilla de la beneficiaria Deis Jimenez. Mientras que en Pedro Castro se fundieron 2 cimentacion.

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Fecha: 25/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 201 Se excavo y fundió la quinta cimentación en el barrio Pedro Castro. Mientras que en los demas barrio se continuo ultimando detalles para entregar los 12 viviendo

Gustavo Benjumea Dairo Pineda

Escaneado con CamScanner

Fecha: 29/03/22 → Cliente: Desgrado
Nota No 202
Se entregan los ultimos viviendas a entregar. En el barrio Pedro Castro se funde la ultima cimentación.

Gustavo Benjumea — Dixie Pinilla

Fecha: 30/03/22 → Cliente: Desgrado
Nota No. 203
Se recibió satisfactoriamente las 12 viviendas terminadas. Se fundió una cimentación en el barrio Brisas del Norte y otra en Pedro Castro. Donde también se empezó a rellenar y compactar los lotes.

Gustavo Benjumea — Dixie Pinilla

Fecha: 04/04/22 → Cliente: Henisa:
Nota No. 204
Se ha trabajado en la definición de acabados de las viviendas pendientes en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea — Dixie Pinilla

Fecha: 07/04/22 → Cliente: Henisa:
Nota No. 205
Se ha trabajado en la instalación de puertas y ventanas en los barrios Luis Carlos Galan, Brisas del Norte y Jose Ramón. A pesar de que se han presentado complicaciones debido al invierno.

Gustavo Benjumea — Dixie Pinilla

Fecha: 08/04/22 → Cliente: Desgrado.
Nota No. 206
Se inició a instalar todo el tablerado electrico en los viviendas que cuentan con puertas y ventanas y que ademas cuentan con alguien que cuide las viviendas

Gustavo Benjumea — Dixie Pinilla

Scanned with CamScanner

Fecha: 11/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 207 Se revisaron las viviendas de dos beneficiarios en el barrio El Golan que se encuentran listos al 100%. Sin embargo, se encontraron detalles de goteras, los cuales fueron comunicados al contratista.
Gestores Bonjemer. Elias Pinto

Fecha: 12/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 208 Se han presentado severas complicaciones en los barrios Luis Carlos Galan y Juan Pablo Uribe al interno. Debido a que el agua de la lluvia afecto el yeso aplicado al interior de las viviendas, lo que impide poder pintarlas.
Gestores Bonjemer. Elias Pinto

Fecha: 13/04/22 → Se registran avance en el enchape de las zonas humedas de las viviendas ubicadas en el barrio El Golan. Tambien dos viviendas fundidas en el barrio Pedro Castro.
Gestores Bonjemer Elias Pinto

Fecha: 13/04/22 → Clima: Despejado
Nota No. 210 Se registro una vivienda fundida en el barrio Pedro Castro. Sin complicaciones por temas climaticos.
Gestor Bonjemer. Elias Pinto

Fecha: 16/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 211 Se registro el trabajo de enchape de zonas humedas en el barrio Jesus Roman. Tambien, la distribucion de material de relleno en los lotes donde se requiere.
Gestor Bonjemer Elias Pinto

Fecha: 19/04/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 212 Durante los dias 17 y 18 de mayo se trabajo en el relleno y compactacion de lotes en Pedro Castro y Camilo Torres.
Gestor Bonjemer. Elias Pinto

Scanned with CamScanner

Fecha: 19/04/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 213 Se registro la fundación de las zimentaciones de Nales Zambrano, priorizado por el municipio. Tambien, la fundación de una plantilla en el barrio El Golan.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Fecha: 20/04/22 → Clima: Nuviosa.
Nota No. 214 Se fundieron los registros sanitarios de algunas viviendas en el barrio El Golan. Tambien, se repartieron los hormigones para las mismas viviendas.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Fecha: 20/04/22 → Se trazaron y excavaron 3 viviendas. En los barrios
Nota No. 215 Pedro Castro, El Golan y Juan Ramon.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Fecha: 23/04/22 → Clima: Despejado
Nota No. 216 Se fundieron las zimentaciones de 2 viviendas. Tambien, se continuó el enchape de zocalos viviendas junto con la definición de acabados en los barrios El Golan y Juan Ramón.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Fecha: 24/04/22 → Clima: Nuviosa.
Nota No. 217 Se registro la fundación de 2 viviendas en el barrio Pedro Castro y 2 zocalos en el barrio El Manantial. Tambien se avanzo en la definición de acabados e instalación de accesorios en las viviendas mas avanzadas.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Fecha: 25/04/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 218 Se registro la fundación de zimientos en el barrio Pedro Castro para completar 78 viviendas y 2 zocalos en el manantial para completar 4.

Gestora Bayuelo Dilio Pinto

Scanned with CamScanner

Fcha: 26/04/22 → Cima: Despejado
Nota No. 219 Se finaliza la etapa de acabados de 8 viviendas. Las cuales se visitaron y se pasa una lista de correcciones al contratista para poder recibirlas.

Gustavo Bayona Julio Pinto

Fcha: 27/04/22 → Cima: Despejado
Nota No. 220 Se registra la vandalización de dos viviendas. Donde hubieron perdidas materiales significativas

Gustavo Bayona Julio Pinto

Fcha: 28/04/22 → Cima: Despejado
Nota No. 221 Se corrigieron los detalles pendientes de acabados en las viviendas por entregar. Detalles que surgieron principalmente por problemas con humedad.

Gustavo Bayona Julio Pinto

Fcha: 29/04/22 → Cima: Despejado
Se radicó el cobro de la vivienda de Rosa Perez, a la cual le habían robado todo los cableado. Además, se recibieron 3 viviendas que estan al 100% y sin detalles.

Gustavo Bayona Julio Pinto

Fcha: 30/04/22 → Cima: Despejado
Dado que en los recientes días se ha llovido; se pudieron detallar los acabados de 5 viviendas mas, las cuales se recibieron ya al 100%. Y sin detalles

Gustavo Bayona Julio Pinto

Scanned with CamScanner

Fecha: 5/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 224 Se trabajo en el cableado, instalación de puertas y definición de acabados en la vivienda de Jesus Villarreal, se levantó la estructura de techo liviano y se fundio las cimentaciones de bordillos en el barrio Juan Roman.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 12/05/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 225 Se inició el levantamiento de muros en la vivienda de Sharlin y Nelsis Zambrano. También se levanto una estructura metalica en el barrio Pedro Castro y otra en el barrio Juan Roman.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 9/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 226 Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Leslie Sandra del barrio Toscano. Se levantaron dos estructuras metalicas mas en el barrio Pedro Castro. Ademas, se instalaron las correas al beneficiario Carlos Ustate.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 16/05/22 → Se empezo el trabajo de levantamiento de muros en el
Nota No. 227 barrio Toscano y se continuó con dimer frentes de mamposteria. Se levantaron dos estructuras mas.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha 17/05/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 228 Solo se registraron trabajos de mamposteria en 3 frentes de trabajos diferentes

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Scanned with CamScanner

Fecha: 20/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 229 Entre los días 18, 19 y 20 de mayo la única actividad registrada fue el levantamiento de estructura metálica en el barrio Pedro Castro. Llovió por falta de playeros. En promedio, se levantaron 2 estructuras al día.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Fecha: 24/05/22 → Clima: Nublado
Nota No. 230 Se iniciaron las excavaciones para instalar la red hidrosanitaria de la vivienda en el terreno. Se levantaron 2 estructuras metálicas más en Pedro castro

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Fecha: 25/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 231 Se instalaron los techos de los beneficiarios Carlos Ustate y Julie Sanchez. Se levantó una estructura metálica en el barrio El Manantial.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Fecha: 26/05/22 → Se fundió la plantilla del beneficiario Carlos Ustate. Al quien, también se le levantó una tapia de 1m de alto como medida de contención para las aguas lluvias de los lotes vecinos.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Fecha: 27/05/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 233 Se inició el levante de mampostería del beneficiario Leonzildo en Juan Roman. También se levantaron dos estructuras metálicas en el barrio Pedro Castro.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Fecha: 31/05/22 Se levantó la estructura metálica de una beneficiaria en
Nota No. 234 Brisas del Norte y otra en Juan Roman.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Scanned with CamScanner

Fecha: 1/6/22 | Clima: Despejado
Nota No. 235 | Se instalaron estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro y se trabajaron viviendas en mamposteria en el barrio Jesus Romero

Gestores Bonjemes Ramiro de la hoz.O

Fecha: 2/6/22 | Clima: Despejado
Nota No. 236 | Se instalaron 2 estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro.

Gestores Bonjemes Ramiro de la hoz.O

Fecha: 3/6/22 | Clima: Actividades suspendidas por 4 horas por lluvia.
Nota No. 237 | Se instalaron 2 estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro y se adicionaron 3 cuadrillas de levantamiento de mamposteria en el barrio Pedro Castro

Gestores Bonjemes Ramiro de la hoz.O

Fecha: 6/6/22 | Clima: Despejado
Nota No. 238 | Se continuo con el levantamiento de mamposteria en los 3 puntos trabajados en el barrio Pedro Castro. Se verificó la correcta instalación de los bloques y su debida colocación de refuerzo. Sin embargo, se encontró con que el lote de bloques cuenta con un gran numero de bloques de buena calidad y unos pocos de muy mala calidad. Por lo que para este caso se le dijo al contratista que no utilizara estos bloques de mala calidad y que se desecharan.

Gestores Bonjemes Ramiro de la hoz.O

Fecha: 7/6/22 | Clima: Despejado
Nota No. 239 | Se continuó la instalación de bloques y se verificó que si se estan cumpliendo lo recomendado de no utilizar bloques de mala calidad, a pesar de que se esta generando un alto desperdicio. Gestores Bonjemes Ramiro de la hoz.O

Scanned with CamScanner

Fecha: 8/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvia de noche, 3 horas perdidas.
Nota No. 240 Se fundio una cimentación en el barrio Toscana y otra en el barrio El Manantial. Se Empezo el levantamiento de mamposteria en el barrio Juan Roman, se realizó la re-adecuación de la estructura metalica del barrio Juan Roman que estaba por debajo del nivel.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Fecha: 9/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvia de noche, 3 horas perdidas.
Nota No 241 Se excavó y fundió el concreto de viga de cimentación de una vivienda del barrio El Manantial.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Fecha: 13/6/22 Clima: Despejado
Nota No 242 Se excavó y fundió el concreto de viga de cimentación de una vivienda mas en el barrio El Manantial.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Fecha: 14/6/22 Clima: Actividades suspendidas a las 3pm por fuerte lluvias
Nota No. 243 Se trabajó en levantamiento de mamposteria en el barrio Pedro Castro de 2 viviendas y una en el barrio Juan Roman.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Fecha: 15/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 244 El unico trabajo registrado en el dia fue levantamiento de mamposteria en 3 pantas del barrio Pedro Castro.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Fecha: 16/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 245 Se entablaron y fundieron 2 vigas de cimentacion de 2 viviendas en el barrio El Manantial. Sin novedades.

Gestor Bayenca Ramiro de la hoz.O

Scanned with CamScanner

Fecha: 17/6/22
Nota No 246
Clima: Excavaciones dañadas por lluvias de noche. 3 horas perdidas. Se instalaron 3 cubiertas en viviendas en el barrio Pedro Castro y una el barrio 17 de febrero.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 20/6/22
Nota No. 247
Clima: Despejado
se continuó con el trabajo de mampostería en 3 puntos diferentes.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 21/6/22
Nota No. 248
Clima: No se trabajo en la mañana por fuertes lluvias. A igual que el día anterior, solo se trabajó con trabajos de mampostería en los mismos 3 puntos.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 22/6/22
Nota No. 249
Clima: Despejado
Se instalaron 2 cubiertas en el barrio Pedro Castro y se activaron 2 frentes mas de trabajo con relación al trabajo de mampostería.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 23/6/22
Nota No. 250
Clima: Despejado
se iniciaron a fundir los vasos de los bancos de las viviendas mas adelantadas de Pedro Castro.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 24/6/22
Nota No. 251
Clima: Excavaciones dañadas por lluvia de noche. 3 horas perdidas. se instaló 1 techo en el barrio Juan Ramon. No se registraron mas actividades en el día.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Fecha: 24/6/22
Nota No. 252
Clima: Despejado
Se instaló una cubierta en el barrio pedro Castro. No se registraron mas actividades.

Gestores Bayuelos Ramiro de la hoz.0

Scanned with CamScanner

Fecha: 30/6/22	Clima: Actividades suspendidas a las 1pm por lluvia
Visita No 253	Se registró la instalación de tejado en el barrio Pedro Castro.
	No se registraron mas actividades.
	Gestora Bienestar Ramiro de la hoz. O

Scanned with CamScanner

A10 – CONCEPTO ESTRUCTURAL CON DEBIDAS APROBACIONES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR
Estamos cumpliendo sueños

Valledupar, 02 de septiembre de 2021.

Ingeniera.
MARYCARMEN OSPINA GUERRA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Referencia: ANEXO No.1 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 616-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PRENOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Cordial saludo

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los compromiso del acta # 02, nos permitimos adjuntar el concepto estructural por parte del ingeniero especialista sobres los cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de la vivienda propuesta en el contrato de obra 088 del 2021, junto con el aval de la interventoría de obra.

Esta gerencia avala el concepto emitido por parte de la interventoría de las viviendas que han sido intervenidas hasta la fecha, sin embargo se dará instrucciones al constructor e interventoría que solo se utilizara elementos continuos sin uniones de soldadura para las estructura de pórticos.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

DEIMER A. PEREZ SOLANO
Coordinador de Proyectos de Vivienda
Comfacesar

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

La Jagua de Ibirico, 31 de agosto de 2021

Señores,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, COMFACESAR
Ingeniero DEIMER PEREZ SOLANO
Coordinador Técnico de Vivienda.
Valledupar- Cesar

Con respecto al concepto estructural presentado por el ingeniero civil, DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO, especialista en estructuras. Me permito informar lo siguiente:

Luego de comprobar de que las credenciales del ingeniero especialista estuvieran vigentes, se comprobó que en efecto el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010, NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2. estipula bajo que condiciones y/o especificaciones es viable la utilización de soldadura tipo Filete en elementos metálicos. De igual forma, la norma establece las siguientes limitaciones o indicaciones para el uso de este tipo de soldadura:

F.2.10.2.2.2 — *Limitaciones* — El tamaño de una soldadura de filete no deberá ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni menor que el mínimo según la tabla F.2.10.2-4. Estos requisitos no se aplican a soldaduras de filete usadas como refuerzo de soldaduras acanaladas de penetración parcial o completa.

Tabla F.2.10.2-4
Tamaño Mínimo de Soldaduras de Filete

Espesor de la parte más delgada a unir, mm	Tamaño Mínimo de la Soldadura de Filete[a] mm
Hasta 6.4 inclusive	3
mayor que 6.4 a 12.7	5
mayor que 12.7	6
mayor que 19.1	8

[a] Dimensión del lado de la soldadura de filete. Debe aplicarse en una sola pasada.
Nota: Véase el numeral F.2.10.2.2.2 para el máximo tamaño de soldaduras de filete.

El tamaño máximo de las soldaduras de filete será:

(a) A lo largo de los bordes de un material con espesor menor que 6 mm: el espesor del material.
(b) A lo largo de los bordes de un material con espesor de 6 mm o más: el espesor del material menos 1.6 mm; excepto cuando la soldadura se haya detallado en los planos para obtener el espesor completo de la garganta. En la soldadura ejecutada, se permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 1.6 mm siempre y cuando el tamaño de la soldadura sea claramente verificable.

Ilustración 1 Limitaciones de soldadura tipo Filete. Tomado de: NSR-10

Luego de realizar el estudio del concepto y verificar todo lo relacionado, como interventoría se concluye que los cambios propuestos y avalados por el ingeniero especialista son viables y no contraria lo estipulado en la NSR-10 Titulo F sección

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

2.10.2. por lo que no sería necesario el cambio de estos elementos metálicos. Sin embargo, a partir de la fecha, se recomienda la no utilización de elementos estructurales unidas por cordones de soldadura. Tales como; columnas, vigas y correas en futuras viviendas a construir para garantizar un extra de seguridad.

Atentamente,

Gustavo Benjumea

Ing. Gustavo Andres Benjumea Serrano
Residente de Interventoría

- Se anexo Copia del Concepto Técnico del Especialista

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
ASSI – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Atn
Gustavo Benjumea.

CONS.VIVIURB-INTERVENTORIA-002

REFERENCIA: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PERNOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Mediante la presente, solicito la revisión y aprobación de los siguientes cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de las casas propuestas en el contrato de obra 088 de 2021, con el objeto de construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Adjunto los siguientes documentos:

- Concepto estructural por parte del ingeniero especialista.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Título F, sección 2.10.2 y sección 2.2.3.5.
- Tarjeta profesional, ingeniero especialista.
- Registro fotográfico.

Atentamente

Luis Eduardo cayón Medina
Representante legal

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
CONSORCIO VIVE URB 2021
Atn
Ingeniero Luis Eduardo Cayon Medina

Con respecto a la revision del cambio del sistema de conexión apernado a conexión por soldadura, me permito informar lo siguiente:

1. La soldadura permite la correcta transmisión de cargas en los elementos estructurales, es un método de unión avalado por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en su título F sección 2.10.2.

2. El estado límite de resistencia para elementos sometidos a compresión axial pura está controlado en general por la fluencia a la compresión o por el pandeo de la sección. El pandeo a compresión depende a su vez de factores como la esbeltez del elemento, las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva, la excentricidad y variabilidad de la carga, y la resistencia a la fluencia y variabilidad de esfuerzos residuales en la sección, condiciones que se garantizan cuando se unen dos elementos estructurales que presentan similitud en los materiales, dado que al ser materiales similares se garantiza la continuidad del material y sus propiedades mecánicas y químicas.

Dicho esto, concluímos que no es necesario reemplazar los elementos estructurales tipo columnas que presenten este tipo de uniones, ya que estas al igual que las no soldadas garantizan la transmisibilidad de cargas y la continuidad de las propiedades estructurales del elemento.

Este mismo concepto aplica para justificar el cambio del sistema de conexión apernado entre la columna, la platina y las zapatas de cimentación, por el sistema soldado entre ellas.

Atentamente,

Ing.Diego Fernando Quiroga Santiago
Mp N°: 68202052070 STD
CC: 13861922 de Bucaramanga

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONEXIÓN POR SOLDADURA

F.2.2.3.5 — *Diseño de conexiones* — Los elementos de conexión deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales F.2.10 y F.2.11. Las fuerzas y deformaciones usadas en el diseño deben ser consistentes con el funcionamiento esperado de la conexión y con las suposiciones formuladas en el análisis estructural. Se admiten deformaciones autolimitadas en las conexiones. En sus puntos de apoyo, las vigas y armaduras deberán estar restringidas contra la rotación alrededor de su eje longitudinal, excepto cuando mediante análisis se puede demostrar que dicha restricción no es necesaria.

F.2.10.2 — SOLDADURAS — Se deben cumplir todas las provisiones del Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1, excepto que se aplicarán los siguientes requisitos del Capítulo F.2 en lugar de las secciones del código AWS correspondientes:

Numeral F.2.10.1.6 en lugar de AWS D1.1 — Sección 5.17.1
Numeral F.2.10.2.2.1 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2.3.2
Tabla F.2.10.2-2 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.1
Tabla F.2.10.2-5 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.3
Tabla F.2.17-1 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.4
Numerales F.2.2.3.10 y F.2.17 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2, Parte C
Numeral F.2.13.2.2 en lugar de AWS D1.1 — Secciones 5.15.4.3 y 5.15.4.4

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA



ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

MP. 682020-92070 STD

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1: Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 3: Conexión por soladura Columna-Zapata.



Imagen 2:Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 4:Columna de acero

A11 – RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A.G.M.
LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 No. 21 - 129 ORIHUACOA RURAL
VALLEDUPAR, CESAR TEL. 3114372081

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA DE ENSAYO
INV. E-410
INVE. 410-13 ES. ASTM C 39 / AASHTO T 22 / ECOVITEC #73

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
VALLEDUPAR
OBRA Y LOCALIZACION: LA JAGUA DE IBIRICO
FECHA: 27/09/2021

CONCRETO HECHO EN OBRA
CEMENTO ARENAS DE LA CUATRA
CEMENTO ARGOS

	P.S.I.	Kg/cm2	3000
	Mpa	Mpa	21,0
Kg/cm2	P.S.I.		210

CILINDRO No.	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA	ASENTAMIENTO PERMITIDO	DIAMETRO CILINDRO	LECTURA EQUIPO (N/M)	RESISTENCIA		PORCENTAJE RESISTENCIA (%)	Kg/cm2	MPa	MPa DE ROTURA	PROYECCION A LOS 28 DIAS		
									P.S.I.	MPa					P.S.I.	MPa	Kg/cm2
1	CIMENT 1: ELOALDO RAFAEL ESCOBAR	09-jun-21	07-jul-21	28	3000		6.00	439.0	3499	23.8	116.5	242.1	24.2	0	3017	20.1	205.0
2	CIMENT 2: YARELYS CURILLOS AROLA	13-jun-21	10-jul-21	28	3000		6.00	429.0	3411	23.5	113.7	239.8	23.9	0	3139	22.8	231.7
3	CIMENT 3: JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	14-jun-21	14-jul-21	28	3000		6.00	429.0	3411	23.5	113.7	239.8	23.9	0	3139	22.8	231.7
4	CIMENT 10: RUTH MARINA PEREZ	17-jun-21	14-jul-21	28	3000		6.00	429.0	3442	23.7	114.8	241.0	24.1	0	3166	23.2	235.2
5	CIMENT 5: CRISTO HUMBERTO RIOS	22-jun-21	20-jul-21	28	3000		6.00	437.0	3479	24.0	115.8	243.2	24.3	0	3301	23.4	237.3
6	CIMENT 6: MARTHA LUCIA DOMINGUEZ	23-jun-21	21-jul-21	28	3000		6.00	442.0	3518	24.2	117.2	246.0	24.6	0	3429	23.8	240.1
7	CIMENT 12: VIVIANA VERGARA	24-jun-21	25-jul-21	31	3000		6.00	442.0	3499	24.1	116.6	244.9	24.5	0	3431	23.7	241.3
8	CIMENT 9: JOSE DAVID URRUTIA	25-jun-21	02-jul-21	7	3000		6.00	338.0	2690	18.3	89.3	188.5	18.8	0	3155	26.2	266.1
9	CIMENT 14: ANA RAQUEL ARRIETA	28-jun-21	5-jul-21	7	3000		6.00	342.0	2719	18.7	90.6	190.4	19.0	0	3151	26.9	273.1
10	CIMENT 11: LUIS ALBERTO CAMARGO	29-jun-21	13-jul-21	14	3000		6.00	370.0	2942	20.3	98.1	206.0	20.6	0	3434	23.7	240.5
11	CIMENT 13: JESUS ALBERTO PEREZ	01-jul-21	08-jul-21	7	3000		6.00	321.0	2552	17.6	85.0	178.7	17.9	0	3081	26.2	266.3
12	CIMENT 8: MAYRA ALEJANDRA SILVA	02-jul-21	9-jul-21	7	3000		6.00	302.0	2401	16.6	80.0	168.1	16.8	0	3141	23.8	241.1
13	CIMENT 16: YENIFER ARRIETA BUSTOS	08-jul-21	03-ago-21	28	3000		6.00	428.0	3403	23.5	113.4	238.2	23.8	0	3436	23.5	239.3
14	CIMENT 4: DORIS NALDA MARTINEZ	09-jul-21	14-jul-21	7	3000		6.00	314.0	2497	17.2	83.2	174.8	17.5	0	3110	24.7	252.7
15	CIMENT 17: ANDRY JOHANA RANGEL	09-jul-21	06-ago-21	28	3000		6.00	442.0	3515	24.2	117.2	246.0	24.6	0	3131	24.2	246.9

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCRETO SEGUN EL ASENTAMIENTO DEL MEZCLADO

	CONDICION		SECA		MEDIA		MEZCLA		RECIBIDA	
	ASENTAMIENTO		0 - 2		2 - 10		10 - 18		MAS DE 18	

OBSERVACIONES:

ANTONIO GARCIA M.
DIRECTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A.G.M.
LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 # 9N- 31 129 URBANIZACION RINCAL
VALLEDUPAR, CESAR. TEL. 3114177081

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMAS DE ENSAYO
ASTM C-39/NTC 673 (2010)
EQUIPO ELECTRO ASTEST CM, NUMERO DE SERIE 473

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
OBRA Y LOCALIZACION: VALLEDUPAR
LA JAGUA DE IBIRICO
FECHA: 27/09/2021

CONCRETO HECHO EN OBRA
GRAVA Y ARENA DE LA GUACHARACA
CEMENTO ORDINARIO

P.S.I.	Kg/cm2	3000
Mpa	Mpal	21,0
Kg/cm2	P.S.I.	210

CILINDRO No.	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA PSI	ASENTAMIENTO REQUERIDO	DIAMETRO CILINDRO	LECTURA DEL ENSAYO LBS	RESISTENCIA		PORCENTAJE DE RESISTENCIA %	Kg/cm2	MPa	TIPO DE ROTURA	PROMEDIO DIAS		
									P.S.I	MPa					P.S.I	MPa	Kg/cm2
14	CIMENT 16 MADELEINES HERNANDEZ	12-jul-21	26-jul-21	14	3000		6,00	2990	2695	18,7	89,3	190,8	20,0	0	3314	233	2334
17	CIMENT 21 YURIS GARETH GRANADO	12-jul-21	19-jul-21	7	3000		6,00	3073	3441	16,8	81,4	175,9	17,1	0	3251	223	2281
18	CIMENT 19 LUZ ELIANA JIMENEZ AYAYA	14-jul-21	11-ago-21	28	3000		6,00	4275	3385	23,4	113,2	237,7	23,8	0	3384	234	2377
19	CIMENT 20 WILEDYS YOHARIS RAMIREZ	15-jul-21	29-jul-21	14	3000		6,00	3760	3014	20,8	100,5	210,9	21,1	0	3330	243	2484
20	CIMENT 23 JOSEFINA ORTEGA	16-jul-21	30-jul-21	14	3000		6,00	3260	2878	18,8	87,2	183,1	18,3	0	3054	211	2159
21	CIMENT 24 OSCAR DE JESUS ROLDAN	19-jul-21	24-jul-21	7	3000		6,00	3010	2401	14,8	80,0	168,1	16,8	0	3401	238	2431
22	CIMENT 7 YORAIMA POLO ROJANO	20-jul-21	17-ago-21	28	3000		6,00	4280	3403	23,8	113,4	238,2	23,8	0	4801	337	3417
23	CIMENT 22 LUIS ALFONSO AVILA	22-jul-21	05-ago-21	14	3000		6,00	3820	3037	20,9	101,2	212,6	21,3	0	3340	245	2483
24	CIMENT 28 JUAN CARLOS GUTIERREZ	23-jul-21	30-jul-21	7	3000		6,00	3120	2481	17,1	82,7	173,7	17,4	0	3159	245	2492
25	CIMENT 26 HENIS YOHANA NUÑEZ	28-jul-21	11-ago-21	14	3000		6,00	3820	3117	21,5	103,9	218,2	21,8	0	3441	251	2564
26	CIMENT 29 RUBY SANCHEZ	28-jul-21	4-ago-21	7	3000		6,00	3040	2417	16,7	80,6	169,2	16,9	0	3405	239	2427
27	CIMENT 33 CECILIA RIOS RAMELO	29-jul-21	12-ago-21	14	3000		6,00	3820	2796	19,3	93,3	196,0	19,6	0	3190	225	2298
28	CIMENT 30 LUZ MARIA RODRIGUEZ	30-jul-21	13-ago-21	14	3000		6,00	3637	2928	20,2	101,2	212,6	21,3	0	3146	245	2483
29	CIMENT 27 YARLZA BEATRIS CRUZ	31-jul-21	14-ago-21	14	3000		6,00	3420	2719	18,7	90,8	190,4	19,0	0	3179	219	2223
30	CIMENT 34 CARMEN ALICIA GARCIA	03-ago-21	10-ago-21	7	3000		6,00	3160	2513	17,3	83,8	175,9	17,6	0	3001	243	2523

CLASIFICACION DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGUN EL ASENTAMIENTO (NSR-10 TITULO C)

TIPO DE ROTURA: TIPO 5 TIPO 4 TIPO 3 TIPO 2 TIPO 1

	CONVENCIONAL		SECA		10 A 15 SECA		MEDIA		MEDIA	
ASENTAMIENTO			2 - 5		11 - 15		10 - 100		100 - 170	

OBSERVACION:

ANTONIO GARCIA M
INGENIERO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A12 - INFORME SOCIAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

JUNIO - 2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de junio el area social caracterizó el barrio Toscano Alto y Toscano Bajo del municipio de la jagua de ibirico con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reuniones de socialización con la comunidad, en acompañamiento con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visitas a domicilio casa por casa para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN BARRIO TOSCANO ALTO Y TOSCANO BAJO

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el día de hoy 12 de junio de 2022, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion realizada en los barrios **TOSCANO ALTO Y TOSCANO BAJO**, en conjunto con los beneficiaros y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer a los beneficiarios datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las políticas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por su bienestar así mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorías visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- Los beneficiarios junto con el presindente del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se concientizo a los beneficiarios acerca del tema de espera de la demolicion de las casas en las cuales residen y se les explico los tiempos de entrega.
- Se tomo asistencia de los beneficiarios.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	OBJETO: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
	CONTRATANTE: CONFACESAR
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.**

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		**DIRECCION:**	
EDAD:		**BARRIO:**	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**PARENTEZCO**	**EDAD**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

_____

C.C.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLICIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"***, por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____, ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ (_____ **M2)** y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura publica de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA MES AÑO	
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

ANEXOS LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO
VIVEURB 2021

DESCRIPCION POR EL SISTEMA DE PREFABRICADOS DE MASA (23 SOLUCIONES DE VIVIENDA
URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA ZONA RURAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO:
CONTRATANTE: CONTRACESAR
CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO: Tosecino Bajo.

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sandra Luz Torres Ramos	36573727	Ama de casa	Calle 9C 9-05	3113346492	beneficiaria	Sandra Torres
	Lucelis Edeno Santana	1065849837	Ama de casa	cll 7-C 9C-35	3117346854	beneficiaria	Lucelis Edeno
	Dalia estefania mejia	1066762483	Ama de casa	Cr 9C # 9C-01	3116880665	Beneficiario	Dalia E.
	Ety Devis portazuela	25995707	Ama de casa	CL 7C 9D	3116542946	Beneficiario	Ety Portazuela
	Rosa Angelica Hdez	1064 118 391	Ama de casa	Cr 9E # 1C-13	3205244708	Beneficiaria	Rosa Hdez
	Sandri Hilena lopez	1.064.165.582	Ama de casa	Cr 9D # 1C-18	3105196580	Beneficiaria	sandri lopez
	Juana Maria Padilla	22.843.628	Ama de casa	CL 2 Cr 9	3143634353	Beneficiaria	Juana Padilla
	Yanines Jimenez	1.064.111.337	Ama de casa	CL 2 Cr B3	3136990313	Beneficiaria	Yanine.
	Elena Cogollo	36.573.892	Ama de casa	CL 2 Cr 9	3204178977	Beneficiaria	Elena cogollo
	Dalis TORRES	36573652	Ama de casa	CL 2 Cr 9A	3124674122	Beneficiaria	
	Leyka Rodriguez C.	1064312378	Ama de cas	CR. 9D. 7C. 34.	3127657944	Beneficiaria	
	Paola A Martinez	36572715		Carr 9 # 3-38	3116647068	Presidenta Vivienda	Paola Martinez
	Lizeth L. Moreno C.	1064113046	Sisso	Centro.	3216813818		Lizeth Moreno
	Eduardo Garcia. G	77040545	Sastre	Centro	3106209940	Vivienda	
	Clara Cujar	1065819800	Ing.	Centro	3007410759	Contratista	
	ROBERTO	1[illegible]16		Mz 9C-1C	3216221510	Beneficiario	Roberto

CONSORCIO
VIVEURB 2021

OBJETO: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA ZAGUERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
CONTRATANTE: CONVICESAR
CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO: Tosco Alto

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Laura A Martinez	36572715		Carr 9#3-58	3116647068	Presidenta	Laura Martinez
	Yanitza Jimenez	1064111331		calle 3 #1 8-26	3136590713	Beneficiaria	
	Eduardo J Perez	77.170.595.		Centro	3006309890	Vive Urb	
	Clara Cuyan	1.063549300		Centro	3002410259	Ing. Social	







ANEXO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toscano Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Mauricio Zambrano Sarmiento	**Nombre**	
Cedula	1.064.112 696	**Cedula**	
Dirección	Toscano bajo	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3213946893	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☒ Si	☐ No	Cual: Internet

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☒ Si	☐ No
Uso	☒ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☒ Si	☐ No
En uso	☒ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No			

7. OBSERVACIONES GENERALES

Cielo raso en poliestireno Extendido. en regular estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1064112686
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tosano Bajo
Dirección				
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado ☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial ☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío ☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Janer Cuallos Lazaro	**Nombre**	
Cedula	77.081.117	**Cedula**	
Dirección	Cll 2 Cr 9 Nº 10-41	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3148132492	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	janercuallos123@gmail.com	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☒ Si	☐ No	Cual: Internet			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	[X] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala	**Pintura**	[X] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala
Puertas	[X] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala	**Viga canal**	[ ] Buena	[X] Regular	[ ] Mala
Rejas	[ ] Buena	[X] Regular	[ ] Mala	**Anden**	[ ] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala
Pisos	[ ] Buena	[ ] Regular	[X] Mala	**Grietas y fisuras**	[X] Si	[ ] No	
Humedades	[X] Si [ ] No	**Hundimiento de Pisos**	[X] Si [ ] No	**Desplazamiento**	[ ] Si	[X] No	

6.2 INTERIOR

Muro	[X] Ladrillo	[ ] Bahareque	[ ] Revoque sin pintar	[ ] Revoque con pintura	[ ] Otro		
Estado	[X] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala	**Pintura**	[ ] Buena	[ ] Regular	[X] Mala
Humedad	[X] Si [ ] No	**Desplazamiento**	[ ] Si [X] No	**Grietas y fisuras**	[X] Si [ ] No		
Pisos	[ ] Concreto	[ ] Esmaltado	[ ] Madera	[X] Baldosa	[ ] Tierra	[ ] Otro:	Cual:
Estado	[ ] Buena	[X] Regular	[ ] Mala	**Hundimiento**	[ ] Si [X] No	**Desplazamiento**	[ ] Si [X] No
Puertas	[X] Metálicas	[ ] Madera	[ ] Otro	**Estado**	[X] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala
Cielorraso	[ ] No hay	[ ] Madera	[ ] Placa	**Estado**	[ ] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala
Estado	[ ] Buena	[ ] Regular	[ ] Mala	**Hundimiento**	[ ] Si [ ] No	**Desplazamiento**	[ ] Si [ ] No
Cubierta	[ ] Teja barro	[ ] Zinc	[X] Asfalto	[ ] Concreto	[ ] Madera	[ ] Teja plástica	
Estado	[ ] Buena	[X] Regular	[ ] Mala	**Hundimiento**	[ ] Si [X] No	**Desplazamiento**	[ ] Si [X] No
Humedad	[X] Si [ ] No				**Grietas y fisuras**	[X] Si [ ] No	
Instalaciones eléctricas	[ ] Empotradas	[X] Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	[X] Empotradas	[ ] Expuesta		
Estado	[ ] Buena	[X] Regular	[ ] Mala	**Hundimiento**	[ ] Si [X] No	**Desplazamiento**	[ ] Si [X] No
Humedad	[X] Si [ ] No				**Grietas y fisuras**	[ ] Si [X] No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

La vivienda cuenta con cielorraso de polisticos extendido en las habitaciones principales en mal estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3




Sandra Triviño.		Jaiver Ovallos L
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 77'081.117 P/to
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

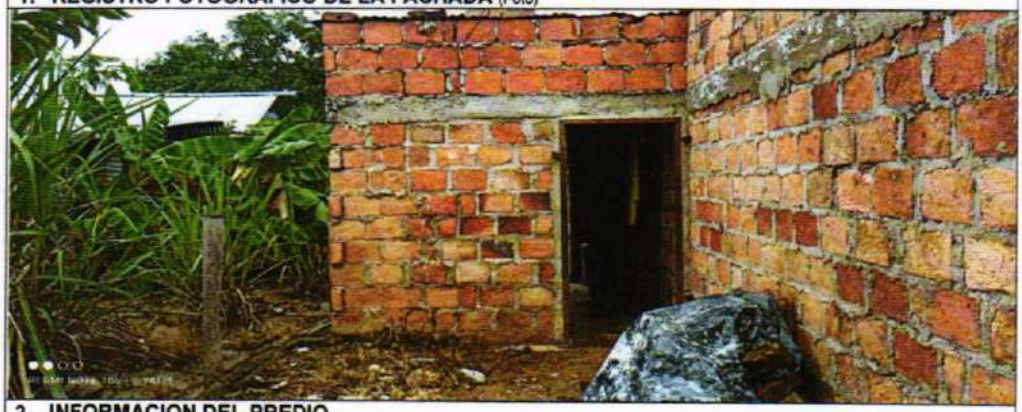

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tocoa Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Daniel De Agua
Cedula	1.60.193
Dirección	Cr 9D # 1C-40
Celular / Tel. fijo	3137591109
C. Electrónico	ND
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.		Fabiel Ogue
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 26.17.193
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasaco Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☒ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Dora Torres	**Nombre**	
Cedula	1.064.121.889	**Cedula**	
Dirección	Tasaco bajo	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3136544008	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☒ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☒ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento ☒ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☒ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento ☒ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.		Diana Torres
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1064121889
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tocono Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No				
Humedades	☐ SI	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No			

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☐ **No**	**Grietas y fisuras**	☐ **Si**	☐ **No**			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No			
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No			

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio, sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Taxco Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Dexcy Aguilar
Cedula	26.572.249
Dirección	Cll 2 N° 9-01
Celular / Tel. fijo	3113487291
C. Electrónico	NO
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No		

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No	
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No	
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No	
Humedad	☐ Si ☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☒ No		
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No	
Humedad	☒ Si ☐ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No		

7. OBSERVACIONES GENERALES

El piso de la cocina es esmaltado, al igual que la habitacion principal, en regular estado.
El vidrio de la ventana de la fachada esta partido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.		Dexcy Aguilar
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 26572249
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tesoro Bajo
Dirección				
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado ☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial ☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío ☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Maryuris Montero	**Nombre**	
Cedula	1.002'624.431	**Cedula**	
Dirección	Cll 2 #9-98	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3127639377	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☒ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☒ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Cielorraso en poliestireno expandido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.		Marvurith Martinez
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1007624431
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasajero Baja	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Jimmy Guzmán
Cedula	1.065.129.572
Dirección	Cra 9C N° 1C-45
Celular / Tel. fijo	321 614 5510
C. Electrónico	Lalojandro6guzman@gmail.com
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA


Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☒ Si ☐ No	Desplazamiento		☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☒ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si ☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si ☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

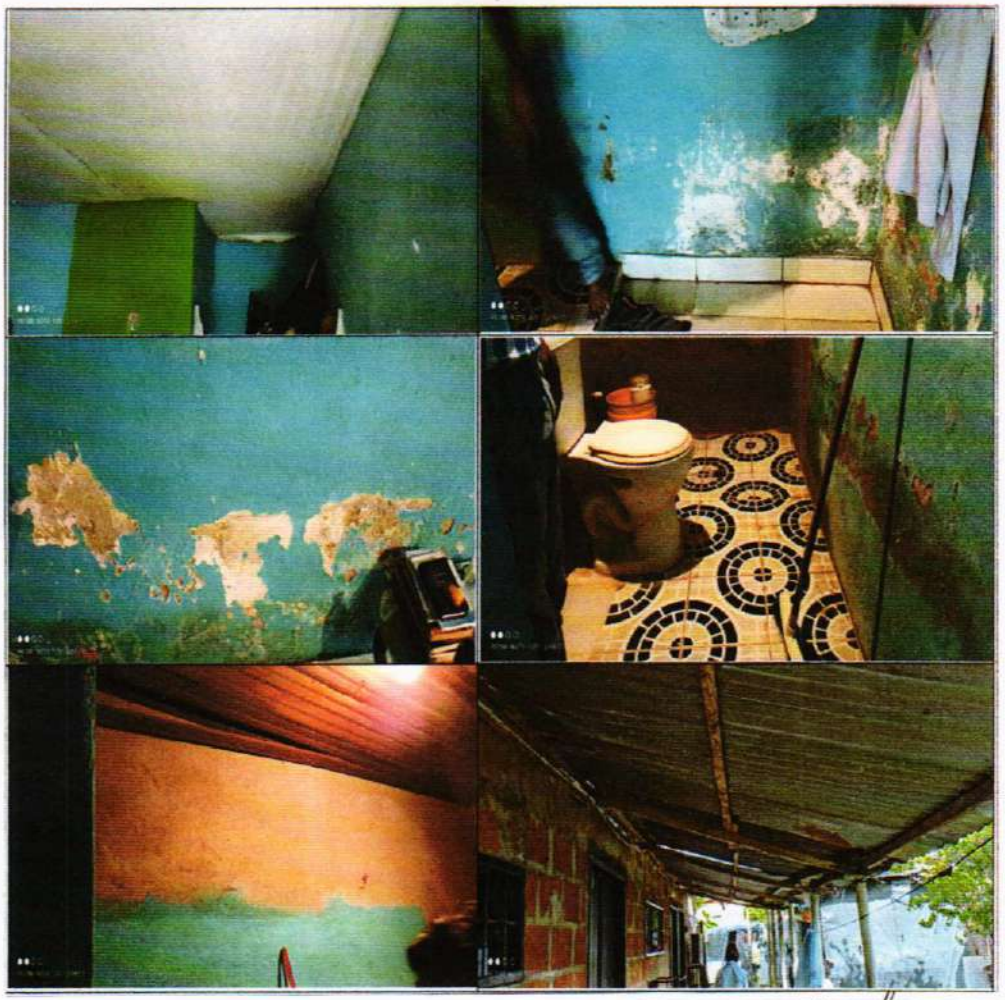

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1.065.128.572
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toxiaa Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Eliana Murcia	**Nombre**	
Cedula	1.056.775.023	**Cedula**	
Dirección	Cra 9E # A5 - 05	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3225407404	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	NO	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No				
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No			

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala				
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No			
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No			
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No			

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sondra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1056775023
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toscana Baja	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☒ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Construcción en abandono, sin información en mal estado

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasajero Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Anibal Garcia	**Nombre**	
Cedula	49.769.669	**Cedula**	
Dirección	Tasajero Bajo	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3105267341	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si ☐ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☒ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

La Vivienda presenta grietas de gran Profundidad.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

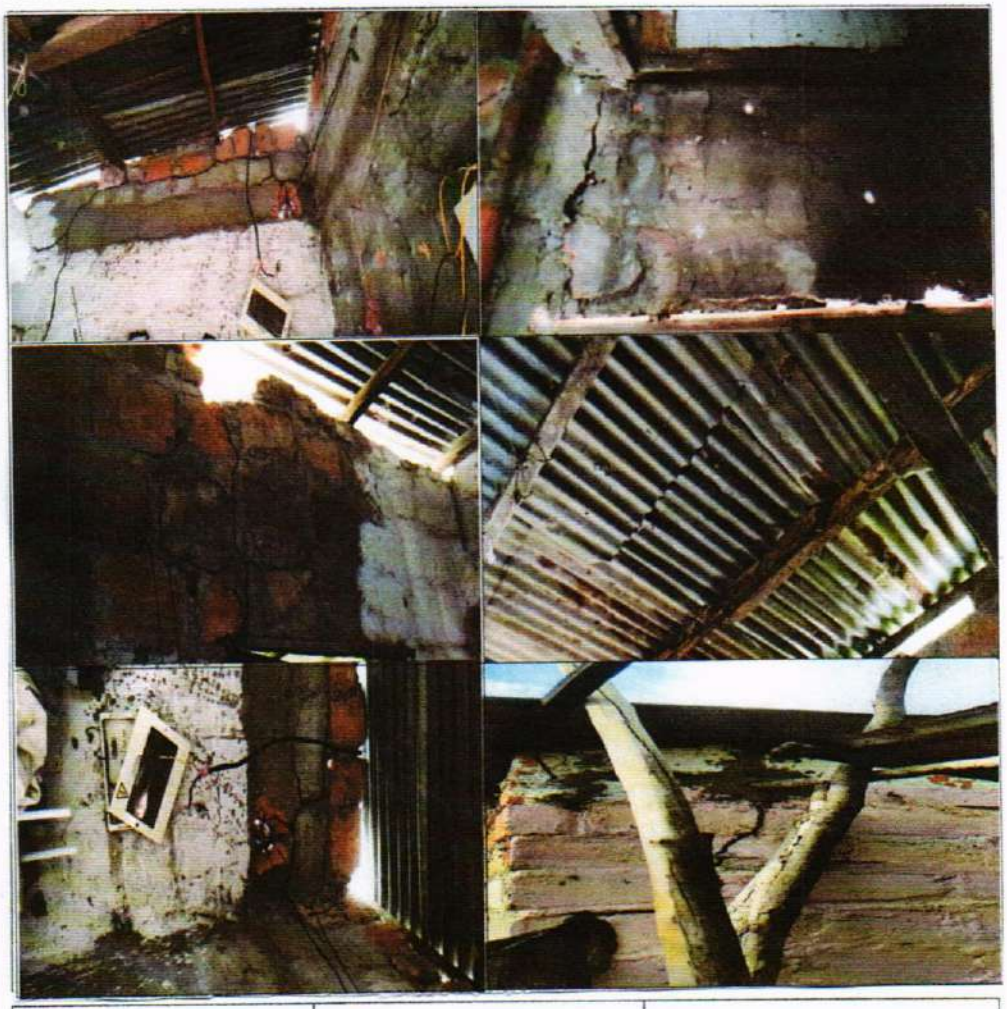

Sandra Triviño.		arelis García
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 49.768.669
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Toscana Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☒ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	Adalberto Castillejos
Cedula		Cedula	91241122
Dirección		Dirección	Crr 9D # 1C-28
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	3135656096
C. Electrónico		C. Electrónico	ND
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☒ Otro	prefabricado
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular ☐ Mala
Humedad	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro: Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular ☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular ☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si ☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si ☐ No			**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.



Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 91.247.122
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasaco Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☒ Otro?	Cuál?	Bloc	
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Robinson Lopez	**Nombre**	
Cedula	19.660.113	**Cedula**	
Dirección	Cra 9D # 1C-06	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3136464339	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☒ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☒ Si	☐ No	Cual: Internet			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ SI	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR


Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena ☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro: Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☒ Buena ☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si ☒ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si ☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

La mitad del interior de la vivienda, esta elaborada en Laminas de Zinc en mal estado. La otra mitad esta Cimentada en Concreto Con muros de ladrillo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	**VERSION: 01**
		Página: 3 de 3

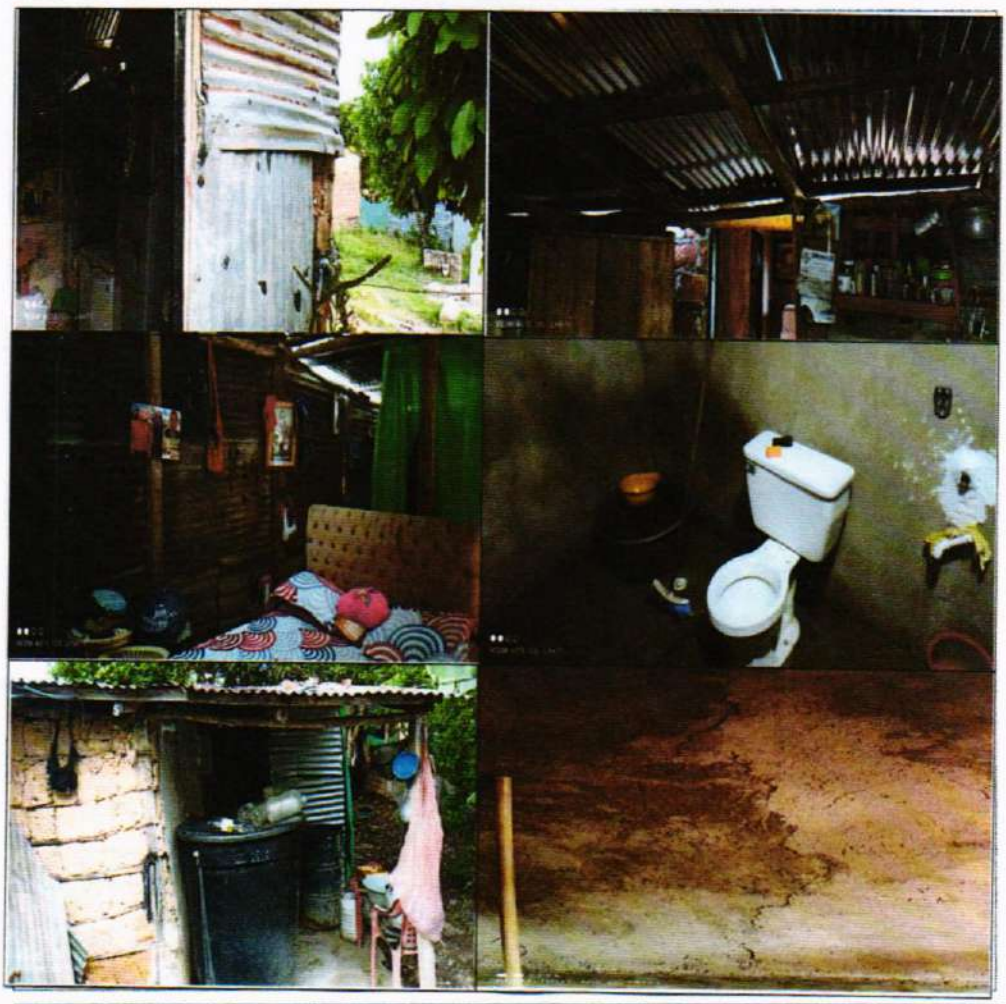

Sandra Triviño.		Provisional
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1066113
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toscano Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	Ana Alexandra Pacha Meso
Cedula		**Cedula**	26.996.528
Dirección		**Dirección**	Cll 1C # 9C-27
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	3206464793
C. Electrónico		**C. Electrónico**	NO
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las habitaciones principales cuentan con cielorroso en poliestireno expandido en mal estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

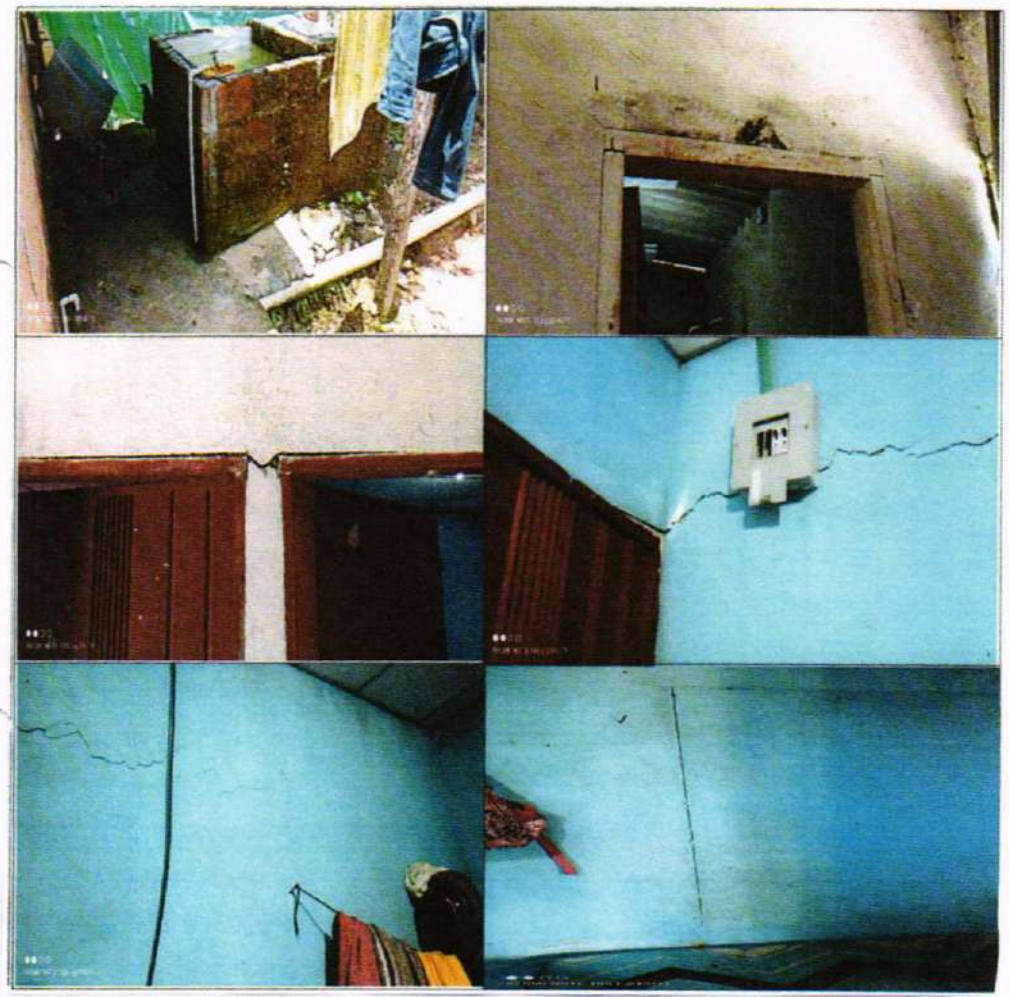

Sandra Triviño.		Ana Rosa Hernandez
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 26996528
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toscano Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☒ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Arisbel Ortiz	**Nombre**	
Cedula	45.431.711	**Cedula**	
Dirección	Cr 16 # 9C-41	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3207409769	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	NO	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☒ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA


Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☒ Otro	Pre fabricado		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si ☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☒ Si ☐ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

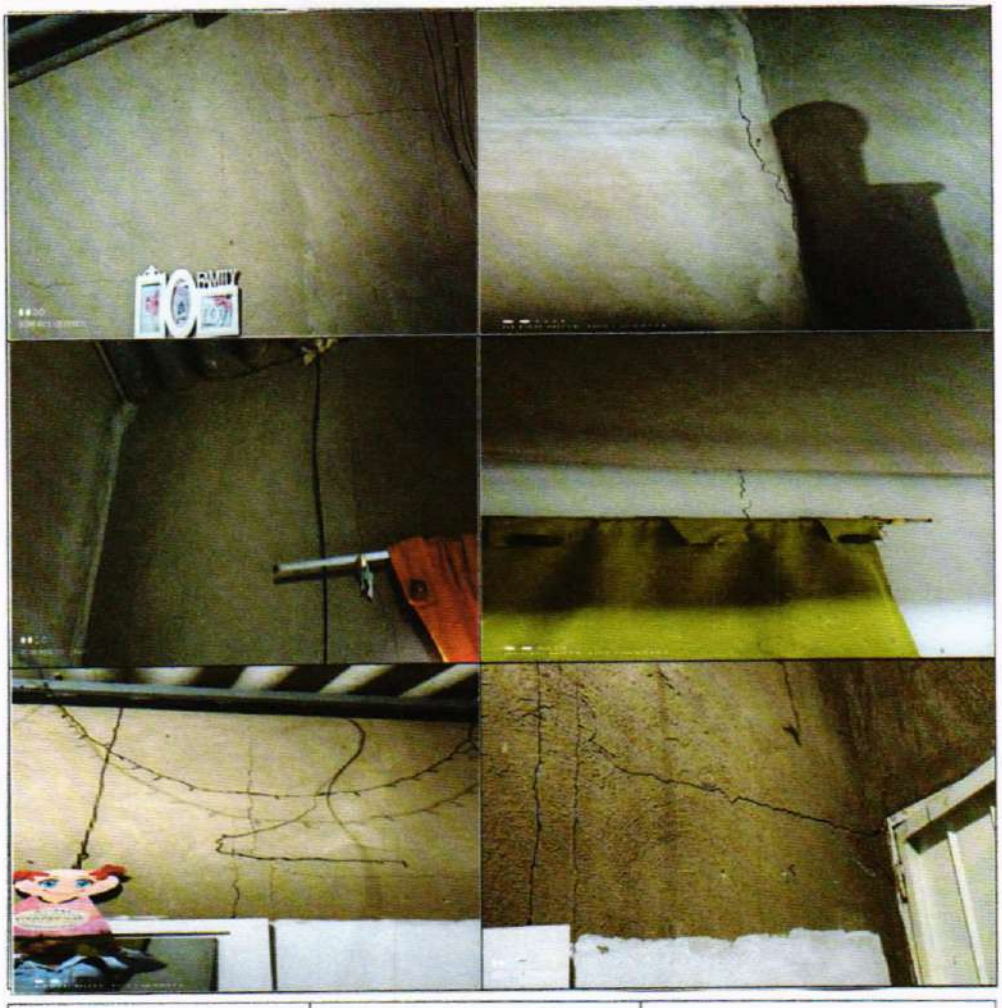

Sandra Triviño.		Aristobel Ospino L
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 45 431 711
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Toscano Alto	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio, sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.


Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

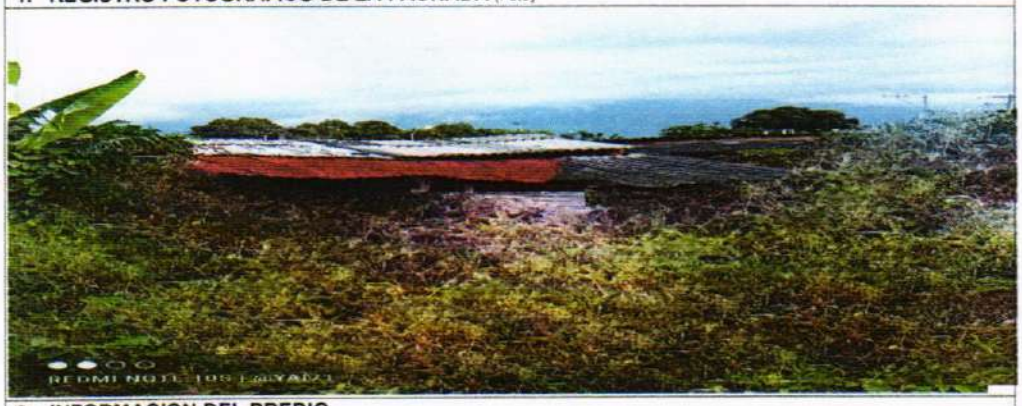

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasajero Alto	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio, sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Tasaco Bajo	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☒ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

La beneficiaria Dorys Tellez, manifiesta que no es necesario realizar un acto de vecindad a esta vivienda, puesto que el bien inmueble es de su propiedad, y no representa inconveniente alguno para la realización de las actividades relacionadas al proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		Dairis Marcela Torres
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 36.573.652
T.P.	T.P.	


La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

A13 – INFORME DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

SISTEMA DE GSTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

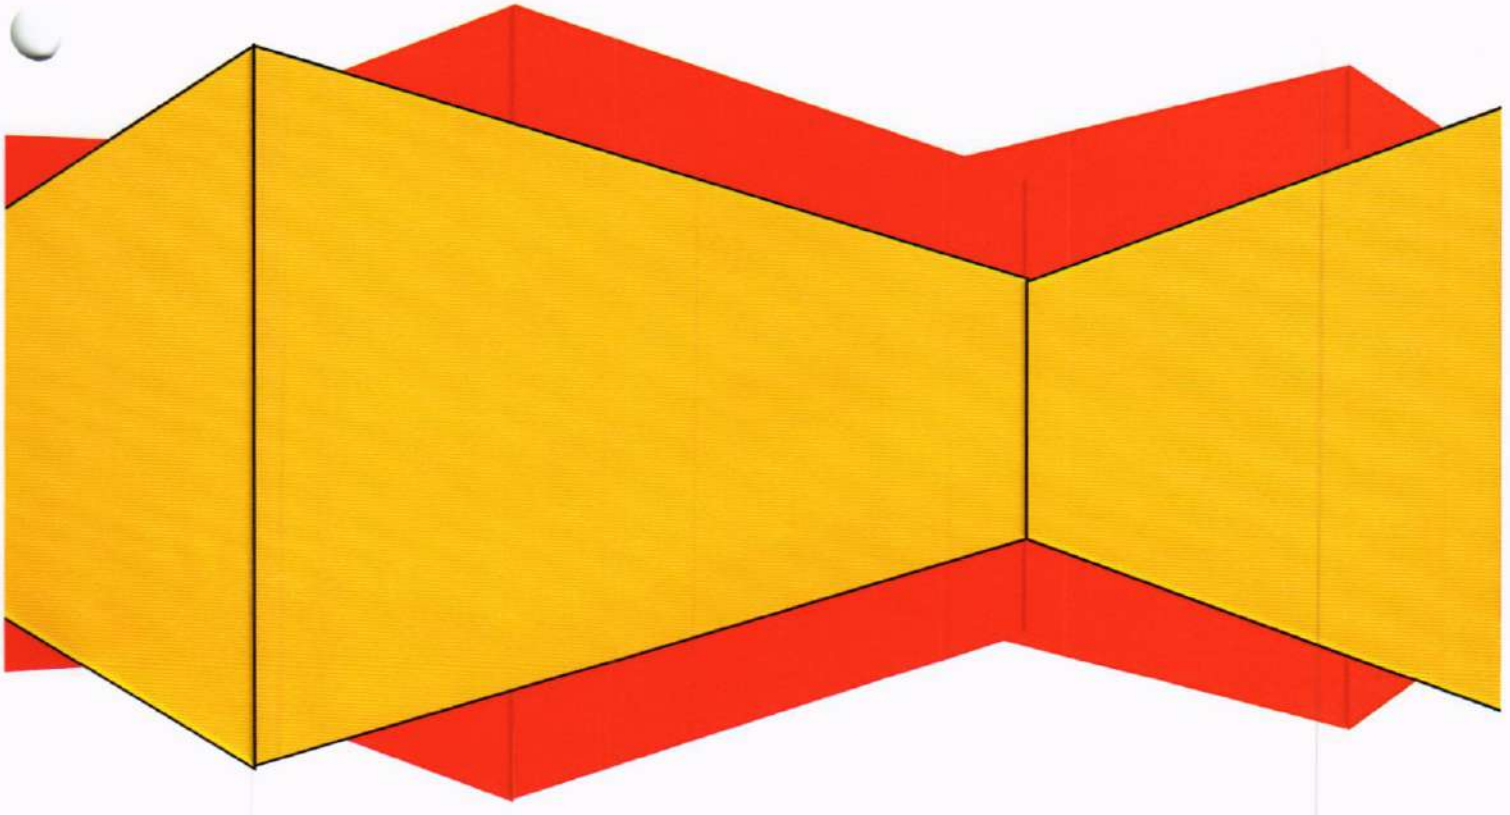

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CONSROCIO VIVEURB 2021

PERIODO: JUNIO DEL 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
JUNIO 2022

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 3

2. OBJETIVOS. 3

2.1. Objetivo General. 3

2.2. Objetivos Específicos. 4

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 5

4. MARCO JURIDICO Y LEGAL. 6

4.1. Dentro de las Leyes se Encuentran: 6

4.2. Los Decretos Referentes a este Sistema Son: 6

5. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 7

6.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En ElTrabajo 7

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MES. 8

7.1. Señalización. 9

7.2. Capacitación y/o Charlas de Seguridad Industrial. 10

7.3. Cronograma de Charlas y/o Capacitaciones Diarias. 10

7.4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos. 11

8. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 12

8.1. Actividades de Promoción y Prevención. 12

8.2. Entrega y Uso Adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP). 13

8.3. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14

8.4. Uso Adecuado de Elementos de Protección Personal (E.P.P). 14

9. CONCLUSIÓN 15

10. ANEXOS. 16

10.1. ENTREGA DE EPP 16

10.2. CHARLAS DE SEGURIDAD 24

10.3. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 32

10.4. ANALISI DE TRABAJO INSEGURO. 49

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCION.

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos claves que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal.

Este informe describe el compromiso asumido por el CONSORCIO VIVE URB 2021 EN LA JAGUA, estableciendo una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual está relacionada con las diferentes actividades que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores en los diferentes frentes de obra, ubicados en el Municipio de la Jagua de Ibirico.

El presente informe refleja los avances y actividades implementadas para promoción y prevención de la salud y seguridad de los trabajadores desde el inicio de la obra, mediante los diferentes programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo "SG – SST".

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.

Concientizar a los trabajares de la empresa CONSORCIO VIVE URB 2021 a cerca

de los factores de riesgos a los cuales están expuesto en su labor y realizar una evaluación de los factores de riesgo que existen en los sitios de trabajo dentro de la empresa, con el fin de tomar las medidas de control para evitar los posibles enfermedades o accidentes laborales.

2.2. Objetivos Específicos.

- Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo, para identificar posibles factores de riesgo.
- Priorizar los factores de riesgo que se presenten y colocarlos en plan de mejora.
- Capacitar al personal para reducir porcentajes de accidentalidad.
- Realizar vigilancia al Panorama de Factor de Riesgos.
- Hacer cumplir el uso permanente en obra de los elementos de protección individual (EPI).
- Atender las solicitudes realizadas por la interventoría y corregir.
- Realizar encintado de peligro en los puntos necesarios.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida, pedro castro y villa chelsy.



MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24' de latitud norte y 73º20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4. MARCO JURIDICO Y LEGAL.

4.1. Dentro de las Leyes se Encuentran:

Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud en el Trabajo y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema de Riesgos Laborales

4.2. Los Decretos Referentes a este Sistema Son:

Decreto 614 de 1984: por el que se determinan las bases para la organización y administración de la Salud en el Trabajo.

Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 1771 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994

Decreto 1772 de 1994: Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 1832 de 1994: determinan las tablas de enfermedades laborales

Decreto 2100 de 1995: Por la cual se establece la clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales

Decreto 2566 de 2009: Por la cual se adopta la tabla de enfermedades laborales.

Decreto 1443 de 2014: Establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto 1477 de 2014: Actualización de la Tabla de Enfermedades Laborales.

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

5. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

desde el inicio de las actividades que viene dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los cuales dictan disposiciones para la estructura e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST), adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan en beneficio de todos sus colaboradores y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento, para lo cual ha diseñado y estructurado los documentos requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con una Política y Objetivos generales y específicos de seguridad y salud en el trabajo definidos y socializados a los trabajadores, para lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en los diferentes procesos.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO.

A continuación, las gestiones de seguridad y salud en el trabajo durante este periodo de actividades, donde también se incluyeron nuevas actividades correspondientes a la prevención, mitigación y control del riesgo biológico por el virus COVID-19:

6.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En ElTrabajo.

Con el fin de orientar, ejecutar y evaluar de manera diaria las acciones encaminadas a lograr el mayor grado de seguridad y bienestar integral de los trabajadores y asistentes a los diferentes frentes de trabajo, se diseñó e implementó un plan de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo, conresponsables e indicadores.

6.2. Inspecciones planeadas a actividades críticas

Se socializo el procedimiento análisis seguro de trabajo e inspecciones pre operacionales para las actividades manuales y mecánicas.
La Inspección de herramientas, inspección de extintores y de equipos como motobombas planta eléctricas generadores de energías, lámparas vehículos y áreas de trabajo, se realiza análisis de trabajo (AST) formato de inspección pero operacional vehículos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MES.

TIPO DE INSPECCION	FECHA	RESPONSABLE
Inspección del Botiquín	JUNIO: 09, 18.	Inspector SISO
Inspección de Herramientas.	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones de HSEQ	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones extintores.	JUNIO: 09, 18.	Inspector SISO
Inspecciones de equipos eléctricos.	Diarios	Inspector SISO
Inspecciones a los vehículos	Semanales	Inspector SISO
Inspección áreas de trabajo	Diarias	Inspector SISO
AST: análisis seguro de trabajo.	Semanales	Inspector SISO
Inspecciones pre operacional a maquinarias.	Diarias	Inspector SISO
Inspección de elementos de protección personal	Diarias	Inspector SISO



Inspección del Botiquín



Inspecciones extintores.

Se capacito al personal sobre el uso del extintor a continuación se plasma lo dicho.

- Hale el pasador;
- Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas;
- Apriete el gatillo manteniendo el extintor en la posición vertical;
- Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.1. Señalización.

Con el objetivo de Prevenir accidentes laborales y a terceros se está implementando el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de las obras.

En el mes de JUNIO los elementos utilizados para la demarcación de los diferentes componentes se inspeccionaron y se encontraron algunos puntos sin señalización a lo cual la interventoría solicito de manera inmediata la toma de correctivos.



Todas las zonas en que se están llevando a cabo actividades de construcción y que estén expuestas al público son adecuadamente señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes.

Se está aislando y demarcando los diferentes sectores de la obra, como oficinas, almacén, depósito de materiales, bodegas, comedor, servicios sanitarios, vestidores, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades

7.2. Capacitación y/o Charlas de Seguridad Industrial.

Antes del inicio de las actividades diarias se realiza la oración a DIOS todo poderoso para recargarnos espiritualmente y charlas de seguridad.

Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.



CHARLAS



CAPACITACION

7.3. Cronograma de Charlas y/o Capacitaciones Diarias.

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE CHARLA DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DEL 2022				HORA:06;30 am	
VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
1	2	4	5	6	7
AMBIENTES DE TRABAJO	EL ALMACENAMIENTO ADECUADO EVITA ACCIDENTES	TRABAJAR CORRECTAMENTE	CONDICIONES CLIMATICAS	EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA CARA	HERRAMIENTAS Y PALANCAS
8	10	11	12	13	14
ROPA PROTECTORA	MANEJO Y APILAMIENTO DE MATERIAL	LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	LAS LLAVES Y LAS LESIONES	MANGOS DE HERRAMIENTAS
15	16	18	19	20	21
LAS ESLINGAS	COMO USAR EL ARNES	HERRAMIENTAS CORTANTES	PAUSAS ACTIVAS	DIGALE ¡NO!! A LOS ACTOS INSEGUROS	PROTECCION PARA LA CABEZA
22	23	25	26	27	28
USO DE LOS GUANTES	USO DE CORTADORAS MECANICAS	TIPOS DE GUANTES, SEGÚN SU ACTIVIDAD	MANEJO DE RESIDUOS	¿QUE ES UNA INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO?	EXCAVACIONES
29	30				
ENFERMEDADES EN LA PIEL	ORDEN Y ASEO				
Nota: Todos los dias se socializara tema relacionado al covid-19, lavado de manos y distanciamiento social.					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos.

Se realizó la identificación de los peligros de las actividades de coordinación de diseño por tareas, y se identifica que los más recurrentes son los riesgos psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y físicos.

Todas las zonas en que se están llevando a cabo actividades de construcción y que estén expuestas al público son adecuadamente señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes; En la noche se deben colocar avisos refractivos, luminosos o intermitentes en caso de ser necesario.



Se está aislando y demarcando los diferentes sectores de la obra, como oficinas, almacén, depósito de materiales, bodegas, comedor, servicios sanitarios, vestidores, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.


El Programa de Salud Ocupacional, consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas.

8.1. Actividades de Promoción y Prevención

Se viene implementando actividades de promoción y prevención que permiten mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados. Así mismo se tienen identificados algunos lugares donde los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales están latentes a su vez son controlados con estas acciones mencionadas anteriormente se ha logrado beneficios como: Se mejora la calidad del ambiente laboral, se logra mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora también la productividad y la calidad de los productos y servicios.



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

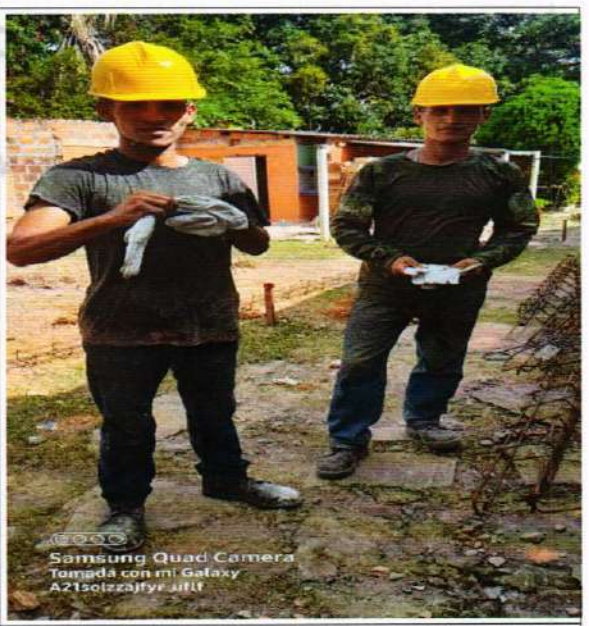

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa con la participación de los trabajadores.


Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. Debe actualizarse como mínimo una vez al año, según se presenten cambios en los factores de riesgo o en los procesos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.


8.2. Entrega y Uso Adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

Con el objetivo de darle un mínimo margen a los posibles accidentes laborales se viene haciendo entrega de los elementos de protección personal (EPP), por parte de los profesionales en campo se viene haciendo seguimiento para que cada trabajador porte correctamente los elementos, aquellas personas o trabajadores que reincidan en el no uso correcto o no usos de estos elementos de protección son sancionados y retirados de la obra, si así lo solicita la interventoría o el profesional a cargo del contratista.

El personal tiene todo el equipo de Seguridad Industrial requerido para realizar las labores, según el puesto de trabajo. Los EPP (Elementos de Protección Personal) se encuentran identificados en el panorama de factores de riesgo.

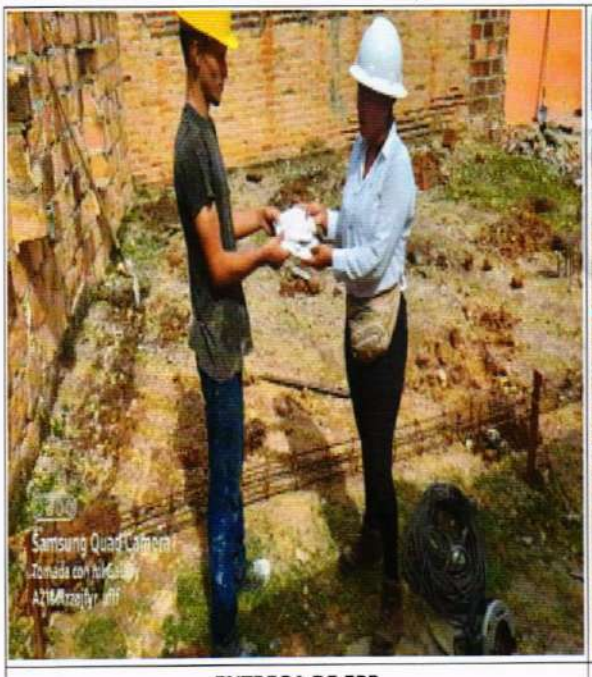

ENTREGA DE EPP

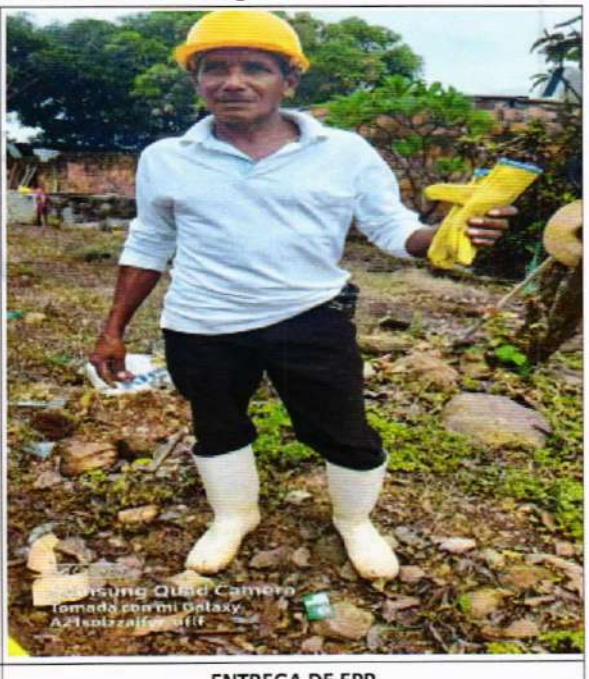

ENTREGA DE EPP

Algunos de los elementos de protección individual entregados son:

- Alcohol.
- Mascarillas protectoras (covid19).
- Gafas de seguridad.
- Guantes.
- Cascos.
- Protectores auditivos


carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8.3. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.


Durante el mes de JUNIO 2022, no se presentaron accidentes laborales, debido a los controles operacionales implementados y ejecutados por la profesional en campo del contratista.

8.4. Uso Adecuado de Elementos de Protección Personal (E.P.P).

Los EPP se suministran a los funcionarios al momento de ser contratados, según las actividades que cada funcionario y contratista realicen, según la matriz de identificación de peligros de la entidad y matriz de elementos de protección personal; mediante los profesionales en campo del contratista e interventoría se hace seguimiento a los trabajadores para que hagan uso adecuado de estos elementos de protección.

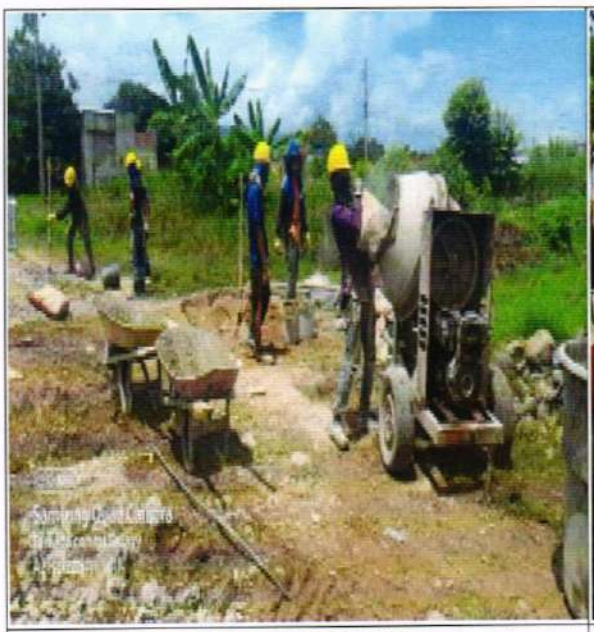

USO ADECUADO DE EPP

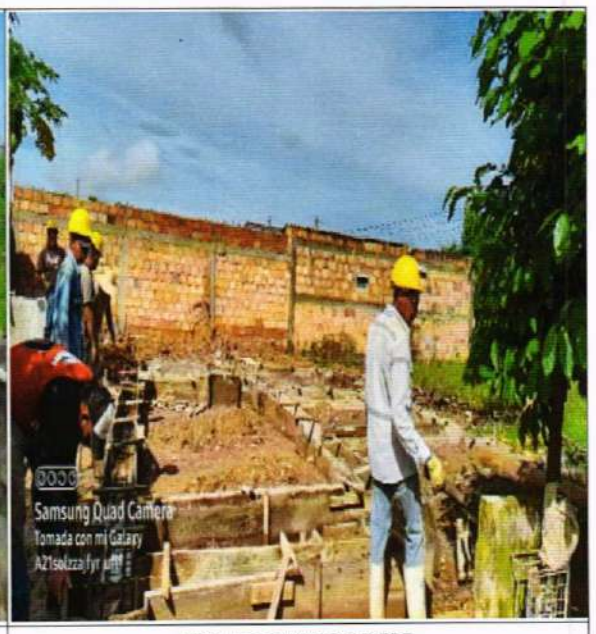

USO ADECUADO DE EPP

Mediante las charlas se les hace a los trabajadores crear conciencia del porque y para que deben usar correctamente estos elementos de protección personal.

Aquellos trabajadores que sean sorprendidos realizando actividades en campo y no porten los epp se les llamarán la atención, si persisten en no usar los elementos serán suspendidos y se les pasara un memorando y en caso extremo se dará por terminado su contrato laboral, esto con el fin de evitar posibles accidentes y mantener una obra protegida y segura siempre.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9. CONCLUSIÓN

El Consorcio VIVEURB 2021 por medio de sus profesionales viene realizando continuamente planes de mejoras, así mismo viene haciendo inspecciones de trabajos con el objetivo de reducir al máximo los posibles accidentes laborales.

Se viene realizando jornadas de capacitaciones tanto a los trabajadores como a los habitantes aledaños al proyecto este último con el fin de generar sentido de pertenencia por la obra construida y también para que eviten que sus familiares entre todos los niños no hagan ingreso a la obra y se expongan en peligro.

Se está cumpliendo con las metas de tener cero incidente y cero accidente laboral gracias a la buena implementación del sistema de gestión SG- que a diario hace la profesional siso del CONSORCIO VIVEURB 2021.

Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

Lizeth K Moreno C.

LIZETH KARINA MORENO CASTRILLO.
TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10. ANEXOS.

10.1. ENTREGA DE EPP

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yeiser Arley Vasquez.		
CÉDULA:	1.063.490.774.	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	02-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	08-06-22	3
2	Gafas de seguridad	08-06-22	3
3	Tapabocas	08-06-22	4
4	Kit de desinfeccion.	08-06-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	13-06-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Yeiser Vasquez
1063 490 774

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luis Atendo		
CÉDULA:	17.413.347.	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	02-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	08-06-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	08-06-22	3
3	Tapabocas.	08-06-22	4
4	Kit de desinfección	08-06-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	13-06-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Luis Atencio
C.C. 17913347

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Alfredo Acosta.		
CÉDULA:	77. 104. 760	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	02-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	08-06-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	07-06-22	3
3	Tapabocas.	08-06-22	3
4	Kit de desinfección	08-06-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	13-06-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Ilzelh I.C. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ilzelh Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

alfredoacosta
cc 77104760

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Ernesto Arias		
CÉDULA:	1.064.128822	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	07-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	13-06-22	3
2	Gafas de seguridad	13-06-22	3
3	Tapabocas.	13-06-22	5
4	Kit de desinfeccion.	13-06-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	13-06-22	4
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Juan Arias
C.C 1064128822

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Leopoldo Alvarez.		
CÉDULA:	88.138.160	OCUPACIÓN:	Oficial.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	07-06-22.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	13-06-22	3
2	Gafas de seguridad.	13-06-22	3
3	Tapabocas.	13-06-22	5
4	Kit de desinfeccion.	13-06-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	16-06-22	4
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Leopoldo Alvarez C
CC 88138160

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Ruda		
CÉDULA:	1.065.586.802	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	28-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	30-06-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	30-06-22	3
3	Tapabocas.	30-06-22	5
4	Kit de desinfección	30-06-22	3
5	Guantes tipo ingeniero	30-06-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Daniel Ruda
C.C 1.065.586.802

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daimer Navarro		
CÉDULA:	1.128.150.086.	OCUPACIÓN:	Aydante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	29-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Botas de seguridad.		1
2	Camisas.		2
3	Pantalon.		2
4			
5			
6			
7.			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1004.113.046
CARGO:	Sso.	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Daimer
CC 1128150086

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Javier Morales Viña		
CÉDULA:	13.999.018	OCUPACIÓN:	Conductor
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	29-06-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Botas de seguridad		1
2	Camisa		2
3	pantalon		2
4			
5			
6			
7.			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth V. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

JMV
CC 13499018


carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.2. CHARLAS DE SEGURIDAD



CIUDAD Y FECHA: 01-06-22 La Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Investigacion de Accidente

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Hugo Rodriguez	12584583	Soldador	construcción	N/A		
Jhon Rodriguez	12524464	Soldador	construcción	N/A		
Jhonedis Barrios	1064777204	Soldador	construcción	N/A		
Edison cabarca	1007980271	Soldador	construcción	N/A		
williston Mojica	12523381	Soldador	construcción	N/A		
Lorenzo Torres	12521388	Oficial	construcción	N/A		
Elimeth Torres	1064112289	Soldador	construcción	N/A		
carlos torres	12521646	Soldador	construcción	N/A		
Felipe Torres	12521099	Soldador	construcción	N/A		
Onobis Dominguez	12685229	Oficial	construcción	N/A		
Neopoldo Alvarez	88188760	Auxiliar	construcción	N/A		
Hector Parra	1009120798	Oficial	construcción	N/A		
Edison Paba	1064109835	Auxiliar	construcción	N/A		
Robes Garcia	1960067 48	Oficial	construcción	N/A		
Alfredo Acosta	17709760	Auxiliar	construcción	N/A		
Luis Atencio	19413947	Oficial	construcción	N/A		
Yeiser Vasquez	1063490774	Auxiliar	construcción	N/A		

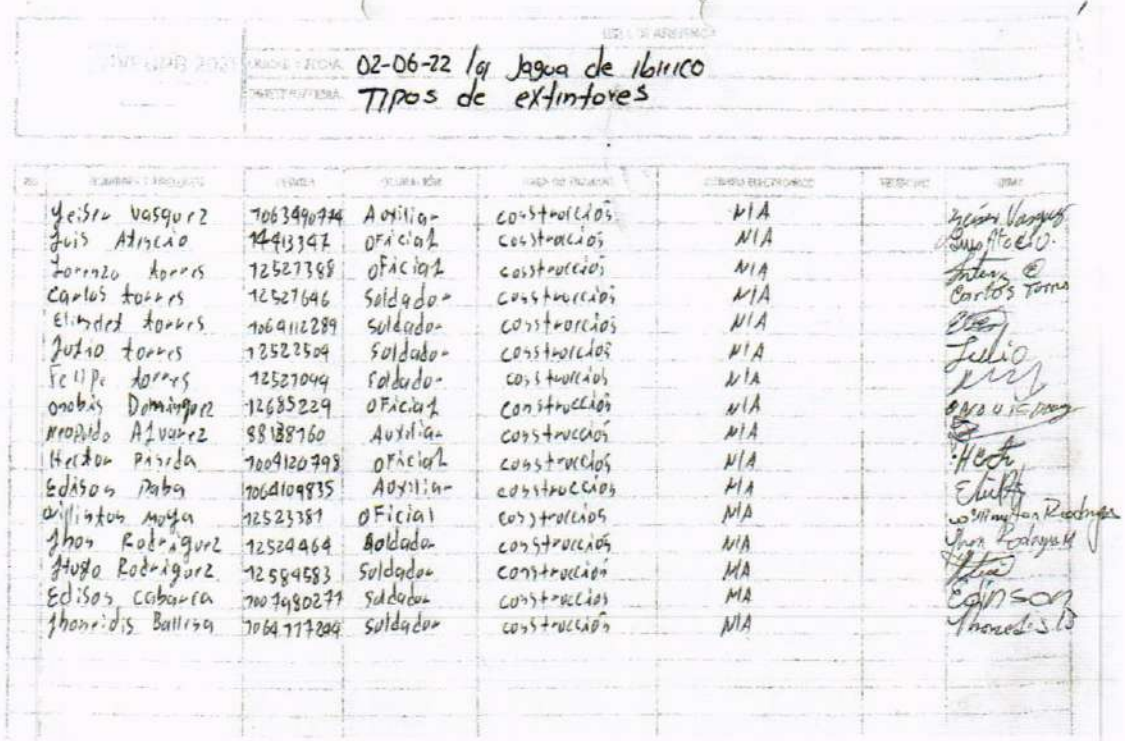

CIUDAD Y FECHA: 02-06-22 La Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Tipos de extintores

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Yeiser Vasquez	1063490774	Auxiliar	construcción	N/A		
Luis Atencio	19413947	Oficial	construcción	N/A		
Lorenzo Torres	12527388	Oficial	construcción	N/A		
Carlos Torres	12527646	Soldador	construcción	N/A		
Elimeth Torres	1064112289	Soldador	construcción	N/A		
Julio Torres	12523504	Soldador	construcción	N/A		
Felipe Torres	12527044	Soldador	construcción	N/A		
Onobis Dominguez	12685229	Oficial	construcción	N/A		
Neopoldo Alvarez	88188760	Auxiliar	construcción	N/A		
Hector Parra	1009120798	Oficial	construcción	N/A		
Edison Paba	1064109835	Auxiliar	construcción	N/A		
williston Mojica	12523381	Oficial	construcción	N/A		
Jhon Rodriguez	12524464	Soldador	construcción	N/A		
Hugo Rodriguez	12584583	Soldador	construcción	N/A		
Edison Cabarca	1007980271	Soldador	construcción	N/A		
Jhonedis Barrios	1064777204	Soldador	construcción	N/A		

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

VIVEURB 2021 — 03-06-22 la jagua de ibirico
Prevencion de Accidentes

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	FIRMA DE ENTERADO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Luis Atencio	19413387	oficial	construcción	N/A		Luis Atencio
	Yeiser Vasquez	1063490779	Auxiliar	construcción	N/A		Yeiser Vasquez
	Hector Pinda	1004120749	oficial	construcción	N/A		Hector
	Edison Puba	1064709855	Auxiliar	construcción	N/A		Edison
	Alfredo Acosta	77704760	Auxiliar	construcción	N/A		Alfredo Acosta
	Ruben Gomez	79600678	oficial	construcción	N/A		Ruben G

VIVEURB 2021 — 04-06-22 la jagua de Ibirico
Riesgo Electrico

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	FIRMA DE ENTERADO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Luis Atencio	19413397	oficial	construcción	N/A		Luis Atencio
	Yeiser Vasquez	1063490779	Auxiliar	construcción	N/A		Yeiser Vasquez
	Hector Pinda	1004120749	oficial	construcción	N/A		Hector
	Edison Puba	1064709855	Auxiliar	construcción	N/A		Edison
	Alfredo Acosta	77704760	Auxiliar	construcción	N/A		Alfredo Acosta
	Ruben Gomez	79600678	oficial	construcción	N/A		Ruben G

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

LUGAR Y FECHA: 06-06-22 la jagua de ibirico
OBJETO DE LA CHARLA: Proteccion Auditiva

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Luis Atencio	79913747	Oficial	construcción	N/A		LuisAtencio
	yeisa vasquez	1063490774	Auxiliar	construcción	N/A		
	Hector Pitre da	1009120749	Oficial	construcción	N/A		
	Edison Pabon	1064109835	Auxiliar	construcción	N/A		
	Alfredo Acosta	77709760	Auxiliar	construcción	N/A		
	rubiro gomez	79600078	Oficial	construcción	N/A		
	Edwin vega	1.009.109526	Auxiliar	construcción	N/A		
	Fenel Lopez	18.974.763	Oficial	construcción	N/A		
	Ivan Angulo	1.006854.125	Auxiliar	construcción	N/A		
	Jose camaño	12521. 843	Auxiliar	construcción	N/A		
	yaira carabaño	5.164.672	Auxiliar	construcción	N/A		
	Daniel Roda	1.005.586.802	Auxiliar	construcción	N/A		

LUGAR Y FECHA: 07-06-22 la jagua de ibirico
OBJETO DE LA CHARLA: lesiones en la piel

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Luis Atencio	79913747	Oficial	construcción	N/A		LuisAtencio
	yeisa vasquez	1063490774	Auxiliar	construcción	N/A		
	Edison Pabon	1064109835	Auxiliar	construcción	N/A		
	Hector Pitre da	1009120749	Oficial	construcción	N/A		
	rubiro gomez	79600078	Oficial	construcción	N/A		
	Alfredo Acosta	77709760	Auxiliar	construcción	N/A		
	Edwin Vega	1.009109526	Auxiliar	construcción	N/A		
	Daniel Roda	1.005.586.802	Auxiliar	construcción	N/A		
	Jose camaño	12521.843	Auxiliar	construcción	N/A		
	Ivan angulo	1.006.854.125	Auxiliar	construcción	N/A		
	yaira carabaño	5.164.672	Auxiliar	construcción	N/A		
	Fenel Lopez	18974763	Oficial	construcción	N/A		
	Alberto Flores	1003291188	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Cristo	1064121822	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Anders	1009123815	Auxiliar	construcción	N/A		
	Jorgis Marquez	17579398	Oficial	construcción	N/A		

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

LUGAR Y FECHA: 08-06-22 la Jagua de Ibirico
CAPACITACION TEMA: Condiciones climaticas

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Grisis Vasquez	1063490774	Auxiliar	construcción	N/A		
	Luis Atencio	1063	Oficial	construcción	N/A		
	Elkin Torres	1064112289	Soldador	construcción	N/A		
	Carlos Torres	12521696	Soldador	construcción	N/A		
	Julio Torres	12522584	Soldador	construcción	N/A		
	Felipe Torres	12521099	Soldador	construcción	N/A		
	Albrito Flores	1064291188	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Ernesto	1064121822	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yoaquis Morales	17579398	Oficial	construcción	N/A		
	Juan Andres	1064123135	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yadis Morales	28746124	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yaime Caraballo	5164672	Auxiliar	construcción	N/A		
	Fernel Lopez	12979783	Oficial	construcción	N/A		
	Edwis Vega	1064109526	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Angulo	1064854125	Auxiliar	construcción	N/A		
	Jose Camargo	12521893	Auxiliar	construcción	N/A		
	Daniel Roda	1065686802	Auxiliar	construcción	N/A		
	Alfredo acosta	77209760	Auxiliar	construcción	N/A		
	Rubis Gomez	796006 78	Oficial	construcción	N/A		
	Nicoldo Alcazar	85738960	Oficial	construcción	N/A		

LUGAR Y FECHA: 09-06-22 la Jagua de Ibirico
CAPACITACION TEMA: Herramientas Manuales

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Alfredo Acosta	77209760	Auxiliar	construcción	N/A		
	Rubis Gomez	796006 78	Oficial	construcción	N/A		
	Albinio Flores	1063291188	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Andres	1064123135	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yaime caraballo	5164672	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yadis morales	28746124	Auxiliar	construcción	N/A		
	Stivis calderon	1193534100	Auxiliar	construcción	N/A		
	Juan Ernesto	1064121822	Auxiliar	construcción	N/A		
	Yoaquis morales	17579398	Oficial	construcción	N/A		
	Hector pineda	1064120748	Oficial	construcción	N/A		

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA Y HORA: 10 - 06 - 22 la jagua de Ibirico
CAPACITACION/TEMA: Alarge de calor

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Yorguis morales	17579398	Oficial	construccion	N/A		Yorguis
	Alberto Flores	1003291138	Auxiliar	Construcción	N/A		
	Juan Anders	1009123135	Auxiliar	Construcción	N/A		Juan Anders
	Jorge mejia	1069927698	Auxiliar	Construcción	N/A		ROMULO MECIA
	Edwin Calderon	1193539100	Auxiliar	construcción	N/A		Edwin C.J.
	Juan Hernesto	1064121822	Auxiliar	Construcción	N/A		Juan Ernesto

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA Y HORA: 13 - 06 - 22 la jagua de Ibirico
CAPACITACION/TEMA: Resbalos, Tropiezos y Caidas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	yaluis caraballo	5169672	Auxiliar	construcción	N/A		
	Frenel lopez	78079463	Oficial	construcción	N/A		Frenel Lopez
	Daniel Ruda	1005586802	Auxiliar	construcción	N/A		Daniel Ruda
	Jose caraballo	12521893	Auxiliar	construcción	N/A		Caraballo

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 23-06-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Atencio	19913347	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Luis Atencio
2	yeiser vasquez	1063490719	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	yeiser Vasquez
3	Hector Pineda	1009120798	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Hecto
4	Rapido Alvarez	85138160	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	
5							
6							
7							
8							
9							

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 24-06-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Atencio	19913347	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Luis Atencio
2	yeiser vasquez	1063490719	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	yeiser Vasquez
3	hector pineda	1009120798	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Hecto
4	Fernel Lopez	1891 19763	Oficial	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Fernel Lopez
5	Jose carrazo	12521893	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Carraza
6	Ivan Angulo	1006854125	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Ivan Angulo
7	Edwin Vega	1004969526	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Edwin
8	Daniel Roda	1005868582	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Daniel Roda
9							
10							
11							
12							
13							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 28-06-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Atencio	19413397	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Luis Atencio
2	yeisa vasquez	1063990774	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Yeisi Vargas
3	Hector pacheco	1004120798	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Hccty
4	Daniel Ruda	1005586802	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Daniel Ruda
5	Edwin vega	1004169526	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Edwin
6	Ivan Angulo	1006859125	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Ivan Angulo
7	Jesi camaño	12521893	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Camaño
8	Fernel Lopez	18974763	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Fernel López
9							
10							
11							
12							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 29-06-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Daniel Ruda	1005586802	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Daniel Ruda
2	Jose camaño	1004169526	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Camaño
3	Ivan Angulo	1006859125	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Ivan Angulo
4	Edwin Vega	12521893	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00 pm	Edwin
5	Fernel Lopez	18974763	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Fernel López
6	Luis Atencio	19413397	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Luis Atencio
7	yeisa vasquez	1063990774	Auxiliar	07:00 Am	12:00 pm	5:00pm	Yeisi Vargas
8	Hector pacheco	1004120798	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Hccty
9							
10							
11							
12							
13							
14							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 30-06-22 La Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Atencio	19413393	OFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Luis Atencio
2	Yisis Vasquez	1063996734	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Yesis Vasquez
3	Hector Pérez	1009120788	oFicial	07:00 Am	12:00pm	5:00 pm	Hecto
4	Ivan Angulo	1006559125	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Ivan Angulo
5	Edwin Vega	1004109526	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	5:00pm	Edwin
6	Daniel Ruda	1005586802	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	5:00pm	Daniel Ruda
7	Jose campaña	12521693	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	5:00pm	Campaña
8	Ferbel Lopez	1897963	oFicial	07:00Am	12:00pm	5:00pm	Ferbel López
9							
10							

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.3. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Izeth K. Moreno C.	FECHA	06	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Hector Pineda	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA			
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, nivel, pala, Caneluilla, Cortadora		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de epp.
2	Alto.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Cortaduras	Generacion de	ecologico
4	Mezcla	Machucones	Material Particu-	- Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSERA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	lizeth K. Moreno C.	FECHA	06	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Ruben Gomez.

NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Hampostería

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretilla, Balde, nivel, pala, cortadora

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caídas	Generacion de	uso de EPP.
2	Hilo.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Machucones	Material parti-	Proteger los
5	Inicio pega de		culado	frentes de
6	Bloque.			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y EMERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		EMERGIAS PERSONAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Alfredo Acosta	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE DRUANTE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	01	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Hector Pineda	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1.		
DESCRIPCION DE LA TAREA A EJECUTAR	Mamposteria.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, Balde, Pala, Cortadora, nivel.		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortadora.	Generacion de	Uso de EPP.
2	H40.	Caidas	Residuos.	Uso de Punto
3	Preparacion de la	Machacones	Generacion de	Ecologico
4	Mezcla.	Golpes.	Material particulado.	proteger los
5	Inicio pega de			frentes de trabajo
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Edinson Pabon	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SALUDATE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Ineth V. Moreno C.	FECHA	01	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Lorenso torres	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	3		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Instalacion Estructura Metalica.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	soldadora, cortadora, polidora.		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DISPUESTAS
1	Limpieza.	Caidas	Generacion de	uso de epp.
2	Traslado del	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Material.	Golpes.	Generacion de	Ecologico
4	Instalacion de		Material parti-	Proteger los
5	la Tuberia.		culado.	Frentes de trabajos
6	Inicio de			para Minimizar
7	Estructura.			los Riesgos
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE AREAS
	TRABAJOS CON MATERIALES PELIGROSOS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES IDENTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSSRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DISPUESTOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Felipe torrez	
2	Carlos torrez	
3	Elimelet torrez	
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&TA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lineth K. Moreno C.	FECHA	01	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Ruben Gamez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Hamposteria	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, pala, carretilla, cortadora, nivel		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DISPUESTAS
1	Corte de Bloque	Cortadora.	Generacion de	uso de EPP
2	H10.	Golpes	Desiduos.	uso de Punto
3	Preparacion de la	Caidas	Generacion de	Ecologico
4	Mezcla.	Machucones	Material parti-	Proteger los
5	Inicio pega de		culado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos.
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON RIESGOS PELIGROSOS		MONTAJES CARGAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&TA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Alfredo Acosta	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Ruben Gam
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — CONSORCIO SALUDABLE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Iveth K. Moreno C. — FECHA: 02 / 06 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Hector Pineda. — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mampostería. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Cartellilla, palu, Balde, Cortadora.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de Epp.
2	H10.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Machucones	Material parti-	
5	Inicio pega de		culado.	
6	Bloque.			
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREA
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARIDAD LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Edason Daba	Edason
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SALUDEYE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Izeth E. Moreno C	FECHA	02	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	ONobis	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretilla, Balde, nivel, pala, cortadora.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	uso de epp.
2	tho.	Caidas	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Machucones	Material parti-	proteger los
5	Inicio pega de		culado.	frentes de trabajos
6	Bloque			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE ENERGIAS	
	TRABAJOS EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		ADECUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSSRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Teofilo Alvarez	Teofilo A C
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Izeth K. Moreno C.	FECHA	02	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	ONobis Dominguez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, nivel, pala, cornetilla, cortadora

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROL DEFINIDOS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de epp.
2	Hilo	Golpes	Desiduos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Cortaduras	Material Particu-	proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			EXCAVACIONES Y DEMOLICION DE OBRAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			TRABAJO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA ATESRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Leopoldo Alvarez	Leopoldo Alvarez
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

ONOVIS Dominguez
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	04	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Hector Pineda	

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Hom posteria

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretilla, Balde, Pala, Cortadora, nivel

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortadora.	Generacion de	uso de EPP.
2	H10.	Machucones	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Caidas	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Golpes	Material parti-	proteger los
5	Inicio pega de		culado.	Frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SAO/DSTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth L. Moreno C.	FECHA	06	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Fernel lopez.		NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	5		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Trazado y EXCavación		EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pico, pala, pita, carretilla, nivel			

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Limpieza.	Raspones	Generación de	uso de EPP.
2	Trazado,	Golpes	Desiduos	uso de punto
3	Inicio de la	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	excavacion.	Cortaduras	Material parti-	proteger los
5			culado.	frentes de
6				trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Daniel Ruda	Daniel Ruda
2	Jivan angulo	Jivan Angulo
3	Jose camacho	Camacho
4	Yajber carabello	
5	Edwin vega	Edwin
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Fernel López S.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.		FECHA	23	06 22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Luis Atencio.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Balde, pala, carretilla, nivel.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Blogue	Caidas	Generacion de	uso de EPP:
2	Tho	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Machacones	Generacion de	Ecologico.
4	Mezcla.	Raspones	Material parti-	proteger los
5	Inicio pega de		culado.	frentes de
6	Blogue			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECÁNICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		HIDRÁULICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ANDAMIOS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSSRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		Yasio Vargas
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Luis Atencio.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDIETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth C. Moreno	FECHA:	24	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Feinel lopez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	4.		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Trazado, excavacion, Fundida.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Trompo, carretilla, pala, pulastre		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	niveles.	Golpes	Generacion de	uso de epp.
2	Excavacion.	Machucones	Residuos	uso de Punto
3	Encofrado.	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Instalacion del	Raspones	Material para-	
5	Hierro.		lizado	
6	Inicio de			
7	Fundida.			
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		TAREAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Daniel Ruda	Daniel Ruda
2	Edwin Cega	Edwin Arguello
3	Juan Angulo	
4	Jose Cadmano	Cadmano
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Feinel López S.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDABLE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS/ARA)

RESPONSABLE DEL PROYECTO O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	28	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Ruben Baez	1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Mamposteria	pala, Balde, nivel, Carretilla, cortadora

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	AMBIENTES AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de EPP.
2	Mo.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	preparacion de la	Machacones	Generacion de	Ecologico
4	Mezcla.	Raspones	Material parti-	proteger los
5	Inicio pega de		culado.	frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PELIGROSAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE ENERGIAS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		HIDRAULICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/ARA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Alfredo Acosta	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE GRUPO O SUPERVISOR SST

Ruben Baez
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Ingth K. Moreno C.	FECHA	28	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Fernel lopez	5

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Fundida de cadimentación

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Trompo, carretilla, pico, pala, nivel.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Trazado, Excavación	Golpes	Generación de	uso de EPP.
2	Encofrado.	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Instalacion del	Machacones	Generacion de	Ecologico
4	Hierro.	Raspones	Material partia-	
5	Preparacion de la		lado	
6	Mezcla.			
7	Inicio de			
8	fundida.			
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PELIGROSAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		GEOMETRICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSSRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	Yajaira Carabalio	
2	Edwis Vega	Edwin
3	Ivan Angulo	
4	Jesi Camacho	Camacho
5	Daniel Ruda	Daniel Ruda
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST

Fernel López S.
FIRMA RESPONSABLE DIRECTO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C	FECHA	29	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Ruben Gomez.

NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretillo, Balde, nivel, pala, cortadora

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de epp
2	tho.	Golpes	Residuos	uso de punto
3	Preparacion de la	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	Mezcla	Cortaduras	Material particu	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	frentes de trabajos
6	Bloque.			para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		SEÍSMICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Alfredo Acosta	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE SUPERVISOR SST

Ruben Gom
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	lizeth K. Moreno C.	FECHA	30	06	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Yorgui Morales	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	3		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Trazado y Excavación	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	pico, pala, carretilla, nivel pita		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Limpieza.	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Trazado.	Machucones	Desidues.	uso de cunto
3	Inicio de la	Cortaduras	Generacion de	Ecologico
4	excavación	Raspones	Material particu-	
5			lado.	
6				
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELÉCTRICA			SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Alberto Florez	
2	Jorge Augusto	
3	Jorge Andres	
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

YORGUI MORALES
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISION SST	Izeth V. Moreno C.	FECHA	30	06	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Fernel lopez.	5

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Fundida de cedimentacion	Carretilla, Pala, Pico, nivel, Trompo

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Trazado, niveles,	Golpes	Generacion de	uso de epp.
2	Encofrado.	Machacones	Desiduos.	uso de punto
3	Instalacion del	Raspones.	Generacion de	Ecologico.
4	Hierro.	Cortaduras	Material punti-	proteger los
5	Inicio de		Colado	Frentes de trabajos Para Minimizar los Riesgos.
6	Fundida.			
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS FISICAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Edwis Vega	Edwis
2	Daniel Ruda	Daniel Ruda
3	Jose Cotazo	Camacho
4	Alvis Segundo	Tyron Hoyos
5	Yaibe Colombiano	
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Fernel Lopez
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.4. ANALISI DE TRABAJO INSEGURO.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — Viveurb
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE — Lizeth K. Moreno C. — Fecha: 13 / 06 / 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las mangas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aspereza y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas no [illegible]	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en lugar seco para que no se deterioren [illegible]	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los [illegible]	X					
29	Las herramientas dañadas o desgastadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					


CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — Viveurb.
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE — Lizeth K. Moreno C. — Fecha: 14 / 06 / 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las mangas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas están limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aspereza y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas no [illegible]	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en lugar seco para que no se deterioren [illegible]	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los [illegible]	X					
29	Las herramientas dañadas o desgastadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

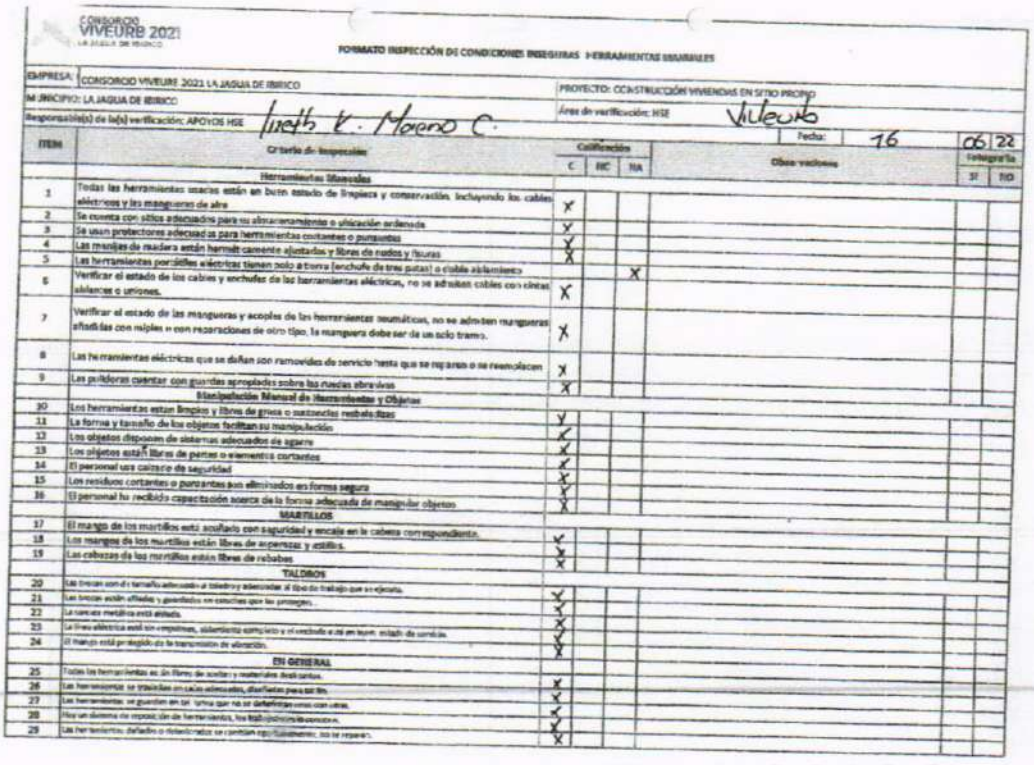

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO


FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE — Lineth K. Moreno C. — Fecha: 16 06 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las mesetas de madera están bien ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo. la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañen son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas en un libre de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se transitan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o defectuosas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

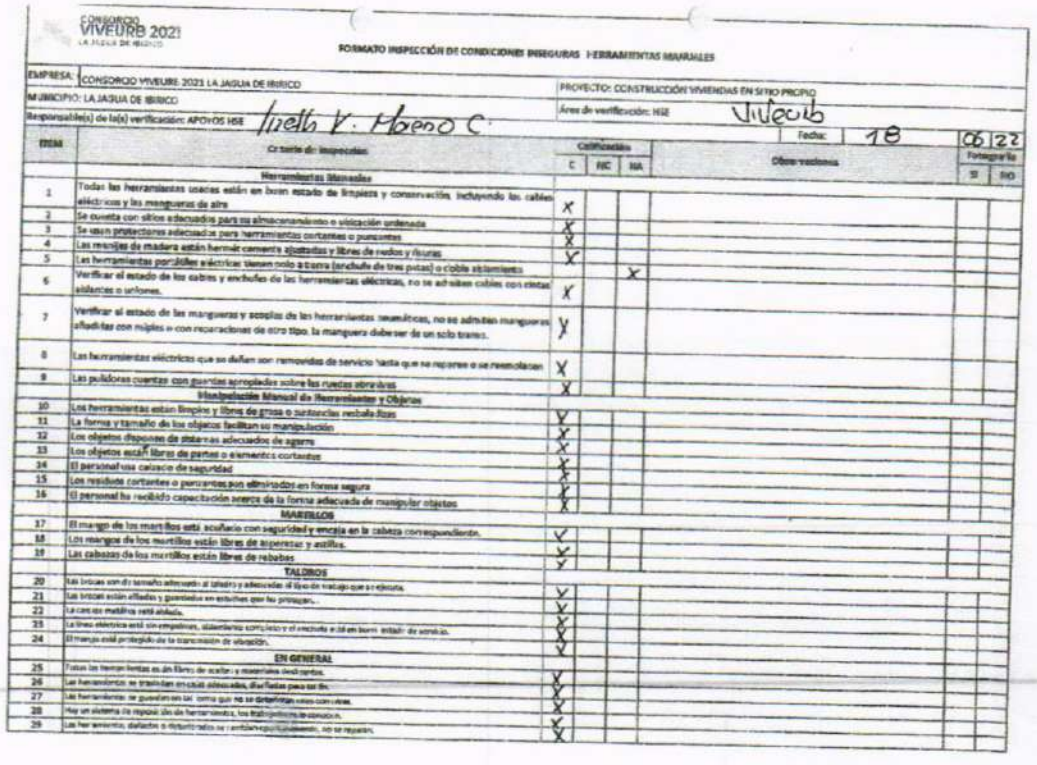

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE — Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE — Lineth K. Moreno C. — Fecha: 18 06 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las mesetas de madera están bien ajustadas y libres de nudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo. la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañen son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas en un libre de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se transitan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o defectuosas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE Viveurb

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 21 06 23

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o colocación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las mandíbulas de madera están herméticamente ajustadas y libres de rudos y fisuras	X					
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento			X			
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de cinta tipo. la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las muelas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de asarras adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de astillas y grietas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe a tierra en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas se limpian de aceites y materiales deslizantes.						
26	Las herramientas se transportan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se señalan convenientemente, no se reparan.	X					

GTH-F-305

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.


A14 – INFORME AMBIENTAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORME DE GESTION AMBIENTAL

JUNIO DEL 2022

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

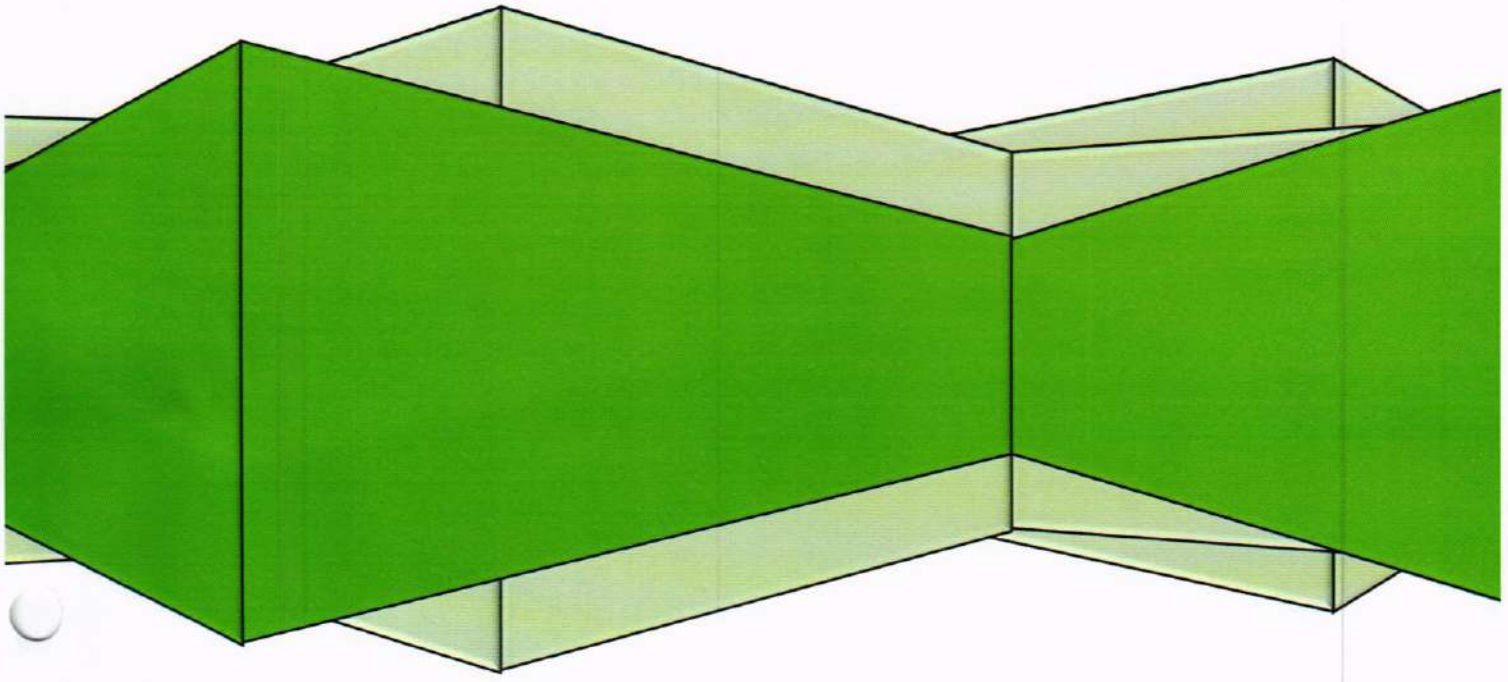

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
(IMPLEMENTACION DEL P.M.A)

CONSORCIO VIVE URBE 2021

PERIODO: JUNIO del 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
JUNIO 2022

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTROUCCION 4

2. OBJETIVOS 5

2.1 GENERAL 5
2.2. ESPECIFICOS 5

3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. 6

4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA 6

5. MARCO NORMATIVO LEGAL 7

6. LOCALIZACION DEL PROYECTO 8

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 9

7.2. Manejo e Instalación de Tuberías Hidrosanitarias. 9
7.3. Educación Ambiental y Cultura al Trabajador. 10
7.4. Manejo y dotación de instalaciones temporales. 11
7.5. Manejo Integral de Materiales de Construcción. 12
7.6. Manejo y Disposición de Recurso Agua. 13
7.7. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos. 14
7.8. Limpieza de la Obra y Manejo de Residuos Sólidos. 15

8. CONCLUSION. 16

9. ANEXOS 17

9.2. FORMATO DE RESIDUOS SOLIDOS 17

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTROUCCION

La legislación ambiental vigente en la República de Colombia establece que todo proyecto o actividad por su magnitud represente la posibilidad de provocar efectos negativos de importancia sobre el medio ambiente y los recursos naturales existentes en la zona donde se pretende ejecutar.

NOMBRE PROYECTO: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

El presente documento contiene un análisis de los impactos ambientales generados por la construcción de VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO". Obra que nace debido a la falta de Parques biosaludables en el Municipio con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del sector e incentivarlos a la recreación y esparcimiento saludable.

Para el posterior informe se evidenciaron las actividades desarrolladas en la obra para su posterior identificación de impactos ambientales, los cuales consta de un registro fotográfico, así como la descripción de la actividad y su respectivo impacto eso si con la propuesta de medida de mitigación correspondiente y otros detalles que describen muy bien las características de cada etapa del proceso constructivo.

En ese sentido, se hace importante la identificación del impacto ambiental, generado por construcción de VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, debido a que es entendido como un instrumento de carácter preventivo que incorpora la dimensión ambiental en las nuevas acciones humanas y en las modificaciones a las obras y actividades existentes.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Plasmar las acciones de Mitigación, Reducción, y/o Compensación de las posibles afectaciones a los factores Ambientales en la construcción de VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

2.2. ESPECIFICOS

- ✓ Determinar la disposición de residuos sólidos, en la construcción del parque recreo deportivo.
- ✓ Establecer las causas y los impactos ambientales generados por la construcción de casas en sitio propio.
- ✓ Realizar las acciones de mitigación de impactos por la de construcción de la obra.
- ✓ Evaluar los impactos relacionados con los componentes ambientales susceptibles de alteración o de causar algún impacto negativo en el medio ambiente y la salud, así como sus efectos y alternativas de solución.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.

En este capítulo se presenta la caracterización de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto, en un contexto regional y local. La información utilizada en el presente capítulo corresponde a información secundaria y a estudios adelantados en el marco de la etapa de estudios y diseños realizados por diferentes asesores.

Desde el punto de vista ambiental, cobra especial importancia lo concerniente a la calidad del aire en términos de ruido y material particulado, y la producción de residuos de construcción.

Los diferentes problemas ambientales del AID, donde se desarrollará el contrato, pueden agrupar de la siguiente manera:

- ✓ Problemas asociados al agua
- ✓ Problemas asociados a la tierra.
- ✓ Problemas asociados al aire.
- ✓ Problemas asociados al manejo de los residuos solidos
- ✓ Problemas asociados a la movilidad y el espacio público

4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

- ✓ Manejo e Instalación de Tuberías Hidrosanitarias
- ✓ Educación Ambiental y Cultura al Trabajador.
- ✓ Manejo Adecuado de Aguas Superficiales.
- ✓ Manejo Protección de Fauna.
- ✓ Manejo y dotación de instalaciones temporales.
- ✓ Manejo Integral de Materiales de Construcción.
- ✓ Manejo y Disposición de Recurso Agua.
- ✓ Manejo de Contaminación del Aire.
- ✓ Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos.
- ✓ Limpieza de la Obra y Manejo de Residuos Sólidos.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. MARCO NORMATIVO LEGAL.

Constitución política de 1991.

La constitución política de Colombia de 1991 elevo a norma constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y medio ambiente, artículos 7, 4, 49, 68, 63, 79, 80, 88, 95, 330.

- **Decreto 4550 de 2009**

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto ley 919 de 1989 y la ley 1228 de 2008, especialmente en relación con la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones, con posterioridad a la declaración de una situación de desastre o calamidad pública y la prohibición de expedir licencias de construcción en casos determinados.

- **Ley 9 de 1979**

Código nacional sanitario por el cual se dictan normas de control sanitario y de medio ambiente.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

✓ RECURSOS HIDRICOS:

- Decreto 1594 de 1994 Por la cual se establecen los usos de agua y residuos líquidos.
- Ley 1608 de 1974 Por la cual se reglamenta el código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente y la ley, 23 de 1973 en materia de fauna silvestre

✓ RECURSO AIRE:

- Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

✓ RECURSO SUELO

- Decreto 2822 de 1978 Por la cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Art 289.
- Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el título VII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

✓ **GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS:**

Decreto número 1713 de agosto 6 de 2002 (presidencia) Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001. en relación con la prestación del servicio público de aseo

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24' de latitud norte y 73º20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida



MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24' de latitud norte y 73º20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

7.2. Manejo e Instalación de Tuberías Hidrosanitarias.

Se vienen dando las recomendaciones de manejo para minimizar los efectos producidos por el manejo de la tubería, excavaciones y rellenos de las zanjas requeridas para la instalación de las mismas.

Se tiene especial cuidado de mantener los vehículos en perfecto estado mecánico para evitar emisiones de gases y ruidos excesivos, por lo tanto se mantienen en óptimo estado del motor, evitar los escapes e instalar silenciadores.
Se viene programando el envío de los vehículos con intervalos mínimos de una hora, con el fin de no congestionar la vía de acceso.



La apertura de la zanja solo se hará cuando la tubería se encuentre lista para su instalación.
Las paredes de la zanja deben ser lo más verticales posible, entibadas y apuntaladas en las zonas donde la estabilidad del terreno así lo requiera.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.3. Educación Ambiental y Cultura al Trabajador.

Se Capacita semanalmente al personal adscrito al proyecto, en aspectos ambientales, tales como: Conservación del medio ambiente y mitigación de los posibles impactos ambientales atribuibles al proyecto.

Se vela por el cuidado de la salud de los trabajadores y los residentes del área de influencia, afectada por algunas actividades del proyecto.
Se Mitigación y/o controla la intervención de trabajadores y/o vehículos en la vida cotidiana de los residentes aledaños a la obra.



Se realizan reuniones semanales con el grupo de trabajadores, acerca de la importancia y necesidad de conservación del medio ambiente.

Tanto el constructor como la Interventoría, vienen estando atentos de la aplicación de las medidas adoptadas en el Plan de Manejo Ambiental para la conservación ambiental del entorno.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.4. Manejo y dotación de instalaciones temporales.

el contratista viene implementando medidas para la instalación, el funcionamiento y el desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal que se requieren construir para la ejecución de las obras del proyecto y los lineamientos mínimos que el contratista debe implementar tanto para las actividades de instalación, funcionamiento como de desmantelamiento de las plantas que demandará el proyecto.



Con la implementación del P.M.A se busca Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.

El área contemplada para la instalación del campamento cuenta con las conexiones a las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y con el debido permiso de la empresa prestadora del servicio.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.5. Manejo Integral de Materiales de Construcción.

Este programa contempla cuatro (4) proyectos, que están encaminados a establecer las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos que se puedan generar durante la ejecución de las obras, con las acciones para el manejo de los materiales de construcción y el manejo de los residuos sólidos,.



1. Medidas de manejo de materiales pétreos: En los frentes de obra el contratista podrá ubicar sólo el volumen de material requerido para una o dos jornadas laborales y deberán estar adecuadamente cubiertos, demarcados y señalizados.

2. Medidas de manejo para concreto: El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los siete metros (7) de altura.

3. Medidas de manejo para asfalto: Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego de adhesivos o cuando se trabaje con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas se hará en una parrilla portátil.

4. Medidas para el manejo de prefabricados: tubería se almacenará ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.6. Manejo y Disposición de Recurso Agua.

Se adelanta siempre las acciones que permiten el buen manejo y disposición de los residuos líquidos durante la construcción de la obra, tal que, no haya afectación sobre los cuerpos de agua cercanos al área dispuesta para la ejecución de la obra.

Se recolecta y evacuan de forma adecuada los residuos líquidos generados en la zona de la obra y disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental correspondiente.



- ✓ Se deben construir cunetas perimetrales alrededor del área del proyecto para el encauzamiento de las aguas superficiales.

- ✓ Las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático en las excavaciones, serán dispuestas en los canales pluviales, alcantarillas o cuerpos de agua.

- ✓ No deberan las aguas vertidas a las vías públicas ni cunetas que desemboquen a cuerpos de aguas naturales.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.7. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos.

Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y Vehículos.

Previo al inicio de las actividades constructivas los contratistas deben entregar a la interventoría los registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los frentes de obra, de acuerdo con lo estipulado en el documento PAGA.







Todos los mantenimientos –preventivos y correctivos– que se deban hacer a la maquinaria, equipos y vehículos deberán estar basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y ser entregados a la Interventoría en el informe mensual.

Para trabajos nocturnos se deberá contar con la iluminación suficiente y localizada que permita buena visibilidad al operador.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.8. Limpieza de la Obra y Manejo de Residuos Sólidos.

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.







Los residuos sólidos y su clasificación se definen como:

- ✓ Residuo sólido o desecho.
- ✓ Residuo sólido aprovechable.
- ✓ Residuo sólido no aprovechable.
- ✓ *Residuo o desecho peligroso.*

1. Se construyó caseta en material plástico negro para acopiar las bolsas llenas de residuos y bolsas de cemento vacías.
2. Se hicieron canastas en varillas y se dispusieron en cada uno de los frentes de trabajo para evitar contaminación de residuos en el lugar de trabajo.
3. Se utiliza guadañadora para evitar enmontado dentro y fuera de la obra.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8. CONCLUSION.

Para este periodo de informe ambiental se están implementando más acciones necesarias para dejar el lugar encontrado donde se desarrolló el proyecto en mejores condiciones en que se encontraba, de la misma manera se viene realizando concientización a los trabajadores para que hagan buen uso de cada componente ambiental involucrado en la obra.

Se continúa implementando por parte de los profesionales del consorcio VIVEURB 2021 la jagua de manera contundente las medidas de manejo ambiental que hasta el momento nos están garantizando la minimización de los impactos ambientales.

Se plasmó cada impacto y cada medida ambiental que se está tomando con el fin de mitigar cada afectación generada por el desarrollo de la obra.

Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

CLARA INES CAYON
INGENIERA AMBIENTAL

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9. ANEXOS

9.2. FORMATO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONTROL DE RESIUDOS SOLIDOS							
FECHA	NO RECICABLES		RECICLABES					
	RESIDUOS ORDINARIOS		PAPEL CARTON (BOLSAS DE CEMENTO)		PLASTICO		CHATARRA	
	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG
FEBRERO	4	3	3	4	2	2	0	0
MARZO	8	4	5	3	3	1	2	2
ABRIL	12	6	4	2	2	1	0	0
MAYO	10	5	45	35	3	2	0	0
JUNIO	10	4	36	68	4	1.5	0	0
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

A15- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

LINEAMIENTO DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

LINEAMIENTO DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

CONSORCIO VIVEURB 2021
JUNIO 2022

LA JAGUA DE IBIRICO
JUNIO 2022.

TABLA DE CONTENIDO.

1. GENERALIDADES 3
1.1. Consideraciones generales para el retorno a la presencialidad. 3
1.2. Consideraciones con referencia evidencia científica actualizada. 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 3
2.1. Centros de trabajo 4
2.2. Descripción de las actividades. 4
2.3. Horario de trabajo. 4
3. OBJETIVOS 4
3.1. Objetivo general. 5
3.2. Objetivos específicos. 5
4. ALCANCE 5
5. MARCO NORMATIVO. 6
5.1. Decretos Nacionales: 6
5.2. Resoluciones Ministerios: 6
6. DEFINICIONES. 6
7. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021. 7
8. DATOS ACERCA DEL COVID-19 8
8.1. ¿Qué es el coronavirus COVID-19. 8
8.2. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus COVID-19? 8
9. PLAN DE TRABAJO PAPSO. 8
9.1. Medidas de Control para el Ingreso 9
9.2. Medidas de Control para la Salida de las Instalaciones 9
10. PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMUNES 10
10.1. Uso de Espacios Comunes 10
10.2. Uso de Baños, Vestidores y Duchas 11
10.3. Uso de Elementos de Protección Personal EPP 11
10.4. Señalización. 12
11. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO 12
11.1. Medidas frente a la persona 12
11.2. Atención y emergencias 13
12. CONCLUSIÓN. 13

1. GENERALIDADES

En el marco de la emergencia Sanitaria mediante la Resolución 1315 del 20211 del 27 de agosto del 2021, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la emergencia sanitaria, se ordenó a las entidades territoriales de orden departamental, distrital y municipal garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para propiciar el retorno gradual, a los trabajadores del área de construcción a la presencialidad, con el fin de que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y de la salud mental.

Por lo anterior, se hace necesario continuar reforzando las orientaciones para la implementación de las acciones de cuidado y bioseguridad para dar continuidad al retorno a la presencialidad en las diferentes obras de construcción civiles

1.1. Consideraciones generales para el retorno a la presencialidad.

Este Ministerio ha señalado la importancia de dar continuidad al retorno a la presencialidad de los trabajadores a cada una de las obras civiles en desarrollo seguro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a actividades académicas en todas las instituciones educativas desde educación inicial, al considerar la asistencia en el entorno educativo como una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental de los niños, niñas y adolescentes.

1.2. Consideraciones con referencia evidencia científica actualizada.

Se ha demostrado una menor transmisibilidad y severidad de la infección por COVID- 19 en obras civiles, así como la importancia de las normas de bioseguridad para el desarrollo integral y el logro de trayectorias, reconociendo el entorno de trabajo como protector para las actividades cotidianas del desarrollo de la obra.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	NIT. 901.457.886-9
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	3106404017
REPRESENTANTE LEGAL	Gilberto Antonio Ibarra Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Karina Paola Mina Centena
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

2.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	construcción de viviendas de interés social en sitio propio en el municipio la jagua de ibirico, departamento del cesar	V

2.2. Descripción de las actividades.

Consorcio constituido para la construcción del escenario recreo deportivo en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

2.3. Horario de trabajo.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m., para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general.

Brindar las recomendaciones actualizadas para el cuidado y disminución del riesgo de contagio por SARS - CoV 2 / COVID-19 para dar continuidad al proceso de retorno a la presencialidad en los diferentes frentes de trabajo.

3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.
- ✓ Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- ✓ Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- ✓ entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

4. ALCANCE.

Es aplicable al proyecto "**proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**", a los trabajadores directos,

contratistas, proveedores y visitantes en el cumplimiento de las fases en que se encuentra el proyecto y hasta la entrega del mismo.

5. MARCO NORMATIVO.

5.1. Decretos Nacionales:

• Decreto 488 de 2020. "Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
• Decreto 500 de 2020. "Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la Emergencia sanitaria generada por la pandemia del CoronavirusCOVID-19 y el mantenimiento del orden público"

Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la Circular 021 del 17 de marzo de 2020, se señaló que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", razón por la cual dicho Ministerio previó una serie de mecanismos con el fin de protegerlo y garantizar la actividad productiva.

5.2. Resoluciones Ministerios:

• Resolución 380 de 2020. "Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones".

• Resolución 453 de 2020 "Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones".
• Resolución 0522 de 2020, "Por la cual se establecen los requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in-vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del COVID-1

6. DEFINICIONES.

***Aislamiento*:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellosque no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediantelos mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizarel factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vidade las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se habíavisto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

***Hipoclorito*:** es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad demicroorganismos.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayudaa bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, quepodrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos comovirus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de laspartículas que se encuentran en el aire.

7. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021.

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

8. DATOS ACERCA DEL COVID-19

8.1. ¿Qué es el coronavirus COVID-19.

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.

8.2. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus COVID-19?

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

El nuevo coronavirus COVID-19 causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

9. PLAN DE TRABAJO PAPSO.

El **Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO)** debe entenderse como un programa detallado de estrategias y actividades que estarán sujetas a evaluación por entidades de control. De esta manera es importante planear de manera adecuada las actividades y que estas sean coherentes con el tamaño y complejidad de cada una de las obras en sus diferentes etapas.

De esta manera, el equipo interno debe tener no solo el PAPSO, sino además los soportes de su diseño e implementación, de tal manera que pueda ser validado y justificado.


9.1. Medidas de Control para el Ingreso.

El Solo se permite el ingreso simultáneo de un número de personas que no supere la capacidad de los espacios, garantizando que se mantenga un distanciamiento de 2,00 metros entre visitantes.

• Toda persona que ingrese debe tener y usar tapabocas. Su uso es obligatorio dentro de las instalaciones de la empresa.

• Al momento de ingresar, toda persona debe limpiar sus manos con alcohol glicerinado o gel antibacteriano que estará dispuesto en el sitio de ingreso.

• Al momento de ingreso de personas vinculadas a la empresa y sus contratistas, deben ser evaluadas para identificar síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, además de la lectura de temperatura corporal. Se dejará registro de esta evaluación en la bitácora.

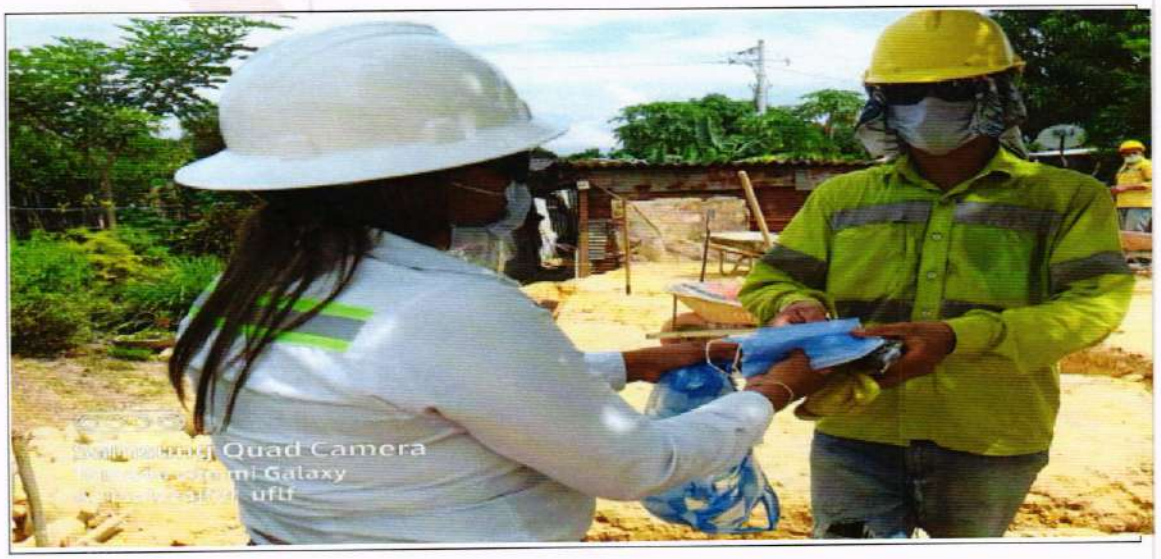

9.2. Medidas de Control para la Salida de las Instalaciones.

El personal vinculado a la empresa o sus contratistas, antes de salir debe:
• Lavar las manos con agua y jabón siguiendo las indicaciones del protocolo de higiene.
• Toma de temperatura y registro en bitácora.
• Tener tapabocas para ser usado en el transporte público.

10. PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMUNES


El personal vinculado a la empresa o sus contratistas solo debe utilizar sus herramientas utensilios propios o entregados por la empresa.

• Queda prohibido el traspaso o préstamo de herramientas y utensilios entre las personas, excepto que por la naturaleza de la herramienta esta deba ser compartida por varias personas. De tener que compartirlas, las personas involucradas se asegurarán de desinfectar con alcohol de manera previa y posterior a su uso y traspaso.

• Se prohíben las reuniones presenciales con más de 10 personas Siempre se preferirá el uso de medios electrónicos.

• Para las reuniones con menos de 10 personas, se garantizará un distanciamiento de 2.00 metros entre cada una de ellas y la reunión se llevará a cabo en sitio ventilado.

El sitio de reunión deberá tener limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previos y posteriores a la reunión.

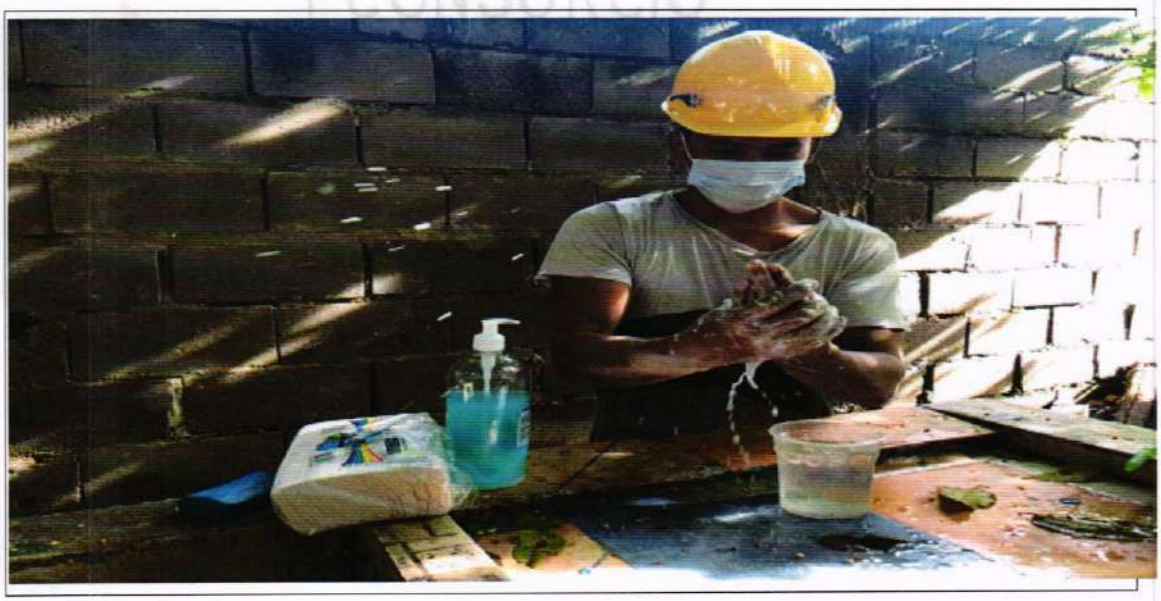

10.1. Uso de Espacios Comunes.

• No se usarán espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca ventilación y que no permitan la distancia de más de 2,00 metros entre personas.

• Todos los espacios comunes tendrán indicado en su demarcación la capacidad de ocupación máxima, de tal manera que se garantice un distanciamiento de al menos 2,00 metros entre personas.



DISTANCIAMIENTO FISICO

10.2. Uso de Baños, Vestidores y Duchas.

• En todos los baños debe haber disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.

• Queda prohibido el ingreso simultáneo a vestidores/baños/duchas a grupos de más de 20 personas. En todo caso los baños, vestidores y duchas se demarcarán visiblemente con su capacidad de ocupación máxima, que garantice que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 2,00metros.




10.3. Uso de Elementos de Protección Personal EPP

• El uso de elementos de protección personal es obligatorio en las instalaciones de la empresa:

• Tapabocas: al interior de cualquier instalación de la empresa.

• Guantes, gafas, protección facial: en los casos especificados.

• Si la actividad se debe desarrollar a menos de 2,00metros, se proveerá mascarillas desechables al personal vinculado a la empresa y sus contratistas. Estas mascarillas deben ser desechadas después de su uso.

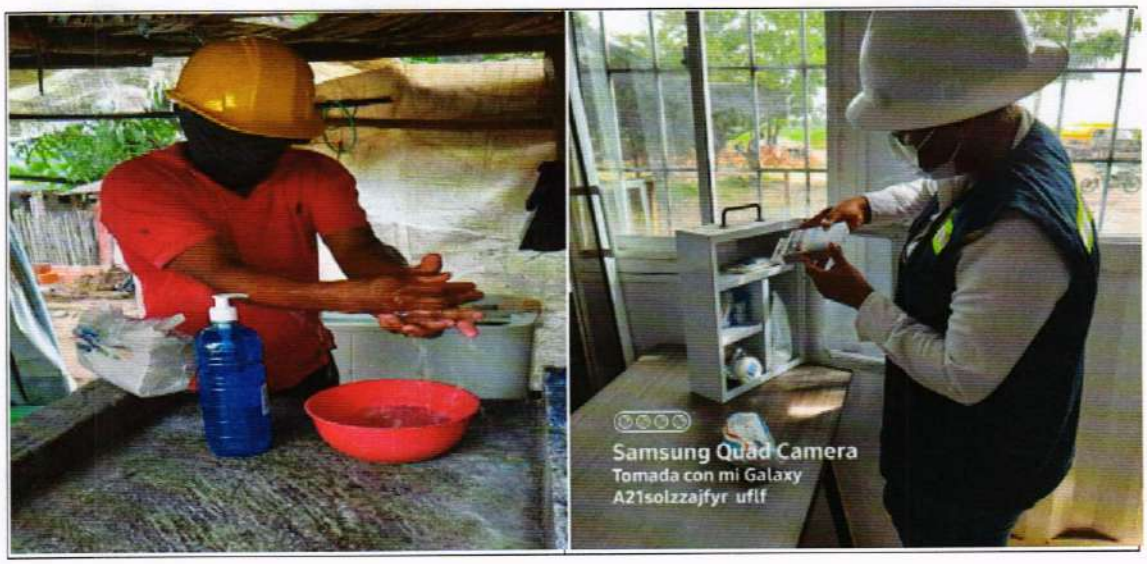

10.4. Señalización.

• A la entrada de las instalaciones de la empresa y sus obras se instalará un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-19 (ver Avisos: De cumplimiento de protocolo).

• Se instalarán avisos en los puntos donde se desarrollan actividades, las prácticas sugeridas para la prevención delCOVID-19.

11. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO.

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

11.1. Medidas frente a la persona.

Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso,

recordando la protección de datos personales y de información médica.

No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde puedaestar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.

Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.

11.2. Atención y emergencias.

Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.

Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.

Se Realizará verificación de estados de salud de colaboradores por personal médicoidóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). En caso de ser necesario.

12. CONCLUSIÓN.

Para este periodo se continúa con la implementación de todas las medidas de bioseguridad de manera rigurosa por parte de los profesionales de obra, esto con el fin de mantener la obra lo menos vulnerable frente algún contagio del covid-19.

Se continúa con un porcentaje de cero casos de covid 19 detectado.

El consorcio VIVEURB 2021 seguirá estableciendo canales entre los profesionales de campo y los trabajadores con el fin de establecer cada vez más medidas que nos permitan seguir con este firme objetivo.

Se pondrá a disposición todo el recurso humano necesario para hacer conciencia entre los trabajadores de la obra sobre la importancia del autocuidado y las medidas necesarias para contrarrestar la propagación y contagio del virus en este cuarto pico que atraviesa el país.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
