INFORME DE INTERVENTORÍA N° 15

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Del 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022

La Jagua de Ibirico - Cesar

2022

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 3
1.1. CONTRATO DE OBRA....4
1.1.1. INFORMACION GENERAL 4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA....4
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 4
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA 5
2.1. FORMA DE PAGO 5
2.2. ANTICIPO 6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA....6
3.1. FORMA DE PAGO 6
3.2. ANTICIPO 6
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. ANTECEDENTES 9
6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN 10
7. AVANCE DE OBRA 15
7.1. BALANCE DEL CONTRAT DE OBRA....16
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS....17
7.2.1. ADMINISTRATIVAS 17
7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS 17
6.2.3. TECNICAS 17
7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA....17
8. GARANTIAS 20
8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA....20
8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA....20
9. POLIZAS....20
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 20
11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES....20
12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19 21
13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS....21

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales. 21
13.2. Avance en la ejecución de las viviendas. 21
14. CONTROLES TECNICOS 60
14.1. Chequeo de trazados. 60
14.2. Chequeo de dimensiones y niveles en cimentaciones 61
14.3. Chequeo de acero de refuerzo de cimentaciones. 61
14.5. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados 62
14.6. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 64
14.7. Chequeo de refuerzo de mampostería. 64
14.8. Chequeo de tapones de estructuras metálicas. 65
14.9. Chequeo de nivel de plantilla. 65
14.10. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio. 66
15. CONTROL DE EQUIPO 66
16. CONTROL DE PERSONAL 67
17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS. 72
17.1. Actas de habitabilidad de viviendas entregadas. **¡Error! Marcador no definido.**
17.2. Actas de recibo a satisfacción de las viviendas. **¡Error! Marcador no definido.**
18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS 75
18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS 75
19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS ..76
ANEXOS 77

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN**

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoría.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	DANFOR DAVID SOLANO GONZALES
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. Amortizando proporcionalmente

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

el anticipo girado, mediante actas de recibo según avance de obra, debidamente soportado por **EL INTERVENTOR** y avalado por el responsable del contrato. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando se hayan construido la totalidad la totalidad de unidades habitacionales de las que trata el proyecto. Todas las viviendas deberán estar completamente habitables, legalizadas y recibidas a satisfacción por parte del responsable del contrato y entregadas a sus respectivos beneficiarios.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. Amortizando proporcionalmente el anticipo girado, mediante actas de recibo según avance de obra, debidamente soportado por **EL INTERVENTOR** y avalado por el responsable del contrato. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando se hayan construido la totalidad la totalidad de unidades habitacionales de las que trata el proyecto. Todas las viviendas deberán estar completamente habitables, legalizadas y recibidas a satisfacción por parte del responsable del contrato y entregadas a sus respectivos beneficiarios.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.



Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios y viviendas intervenidas.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE FEBRERO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

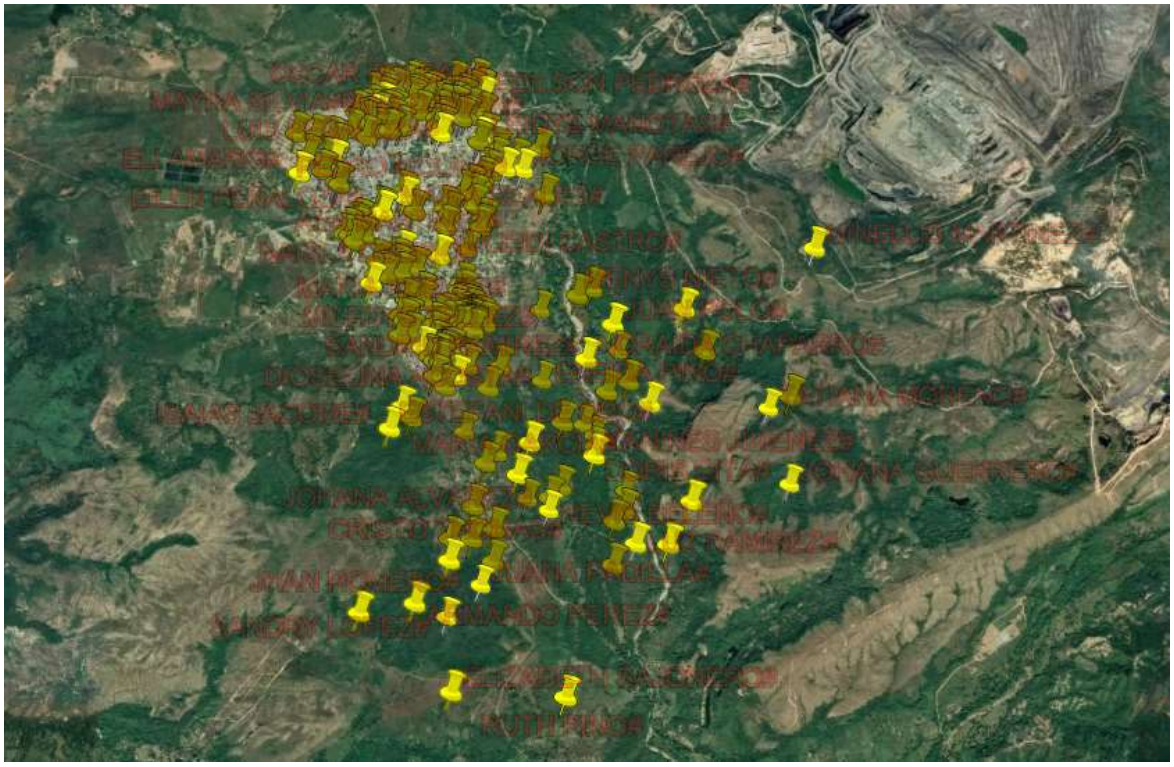


Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO 089	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	VIVIENDAS COMPLETADAS O AVANZADAS	FALTANTES
I.	PRELIMINARES REALIZADOS	126	145
1.1	DESCAPOTE MANUAL	115	156
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	126	145
1,3	CORTE, RELLENO O ENTABLADO	115	156
II.	CIMENTACIONES FUNDIDAS	115	156
2,1	EXCAVACION MANUAL	115	156
2,2	ZAPATAS	115	156
2,3	VIGAS	115	156
2,4	PLANTILLA	87	184
2,5	ACERO DE REFUERZO	115	156
2,6	ESTRUCTURA METALICA	113	158
III.	MAMPOSTERIAS LEVANTADAS	105,43	165,57
3,1	MUROS	105,43	165,57
3,2	PAÑETES DE BAÑO Y COCINA	86	185
IV.	CUBIERTAS INSTALADAS	105	166
4,1	LAMINAS DE FIBRO CEMENTO	105	166
4,2	CABALLETE	105	166
V.	PISOS Y ENCHAPES	83	188
5,1	PISO CERAMICO PARA BAÑO Y COCINA	83	188
VI.	INSTALACIONES ELECTRICAS	83	188
6,1	ACOMETIDA GENERAL	89	182
6,2	POLO DE TIERRA	72	199
6,3	TABLERO MONOFASICO	83	188
6,4	ILUMINACION	83	188
6,5	INTERRUPTORES SENCILLOS	83	188
6,6	INTERRUPTORES DOBLE	78	193
6,7	TOMA CORRIENTE NORMAL	95,3	175,7
6,8	TOMA CORRIENTE CON PROTECCION	26	245
6,9	TOMA COAXIAL PARA TV	0	271
VII.	PUERTAS Y VENTANAS	84	187
7,1	PUERTA METALICA	84	187
7,2	PUERTAS DE MADERA	72	199
7,3	VENTANA	84	187
VIII.	INSTALACIONES SANITARIAS	93	178
8,1	RED GENERAL	93	178
8,2	CAJA DE INSPECCION	93	178
8,3	EXCAVACION MANUAL	95	176
IX.	INSTALACIONES HIDRAULICAS	93	178
9,1	PUNTO HIDRAULICA	93	178
9,2	RED DE SUMINISTRO	93	178
X.	ACCESORIOS	80	191
10,1	LLAVE DE CONTROL	60	211
10,2	LAVAPLATOS	80	191
10,3	LAVAMANOS	80	191
10,4	SANITARIO	80	191
10,5	DUCHA	80	191
10,6	REJILLA SOSCO	80	191
10,7	INSCRUSTACIONES PORCELANATO	80	191
10,8	LAVADERO	72	199
XI.	ACABADOS	79	192
11,1	PASTA SOBRE MUROS	75,67	195,33
11,2	GRANIPLAST FACHADA	79	192
11,3	YESO PINTURA	79	192
XII.	TANQUE DE AGUA	72	199
12,1	TANQUE DE 500LT	72	199
12,2	PLACA EN CONCRETO	90	181

Ilustración 3 Resumen de actividades ejecutadas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

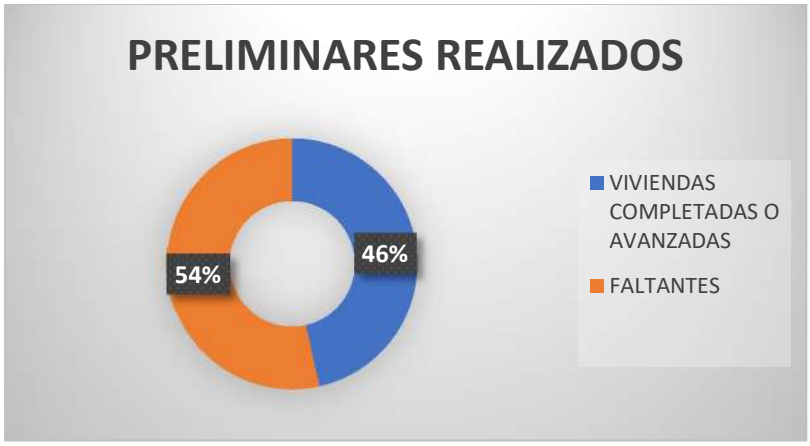


Gráfico 1 Porcentaje de preliminares realizados



Gráfico 2 Porcentaje de cimentaciones fundidas

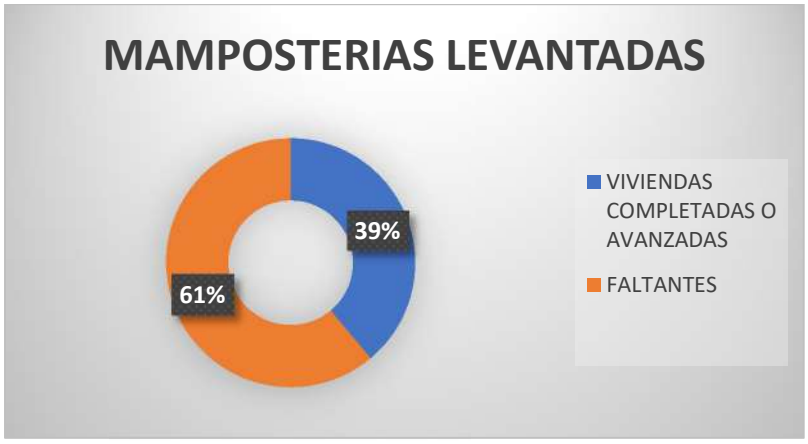


Gráfico 3 Porcentaje de mamposterías levantadas

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Gráfico 4 Porcentaje de cubiertas instaladas

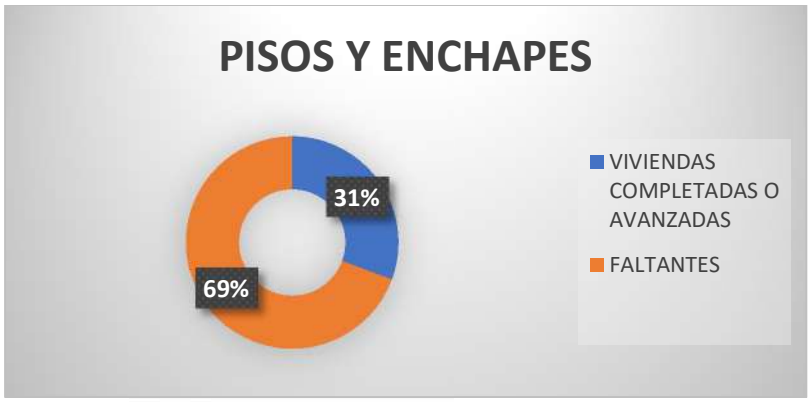


Gráfico 5 Porcentaje de enchapes instalados.

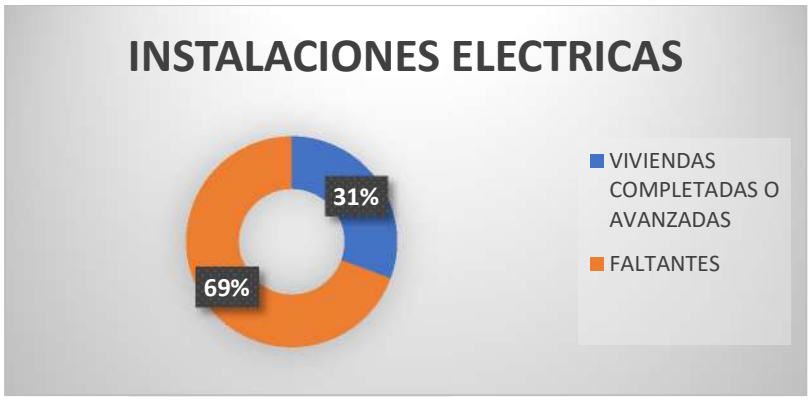


Gráfico 6 Porcentaje de instalaciones eléctricas instaladas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

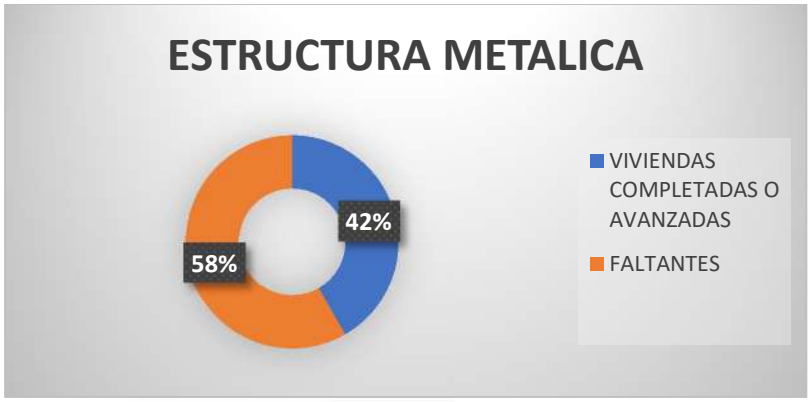


Gráfico 7 Porcentaje de estructuras metálicas levantadas.



Gráfico 8 Porcentaje de puertas y ventanas instaladas.

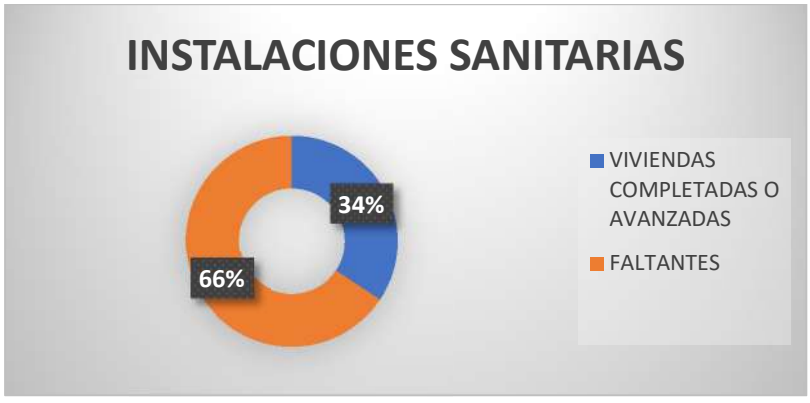


Gráfico 9 Porcentaje de instalaciones sanitarias instaladas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

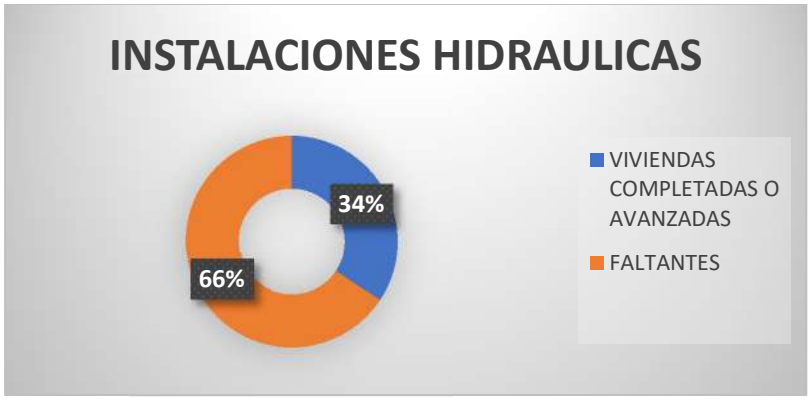


Gráfico 10 Porcentaje de instalaciones hidráulicas instaladas.



Gráfico 11 Porcentaje de accesorios instalados.

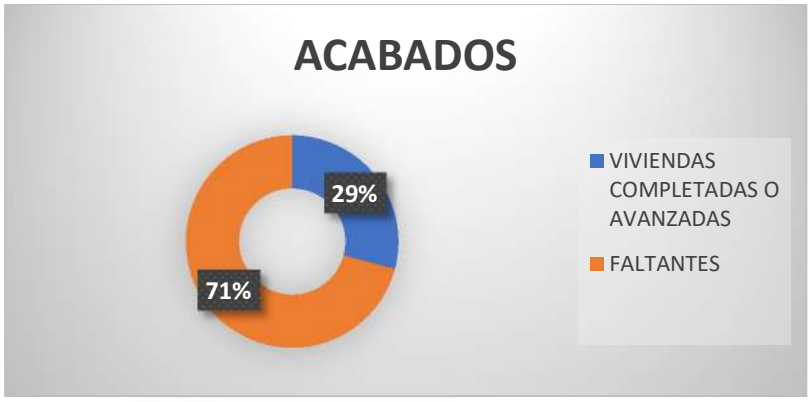


Gráfico 12 Porcentaje de acabados avanzados o terminados.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

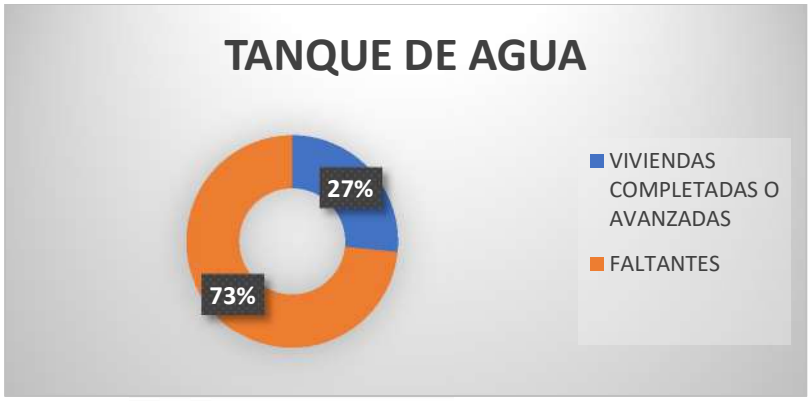


Gráfico 13 Porcentaje de tanques de agua instalados.

7. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (días):	**549**
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 31 de agosto:	**470 días**
Porcentaje de avance en tiempo:	85,61%
Porcentaje de ejecución de la obra:	**37,22%**
Porcentaje programado:	86,35%
Porcentaje de retraso:	**36,21%**
Porcentaje ejecutado en el mes:	2,62%
Porcentaje de avance total del proyecto (incluyendo gerencia, interventoría y supervisión):	**41,81%**

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 4 Grafica de porcentajes de ejecución VS metas propuestas.

7.1. BALANCE DEL CONTRAT DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80

ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.
b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.
c. Revisión de las labores y actividades contratadas.
d. Revisión de la programación de la obra.

7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto general ejecutado del proyecto

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 7.379.973.810,68
VALOR EJECUTADO SOLO EN EL MES DE AGOSTO 2022:	$ 955.169.349,41

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ITEM	DESCRIPCION		31 DE AGOSTO: 470 DIAS DE 549 DIAS				85,61%
I.	REALIZAR PRELIMINARES		CASAS	CANTIDADES	Vr. PARCIAL	% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
1.1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT		115	10504,1	$ 36.757.837,46	0,208%	42,44%
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO		126	12748,68	$ 23.237.783,96	0,130%	46,49%
1,3	CORTE, Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRACEO DE LOTES H.PROM 40CM CON MATERI		115	6499,8	$ 47.815.648,70	0,272%	42,44%
			SUB TOTAL		$ 107.811.270,12	0,610%	
II.	FUNDIR CIMENTACION						
2,1	EXCAVACION MANUAL		115	414	$ 15.118.207,74	0,085%	42,44%
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		115	103,5	$ 53.228.617,56	0,301%	42,44%
2,3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20		115	312,8	$ 231.467.032,74	1,311%	42,44%
2,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.06m		87	271,44	$ 172.632.582,72	0,979%	32,10%
2,5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI		115	50715	$ 303.977.088,45	1,723%	42,44%
2,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.		113	150198,47	$ 1.707.743.086,04	9,674%	41,70%
			SUB TOTAL		$ 2.484.166.615,24	14,073%	
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES						
3,1	MURO DE .10 DE ESPESOR EN ladrillo Hueco de 10.0 x 20 x 30 -MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO		105,43	11866,1465	$ 530.815.688,40	3,007%	38,90%
3,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 (EN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA)		86	1124,88	$ 28.308.808,82	0,162%	31,73%
			SUB TOTAL		$ 559.124.497,22	3,169%	
IV.	INSTALAR CUBIERTA						
4,1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO		105	5788,65	$ 181.364.193,15	1,027%	38,75%
4,2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO		105	630	$ 18.384.288,30	0,105%	38,75%
			SUB TOTAL		$ 199.748.481,45	1,131%	
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES						
5,1	PISO PARED EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M. Y COCINA H=0.40M, TIPO CORONA O SIMILAR.		83	949,52	$ 28.420.016,65	0,162%	30,63%
			SUB TOTAL		$ 28.420.016,65	0,162%	
VI.	INSTALAR PARTE ELÉCTRICAS INTERNA						
6,1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE EMERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.		89	178	$ 4.362.158,78	0,026%	32,84%
6,2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION		72	72	$ 14.501.676,24	0,082%	26,57%
6,3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE 3 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20 A		83	83	$ 10.773.433,20	0,061%	30,63%
6,4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V		83	664	$ 38.660.483,68	0,221%	30,63%
6,5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		83	332	$ 18.098.963,40	0,101%	30,63%
6,6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		78	156	$ 8.999.788,20	0,052%	28,78%
6,7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		95,3	858	$ 43.784.555,10	0,250%	35,18%
6,8	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		26	78	$ 6.862.984,44	0,039%	9,59%
6,9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO APLIQUE Y TUBERIA CONDUIT PVC)		0	0	$ -	0,000%	0,00%
			SUB TOTAL		$ 146.044.043,04	0,832%	
VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS						
7,1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.90*2, INCLUYE , CERRADURA Y ANTICORROSIVO		84	168	$ 58.488.123,12	0,332%	31,00%
7,2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA		72	288	$ 94.505.353,92	0,537%	26,57%
7,3	VENTANA EN ALUMINIO S020-VIDRIO NATURAL 4MM		84	689,64	$ 151.981.132,20	0,862%	31,00%
			SUB TOTAL		$ 304.974.609,24	1,730%	

Ilustración 5 Avance de presupuesto pt1.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA					
8,1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	93	665,88	$ 19.471.629,67	0,110%	34,32%
8,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	93	93	$ 7.335.308,97	0,041%	34,32%
8,3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	93	465	$ 27.833.942,10	0,158%	34,32%
8,4	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	93	1354,08	$ 61.871.611,84	0,350%	34,32%
8,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	93	186	$ 48.713.772,00	0,275%	34,32%
8,6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	95	356,25	$ 40.965.515,25	0,231%	35,06%
8,7	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 6"	93	697,5	$ 61.074.027,68	0,347%	34,32%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE Ø 8"X 6"	93	93	$ 24.029.190,27	0,137%	34,32%
		SUB TOTAL		$ 291.294.997,77	1,649%	
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA					
9,1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2".	93	558	$ 18.425.522,70	0,103%	34,32%
9,2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	93	2232	$ 27.110.318,40	0,154%	34,32%
		SUB TOTAL		$ 45.535.841,10	0,257%	
X.	INSTALAR ACCESORIOS					
10,1	LLAVE CONTROL DE 1/2"	60	240	$ 6.902.164,80	0,040%	22,14%
10,2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR	80	80	$ 12.917.788,80	0,074%	29,52%
10,3	LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	80	80	$ 5.824.242,40	0,032%	29,52%
10,4	SANITARIO BLANCO	80	80	$ 11.602.429,60	0,065%	29,52%
10,5	DUCHA ECONOMICA	80	80	$ 3.013.568,80	0,018%	29,52%
10,6	REJILLAS SOSCO 3X 2	80	80	$ 1.489.674,40	0,009%	29,52%
10,7	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	80	80	$ 2.698.742,40	0,015%	29,52%
10,8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO	72	72	$ 9.795.975,12	0,056%	26,57%
		SUB TOTAL		$ 54.244.586,32	0,308%	
XI.	APLICAR ACABADOS					
11,1	PASTA SOBRE MURO EN ACRONAL, A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATECOL, AMONIACO Y NATRASOL (DOS MANOS)	75,67	6267,7461	$ 131.793.150,79	0,746%	27,92%
11,2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA	79	1166,83	$ 30.944.424,95	0,175%	29,15%
11,3	YESO PINTURA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	79	7993,22	$ 233.985.529,06	0,000%	29,15%
		SUB TOTAL		$ 396.723.104,80	0,920%	
XII.	INSTALAR TANQUE DE AGUA					
12,1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	72	72	$ 33.949.596,24	0,191%	26,57%
12,2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10 M	90	29,7	$ 22.308.618,92	0,126%	33,21%
		SUB TOTAL		$ 56.258.215,16	0,317%	
TOTAL COSTO DIRECTO				$ 4.674.346.278,11		
ADMINISTRACION				$ 841.382.330,06		
IMPREVISTO				$ 46.743.462,78		
UTILIDAD				$ 233.717.313,91		
TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 1.121.843.106,75		
TOTAL COSTO NETO				$ 5.796.189.384,86		
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA		72		$ 32.185.501,20		
IMPLEMENTACIÓN PMA - BIOSEGURIDAD				$ 119.203.571,92		
VALOR SUBTOTAL (EJECUTADO POR EL CONTRATISTA)				$ 5.947.578.457,98	37,22%	
INTERVENTORIA				$ 538.214.069,79		
GERENCIA INTEGRAL				$ 538.214.069,79		
ACTIVIDAD 17: APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				$ 355.967.213,11		
VALOR TOTAL		Acumulado		$ 7.379.973.810,68		
		Mes		$ 955.169.349,41		
		% Ejecutado:		41,81%		
		% Mes:		5,41%		

Ilustración 6 Avance de presupuesto pt2.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

8. GARANTIAS

8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoría

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

9. POLIZAS

9.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

9.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales.

- Se iba a intervenir la vivienda de la beneficiaria Doris Dita, registrada en el listado en el barrio El Manantial. Sin embargo, la comunidad del barrio La Mano de Dios no permitió esto alegando que la beneficiaria pertenece al barrio de ellos y no en el que aparece en el listado. Por lo que se decidió no intervenir esta vivienda hasta que el municipio aclare este caso.

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

13.2.1. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JHON FREDY RIOS GARCIA (Identificada como la vivienda #52)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de AGOSTO.

13.2.2. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARLOS EFRAIN USTATE MARTINEZ (Identificada como la vivienda #74)



Ilustración 7 Instalación de puertas y ventanas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13.2.3. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DIANA MARTINEZ (Identificada como la vivienda #75)



Ilustración 8 Levantamiento de muros.



Ilustración 9 Vaciado de concreto de plantilla.



Ilustración 10 Instalación de puertas y ventanas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 11 Enchape de zonas húmedas de las viviendas.

13.2.4. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEOVIGILDO FLORES (Identificada como la vivienda #76)



Ilustración 12 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 13 Enchape de zonas húmedas de la vivienda.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13.2.5. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZDARI MARTINEZ (Identificada como la vivienda #77)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de AGOSTO.

13.2.6. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DINA OLAYA (Identificada como la vivienda #84)



Ilustración 14 Definición de acabados de fachada.



Ilustración 15 Instalación de puertas y ventanas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 16 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 17 Instalación de marcos de puertas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13.2.7. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JUAN PICON (Identificada como la vivienda #85)



Ilustración 18 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 19 Definición de acabados internos.



Ilustración 20 Cableado eléctrico de la vivienda.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 21 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.8. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARELIS GOMEZ (Identificada como la vivienda #86)



Ilustración 22 Definición de acabados internos de vivienda.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 23 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 24 Impermeabilización de placa tanque.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 25 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.9. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MENDOZA (Identificada como la vivienda #87)



Ilustración 26 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JESICA BERRIO (Identificada como la vivienda #88)



Ilustración 27 Vaciado de concreto de plantilla.



Ilustración 28 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.11. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YEIMIR TRILLOS (Identificada como la vivienda #89)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 29 Instalación de tejado.



Ilustración 30 Instalación de red hidrosanitaria.



Ilustración 31 Levantamiento de mampostería.

13.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YULIS MORENO (Identificada como la vivienda #90)



Ilustración 32 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 33 Vaciado de concreto de plantilla.



Ilustración 34 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.13. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria BERTA TAPIA (Identificada como la vivienda #91)



Ilustración 35 Levantamiento de mampostería.

13.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NORAIDA CHAPARRO (Identificada como la vivienda #92)



Ilustración 36 Instalación de tejado.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 37 Levantamiento de mampostería.

13.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEIDER RIOS (Identificada como la vivienda #93)



Ilustración 38 Instalación de tejado.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 39 Relleno de vivienda.



Ilustración 40 Instalación de red hidrosanitaria.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 41 Trabajos de mampostería en la vivienda.

13.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALVARO BELTRAN (Identificada como la vivienda #94)



Ilustración 42 Levantamiento de mampostería.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 43 Vaciado de concreto de plantilla.

13.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JULIETH AGUDELO (Identificada como la vivienda #95)



Ilustración 44 Instalación de accesorios.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 45 Trabajos de acabados al interior de la vivienda.

13.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEIDY ROLON (Identificada como la vivienda #96)



Ilustración 46 Levantamiento de mampostería.

13.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALBERTH BAQUERO (Identificada como la vivienda #97)



Ilustración 47 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 48 Instalación de accesorios.

13.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARGARITA ROCHA (Identificada como la vivienda #98)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 49 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 50 Vaciado de concreto de plantilla.

13.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MILEIDY TELLEZ (Identificada como la vivienda #99)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 51 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 52 Instalación de tejado.



Ilustración 53 Instalación de red hidrosanitaria.

13.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JAVIER SANCHEZ (Identificada como la vivienda #100)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 54 Instalación de tejado.



Ilustración 55 Excavación de red hidrosanitaria.



Ilustración 56 Levantamiento de mampostería.

13.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ENEIDA PINO (Identificada como la vivienda #101)



Ilustración 57 Levantamiento de mampostería.

13.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARLENIS BELTRAN (Identificada como la vivienda #102)



Ilustración 58 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 59 Instalación de tejado.

13.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NOLVIS ZAMBRANO (Identificada como la vivienda #103)



Ilustración 60 Instalación de accesorios.



Ilustración 61 Instalación de puertas y ventanas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 62 Definición de acabados internos.

13.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CELSA CASERES (Identificada como la vivienda #104)



Ilustración 63 Levantamiento de mampostería.

13.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CRISTO HUMBERTO THOMAS (Identificada como la vivienda #105)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 64 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 65 Instalación de tejado.

13.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZ ZULETA (Identificada como la vivienda #106)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 66 Instalación de tejado.

13.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA ALEJANDRA GARCIA (Identificada como la vivienda #107)



Ilustración 67 Demolición de cimentación.

13.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA GUETTE (Identificada como la vivienda #108)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 68 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 69 Instalación de tejado.

13.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANGELICA CAÑIZARES (Identificada como la vivienda #109)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 70 Instalación de red hidrosanitaria.



Ilustración 71 Instalación de mampostería.



Ilustración 72 Instalación de tejado.

13.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ESMERALDA CORDOBA (Identificada como la vivienda #110)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 73 Levantamiento de mampostería.

13.2.33. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA GONZALEZ (Identificada como la vivienda #111)



Ilustración 74 Excavaciones para redes.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 75 Mampostería y rellenos.

13.2.34. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MIRIAN ABRIL (Identificada como la vivienda #112)



Ilustración 76 Levantamiento de mampostería.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 77 Instalación de tejado.



Ilustración 78 Excavación para red hidrosanitaria

.

13.2.35. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria VIRGINIA MORA (Identificada como la vivienda #113)



Ilustración 79 Levantamiento de mampostería.



Ilustración 80 Excavación para red hidrosanitaria.

13.2.36. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUBEN DARIO ORTIZ (Identificada como la vivienda #114)



Ilustración 81 Relleno en el lote.



Ilustración 82 Excavaciones para cimentaciones.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 83 Vaciado de concreto para cimentaciones.



Ilustración 84 Instalación de estructura metálica.

13.2.37. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LESLIE CAROL SANCHEZ RIVAS (Identificada como la vivienda #115)

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 85 Definición de acabados.



Ilustración 86 Cableado eléctrico.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 87 Pintura de interiores.

13.2.38. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MENYS ZAETH NIETO MENDOZA (Identificada como la vivienda #116)



Ilustración 88 Levantamiento de mampostería.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13.2.39. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DALIA ESTHER MEJIA URIBE (Identificada como la vivienda #117)



Ilustración 89 Disposición de relleno en el lote.



Ilustración 90 Trazado de la vivienda.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

14. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

14.1. Chequeo de trazados.

Una vez trazado todo el esquema correspondiente a las cimentaciones, se chequean las medidas entre ejes y la escuadra del trazado.



Ilustración 91 Chequeo de trazados.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

14.2. Chequeo de dimensiones y niveles en cimentaciones.

Una vez fundidas las cimentaciones, se chequea que las vigas y zapatas cumplan con las dimensiones especificadas y con los niveles adecuados.



Ilustración 92 Chequeo de cimentaciones.

14.3. Chequeo de acero de refuerzo de cimentaciones.

Previamente a fundir las cimentaciones se chequea que el acero de refuerzo puesto para las mismas sea el especificado. Revisando diámetros, traslapos y todo lo relacionado con el tema.



Ilustración 93 Chequeo de acero de refuerzo.

14.4. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 94 Chequeo de perfiles metálicos.

14.5. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.
Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.



Ilustración 95 Chequeo de nivelación de perfiles metálicos.

14.6. Nivelación de marcos de puertas internas.
Se revisa la correcta instalación de los marcos que sostendrán las puertas para su correcto funcionamiento.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 96 Chequeo de marcos de puertas.

14.7. Chequeo de dimensiones de puertas y ventanas.

Se revisan todas las ventanas y puertas de las viviendas chequeando que estas cumplan con sus respectivas dimensiones.



Ilustración 97 Chequeo de dimensiones de puertas y ventanas.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

14.8. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.

Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 98 Chequeo de mampostería.

14.9. Chequeo de refuerzo de mampostería.

Se revisa y garantiza que en el levantamiento de muros este presente el refuerzo de una varilla de ¼" cada dos hiladas.



Ilustración 99 Chequeo de refuerzo de mampostería.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

14.10. Chequeo de tapones de estructuras metálicas.

Una vez levantadas las estructuras metálicas, se verifica que se coloquen los tapones en los lugares donde se requiera para evitar la infiltración de agua al interior de los perfiles metálicos.

14.11. Chequeo de nivel de plantilla.

Una vez fundida la plantilla de las viviendas, se chequea que la altura libre hasta la viga sea la correcta.



Ilustración 100 Chequeo de altura libre.

14.12. Chequeo de enchape de zonas húmedas.

Se verifica que la altura de enchape del baño quede a 40cm por debajo del nivel de viga y se verifica que la altura de enchape en la cocina no sea menor de 40cm.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Ilustración 101 Chequeo de enchape.

14.13. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio.

- Anexos

15. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles mayor resistencia a las bases de la vivienda:

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.
- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.
- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

16. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

16.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: Javier Pérez Chajin
- Residente de obra: Ramiro Ramos

Tabla 10. Personal activo en el mes de AGOSTO 2022.

NOMBRE DEL EMPLEADO CONTRATISTA	CEDULA	TIPO (Empleado/ Contratista)
RAMIRO RAMOS TORRES		EMPLEADO
LIZETH KARINA MORENO CASTRILLO	1.064.113.046	EMPLEADO
EDUARDO PERAZA GUTIERREZ	77.040..595	EMPLEADO
HERNANDEZ GARRIDO JAIR ANTONIO	12.436.310	CONTRATISTA
JAVIER MORALES VIÑA	13.499.018	EMPLEADO
DEIMER NAVARRO NAVARRO	1.128.150.086	EMPLEADO
ARIAS CABARCAS JUAN ERNESTOR	1.064.121.822	PRESTACION DE SERVICIO
ARIAS CABARCAS JUAN ANDRES	1.064.123.135	PRESTACION DE SERVICIO
HERNANDEZ GARRIDO RICARDO ENRIQUE	77.182.782	PRESTACION DE SERVICIO
SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	1.063.287.421	PRESTACION DE SERVICIO
MORALES CHAVEZ YORDIS JOSE	PT 1.062.997	PRESTACION DE SERVICIO
MORALES MORALES YORQUIS	PT 4.954.013	PRESTACION DE SERVICIO
CORTEZ CAMARILLO JESUS ENRIQUE	PT 5.418.953	PRESTACION DE SERVICIO
SENCIAL VIDES NELIO LUIS	1.064.122.571	PRESTACION DE SERVICIO
HERRERA DITTA EPIMENIO	85.440.724	PRESTACION DE SERVICIO

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

FLOREZ GUZMAN DUVAN	1.003.291.192	PRESTACION DE SERVICIO
ALVAREZ CAMPO LEOPOLDO	88.138.160	PRESTACION DE SERVICIO
FLOREZ GUZMAN ALBEIRO	1.003.291.188	PRESTACION DE SERVICIO
ROBLES PACHECO JHONATAN JOSE	77.105.958	PRESTACION DE SERVICIO
PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	1.064.120.798	PRESTACION DE SERVICIO
ATENCIO URDANETA LUIS VENANCIO	PT 5.893.028	PRESTACION DE SERVICIO
MEJIA OSPINO JORGE ROMARIO	1.064.121.698	PRESTACION DE SERVICIO
DOMINGUEZ DE LA CRUZ ONOBYS ISAIAS	12.685.229	PRESTACION DE SERVICIO
POLO RODIGUEZ DEIMER ANTONIO	1.065.661.897	PRESTACION DE SERVICIO
POLO RODIGUEZ GEISON DAVID	1.143.241.494	PRESTACION DE SERVICIO
GAMEZ BENAVIDEZ RUBEN DARIO	19.600.678	PRESTACION DE SERVICIO
RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	12.521.642	PRESTACION DE SERVICIO
LOPEZ SUAREZ FERNEL	18.974.763	PRESTACION DE SERVICIO
CAMAÑO ARGOTE JOSE ENRIQUE	12.521.843	PRESTACION DE SERVICIO
CUICAS COLINA DARWIN ERNESTO	PT 6.615.175	PRESTACION DE SERVICIO
NAVARRO NAVARRO FERNANDO	1.085.225.934	PRESTACION DE SERVICIO
PATERNINA ACOSTA JOSE LEONARDO FABIO	1.064.115.977	PRESTACION DE SERVICIO
DE AVILA OBESO OMAR ENRIQUE	1.063.949.118	PRESTACION DE SERVICIO

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CABARCAS RIOS CRISTHIAN ENRIQUE	1.007.326.439	PRESTACION DE SERVICIO
LOBO TRIANA ANDERSON SMITH	1.064.109.363	PRESTACION DE SERVICIO
QUINTERO CUDRIS JUAN CARLOS	12.524.863	PRESTACION DE SERVICIO
MUÑOZ GIL SERGIO	12.568.046	PRESTACION DE SERVICIO
LOPEZ SANCHEZ LEONARDO	19.835.752	PRESTACION DE SERVICIO
TORRES AMARA DIDIER	9.694.450	PRESTACION DE SERVICIO
IBAÑEZ EUCLIDES	1.062.809.939	PRESTACION DE SERVICIO
FONTALVO LOPEZ EDIER ALFONSO	1.064.107.047	PRESTACION DE SERVICIO
RIVERA MIER LUIS IVAN	1.065.998.235	PRESTACION DE SERVICIO
LEON CONTRERAS OCTAVIO RAFAEL	PT 6.589.445	PRESTACION DE SERVICIO
JURADO JIMENEZ YAN CARLOS	1.002.410.106	PRESTACION DE SERVICIO
DIAZ IRIARTE JAIME ALONSO	12.523.057	PRESTACION DE SERVICIO
BOLAÑO GARCIA RICHARD	12.524.538	PRESTACION DE SERVICIO
GARCIA FUENTES JENRRY	1.064.118.652	PRESTACION DE SERVICIO
VASQUEZ MESA YORMAN JOSE	PT 6.523.829	PRESTACION DE SERVICIO
OSPINO OSPINO MAURICIO JOSE	1.082.916.550	PRESTACION DE SERVICIO
GUTIERREZ MEJIA JUAN DAVID	1.064.107.618	PRESTACION DE SERVICIO
GUARIN RANGEL JAIDER ALFONSO	1.007.624.505	PRESTACION DE SERVICIO

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

GARCIA MARTINEZ JAVIER ENRIQUE	1.003.123.244	PRESTACION DE SERVICIO
ALVAREZ CASTRO SAMIR ALFONSO	1.064.110.377	PRESTACION DE SERVICIO
JURADO JIMENEZ JESUS MARIA	1.002.410.106	PRESTACION DE SERVICIO
QUINTERO MORENO DAVID ANTONIO	1.127.659.584	PRESTACION DE SERVICIO
ARIAS PALLARES JOHAN JOSE	1.064.116.656	PRESTACION DE SERVICIO
NIEVES EDGAR MANUEL	77.033.935	PRESTACION DE SERVICIO
ROJAS PARRA ADEL HUMBERTO	1.064.112.318	PRESTACION DE SERVICIO
SILVA MENDOZA HERNANDO	12.521.143	PRESTACION DE SERVICIO
ROJAS PEÑAS ADEL	9.265.081	PRESTACION DE SERVICIO
IBAÑEZ ARANGO EUCLIDES SEGUNDO	1.129.519.632	PRESTACION DE SERVICIO
CALDERON FLOREZ STIVEN	1.193.534.100	PRESTACION DE SERVICIO
FONSECA DE ORO ROBINSON CRUSOYS	17.975.363	PRESTACION DE SERVICIO
RAPALINO JIMENEZ LUIS FERNANDO	1.192.778.022	PRESTACION DE SERVICIO
PEREZ CORDOBA JOSE HUMBERTO	12.522.669	PRESTACION DE SERVICIO
VASQUEZ GUTIERREZ HERNANDO	12.523.103	PRESTACION DE SERVICIO
OCHOA VARGAS AMINSO	12.523.543	PRESTACION DE SERVICIO
CANTILLO ROMERO ALFREDO	1.010.009.471	PRESTACION DE SERVICIO
MENDEZ VILLAMIZAR JORGE LUIS	1.064.113.084	PRESTACION DE SERVICIO
BRACHO PUENTES SAUL ANTONIO	12.524.436	PRESTACION DE SERVICIO
MENDOZA BRITO ELKIN JAVIER	1.064.107.792	PRESTACION DE SERVICIO
LOBO TRIANA ANDERSON SMITH	1.064.107.792	PRESTACION DE SERVICIO
DELGADO VILLA HENRY JOSE	19.604.771	PRESTACION DE SERVICIO
MARTINEZ SANCHEZ ESNEIDER	1092345844	PRESTACION DE SERVICIO
MIELES SANCHEZ JORGE ARMANDO	1.082.879.901	PRESTACION DE SERVICIO

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

GUERRA CORDOBA NEIDER ENRIQUE	5.165.220	PRESTACION DE SERVICIO
JAMIOY HERNANDEZ CARLOS ALIRIO	12.567.335	PRESTACION DE SERVICIO
ALVAREZ FLORES ANTONIO RAMON	PT 5.831.799	PRESTACION DE SERVICIO
SALCEDO MARIN ELIAS	18.956.005	PRESTACION DE SERVICIO
JAIMES GALVIS LUIS ALBERTO	13.243.787	PRESTACION DE SERVICIO
EPIAYU PALIZA JAVIER SEGUNDO	PT 6.946.782	PRESTACION DE SERVICIO
MENESES SANGUINO JHONIS	12.523.050	PRESTACION DE SERVICIO
MEZA MORALES ARQUIMEDES	17.849.734	PRESTACION DE SERVICIO
VEGA MOJICA EDWIN JOSE	1.064.109.526	PRESTACION DE SERVICIO
MORALES ROMAN RICHAR ALBERTO	PT 6.186.089	PRESTACION DE SERVICIO
GUARIN RANGEL JEIDER EDUARDO	1.007.624.606	PRESTACION DE SERVICIO
PABA CARREÑO HERNAN ENRIQUE	15.174.018	PRESTACION DE SERVICIO
CONTRERA AVILA WILDER	1.064.122.171	PRESTACION DE SERVICIO
CASTILLEJO GONZALES ADALBERTO	91.247.122	PRESTACION DE SERVICIO
GUARIN RANGEL JANIER ESTEBAN	1.003.123.491	PRESTACION DE SERVICIO
RAMIREZ APONTE CARLOS ENRIQUE	6.013.972	PRESTACION DE SERVICIO
OLIVERA JURADO JEINER DAVID	1.007.624.412	PRESTACION DE SERVICIO
CARRANZA CABALLERO JAIDER	1.081.791.009	PRESTACION DE SERVICIO

16.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoría: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoría: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS.

En el mes de mayo de 2022 se protocolizaron 20 viviendas adicionales a las 52 viviendas ya protocolizadas, una vez revisadas y recibidas por interventoría, comfacesar y la alcaldía municipal. En total, los 72 beneficiarios que han recibido ya su vivienda por parte del municipio son los siguientes:

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Tabla 11. Relación de viviendas protocolizadas.

No. Vivienda	BENEFICIARIO	BARRIO	ESTADO	No. DE ENTREGA
1	EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
2	YARELYS CUBILLOS ARDILA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
3	CRISTO HUMBERTO RIOS	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
4	MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
5	YORAIMA POLO ROJANO	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
6	JOSE DAVID URRUTIA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
7	VIVIANA MENDIBIL GUEVARA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
8	MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
9	RUTH MARINA PEREZ RAMOS	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
10	JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
11	DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	1
12	MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
13	YENIFER ARRIETA BUSTOS	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
14	ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
15	YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
16	LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
17	MILEIDYS YONARIS RAMIREZ MENDOZA	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
18	LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	EL PROGRESO	ENTREGADA	1
19	JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
20	ANYLUZ DAZA CARREÑO	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
21	JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
22	LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
23	LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
24	OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	1
25	ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
26	CARMEN ALICIA GARCIA RODRIGEZ	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
27	CECILIA RIOS RAVELO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
28	INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	1
29	DIANA CAROLINA SUAREZ USMA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
30	DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
31	LUCINDO MONTERO SALDAÑA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
32	MARIA DELFINA MENDOZA LLANES	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
33	ORLANDO NIETO TORRES	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

34	JORGE ENRIQUE GELVIS	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	2
35	TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	2
36	ANGELICA MARIA CARO GOMEZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	2
37	CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
38	MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
39	TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ ARENGAS	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
40	WILMER CARO GOMEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	2
41	KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
42	LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
43	EDILSON PEDROZA ROBLES	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
44	EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
45	GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
46	MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
47	RUBY SANCHEZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	3
48	HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	3
49	BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	3
50	NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	3
51	ALBA YASMIN CRUZ PAEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	3
52	CONSUELO BALLENA CLAVIJO	VILLA ESPERANZA	ENTREGADA	3
53	ESPERANZA ISABEL BELEÑO DELGADO	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
54	MELIZA PADILLA MANCERA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
55	MINELLIS CECILIA MARTINEZ MEJIA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
56	AMALIA MORA ARDILA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
57	ANA MERCEDES HURTADO GALVAN	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
58	DENIS CECILIA JIMENEZ HURTADO	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	4
59	CARMEN ELENA VEGA TORRES	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
60	CINDY PAOLA JIMENEZ LUGO	JUAN RAMON	ENTREGADA	4
61	LILIBETH MARTINEZ VEGA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
62	YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	4
63	ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
64	WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN	BRISAS DEL NORTE	ENTREGADA	4
65	YANIS MABEL THOMAS SAMPAYO	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
66	LINA MARCELA SANCHEZ IGUARAN	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
67	ANA MERCEDES DAMIAN ABRIL	17 DE FEBRERO	ENTREGADA	4
68	LEUBITH JUDITH RAMOS MELENDEZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
69	ROSA ELENA PEREZ ESTRADA	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4
70	JESUS ALBERTO PEREZ REAL	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
71	LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE	BELLO HORIZONTE	ENTREGADA	4
72	LEOMAR YIGETH VILLAREAL PERTUZ	LUIS CARLOS GALAN	ENTREGADA	4

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS

A lo largo de la ejecución del proyecto se han realizado diversas modificaciones a lo establecido en los planos por distintas razones. Ya sea por las condiciones únicas de la ubicación del lote de cada beneficiario, por facilidad y mayor seguridad o por incongruencias que se han encontrado en los diseños establecidos.

Las modificaciones que se han realizado a lo largo del proyecto son las siguientes:

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS

En la ejecución del proyecto se presentaron viviendas en las cuales la estructura metálica se levantó con columnas unidas mediante cordones de soldadura y en todas las viviendas se han utilizado flanches (los cuales transmiten la carga de las columnas a las cimentaciones) con soportes de varillas de 3/8' corrugadas soldadas por debajo del elemento, en vez de utilizar un sistema apernado. Ante lo cual, el municipio manifestó su preocupación, por lo que el contratista decidió solicitar el concepto de un ingeniero especialista en estructuras para aclarar si era necesario cambiar estos elementos o su funcionamiento sigue cumpliendo su propósito bajo las condiciones dadas. Dicho concepto fue revisado por interventoría y por COMFACESAR los cuales le otorgaron validez.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Anexo. Concepto estructural con anexo de aprobación interventoría y COMFACESAR.

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- El día **1 de agosto** se presentaron precipitaciones a partir de las 3:30P.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **1.5 horas** de trabajo.
- El día **5 de agosto** se presentaron precipitaciones a partir de las 2:00P.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **3 horas** de trabajo.
- El día **16 de agosto** se presentaron precipitaciones a partir de las 3:20P.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **1.7 horas** de trabajo.
- El día **22 de agosto** se presentaron precipitaciones a partir de las 4:00P.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **1 hora** de trabajo.
- El día **25 de agosto** se presentaron precipitaciones en la mañana hasta las 9:00A.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **2 horas** de trabajo.
- El día **26 de agosto** se presentaron precipitaciones en la mañana hasta las 11:00A.M. Por lo que se suspendieron las actividades y se perdieron **4 horas** de trabajo.

En total, en el mes de AGOSTO se perdieron **13,2 horas** de trabajo.

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com


En total, desde que inició el proyecto hay un total de **352,2** horas perdidas por fuerza mayor.

ANEXOS

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

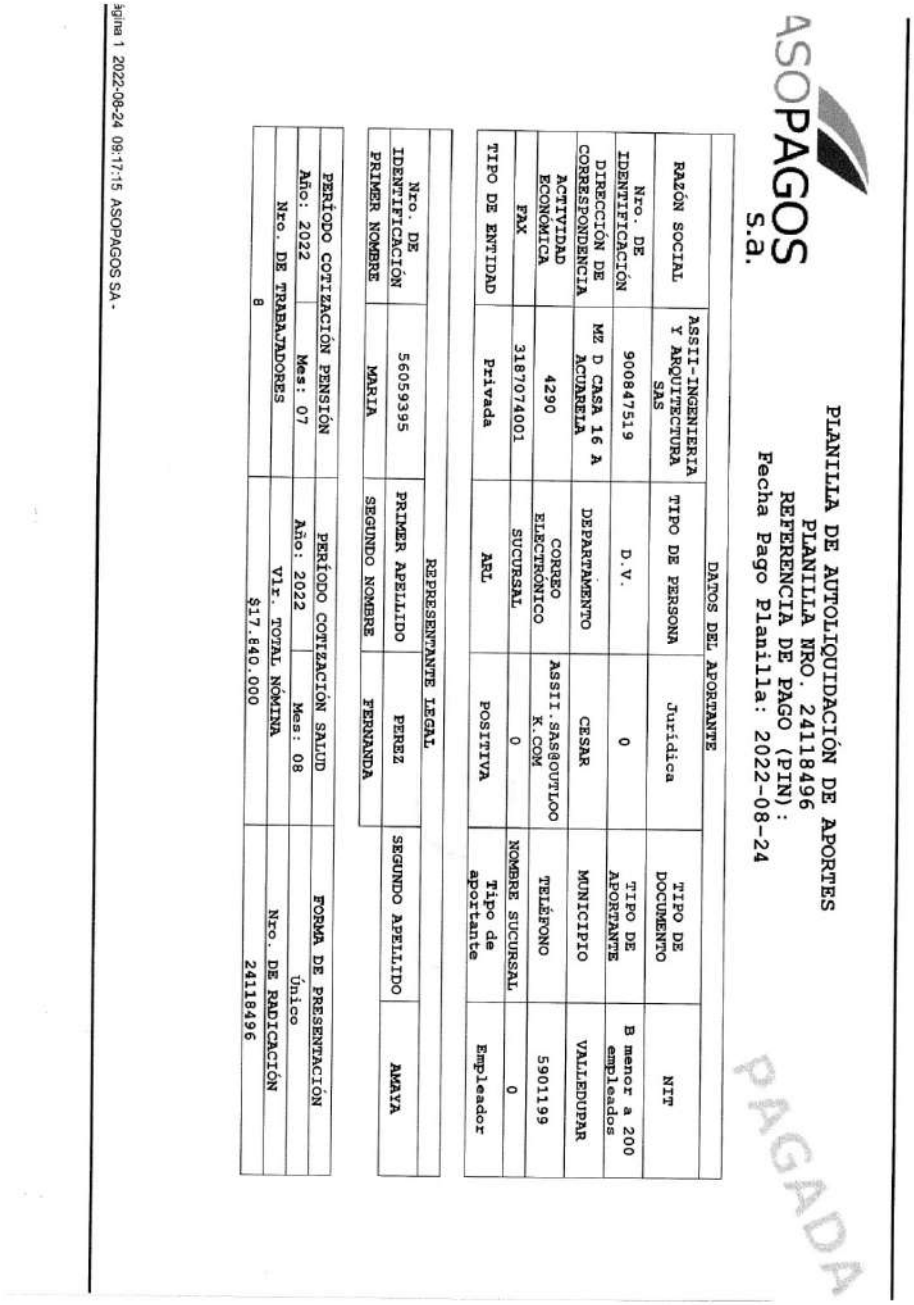

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24118496
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-08-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900847519	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ D CASA 16 A ACUARELA	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ASSII.SAS@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	5901199
FAX	3187074001	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	56059395	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$17.840.000		24118496

Página 1 2022-08-24 09:17:15 ASOPAGOS SA -

A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: Carrera 23 #6N bis – 18, Local 1 - Mirador de la Sierra 1 – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901469926	3	CONSORCIO VIGUER 2021	R	0	SEGUROS COLPATRIA S.A.	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
20-1	CRA 11 NO 15 86 OF 505 ED GRANA-ERRAR		5901119		GILBERTHBARRA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23957845	E	2022-08-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.437.708	28.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
12	23957845	2022-08-05	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MOTIVO/RET DE SALARIO	VSP	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPST	APRT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PENS.	FVEJE	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot	Cot	Tarifa	Sub. Total	Total	Cambio de Pensionados
1	CC 12538976	CAYOTH MARQUEZ EDUARDO JOSE	7.550.000	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.550.000	1.324.000	16.000	16.000	CAPITAL-EPS002	7.550.000	566.000	COMFACESA R-CCF13	7.550.000	906.000	7.550.000	332.580	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	2.445.300	S
2	CC 1065588980	CATON OCHOA CLARA INES	2.155.000	F											0		30	30	30	30	PORVENIR-25830	2.155.000	344.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.155.000	86.200	COMFACESA R-CCF13	2.155.000	86.200	2.155.000	1.58.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	697.200	S
3	CC 1065807433	BUGRA SIERRA GILBERTO ANTONIO	1.000.000	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0		CAPITAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFACESA R-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	309.000	S
4	CC 1065838488	LOPEZ ARRIETA JAITHERSON	1.000.000	F											0		30	30	30	30	PORVENIR-25830	1.000.000	160.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACESA R-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	309.000	S
5	CC 1749020	AVILA LEY VIDAL JAVIER	1.000.000	F											0		30	30	30	30	PORVENIR-25830	1.000.000	160.000	0		CAMACOL-EPS017	1.000.000	40.000	COMFACESA R-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	309.000	S
6	CC 1084113040	MORENO CASTRILLO LIZETH RANDIA	1.380.000	F											0		30	30	30	30	PROTECCION-25924	1.380.000	192.000	0		ASOC AGRIT SALUD-EPS041	1.380.000	48.000	COMFACESA R-CCF13	1.380.000	48.000	1.380.000	95.000	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	171.600	S
7	CC 1121136086	NAVARRO NAVARRO DAIMER	1.000.000	F											0		30	30	30	30	PORVENIR-25830	1.000.000	160.000	0		EPS C MUTUAL-EPS013	1.000.000	40.000	COMFACESA R-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	309.000	S
8	CC 1065964937	PALMERA CASTILLA MARIA ALEXANDRA	2.000.000	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0		SALUD TOTAL-EPS005	2.000.000	80.000	COMFACESA R-CCF13	2.000.000	80.000	2.000.000	138.200	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	618.200	S
9	CC 77048195	PERAZA GUTIERREZ EDUARDO JESUS	1.000.000	F											0		30	30	30	30	PORVENIR-25830	1.000.000	160.000	0		SALUD TOTAL-EPS005	1.000.000	40.000	COMFACESA R-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.080	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	309.000	S
10	CC 1094892782	FIGUEYRA SIERRA DARIO STEVEN	1.380.000	F	X										0		15	12	15	15	PORVENIR-25830	600.000	104.000	0		MEDIMAS-EPS099	600.000	24.000	COMFACESA R-CCF13	600.000	24.000	630.000	43.500	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	201.300	S
11	CC 1065809088	RAMOS TORRES RAMIRO	1.380.000	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.380.000	240.000	0		SALUD TOTAL-EPS005	1.380.000	80.000	COMFACESA R-CCF13	1.380.000	80.000	1.380.000	104.480	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	466.400	S
12	CC 1065832098	SIERRA URIBE ROBSY DAVID	1.000.000	F	X										0		0	8	9	9	PORVENIR-25830	160.000	64.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	160.000	12.800	COMFACESA R-CCF13	160.000	12.800	160.000	28.980	0,00360	0	0	0	0	0	0,00	91	0	52.900	S

Página 1 2022-08-10

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR
VALLEDUPAR
CESAR
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0046620 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCG007-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

VIGILADO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CJP189

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

Berkley Colombia Seguros
La Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

VIGILADO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CJ0189

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CJ 0189.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ 01 89.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.089 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0	MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8	CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015200617305(3900)0000068881 39(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061730-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO. CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY. POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 089 DE 2021. CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSI-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-40-101005082

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0	MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8	CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101520061732 1 (3900) 000000453677 (96) 20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS “COVID-19”

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	**Abril de 2020**	**Elaboración inicial**	**Administrativas y Operativas**	**26**

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN……	**4**
1	**INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA……**	**5**
2	**OBJETIVOS……**	**8**
3	**ALCANCE……**	**8**
4	**DEFINICIONES……**	**8**
5	**MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S……..**	**11**
6	**MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES……..….**	**14**
7	**MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA…….…… …..**	**15**
8	**MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S ……**	**16**
9	**MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN INTERVENTORÍAS…… ……**	**22**
10	**MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS….**	**25**
11	**ATENCIÓN Y EMERGENCIAS…….**	**26**

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora “ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoría Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoría de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoría con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoría que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoría.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.

➢ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoría.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoría y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoría que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoría.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoría en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**., proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

***Aislamiento*:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

***Hipoclorito*:** es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoría
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoría
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoría se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoría
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoría se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoría

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehículo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoría se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoría

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
  de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
  de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
  19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorías y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoría, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
  desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
  enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoría (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoría se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoría

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

reportarán al director de interventoría y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
  19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoría, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.

- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoría con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoría avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoría, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
  seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
  generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
  organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.

Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoría descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoría en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoría para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoría.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoría, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoría.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo  Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Gerente Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021
AGOSTO 2022.

LA JAGUA DE IBIRICO
AGOSTO
2022.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO.

1. INTRODUCCION 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA..... 4

2.1. Centros de trabajo 4

2.2. Descripción de las actividades 4

2.3. Horario de trabajo. 4

3. OBJETIVOS 4

3.1. General..... 5

3.2. Específicos. 5

4. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA. 6

5. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES..... 7

6. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA. 9

7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL. 10

8. CONCLUSIÓN 11

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológicaen todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de laconstrucción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias delproyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad,prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora “CONSORCIO VIVEURB 2021”, ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

2.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas sitio propio	V

2.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de viviendas de interés social en sitio propio en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

2.3. Horario de trabajo.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m., para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

3. OBJETIVOS

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3.1. General.

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID – 19).

3.2. Específicos.

- ✓ Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrerodel 2020.

- ✓ Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- ✓ Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA.

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

IT	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
	Ubicación de dos (2) carteleras informativas en elárea de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID-19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al tosero estornudar con el antebrazo o con un pañuelode papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientacionesde medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

El CONSORCIO VIVEURB 2021 viene cumpliendo con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19.

- Se están implementando estrategias como YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se refuerzan en las charlas diarias de seguridad, se vela por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.



- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.



- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables:

  - ✓ Nombre
  - ✓ Contacto
  - ✓ Edad
  - ✓ Enfermedades previas
  - ✓ Estado de embarazo (si aplica)
  - ✓ EPS
  - ✓ ARL





carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.

6. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

- ✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad yacceso a lugares públicos.
- ✓ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- ✓ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- ✓ Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.



- ✓ Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

- ✓ Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.

- ✓ se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.

- ✓ Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.





- ✓ Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.

- ✓ Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8. CONCLUSIÓN

En general se viene implementando todas las medidas de bioseguridad de manera rigurosa por parte de los profesionales de obra y el gran acompañamiento que nos ha hecho la interventorías, secretaria de salud entre otras entidades.

Hasta el momento no hemos tenido ningún caso de covid-19 lo que nos hace pensar que se viene haciendo un excelente trabajo.

El consorcio VIVEURB 2021 seguirá estableciendo canales entre los profesionales de campo y los trabajadores con el fin de establecer cada vez más medidas que nos permitan seguir con este firme objetivo.

Se seguirá acogiendo e implementando las solicitudes realizadas por la interventoría y demás entidades que no ayuden a estar siempre en plan de mejora.

Lizeth K Moreno C.

LIZETH KARINA MORENO CASTRILLO.
TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sello con Reglamento Técnico

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.,** en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.,** in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ANSI ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate*	**CSR - CER269688**		
Fecha de Aprobación: *Approval Date:*	**2013-09-27**	**Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:*	**2018-03-09**
Fecha de Renovación: *Renewal Date:*	**2016-08-17**	**Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:*	**2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

DIACO S.A.

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	**Consecutivo Nº:**	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	**Remisión:**	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	**Cliente:**	HIERROS HB S.A-SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmX6m	**N° Orden:**	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, mín.
50	0,25	1,35	0,035	0,04	275	380	16

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000318391
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA)

FECHA 26.02.2021

MATERIAL: 110941 - Metaltub N 100x100-4.0 6000 A500C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A500/NTC 4526 GRADO C

LOTE No	0006909195				
COLADA No	538407				
PESO	2.557,800 kg				
PORCENTAJE DE CARBONO	0,160 %				
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,880 %				
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,020 %				
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %				
LÍMITE ELÁSTICO	443 MPa				
RESISTENCIA MÁXIMA	602 MPa				
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	25 %				

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6829 - CEL. 300 810 17 92

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:**	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACION DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	**LOCALIZACIÓN:**	
		COLOR:	ANARANJADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	**NOTA:**	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ma	Kg	3,534	3,604	3,621	3,572	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,506	6,501	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,210	0,236	0,245	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,30	11,82	12,34	11,96	11,78
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmáx	N	89600	83500	74500	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m3	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49381	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2897000	2942000	2908000	2893000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	198	200	195	196	198	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14611,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,61	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
Nit. 900891457-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PLACAS ONDULADAS DE FIBRO CEMENTO

Fabricado por **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. – TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, en la **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

Manufactured by **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. – TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, in the **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4694 (2002)

Placas onduladas de fibrocemento para cubiertas y revestimientos

Fiber-cement corrugated sheets for covering and sheaating

SECTOR ICS 91.100.40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER326441
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2014-08-08	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2020-08-14
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2017-07-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2023-08-07

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ES-I-PD-04-F-001 Versión 3

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

BITACORA DE OBRA.

Datos de la obra:

Objeto: Construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio.

Localización: Cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Contrato de Obra: No. 088 de 2021.
Valor: $15.977.378.542.00.
Duración: Dieciocho (18) meses.
Fecha de inicio: Dieciocho (18) de Mayo de 2021
Fecha de conclusión: Dieciocho (18) de Noviembre de 2022

Datos del contratista:

Nombre: Consorcio Vivienda 2021 La Jagua de Ibirico
Dirección: Carrera 11 # 15 - 66 / Edificio Granaherrar / Oficina 505
Telefono: 590 1119
Representante Legal: Luis Eduardo Cayón Medina.

Datos del interventor:
Nombre: ASSII - Ingeniria y Arquitectura S.A.S.
Dirección: Manzana D Casa 16 A / Conjunto Cerrado Acuarela
Telefono: 3004403421
Gerente General: Maria Fernanda Perez Anaya.

Responsables de Obra:
Director de Obra: Jorge Luis Medina :

Residente de interventoria: Gustavo Andres Benjumea Serrano: Gustavo Benjumea

Residente de Obra: Luis Vergara :

Escaneado con CamScanner

Nota No.001 Fecha: 28/05/2021

Hoy, viernes 28 de mayo de 2021 siendo las 7:30am se da apertura a la bitacora de obra. En la cual se expondrá las actividades realizadas en la construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Dicho proyecto tiene como meta contratada el inicio y la finalización en un plazo no mayor a 18meses.

Gustavo Bayuelo

Nota No.002 Fecha: 28/05/2021

Con esta nota se hace constancia que entre las 8:00am y las 9:00am el contratista realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios del barrio Bello Horizonte. Donde, además, estuvieron presente representantes de la alcaldía municipal, el presidente de la junta de acción comunal y la interventoría.

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0003 Fecha: 31/05/2021

Personal del contratista, empezó a visitar a los beneficiarios en sus respectivos lotes propios a la altura de los 9:30am. Donde se le pide llenar un acta de poder para que CONFACESAR adelante el proceso de los escrituras del predio. Ademas, el contratista verifica que el lote cumpla con los requisitos, recolecta información general del lote y realiza los actas de vecindad correspondientes.

Gestor Bayamo

Nota No.0004 Fecha 31/05/2021

El lote de la beneficiaria Maria Angelica Coro cumple con las dimensiones para la construcción de la vivienda. Sin embargo, la beneficiaria manifiesta que no quiere demoler una sección del predio correspondiente a cocina, habitación, baño y patio, debido que está construido en material. Lo que deja un area disponible para construir en el predio de 7,20m de ancho por 4.30m de fondo, lo que implicaría un nuevo diseño para esta vivienda en especifico.

Gestor Bayamo

Nota No.0005 Fecha 01/06/2021

El vecino al este del beneficiario Eudaldo Escobar no permite el ingreso a los alcobas de su predio para la realización de los actas de vecindad.

Gestor Bayamo

Nota No.0006 Fecha 02/06/2021


Con esta nota se hace constancia que a las 11:00 AM llegaron los materiales requeridos para empezar la construcción de la casa modelo. Y la se empezo el trabajo de nivelado del terreno el cual fue suspendido a las 2:00PM por lluvia.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0007 Fecha: 04/06/2021

A las 10:00 AM inició la socialización con los beneficiarios del barrio El Progreso y al terminar se procedió a caracterizar a los beneficiarios en sus respectivos lotes. Donde se encontró que la beneficiaria Andrea Rangel cuenta con un lote que no cumple las dimensiones requeridas (En el Dibujo No.1 se plasman las dimensiones del lote). Por otro lado, el trazado en la casa modelo quedó listo y se iniciaron las excavaciones.

Gustavo Bayuelo

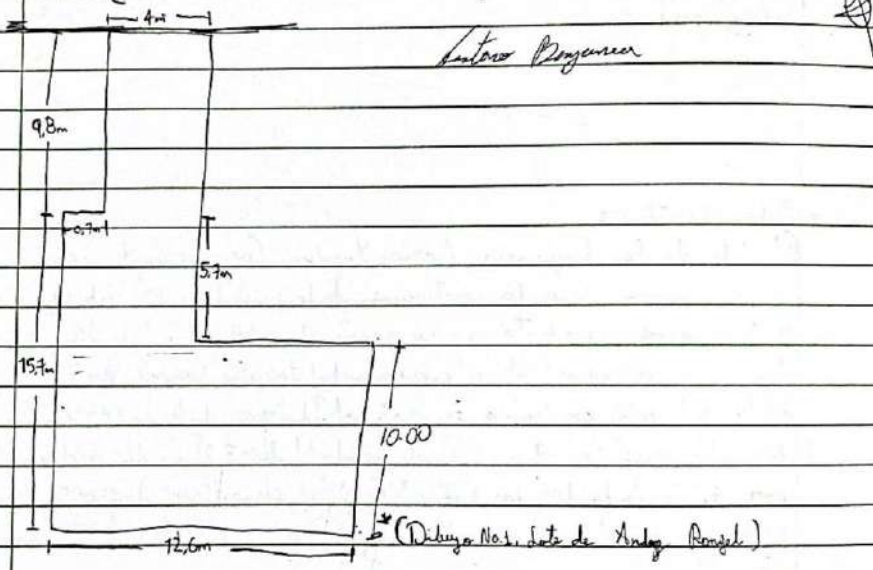

(Dibujo No.1, Lote de Andrea Rangel)

Nota No. 0008 Fecha: 09/06/2021 Estado del tiempo: Lluvia desde la 1:00PM hasta las 2:30 PM

A las 2:30 P.M. se inició a fundir el concreto correspondiente a las cimentaciones de la casa modelo. Una vez fundidos los medidos y niveles requeridos.

Gustavo Bayuelo

Nota No. 0009 Fecha: 10/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores

Actividades: Corte del material correspondiente a las columnas, relleno de material, excavaciones y trazados. Gustavo Bayuelo

Nota No. 0010 Fecha: 11/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas

Equipos/Herramientas: Placa compactadora, Volqueta, herramientas menores

Actividad: Trazados, Excavaciones, Rellenos.

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0011 Fecha: 11/06/2021
se le realizó una charla de seguridad al personal en obra. Además, se hizó entrega de conos de seguridad, tapabocas, guantes tipo ingenieros, gafas de seguridad y todos en buen estado.
Gustavo Bonjumea

Nota No.0012 Fecha: 12/06/2021, Estado del tiempo: lluvia hasta las 7:30 pm
Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipos y herramientas: Volqueta, equipo soldador, mezclador de concreto y herramientas menores.
Actividades: vaciado de cimentaciones y relleno de material
Gustavo Bonjumea

Nota No.0013 Fecha: 13/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 1 Cuadrilla
Equipos y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores
Actividades: Instalación de perfiles metalicos.
Gustavo Bonjumea

Nota No.0014 Fecha: 15/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramienta: Equipo de soldadura, Vibrocompactadores, herramientas menores
Actividades: Instalación de vigas metalicas, excavaciones manuales y compactación
Gustavo Bonjumea

Nota No.0015 Fecha: 16/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Vibrocompactador, Equipo de soldadura, trompa mezclador y herramientas menores
Actividad: En las horas de la mañana se nivela y compacta el lote del beneficiario Cristo Rios, se continua el proceso de soldadura de vigas metalicas, se culminaron detalles de soldadura en el refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las cimentaciones correspondientes a una vivienda.
Gustavo Bonjumea

Nota No.0016 Fecha: 16/06/2021.
Entre las 2:00pm y las 3:30pm no hubo fluido electrico en la zona de trabajo.
Gustavo Bonjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0017	Fecha: 17/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, herramientas menores Actividades: Trazado y nivelación, soldadura y montaje de estructura, vaciado de cimentaciones. Gustavo Benjumea
Nota No 0018	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizó trazado y excavaciones en 3 viviendas y se hizo trabajo de montura de estructura en 2 viviendas. Gustavo Benjumea
Nota No 0019	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Lluvioso El trabajo en Obra fue suspendido a las 4:00PM por lluvia Gustavo Benjumea
Nota No 0020	Fecha 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezclador de concreto, zalqueta, cerra tenaza, herramientas menores. Actividades: Se hizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se realizó trazado y excavaciones en 2 viviendas y se fundió una base de concreto ciclopeo en la vivienda del beneficiario Gusto Humberto, esto para el fin de tener un mejor soporte para las cimentaciones. Gustavo Benjumea
Nota No 0021	Fecha 21/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizaron trabajos de soldadura, trazado, nivelación y excavaciones. Gustavo Benjumea
Nota No 0022	Fecha 22/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, zalqueta, Mezclador de concreto y herramientas menores. Actividades: Se realizo trabajo de soldadura en 1 Vivienda, se fundieron las cimentaciones de 1 Vivienda y se adelantó trabajo de trazado y excavaciones en 2 viviendas. Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0023 Fecha 23/06/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 5 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, talquato, mezclador de concreto y herramientas menores
Actividades: Se realizó trabajo de trazado, nivelación y excavaciones en una vivienda, se fundio la cimentacion de una vivienda, se realizó trabajo de soldadura en una vivienda y se inició la instalación del techado de la casa modelo.
Cristina Benjamez

Nota No. 0024 Fecha 24/06/2021
A partir de las 6:00AM iniciaron fuertes lluvias hasta las 9:30AM. A partir de ahí permanecio en zona de intensidad moderada hasta las 10:00AM. El resto del día permaneció parcialmente nublado.
Cristina Benjamez

Nota No. 0025 Fecha 25/06/2021
En la ubicación del lote de la beneficiaria Ana maciel arrieta. se presentó la señora Yoanis Vera quien dice ser quien vendió esos lotes. La señora vera asegura que el lote de la beneficiaria esta corrido 1 metro hacia la derecha, por lo que la construcción de la vivienda esta invadiendo 1 metro del lote de la izquierda. que pertenecia al familiar fallecido Ana Maciel, quien seria su madre, luego de hablar con la beneficiaria y los hermanos se acordó que en la sucesión del lote el metro invadido será otorgado a la beneficiaria. Por lo que se decidio continuar con la construcción.
Cristina Benjamez

Nota No. 0026 Fecha 26/06/2021. Estado del tiempo: nublado. Personal en Obra: 5 cuadrillas
Equipo y herramientas: Herramientas menores y equipo de soldadura
Actividades: Se terminaron los preparativos en el lote de la beneficiaria Ana arrieta para fundir las cimentaciones y se inicio el trabajo de excavaciones en el lote de Luis Camargo. Mientras que en el lote de Jose Urrutia se inició la instalación de la estructura metalica.
Cristina Benjamez

Escaneado con CamScanner

Nota No.0027 | Fecha 28/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, herramienta menor
Actividades: Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yaiana Mendivil, Excavación
en la vivienda de Luis Camargo. Pega de bloques de medianera en la
vivienda de Eudaldo Escobar, trazado en el barrio el progreso, relleno
en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez. Gustavo Bayeneo

Nota No.0028 | Fecha 29/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, vibrocompactadora
herramientas menores y Taladro.
Actividades: Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Luis Camargo,
compactación en la vivienda de Mayra Silva, compactación y relleno en la
vivienda de Yaiana Polo. Levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo
Escobar, levantamiento de estructuras en la vivienda de Yaiana mendivil, pintura
de corazas en la vivienda de Juan Diaz.
Gustavo Bayeneo

Nota No.0029 | Fecha 30/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Herramienta menores, vibrocompactadora, taladro
Actividades: Se continua con el levantamiento de muros en la casa modelo,
relleno y compactación en la vivienda de Mayra Silva y Doris Martinez y se
realizaron la preparativos para fundir las cimentaciones en la vivienda
de Juan Perez.
Gustavo Bayeneo

Nota No.0030 | Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra, 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar,
trazado en la vivienda de Mayra Silva, relleno en las viviendas de Mileidys Ramirez
y Madelina Hernandez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Juan Perez
Gustavo Bayeneo

Nota No. 0031 | Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones
El vaciado de las cimentaciones en la vivienda de Juan perez, fue suspendido
a la 4:15PM por fuertes lluvias.
Gustavo Bayeneo

Nota No.0032 | Fecha 01/07/2021
Al rededor de las 4:30PM inicio la socialización del barrio
Bivian del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para protegerse
de la lluvia. Gustavo Bayeneo

Escaneado con CamScanner

Nota No.0033 Fecha 02/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores, motocarro.
Actividades: Se termino de fundir las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continuo el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Gustavo Benjumea

Nota No.0034 Fecha 03/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramientas menores.
Actividades: Se inicio la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria Yenifer Arrieta para fundir cimentaciones. Gustavo Benjumea

Nota No.0035 Fecha 06/07/2021. Estado del tiempo: Nublado. Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Talquetas, herramientas menores.
Actividades: Levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y Yuneli Cabillos, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yenifer Arrieta, Trazados y Excavaciones en la vivienda de Dora Martinez

Gustavo Benjumea

Nota No.0036 Fecha 06/07/2021
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por racionamiento a las 9:00 AM, se informo que volvera el servicio a las 5:00PM por lo que no se puede avanzar con los trabajos relacionados con soldadura.

Gustavo Benjumea

Nota No.0037 Fecha 06/07/2021
Inicio el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Horizonte, el cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios

Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0038	Fecha: 07/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizaron excavaciones en la vivienda de doris martinez y madelin hernandez, levantamiento de muros en las viviendas de yaneli Castillos y juan diaz y trazado en la vivienda de Andrey Rangel Gustavo Benjumea
Nota No 0039	Fecha: 08/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, volqueta, herramientas menores. Actividades: Excavacion en la vivienda de Andrey Rangel, instalacion de estructura metalica en la vivienda de yaneli Castillo, Relleno en la vivienda de Madelin Ramirez y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Doris Martinez. Gustavo Benjumea
Nota No. 0040	Fecha: 09/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, herramientas menores Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Doris martinez, relleno y nivelacion en la vivienda de Jhoy Jimenez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Andrey Rangel, levantamiento de muros en la vivienda de Juan Diaz Gustavo Benjumea
Nota No 0041	Fecha: 10/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, volqueta y herramientas menores. Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Andrey Rangel, Excavaciones en la vivienda de Yuris Granados y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Madelenin Hernandez, la cual se suspendió por lluvias en el mezclador de concreto. Gustavo Benjumea
Nota No. 0042	Fecha: 12/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Volqueta, equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto y herramientas menores. Actividades: Se continuó con las instalacion de la estructura metalica en la vivienda de Andrey Rangel, con la fundicion del concreto de cimentacion en la vivienda de Madelene Hernandez, Relleno, Compactacion y trazado en la vivienda de Jhoy Jimenez y levantamiento de muros en la vivienda de Carlos Pico Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0043 Fecha: 12/07/2021,
Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Villa Esperanza a la alturas de las 5:30PM
Gustavo Bayonne

Nota No 0044 Fecha: 13/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yuris Granados y Madelaine Hernandez, se rellenó y compacto el lote de Yovanna Polo y Nilcidys Ramirez, Excavaciones en la vivienda de Luz Jimenez y se continuó con el levantamiento de muros. Tambien, se fundió concreto ciclopeo en la vivienda de Luz.
Gustavo Bayonne

Nota No. 0045 Fecha: 14/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se realizaron las excavaciones en la vivienda de Nilcidys Ramirez, Josefina Ortega y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luz Jimenez. De igual forma, se continuó con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No. 0046 Fecha: 15/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Luz Jimenez y se avanza en relleno de lote y excavaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Nilcidys Ramirez. Tambien se encontró que las tuberias de aguas residuales se estaban colocando de forma erronea. Se siguió avanzando el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No. 0047 Fecha: 16/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Nilcidys Ramirez, se avanzó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Josefina Ortega.
Gustavo Bayonne

Nota No. 0048 Fecha: 17/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se avanza en las excavaciones de las viviendas de Yovanna Polo y Oscar Roldan. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Roldan y se continuó avanzando con el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonne

Nota No. 0049 Fecha: 19/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se fundió una solado para que sirva de base para las cimentaciones de Yovanna Polo, se avanza en relleno de lotes, levantamiento de muros y estructura.
Gustavo Bayonne

Escaneado con CamScanner

Nota No 0050 — Fecha: 20/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranco en relleno de lotes, levantamiento de muros y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Yoraima Polo.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0051 — Fecha: 21/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranco en trabajos de relleno y compactación de lotes, se inicio el levantamiento de muros en la vivienda de Mayra Silva y Ruth Perez. Tambien se inicio el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yoraima Polo, se encontró que el levantamiento de los muros no es el que corresponde a los planos, se preparo el lote de Luis Avila para ser fundido al dia siguiente, con excavaciones y refuerzo listos.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0052 — Fecha 22/07/2021, Estado del tiempo: Despejado
Se arranco el trabajo de relleno y compactación en el barrio Brisas del Norte, se arranco el levantamiento de muros en las viviendas de Mayra Silva, Jose Urrutia, Juan Diaz y Cristo Rios. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yoraima Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila.
Gustavo Bejarano

Nota No. 0053 — Fecha: 23/07/2021
Se arranco el trabajo de relleno, compactación y trazado en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Juan Gutierrez y se arranco en el levantamiento de muros en las viviendas de Cristo Rios, Viviana Mendivil, Mayra Silva y Jose Urrutia
Gustavo Bejarano

Nota No 0054 — Fecha: 26/07/2021, Clima: Despejado
El dia sabado 24 de julio se dejaron excavaciones arranzadas y una estructura metalica muy alzada. Sin embargo, durante el fin de semana hubieron fuertes lluvias lo que daño las excavaciones y arreglarlas nuevamente ocasiono un medio dia de retraso aproximadamente.
Gustavo Bejarano

Escaneado con CamScanner

Nota No 0055 Fecha: 26/07/2021, Clima: Despejado

Se arregló en trabajos de trazado, nivelación y excavación. El equipo de soldadura retomó estructuras ya levantadas para la instalación de los correas y se arregló en el levantamiento de muros.

Gestor Bryanner

Nota No 0056 Fecha: 26/07/2021

Mediante esta nota se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo Jose Cayon Marquez.

Gestor Bryanner

Nota No. 0057 Fecha: 27/07/2021

Se arregló en trabajos de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y la instalación de correas en estructuras faltantes. En el barrio Brisas del Norte se fundió como base de cimentaciones un concreto ciclopeo para dos viviendas. Adicionalmente, se pintó con anticorrosivo las correas de algunas viviendas.

Gestor Bryanner

Nota No. 0058 Fecha: 27/07/2021

Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron al menos 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñada.

Gestor Bryanner

Nota No. 0059 Fecha: 28/07/2021, Clima: Despejado

Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Brisas del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de correas y levantamiento de muros en Brisas del Norte.

Gestor Bryanner

Escaneado con CamScanner

Nota No.0060 | Fecha: 29/07/2021, Clima: Unviosa
Se arranjó con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el trazado de una nueva vivienda, Se arranjó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se excavó y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.

Nota No.0061 | Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se arranjaba de igual forma en levantamientos de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.

Nota No.0062 | Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado
Este día sábado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de Brisas del Norte

Nota No.0063 | Fecha 02/08/2021, Clima: Despejado
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldadura ni levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se excavó una vivienda del barrio Villa Esperanza.

Nota No.0064 | Fecha 03/08/2021, Clima: Unviosa
Se continuó con trabajo de excavaciones y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias.

Nota No.0065 | Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado
Se levantó la estructuras metálica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban, Excavaron y excavaron otras 3 lotes del mismo barrio.

Escaneado con CamScanner

Nota N.0066 Fecha: 05/08/2021 Clima: Despejado

Se arranco en la instalación de la red hidrosanitaria de las viviendas de Yarela Cubillos y Eudaldo Escobar, junto con la instalación de los sistemas de la vivienda y la fundida de la losa del techo, Por otro lado, se fundió concreto ciclopeo en el barrios Brisas del Norte y Construcción en Villa esperanza

Gustavo Bayona

Nota N. 0067 Fecha: 06/08/2021 Clima: Lluvioso

Se empezaron a realizar las instalaciones electricas en las viviendas de Yarela Cubillos y Eudaldo Escobar, junto con el vaciado de concreto para la plantilla de las viviendas. También se arranco en trabajo de relleno y Excavaciones de Vigas. Sin embargo, las actividades fueron suspendidas a las 2:30PM por fuerte lluvias.

Gustavo Bayona

Nota N. 0068 Fecha: 07/09/2021, Clima: Despejado

Se fundieron cimentaciones en la vivienda de Wilso Sanchez y se levantaron estructuras metalicas en el barrio Brisas del Norte

Gustavo Bayona

Nota N. 0069 Fecha: 09/08/2021, Clima: Despejado

Se continuó la instalación de correas metalicas en estructuras del barrio el progreso y se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Bayona

Nota N0070 Fecha 10/08/2021 → Clima despejado.

→ en el día de hoy se presento manifestaciones por parte de la Comunidad, presidente de la Acciones Comunales de los Barrios Barrio Horizonte, 17 de febrero, villa esperanza donde alegan que el Consorcio vive una no está Cumpliendo con el Compromiso de ofrecer trabajos a los habitantes del Sector ó municipio de la Jagua, tambien manifiestan que los predios entre el consorcio y los trabajadores

Escaneado con CamScanner

no es justo y digno para ellos, tal el motivo ellos tomaron la decisión de parar todo tipo de trabajo de obra, que este realizando el Consorcio Vive ves en los barrio bello Horizonte y el progreso, Bolsa del monte, villa esperanza al punto se llegue a una reunion entre las partes para Conciliar todas peticiones hechas por ellos.

nota: el ing. eduardo Cayon les manifesto por vía telefonica que se realizara un acto donde ellos (comunidad) paran las obras por los motivos expuestos para así no Afectar la programacion y ejecucion de las actividades, donde ellos no Aceptaron firmar ningun acta, pero manifestaron que no dejaran trabajar a ninguno del consorcio hasta que se presente la reunión y tengan un Concilio entre ces partes.

Ing. Luis Vergara C.
C. Vive ves.

Nota No 0071 Fecha: 12 de agosto de 2021. Estado del tiempo: lluvioso
Las actividades en campo fueron retomadas hoy fueron a partir de las 7:00 AM. Con la novedad de la renuncia del residente de obra. Por lo que momentaneamente la dirección y/o ejecución de la obra esta a cargo del inspector de la obra Ramiro de la Hoz y el director de la obra Eduardo Cayon.

Ramiro de la hoz.O

Nota No.0072 Fecha: 12/08/2021, Clima: Lluvioso
En el día de hoy se retomaron actividades correspondientes a relleno, compactación y excavaciones en los barrios Brisas del Norte y Villa Esperanza. Por otro lado, en el barrio Bello Horizonte se avanza con el trabajo de las instalaciones electricas y se fundieron plantillas en 2 viviendas. Sin embargo, las actividades se suspendieron a las 3:30 PM por fuertes lluvias.

Gestora Bonfiglio Ramiro de la hoz.0

Nota No.0073 Fecha: 13/08/2021, Clima: Despejado
Por razones de lluvia del día anterior, se dañaron todas las excavaciones de las viviendas que estaban listas para fundir por lo que se tuvo que realizar el trabajo de nuevo. Por otro lado, en el barrio Bello Horizonte se avanzó en los acabados de dos viviendas.

Gestora Bonfiglio Ramiro de la hoz.0

Nota No.0074 Fecha: 17/08/2021, Clima: Despejado
Por causa de las lluvias durante el fin de semana se tuvo que volver a iniciar las actividades de excavaciones por lo que no se ha podido fundir cimentaciones.

Gestora Bonfiglio

Nota No.0075 Fecha: 18/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
En el barrio Bello Horizonte se adelantó trabajo de redes de aguas en algunas viviendas, fundición de losa del baño y se realizaron excavaciones y trazado en el barrio 17 de febrero.

Gestora Bonfiglio

Nota No.0076 Fecha: 19/08/2021, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.0
se fundieron las primeras cimentaciones de la semana en el barrio Villa Esperanza, mientras en el barrio Bello Horizonte se continuo con la instalación de aguas negras, fundición de losas de baño y registros

Gestora Bonfiglio Ramiro de la hoz.0

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0077 | Fecha: 20/08/2021, Clima: Despejado

se avanzó en el trabajo de instalación de techos en el barrio Bello horizonte. Se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte. Se hizo estructura metálica y excavaciones en el barrio Villa Esperanza. De igual forma, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Villa esperanza y en el barrio el progreso se adelanto el trabajo de fundición de losas de techo.

Gustavo Bejarano — Ramiro de la hoz.o

Nota No.0078 | Fecha: 23/08/2021, Clima: Despejado

En el barrio Bello horizonte se avanzo en trabajos de instalación de puertas y ventanas, pinturas de perfiles metalicos y levantamiento de muros. De igual forma, en el barrio El Progreso se avanzo en levantamiento de muros y la instalación de techos. Se fundieron tambien las cimentaciones de la beneficiaria Tulia Tejeda.

Gustavo Bejarano — Ramiro de la hoz.o

Nota No.0079 | Fecha: 24/08/2021, Clima: Despejado

Se fundió la plantilla del beneficiario Cristo Rios, tambien se avanzó con la instalación de puertas y ventanas en Bello Horizonte, levantamiento de muros en el barrio El Progreso y trazado, relleno y compactación en el barrio 17 de febrero.

Ramiro de la hoz.o

Gustavo Bejarano

Nota No.0080 | Fecha: 25/08/2021, Clima: Nublado

se instalaron puertas y ventanas sanitarios en el barrio Bello Horizonte, se fundieron cimentaciones y se trasportaron luego en el barrio 17 de febrero y en el barrio el progreso se continuó levantando muros e instalando techos.

Gustavo Bejarano — Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0081 | Fecha: 26/08/2021

Se realizó la primera supervisión del avance de obra del proyecto en conjunto entre la alcaldía, Comfacesar, el contratista e interventoría.

Gustavo Bejarano — Comfacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0082 Fecha: 27/08/21, Clima: Despejado

Se realizaron rellenos y excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se le hicieron retoques a los acabados de la casa modelo y se fundió plantilla en otras viviendas. En el barrio El progreso y Brisas del Norte se avanzó en el trabajo de levantamiento de muros.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0083 Fecha: 29/08/21, Clima: Despejado

Con esta nota se da constancia de que el día 26 de agosto de 2021 se realizó la socialización del barrio Luis Carlos Galan en el parque de dicho barrio y con la participación de todos los beneficiarios y el contratista.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0084 Fecha 30/08/21, Clima: Nublado

En el barrio Bello Horizonte se inicia la edificación de acabados del beneficiario Cristo Rios, la instalación del techo de la beneficiaria Doris Martinez. Mientras que en el barrio 17 de febrero se avanzó con el relleno y compactación de lotes, excavaciones y se fundieron los cimentaciones de una vivienda.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0085 Fecha 31/08/21, Clima: Nuevoso

Se adelantaron las excavaciones en el barrio 17 de febrero, Mientras que en el barrio Bello Horizonte se instalaron redes electricas y se fundió plantilla de una vivienda.

Gestor Benjumea Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0085 Fecha: 01/09/21, Clima: Humoso
se adelantó el trabajo de levantamiento de muros en los barrios Brisas del Norte y el progreso. Mientras que en Bello Horizonte se fundió una plantilla y se adelantó los acabados de una vivienda

Gustavo Benjumea RAMIRO de la hoz. O

Nota No 0087 Fecha: 02/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se fundió plantilla en una vivienda mientras que en otras se adelanto el trabajo de acabados. En dimas barrios se continuó el levantamiento de muros. No se han fundido cimentaciones ni levantado nuevas estructuras.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota. No 0088 Fecha: 03/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se continuó fundiendo plantilla en dimas viviendas junto con redes hidrosanitarias y eléctricas mientras en los dimas barrios intervenidos se continua con el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota. No 0089 Fecha: 06/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se avanza en la instalación de puntos definición de acabados y fundición de plantilla. Mientras que en el barrio el progreso se instalaron redes hidrosanitarias y eléctricas y en los dimas barrios se continuo el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No 0090 Fecha: 07/09/21, Clima: Humoso
En el barrio El progreso se adelantó la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, definición de acabados y fundición de plantilla. De igual forma, el contratista avanzo de manera significativa en la aplicación de anticorrosivo en las zapatas de la estructura y la instalación de los tejados para proteger las estructuras

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No 0091 Fecha: 07/09/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en obra fueron suspendidos alrededor de las 3:00PM por fuertes lluvias.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz O

Nota No. 0092 Fecha: 08/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el trabajo de levantamiento de estructuras metálicas en el barrio Villa Esperanza. En las viviendas de Bibiana Galan, Lucas Mieres y Julio Ibañez. Este último no se había podido suspendido por desperfectos en el lote. Sin embargo, la alcaldía de la mano de Miguel Nieves dieron el aval para continuar la vivienda.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz O

Nota No 0093 Fecha: 09/09/21, Clima: Despejado
Se continuó el levantamiento de muros en los barrios Villa Esperanza, 17 de febrero y Brisas del Norte. Se fundió plastilla en el barrio El progreso y Villa esperanza. En el barrio Bello Horizonte se continuo con la división de acabados y la instalación de puertas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz O

Nota No. 0094 Fecha: 10/09/21, Clima: Despejado
Se continuó con la instalación de tejados, redes hidrosanitarias eléctricas y la fundición de placas de baños.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0095 Fecha: 11/09/21, Clima: Despejado
En los barrios bello horizonte y el progreso se trabajo acabados y impermeabilización al igual que en los barrios Brisas del norte y Villa esperanza.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0096 Fecha: 13/09/21
Durante todo el día no hubo fluido electrico en la ciudad, lo que atrasó todo el cronograma de actividades de la obra, debido a que se dependía en gran medida de los soldadores.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0097 | Fecha: 14/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó levantando muros en todos los barrios donde se está trabajando, a excepción del 17 de febrero donde se fundieron cimentaciones. En el barrio Bella Horizonte se fundió una plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0098 | Fecha: 15/09/2021, Clima: Despejado
Se continuó el levantamiento de muros. En otros frentes de trabajo se encuentran fundiendo plantillas y por otros fundiendo cimentaciones, a la vez, se arranco en la definición de alabadas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0099 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Despejado
En el día de hoy solo se adelantó el trazado y excavación de una vivienda en el 17 de febrero. Se aplicó pintura a algunos acabados y perfiles metálicos.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0100 | Fecha: 16/09/2021, Clima: Lluvioso
Durante toda la jornada de la tarde no fue posible trabajar en campo debido a fuertes lluvias.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0101 | Fecha: 17/09/2021, Clima: Despejado
En el barrio El Progreso avanzó el trabajo de definición de acabados, enchape de zonas humedas y la instalación de cableado eléctrico. Mientras que, en Brisas del Monte se adelantó y fundió la plantilla de una vivienda.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 00102 | Fecha: 20/09/2021, Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en el barrio 17 de febrero, donde también se levantó una estructura, Mientras que en los barrios Villa Esperanza y Brisas del Monte se enchapaban zonas humedas y se levantaban muros

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0102 Fecha: 21/09/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Anglica Caro, la cual tardó porque no había demolido su vivienda hasta que personal de la alcaldía se lo solicitó. En otros puntos de trabajo se fundió plantilla, enchape zona humedos y se instaló cableado eléctrico.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0104 Fecha: 22/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se y el progreso se instalaron puertas y ventanas. Mientras que en el 17 de febrero se trazó y excavó una vivienda y se levantó la estructura de otra. En Bello Horizonte se fundió la plantilla de Doris Martinez

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz O

Nota No. 0105 Fecha: 23/09/21, Clima: Despejado
En el barrio 17 de febrero se fundió una cimentación. En Bello Horizonte y El Progreso se instalaron puertas y ventanas. En Brisas del Norte y Villa Esperanza se enchapó zona humedos y se trabajó en la definición de acabados.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0106 Fecha: 24/09/21, Clima: Nuriosos (no aplica)
Se avanzó con la instalación de puertas en el progreso En el 17 de febrero se trazó y excavó otra vivienda y en Brisas del Norte se continuó levantando muros y se fundió una plantilla.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz O

Nota No. 0107 Fecha: 25/09/21, Clima: Despejado
Se avanzó el trabajo de pintura con anticorrosivo en perfiles metalicos.

Gestores Bayumeo Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0108 Fecha: 27/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Villa Esperanza se avanzó en la definición de acabados, enchapado e instalación de accesorios. En el 17 de febrero se fundió una cimentación

Gestores Bayumeo

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0109 Fecha: 29/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Brisas del norte se continuó el levante de muros y fundición de plantillo. En el 17 de febrero se trabajó y excavo en lotes.
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No 0110 Fecha: 29/09/21, Clima: Nuviroso
se fundieron cimentaciones en el 17 de febrero. Donde también se rellenó una lotes y se empezó levante de muros. En el barrio Brisas del Norte se fundió plantillo y en Villa Esperanza se arreglaron los escalados e instalación de excusados.
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0111 Fecha: 29/09/21, Clima: Nuviroso
Las actividades en la jornada de la tarde se suspendieron por fuertes lluvias.
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0112 Fecha: 30/09/21, Clima: Despejado
Se trabajo y excavo en el barrio 17 de febrero 2 viviendas. Se fundió cimentaciones.
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0113 Fecha: 04/10/21, Clima: Despejado
No se registraron actividades en campo durante el día
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Nota No.0114 Fecha: 05/10/21, Clima: Despejado
Durante el día se hizó un recorrido vivienda a vivienda recogiendo basura dejada. También se trabajó en el levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte, 17 de febrero y Brisas del Nor
Gustavo Bayumeo Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Bit. No 0115 Fecha: 06/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se trabajó unicamente levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero y trabajo de acabados en el barrio Bella Horizonte en la vivienda d. Doris Madrid

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz.O

Bit. No 0116 Fecha: 07/10/21, Clima: Despejado
Durante la jornada completa se trabajó, Continuó, en las mismas actividades y viviendas del día anterior.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz.O

Bit. No 0117 Fecha: 11/10/21, Clima: Despejado
Durante los días 08, 09, 10, No se realizaron actividades en campo por falta de material. El día de hoy solo se reanudó el trabajo de levantamiento de muros en el 17 de febrero.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz.O

Bit. No 0118 Fecha: 12/10/21, Clima: Lluvioso
Se realizó el trazado y excavaciones en la vivienda de Orlando Nieto (17 de febrero) y Wilmer Rios (El Golán). También se levantó el sistema estructural metalico de las viviendas de Dizze Sayeth y Katherine Karo (17 de febrero). Las actividades en Campo se suspendieron a las 3:40PM por lluvias.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz.O

Bit. No 0119 Fecha: 13/10/21, Clima: Lluvioso
En el barrio el progreso se fundieron cajillas de inspección. Mientras que, en el 17 de febrero se continuó levantando mamposteria y se fundieron las cimentaciones de Orlando Nieto. Se firmó el acta de vecindad que permite construir la vivienda de Tonio Jimenez pegada al anden. Se suspendieron actividades a la 4:00PM por lluvia.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0120 Fecha: 14/10/21, Clima: Despejado — Ramiro de la Hoz. O

Se levantó la estructura metalica de la beneficiaria Xna Damian en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galán se trazaron, Excavaron y fundieron 2 viviendas.

Gestora Benjumea — Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0121 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se le realizó 3 supervicion puntuales al contratista. Primero, Tener mas estetica y precauciones al momento de soldar los elementos metalicos y fundir las cimentaciones dejando, utilizar ladrillos debidamente cocidos. Tercero, Utilizar el nivel correcto para fundir las viviendas y evitar inconvenientes.

Gestora Benjumea — Ramiro de la Hoz. O


Nota No. 0122 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se levantaron 2 estructuras metalicas y se trazaron, excavaron, entablaron y fundieron 2 viviendas. Se continua el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero junto con las losas de baño.

Gestora Benjumea — Ramiro de la Hoz. O

Nota No. 0123 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se presentó una particularidad en el lote de la beneficiaria Tania Jimenez en el barrio Luis Carlos Galan. Donde la vivienda tipo casa está diseñada no cabe en el lote.

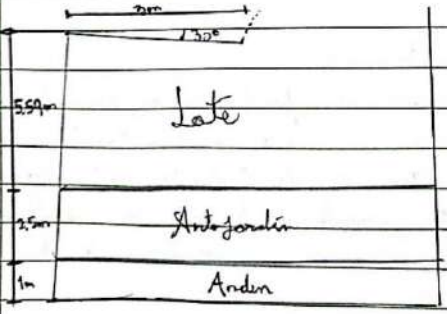

* El dibujo no está a escala

Ramiro de la Hoz. O

Gestora Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0124 Fecha: 16/10/21 Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones del beneficiario Edilser Pedroza ubicado en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota No. 0125 Fecha: 19/10/21 Clima: Despejado
Se trabajó en los acabados de los fachadas de Yuris Granado y Luis Trilo en el barrio El Progreso. Además se continuó el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galan, se fundieron las cimentaciones de 2 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota No. 0126 Fecha: 20/10/21, Clima: Lluvioso
Se trabajó en los acabados de la beneficiaria Josefina Ortega. Se le instaló la tenteneria a la vivienda de Martha Dominguez. En el barrio 17 de febrero se continuó el levantamiento de muros y se trazaron, excavaron y entablaron 3 viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Se suspendieron las actividades entre las 2:00pm y 2:30pm por lluvia.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0127 Fecha: 21/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se fundieron las cimentaciones de los beneficiarios Alba Cruz y Melisa padilla, se trazó y excavó la vivienda de esperanza beltrán. Se le instalaron los tenteneria a Martha Dominguez y se le instaló el tablero electrico a Josefina Ortega. En el barrio 17 de febrero se trabajo en el levantamiento de muros y en Villa esperanza se trabajó en los acabados.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota No 128	Fecha: 22/10/21, Clima: Despejado Se trajo y excavó la vivienda de Ramon Villareal y se fundieron las cimentaciones de esperanza Solano. Alanya se avanzó con el levantamiento de muros en el barrio El Golan. Gestor Bayenca Ramiro de la hoz. O
Nota No. 129	Fecha: 23/10/21, Clima: Despejado Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Mirellis Martinez y a la vez se continuó el levantamiento de muros en el barrio El Golán. Gestor Bayenca Ramiro d. la hoz. O
Nota No. 130	Fecha: 25/10/21, Clima: Despejado Mediante esta nota se hace constar que tanto como el contratista como interventoría y personal de la alcaldía; le hicieron saber a la beneficiaria Leidy Manotas que no demoliera su vivienda, hasta que se definiera su situación, ya que el lote no cumple con las medidas. Sin embargo, la beneficiaria demolió su vivienda por sugerencia de un conocido llamado "Victor Ballena" Actualmente, la beneficiaria se encuentra pagando arriendo. Gestor Benjenca Ramiro de la hoz. O
Nota No. 0131	Fecha: 26/10/21, Clima: Despejado Se trabajo unicamente en el levantamiento de muros en los barrios 17 de febrero y el golan. Ademas, se reportio material de relleno en los puntos donde se requeria Gestor Bayenca Ramiro de la hoz. O
Nota No 0132	Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso Se continuó el trabajo de levantamiento de Muros en el barrio El Golan, donde tambien se rellenaron varias viviendas (lotes). Se instaló el tejado de Lucinda Montes y en el barrio el progreso se trabajo en acabados y se instaló una cubierta electrica que habia sido hurtada. Gestor Bayenca

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0133 Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en campo estuvieron suspendidos por la mañana debido a fuertes lluvias

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0134 Fecha: 28/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Leonor Villareal del barrio Luis Carlos Galán. Donde también, se rellenaron y compactaron 4 distintos lotes.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0135 Fecha: 29/10/21, Clima: Despejado
Se continuó con el relleno y compactación de diferentes viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Donde también se realizaron excavaciones.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0136 Fecha: 30/10/21, Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Edna Pabuyo y en el barrio bella horizonte se arranjó con el trabajo de la instalación de manta drill y la instalación de tanques de agua. También se fundió las cimentaciones de Gloricelth Jimenez.

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0137 Fecha: 02/11/21, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado en campo fue la instalación de tejados en el barrio 17 de febrero y la instalación de manta drill en el barrio Bella Horizonte

Gestores Benjamin Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota No.0139 Fecha: 03/11/21, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado en campo fue la conversión de detalles en losas de baño de algunas viviendas y se instaló el cableado de una vivienda en Villa Esperanza.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota N.0139 Fecha: 09/11/21, Clima: Despejado
se adelantó trabajos de instalación de acometida electrica y se fundió la plantilla de una beneficiaria en el barrio Bello Horizonte.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No.0140 Fecha: 10/11/21, Clima: Despejado
se arranzó con la instalación de tyadas de viviendas que ya estaban levantados en estructuras y se preparaban otras viviendas para fundir plantilla.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No.0141 Fecha: 11/11/21, Clima: Despejado
se trajó la primera vivienda del barrio Jose Raman, mientras que en el barrio el galan se levantaron dos estructuras metalicas y se fundió una plantilla en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Benjamin

Nota No. 0142 Fecha: 12/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
En el barrio Villa Esperanza se fundieron la plantilla de una vivienda. En el barrio El Galan se fundió la cimentación de una vivienda y se levantaron la estructura metalica de 2 viviendas. Tambien, se inició el levantamiento de muro en 5 viviendas.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0143 Fecha: 13/11/21, Clima: Despejado
Se levantó la estructura metalica de 3 viviendas en el barrio El Golon y se instaló el tejado de 1 vivienda

Gustavo Benjamen Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0144 Fecha: 16/11/21, Clima: Despejado
Se instalaron dos tejados en el barrio el golon. y se fundió una plantilla en el barrio el golon. Donde tambien se rellenó y se encofró otra vivienda.

Gustavo Benjamen Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0145 Fecha: 17/11/21, Clima: Despejado
Se inició el levantamiento de muros en dos nuevas viviendas y se fundió una cimentación en el barrio El Golon y otra en el barrio Juan Ramon, donde tambien se trazó y encofró otra vivienda.

Gustavo Benjamen

Nota No. 0146 Fecha: 18/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
Se fundio una plantilla en el barrio Villa Esperanza. En el golon se levantaron dos estructuras metalicas y se entecharon 3 viviendas y tambien se fundieron 3 losas de bañas y una cimentación.

Gustavo Benjamen Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0147 Fecha 19/11/21, Clima: Despejado
Se fundió unas cimentación en el barrio Juan Ramon y otra en el Juan Carlos Golon. Se instalaron 2 tejados y la red hidrosanitaria de otras viviendas. y se levantó una estructura metalica

Gustavo Benjamen Ramiro de la hoz.o

Nota No. 0148 Fecha 22/11/21, Clima: Lluviosa
Durante la mañana se replantearon 2 viviendas para fundir cimentaciones y 1 para plantilla pero los trabajos se suspendieron por fuerte lluvias en la tarde.

Gustavo Benjamen Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 149 | Fecha: 22/11/21

Han llegado reporteros de que todos los lotes del barrio Villa Shelay tienen un ancho de frente de entre 5.5-6.1m lo que no es suficiente para la construcción de las viviendas.

Gestora Benjamin. Ramiro de la hoz-0

Nota No. 0150 | Fecha: 23/11/21. Clima: Despejado

Se continuó el enchape de nuevas viviendas y se fundió una plantilla del barrio 17 de febrero. Además, se avanzó en la pintura de la fachada de las primeras viviendas.

Gestora Benjamin Ramiro de la hoz-0

Nota No. 0151 | Fecha: 24/11/21

Se realizó la socialización al barrio Pedro Castro

Gestora Benjamin Ramiro de la hoz-0

Nota No. 0152 | Fecha: 24/11/21, Clima: Despejado.

Se continuó con la pintura de las primeras viviendas y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero y se fundió una cimentación en el barrio Juan Roman.

Gestora Benjamin Ramiro de la hoz-0

Nota No. 0153 | Fecha: 25/11/21, Clima: Despejado

Se fundieron las cimentaciones de una vivienda en el barrio Juan Román y una plantilla en el barrio 17 de febre

Gestora Benjamin Ramiro de la hoz-0

Nota No. 0154 | Fecha: 29/11/21.

Se realizó la segunda supervisación técnica a las primeras 22 viviendas que estan entre un 95% y 98% de ejecución. En conjunto con el supervisor de Confacesar y la alcaldia.

Gestora Benjamin

Supervisor Confacesar.

Escaneado con CamScanner

Nota No.0155 Fecha: 30/11/21, Clima: Despejado
Se fundieron dos plantillas (1 en el 17 de febrero y otra en el galan). También se levantó una estructura metalica en el galan y otra en Juan Ramón. Además, se trabajó en subsanar los detalles pendientes de los primeros viviendas.

Gestora Bayonas Ramiro de la hoz O

Nota No.0156 Fecha: 01/12/21, Clima: Despejado
Se inició el relleno del lote de una beneficiaria faltante en el barrio Brisas del Norte y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gestora Bayonas Ramiro de la hoz O

Nota No.0157 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
se levantaron 2 estructuras metalicas en el barrio Juan Ramon. Se instalaron puertas y ventanas en los barrios Brisas del Norte y Bello Horizonte. En el barrio 17 de febrero se fundió una plantilla.

Gestora Bayonas Ramiro de la hoz O

Nota No.0158 Fecha: 03/12/21, Clima: Despejado
se fundió una plantilla en el barrio bello horizonte. Oficialmente, el contratista decidió no fundir mas cimentaciones.

Gestora Bayonas Ramiro de la hoz O

Nota No.159 Fecha: 06/12/21, Clima: Despejado
Se avanzó en el trabajo de acabados de las primeras viviendas que habian quedado atras, junto con la instalación de puertas, ventanas, barandas y accesorios. Se fundio una plantilla en Bello Horizonte

Gestora Bayonas Ramiro de la hoz O

Escaneado con CamScanner

Nota No. 160 | Fecha: 10/12/21, Clima: Despejado
Se sobtuvieron viviendas en el barrio Villa Esperanza, donde también se corrigieron algunos detalles de acabados. Se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No. 161 | Fecha: 13/12/21, Clima: Despejado
se fundieron 2 plantillas en el barrio el galan. También se replantearon otras 2 viviendas mas para fundir plantilla

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No. 162 | Fecha: 14/12/21, Clima: Despejado
En el barrio el galan, se fundieron 2 plantillas. Mientras que, en el barrio Brisas del Norte se trabajo en acabados de 2 Viviendas.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No. 163 | Fecha: 15/12/21, Clima: Despejado
En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. También se realizaron los ultimos correcciones a las primeras viviendas que se desean entregar

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No. 164 | Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado
En el barrio El Galan se fundieron 2 plantillas. Se continuó el trabajo de acabados en Brisas del Norte.

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Nota No. 165 | Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado
Oficialmente, la interventoria le recibió 23 viviendas listas para entregar al contratista

Gustavo Benjamin Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No.166 Fecha: 29/12/21, Clima: Despejado:
De la mano del alcalde del municipio Orelio Jimenez, se realizo la protocolización de 24 viviendas a los beneficiarios que correspondian, Quedaron restando 4 viviendas de beneficiarios que no fue posible contactar

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota No.167 Fecha: 21/01/22, Clima: Despejado
Durante los recientes dias del mes de enero se ha trabajado en la definición de los acabados de la parte interna y externa de las viviendas, junto con las actividades necesarias para instalar el cableado de las viviendas

Gustavo Benjumea Pilio Piñeta

Nota No.168 Fecha: 24/01/22
se identificaron dos problematicas durante la ejecución del proyecto, En primer lugar, en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sanchez, se presentó el levantamiento de una vivienda al lado derecho, la cual impedia la difinición de los acabados de esta, En segundo lugar, la beneficiaria Bleidis Castro pañetó toda la vivienda, ocultando aún todas las perforaciones y modificando los acabados de la vivienda

Gustavo Benjumea Pilio Piñeta

Nota No.169 Fecha: 28/01/22
Se realizó la supervisacion a los anexo 1 y anexo 2 de la mano con compañeros y la alcaldia y esto se realizó entre los dias 27 y 28 de enero.

Gustavo Benjumea Pilio Piñeta

Escaneado con CamScanner

Nota No. 170 Fecha: 31/01/22
Se ha organizado en el levantamiento de muros en una vivienda de Juan Ramon y 1 en el galeón. Se organizó en la fundición de cajas de inspección, e instalación de tuberías.

Gestora Benjamina Dario Dirección

Nota No. 171 Fecha: 01/02/22, Clima: Despejado
Se ha estado trabajando en el levantamiento de muros en los barrios Juan Ramón y El Galeón. En el barrio 17 de febrero se ha organizado en la definición de acabados interno de las viviendas.

Gestora Benjamina Ramiro de la hoz.o

Nota No. 172 Fecha: 02/02/22, Clima: Despejado
En el barrio Juan Ramón hay 1 cuadrilla levantando muros y otra instalando tuberías. En el barrio 17 de febrero hay 4 cuadrillas definiendo acabados y el galeón 1 y otras 3 de importa

Gestora Benjamina Ramiro de la hoz.o

Nota No. 173 Fecha: 03/02/22, Clima: Despejado
se continuó el trabajo de levantamiento de muros y definición de acabados

Gestora Benjamina Ramiro de la hoz.o

Nota No. 174 Fecha: 07/02/22, Clima: Despejado
se retomó el trabajo de la instalación de cableado eléctrico y se continuó la definición de acabados en el 17 de febrero.

Gestora Benjamina Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 175 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metalicas y rentanas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y se instaló el cableado de 7 viviendas en el mismo barrio.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 176 Fecha: 09/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas metalicas y rentanas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y, a la vez se les instaló el cableado electricos.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 177 Fecha: 10/02/2022, Clima: Despejado
Se trabajó en el levantamiento de muros en 3 viviendas del barrio Juan Ramon. En el barrio Bello Horizonte se instaló las puertas, rentanas y red electrica de una vivienda. En el barrio El Golfo se trabajo en el levante de muros de dos viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 178 Fecha: 15/02/2022, Clima: Despejado
Se instalaron las puertas, rentanas y red electrica de 3 viviendas mas, a la vez, se empezó el trabajo de definición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 179 Fecha: 16/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló las puertas, rentanas y redes electricas de 3 viviendas y de igual forma se trabajó en la definición de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 180 | Fecha: 17/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó la zona humedo de 3 viviendas y se instaló el combo sanitario y redes electricas de dos viviendas.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 181 | Fecha: 18/02/2022, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado es la instalación del enchape de zonas humedas de dos viviendas

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 182 | Fecha: 21/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó la zona humedo de dos viviendas, se instaló el combo sanitario de dos mas. Tambien se trabajo en el levantamiento de muros de dos viviendas en el barrio el golan

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 183 | Fecha: 22/02/2022, Clima: Despejado
Se instaló los puertas y ventanas de dos viviendas y la instalación de tanque de agua de 10 viviendas

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota No. 184 | Fecha: 26/02/2022, Clima: Despejado
Se enchapó las viviendas restantes del barrio 17 de febrero y 4 del barrio El Golan. Tambien se instalaron las accesorios y duras accesorios como combo sanitario a las mismas viviendas.

Cristian Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No. 185 Fecha: 28/02/2022, Clima Despejado
Se retocaron los perfiles metalicos y se retocaron almas detalles de acabados para realizar entrega de viviendas.

Gestores Bonjemes Ramiro de la Hoz O

Nota No. 186 Fecha: 01/03/2022. Clima: Despejado
Se inventario recibio 6 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gestores Bonjemes

Nota No. 187 Fecha: 02/03/2022, Clima: Nublado
Inventario recibio 4 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gestores Bonjemes Ramiro de la Hoz O

Nota No. 188 Fecha: 02/03/2022
se presentaron fuertes precipitaciones entre las 2:30 y 5:00 PM.

Gestores Bonjemes. Ramiro de la Hoz O

Nota No. 189 Fecha: 03/03/2022. Clima: Despejado
Se trabajo en la instalación de puertas internas de las viviendas y remate de detalles de acabados en el barrio 17 de febrero.

Gestores Bonjemes Dilio Pinilla

Nota No. 190 Fecha: 08/03/2022, Clima: Despejado
Durante los ultimos dias se ha enfocado el trabajo en los 42 viviendas a entregar, en los barrios 17 de febrero, Luis Carlos Galan y Brisas del Norte.

Gestores Bonjemes Dilio Pinilla

Escaneado con CamScanner

Fecha: 10/03/22
Nota No. 191 → Cima: Despejado.
Se verificó la correcta instalación de los puertos y rentanas en el barrio Brisas del Norte. También se chequeo el correcto enchape en el barrio Villa Esperanza.

Gustavo Benjamin Dino Pinto

Fecha: 11/03/22
Nota No. 192 → Cima: Despejado.
Se verificó la correcta instalación de puertos interiores en el barrio Villa Esperanza al igual que los acabados de los viviendas del mismo barrio.

Gustavo Benjamin Dino Pinto

Fecha: 15/03/22
Nota No. 193 → Cima: Despejado
Se verificó los correctos instalación de puertos y rentanas en el barrio Brisas del Norte, al igual que el enchape y los acabados de los viviendas. De igual forma en el 17 de febrero

Gustavo Benjamin Dino Pinto

Fecha: 15/03/22
Nota No. 194 → Cima: Despejado
Se empezó a intervenir la primera vivienda del barrio Pedro Castro. Se le realizó el trozado.

Gustavo Benjamin Dino Pinto

Fecha: 16/03/22 → Cima: Despejado
Nota No. 195
Se excavó y fundió los primeros cimentaciones del barrio Pedro Castro. Mientras que en los próximos 12 viviendas a entregar se le verificó que tengan los cimentaciones correctamente instalados.

Gustavo Benjamin Dino Pinto

Escaneado con CamScanner

Fecha: 17/03/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 196
Se trazó, excavó y fundió la segunda cimentación en el barrio Pedro Castro. En los demas barrios se instaló trazador y se entregó asesoría en las viviendas faltantes.

Castoro Benjumea — Dios Pública

Fecha: 18/03/22 → Clima: Despejado
Nota No 197
En el barrio Pedro Castro se trazó y fundio las tercera cimentaciones. Se le recibieron 12 viviendas terminadas al contratista

Castoro Benjumea — Dios Pública

Fecha: 22/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 198
Se trazó, excavó y fundió las cuartas cimentaciones en el barrio Pedro Castro. Se empezaron los trabajos para terminar las primeras 12 viviendas priorizadas en el barrio 17 de febrero y el galan.

Castoro Benjumea — Dios Pública

Fecha: 23/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 199
Se fundió una plantilla en el barrio Jose Carlos Galan y a la vez se intensificó el trabajo de acabados en el mismo barrio. En Pedro Castro, se fundieron 2 cimentaciones

Castoro Benjumea — Dios Pública

Fecha: 24/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 200
Se fundió una plantilla en el barrio el galan. Tambien se reporto la plantilla de los beneficiarios Dois Jimenez. Mientras que en Pedro Castro se fundieron 2 cimentaciones.

Castoro Benjumea — Dios Pública

Fecha: 28/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 204
se excavo y fundió la quinta cimentación en el barrio Pedro Castro. Mientras que en los demas barrio se continua ultimando detalles para entregar los 12 viviendas

Castoro Benjumea — Dios Pública

Escaneado con CamScanner

Fecha: 29/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 202 Se enchapan los ultimos viviendas a entregar. En el barrio Pedro Castro se funde la decima cimentación.

Gustavo Benjumea — Dilio Piñita

Fecha: 30/03/22 → Clima: Despejado
Nota No. 203 Se reciben satisfactoriamente las 12 viviendas terminadas. Se fundió una cimentación en el barrio Bison del Norte y otra en pedro Castro. Donde tambien se empezó a rellenar y compactar los lotes.

Gustavo Benjumea — Dilio Piñita

Fecha: 04/04/22 → Clima: Lluvioso:
Nota No. 204 Se ha trabajado en la definición de acabados de las viviendas pendientes en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea — Dilio Piñita

Fecha: 07/04/22 → Clima: Lluvioso:
Nota No 205 Se ha trabajado en la instalación de puertas y ventanas en los barrios Luis Carlos Galan, Bison del Norte y Juan Ramón. A pesar de que se han presentado complicaciones debido al invierno.

Gustavo Benjumea — Dilio Piñita

Fecha: 08/04/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 206 Se inició a instalar todo el tableado electrico a las viviendas que cuentan con puertas y ventanas y que ademas cuentan con alguien que cuide las viviendas

Gustavo Benjumea. — Dilio Piñita

Scanned with CamScanner

Fecha: 11/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 207 Se revisaron las viviendas de los beneficiarios en el barrio El Golan que se encuentran listos al 100%. Sin embargo, se encontraron detalles de goteras, los cuales fueron comunicados al contratista.

Gestora Benjamen Blas Pineda

Fecha: 12/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 208 Se han presentado severas complicaciones en los barrios Luis Carlos Galan y Juan Ramón debido al invierno. Debido a que el agua de la lluvia afecta el yeso aplicado al interior de las viviendas, lo que impide poder pintarlas.

Gestora Benjamen. Blas Pineda

Fecha: 12/04/22 → Se registra avance en el enchape de las zonas
Nota No. 209 humedas de las viviendas ubicadas en el barrio El Golan. También dos viviendas fundidas en el barrio Pedro Cortes

Gestora Benjamen Blas Pineda

Fecha: 13/04/22 → Clima: Despejado
Nota No. 210 Se registra una vivienda fundida en el barrio Pedro Cortés. Sin complicaciones por temas climaticos.

Gestora Benjamen. Blas Pineda

Fecha: 16/04/22 → Clima: Lluvioso
Nota No. 211 Se registra el trabajo de enchape de zonas humedas en el barrio Jesus Ramon. También, la distribucion de material de relleno en los lotes donde se requiere.

Gestora Benjamen Blas Pineda

Fecha: 19/04/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 212 Durante los dias 17 y 18 de mayo se trabajo en el relleno y compactación de lotes en Pedro Cortes y Comite Torres.

Gestora Benjamen. Blas Pineda

Scanned with CamScanner

Fecha: 19/04/22 → Clima: Despejado.

Nota No. 213 Se registro la fundación de los cimentaciones de Nalda Zambrana, priorizado por el municipio. También, la fundación de una plantilla en el barrio El Golan.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Fecha: 20/04/22 → Clima: Nuriosa.

Nota No. 214 Se fundieron los registros sanitarios de algunas viviendas en el barrio El Golan. También, se repartieron los baraderos para las mismas viviendas.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Fecha: 20/04/22 → Se trazaron y excavaron 3 viviendas. En los barrios

Nota No. 215 Pedro Castro, El Golan y Juan Ramon.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Fecha: 21/04/22 → Clima: Despejado

Nota No. 216 Se fundieron los cimentaciones de 2 viviendas. También, se continuó el enchape de zanjas viviendas junto con la definición de acabados en los barrios El Golan y Juan Ramón.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Fecha: 21/04/22 → Clima: Nuriosa.

Nota No. 217 Se registro la fundación de 2 viviendas en el barrio Pedro Castro y 2 mas en el barrio El Manantial. También se organizo en la definición de acabados e instalación de accesorios en dos viviendas mas organizadas.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Fecha: 25/04/22 → Clima: Despejado.

Nota No. 218 Se registro la fundación de cimientos en el barrio Pedro Castro para completar 78 viviendas y 2 mas en el manantial para completar 4.

Gestora Benjamin Dilia Pineda

Scanned with CamScanner

Fcha: 26/04/22 → Ama: Despacho
Nota No. 219
Se finaliza la etapa de acabados de 8 viviendas. Las cuales se visitaron y se paso una lista de correcciones al contratista para poder recibirlas.

Gestor Bayamo

Fcha: 27/04/22 → Ama: Despacho
Nota No. 220
Se registro la vandalización de dos viviendas. Donde habian perdidas materiales significativas

Gestor Bayamo

Fcha: 28/04/22 → Ama: Despacho
Nota No. 221
Se corrigieron los detalles pendientes de acabados en las viviendas por entregar. Detalles que surgieron principalmente por problemas con humedad.

Gestor Bayamo

Fcha: 29/04/22 → Ama: Despacho
Se robó a cabeza la vivienda de Rosa Perez, a la cual le habian robado todo los cableria. Ademas, se recibieron 3 viviendas que estan al 100% y sin detalles.

Gestor Bayamo

Fcha: 30/04/22 → Ama: Despacho
Dado que en los recientes dias no ha llovido; se pudieron detallar los acabados de 5 viviendas mas, las cuales se recibieron por el 100%. Y sin detalles

Gestor Bayamo

Scanned with CamScanner

Fecha: 5/05/22 → Clima: Despejado

Nota No. 224 Se trabajo en el cableado, instalación de puertas y definición de acabados en la vivienda de Jumar Villarreal, se levantó la estructura de Juan Pina y se fundió las cimentaciones de bareguido en el barrio Juan Ramon.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 12/05/22 → Clima: Nublado

Nota No. 225 Se inició el levantamiento de muros en la vivienda de Sharlin y Nolan Zambrano. También se levanto una estructura metalica en el barrio Pedro Castro y otra en el barrio Juan Ramon.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 13/05/22 → Clima: Despejado

Nota No. 226 Se fundieron las cimentaciones de la beneficiaria Leidis Sanchez del barrio Toscano. Se levantaron dos estructuras metalicas mas en el barrio Pedro Castro. Ademas, se instalaron las correas al beneficiario Carlos Ustate.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 16/05/22 → Se empezo el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Toscano y se continuó los demas frentes de emsamfonteria. Se levantaron dos estructuras mas.

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha 17/05/22 → Clima: Nublado

Nota No. 228 Hoy se registraron trabajos de emsamfonteria en 3 frentes de trabajos diferentes

Gustavo Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Scanned with CamScanner

Fecha: 20/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 229 Entre los días 18, 19 y 20 de mayo la única actividad registrada fue el levantamiento de estructura metálica en el barrio Pedro Castro. Al parecer, por falta de alegres. En promedio, se levantaron 2 estructuras al día.

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 24/05/22 → Clima: Nervio
Nota No. 230 Se iniciaron las excavaciones para instalar la red hidrosanitaria de la vivienda en el terreno. Se levantaron 2 estructuras metálicas una en Pedro castro

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 25/05/22 → Clima: Despejado
Nota No. 231 Se instalaron los techos de los beneficiarios carlos Ustate y Julie Sanchez. Se levantó una estructura metálica en el barrio El Manantial.

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 26/05/22 → Se fundió la plantilla del beneficiario Carlos Ustate.
Nota No. 232 El cual, también se le levantó una tapia de 1m de alto como medida de contención para las aguas Negras de los otros vecinos.

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 27/05/22 → Clima: Despejado.
Nota No. 233 Se inició el levante de mampostería del beneficiario localizado en Juan Roman. También, se levantaron dos estructuras metálicas en el barrio Pedro Castro.

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Fecha: 31/05/22 Se levanto la estructura metálica de una beneficiario en
Nota No. 234 Brisas del Norte y otra en Juan Roman.

Gestores Benjumea Ramiro de La Hoz. O

Scanned with CamScanner

Fecha: 1/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 235 Se instalaron estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro y se trabajaron viviendas en mamposteria en el barrio Jecan Ramon

Gestora Benjamen Ramiro de la hoz.O

Fecha: 2/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 236 Se instalaron 2 estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro.

Gestora Benjamen Ramiro de la hoz.O

Fecha: 3/6/22 Clima: Actividades suspendidas por 4 horas por lluvia.
Nota No. 237 Se instalaron 2 estructuras metalicas en el barrio Pedro Castro y se adisaron 3 cuadrillas de levantamiento de mamposteria en el barrio Pedro Castro

Gestora Benjamen Ramiro de la hoz.O

Fecha: 6/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 238 Se continuo con el levantamiento de mamposteria en los 3 puntos trabajados en el barrio Pedro Castro. Se verificó la correcta instalación de los bloques y su debida colocación de aliero de refuerzo. Sin embargo, se encontró con que el lote de bloques contaba con un gran numero de bloques de buena calidad y unos pocos de muy mala calidad. Por lo que para este caso se le dijo al contratista que no utilizaran estos bloques de mala calidad y que se desecharan.

Gestora Benjamen Ramiro de la hoz.O

Fecha: 7/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 239 Se continuó la instalación de bloques y se verificó que si se estan cumpliendo las recomendado de no utilizar bloques de mala calidad, a pesar de que se esto generando un alto desperdicio. Gestora Benjamen Ramiro de la hoz.O

Scanned with CamScanner

Fecha: 8/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvia de noche, 3 horas perdidas.
Nota No. 240 Se fundio una cimentación en el barrio Toscano y otro en el barrio El Manantial. Se Empezo el levantamiento de mamposteria en el barrio Juan Ramon. Se realizó la re-adecuación de las estructuras metalicas del barrio Juan Ramon que estaba por debajo del nivel.

Gestor Benjamin Ramiro de La hoz.O

Fecha: 9/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvias de noche, 3 horas perdidas.
Nota No 241 Se excavó y fundió el concreto de vigas de cimentación de una vivienda del barrio El Manantial.

Gestor Benjamin Ramiro de La hoz.O

Fecha: 13/6/22 Clima: Despejado
Nota No 242 Se excavó y fundió el concreto de vigas de cimentación de una vivienda mas en el barrio El Manantial.

Gestor Benjamin Ramiro de La hoz.O

Fecha: 14/6/22 Clima: Actividades suspendidas a las 3pm por fuertes lluvias
Nota No. 243 Se trabajó en levantamiento de mamposteria en el barrio Pedro Castro de 2 viviendas y 4ro en el barrio Juan Ramon.

Gestor Benjamin Ramiro de La hoz.O

Fecha: 15/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 244 El unico trabajo registrado en el dia fue levantamiento de mamposteria en 3 puntos del barrio Pedro Castro.

Gestor Benjamin. Ramiro de La hoz.O

Fecha: 16/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 245 Se entablaron y fundieron 2 vigas de cimentacion de 2 viviendas en el barrio El Manantial. Sin novedades.

Gestor Benjamin Ramiro de La hoz.O

Scanned with CamScanner

Fecha: 17/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvias de noche. 3 horas perdidas
Nota No. 246 Se instalaron 3 cubiertas en viendas en el barrio Pedro Castro y una el barrio 17 de febrero.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 20/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 247 Se continuó con el trabajo de mamposteria en 3 puntos diferentes.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 21/6/22 Clima: No se trabajo en la mañana por fuertes lluvias
Nota No. 248 A igual que el dia anterior, solo se trabajó con trabajos de mamposteria en los mismos 3 puntos.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 22/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 249 Se instalaron 2 cubiertas en el barrio Pedro Castro y se adicionaron 2 puntos mas de trabajo con relacion al trabajo de mamposteria.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 23/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 250 Se iniciaron a fundir los losas de los techos de las viviendas mas adelantadas de Pedro Castro.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 24/6/22 Clima: Excavaciones dañadas por lluvia de noche. 3 horas perdidas
Nota No. 251 Se instaló 1 techo en el barrio Juan Ramon. No se registraron mas actividades en el dia.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Fecha: 24/6/22 Clima: Despejado
Nota No. 252 Se instaló una cubierta en el barrio Pedro Castro. No se registraron mas actividades.

Gestores Boyeros Ramiro de la Hoz.

Scanned with CamScanner

Fecha: 30/6/22
Nota No. 253
Clima: Actividades suspendidas a las 1pm por lluvia
Se registró la instalación de tezado en el barrio Pedro Castro.
No se registraron mas actividades.

Gestora Bonyeneo: Ramiro de la Hoz.O

Fecha: 18/07/22
Nota No. 254
Clima: Despejado
Entre los días 1 y 17 de julio no se registraron actividades de ningun tipo en obra. Hoy y hoy en curso personal a cargo de la ejecución de las actividades.

Gestora Bonyeneo

Fecha: 18/07/22
Nota No. 255
Mediante la presente nota se da constancia de un cambio en los cargos de ingeniero residente de obra y director de obra. Los cuales serán ocupados por los siguientes ingenieros:
- Residente de Obra: Ramiro Ramos →
- Director de Obra: Javier Perez Crespín →

Gestora Bonyeneo

Fecha: 18/07/22
Nota No. 256
Se registra que iniciaron las excavaciones para instalación de redes hidrosanitarias en el barrio Pedro Castro. Precisamente en las viviendas de Dino Olaya, Julieth Agudelo, Ana Mendoza y Juan Pixón.

Gestora Bonyeneo

Fecha: 19/07/22
Nota No. 257
Se continuaron los trabajos de excavaciones en las mismas viviendas del día anterior y además se armó la mesa para vaciar concreto en la losa de baño.

Gestora Bonyeneo

Fecha: 20/07/22
Nota No. 258
Se vació el concreto para las de baño en la vivienda de Ana Mendoza y se empezó la instalación de red hidrosanitaria en las mismas viviendas trabajadas en el barrio Pedro Castro. Además se inició la excavación para otra vivienda en 2 viviendas mas.

Gestora Bonyeneo

Scanned with CamScanner

Fecha: 20/07/22	Clima: Lluvioso
Nota No. 259	-> Se presentaron fuertes lluvias a partir de las 4:00PM, por lo que se perdió una hora de trabajo.
	Gestora Benjamin
Fecha: 21/07/22	Clima: Despejado
Nota No 260	Se registro la instalacion de red hidrosanitaria en las viviendas de Alberth Baquero y Yoselin Gomez en el barrio Pedro Castro y en el barrio Camilo Torres se inicio esta misma actividad en la vivienda de Nelis Zambrano. Ademas, se inicio la instalacion de la acometida electrica en el barrio Pedro Castro para 3 viviendas. Tambien se instalo red hidrosanitaria donde Leila Sanchez (Tesorero)
	Gestora Benjamin
Fecha: 22/07/22	Clima: Despejado
Nota No. 261	Se vacio el concreto de loza de baño para las viviendas de Alberth Baquero y Yoselin Gomez. Se continuo instalando red hidrosanitaria en las viviendas de Leila Sanchez, Nelis Zambrano y Pedro Lopez. Se fundio plantilla en la vivienda de Ana mendoza.
	Gestora Benjamin
Fecha: 25/07/22	Clima: Despejado
Nota No 262	Durante el fin de semana se vacio el concreto para la plantilla de la vivienda de Juan Pican y se levantaron las estructuras metalicas de los beneficiarios Miriam Abril y Virginia Mora. El dia de hoy se levantaron las estructuras de los beneficiarios Angelica Quiroga y Maria Gonzalez del barrio El Manantial. Tambien se vacio el concreto de plantilla donde Julith Oviedo y Ana Olaya
	Gestora Benjamin
Fecha 26/07/22	Clima: Despejado
Nota No 263	se empezo el trabajo de enchape de zona humedas de las viviendas de Ana Mendoza y Juan Pican. Se vacio el concreto de plantillo de Leidis Sanchez y Yoselin Gomez. se levanto la estructura metalica de Nilida Tellez y Ana Cecilia.
	Gestora Benjamin

Scanned with CamScanner

Fecha: 27/07/22 Clima: Despejado
Visita No. 264 Se levantaron las estructuras metálicas de Evaida Pino y Luis Paredes. Se Inicio el encofrado de zapatas tomadas de julieth Izquierdo y Julio Cortez. Se fundio la plantilla del beneficiario Alberth Bejarano.

Gustavo Benjamen

Fecha 28/07/22 Clima: Lluvioso, Llovio entre las 9:00am y 7:00pm
Visita No. 265 Se levantó la estructura metalica de Mary Nieto en el Tarcoso y Yeimir Trillos en Pedro Castro. Se vacio el concreto de plantillas en la vivienda de Nelvis Zambrano y Leonigildo en Juan Ramon. En la vivienda de Diana Martinez se instalo la red hidrosanitaria y se continuo con la pega de bloques.

Gustavo Benjamen

Fecha 29/07/22 Clima: Despejado
Visita No. 266 se inicio el levantamiento de mamposteria en las viviendas de Dino Mendoza, Margarita Rocha y Yulis Moreno. Tambien se fundieron las cimentaciones del beneficiario Javier Sanchez.

Gustavo Benjamen

Fecha: 01/08/22 Clima: Lluvioso, Llovio a partir de las 3:30 P.M.
Visita No. 267 Se continuó con la pega de bloques en las puntas iniciadas y se inició el levantamiento de muros donde las beneficiarias Virginia Mora y Miriam Abril.

Gustavo Benjamen

Fecha: 02/08/22 Clima: Despejado
Visita No 268 • En el barrio Pedro Castro se realizaron trabajos de mamposteria en las viviendas de Margarita Rocha, Hilrana Beltran, Yulis Moreno, Jesica Borrio. • En la vivienda de Norardo Gonzalez se esta haciendo demolición de piedras. • En la plantilla de Dino Olaya se evidenció el mal estado de la plantilla. • En el barrio El Manantial se esta levantando mamposteria donde Miriam Abril y se esta demoliendo la cimentación de Maria Alejandra Garcia.

Gustavo Benjamen

impulsado por CamScanner

Fecha: 03/08/22	Clima: Despejado a partir de las 9:00AM (lluvia)
Nota: 269	Hoy se registraron trabajos en la vivienda de Yulis Moreno (Pedro Castro), zanja de registro donde Leslie Sanchez (Toscano) y se continuó la demolición de la cimentación de Monica Alejandra Garcia (El Manantial). Gustavo Benjumea.
Fecha: 04/08/22	Clima: Despejado
Nota No. 270	• En el barrio Pedro Castro se registran trabajos de mampostería en las viviendas de Margarita Rocha, Yulis Moreno, Alvaro Beltran y Jessica Borrio. • Se encontraron detalles en la soldadura de las viviendas de Horacio Asprovo, Alvaro Beltran, Eneida Pino, Mikicly Tellez. • En el barrio El Manantial se registran trabajos de mampostería en las viviendas de Mirian Abril y Virginia Mora. • En la vivienda de Nelvis Zambrano se fundió concreto ciclopeo para contingencia de relleno. • Se trabajo mampostería en la casa de Diana Martinez (Juan Roman) Gustavo Benjumea.
Fecha: 05/08/22	Clima: Nublado, a partir de las 2:00 P.M.
Nota No. 271	• Se registran trabajos de mampostería en Pedro Castro en las viviendas de Margarita Rocha, Alvaro Beltran, Yulis Moreno, Yeimir Trillos, Jessica Borrio. trabajos de instalaciones sanitarias donde Yarlenis Beltran y Yeimir Trillos • En el barrio El Manantial se registran trabajos de mampostería donde Mirian Abril y Virginia Mora. • Relleno donde Ruben Ortiz e instalaciones sanitarias donde cristo thamos • Donde Nelvis Zambrano (Camilo Torres) se registran trabajos de zanja electrica y tapas de cajillos. Gustavo Benjumea.
Fecha: 06/08/22	Clima: Despejado.
Nota No. 272	Se registran trabajos de acabado en la vivienda de Leslie Sanchez (Toscano), se fundió la plantilla de Diana Martinez (Juan Roman). • En el barrio Manantial se continuan trabajando mamposteria en las mismas 2 puntos. • Red hidrosanitario donde margarita rocha. Gustavo Benjumea.

impulsado por CamScanner

Fecha: 08/08/22 Clima: Despejado.
Visita No. 273 • En el barrio Pedro Castro se continua el trabajo de mamposteria en las viviendas de Margarita Rocha (se demolio un muro deplomado), Alvaro Beltran, Yulin Moreno, Jessica Barrios. • El Manantial registra trabajos de mamposteria en las viviendas de Miriam Abril, Virginia Mora y Rede donde Ana Guetta y Relleno donde Luz Posada. • En Juan Ramon donde Diana Martinez se fundieron tapas de registros y filetes.

Gestora Benjumea.

Fecha: 09/08/22 Clima: Despejado.
Visita No. 274 • La mayoria de los trabajos se suspendieron por manifestacion de los trabajadores en la bodega por falta de pago. • En el manantial se registran trabajos de instalacion de red hidrosanitaria en las viviendo de Ana guetta, Maria gonzalez, Angelica Cañizares y Luz Posada. • En el barrio Pedro Castro se registran trabajos de mamposteria en las viviendo de Alvaro Beltran y Yorbeis Beltran. • En la vivienda de Noliz Zambrano (Camilo Torres) se registro que se esta utilizando Pvc plan en los acabados en vez de Yeso.

Gestora Benjumea.

Fecha: 10/08/22 Clima: Despejado
Visita No. 275 • En el barrio Pedro Castro se registran trabajos de mamposteria en las viviendas de Margarita rocha y Yorbeis Beltran. • En el barrio Manantial se registro trabajos de relleno en la vivienda de Cristo Thomas, mamposteria en la vivienda de Virginia Mora e instalaciones electricas en la vivienda de Angelica Cañizares.

Gestora Benjumea.

impulsado por CamScanner

Fecha: 11/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 276. En el barrio Pedro Castro se registraron trabajos de mamposteria en las viviendas de Yulis Moreno, Alvaro Beltran, Yordanis Beltran; Acabados en la vivienda de Dixon Obando. • Se intervino con Nitodur-3P premier la cimentacion de la beneficiaria Berta Tapias. Se instalo la acometida electrica en la vivienda de Jessica Barrio. • En el Manantial se trabajo mamposteria en las viviendas de Angelica Cornejo y Virginia Moro. Tambien, relleno donde Ruben Ortiz. • Se realizo replanteo y trazado donde Juana Padilla (Toscano Dajo).

Gestor Benjamin.

Fecha: 12/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 277. En el barrio Pedro Castro se registro vaciado de concreto de placa-tanque en las viviendas de Jessica Barrio y Alvaro Beltran, Mamposteria donde Yordanis Beltran y Yeimin Trilla; Acabados de fachada donde Yadira Gomez.

Gestor Benjamin.

Fecha: 13/08/22 Clima: Despejado.

Nota No. 278 • En el barrio Pedro Castro se registraron actividades de placa tanque donde maryanito rocha; vaciado de plantilla donde Jessica Barrio y Alvaro Beltran; Mamposteria donde Melida Tellez. • En el barrio El Manantial se entablo y vacio concreto de cimentacion donde Ruben Ortiz y se trabajo mamposteria donde Mario Gonzalez y Virginia Moro. • En el barrio toscano se levanto muros donde Mayra Nieto y se dispuso relleno donde Juana Padilla.

Gestor Benjamin.

Agosto 16-2022 Clima: Lluvioso en portion de las 3:20 P.M.

Nota No. 279 • En el barrio Pedro Castro se registraron trabajos de mamposteria donde Yulis Moreno (vaciado de plantilla), Melida Tellez, Alvaro Beltran, Tejado donde Yeimin Trillos. • Se registraron trabajos de mamposteria en la vivienda de Heider Rios a pesar de que se informo que la cimentacion no cumple. • Donde Nelvis Zambrano se rompio plantilla para instalar puentes; se informo que esta metodologia se puede y debe cambiar.

Gestor Benjamin.

impulsado por CamScanner

Fecha: 17/08/22 Clima: Despejado.

Nota No. 280 • En el barrio Pedro Castro se está trabajando manpostería en las viviendas de Yaimin Trillos, Yordis Beltran, Milidy Tellez y Eneido Pino. • En el barrio El Manantial se trabajo manpostería donde Maria Gonzalez y Ana Guetta; se informó que se debe limpiar el relleno de raices y piedras grandes. • se rellenó y compactó donde Jesus Padilla (Tocano) y manpostería donde Manyi Nieto.

Gustavo Benjumea.

Fecha: 18/08/22 Clima: Despejado.

Nota No. 281 • En el barrio Manantial se instaló techo donde Miriam Abril y Cristo Thomas, Manpostería donde Maria Gonzalez y Ana guetta. • En el barrio Pedro Castro se realizaron trabajos de manpostería donde Yordis Beltran, Eneido Pino, Berto Tapia y Yaimin Trillos, Techo donde Neraldo chaparro y manpostería a la vez; Acabados internos donde Dino Olaya. • En Juan Pablo se instalaron puertas y ventanas donde Marigildo y Diana Martinez; Donde Nohis Zambrano tambien (Camilo Tovar).

Gustavo Benjumea.

Fecha: 19/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 282 • Se registran trabajos de instalación de puertas y ventanas donde Yoneris Gomez (Detalle empuste de pato), Alberth Baquero, Ana Nordoya; Instalación de Techo donde Jonier Donedy, Yordis Beltran y Angelica Cartagena; Manpostería donde Neraldo Gonzalez, Eneido Pino, Milidy Tellez. • En el barrio Manantial se registra trabajos de manpostería donde Maria Gonzalez y Ana Guetta. • En el barrio terrazas hay manpostería donde Manyi Nieto y relleno y compostazion donde Jesus Padilla.

Gustavo Benjumea.

Fecha: 20/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 283 se entabló y vació el concreto de cimentaciones donde Jesus Padilla

Gustavo Benjumea.

Fecha: 21/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 284 se instaló la estructura metalica donde Jesus Padilla.

Gustavo Benjumea.

impulsado por CamScanner

Fecha: 22/08/22 Clima: lluvia a partir de las 4:00 P.M.

Nota No. 285 • En el barrio Pedro Castro se fundio la nueva cimentación del beneficiario Heider Rios; Mamposteria en los viviendo de Eneida Pino, Noraido Chaparro, Mileidy Tellez, Javier Sanchez, Berto Tapia; Pañetes y Ventanas en las viviendo de Leslie Sanchez y Jessica Berrio; Enchape donde Yoreli Gomez. • En el Manantial se registro trabajos de mamposteria donde Maria Gonzalez, Margueth, Esmeralda Cordoba, Tejado donde Luz Zuleto. • En el manantial se registro trabajos de mamposteria donde Maria Gonzalez, Margueth, esmeralda cordoba y Tejado donde Luz Zuleto. • En el Tesoro se esta instalando pañetes y ventanas y donde Dalis Mejia hay Relleno de Lote.

Gestora Benjumea.

Fecha: 23/08/22 Clima: Despejado

Nota No 286 • En el barrio Pedro Castro se esta levantando mamposteria donde Mileidy Tellez, Eneida Pino, Noraido Chaparro y Berto Tapia. • En el barrio El Manantial se esta instalando Tejado donde Luz Rosado; Mamposteria donde Luz Zuleto, Margueth, Esmeralda Cordoba, Celso Cocoran. • Se esta instalando cableado donde Leslie Sanchez y donde Juana Padilla se estan corrigiendo columnas deplomadas.

Gestora Benjumea.

Fecha: 24/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 287 • En el barrio Pedro Castro se continuó el trabajo de mamposteria en las mismas puntos; instalación de tejado donde Heider Rios e instalación de accesorios donde Judith Agudelo y Yoreli Gomez. • En el Manantial se trabajo mamposteria en las mismas puntos. • Se le sugirió al contratista sacar la placa de tanque antes de pegar los bloques.

Gestora Benjumea.

impulsado por CamScanner

Fecha: 25/08/22 Clima: Llovio hasta las 9:00 A.M.
Lote No. 288 En el barrio Pedro Castro se registro manposteria en las viviendas de Yimis Trillos, Noraida chaparro, Milady Tellez, Eneida Pino, Leidy Rolon, Berta Tapia; se corbio la cera de Juan Pino y se acabados de interiores y se relleno donde Juan Pinos. • Enchape y pintura desde Nelis Zambrano • Acabados de fachada se mal ortado donde Julieth agudelo, Yordin gomez y Leidi.

Gustavo Benjumea.

Fecha: 26/08/22 Clima: Llovio hasta las 11:40 P.M.
Lote No. 289 • En el barrio Pedro Castro se registro trabajos de manposteria en las mismas puntos; Cabkeado desde Alberth baquero; Enchape desde Dina Olaya; Instalaciones sanitarias desde Haider Pino y Noraida Chaparro. • Manposteria En el barrio Manantial en las mismas puntos. • se registran fotos en las casas de Juan pinto y Dina Olaya.

Gustavo Benjumea.

Fecha: 27/08/22 Clima: Despejado
Lote No. 290 En el barrio Pedro Castro se registro manposteria en las mismas puntos; Acabados internos con Julieth Agudelo. • En el manantial manposteria desde Luz Posada, Celsa Cacerez, Esmeralda Cordoba y Luz Zapata. • Se sintio que se deben compactar los rellenos de las viviendas de Pedro Castro y El Manantial.

Gustavo Benjumea.

Fecha: 29/08/22 Clima: Despejado
Lote No. 291 • Se trabajo en el barrio Pedro Castro trabajos de manposteria en las viviendas de Leidy Rolon, Eneida Pino, Noraida Chaparro, Javier Sanchez, Haider Pino y Berta Tapia; se fundio la plantilla de [redacted] Noraida chaparro y se trabajaron acabados en las viviendas de Yordin Gomez y Julieth agudelo. • En el manantial solo se trabajo en manposteria donde Esmeralda Cordoba. • En Juan Ramon se enchapo donde Leonidio Flores y Dina Martinez. • Se identificaron tableros monofasicos de 4 toros cuando deben ser seis (6 se deben cambiar). • En el toriano se empezo el trazado donde Dalia Mejia.

Gustavo Benjumea

impulsado por CamScanner

Fecha: 30/08/22 Clima: Despejado

Nota No. 292 Se registra poca actividad en campo por una supuesta falta de material. En el barrio Pedro Castro se registran trabajos de acabados en las viviendas de Julieth Agudelo y Yarelis Gonzalez, Instalación de acometidas electricas donde Milady Tello. En el barrio El Manantial se registran instalaciones de redes en las viviendas de Miriam Abril y Virginio Mares.

Gustavo Benjumea

Fecha: 31/08/22 Clima: Despejado.

Nota No. 293 Aún se continua con poca actividad en campo. En el barrio Pedro Castro se registra instalación de marcos de puertas internas de viviendas. En el barrio El Manantial se registra Mamposteria en la vivienda de Heider Rios e instalación de techo en la vivienda de Ana Suarez. Se evidencia un sobre malleo en la vivienda de Heraldo Chaparro, la cual diseño un nivel de entrepiso mayor al que esta estipulado.

Gustavo Benjumea

Fecha 01/09/22 Clima: Despejado

Nota No. 294 Mediante la presente acta se deja constancia de que a partir de la fecha, Yo, Gustavo Benjumea Serrano; Dejo mi función y cargo como residente de interventoría del proyecto. A partir de la fecha, el cargo será ejercido por el ingeniero civil Carlos Alberto Mena Ochoa, identificado con el documento 1.065.838.807.

Gustavo Benjumea Carlos Mena

impulsado por CamScanner

Valledupar, 02 de septiembre de 2021.

Ingeniera.
MARYCARMEN OSPINA GUERRA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Referencia: ANEXO No.1 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 616-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PRENOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Cordial saludo

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los compromiso del acta # 02, nos permitimos adjuntar el concepto estructural por parte del ingeniero especialista sobres los cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de la vivienda propuesta en el contrato de obra 088 del 2021, junto con el aval de la interventoría de obra.

Esta gerencia avala el concepto emitido por parte de la interventoría de las viviendas que han sido intervenidas hasta la fecha, sin embargo se dará instrucciones al constructor e interventoría que solo se utilizara elementos continuos sin uniones de soldadura para las estructura de pórticos.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

DEIMER A. PEREZ SOLANO
Coordinador de Proyectos de Vivienda
Comfacesar

.

La Jagua de Ibirico, 31 de agosto de 2021

Señores,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, COMFACESAR
Ingeniero DEIMER PEREZ SOLANO
Coordinador Técnico de Vivienda.
Valledupar- Cesar

Con respecto al concepto estructural presentado por el ingeniero civil, DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO, especialista en estructuras. Me permito informar lo siguiente:

Luego de comprobar de que las credenciales del ingeniero especialista estuvieran vigentes, se comprobó que en efecto el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010, NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2. estipula bajo que condiciones y/o especificaciones es viable la utilización de soldadura tipo Filete en elementos metálicos. De igual forma, la norma establece las siguientes limitaciones o indicaciones para el uso de este tipo de soldadura:

F.2.10.2.2.2 — *Limitaciones* — El tamaño de una soldadura de filete no deberá ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni menor que el mínimo según la tabla F.2.10.2-4. Estos requisitos no se aplican a soldaduras de filete usadas como refuerzo de soldaduras acanaladas de penetración parcial o completa.

Tabla F.2.10.2-4
Tamaño Mínimo de Soldaduras de Filete

Espesor de la parte más delgada a unir, mm	Tamaño Mínimo de la Soldadura de Filete[a] mm
Hasta 6.4 inclusive	3
mayor que 6.4 a 12.7	5
mayor que 12.7	6
mayor que 19.1	8

[a] Dimensión del lado de la soldadura de filete. Debe aplicarse en una sola pasada.
Nota: Véase el numeral F.2.10.2.2.2 para el máximo tamaño de soldaduras de filete.

El tamaño máximo de las soldaduras de filete será:

(a) A lo largo de los bordes de un material con espesor menor que 6 mm: el espesor del material.
(b) A lo largo de los bordes de un material con espesor de 6 mm o más: el espesor del material menos 1.6 mm; excepto cuando la soldadura se haya detallado en los planos para obtener el espesor completo de la garganta. En la soldadura ejecutada, se permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 1.6 mm siempre y cuando el tamaño de la soldadura sea claramente verificable.

Ilustración 1 Limitaciones de soldadura tipo Filete. Tomado de: NSR-10

Luego de realizar el estudio del concepto y verificar todo lo relacionado, como interventoría se concluye que los cambios propuestos y avalados por el ingeniero especialista son viables y no contraria lo estipulado en la NSR-10 Titulo F sección

2.10.2. por lo que no sería necesario el cambio de estos elementos metálicos. Sin embargo, a partir de la fecha, se recomienda la no utilización de elementos estructurales unidas por cordones de soldadura. Tales como; columnas, vigas y correas en futuras viviendas a construir para garantizar un extra de seguridad.

Atentamente,

Gustavo Benjumea

Ing. Gustavo Andres Benjumea Serrano
Residente de Interventoría

- Se anexo Copia del Concepto Técnico del Especialista

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
ASSI – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Atn
Gustavo Benjumea.

CONS.VIVIURB-INTERVENTORIA-002

REFERENCIA: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PERNOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Mediante la presente, solicito la revisión y aprobación de los siguientes cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de las casas propuestas en el contrato de obra 088 de 2021, con el objeto de construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Adjunto los siguientes documentos:

- Concepto estructural por parte del ingeniero especialista.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Título F, sección 2.10.2 y sección 2.2.3.5.
- Tarjeta profesional, ingeniero especialista.
- Registro fotográfico.

Atentamente

Luis Eduardo cayón Medina
Representante legal

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
CONSORCIO VIVE URB 2021
Atn
Ingeniero Luis Eduardo Cayon Medina

Con respecto a la revision del cambio del sistema de conexión apernado a conexión por soldadura, me permito informar lo siguiente:

1. La soldadura permite la correcta transmisión de cargas en los elementos estructurales, es un método de unión avalado por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en su título F sección 2.10.2.

2. El estado límite de resistencia para elementos sometidos a compresión axial pura está controlado en general por la fluencia a la compresión o por el pandeo de la sección. El pandeo a compresión depende a su vez de factores como la esbeltez del elemento, las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva, la excentricidad y variabilidad de la carga, y la resistencia a la fluencia y variabilidad de esfuerzos residuales en la sección, condiciones que se garantizan cuando se unen dos elementos estructurales que presentan similitud en los materiales, dado que al ser materiales similares se garantiza la continuidad del material y sus propiedades mecánicas y químicas.

Dicho esto, concluimos que no es necesario reemplazar los elementos estructurales tipo columnas que presenten este tipo de uniones, ya que estas al igual que las no soldadas garantizan la transmisibilidad de cargas y la continuidad de las propiedades estructurales del elemento.

Este mismo concepto aplica para justificar el cambio del sistema de conexión apernado entre la columna, la platina y las zapatas de cimentación, por el sistema soldado entre ellas.

Atentamente,

Ing.Diego Fernando Quiroga Santiago
Mp N°: 68202092070 STD
CC: 13861922 de Bucaramanga

CONEXIÓN POR SOLDADURA

F.2.2.3.5 — ***Diseño de conexiones*** — Los elementos de conexión deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales F.2.10 y F.2.11. Las fuerzas y deformaciones usadas en el diseño deben ser consistentes con el funcionamiento esperado de la conexión y con las suposiciones formuladas en el análisis estructural. Se admiten deformaciones autolimitadas en las conexiones. En sus puntos de apoyo, las vigas y armaduras deberán estar restringidas contra la rotación alrededor de su eje longitudinal, excepto cuando mediante análisis se puede demostrar que dicha restricción no es necesaria.

F.2.10.2 — SOLDADURAS — Se deben cumplir todas las provisiones del Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1, excepto que se aplicarán los siguientes requisitos del Capítulo F.2 en lugar de las secciones del código AWS correspondientes:

Numeral F.2.10.1.6 en lugar de AWS D1.1 — Sección 5.17.1
Numeral F.2.10.2.1 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2.3.2
Tabla F.2.10.2-2 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.1
Tabla F.2.10.2-5 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.3
Tabla F.2.17-1 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.4
Numerales F.2.2.3.10 y F.2.17 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2, Parte C
Numeral F.2.13.2.2 en lugar de AWS D1.1 — Secciones 5.15.4.3 y 5.15.4.4

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA



ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

MP. 682020-92070 STD

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1: Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 2:Conexión por soldadura Columna-Zapata.



Imagen 3: Conexión por soladura Columna-Zapata.



Imagen 4:Columna de acero

A.G.M.
LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 c No. 21 -129. URBANIZACION IRACAL
VALLEDUPAR, CESAR- TEL. 3114172081

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, INCONTEC 673

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
DIRECCION DEL CLIENTE: VALLEDUPAR
OBRA Y LOCALIZACION: LA JAGUA DE IBIRICO
FECHA: 27/09/2021

CONCRETO HECHO EN OBRA
GRAVA Y ARENA DE LA CANTERA CERROPARTIDO

P.S.I.	Kg/cm2	3000
	Mpal	21,0
Mpa		
Kg/cm2	P.S.I.	210

CILINDRO No	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Dias)	RESISTENCIA ESPECIFICADA-PSI.	ASENTAMIENTO REQUERIDO	DIAMETRO CILINDRO	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA		PORCENTAJE DE RESISTENCIA (PSI)	Kg/cm2	MPa	TIPO DE ROTURA	PROYECCION A LOS 28 DÍAS		
									P.S.I.	MPa					P.S.I	MPa	Kg/cm2
16	CIMENT 18: MADELEINES HERNANDEZ	12-jul-21	26-jul-21	14	3000		6,00	359,0	2855	19,7	95,2	199,8	20,0	D	3334	23,0	233,4
17	CIMENT 21: YURIS MAIRETH GRANADO	12-jul-21	19-jul-21	7	3000		6,00	307,0	2441	16,8	81,4	170,9	17,1	D	3231	22,3	226,1
18	CIMENT 19: LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	14-jul-21	11-ago-21	28	3000		6,00	427,0	3395	23,4	113,2	237,7	23,8	D	3396	23,4	237,7
19	CIMENT 20: MILEIDYS YONARIS RAMIREZ	15-jul-21	29-jul-21	14	3000		6,00	379,0	3014	20,8	100,5	210,9	21,1	D	3520	24,3	246,4
20	CIMENT 23: JOSEFINA ORTEGA	16-jul-21	30-jul-21	14	3000		6,00	329,0	2616	18,8	87,2	183,1	18,3	D	3056	21,1	213,9
21	CIMENT 24: OSCAR DE JESUS ROLDAN	17-jul-21	24-jul-21	7	3000		6,00	302,0	2401	16,6	80,0	168,1	16,8	D	3445	23,8	241,1
22	CIMENT 7: YORAIMA POLO ROJANO	20-jul-21	17-ago-21	28	3000		6,00	428,0	3403	23,5	113,4	238,2	23,8	D	4882	33,7	341,7
23	CIMENT 22: LUIS ALFONSO AVILA	22-jul-21	05-ago-21	14	3000		6,00	382,0	3037	20,9	101,2	212,6	21,3	D	3548	24,5	248,3
24	CIMENT 26: JUAN CARLOS GUTIERREZ	23-jul-21	30-jul-21	7	3000		6,00	312,0	2481	17,1	82,7	173,7	17,4	D	3559	24,5	249,1
25	CIMENT 28: HEINIS YOHANA NUÑEZ	28-jul-21	11-ago-21	14	3000		6,00	392,0	3117	21,5	103,9	218,2	21,8	D	3641	25,1	254,8
26	CIMENT 29: RUBY SANCHEZ	28-jul-21	4-ago-21	7	3000		6,00	304,0	2417	16,7	80,6	169,2	16,9	D	3468	23,9	242,7
27	CIMENT 33: CECILIA RIOS RAVELO	29-jul-21	12-ago-21	14	3000		6,00	352,0	2799	19,3	93,3	195,9	19,6	D	3269	22,5	228,8
28	CIMENT 30: LUZ MARIA RODRIGUEZ	30-jul-21	13-ago-21	14	3000		6,00	382,0	3037	20,9	101,2	212,6	21,3	D	3548	24,5	248,3
29	CIMENT 27: YARILZA BEATRIZ CRUZ	31-jul-21	14-ago-21	14	3000		6,00	342,0	2719	18,7	90,6	190,4	19,0	D	3176	21,9	222,3
30	CIMENT 34: CARMEN ALICIA GARCIA	03-ago-21	10-ago-21	7	3000		6,00	316,0	2513	17,3	83,8	175,9	17,6	D	3605	24,9	252,3

TIPOS DE ROTURA

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E



CLASIFICACION DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO (SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA		SECA	SEMI SECA				MEDIA	HUMEDA		
ASENTAMIENTO		20 - 35	35 - 50				50 - 100	100 - 150		

OBSERVACION:

ANTONIO GARCIA M.
INGENIERO

A.G.M.

LABORATORIO DE SUELO, ASFALTO Y CONCRETO
CALLE 9 c No. 21 -129. URBANIZACION IRACAL
VALLEDUPAR, CESAR- TEL. 3114172081

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, INCONTEC 673

NOMBRE DEL CLIENTE CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
VALLEDUPAR
OBRA Y LOCALIZACION: LA JAGUA DE IBIRICO
FECHA: 27/09/2021

CONCRETO HECHO EN OBRA

GRAVA Y ARENA DE LA CANTERA CERROPARTIDO

P.S.I.	Kg/cm2	3000	
	Mpal	21,0	
Mpa			
Kg/cm2	P.S.I.	210	

CILINDRO No	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	RESISTENCIA ESPECIFICADA-PSI.	ASENTAMIENTO REQUERIDO	DIAMETRO CILINDRO	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA		PORCENTAJE DE RESISTENCIA (PSI)	Kg/cm2	MPa	TIPO DE ROTURA	PROYECCION A LOS 28 DÍAS		
									P.S.I.	MPa					P.S.I	MPa	Kg/cm2
1	CIMENT 1: EUDALDO RAFAEL ESCOBAR	09-jun-21	07-jul-21	28	3000		6,00	435,0	3459	23,8	115,3	242,1	24,2	D	3357	23,1	235,0
2	CIMENT 2: YARELYS CUBILLOS ARDILA	12-jun-21	10-jul-21	28	3000		6,00	429,0	3411	23,5	113,7	238,8	23,9	D	3310	22,8	231,7
3	CIMENT 5: JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	16-jun-21	14-jul-21	28	3000		6,00	429,0	3411	23,5	113,7	238,8	23,9	D	3310	22,8	231,7
4	CIMENT 10: RUTH MARINA PEREZ	17-jun-21	15-jul-21	28	3000		6,00	433,0	3443	23,7	114,8	241,0	24,1	D	3360	23,2	235,2
5	CIMENT 3: CRISTO HUMBERTO RIOS	22-jun-21	20-jul-21	28	3000		6,00	437,0	3475	24,0	115,8	243,2	24,3	D	3391	23,4	237,3
6	CIMENT 8: MARTHA LIGIA DOMINGUEZ	23-jun-21	21-jul-21	28	3000		6,00	442,0	3515	24,2	117,2	246,0	24,6	D	3429	23,6	240,1
7	CIMENT 12: VIVIANA MENDIBIL	24-jun-21	25-jul-21	31	3000		6,00	440,0	3499	24,1	116,6	244,9	24,5	D	3433	23,7	240,3
8	CIMENT 9: JOSE DAVID URRUTIA	25-jun-21	02-jul-21	7	3000		6,00	333,3	2650	18,3	88,3	185,5	18,6	D	3802	26,2	266,1
9	CIMENT 14: ANA MASIEL ARRIETA	28-jun-21	5-jul-21	7	3000		6,00	342,0	2719	18,7	90,6	190,4	19,0	D	3901	26,9	273,1
10	CIMENT 11: LUIS ALBERTO CAMARGO	29-jun-21	13-jul-21	14	3000		6,00	370,0	2942	20,3	98,1	205,9	20,6	D	3436	23,7	240,5
11	CIMENT 13: JESUS ALBERTO PEREZ	01-jul-21	08-jul-21	7	3000		6,00	321,0	2552	17,6	85,6	178,7	17,9	D	3662	25,2	256,3
12	CIMENT 6: MAYRA ALEJANDRA SILVIA	02-jul-21	9-jul-21	7	3000		6,00	302,0	2401	16,6	80,0	168,1	16,8	D	3445	23,8	241,1
13	CIMENT 16: YENIFER ARRIETA BUSTOS	06-jul-21	03-ago-21	28	3000		6,00	428,0	3403	23,5	113,4	238,2	23,8	D	3404	23,5	238,3
14	CIMENT 4: DORIS NALDA MARTINEZ	08-jul-21	15-jul-21	7	3000		6,00	314,0	2497	17,2	83,2	174,8	17,5	D	3582	24,7	250,7
15	CIMENT 17: ANDRY JOHANA RANGEL	09-jul-21	06-ago-21	28	3000		6,00	442,0	3515	24,2	117,2	246,0	24,6	D	3515	24,2	246,0

TIPOS DE ROTURA

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E



CLASIFICACION DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA		SECA	SEMI SECA				MEDIA	HUMEDA		
ASENTAMIENTO		20 - 35	35 - 50				50 - 100	100 - 150		

OBSERVACION:

ANTONIO GARCIA M.
INGENIERO

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

AGOSTO - 2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de agosto el area social caracterizó y realizó levantamiento de suspensión en el barrio manantial, del municipio de la jagua de ibirico con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reunión de socialización con el beneficiario, en acompañamiento con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visita a domicilio a la beneficiaria para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION BARRIO MANANTIAL

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el día de hoy 10 de agosto de 2022, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion y levantamiento de suspensión realizada en el barrio manantial, en conjunto con el beneficiario y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer al beneficiario datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las políticas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes del beneficiario y propender por su bienestar así mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorías visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion de levantamiento y suspension en vivienda de aplicación
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- El beneficiario junto con el presindente del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se concientizo al beneficiario acerca del tema de espera de la demolicion de las casas en la cual reside y se le explico el tiempo de entrega.
- Se tomo asistencia del beneficiario.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**OBJETO**: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	
	CONTRATANTE:	CONFACESAR
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.**

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		**DIRECCION:**	
EDAD:		**BARRIO:**	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**PARENTEZCO**	**EDAD**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

_____

C.C.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLICIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"*****,** por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____**,** ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ **(**_____ **M2)** y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura pública de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

LA JAGUA - CESAR			FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA	MES	AÑO	
ACTA DE VECINDAD			OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO			**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**		
Nombre			**Nombre**		
Cedula			**Cedula**		
Dirección			**Dirección**		
Celular / Tel. fijo			**Celular / Tel. fijo**		
C. Electrónico			**C. Electrónico**		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C C.	C C.	C C.
T P.	T P.	

ANEXOS LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVAEN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO:	
CONTRATANTE:	CONFACESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO:	

USTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Doris Ditta	32835100	O: de casa	la mano de dios	3219158	Veneficiario	
	Carolina Andrea Bayona	1234092953	Ing. Civil	Centro	3008337469	Interventoria	
	Doris Ditta	32835100	O: de casa	la mano de dios	3219158	presidenta	
	Gloria Cano	1065899300	Ing.	Cerrito	3007411659	Ing. Social	







ANEXO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA MES AÑO	
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Hospital	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☒ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Silfrido Robles	**Nombre**	
Cedula	1.064.111.953	**Cedula**	
Dirección	Calle 2 Casa 105	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3113860020	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	No	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☒ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☒ Otro	Madera
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala

Humedad	☒ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☒ **No**	**Grietas y fisuras**	☒ **Si**	☐ **No**

Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro: Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No

Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☒ No		**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta

Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No

Humedad	☐ Si	☒ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 1064777953
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA MES AÑO	
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Mariscal	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Humedad	☐ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☐ **No**	**Grietas y fisuras**	☐ **Si**	☐ **No**

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio Sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C C.	C C.	C C.
T P.	T P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

2022

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CONSROCIO VIVEURB 2021

PERIODO: AGOSTO DEL 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
AGOSTO 2022

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN....3

2. OBJETIVOS....4

2.1. General. 4

2.2. Específicos. 4

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO. 5

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO....5

4.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En El Trabajo.... 5

4.2. Inspecciones Planeadas a Actividades Críticas. 5

4.3. Suministro de Elementos de Protección Personal. 6

4.4. Charlas y/o Capacitaciones de Seguridad Diarias. 8

4.5. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Demarcación y Señalización. 9

4.6. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 10

4.7. Inspecciones Periódicas de Seguridad y Salud, paraIdentificación y control de peligros y riesgos. 10

5. FOTOS VARIAS....11

6. CONCLUSIONES....12

7. ANEXOS DE FORMATOS. 13

7.1. Formato Entrega de EPP y Bioseguridad. 13

7.2. Charlas de Seguridad. 32

7.3. Formato de Asistencia Diaria. 37

7.4. Condiciones Seguras de Trabajo. 44

7.5. Condiciones Inseguras de Trabajo. 60

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos claves que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal. Este informe describe el compromiso asumido por el CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual está relacionada con las diferentes actividades en la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores en los diferentes frentes de obra, ubicados en el Municipio de la Jagua de Ibirico.

El presente informe refleja los avances y actividades implementadas para promoción y prevención de la salud y seguridad de los trabajadores desde el inicio de la obra, mediante los diferentes programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo “SG – SST”.

Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, el CONSORCIO VIVEURB 2021, se diseñó, estructuró y se vienen implementando un protocolo de bioseguridad de estricto cumplimiento por todas las partes interesadas que asisten a los diferentes frentes de las obras, señalándose en el presente informe correspondiente al primer mes de actividades, las gestiones adelantadas para la mitigación y prevención del riesgo biológico por el COVID – 19, como también los demás riesgos asociados a las actividades desarrolladas.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS

2.1. General.

Concientizar a los trabajares de la empresa CONSORCIO VIVEURB 2021, a cerca de los factores de riesgos a los cuales están expuesto en su labor y realizar una evaluación de los factores de riesgo que existen en los sitios de trabajo dentro de la empresa, con el fin de tomar las medidas de control para evitar los posibles enfermedades o accidentes laborales.

2.2. Específicos.

- ✓ Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo, para identificar posibles factores de riesgo.
- ✓ Priorizar los factores de riesgo que se presenten y colocarlos en plan de mejora.
- ✓ Capacitar al personal para reducir porcentajes de accidentalidad.
- ✓ Realizar vigilancia al Panorama de Factor de Riesgos.
- ✓ Hacer cumplir el uso permanente en obra de los elementos de protección individual (EPI).
- ✓ Atender las solicitudes realizadas por la interventoría y corregir.
- ✓ Realizar encintado de peligro en los puntos necesarios.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO.

El CONSORCIO VIVEURB 2021, desde el inicio de las actividades que viene dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los cuales dictan disposiciones para la estructura e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST), adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan en beneficio de todos sus colaboradores y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento, para lo cual ha diseñado y estructurado los documentos requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con una Política y Objetivos generales y específicos de seguridad y salud en el trabajo definidos y socializados a los trabajadores, para lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en los diferentes procesos. Durante los primeros meses se lograron diseñar los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la identificación inicial de los peligros, evaluación y control de los riesgos, acorde con las actividades en desarrollo, para luego establecer los procedimientos y actividades necesarias para el control de los riesgos, logrando establecer el plan de trabajo anual y su implementación de manera semanal, acorde con las necesidades de los avances de obra.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

A continuación, las gestiones de seguridad y salud en el trabajo durante este periodo de actividades, donde también se incluyeron nuevas actividades correspondientes a la prevención, mitigación y control del riesgo biológico por el virus COVID-19:

4.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Con el fin de orientar, ejecutar y evaluar de manera diaria las acciones encaminadas a lograr el mayor grado de seguridad y bienestar integral de los trabajadores y asistentes a los diferentes frentes de trabajo, se diseñó e implementó un plan de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo, conresponsables e indicadores.

4.2. Inspecciones Planeadas a Actividades Críticas.

Se socializo el procedimiento análisis seguro de trabajo e inspecciones pre

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

operacionales para las actividades manuales y mecánicas.
La Inspección de herramientas, inspección de extintores y de equipos como motobombas planta eléctricas generadores de energías, lámparas vehículos y áreas de trabajo, se realiza análisis de trabajo (AST) formato de inspección pero operacional vehículos.

TIPO DE INSPECCION	FECHA	RESPONSABLE
Inspección del Botiquín	Agosto: 04, 11, 18, 25	Inspector SISO
Inspección de Herramientas.	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones de HSEQ	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones extintores.	Agosto: 13/ 2022	Inspector SISO
Inspecciones de equipos eléctricos.	Diarios	Inspector SISO
Inspecciones a los vehículos	Semanales	Inspector SISO
Inspección áreas de trabajo	Diarias	Inspector SISO
AST: análisis seguro de trabajo.	Semanales	Inspector SISO
Inspecciones pre operacional a maquinarias.	Diarias	Inspector SISO
Inspección de elementos de protección personal	Diarias	Inspector SISO

Se realizó la verificación del botiquín de la obra e inspecciones de elementos de protección personal e inspecciones de HSEQ.



Inspección del Botiquín



Inspecciones extintores.

4.3. Suministro de Elementos de Protección Personal.

Con el objetivo de darle un mínimo margen a los posibles accidentes laborales se viene haciendo entrega de los elementos de protección personal (EPP), por parte de

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

los profesionales en campo se viene haciendo seguimiento para que cada trabajador porte correctamente los elementos, aquellas personas o trabajadores que reincidan en el no uso correcto o no usos de estos elementos de protección son sancionados y retirados de la obra, si así lo solicita la interventoría o el profesional a cargo del contratista.

Sabemos que para tener una obra totalmente segura es casi imposible pero día a día se viene haciendo planes de mejora para que los porcentajes de accidentalidad no sean alarmantes y por lo contrario sean manejables.

	
Uso de los elementos de protección	**Entrega de elementos de EPP y bioseguridad.**

<u>Algunos de los elementos de protección individual entregados son:</u>

- Alcohol.
- Mascarillas protectoras.
- Gafas de seguridad.

- Guantes.
- Cascos.
- Protectores auditivos.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4.4. Charlas y/o Capacitaciones de Seguridad Diarias.

Antes del inicio de las actividades diarias se realiza la oración a DIOS todo poderoso para recargarnos espiritualmente y charlas de seguridad.

Los profesionales divulgan la información sobre la aplicación de los planes de emergencia y de evacuación de los sitios de trabajo, Difusión de las políticas de control de alcohol, tabaquismo y drogadicción entre otros temas.

Relación de capacitaciones diarias

	
capacitaciones diarias	**capacitaciones diarias**

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE CHARLA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO DEL 2022				HORA:06;30 am	
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2	3	4	5	6
USO DE EPP	HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE OBRA	ORDEN Y ASEO	EQUIPOS CONTRACAIDAS	USO ADECUADO DE PULIDORAS	EL AGUA FIESTA
8	9	10	11	12	13
AST	OBSERVACIONES DE TAREA	CAIDAS DESDE UN MISMO Y DIFERENTE NIVEL	USO CORRECTO DE HERRAMIENTAS	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	SEÑALIZACIONES
15	16	17	18	19	20
ESTRES POR C ALOR	USO DE BOTAS DE SEGURIDAD	USO DE MASCARILLAS	ASEO PERSONAL	POSICIONES INADECUADAS	PREVENCION DE INCENDIOS
22	23	24	25	26	27
OBJETOS QUE CAEN	PRIMEROS AUXILIOS	INSPECCIONES PLANEADAS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	RIESGO ELECTRICO	POLITICAS DE ALCOHOL Y DROGA
29	30	31			
PROTECCION PARA LAS MANOS	CAIDAS,TROPIEZOS,RESBALONES	USO DEL CASCO Y ROSTRO			
Nota: Todos los dias se socializara tema relacionado al covid-19, lavado de manos y distanciamiento social.					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4.5. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Demarcación y Señalización.

Con el objetivo de Prevenir accidentes laborales y a terceros se está implementando el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de las obras.
Se Implementan los usos de señales preventivas, reglamentarias e informativas durante el tiempo que dure la ejecución de las obras.

	
Evaluación de Riesgos	**Evaluación de Riesgos**

Todas las zonas en que se están llevando a cabo actividades de construcción y que estén expuestas al público son adecuadamente señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes; En la noche se deben colocar avisos refractivos, luminosos o intermitentes en caso de ser necesario.

Se está aislando y demarcando los diferentes sectores de la obra, como oficinas, almacén, depósito de materiales, bodegas, comedor, servicios sanitarios, vestidores, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4.6. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.

Durante el mes de Agosto 2022, no se presentaron accidentes laborales, debido a los controles operacionales implementados y ejecutados por la profesional en campo del contratista.

4.7. Inspecciones Periódicas de Seguridad y Salud, paraIdentificación y control de peligros y riesgos.

Se adelantan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo donde se evalúan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y se dan las recomendaciones para evitar incidentes y accidentes laborales.

	
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO	**CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS**

Algunos impactos potenciales que deben estar en plan de mejora con el fin de evitarlos al máximo son:

- ✓ Generación de riesgos para personas y bienes por mal uso de equipos.
- ✓ Presencia de personal extraño y ajeno a la obra que se puede lesionar.
- ✓ Posibilidad de accidentes por alteración del tránsito vehicular y peatonal.
- ✓ Posibilidad de Obstrucción de vías y accesos a propiedades privadas.
- ✓ Generación de molestias e incomodidad a la comunidad.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. FOTOS VARIAS









carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6. CONCLUSIONES

- ✓ El CONSORCIO VIVEURB 2021 por medio de sus profesionales viene realizando continuamente planes de mejoras, así mismo viene haciendo inspecciones de trabajos con el objetivo de reducir al máximo los posibles accidentes laborales.

- ✓ Se viene realizando jornadas de capacitaciones tanto a los trabajadores como a los habitantes aledaños al proyecto este último con el fin de generar sentido de pertenencia por la obra construida y también para que eviten que sus familiares entre todos los niños no hagan ingreso a la obra y se expongan en peligro.

- ✓ Se está cumpliendo con las metas de tener cero incidente y cero accidente laboral gracias a la buena implementación del sistema de gestión SG- que a diario hace la profesional siso del CONSORCIO VIVEURB 2021.

- ✓ Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

Lizeth K Moreno C.

LIZETH KARINA MORENO CASTRILLO.
TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. ANEXOS DE FORMATOS.

7.1. Formato Entrega de EPP y Bioseguridad.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Duvan Florez		
CÉDULA:	1.003.291.192	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	01-08-22	3
2	Gafas de seguridad	01-08-22	3
3	Tapabocas	01-08-22	5
4	Casco de seguridad.	01-08-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	5
6	Gafas de seguridad	10-08-22	2
7	Chaleco.	10-08-22	1
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.946.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

DUVAN Florez
C.C 1003291192

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Janier Guarin		
CÉDULA:	1.003.123.491.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción.	FECHA:	19-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero,	19-08-22	3
2	Gafas de seguridad	19-08-22	3
3	Tapabocas	19-08-22	3
4	Casco de seguridad	19-08-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	19-08-22	3
6	Gafas de seguridad.	19-08-22	2
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C	CÉDULA:	1.069.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Janier Guarin
CC 1003123491

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Epimenio Herrera.		
CÉDULA:	85.440.724.	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	01-08-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	01-08-22	3
3	Tapabocas.	01-08-22	5
4	Gafas de seguridad	01-08-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	5
6	Gafas de seguridad.	10-08-22	2
7	Chaleco.	10-08-22	1
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth L. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Epimenio Herrera D.
C.C. 85440724

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Jorge Armando Mides		
CÉDULA:	1.082.879.901.	OCUPACIÓN:	Oficial.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	19-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	24-08-22	3
2	Gafas de seguridad	24-08-22	3
3	Tapabocas.	24-08-22	5
4	Casco de seguridad.	24-08-22	1
5	Chalecos.	24-08-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Jorge Mides
C.C 1082 879 901

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan David Gutierrez.		
CÉDULA:	1.064.107.618.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad.	10-08-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
3	Gafas de seguridad.	10-08-22	5
4	Tapabocas	10-08-22	1
5	Chaleco.	10-08-22	3
6	Guantes tipo ingeniero.	19-08-22	2
7	Gafas de seguridad.	19-08-22	1
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.946.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

JUAN DAVID GM.
C.C. 1064 107 618

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Esneider Martinez Sanchez.		
CÉDULA:	1.092.345.844.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	19-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	24-08-22	3
2	Gafas de seguridad.	24-08-22	3
3	Tapabocas.	24-08-22	5
4	Chaleco.	24-08-22	1
5	Casco de seguridad.	24-08-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Esneider
CC 1.092.345.844.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Mauricio Ospino		
CÉDULA:	1.082.916.550	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Gafas de seguridad	10-08-22	3
3	Casco de seguridad	10-08-22	1
4	Tapabocas.	10-08-22	5
5	Chaleco	10-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero	20-08-22	3
7	Gafas de seguridad.	20-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1-069.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Mauricio J. Ospino
C.C. 1082916550

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luis alberto Jaimes		
CÉDULA:	13.243.787	OCUPACIÓN:	Oficial.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	19-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	24-08-22	3
2	Gafas de seguridad.	24-08-22	3
3	Casco de seguridad.	24-08-22	1
4	Tapabocas.	24-08-22	5
5	Chaleco.	29-08-22	1
6	Tapa oidos.	24-08-22	5
7.			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lineth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

C.C. 13243787

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Julder Alfonso Guarin		
CÉDULA:	1.007.624.505	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Gafas de seguridad	10-08-22	3
3	Tapabocas	10-08-22	5
4	Casco de seguridad	10-08-22	1
5	Chaleco.	10-08-22	1
6	Gafas de seguridad.	19-08-22	3
7	Guantes tipo Ingeniero	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth C. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Julder Guarin
C.C. 1.007.624.505

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Dichar Alberto Morales		
CÉDULA:	78.495.343	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	19-08-22.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	24-08-22	3
2	Gafas de seguridad.	24-08-22	3
3	Casco de seguridad.	24-08-22	1
4	Chaleco.	24-08-22	1
5	Tapabocas.	24-08-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Dichar Morales
C.C. 78.495.343

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Javier Enrique Garcia Martinez		
CÉDULA:	1.003.123.244	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Tapabocas	10-08-22	5
3	Gafas de seguridad	10-08-22	3
4	Casco de seguridad	10-08-22	1
5	Chaleco	10-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero	19-08-22	3
7	Gafas de seguridad	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Javier Enrique Garcia
C.C. 1003123244

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Johan David Arias		
CÉDULA:	1.064.116.656.	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	19-08-22.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	29-08-22	3
2	Gafas de seguridad.	29-08-22	3
3	Casco de seguridad.	29-08-22	1
4	Chaleco.	29-08-22	1
5	Tapabocas	29-08-22	5
6	Guantes tipo ingeniero	27-08-22	3
7	Gafas de seguridad.	27-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lineth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lineth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Johan Arias
CC. 1064116656

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edier Fontalvo.		
CÉDULA:	1-064.107.097	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Gafas de seguridad.	10-08-22	3
3	Casco de seguridad	10-08-22	1
4	Tapabocas	10-08-22	3
5	Chaleco.	10-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero	19-08-22	3
7	Gafas de seguridad	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Edier Fontalvo
CC 1064107097

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adel Humberto Rojas.		
CÉDULA:	1.064.112.318.	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción.	FECHA:	22-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	27-08-22	3
2	Gafas de seguridad	27-08-22	3
3	Casco de seguridad.	27-08-22	1
4	Tapabocas.	27-08-22	5
5	Chaleco.	27-08-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

C.C. 1064112318

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luis Juan Rivera		
CÉDULA:	1.065.998.235	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Gafas de seguridad	10-08-22	3
3	Casco de seguridad	10-08-22	1
4	Tapabocas	10-08-22	5
5	Chalecos.	10-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero	19-08-22	3
7	Gafas de seguridad	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Ineth C. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Luis Juan Rivera
C.C. 1065 998 235

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Hernan Pava.		
CÉDULA:	15.174.618	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	22-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad.	22-08-22	1
2	Guantes tipo Ingeniero	22-08-22	3
3	Gafas de seguridad.	22-08-22	3
4	Tapabocas.	22-08-22	5
5	Chaleco.	22-08-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad* Hernán Mauricio Pava de 15174018.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Euclides Ibañez		
CÉDULA:	1.062.809.939.	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Gafas de seguridad	10-08-22	3
3	Casco de seguridad	10-08-22	1
4	Tapabocas.	10-08-22	5
5	Chaleco.	16-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero.	19-08-22	3
7	Gafas de seguridad.	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Euclides Ibañez
C.C. 1062809939

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Neider Guerra		
CÉDULA:	5.165.220.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	30-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad.	30-08-22	1
2	Guantes tipo ingeniero	30-08-22	3
3	Gafas de seguridad	30-08-22	3
4	Chaleco	30-08-22	1
5	Tapabocas.	30-08-22	5
6	Tapa oidos.	30-08-22	2
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Neider Guerra
C.C 5165220

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Carlos Fontero		
CÉDULA:	12.529.863	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	10-08-22	3
2	Casco de seguridad	10-08-22	1
3	Gafas de seguridad	10-08-22	3
4	Tapabocas.	10-08-22	5
5	Chalecos	10-08-22	1
6	Guantes tipo ingeniero	19-08-22	3
7	Gafas de seguridad	19-08-22	2
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1-069-113-086
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

C.C. 12521863

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.


7.2. Charlas de Seguridad.



VIVEURB 2021 — LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 25-08-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: levantamiento de cargas

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	ÁREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	Yorgos Morales	12.893.260	Auxiliar.	Construccion	N/A		YOVANIS
	Jose Carrocho	12.693.380	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Camacho
	Juan E. Arias	1003.960.102	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Juan e
	Jorge Mejia	1.069.160.465	Auxiliar.	Construccion	N/A.		JORGE
	Juan A. Arias	1.003.908.260	Auxiliar	Construccion	N/A.		Juan
	Nordis Morales	1.069.591.160	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Jordis
	Fernel Lopez	18.893.609	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Fernel Lopez
	Epimenio Herrera	1.069.110.415	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Davan Flores	1.003.910.670	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Juan Flores
	Hector Pineda	12.693.260	Oficial	Construccion	N/A.		Hector
	Epimenio H.	1.069.105.460	Oficial	Construccion	N/A.		Epimenio
	Juan David	1.069.105.920	oficial	Construccion	N/A.		Juan David
	Javier Garcia	1.069.909.260	Auxiliar	Construccion	N/A.		Javier Garcia
	Mauricio O.	1.069.903.135	Auxiliar.	Construccion	N/A.		
	Aminso ochoa	12.893.823	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Julme Diaz	12.892.160	Oficial	Construccion	N/A.		Jaimedias
	Yuvier Guzman	1.069.110.936	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Anderson Lopo	1.069.405.260	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Elias Salcedo	1.069.205.929	Auxiliar	Construccion	N/A.		Elias S.
	Eder Fontalvo	1.069.450.420	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Javier Ayala	1.069.590.305	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Juan Carlos Quintero	12.893.260	Oficial.	Construccion	N/A.		

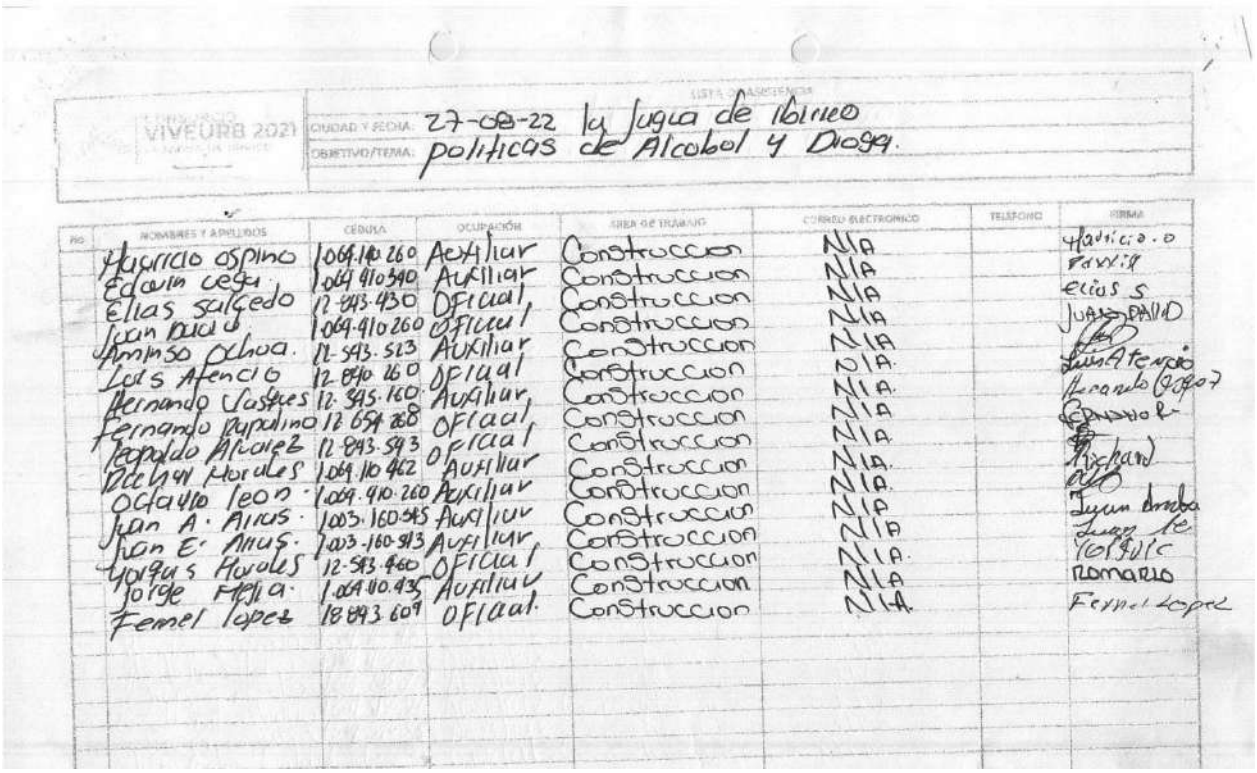


VIVEURB 2021 — LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 27-08-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: politicas de Alcohol y Drogas.

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	ÁREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	Mauricio ospino	1.069.140.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.o
	Edwin ceja	1.069.910.340	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Elias salcedo	12.893.430	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David	1.069.910.260	Oficial	Construccion	N/A		Juan David
	Aminso Ochoa	12.893.523	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Luis Afencio	12.890.160	Oficial	Construccion	N/A.		Luis Afencio
	Hernando Vasques	12.893.160	Auxiliar	Construccion	N/A.		Hernando 23807
	Fernando Papalino	12.694.268	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12.893.593	Oficial	Construccion	N/A.		
	Richard Morales	1.069.110.462	Auxiliar	Construccion	N/A.		Richard
	Octavio leon	1.069.910.260	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Juan A. Arias	1.003.160.595	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Arias
	Juan E. Arias	1.003.160.913	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan le
	Yorgos Morales	12.893.460	Oficial	Construccion	N/A.		YORGUIS
	Jorge Mejia	1.069.110.935	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Fernel Lopez	18.893.609	Oficial.	Construccion	N/A.		Fernel Lopez

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

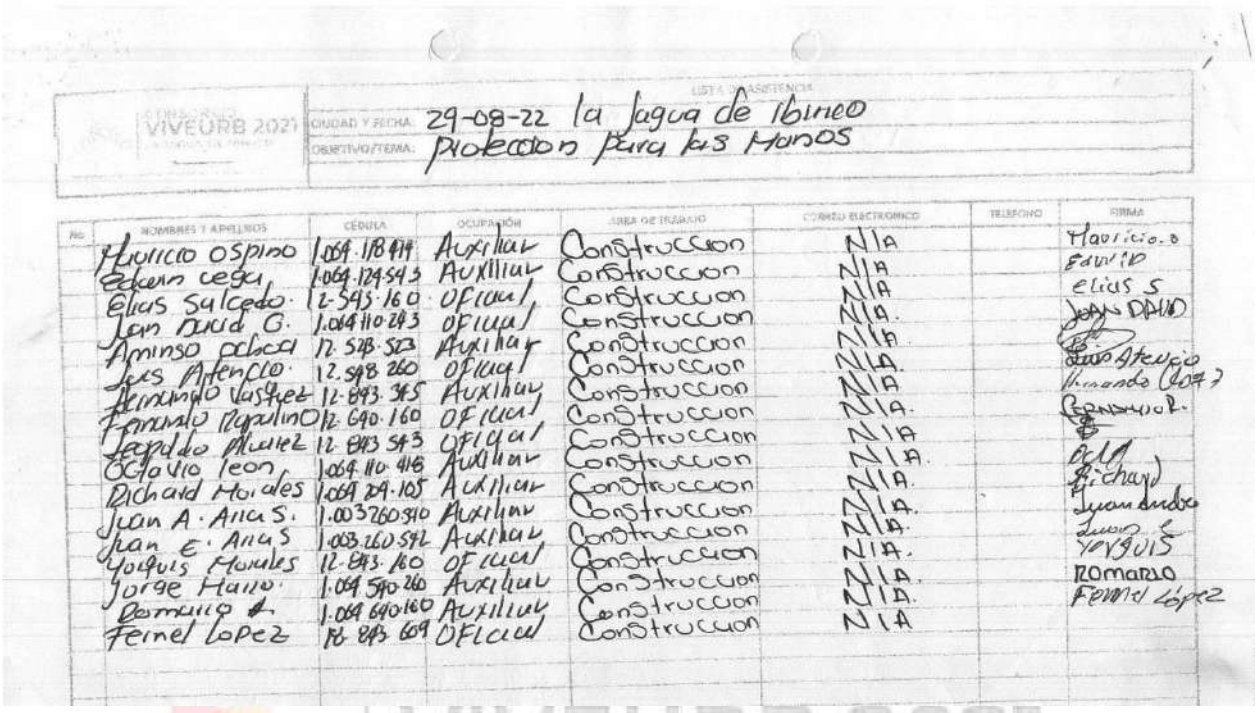


LISTA DE ASISTENCIA

VIVEURB 2021

CIUDAD Y FECHA: 29-08-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: proteccion para las Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio Ospino	1.064.118.919	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.O
	Edwin vega	1.064.129.543	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias Salcedo	12.543.160	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David G.	1.064.110.243	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso ochoa	12.528.523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12.548 260	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12.893.365	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (0373
	Fernando Rapalino	12.640.160	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12.893.543	Oficial	Construccion	N/A		
	Octavio leon	1.064.110.418	Auxiliar	Construccion	N/A		Octavio
	Richard Morales	1.064.29.105	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Juan A. Arias S.	1.003.260.340	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan E. Arias	1.003.260.592	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Yorgus Morales	12.893.160	Oficial	Construccion	N/A		YORGUIS
	Jorge Hesia	1.064.540.260	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Romario A.	1.064.640.160	Auxiliar	Construccion	N/A		Fernel López
	Fernel Lopez	18.893.609	Oficial	Construccion	N/A		

VIVEURB 2021

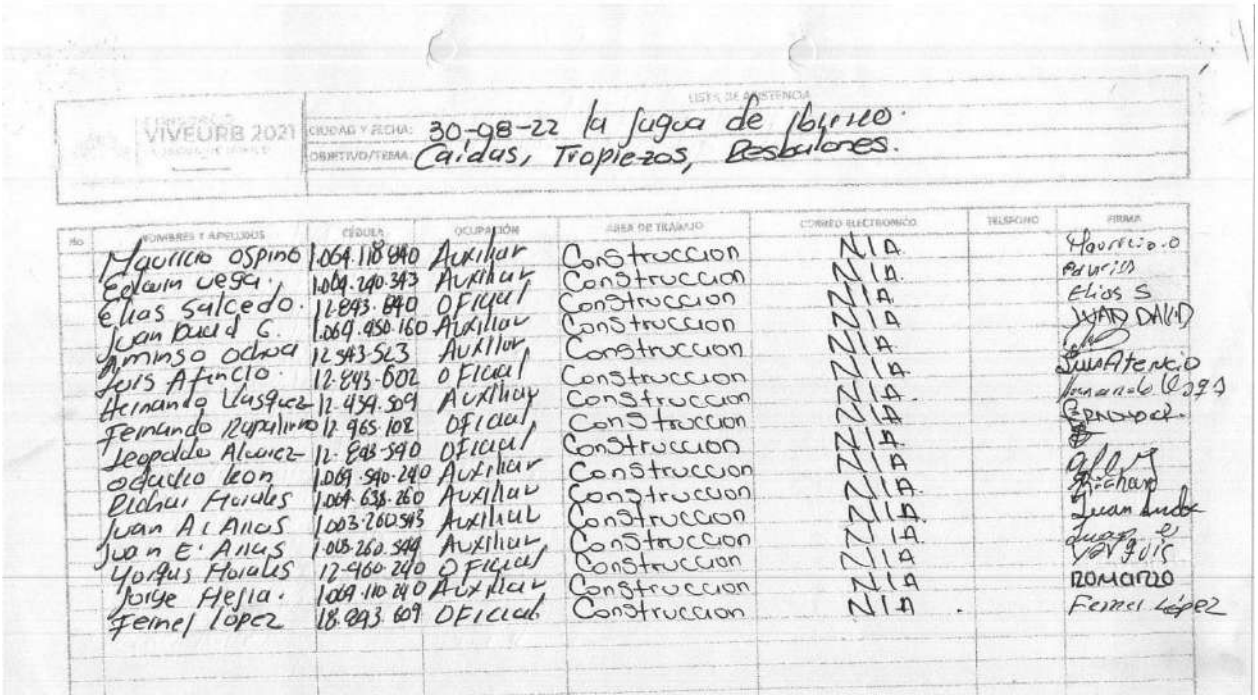

LISTA DE ASISTENCIA

VIVEURB 2021

CIUDAD Y FECHA: 30-08-22 la Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Caidas, Tropiezos, Resbalones.


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio Ospino	1.064.118.940	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.O
	Edwin vega	1.064.240.343	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias Salcedo	12.893.840	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David G.	1.064.950.160	Auxiliar	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso ochoa	12.543.523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12.893.602	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12.434.509	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (0373
	Fernando Rapalino	12.965.102	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12.893.540	Oficial	Construccion	N/A		
	octavio leon	1.064.540.240	Auxiliar	Construccion	N/A		Octavio
	Richard Morales	1.064.638.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Juan A. Arias	1.003.260.343	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan E. Arias	1.003.260.349	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Yorgus Morales	12.460.240	Oficial	Construccion	N/A		YORGUIS
	Jorge Hesia	1.064.110.240	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Fernel Lopez	18.893.609	Oficial	Construccion	N/A		Fernel López

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.



VIVEURB 2021
CIUDAD Y FECHA: 25-08-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Levantamiento de cargas


NO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Yorgos Morales	12.893.260	Auxiliar.	Construccion	N/A		YORGUIS
	Jose Camacho	12.693.380	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Camacho
	Juan E. Arias	1003.960.102	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Juan e
	Jorge Mejia	1069.160.465	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Jorge
	Juan A. Arias	1003.908.260	Auxiliar	Construccion	N/A.		Juan
	Yordis Morales	1069.504.160	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Yordis
	Fernel lopes	18.893.609	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Fernel López
	Epimenio Herrera	1069.110.425	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Dayan flores	1003.910.620	Auxiliar.	Construccion	N/A.		DUAN FLORE
	Heector pineda	12.693.260	Oficial	Construccion	N/A.		Hector
	Epimenio H.	1069.105.460	Oficial	Construccion	N/A.		Epimenio
	Juan David	1069.105.920	oficial	Construccion	N/A.		JUAN DAVID
	Javier Garcia	1069.904.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Javier Garcia
	Mauricio O.	1069.905.135	Auxiliar.	Construccion	N/A.		Mauricio.O
	Aminso ochoa	12.893.843	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Julme Diaz.	12.892.160	OFICIAL	Construccion	N/A.		Jaimediaz
	Javier Guzman	1069.110.936	Auxiliar	Construccion	N/A.		Javier Guzman
	Anderson Lopo.	1069.405.440	Auxiliar	Construccion	N/A.		anderson.
	Elias Salcedo.	1069.205.929	Auxiliar	Construccion	N/A		Elias S.
	Eder Fontalvo	1069.450.420	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Javier Guzman	1069.590.305	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Juan Carlos Quintero	12.893.160	Oficial.	Construccion	N/A.		

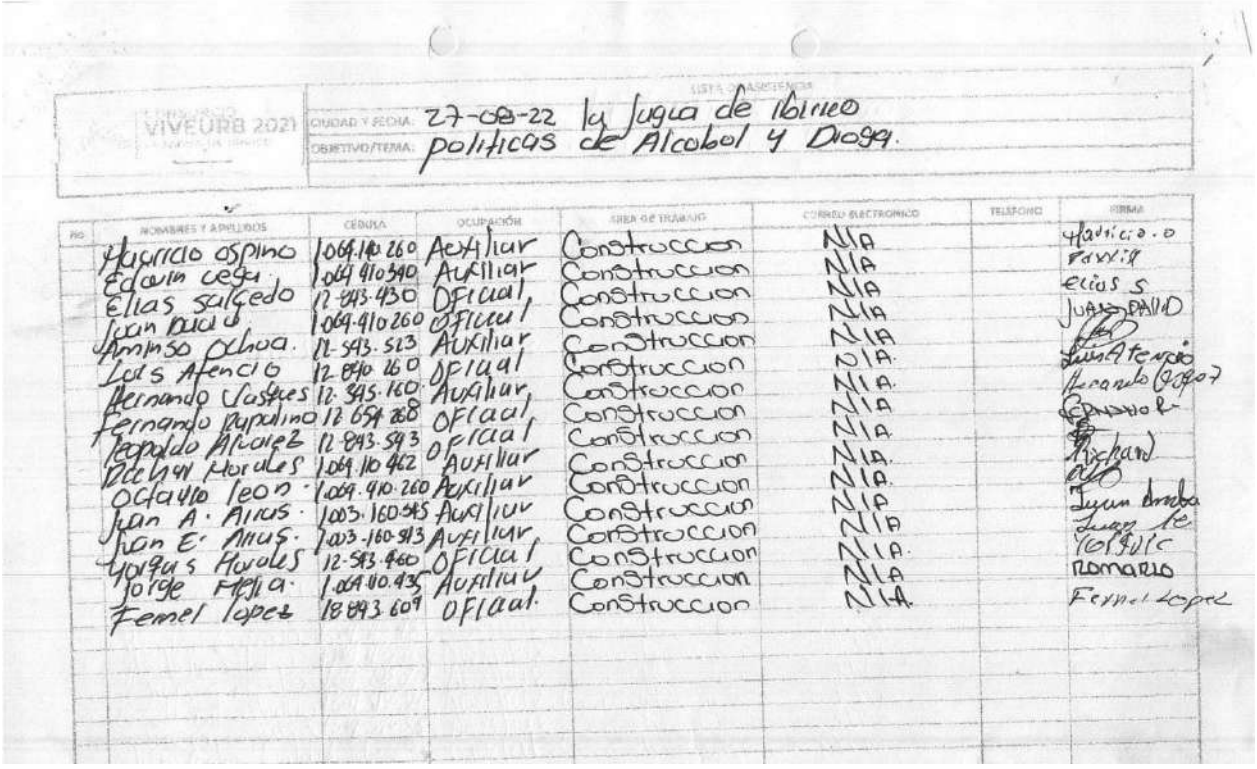

VIVEURB 2021
CIUDAD Y FECHA: 27-08-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: politicas de Alcobol y Droga.

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio ospino	1069.140.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.O
	Edwin cepeda	1069.910.340	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Elias salcedo	12.893.430	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David	1069.910.260	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso Ochoa.	12.893.523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Afencio	12.890.160	Oficial	Construccion	N/A.		
	Hernando Vasquez	12.895.160	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Fernando Papalino	12.654.280	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12.893.593	Oficial	Construccion	N/A.		
	Richard Morales	1069.110.462	Auxiliar	Construccion	N/A.		
	Octavio leon	1069.910.260	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Juan A. Arias	1003.160.585	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Juan E. Arias	1003.160.913	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Yorgus Morales	12.893.460	Oficial	Construccion	N/A.		YORGUIS
	Jorge Mejia	1069.110.435	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Femel lopez	18.893.609	Oficial	Construccion	N/A.		Fernel Lopez

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

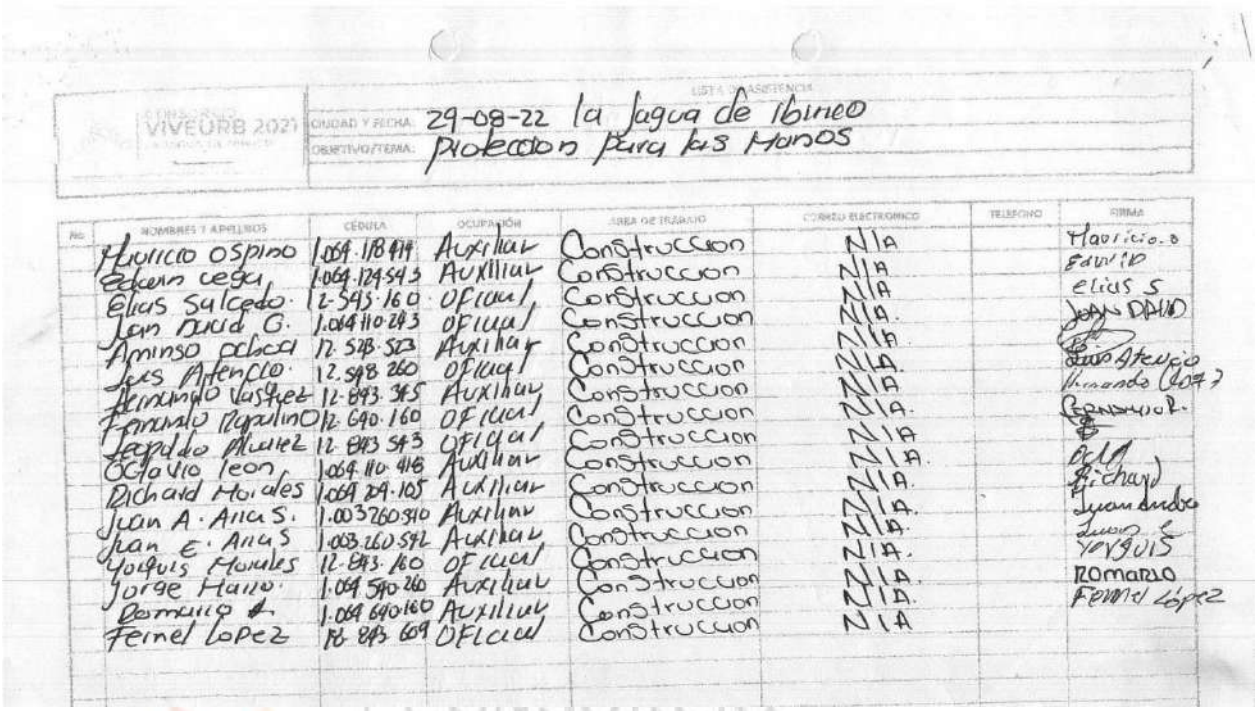


LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIVEURB 2021

CIUDAD Y FECHA: 29-08-22 la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Proteccion para las Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio Ospino	1.064.118.419	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.O
	Edwin vega	1.064.124.543	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias Salcedo	12-543-160	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David G.	1.064.110.243	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso ochoa	12.543.523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12.548.260	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12.893.345	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (807)
	Fernando Rapalino	12.640.160	Oficial	Construccion	N/A		Fernando R.
	Leopoldo Alvarez	12.893.543	Oficial	Construccion	N/A		
	Oclavio leon	1.064.110.416	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Richard Morales	1.064.29.105	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan A. Arias S.	1.003.260.340	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Juan E. Arias	1.003.260.542	Auxiliar	Construccion	N/A		YORQUIS
	Yorquis Morales	12.893.160	Oficial	Construccion	N/A		ROMARIO
	Jorge Hajia	1.064.540.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Fernel López
	Romario	1.064.640.160	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Fernel Lopez	18.893.609	Oficial	Construccion	N/A		

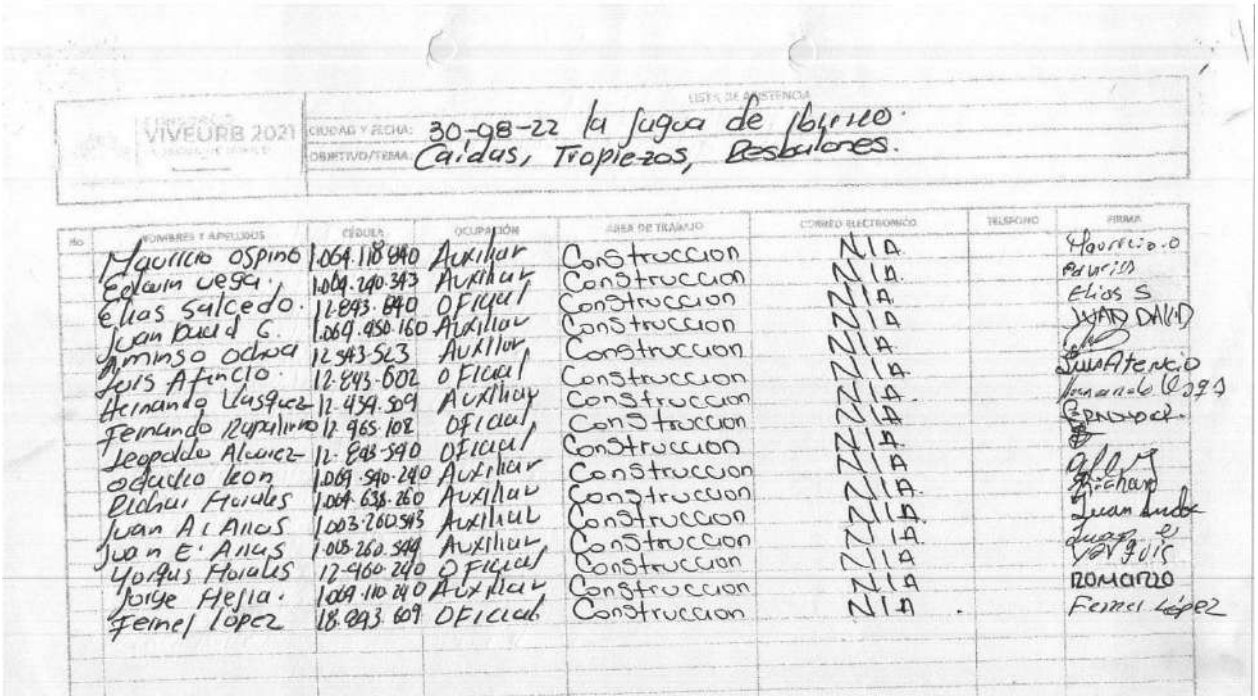


LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIVEURB 2021

CIUDAD Y FECHA: 30-08-22 la Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Caidas, Tropiezos, Resbalones.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio Ospino	1.064.118.840	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.O
	Edwin vega	1.064.240.343	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias Salcedo	12.893.840	Oficial	Construccion	N/A		Elias S
	Juan David G.	1.064.950.160	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso ochoa	12.543.523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12.893.602	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12.439.509	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (807)
	Fernando Rapalino	12.965.102	Oficial	Construccion	N/A		Fernando R.
	Leopoldo Alvarez	12.893.540	Oficial	Construccion	N/A		
	Oclavio leon	1.064.540.240	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Richard Morales	1.064.638.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan A. Arias	1.003.260.543	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Juan E. Arias	1.003.260.549	Auxiliar	Construccion	N/A		YORQUIS
	Yorquis Morales	12.960.240	Oficial	Construccion	N/A		ROMARIO
	Jorge Hajia	1.064.110.240	Auxiliar	Construccion	N/A		Fernel López
	Fernel Lopez	18.893.609	Oficial	Construccion	N/A		

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

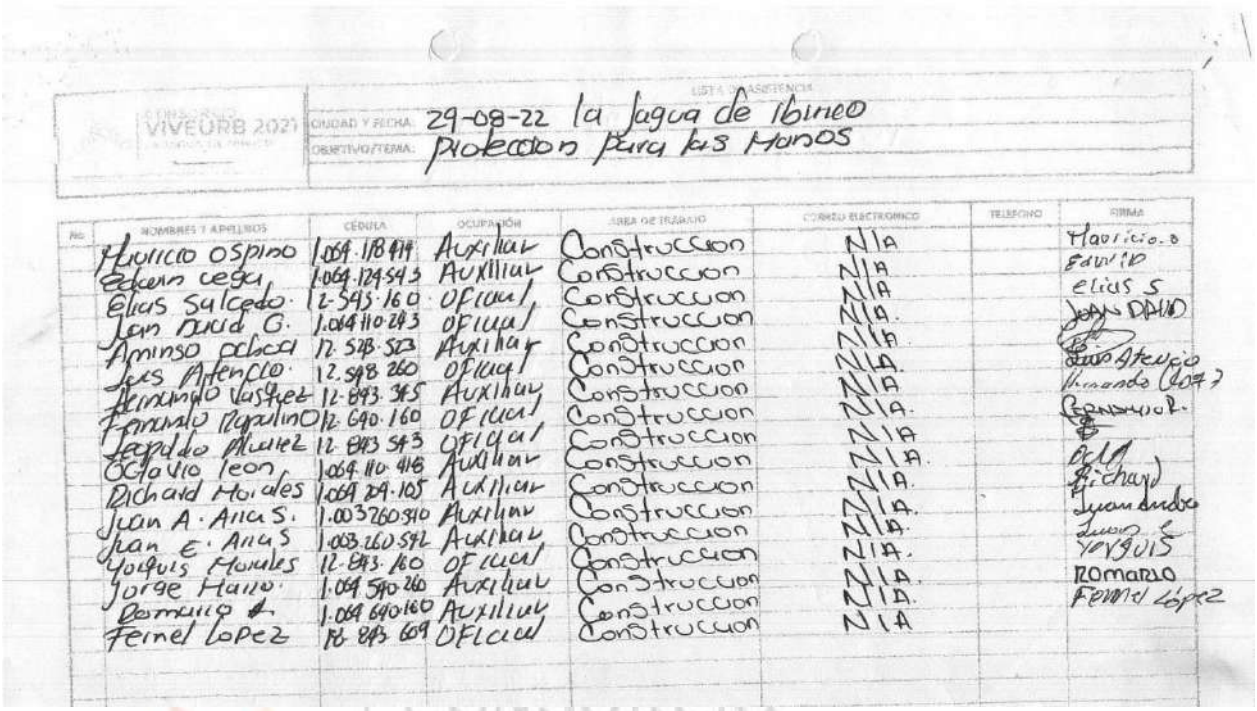


VIVEURB 2021

FECHA Y HORA: 29-08-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Proteccion para las Manos

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio Ospino	1.064.178.419	Auxiliar	Construccion	N/A		Mauricio.o
	Edwin Ceska	1.064.124.543	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias Salcedo	12-543-160	Oficial	Construccion	N/A		elias S
	Juan David G.	1.064.110.243	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso Ochoa	12-543-523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12.548.260	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12-843-345	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (2007
	Fernando Rapalino	12-640-160	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12-843-543	Oficial	Construccion	N/A		
	Octavio Leon	1.064.110.416	Auxiliar	Construccion	N/A		Octa
	Richard Morales	1.064.29.105	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Juan A. Arias S.	1.003.260.340	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan E. Arias	1.003.260.542	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Yorguis Morales	12-843-160	Oficial	Construccion	N/A		YORGUIS
	Jorge Mejia	1.064.540.260	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Romario	1.064.640.160	Auxiliar	Construccion	N/A		Fernel López
	Fernel Lopez	18 843 609	Oficial	Construccion	N/A		

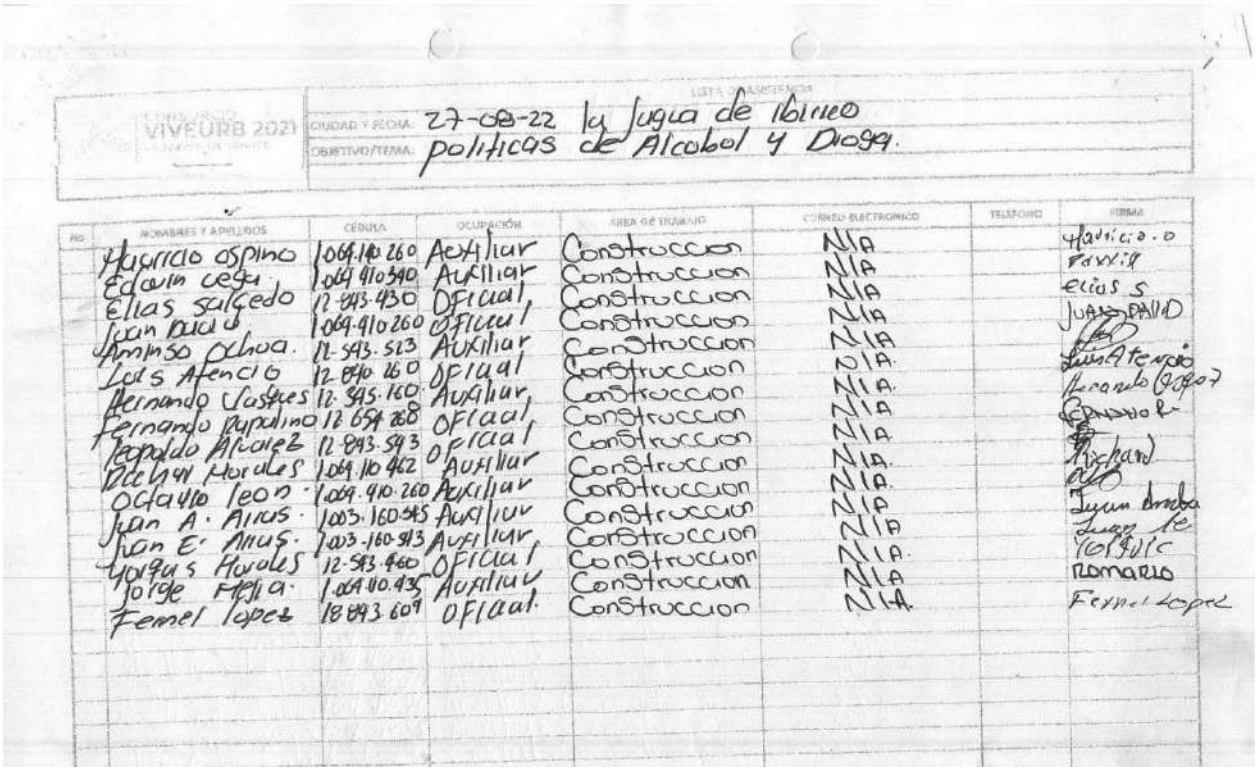

VIVEURB 2021

FECHA Y HORA: 27-08-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: politicas de Alcohol y Drogs.

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	AREA DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Mauricio ospino	1064.140.260	Aexiliar	Construccion	N/A		Mauricio.o
	Edwin ceska	1.064.910.340	Auxiliar	Construccion	N/A		Edwin
	Elias salcedo	12-543-430	Oficial	Construccion	N/A		elias S
	Juan David	1.064.910.260	Oficial	Construccion	N/A		JUAN DAVID
	Aminso Ochoa	12-543-523	Auxiliar	Construccion	N/A		
	Luis Atencio	12-840-160	Oficial	Construccion	N/A		Luis Atencio
	Hernando Vasquez	12-543-160	Auxiliar	Construccion	N/A		Hernando (2007
	Fernando Rapalino	12 654 260	Oficial	Construccion	N/A		
	Leopoldo Alvarez	12-843-543	Oficial	Construccion	N/A		
	Richard Morales	1.064.110.462	Auxiliar	Construccion	N/A		Richard
	Octavio Leon	1.064.910.260	Auxiliar	Construccion	N/A		Octa
	Juan A. Arias	1.003.160.545	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan Andres
	Juan E. Arias	1.003.160.913	Auxiliar	Construccion	N/A		Juan E
	Yorguis Morales	12-543-460	Oficial	Construccion	N/A		YORGUIS
	Jorge Mejia	1.064.110.435	Auxiliar	Construccion	N/A		ROMARIO
	Fernel Lopez	18843 609	Oficial	Construccion	N/A		Fernel Lopez

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.3. Formato de Asistencia Diaria.




CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 01-08-22 La Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Duan Florez	1069.129.123	Auxiliar	07:00 AM	05:00pm	05:00pm	DUVAN Florez
2	Epimenio Herera	36.572.420	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio
3	Sergio Gil	1069.120.315	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
4	Darwin Coicas	1003.123.915	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00 pm	Darwin C
5	Hector Pineda	26.573.916	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Hector
6	Leopoldo Alcaraz	12.529.421	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
7	Octavio Leon	12.526.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
8	Luis Atencio	12.481.230	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
9	Jesus Jurado	1002.410.706	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus
10	Yorgui Morales	1069.114.420	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YORGUIS
11	Jose Camaño	12.523.420	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
12	Jesus Cortes	1069.113.429	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus Cortes
13	Juan Carlos Quintero	1069.116.130	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
14	Juan David Quiroz	1069.120132	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
15	Mauricio Ospino	12.524.413	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
16	Jaider Alfonso Gomez	12.603.420	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaider G.
17	Jaide E. Garcia	1069.109.202	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaime Garcia
18	Jaime Alonso Diaz	12.524.145	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaime. Diaz
19	Edier Fontalvo	1069.110.414	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
20	Luis Juan Rivera	1069.230135	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00 pm	Luis I Rivera

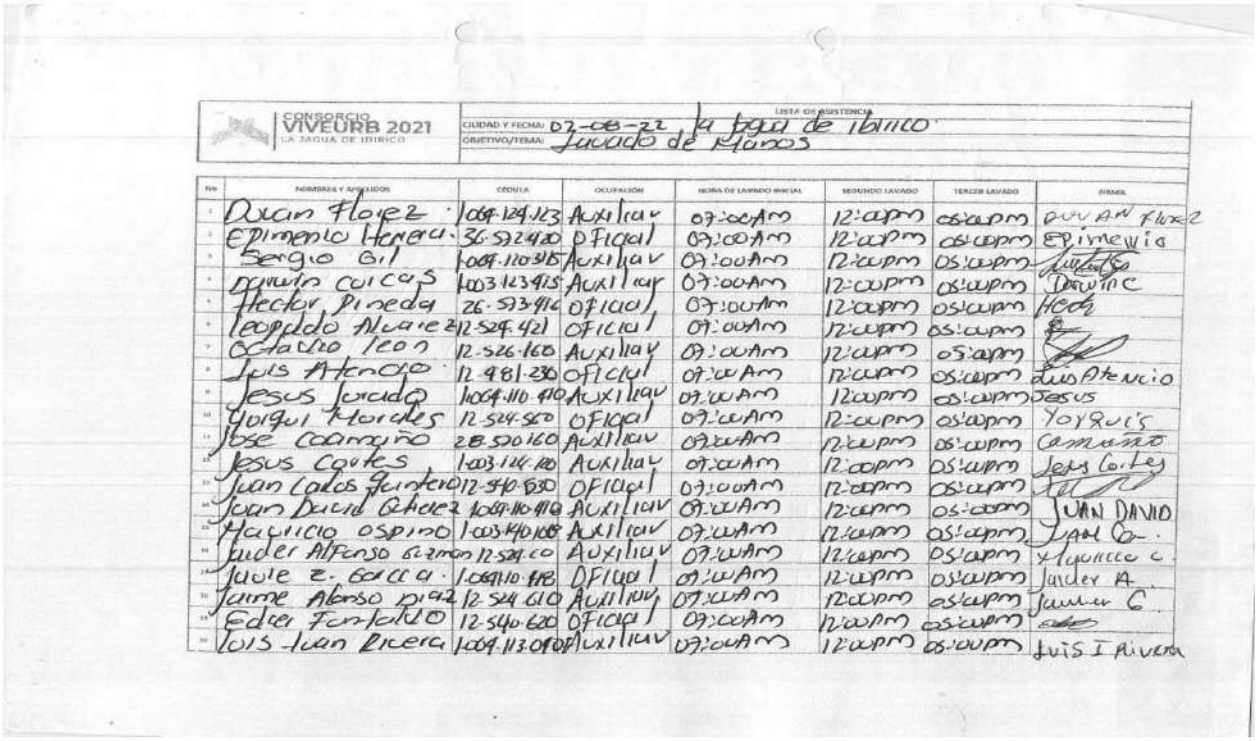

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 02-08-22 La Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Duan Florez	1069.129.123	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DUVAN Florez
2	Epimenio Herera	36.572.420	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio
3	Sergio Gil	1069.120315	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
4	Darwin Coicas	1003.123915	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Darwin C
5	Hector Pineda	26.573.916	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Hector
6	Leopoldo Alcaraz	12.529.421	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
7	Octavio Leon	12.526.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
8	Luis Atencio	12.481.230	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
9	Jesus Jurado	1069.110.410	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus
10	Yorgui Morales	12.524.520	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YORGUIS
11	Jose Camaño	28.520.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
12	Jesus Cortes	1003.114.120	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus Cortes
13	Juan Carlos Quintero	12.540.630	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
14	Juan David Quiroz	1069.110.410	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
15	Mauricio Ospino	1003.140.108	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
16	Jaider Alfonso Gomez	12.524.60	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaider A.
17	Jaide E. Garcia	1069.110.418	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaider A.
18	Jaime Alonso Diaz	12.524.610	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jaime C.
19	Edier Fontalvo	12.540.620	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
20	Luis Juan Rivera	1069.113.010	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis I Rivera

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 03-08-22 la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Ruben Gamez	1.069.110.420	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Ruben G.
2	epimenio Herrera	12.523.430	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Epimenio
3	Yorguis Morales	12.413.610	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	YOYGUIS
4	Johan Arias	1.069.114.340	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Johan Arias
5	Jose cacamuño	12.920.160	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Cacamuño
6	Juan Florez	1.003.124.340	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	JUAN FLOREZ
7	Leopoldo Alvarez	12.541.286	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
8	Ocfadio leon	1.069.108.260	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
9							
10							
11							


CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 04-08-22 la jagua de ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Yider Guarin	1.069.110.410	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Yider Guarin
2	Javier enrique	1.003.426.192	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	JAVIER ENRIQUE
3	Juan David	1.069.104.609	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	JUAN DAVID GM
4	Jaime Diaz	12.524.610	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Jaimeniez
5	Mauricio Espino	12.540.672	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Mauricio.o
6	Dayan Cuicas	1.069.802.410	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Dayan C.
7	Hector pineda	12.524.630	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Hect
8	Luis Atencio	12.408.160	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	LuisAtencio
9	Jesus Jurado	1.069.018.615	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Jesus
10	Leopoldo Alvarez	12.529.605	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
11	ocfadio leon	1.069.110.210	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
12	Yordis Jose Morales	1.069.506.809	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Yordis
13	Yorguis Morales	12.432.410	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Yorguis
14	Eduides Ibañez	12.643.615	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
15	Edier Fontalvo	1.069.110.415	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Edier
16	Ruben Gamez	1.069.110.275	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Ruben G.
17	Johan Arias	1.069.605.172	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Johan Arias
18	Luis E. Rivera	1.069.405.215	Auxiliar	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	Luis E Rivera
19	Juan Carlos Fuentes	12.546.526	Oficial	07:00 AM	12:00 pm	05:00 pm	
20							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

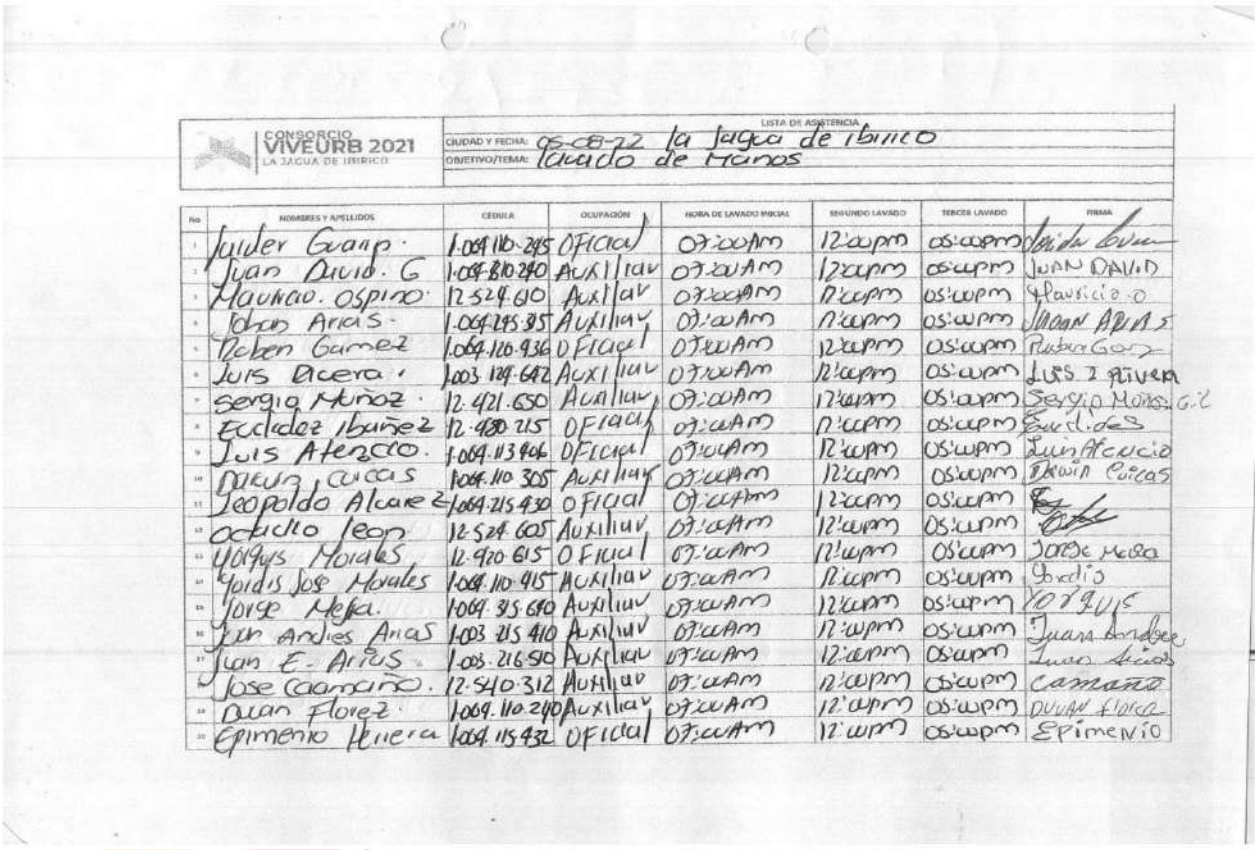

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO


LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 06-08-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Julder Guarp.	1.064.110.295	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
2	Juan David. G	1.064.810.240	AUXILIAR	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
3	Mauricio. Ospino	12.524.610	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Mauricio.O
4	Johan Arias	1.064.295.385	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JOHAN ARIAS
5	Neben Gomez	1.064.120.936	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben Gom
6	Luis Acera	1.003.129.642	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	LUIS J RIVERA
7	Sergio Muñoz	12.421.650	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Sergio Muñoz G.
8	Euclides Ibañez	12.480.215	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Euclides
9	Luis Atencio	1.064.113.906	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
10	Darwin Cuicas	1.064.110.305	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Darwin Cuicas
11	Leopoldo Alcaraz	1.064.215.430	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
12	octavio leon	12.524.605	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
13	Yolyus Morales	12.920.615	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jorge Mejia
14	Yoidis Jose Morales	1.064.110.915	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Yoidis
15	Jorge Mejia.	1.064.315.690	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YOIDIS
16	Juan Andres Arias	1.003.215.410	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Andres
17	Juan E. Arias	1.003.216.590	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
18	Jose Camargo	12.540.312	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camargo
19	Duan Florez	1.064.110.240	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DUVAN FLOREZ
20	Epimenio Herrera	1.064.115.432	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio

LA JAGUA DE IBIRICO

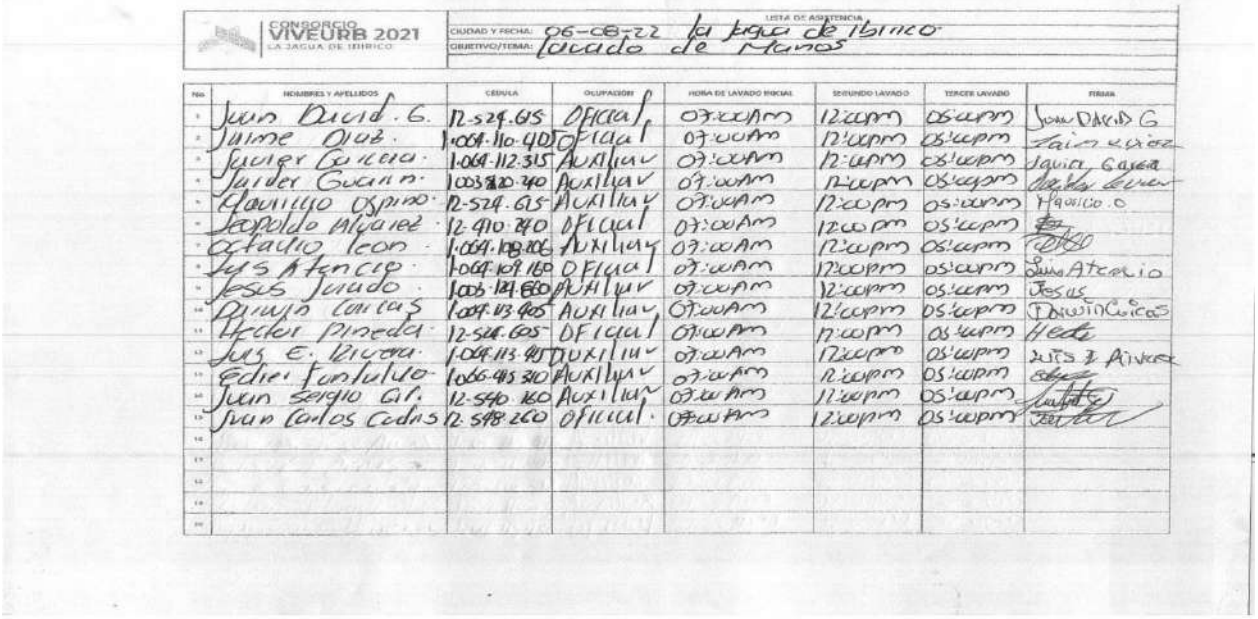

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 06-08-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Juan David. G.	12.524.605	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID G
2	Jaime Diaz.	1.064.110.405	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
3	Javier Garcia	1.064.112.315	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Javier Garcia
4	Javier Guarp.	1.003.820.240	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
5	Mauricio Ospino	12.524.605	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Mauricio.O
6	Leopoldo Alvarez	12.410.240	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
7	Octavio Leon	1.064.108.806	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
8	Luis Atencio	1.064.109.160	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
9	Jesus Jurado	1.003.121.680	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus
10	Darwin Cuicas	1.064.113.905	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DarwinCuicas
11	Heder Pineda	12.526.605	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Heder
12	Luis E. Rivera	1.064.113.907	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	LUIS J RIVERA
13	Edier Fontalvo	1.066.495.310	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
14	Juan Sergio Gil	12.540.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
15	Juan Carlos Cadiz	12.598.260	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
16							
17							
18							
19							
20							

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 08-08-22 la jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Javier Enrique	1064.110.415	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Javier enrique
2	Juan David.	1064.110.415	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID G
3	Leopoldo Alcale 2	1.064.405.826	OFICIAL	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
4	Oclavio Leon	12-547.605	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
5	Jesus Jurado	1.003.129.615	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jesus
6	Hector Pineda	12-540.215	OFICIAL	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Hect
7	Daiwin Colcas	1064.215.460	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Daiwin C
8	Edier Fontalvo	1064.96.210	OFICIAL	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
9	Juan Carlos G.	1.064.110.415	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
10	Fernando Papalino	12-540.160	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
11	Yoidis Jose Morales	12-960.160	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Yoidis
12	Juan E. Arias	1003.410.610	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
13	Yoiquis Morales	12-540.160	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	YOIQUIS
14	Juan A. Arias	1003.410.610	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
15	Jose Camaño	12-540.160	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
16	Jorge Mejia	1064.410.615	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Jorge Mejia
17							
18							

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 10-08-22 la jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Javier Garcia	1064.110.415	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Javier Garcia
2	Juan David.	1064.110.62	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID G
3	Leopoldo Alcalez	12-540.830	OFICIAL	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
4	Oclavio Leon	1.064.113.040	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
5	Jesus Jurado	1.064.110.210	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jesus
6	Hector Pineda	12-950.210	OFICIAL	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Hect
7	Daiwin Colcas	1.064.110.415	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Daiwin C
8	Edier Fontalvo	1064.230.08	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
9	Juan Carlos Fontalvo	12-529.610	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
10	Fernando Papalino	12-610.410	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
11	Yoidis Jose Morales	1064.110.239	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Yoidis
12	Juan Andres Arias	12-540.684	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
13	Yoidis Morales	1064.123.440	OFICIAL	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	YOIQUIS
14	Juan E. Arias	1003.113.880	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
15	Jose Camaño	1064.08.160	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
16	Jorge Mejia	1064.10.230	Auxiliar	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Jorge Mejia
17							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 12-08-22 la jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Javier Garcia.	1064.140.225	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Javier enrique
2	Juan David. G.	1064.140.240	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID G
3	Leopoldo Alcalez	12.524.615	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
4	Octavio leon.	1064.113.040	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
5	Jesus Salcedo	1003.120.215	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jesus
6	Hector pineda,	12.540.615	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Hector
7	Darwin Calcos.	1064.110.495	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
8	Edier Fontalvo.	1064.140.205	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
9	Juan Carlos Pinkero	1064.110.205	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
10	Fernando Pupalino	12.410.685	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
11	Yoidis Jose Montes	1064.145.205	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jordis
12	Juan E. Arnus.	1003810.625	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arnus
13	Yoiguis Montes	12.540.862	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	YOYGUIS
14	Juan A. Arnus	1.003.910.140	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arnus
15	Jose Camaño	12.405.205	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
16	Jorge Mejia.	12.802.160	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JORGE MEJIA
17							
18							
19							

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 13-08-22 la jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Ivan Rivera	1064.110.415	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis I Rivera
2	Edier Fontalvo.	1003.915.205	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Edier
3	Juan Carlos Pinkero	12.524.605	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
4	Leopoldo Alcalez	12.682.915	Oficial	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
5	Octavio leon.	1064.110.205	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
6	Luis Atencio.	12.915.405	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
7	Duan Florez	1003.120.105	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DUVAN FLOREZ
8	Epimenio Herrera	12.410.215	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio
9	Mauro ospino	1064.113.405	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Mauricio.O
10	Juan David. G.	1064.088.205	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
11	Javier Enrique	1064.405.680	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Javier enrique
12	Juan A. Arnus.	1003.129.615	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arnus
13	Yoidis Jose Montes	12.860.120	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Yo-dis
14	Jose Camaño.	12.450.210	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
15	Juan E. Arnus.	1003.429.615	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan e
16	Jorge Mejia.	1064.432.008	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JORGE MEJIA
17							
18							

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 17-08-22 la Jagua de Ibirico.
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Juan Rivera	1.064.410.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis F Rivera
2	Edier Fontalvo	1.069.610.280	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
3	Juan Carlos Quintero	12.540.615	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
4	Leopoldo Alvarez	12.430.160	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
5	Octavio Leon	12.430.260	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
6	Luis Atencio	12.586.120	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
7	Duan Florez	1003.129.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	DUAN FLOREZ
8	Epimenio Herrera	12.425.408	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Epimenio
9	Mauricio Ospino	1.069.108.903	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Mauricio.O
10	Juan David G.	1.069.108.910	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
11	Javier Garcia	1.069.209.106	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Javier Garcia
12	Juan A. Arias	1.003.129.660	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
13	Yordis Morales	1.069.100.240	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Yordis
14	Jose Caamaño	12.529.610	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Caamaño
15	Juan E. Arias	1003 129.610	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan E
16	Jorge Mejia	1.069.106.820	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jorge Mejia
17							


CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 29-08-22, la Jagua de Ibirico
OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Luis Rivera	1.064.106.402	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis Rivera
2	Edwin vega	1.069.208.902	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
3	Juan Carlos Quintero	1.069.290.240	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
4	Leopoldo Alvarez	12.584.610	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
5	octavio leon	12.610.493	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
6	Luis Atencio	12.410.843	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Luis Atencio
7	Duan Florez	1003.129.610	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	DUAN FLOREZ
8	Epimenio Herrera	12.430.246	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Epimenio
9	Mauricio ospino	1.069.108.624	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Mauricio.O
10	Juan David G.	1.069.109.926	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID G
11	Javier Garcia	1.069.106.926	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Javier Garcia
12	Amaso ochoa	12.430.160	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
13	Juan A. Arias	1.003.141.610	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
14	Yordis Morales	1.64.124.608	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Yordis
15	Jose caamaño	12.430.624	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Caamaño
16	Juan E. Arias	1.069.110.910	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan E
17	Jorge Mejia	12.524.610	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jorge Mejia
18							

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

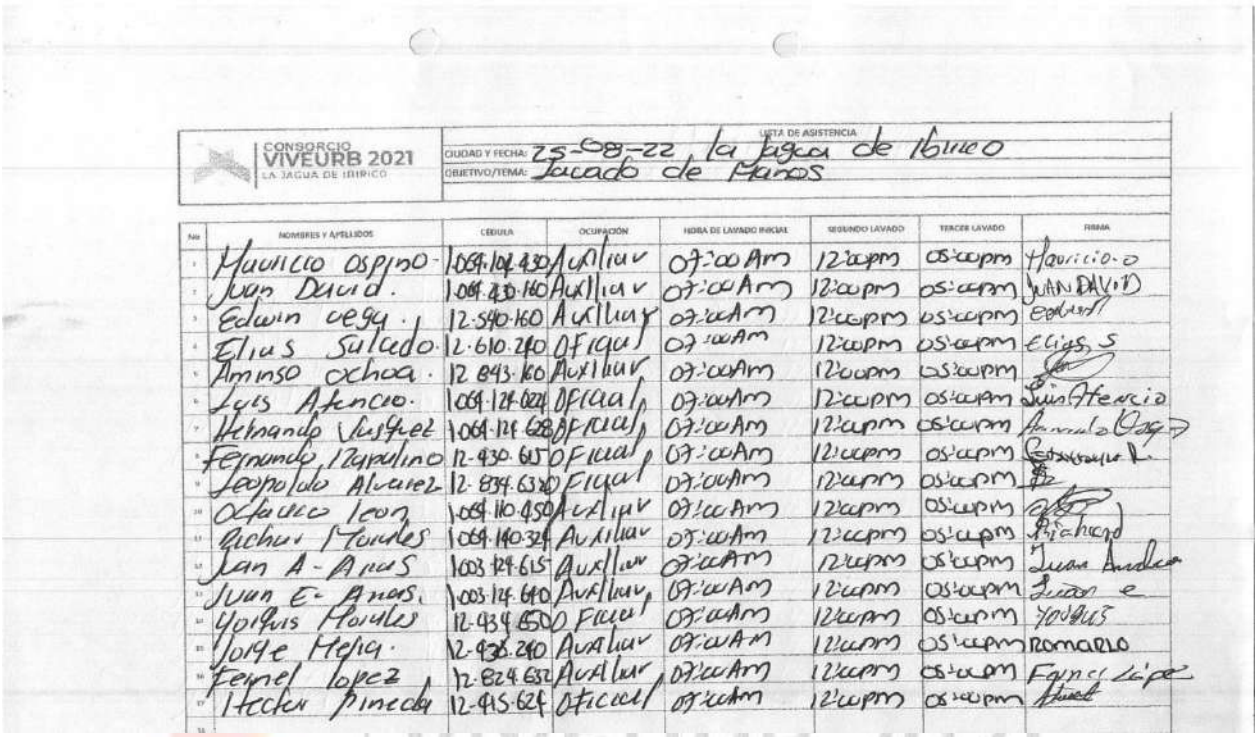


CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 25-08-22 la jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Mauricio Ospino	1.069.104.432	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Mauricio.o
2	Juan David.	1.069.430.160	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
3	Edwin vega.	12.540.160	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Edwin
4	Elias Salcedo	12.610.240	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Elias S
5	Aminso ochoa.	12 893 160	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
6	Luis Atencio.	1.069.124.024	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	LuisAtencio
7	Hernando Vasquez	1.069.124 628	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Hernando Vasq
8	Fernando Napolino	12-930 665	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
9	Leopoldo Alvarez	12. 834.6320	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
10	Octavio leon	1.069.110.450	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
11	Richar Morales	1.069.140.324	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Richard
12	Juan A-Arias	1.003.129.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Andres
13	Juan E. Arias.	1.003.129.640	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan e
14	Yorgus Morales	12-934 6500	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Yorgus
15	Jorge Mejia.	12-936.240	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Romario
16	Fernel lopez	12-824 632	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernel Lópe
17	Hector Pineda	12-915-624	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	

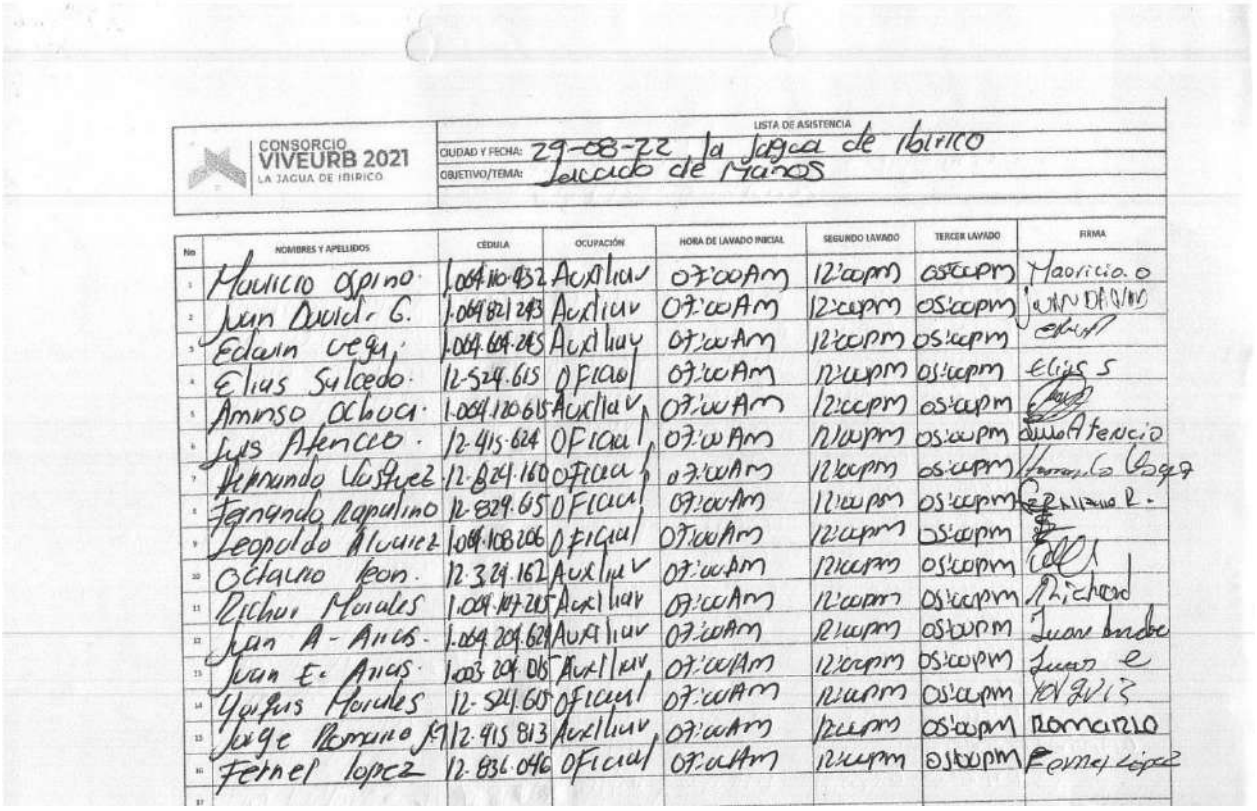

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

LISTA DE ASISTENCIA


CIUDAD Y FECHA: 29-08-22 la Jagua de Ibirico

OBJETIVO/TEMA: Lavado de Manos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACIÓN	HORA DE LAVADO INICIAL	SEGUNDO LAVADO	TERCER LAVADO	FIRMA
1	Mauricio Ospino	1.069.110.432	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Mauricio.o
2	Juan David. G.	1.069.821.243	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	JUAN DAVID
3	Edwin vega.	1.069.669.285	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	edwin
4	Elias Salcedo	12-524.615	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Elias S
5	Aminso ochoa	1.069.120.615	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
6	Luis Atencio.	12-915-624	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	LuisAtencio
7	Hernando Vasquez	12-824.160	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Hernando Vasq
8	Fernando Napolino	12-829.665	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
9	Leopoldo Alvarez	1.069.108.206	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
10	Octavio leon.	12.324.162	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
11	Richar Morales	1.069.107.205	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Richard
12	Juan A-Arias.	1.069.209.624	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Andres
13	Juan E. Arias.	1.003.209.065	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan e
14	Yorgus Morales	12-524.665	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Yorgus
15	Jorge Romero M	12.915 813	Auxiliar	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Romario
16	Fernel lopez	12-836.046	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernel Lópe
17							

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.4. Condiciones Seguras de Trabajo.

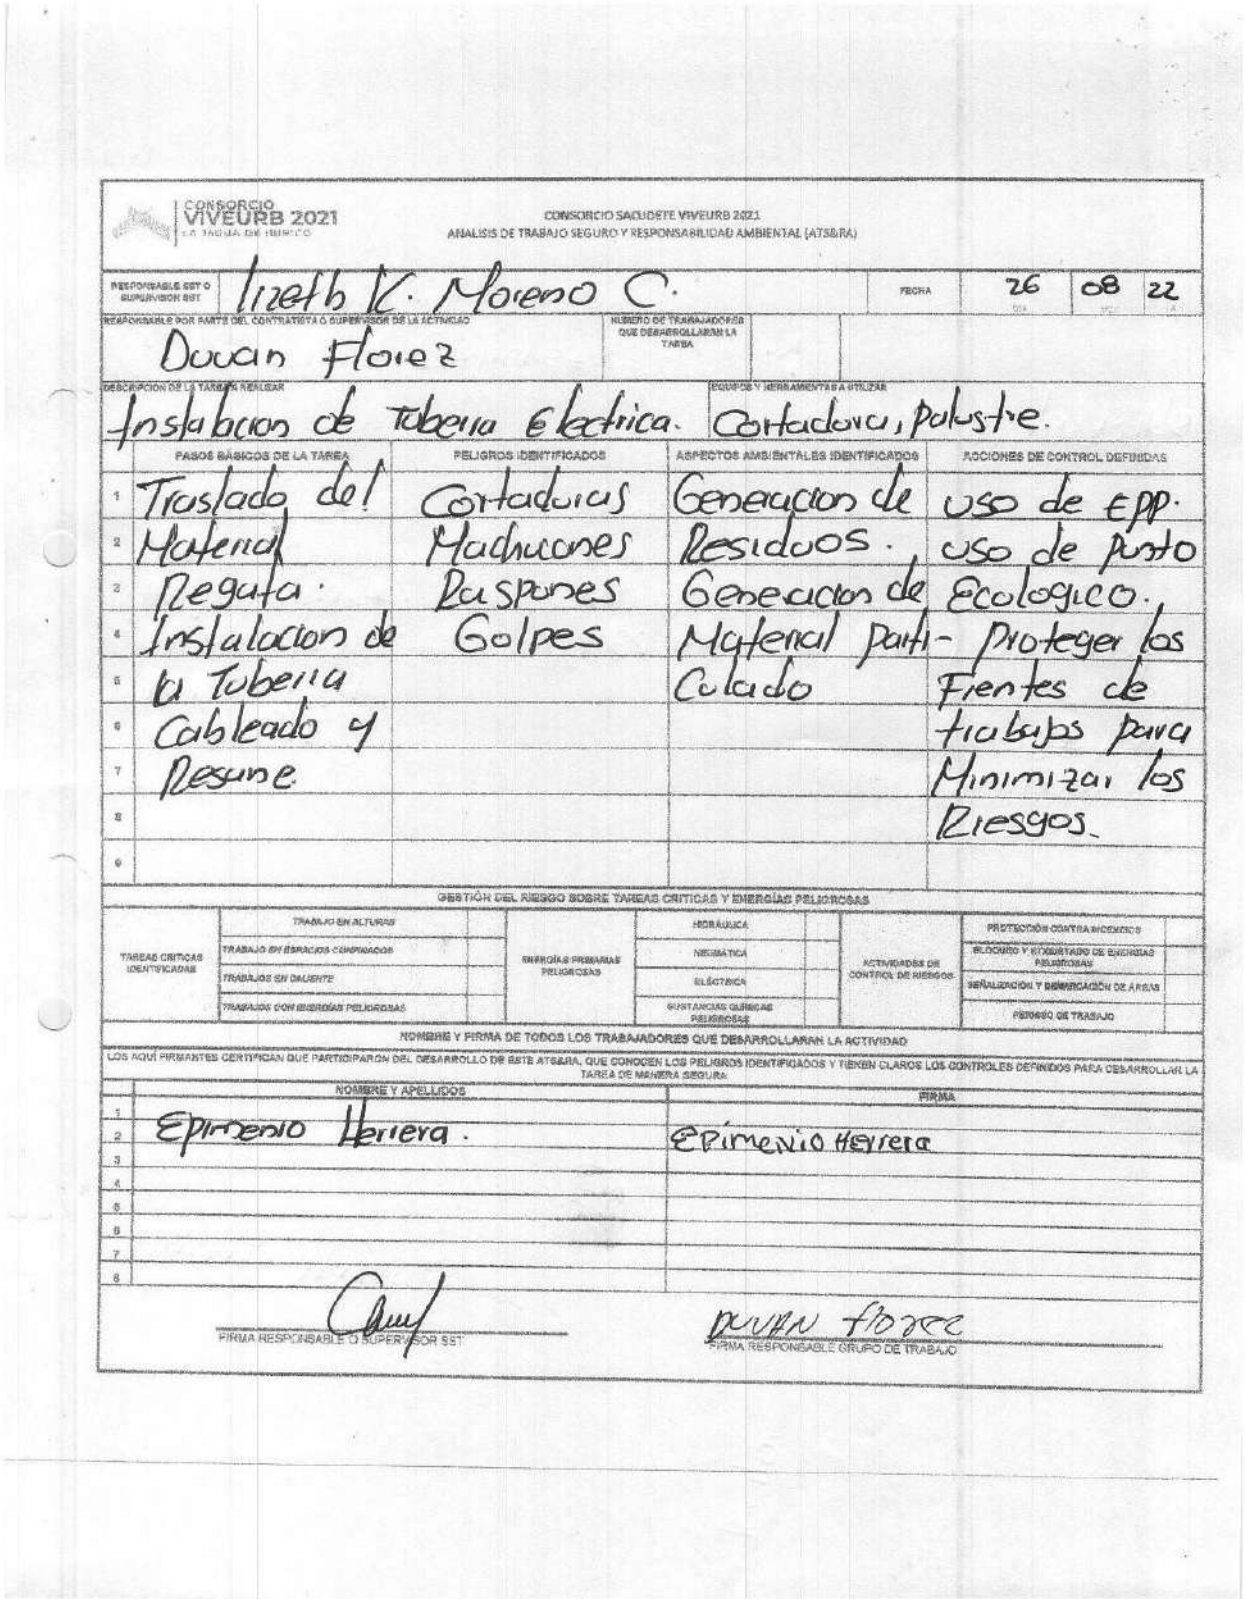

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISION SST	Lineth V. Moreno C.	FECHA	26	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Duvan Florez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA			
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Instalacion de Tuberia Electrica.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Cortadora, Pulustre.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado del Material Regata. Instalacion de la Tuberia Cableado y Resane	Cortaduras Machucones Raspones Golpes	Generacion de Residuos. Generacion de Material parti- Colado	uso de EPP. uso de punto Ecologico. Proteger los Frentes de trabajos para Minimizar los Riesgos.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Epimenio Herrera.	Epimenio Herrera
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

DUVAN FLOREZ
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

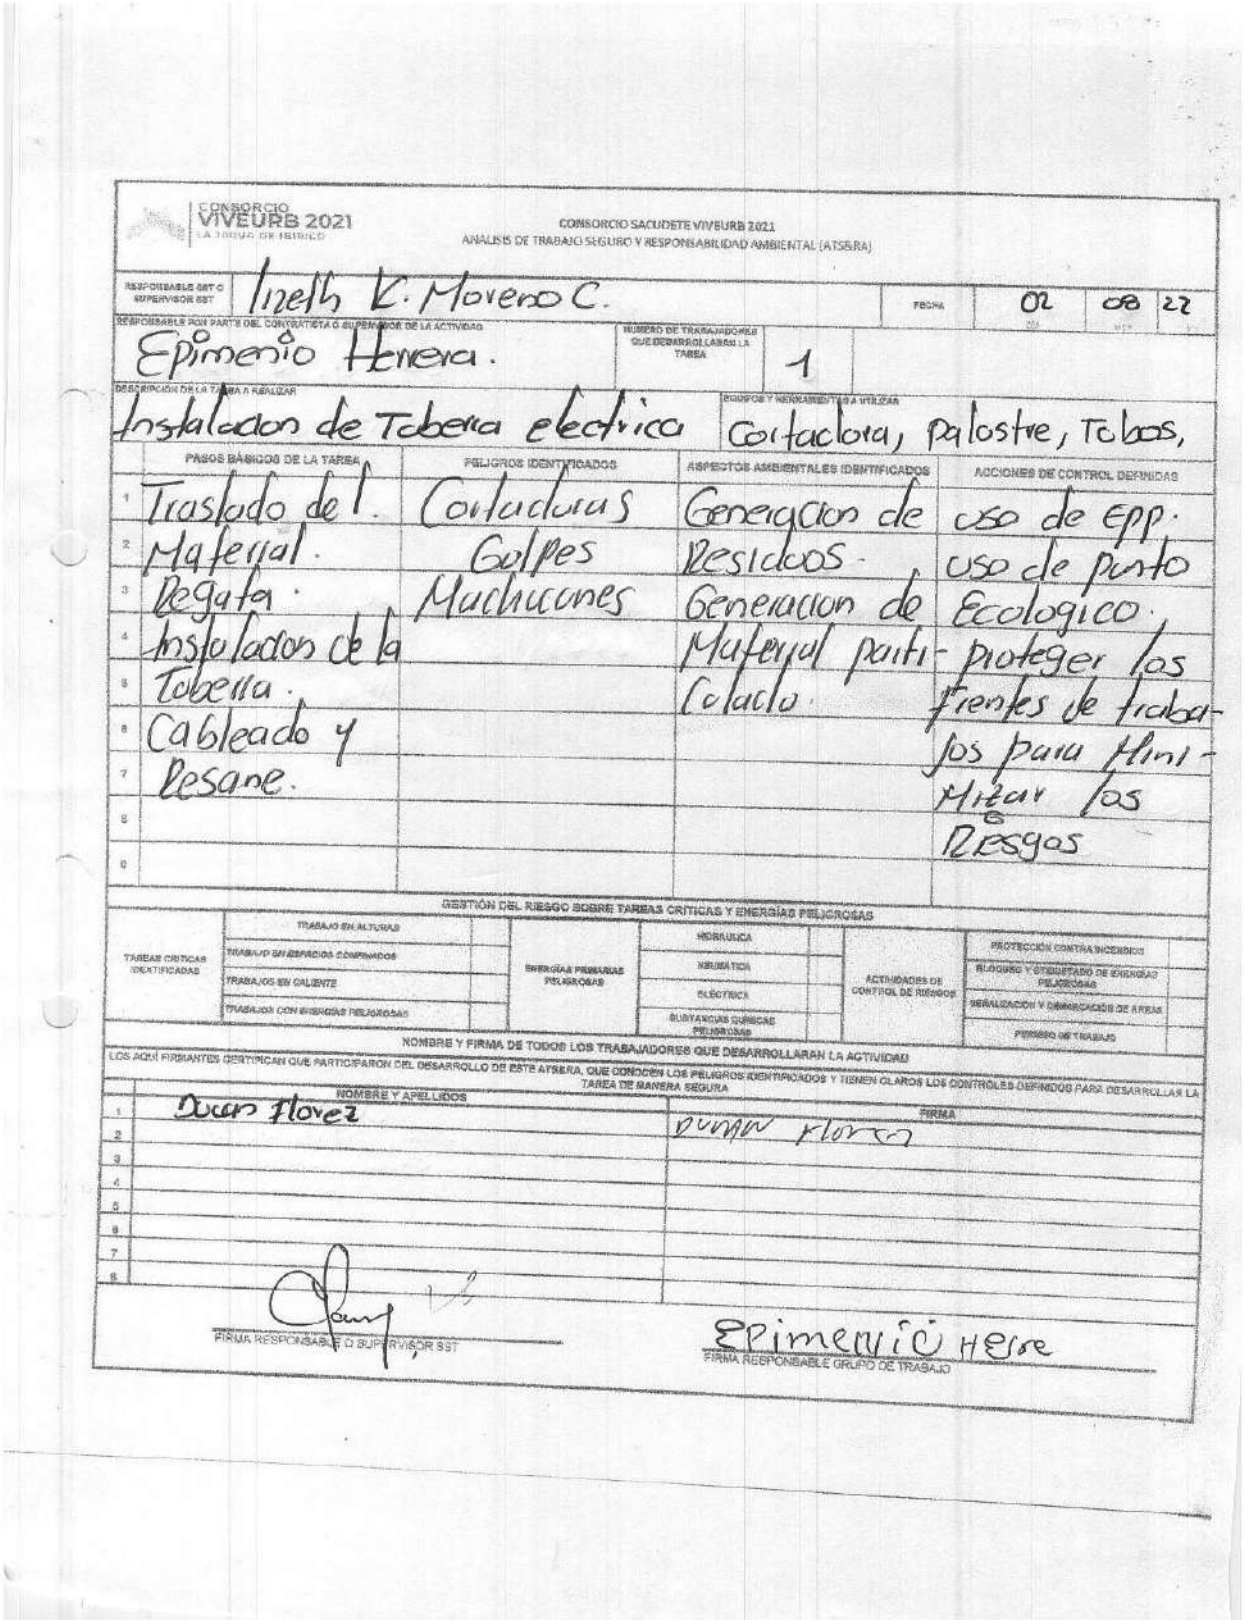

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Ineth K. Moreno C. | FECHA: 02 08 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA DE LA ACTIVIDAD: Epimenio Herera. | NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de Tobera electrica | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Cortadora, Palostre, Tobos,

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado del Material.	Cortaduras Golpes Machucones	Generacion de Residuos. Generacion de Material particulado.	uso de EPP. uso de punto Ecologico. proteger los frentes de trabajos para minimizar los Riesgos
2	Regata.			
3	Instalacion de la Tobera.			
4	Cableado y Resane.			
5				
6				
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Juan Florez	Juan Florez
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Epimenio Herera
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

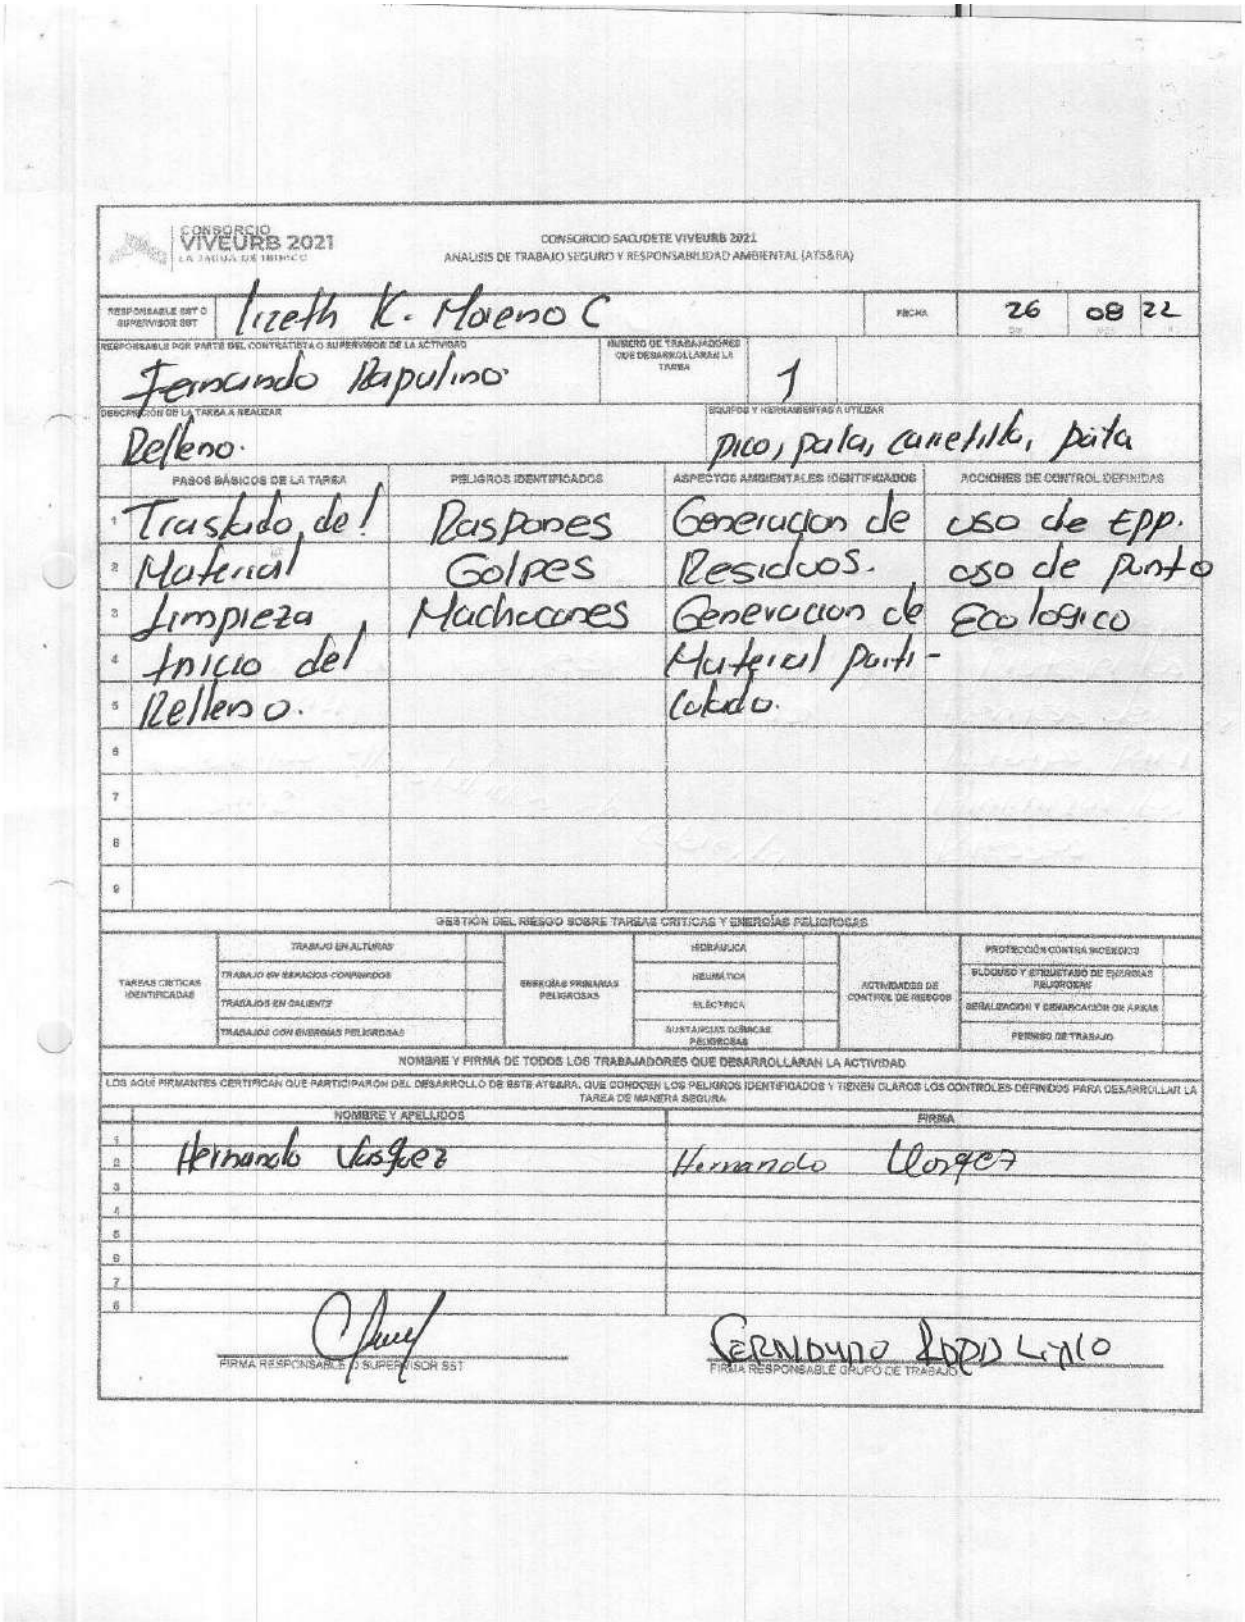

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C — FECHA: 26 08 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Fernando Bapulino — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Relleno. — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pico, pala, canetilla, pala

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado de!	Raspones	Generacion de	uso de EPP.
2	Material	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	limpieza	Machacones	Generacion de	Ecologico
4	Inicio del		Material parti-	
5	Relleno.		culado.	
6				
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Hernando Vasquez	Hernando Vasquez
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Fernando Bapulino
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

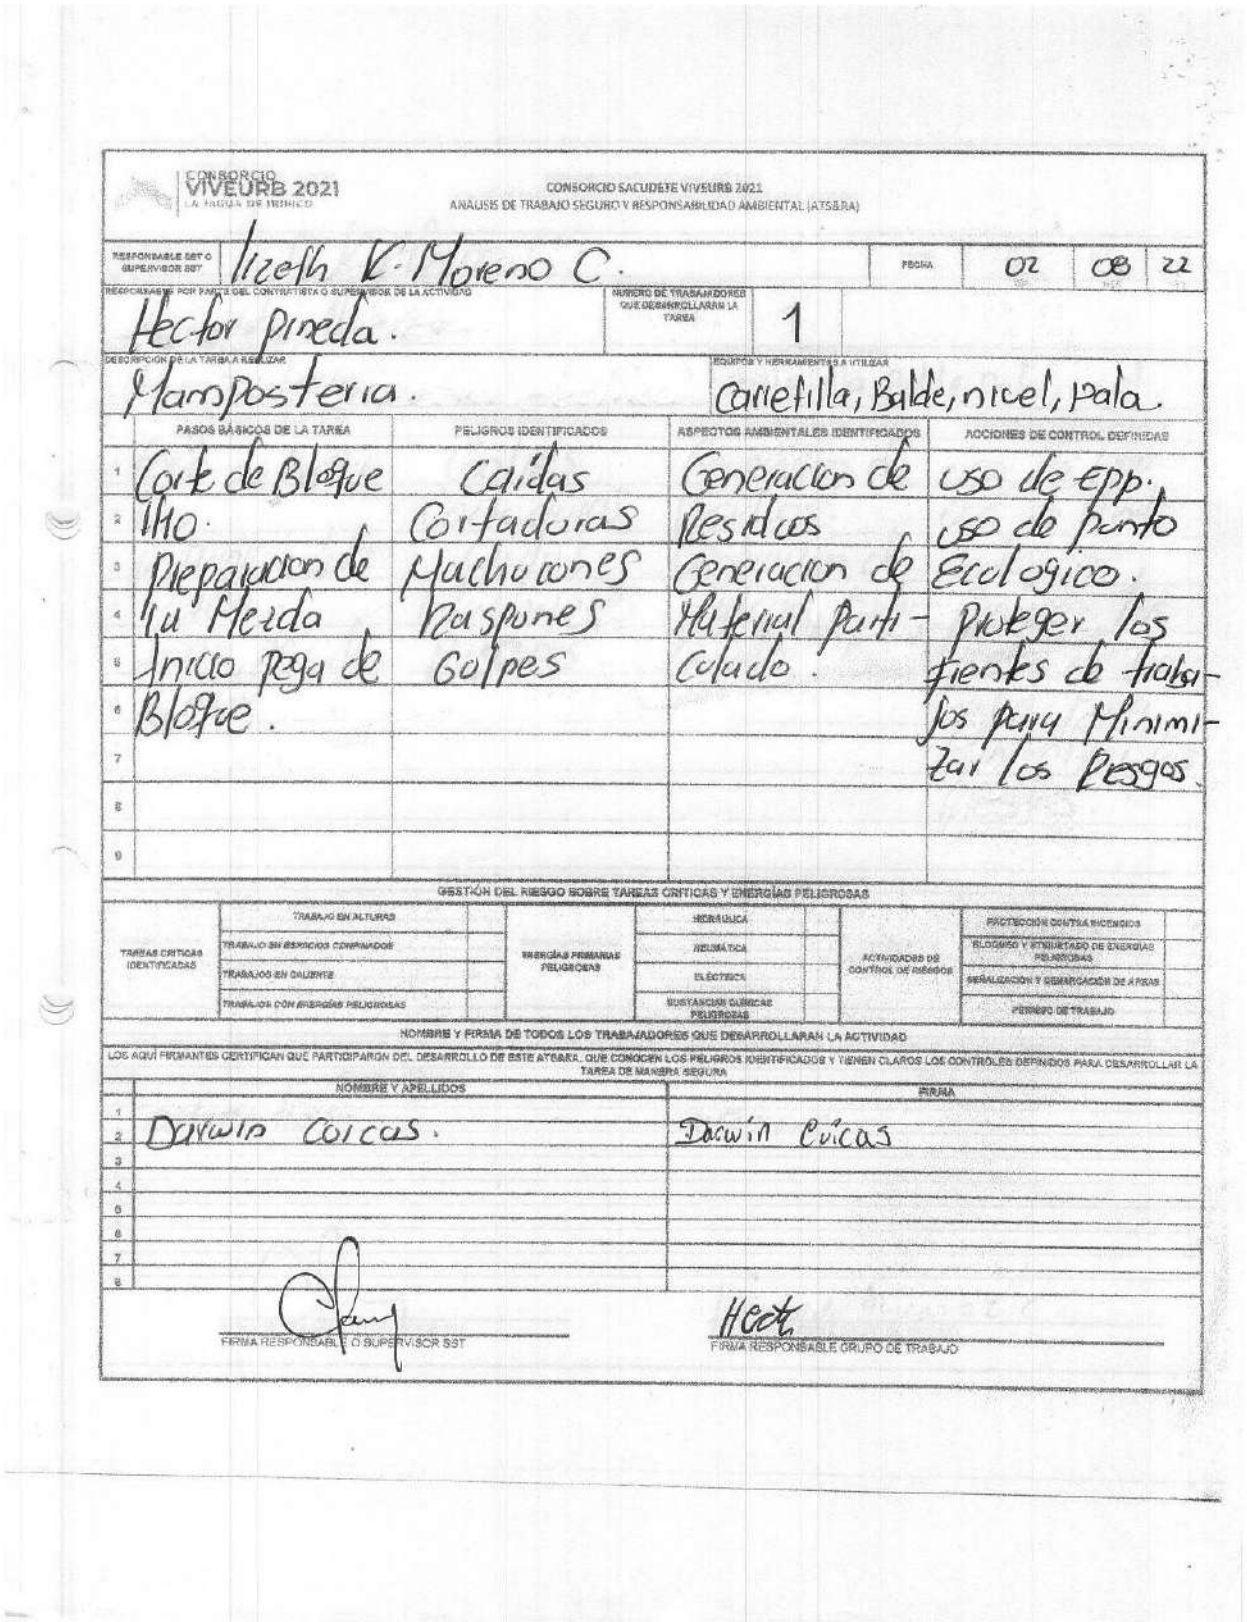

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C. | FECHA: 02 08 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Hector Pineda. | NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Carretilla, Balde, nivel, Pala.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	Uso de epp.
2	Rho.	Cortaduras	Residuos	Uso de punto
3	Preparacion de	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezda	Raspones	Material parti-	Proteger los
5	Inicio pega de	Golpes	culado.	frentes de trabaj-
6	Bloque.			os para Minimi-
7				zar los Riesgos.
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO SIN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Darwin Colcas.	Darwin Colcas
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

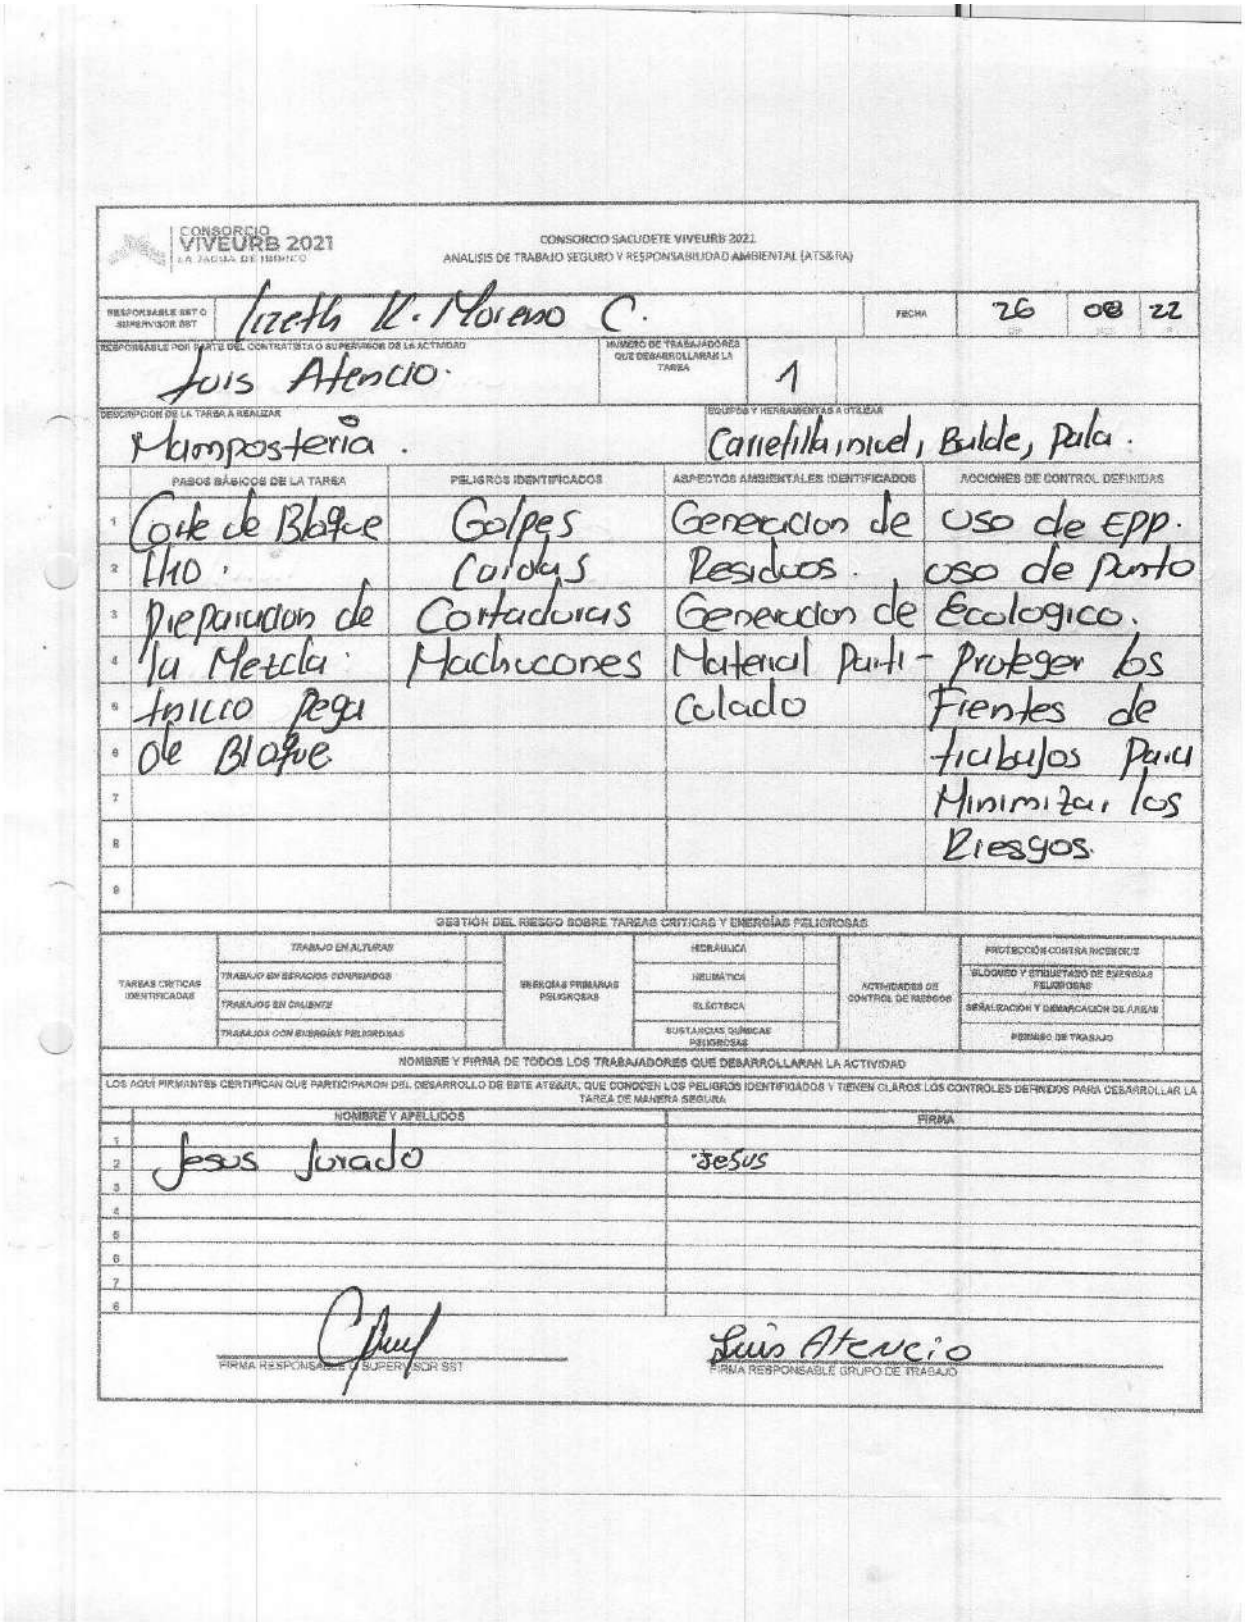

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth M. Moreno C.	FECHA	26	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Luis Atencio.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, nivel, Balde, Pala.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Blogue	Golpes	Generacion de	Uso de EPP.
2	Lllo.	Caidas	Residuos.	Uso de Punto
3	Preparacion de	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezcla.	Machucones	Material Partl-	Proteger los
5	Apicco pega		Colado	Frentes de
6	de Blogue			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Jesus Jurado	Jesus
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Luis Atencio
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

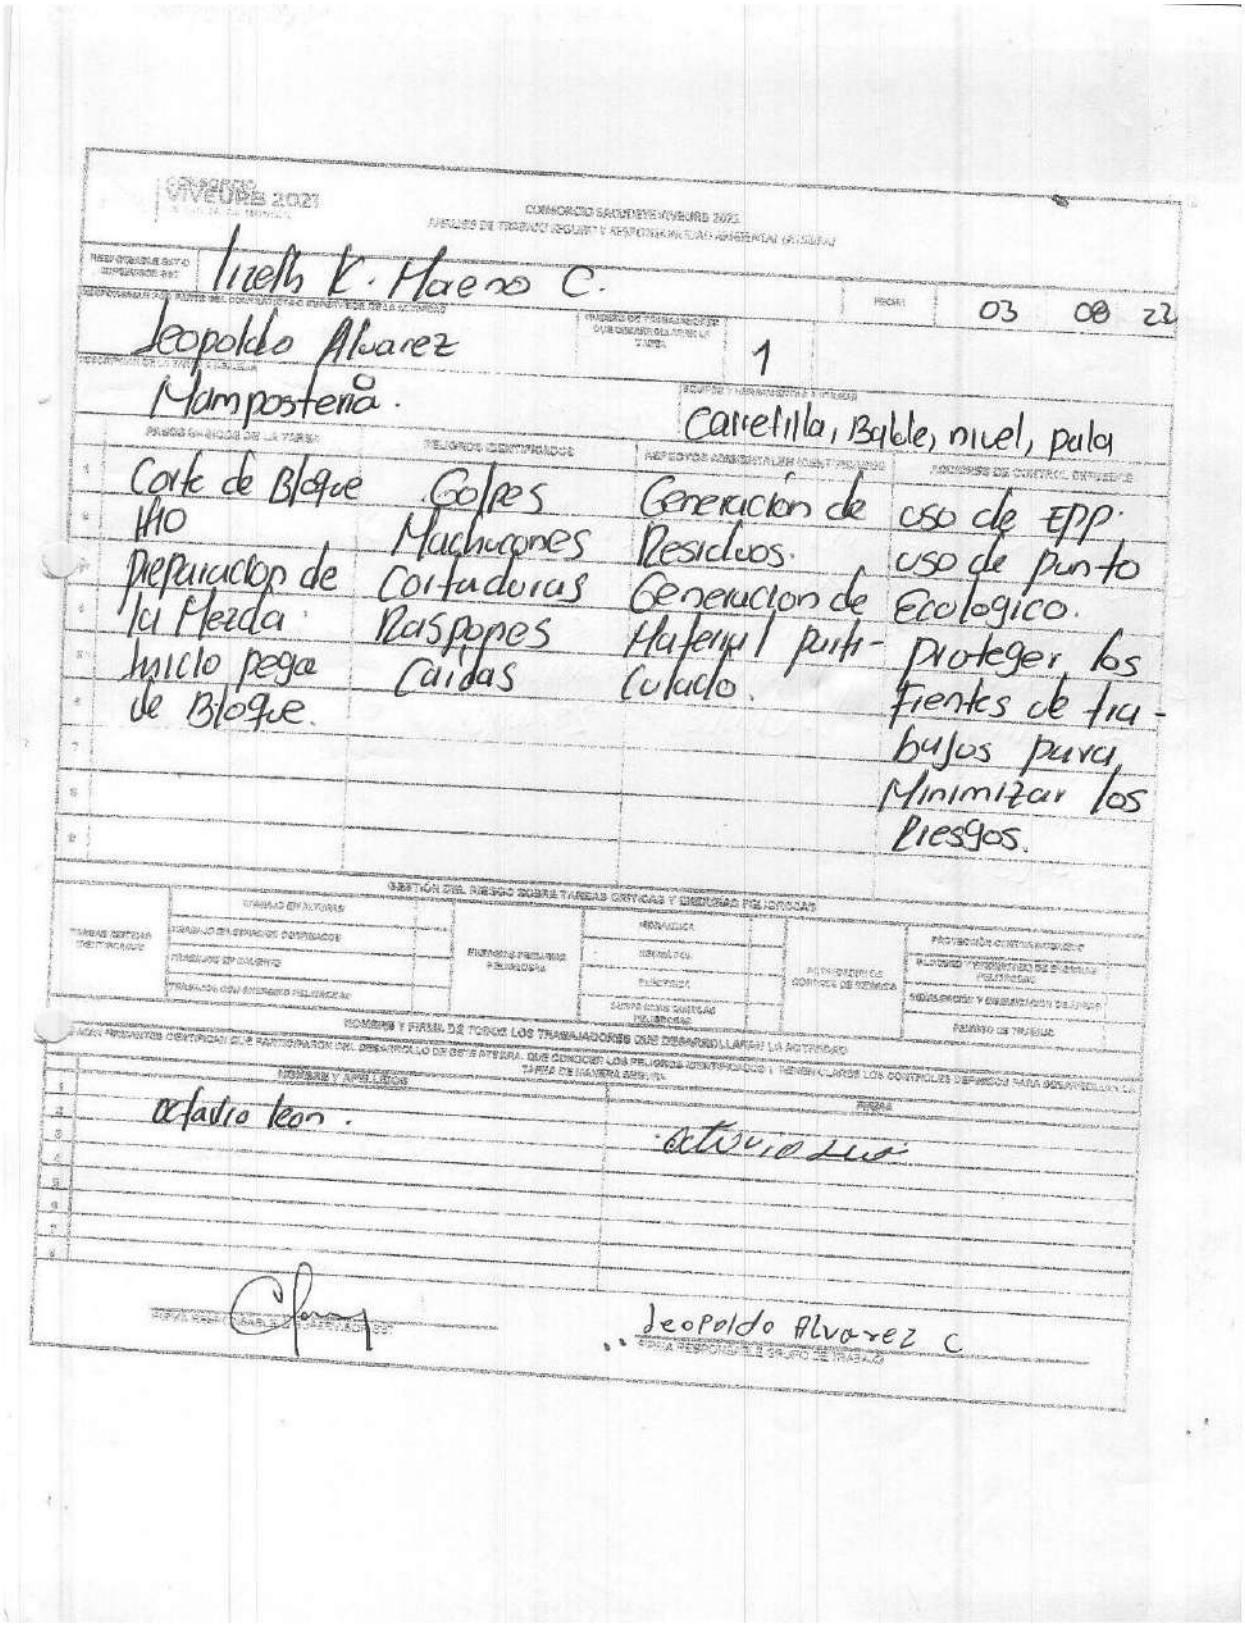

CONSORCIO VIVEURB 2021

Liseth K. Moreno C.

FECHA: 03 08 22

Leopoldo Alvarez

1

Mamposteria.

Carretilla, Balde, nivel, pala

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS CONTENIDOS	RIESGOS ASOCIADOS	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
H10	Machacones	Residuos.	uso de punto
Preparacion de	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
la Mezda.	Raspones	Material	Proteger los
Inicio pega	Caidas	Caido.	frentes de tra-
de Bloque.			bajos para
			Minimizar los
			Riesgos.

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRÍTICAS Y ENTORNO PELIGROSO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARÁN LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	Catastro Leon.	
2		
3		
4		
5		
6		

Leopoldo Alvarez C.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSSRA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K - Moreno C.	FECHA	26	08	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Carlos Espinoza.	1.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Mamposteria	Carretilla, Balde, nivel, pala.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortaduras	Generacion de	Uso de EPP,
2	H20.	Golpes	Residuos.	Uso de Punto
3	Preparacion de	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	la Mezcla.	Resporses	Material para	Proteger los
5	Inicio pega de	Caidas	Colado.	Frentes de
6	Bloque			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSSRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Carlos Ramirez	Carlos Ramirez
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

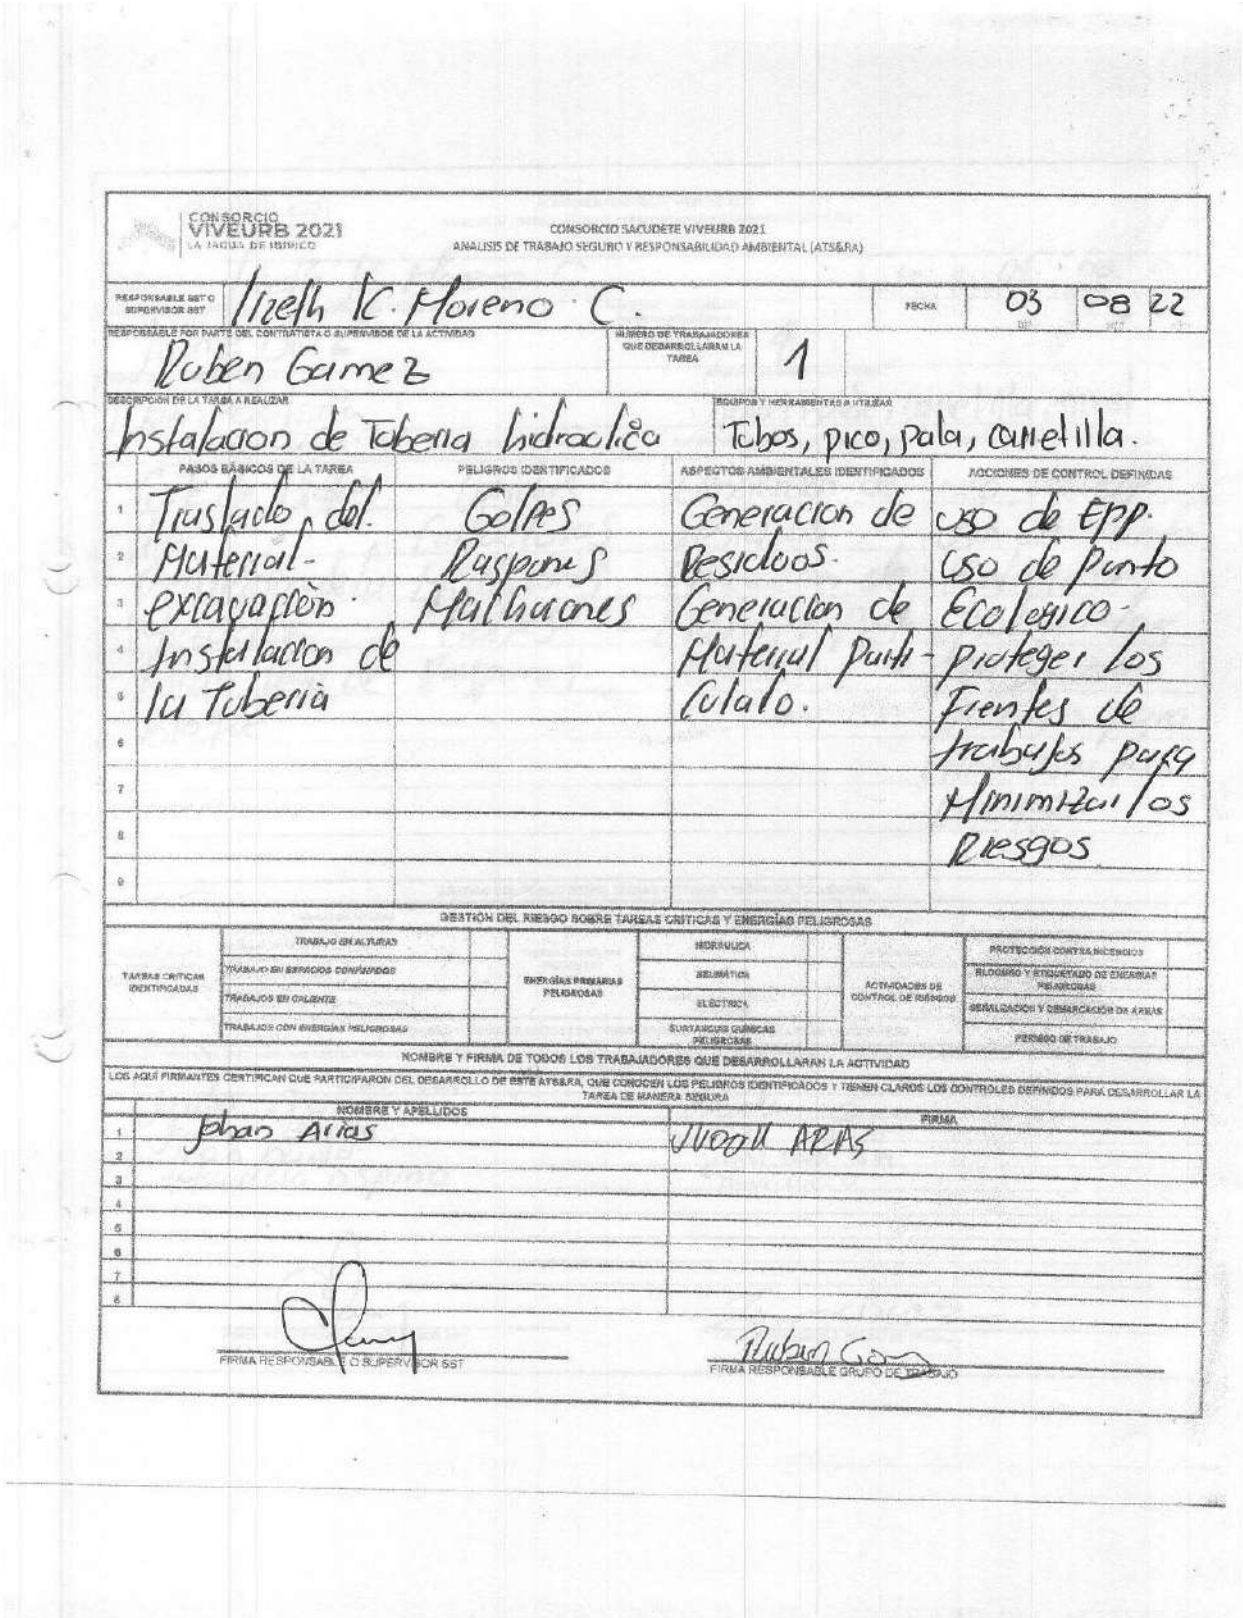

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Ineth C. Moreno C.	FECHA	03	08	22
			DD	MM	AA

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Ruben Gamez	1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Instalacion de Tuberia hidraulica	Tubos, pico, pala, carretilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado del	Golpes	Generacion de	Uso de Epp.
2	Material-	Raspones	Residuos.	Uso de Punto
3	excavacion.	Magulladuras	Generacion de	Ecologico.
4	Instalacion de		Material Punti-	Proteger los
5	la Tuberia		culado.	Frentes de
6				trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Johan Arias	Johan Arias
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	29	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Javier Brito	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1				
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Hormosteria	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, pala, cinta, nivel.				

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de EPP.
2	Uso.	Cortaduras	Residuos.	Uso de Punto
3	Preparacion de	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezcla	Lasiones	Material Particulado	Proteger los
5	Inicio pega de			Frentes de
6	Bloque.			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Elkin Mendoza Brito	Elkin mendoza
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

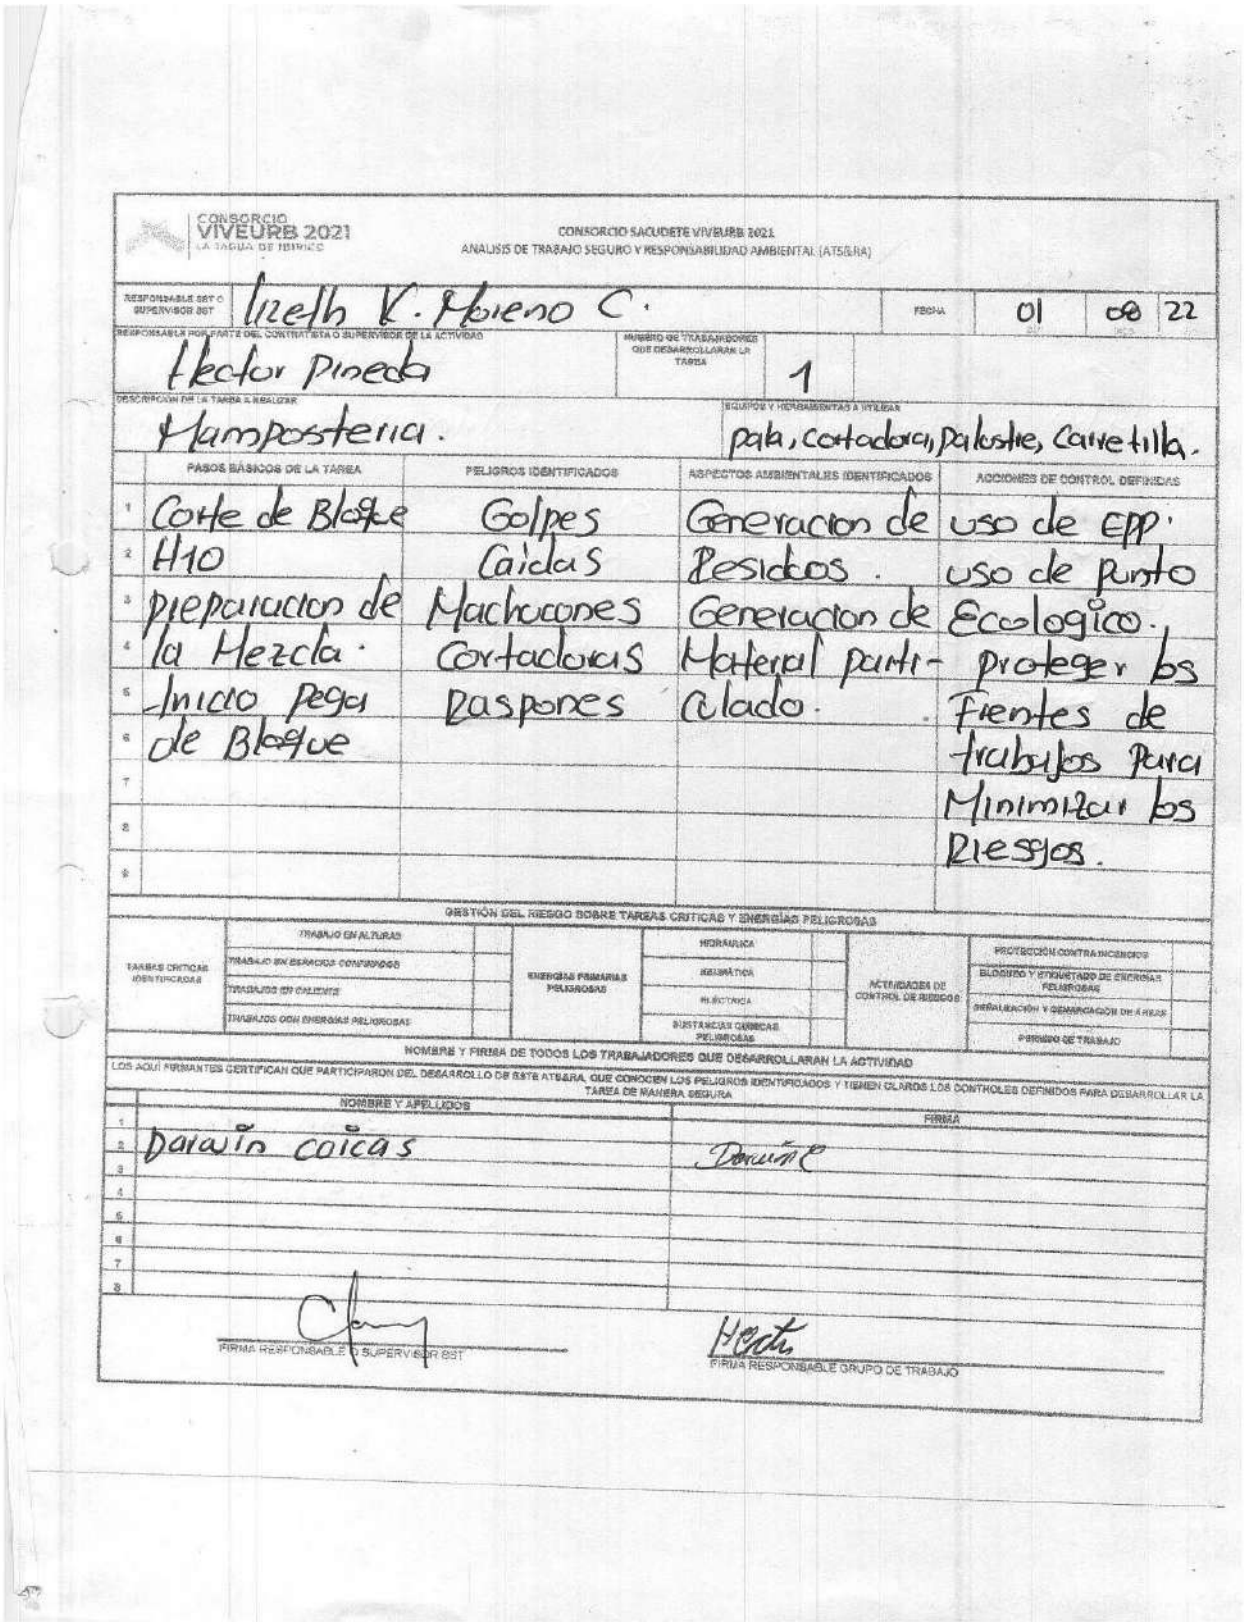

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Ineth V. Moreno C. | FECHA: 01 / 08 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Hector Pineda | NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Hamposteria. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, cortadora, palustre, carretilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	H10	Caidas	Residuos.	uso de punto
3	preparacion de	Machacones	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezcla.	Cortaduras	Material parti-	proteger los
5	Inicio pega	Raspones	culado.	frentes de
6	de Bloque			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		DELIMITACION Y DEMARCACION DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Darwin Calcas	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

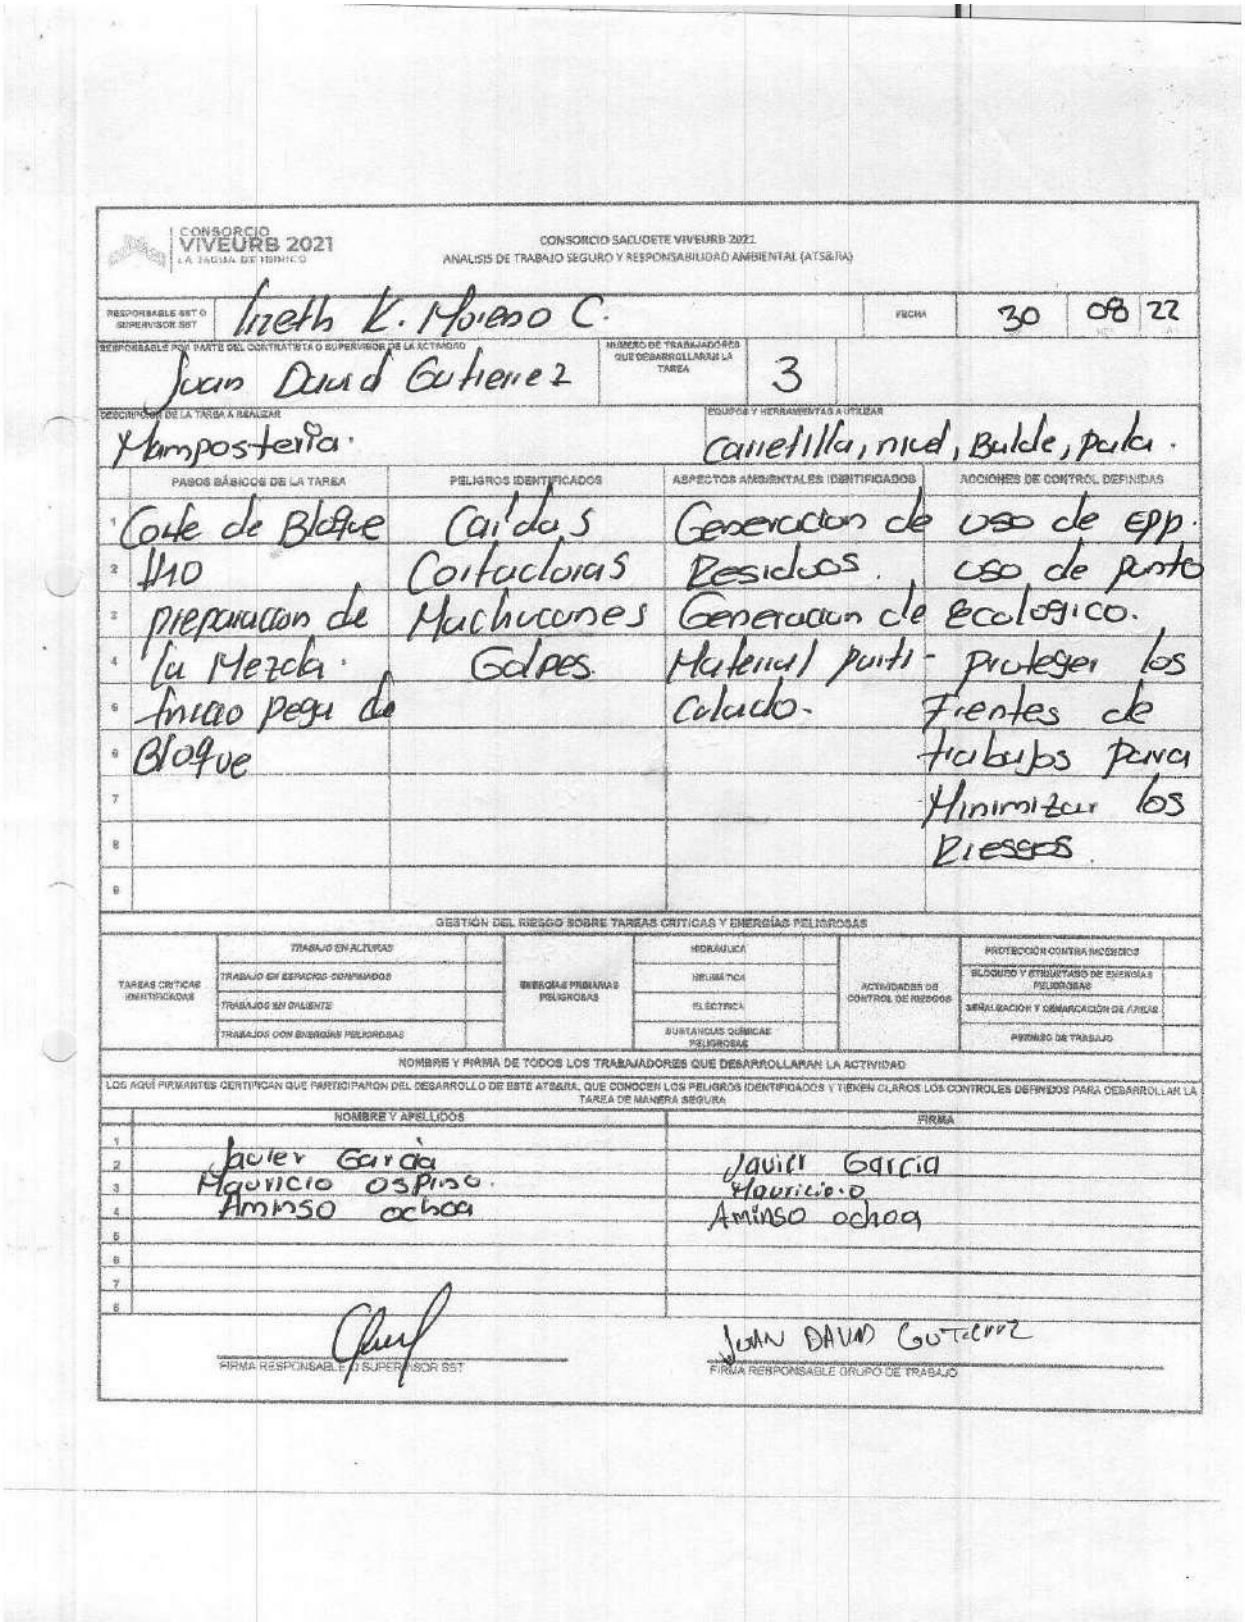

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SALUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lineth K. Moreno C.	FECHA	30	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Juan David Gutierrez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	3		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Mamposteria.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, nivel, Balde, Pala.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de EPP.
2	#10	Cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	preparacion de	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezcla.	Golpes.	Material punti-	Proteger los
5	Inicio pega de		calado.	Frentes de
6	Bloque			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS			ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS		
	TRABAJO EN ALTURAS			HIDRAULICA			PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			NEUMATICA			BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA			SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Javier Garcia	Javier Garcia
3	Mauricio Ospino.	Mauricio.o
4	Aminso ochoa	Aminso ochoa
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

JUAN DAVID GUTIERREZ
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

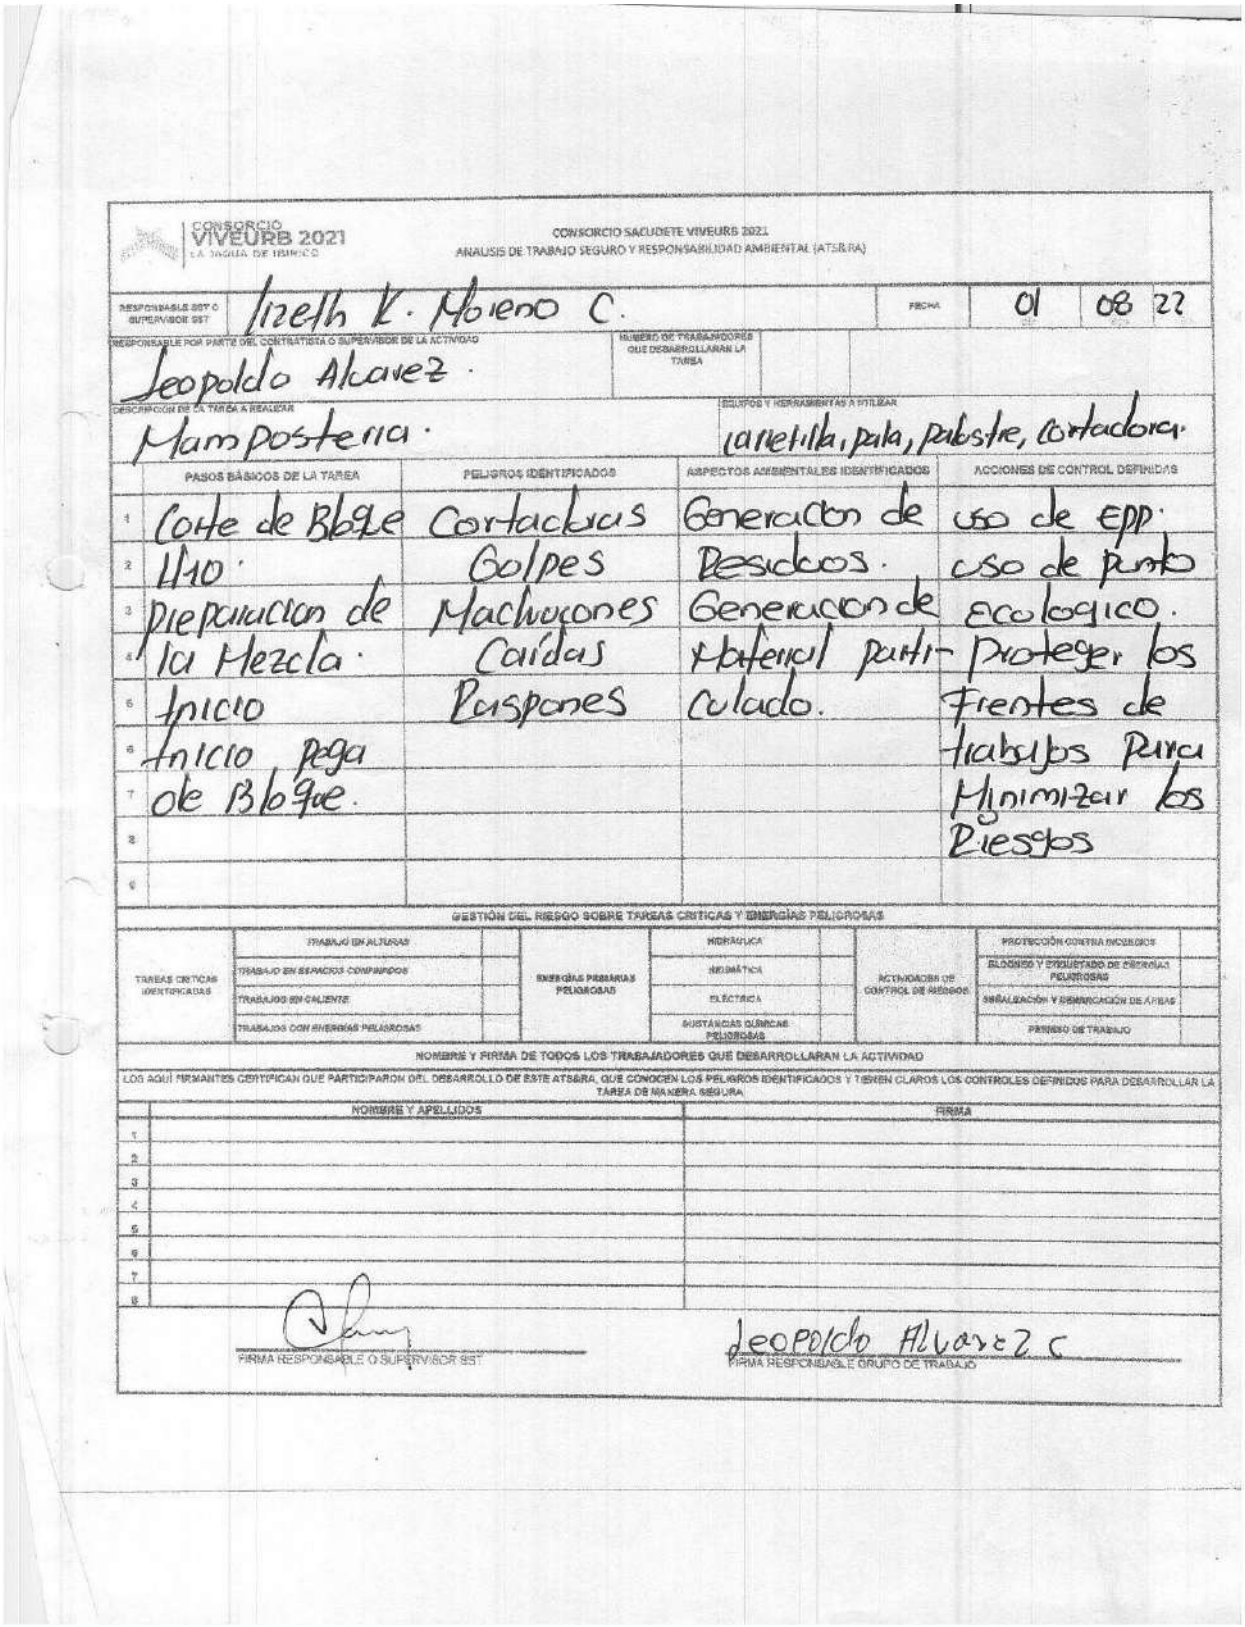

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	01	08	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Leopoldo Alvarez.	

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Mamposteria.	carretilla, pala, palustre, cortadora.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2	Izado.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de	Machucones	Generacion de	ecologico.
4	la Mezcla.	Caídas	Material parti-	Proteger los
5	Inicio	Raspones	culado.	frentes de
6	Inicio pega			trabajos para
7	de Bloque.			Minimizar los
8				Riesgos
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Leopoldo Alvarez C
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lineth K. Moreno C.	FECHA	30	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Elias Salcedo.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	1.		

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Balde, pala, Cartelillo, nivel.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	uso de EPP.
2	Alto.	cortaduras	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de la	Golpes	Generacion de	Ecologico
4	Mezda.	Machucones	Material	para proteger los
5	Inicio pega de		Caido.	Frentes de
6	Bloque			trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Edwin vega	Edwin
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Elias Salcedo.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATSERA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Izeth V. Moreno C	FECHA	01	08	22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA
Epimenio Herrera.	1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Instalacion de Tuberia electrica	cortadora, palestre, Tubos, cables

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado de l.	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2	Material.	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Regata.	Machucones	Generacion de	Ecologico.
4	Instalacion de	Puspones.	Material parti-	
5	Tuberia.		culado.	
6	Cableado y			
7	Resane.			
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRÁULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATSARA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Duvan Florez	DUVAN FLOREZ
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Epimenio Herrera
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

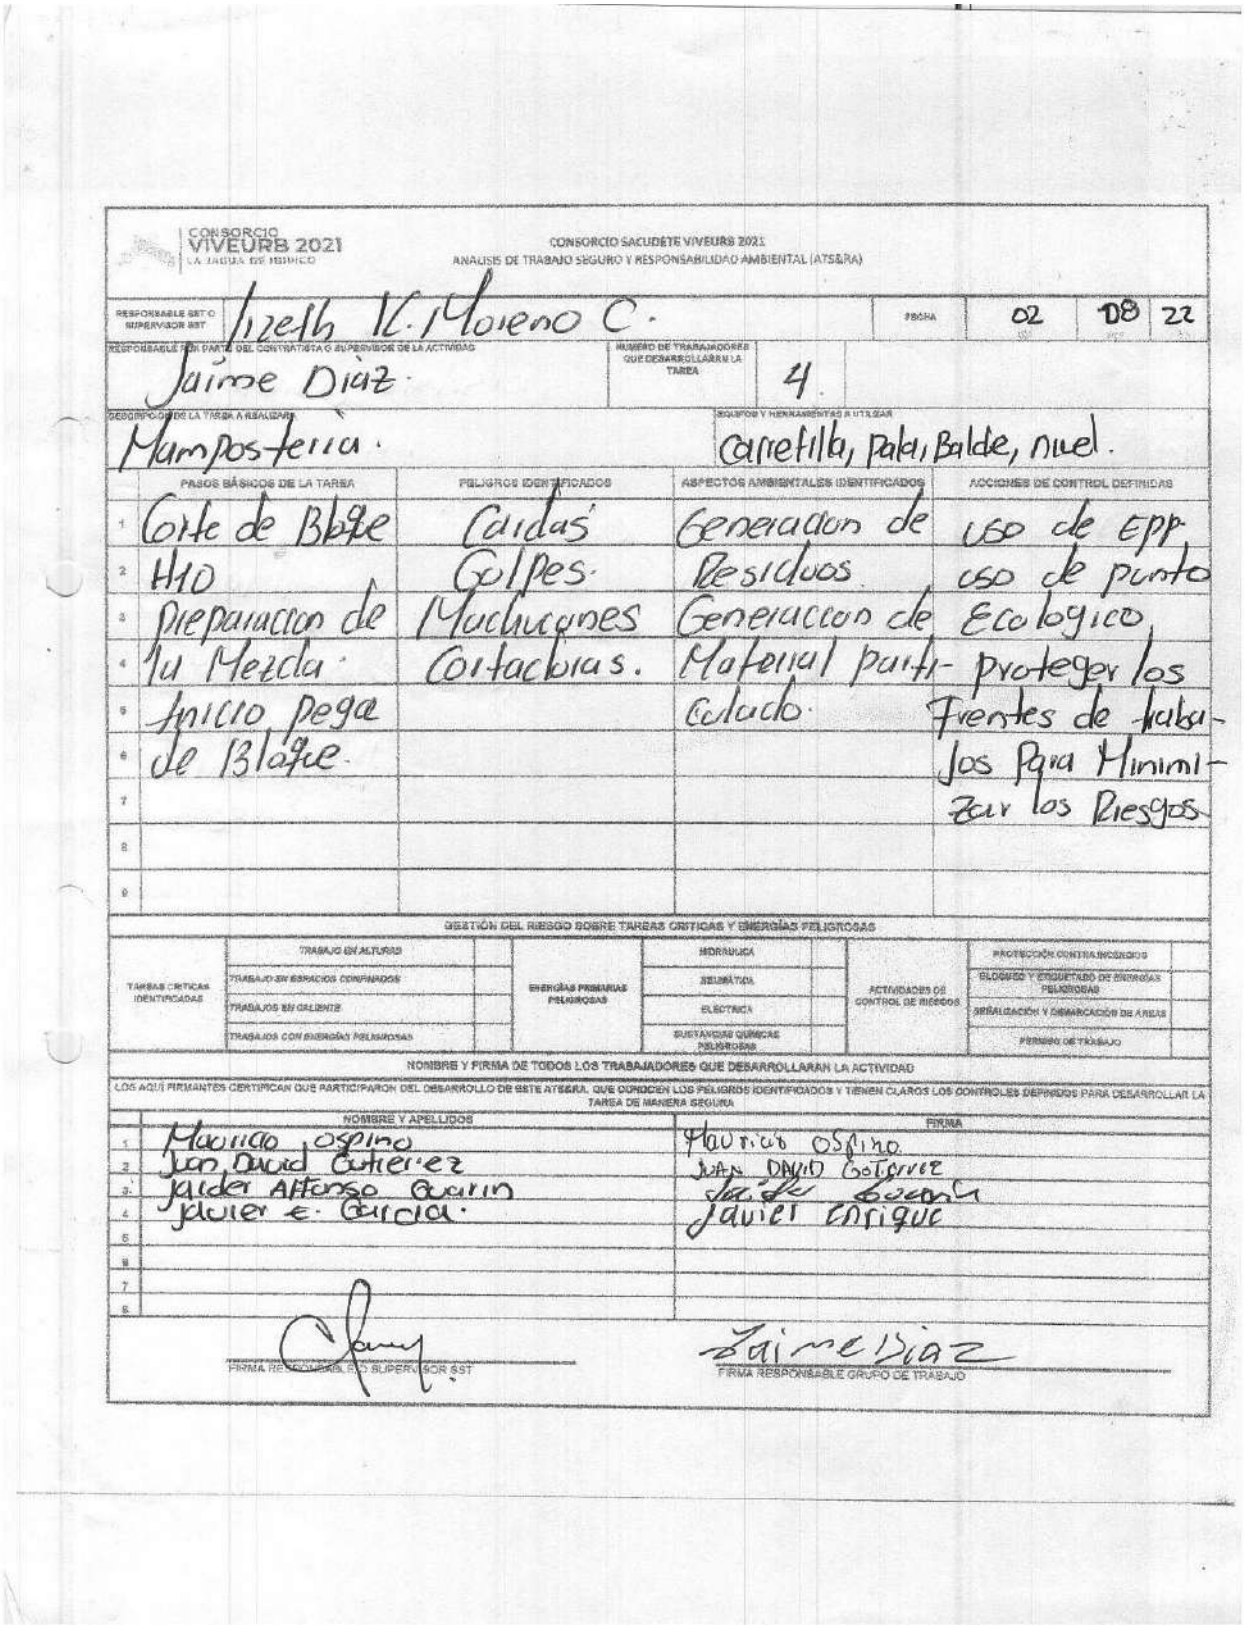

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth V. Moreno C. | FECHA: 02 | 08 | 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Jaime Diaz. | NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 4

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Mamposteria. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: carretilla, pala, Balde, nivel.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Caidas	Generacion de	Uso de EPP
2	H10	Golpes.	Residuos.	uso de punto
3	Preparacion de	Machucones	Generacion de	Ecologico,
4	la Mezcla.	Cortaduras.	Material para-	proteger los
5	Inicio Pega		Colado.	Frentes de traba-
6	de Bloque.			jos Para Minimi-
7				zar los Riesgos
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Mauricio ospino	Mauricio OSPINO.
2	Juan David Gutierrez	JUAN DAVID GUTIERREZ
3	Jaider Alfonso Guerra	Jaider Guerra
4	Javier E. Garcia.	Javier Enrique
5		
8		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST

Jaime Diaz
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO SACUDETE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (ATS&RA)

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	02	08	22
RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD	Euclides Ibañez.	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA	3		
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Pamposteria	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Carretilla, Balde, nivel, pala.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Corte de Bloque	Cortaduras	Generacion de	Uso de EPP
2	HHO	Caidas	Residuos.	Uso de punto
3	Preparacion de	Maduraciones	Generacion de	Ecologico.
4	la Mezcla.	Golpes.	Material particu-	Proteger los
5	Inicio pega de		lado.	Frentes de
6	Bloque.			Trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HIDRAULICA		PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMATICA		BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS&RA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA


	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Edier Fontalvo.	
2	Luis Rivera	Luis Rivera
3	Juan Carlos Cadis.	Juan Carlos
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Euclides Ibañez
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.5. Condiciones Inseguras de Trabajo.

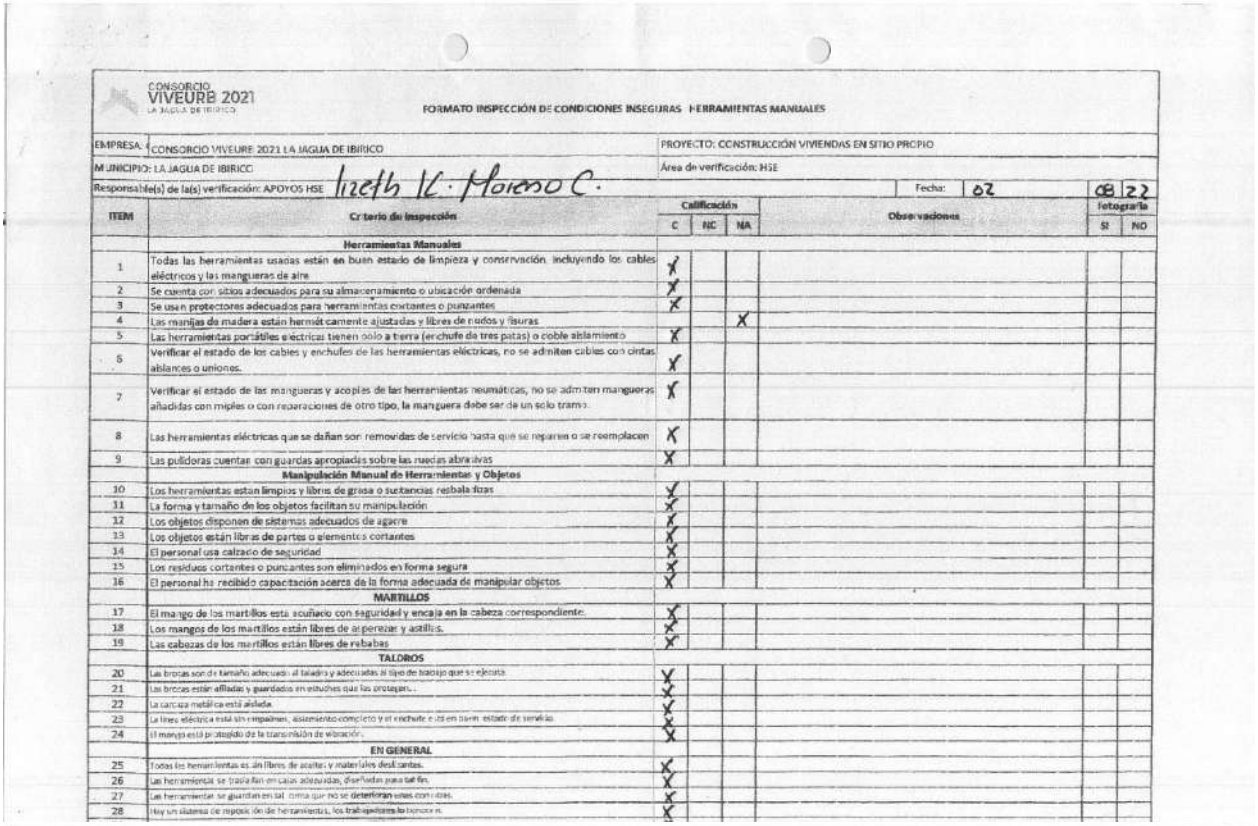

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO


FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 02 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermé camente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mniples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aspereza y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceite y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramienta se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					

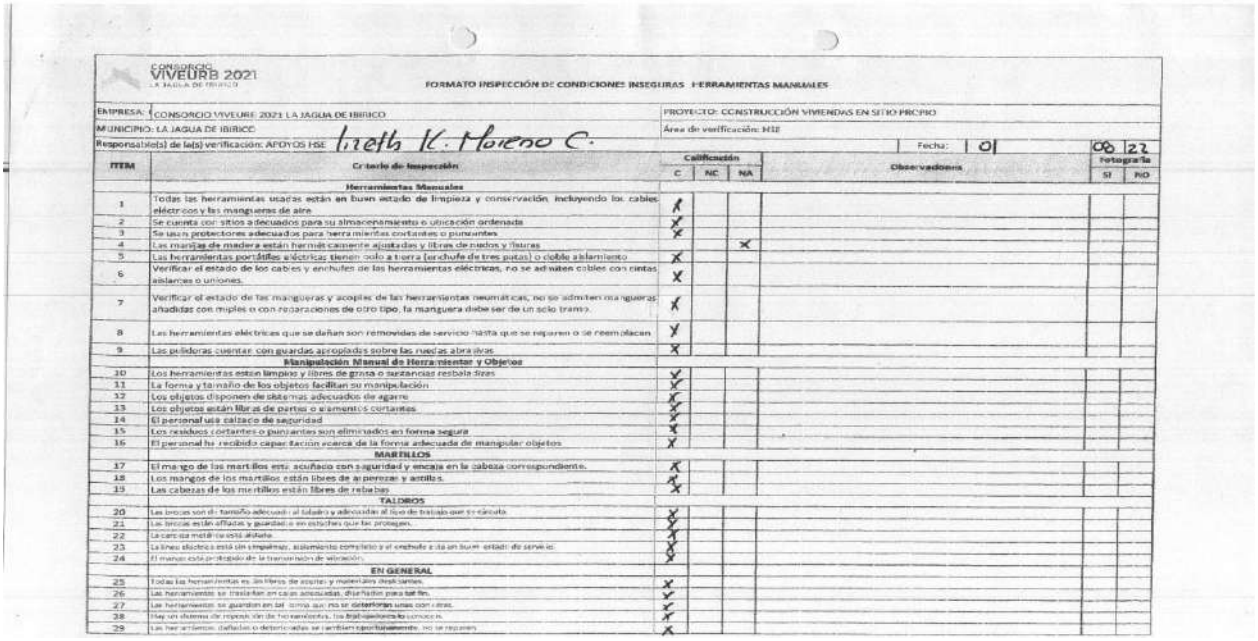

CONSORCIO VIVEURB 2021 — LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 01 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermé camente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mniples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aspereza y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceite y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramienta se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan	X					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA:	CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE	lineth K. Moreno C.
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
Área de verificación:	HSE
Fecha:	04 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas es án libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramienta, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

VIVEURB 2021

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA:	CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE	lineth K. Moreno C.
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
Área de verificación:	HSE
Fecha:	06 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALADROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	X					
22	La carcasa metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas es án libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramienta, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C. — Fecha: 10 08 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lizeth K. Moreno C — Fecha: 12 08 22

ITEM	Criterio de Inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lineth K. Moreno C. — Fecha: 23 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libras de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE

Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE lineth K. Moreno C — Fecha: 25 08 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con niples o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbalizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libras de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de aperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcaza metálica está aislada	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Lizeth K. Moreno C — Fecha: 29 / 08 / 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermét camente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixtos o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica esta aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas es án libres de aceite, y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientos, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS HERRAMIENTAS MANUALES

EMPRESA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO — PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN SITIO PROPIO
MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO — Área de verificación: HSE
Responsable(s) de la(s) verificación: APOYOS HSE Lizeth K. Moreno C. — Fecha: 30 / 08 / 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	Calificación NC	Calificación NA	Observaciones	Fotografía SI	Fotografía NO
	Herramientas Manuales						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire	X					
2	Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada	X					
3	Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes	X					
4	Las manijas de madera están hermét camente ajustadas y libres de nudos y fisuras			X			
5	Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento	X					
6	Verificar el estado de los cables y enchufes de las herramientas eléctricas, no se admiten cables con cintas aislantes o uniones.	X					
7	Verificar el estado de las mangueras y acoples de las herramientas neumáticas, no se admiten mangueras añadidas con mixtos o con reparaciones de otro tipo, la manguera debe ser de un solo tramo.	X					
8	Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen	X					
9	Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruecas abrasivas	X					
	Manipulación Manual de Herramientas y Objetos						
10	Los herramientas estan limpios y libres de grasa o sustancias resbaladizas	X					
11	La forma y tamaño de los objetos facilitan su manipulación	X					
12	Los objetos disponen de sistemas adecuados de agarre	X					
13	Los objetos están libres de partes o elementos cortantes	X					
14	El personal usa calzado de seguridad	X					
15	Los residuos cortantes o punzantes son eliminados en forma segura	X					
16	El personal ha recibido capacitación acerca de la forma adecuada de manipular objetos	X					
	MARTILLOS						
17	El mango de los martillos esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X					
18	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X					
19	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X					
	TALDROS						
20	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta	X					
21	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	X					
22	La carcasa metálica esta aislada.	X					
23	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	X					
24	El manejo está protegido de la transmisión de vibración.	X					
	EN GENERAL						
25	Todas las herramientas es án libres de aceite, y materiales deslizantes.	X					
26	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X					
27	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X					
28	Hay un sistema de reposición de herramientos, los trabajadores lo conocen.	X					
29	Las herramientas dañadas o deteriodadas se cambian oportunamente, no se reparan.	X					

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

carrerall N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2022

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTACION DEL P.M.A

CONSORCIO VIVE URBE 2021
PERIODO AGOSTO 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
AGOSTO 2022

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN....3

2. MARCO AMBIENTAL GENERAL....4

3. OBJETIVOS. 5

3.1. General 5

3.2. Específicos. 5

4. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 6

5. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA....6

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7

6.1. Municipio de la Jagua de Ibirico. 7

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 8

7.1. Manejo Agregados Pétreos (arenas, gravas, triturados, ladrillos). 8

7.2. Sensibilización y Capacitación Ambiental. 9

7.3. Manejo y Disposición Final de Escombros 10

7.4. Educación Ambiental y Cultura al Ciudadano 11

7.5. Desvíos de Tráfico 11

7.6. Manejo y Disposición del Recurso Agua. 12

7.7. Manejo de Residuos Sólidos 14

7.8. Generación de Empleo y Enganche de Personal....15

7.9. Mejoramiento de la Calidad de Vida....16

8. FOTOS VARIAS....17

9. CONCLUSION 18

10. FORMATO CONTROL DE RESIDUOS 19

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentran los principales resultados de los ejercicios realizados por la implementación del P.M.A.

Se afirma que una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados, como constructores, comunidad vecina, usuarios, entes de planeación y autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada. Al Consultor o Contratista de la obra vial le corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y construir con mínima generación de contaminación, respondiendo a las necesidades de desarrollo socioeconómico en su área de influencia.

Para contrarrestar los posibles impactos potenciales el contratista diseña un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y cierre.

Hoy en día se exige que las obras de ingeniería sean compatibles con el medio ambiente, es decir, que su construcción y operación se hagan guardando un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los bienes y elementos de la Naturaleza, incluyendo principalmente el ser humano.

Para este propósito se han requerido los estudios ambientales en la construcción de las obras civiles, como una dimensión ambiental que llega a convertirse en un factor determinante para las bondades y decisiones de los proyectos de desarrollo.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

2. MARCO AMBIENTAL GENERAL

- ✓ El artículo 79 de la Constitución Política de 1991 dice: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

- ✓ Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 1974.

- ✓ La Ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones.
  Es especial se tendrá en cuenta lo dispuesto en los títulos VIII – Licencias ambientales y X - De los modos y procedimientos de participación ciudadana.

- ✓ El artículo 31 de la ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1865 de 1994 establece las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

- ✓ Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, que creó el MAVDT, llamado actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por Ley 1444 de 2011 (Articulo 12).

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

3. OBJETIVOS.

3.1. General

Implementar todas las actividades encaminadas a Mitigar, Reducir, y/o Compensar las posibles afectaciones al Ambiente en la construcción del proyecto CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021.

3.2. Específicos.

- ✓ Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo donde se presente generación de residuos sólidos.
- ✓ Priorizar los factores de Ambientales que se presenten afectación y colocarlos en plan de mejora.
- ✓ Capacitar al personal sobre la importancia del ambiente y sus componentes.
- ✓ Hacer cumplir el uso permanente en obra de los puntos ecológicos.
- ✓ Atender las solicitudes realizadas por la interventoría y corregir.
- ✓ Realizar jornadas de limpiezas, Arborización de Áreas intervenidas y de conservación.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

4. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021en el Municipio De La Jagua De Ibirico – Cesar, surge como necesidad de integrar niños, adultos y personas de la tercera edad los cuales serán los directamente beneficiarios del proyecto que entrego el gobierno nacional por medio de del ministerio del interior este proyecto tiene como objetivo completar los procesos culturales, tecnológicos y recreativos al servicio de toda la comunidad anteriormente mencionada.

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos, frecuentemente derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, efectos físicos de la ruta como barrera y otros. Incluye al Área Operativa, Área de Influencia Directa e Indirecta, y su delimitación debe realizarse a través de un equipo interdisciplinario que evalúe la extensión del espacio donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra

Para la determinación de las áreas de influencia se tomó como base los siguientes aspectos.

- ✓ Actividades a desarrollar con la ejecución del proyecto.
- ✓ División político administrativa del municipio.
- ✓ Actividades socioeconómicas pertenecientes al área de influencia del proyecto.
- ✓ Análisis de trascendencia de los posibles impactos por la ejecución de las actividades a desarrollar.


5. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA.

- ✓ MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O RECEBOS), LADRILLOS.
- ✓ SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL
- ✓ MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS
- ✓ EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA AL CIUDADANO
- ✓ MANEJO TRANSITORIO DE CAMPAMENTO
- ✓ MANEJO Y DISPOSICION DEL RECURSO AGUA
- ✓ MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
- ✓ JORNADA DE LIMPIEZA DE OBRA

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, Manantial, Pedro Castro, Juan Ramon.

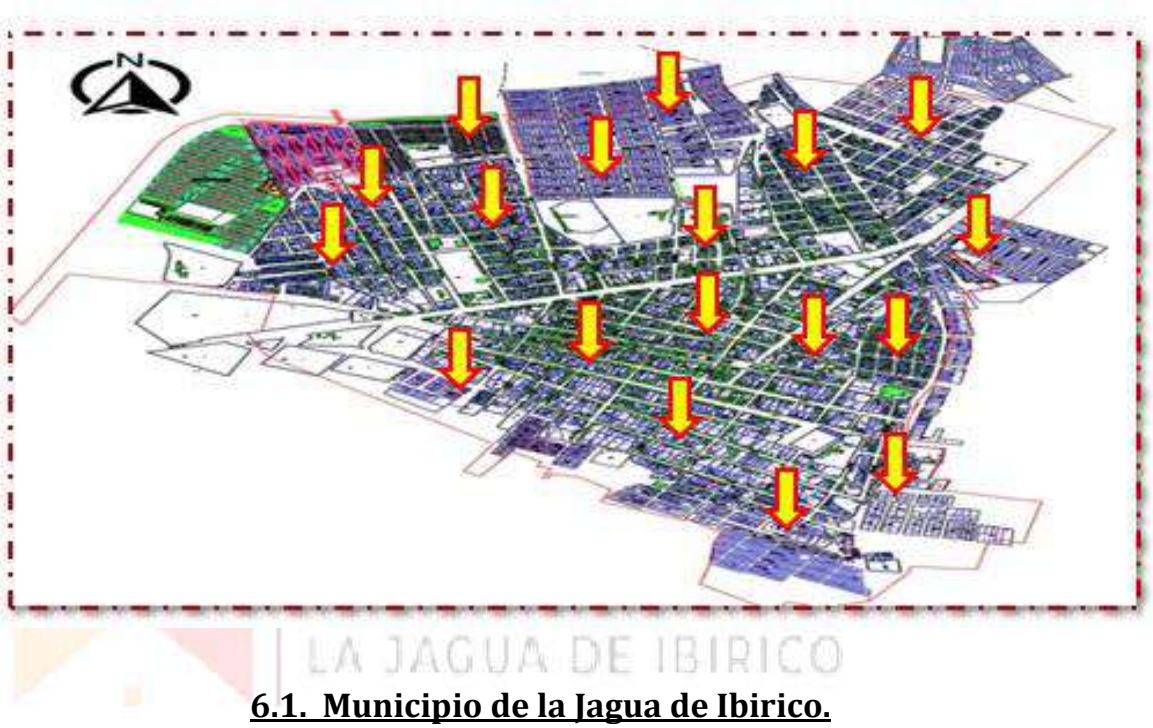

6.1. Municipio de la Jagua de Ibirico.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24’ de latitud norte y 73º20’ de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

7.1. Manejo Agregados Pétreos (arenas, gravas, triturados, ladrillos).

Con esta medida se busca establecer las medidas de manejo ambiental para la explotación de materiales de construcción y manejo de los mismos en la obra.

Los agregados y materiales se depositan de manera adecuada y temporal en la parte externa de la obra para luego transportarlos al interior, logrando depositar los materiales requeridos, sin afectación al ambiente ni a la salud y seguridad de los trabajadores.

	
Disposición adecuada material sobrante de construcción	**Deposito transitorio materiales construcción.**

Los materiales sobrantes de ladrillos son devueltos al campamento y depositados de manera segura.

Los materiales arena y triturado sobrantes son transportados a una siguiente vivienda donde se valla a fundir.

Los impactos ambientales que se buscan minimizar son:

- ✓ Ocupación y deterioro del espacio público.
- ✓ Generación de molestias a la comunidad.
- ✓ Emisión de material particulado.
- ✓ Probabilidad de accidentes.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.2. Sensibilización y Capacitación Ambiental.

Consiste en la preparación y realización de un programa de sensibilización y capacitación ambiental dirigido a todo el personal que labora en la empresa tanto al área de campo como administrativa.

Se viene sensibilizando a la comunidad, contratistas y personal encargado de ejecutar las obras, sobre la importancia de la conservación ambiental y el adecuado manejo de los impactos ambientales durante la ejecución de la obra.

	
CAPACITACIONES AMBIENTALES	**SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIONES AMBIENTALES**

Desarrollándose las siguientes capacitaciones ambientales:

- ✓ Protección del recurso hídrico,
- ✓ Manejo y preservación de fuentes de agua
- ✓ Protección del recurso suelo
- ✓ Protección del recurso aire
- ✓ Áreas de trabajo limpias
- ✓ Manejo de residuos solidos

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.3. Manejo y Disposición Final de Escombros

Esta actividad consiste en disponer los materiales sobrantes generados durante la obra en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Esto incluye la disposición temporal y el manejo dentro de la obra.

	
MANEJO TEMPORAL DE ESCOMBROS	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
	
DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Se seleccionó y demarcó una zona dentro del sitio de la obra para el almacenamiento temporal de los sobrantes producidos. Este sitio está aislado de la zona de permanencia del personal.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.4. Educación Ambiental y Cultura al Ciudadano

Se realizó una socialización a la comunidad con acompañamiento del presidente del barrio ubicado dentro del área de influencia del proyecto sobre la importancia de proteger el medio ambiente mediante un uso adecuado de los servicios prestados.

Así mismo se hizo énfasis en el cuidado y sentido de pertenencia por las viviendas que serán puestos a disposición mediante la entrega.

Se solicitó a la comunidad mantener a los niños alejados de la zona directa del proyecto ya que se está trabajando con herramientas lo que podría poner en riesgo la integridad de los niños que por ahí transitan.

	
SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD	**SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD**

Así mismo se les solicito denunciar si sucedes algún abuso de los trabajadores del consorcio para poder tomar correctivos y no alterar la sana convivencia que viene presentando el desarrollo de la obra.

Tanto el profesional del contratista como el de interventoría, están atentos de la aplicación de las medidas adoptadas para la conservación ambiental del entorno.


7.5. Desvíos de Tráfico

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Se busca Programar constante y adecuadamente el manejo y operación del tráfico en los alrededores del proyecto, Proteger los trabajadores y transeúntes durante el desarrollo de las actividades de la obra

Se Localizaron cintas de seguridad provisionales que se requieran durante la etapa de ejecución de la actividad en sitios donde ocasione la menor afectación a la cotidianidad de los residentes de la zona urbana.

Igualmente se dirige la circulación en forma ágil y segura en las zonas de trabajo y alrededores.

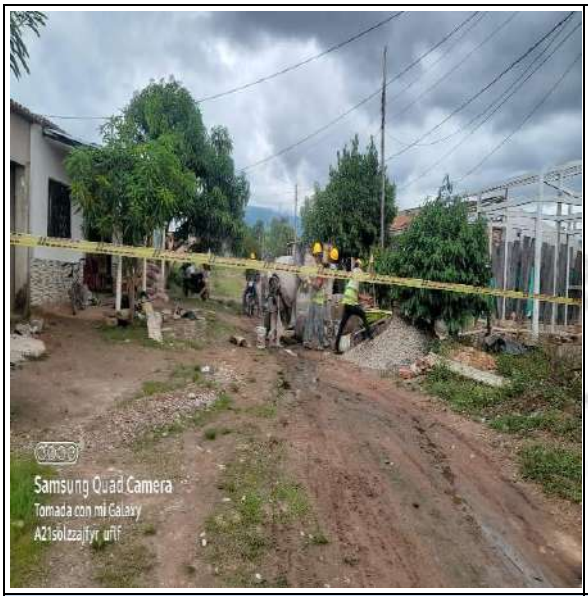	
DESVIO DE TRÁFICO.	**DESVIO DE TRÁFICO.**

Con el desvío de tráfico se busca minimizar los impactos:

- ⇨ Alteración del tráfico vehicular y peatonal
- ⇨ Modificación de las actividades rutinarias de la población.
- ⇨ Incomodidad a la población.

7.6. Manejo y Disposición del Recurso Agua.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Se refiere a las acciones que permiten el buen manejo y disposición de los residuos líquidos durante la construcción de la obra, tal que, no haya afectación sobre los cuerpos de agua cercanos al área dispuesta para la ejecución de la obra.

Con el fin de optimizar el uso del agua en la obra, se utilizan tanques para su depósito de manera temporal y así evitar gastos innecesarios y contribuir al ahorro y uso eficiente del agua.

	
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA.	**USO EFICIENTE DEL AGUA.**

Se viene recolectando y evacuando de forma adecuada los residuos líquidos generados en la zona de la obra y disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental correspondiente.

Con la implementación de estas acciones se busca evitar estancamientos de aguas e impedir la proliferación de vectores muy comunes en tiempos de lluvias, por otra parte la contaminación visual, dificultades para el desarrollo de las diferentes actividades, el estancamiento de agua por mucho tiempo ´produce la generación de malos olores.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.7. Manejo de Residuos Sólidos

Consiste en el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos que se generan en la ejecución de las actividades de la obra.
El manejo de residuos sólidos se adelanta mediante la separación desde la fuente en puntos ecológicos, al igual se les exige a las empresas subcontratistas el manejo, retiro y disposición final de los residuos que generan durante las actividades en la obra.

	
Manejo de bolsas de cemento.	**Recolección diaria de residuos.**

Se viene Aislando conveniente y adecuadamente los residuos sólidos de tal manera que no intervengan en el proceso evolutivo de la obra y el trabajo de sus operadores, con la Implementación de puntos de recolección de residuos en puntos estratégicos de la obra y entrega de residuos a empresa de reciclaje local se está evitando que la obra civil presente:

- ✓ acumulación de residuos sólidos ocasionando la presencia de vectores y valoración paisajística negativa
- ✓ contaminación por emisiones (olores y material particulado).
- ✓ Afectaciones a la salud del personal de trabajo
- ✓ Modificación paisajística del entorno.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.8. Generación de Empleo y Enganche de Personal

Se realizó una socialización a la comunidad ubicada dentro del área de influencia del proyecto sobre la importancia de participar en las convocatorias de empleo que se generara en la ejecución de las actividades del proyecto.

Así mismo se hizo énfasis en el cuidado y sentido de pertenencia por los elementos que serán puestos a disposición mediante la entrega y puesta en marcha del proyecto una vez finalizado este.

Se establecieron las medidas para el enganche del personal apropiado para el proyecto acorde con las expectativas de la comunidad.

	
GENERACION DE EMPLEO	**CONTRATACION DE MANO DE OBRA DE LA ZONA**

Con esta actividad se busca:

- ⇨ Mejora de la condiciones y la calidad de vida de quienes residen en las áreas de influencia.
- ⇨ Dar a conocer la oferta laboral del proyecto y conocer las inquietudes de la misma.
- ⇨ Estimular la participación comunitaria y la veeduría ciudadana.

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.9. Mejoramiento de la Calidad de Vida

Con la ejecución de este proyecto se busca mejorar las condiciones de vida de los beneficiados en el programa, que tengan un techo digno donde estar con toda su familia.

Las casas donde se encontraban viviendo algunos beneficiados eran de tablas, cartón, barro entre otros materiales.

	
ANTES	**AHORA**

La dignificación de la vida se verá en cada usuario beneficiado una vez entregada la nueva vivienda; se espera que se les de buen uso y permanezcan en el tiempo.

	
AHORA	**ANTES**

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

8. FOTOS VARIAS









Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

9. CONCLUSION

Para este periodo de informe ambiental se puede deducir que ya se están implementando las acciones necesarias para dejar el lugar encontrado donde se desarrolló el proyecto en mejores condiciones en que se encontraba, de la misma manera se viene realizando concientización a los habitantes de la zona para que hagan buen usos de estas viviendas.

Se continúa implementando por parte de los profesionales del consorcio sacúdete la jagua de manera contundente las medidas de manejo ambiental que hasta el momento nos están garantizando la minimización de los impactos ambientales.

Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.



CLARA INES CAYON
INGENIERA AMBIENTAL

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

10. FORMATO CONTROL DE RESIDUOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONTROL DE RESIUDOS SOLIDOS							
FECHA	NO RECICABLES		RECICLABES					
	RESIDUOS ORDINARIOS		PAPEL CARTON (BOLSAS DE CEMENTO)		PLASTICO		CHATARRA	
	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG
FEBRERO	4	3	3	4	2	2	0	0
MARZO	8	4	5	3	3	1	2	2
ABRIL	12	6	4	2	2	1	0	0
MAYO	10	5	45	35	3	2	0	0
JUNIO	10	4	36	68	4	1.5	0	0
JULIO	6	2	41	72	5	2	1	2
AGOSTO	4	4	29	51	3	1	0	0
SEPTIEMBRE								

Dirección Carrera 11 N.º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.
