INFORME DE INTERVENTORÍA N° 09

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

La Jagua de Ibirico - Cesar

2022

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
1.1. CONTRATO DE OBRA 4
1.1.1. INFORMACION GENERAL 4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 5
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA 6
2.1. FORMA DE PAGO 6
2.2. ANTICIPO 6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA 6
3.1. FORMA DE PAGO 6
3.2. ANTICIPO 7
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. ANTECEDENTES 9
6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN 10
7. AVANCE DE OBRA 16
7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 17
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 17
7.2.1. ADMINISTRATIVAS 17
7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS 17
6.2.3. TECNICAS 17
7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA 18
8. GARANTIAS 20
8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA 20
8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA 20
9. POLIZAS 20
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 20
11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES 20
12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19 20

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS 21

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales. 21

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas. 21

14. CONTROLES TECNICOS 59

14.2. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados 61

14.3. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 61

14.4. Chequeo de refuerzo de mamposteria. 61

14.5. Chequeo de tapones de estructuras metálicas. 62

14.6. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio. 62

15. CONTROL DE EQUIPO 62

16. CONTROL DE PERSONAL 63

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS. 65

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS 65

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS 66

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS 66

ANEXOS 67

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoría.

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato con un pago anticipado del 40% ($251.471.935,59) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.



Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios y viviendas intervenidas.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE MARZO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10
5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271

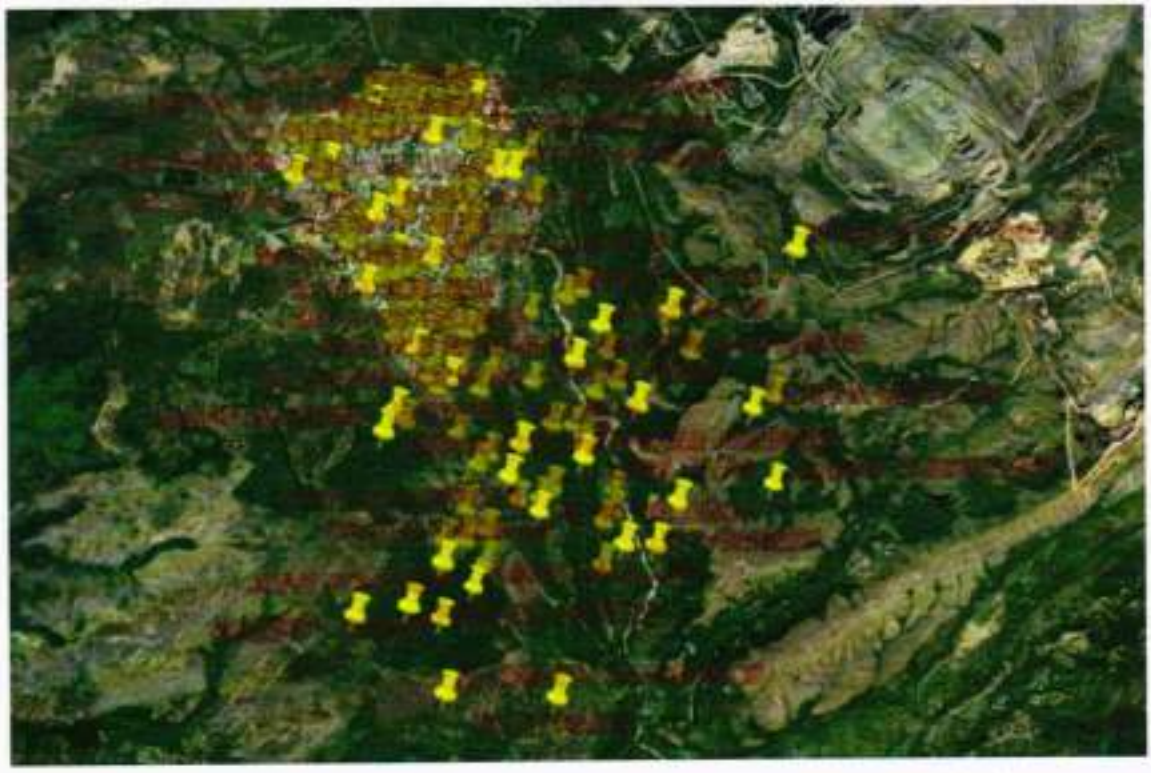


Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021
CONTRATO 089	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021

6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	VIVIENDAS COMPLETADAS O AVANZADAS	FALTANTES
I.	PRELIMINARES REALIZADOS	103	168
1,1	DESCAPOTE MANUAL	86	185
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	103	168
1,3	CORTE, RELLENO O ENTABLADO	86	185
II.	CIMENTACIONES FUNDIDAS	85	186
2,1	EXCAVACION MANUAL	86	185
2,2	ZAPATAS	85	186
2,3	VIGAS	85	186
2,4	PLANTILLA	67	204
2,5	ACERO DE REFUERZO	85	186
2,6	ESTRUCTURA METALICA	74	197
III.	MAMPOSTERIAS LEVANTADAS	73	198
3,1	MUROS	73	198
3,2	PAÑETES DE BAÑO Y COCINA	63	208
IV.	CUBIERTAS INSTALADAS	72	199
4,1	LAMINAS DE FIBRO CEMENTO	72	199
4,2	CABALLETE	72	199
V.	PISOS Y ENCHAPES	63	208
5,1	PISO CERAMICO PARA BAÑO Y COCINA	63	208
VI.	INSTALACIONES ELECTRICAS	53	218
6,1	ACOMETIDA GENERAL	67	204
6,2	POLO DE TIERRA	53	218
6,3	TABLERO MONOFASICO	53	218
6,4	ILUMINACION	53	218
6,5	INTERRUPTORES SENCILLOS	53	218
6,6	INTERRUPTORES DOBLE	53	218
6,7	TOMA CORRIENTE NORMAL	53	218
6,8	TOMA CORRIENTE CON PROTECCION	53	218
6,9	TOMA COAXIAL PARA TV	53	218
VII.	PUERTAS Y VENTANAS	55	216
7,1	PUERTA METALICA	55	216
7,2	PUERTAS DE MADERA	55	216
7,3	VENTANA	55	216
VIII.	INSTALACIONES SANITARIAS	67	204
8,1	RED GENERAL	67	204
8,2	CAJA DE INSPECCION	67	204
8,3	EXCAVACION MANUAL	67	204
IX.	INSTALACIONES HIDRAULICAS	67	204
9,1	PUNTO HIDRAULICA	67	204
9,2	RED DE SUMINISTRO	67	204
X.	ACCESORIOS	52	219
10,1	LLAVE DE CONTROL	52	219
10,2	LAVAPLATOS	52	219
10,3	LAVAMANOS	52	219
10,4	SANITARIO	52	219
10,5	DUCHA	52	219
10,6	REJILLA SOSCO	52	219
10,7	INSCRUSTACIONES PORCELANATO	52	219
10,8	LAVADERO	52	219
XI.	ACABADOS	62	209
11,1	PASTA SOBRE MUROS	58	213
11,2	GRANIPLAST FACHADA	58	213
11,3	YESO PINTURA	62	209
XII.	TANQUE DE AGUA	52	219
12,1	TANQUE DE 500LT	52	219
12,2	PLACA EN CONCRETO	66	205

Ilustración 3 Resumen de actividades ejecutadas.



Gráfico 1 Porcentaje de preliminares realizados



Gráfico 2 Porcentaje de cimentaciones fundidas



Gráfico 3 Porcentaje de mamposterías levantadas



Gráfico 4 Porcentaje de cubiertas instaladas

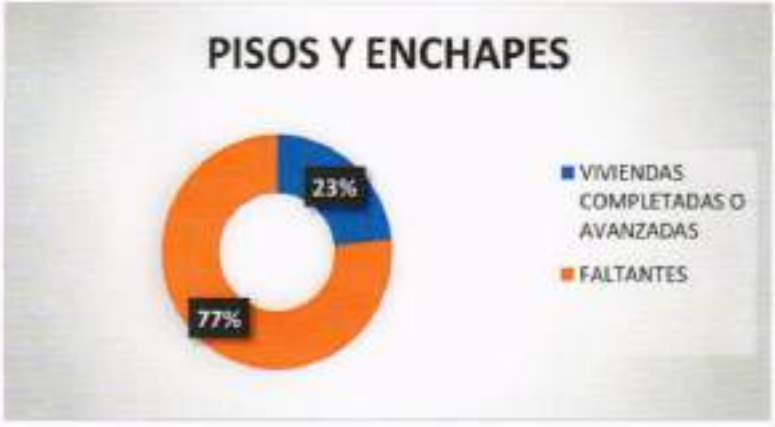


Gráfico 5 Porcentaje de enchapes instalados.



Gráfico 6 Porcentaje de instalaciones eléctricas instaladas.

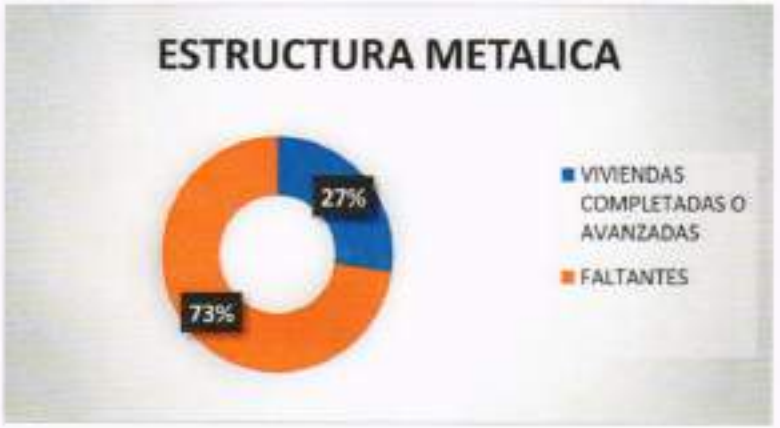


Gráfico 7 Porcentaje de estructuras metálicas levantadas.



Gráfico 8 Porcentaje de puertas y ventanas instaladas.

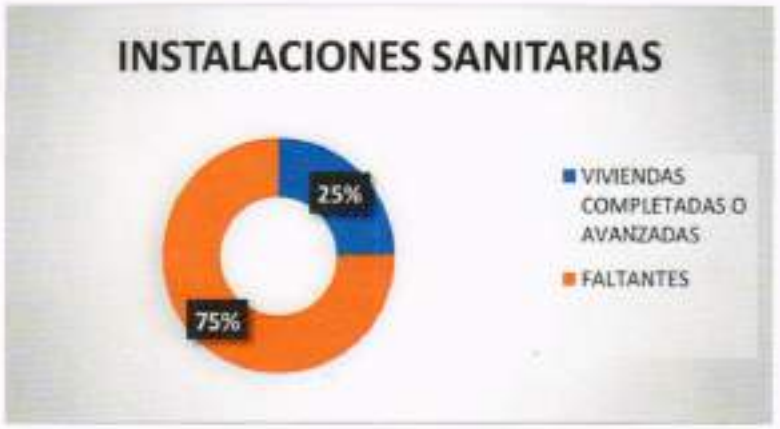


Gráfico 9 Porcentaje de instalaciones sanitarias instaladas.



Gráfico 10 Porcentaje de instalaciones hidráulicas instaladas.

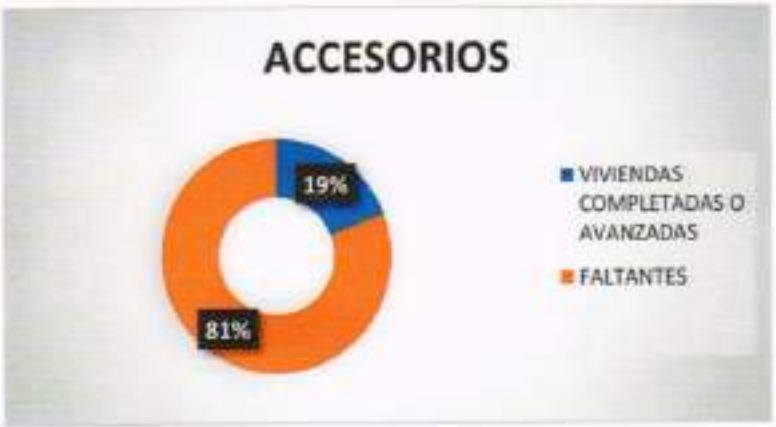


Gráfico 11 Porcentaje de accesorios instalados.



Gráfico 12 Porcentaje de acabados avanzados o terminados.



Gráfico 13 Porcentaje de tanques de agua instalados.

7. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (días):	549
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 31 de marzo	**517 días**
Porcentaje de avance en tiempo	**57,74%**
Porcentaje de ejecución	**29,98%**
Porcentaje programado	**44,68%**
Porcentaje de retraso	**15,70%**
Porcentaje ejecutado en el mes	**2,36%**

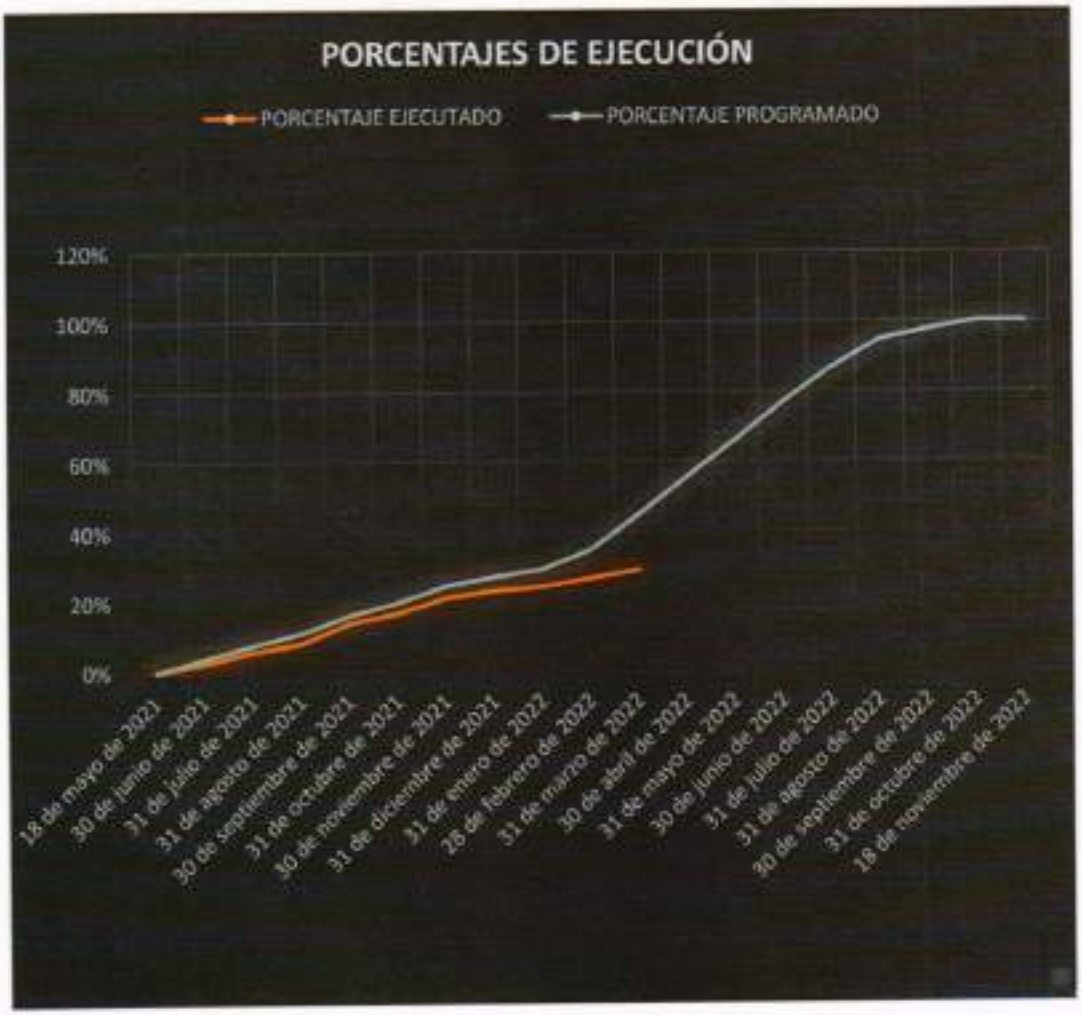


Ilustración 4 Grafica de porcentajes de ejecución VS metas propuestas.

7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80
ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.

b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

c. Revisión de las labores y actividades contratadas.

d. Revisión de la programación de la obra.

7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto ejecutado

VALOR TOTAL	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 5.115.946.714,01
VALOR EJECUTADO SOLO EN EL MES DE MARZO 2021	$ 418.175.273,67

ITEM	DESCRIPCION
I.	REALIZAR PRELIMINARES
1,1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
1,3	CORTE, Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRACEO DE LOTES H.PROM 400M CON MATERI
II.	FUNDIR CIMENTACION
2,1	EXCAVACION MANUAL
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI
2,3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20
2,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.06m
2,5	ACERO DE REFUERZO FOR DE 60.000 PSI
2,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES
3,1	MURO DE .10 DE ESPESOR EN ladrillo Hueco de 10.0 x 20 x 30 -MORTERO DE PEGA 1:4-A LA VISTA Y BANURADO
4,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 (EN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA)
IV.	INSTALAR CUBIERTA
4,1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO
4,2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES
5,1	PISO PARED EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M, Y COCINA H=0.40M, TIPO CORONA O SIMILAR.
VI.	INSTALAR PARTE ELÉCTRICAS INTERNA
6,1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x6+8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.
6,2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION
6,3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE 3 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20 A
6,4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V
6,5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V
6,6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V
6,7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA
6,8	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V
6,9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO APLIQUE Y TUBERIA CONDUIT PVC)

31 DE MARZO: 317 DIAS DE 349 DIAS				57,74%
CASAS	VL. PARCIAL		% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
86	$	27.488.669,75	0,155%	31,73%
103	$	38.995.966,25	0,109%	98,05%
86	$	35.757.789,47	0,203%	31,73%
SUB TOTAL	$	82.242.225,47	0,465%	

86	$	11.305.790,14	0,063%	31,73%
85	$	39.342.891,24	0,223%	31,37%
85	$	171.084.328,54	0,969%	31,37%
67	$	132.946.991,52	0,754%	24,72%
85	$	224.678.717,55	1,273%	31,37%
74	$	1.118.345.039,79	6,335%	27,32%
SUB TOTAL	$	1.697.703.668,78	9,618%	

73	$	367.538.131,96	2,082%	35,94%
63	$	20.737.848,51	0,118%	33,25%
SUB TOTAL	$	388.275.980,29	2,201%	

72	$	124.364.038,16	0,704%	26,57%
72	$	12.606.369,12	0,072%	26,57%
SUB TOTAL	$	136.970.387,28	0,776%	

63	$	21.571.859,87	0,122%	33,25%
SUB TOTAL	$	21.571.859,87	0,122%	

87	$	3.283.672,34	0,020%	24,72%
59	$	10.674.845,01	0,061%	19,56%
53	$	6.879.421,20	0,039%	19,58%
53	$	24.686.814,88	0,142%	19,58%
53	$	11.557.169,40	0,065%	19,56%
53	$	6.315.240,70	0,035%	19,56%
53	$	24.341.763,15	0,138%	19,58%
53	$	13.988.639,83	0,080%	19,56%
53	$	1.343.833,74	0,008%	19,56%
SUB TOTAL	$	102.872.690,24	0,583%	

Ilustración 5 Avance de presupuesto pt1.

VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS						
7.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL 20 DE 0.90*2, INCLUYE , CERRADURA Y ANTICORROSIVO						
7.2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA						
7.3	VENTANA EN ALUMINIO 5020 VIDRIO NATURAL 4MM						
VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA						
8.1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE						
8.2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE						
8.3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE						
8.4	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE						
8.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
8.6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN						
8.7	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 6"						
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE Ø 8"X 6"						
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA						
9.1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2".						
9.2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"						
X.	INSTALAR ACCESORIOS						
10.1	LLAVE CONTROL DE 1/2"						
10.2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR						
10.3	LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERÍA						
10.4	SANITARIO BLANCO						
10.5	DUCHA ECONOMICA						
10.6	REJILLAS SOSCO 3M 2						
10.7	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR						
10.8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO						
XI.	APLICAR ACABADOS						
11.1	PASTA SOBRE MURO EN ACRÓMAL A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATECOL, AMONIACO Y NATRASOL (DOS MANOS)						
11.2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA						
11.3	YESO PINTURA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES						
XII.	INSTALAR TANQUE DE AGUA						
12.1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO						
12.2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0.10 M						
TOTAL COSTO DIRECTO							
ADMINISTRACION							
IMPREVISTO							
UTILIDAD							
TOTAL COSTO INDIRECTO							
TOTAL COSTO NETO							
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA							
IMPLEMENTACIÓN PMR - BIOSEGURIDAD							
VALOR SUBTOTAL (EJECUTADO POR EL CONTRATISTA)							
INTERVENTORIA							
GERENCIA INTEGRAL							
ACTIVIDAD 17: APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
VALOR TOTAL							

55	$	38.265.794,00	0,317%	30,30%
55	$	72.191.580,80	0,410%	30,30%
55	$	99.511.465,61	0,566%	30,30%
SUB TOTAL	$	209.968.840,41	1,193%	
67	$	14.027.948,25	0,079%	34,72%
67	$	5.384.577,43	0,030%	34,72%
67	$	20.052.405,90	0,114%	34,72%
67	$	44.574.171,97	0,252%	34,72%
67	$	35.094.868,00	0,198%	34,72%
67	$	28.891.468,85	0,163%	34,72%
67	$	43.999.568,33	0,250%	34,72%
67	$	17.311.352,13	0,098%	34,72%
SUB TOTAL	$	209.336.364,66	1,190%	
67	$	13.219.801,30	0,075%	34,72%
67	$	19.581.089,60	0,111%	34,72%
SUB TOTAL	$	32.805.990,90	0,186%	
52	$	5.981.876,19	0,034%	39,19%
52	$	8.356.562,72	0,048%	39,19%
52	$	3.785.757,56	0,021%	39,19%
52	$	7.541.579,24	0,043%	39,19%
52	$	1.958.855,72	0,011%	39,19%
52	$	968.288,36	0,006%	39,19%
52	$	1.754.182,59	0,010%	39,19%
52	$	7.074.870,02	0,040%	39,19%
SUB TOTAL	$	37.462.007,34	0,213%	
58	$	101.017.022,61	0,573%	21,40%
59	$	22.718.681,73	0,129%	21,40%
62	$	183.634.212,68	0,830%	22,88%
SUB TOTAL	$	307.370.917,02	0,702%	
52	$	24.519.152,84	0,139%	39,19%
88	$	16.359.653,87	0,093%	24,35%
SUB TOTAL	$	40.878.806,71	0,231%	
	$	3.267.988.648,77		
	$	588.129.956,78		
	$	32.671.886,49		
	$	185.589.432,44		
	$	784.171.275,70		
	$	4.051.561.924,47		
40	$	17.980.934,00		
	$	80.994.006,89		
	$	4.149.841.765,36	23,55%	
	$	303.008.213,03		
	$	303.008.213,03		
	$	240.088.534,59		
Acumulado	$	5.125.984.714,01		
Mes	$	418.175.173,67		
% Ejecutado:	29,99%			
% Mes:	2,37%			

Ilustración 6 Avance de presupuesto pt2.

8. GARANTIAS

8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoría

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

9. POLIZAS

9.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

9.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales.

- En el mes de marzo se recibió un total de 24 viviendas por parte de la interventoria con toda la satisfacción por parte de los beneficiarios y con el visto bueno de los supervisores por parte del municipio.

- Se realizó la cuarta visita técnica por parte de comfacesar el día 29 de marzo. En conjunto con interventoria, supervisores de la secretaria de infraestructura y el contratista.

- Se iniciaron los trabajos en el barrio Pedro Castro.

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

13.2.1. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE (Identificada como la vivienda #11)



Ilustración 7 Instalación de tejado.

13.2.2.Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JESUS ALBERTO PEREZ REAL (Identificada como la vivienda #13)



Ilustración 8 Instalación de tejado.

13.2.3.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ (Identificada como la vivienda #14)



Ilustración 9 Instalación de tejado.

13.2.4.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANGELICA MARIA CARO GOMEZ (Identificada como la vivienda #15)



Ilustración 10 Detalles de acabados para entrega de vivienda.

13.2.5.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ (Identificada como la vivienda #27)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de marzo.

13.2.6.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES (Identificada como la vivienda #28)



Ilustración 11 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 12 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 13 Definición de acabados.

13.2.7.Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUBY SANCHEZ (Identificada como la vivienda #29)



Ilustración 14 acabados al interior de la vivienda.



Ilustración 15 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 16 Cableado eléctrico de la vivienda.

13.2.8. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #32)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de marzo.

13.2.9. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CONSUELO BALLENA CLAVIJO (Identificada como la vivienda #35)



Ilustración 17 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 18 Definición de acabados de la vivienda.



Ilustración 19 Enchape de zonas húmedas.

13.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA (Identificada como la vivienda #38)



Ilustración 20 Instalación de accesorios.



Ilustración 21 Definición de acabados de la fachada.



Ilustración 22 Instalación de puertas y ventanas



Ilustración 23 Definición de acabados al interior de la vivienda.



Ilustración 24 Enchape de zonas húmedas.

13.2.11. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ (Identificada como la vivienda #39)



Ilustración 25 Definición de acabados para entrega de vivienda.

13.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DIANA CAROLINA SUAREZ USMA (Identificada como la vivienda #40)



Ilustración 26 Definición de acabados de fachada.



Ilustración 27 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 28 Instalación de puertas internas.

13.2.13. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ORLANDO NIETO GARCIA (Identificada como la vivienda #41)



Ilustración 29 Definición de acabados para la entrega de la vivienda.



Ilustración 30 Instalación de accesorios.

13.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JORGE ENRIQUE GELVIS (Identificada como la vivienda #42)



Ilustración 31 Instalación de puertas internas.

13.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA (Identificada como la vivienda #43)



Ilustración 32 Definición de acabados para entrega de la vivienda.



Ilustración 33 Instalación de accesorios.

13.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DELFINA MENDOZA LLANES (Identificada como la vivienda #44)



Ilustración 34 Definición de acabados para entrega de la vivienda.



Ilustración 35 Instalación de accesorios.

13.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE (Identificada como la vivienda #45)



Ilustración 36 Instalación de accesorios.

13.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO (Identificada como la vivienda #46)



Ilustración 37 Instalación de accesorios.

13.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA (Identificada como la vivienda #47)



Ilustración 38 Definición de acabados al interior de la vivienda.



Ilustración 39 Instalación de puertas y ventanas.



Ilustración 40 Instalación de accesorios.

13.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DENIS CECILIA JIMENEZ ANDRADE (Identificada como la vivienda #48)



Ilustración 41 Reparación de plantilla dañada por beneficiaria.



Ilustración 42 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES DAMIAN ABRIL (Identificada como la vivienda #49)



Ilustración 43 Instalación de tejado.

13.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ (Identificada como la vivienda #50)



Ilustración 44 Instalación de accesorios.

13.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUCINDO MONTERO SALDAÑA (Identificada como la vivienda #51)



Ilustración 45 Definición de acabados para entrega de vivienda.



Ilustración 46Instalación de accesorios.

13.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JHON FREDY RIOS GARCIA (Identificada como la vivienda #52)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de marzo.

13.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILMER RIOS SANCHEZ (Identificada como la vivienda #53)



Ilustración 47 Definición de acabados para entrega de vivienda.



Ilustración 48 Instalación de accesorios.

13.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TRINIDAD ANTONIA RODRIGUEZ ARENGAS (Identificada como la vivienda #54)



Ilustración 49 Definición de acabados para entrega de vivienda.

13.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LINA MARCELA SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #55)



Ilustración 50 Instalación de tejado.

13.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDILSON PEDROZA ROBLES (Identificada como la vivienda #56)



Ilustración 51 Pintura de muros.



Ilustración 52 Instalación de accesorios.

13.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria AMALIA MORA ARDILA (Identificada como la vivienda #57)



Ilustración 53 Definición de acabados.



Ilustración 54 Enchape de zonas húmedas.

13.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YANIS MABEL THOMAS SAMPAYO (Identificada como la vivienda #58)



Ilustración 55 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 56 Fundación de plantilla.

13.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALBA YASMIN CRUZ PAEZ (Identificada como la vivienda #59)



Ilustración 57 Definición de acabados internos.

13.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MELIZA PADILLA MANCERA (Identificada como la vivienda #60)



Ilustración 58 Definición de acabados internos.



Ilustración 59 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.33. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ESPERANZA ISABEL BELEÑO DELGADO (Identificada como la vivienda #61)



Ilustración 60 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 61 Definición de acabados internos

13.2.34. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MINELLIS CECILIA MARTINEZ MEJIA (Identificada como la vivienda #62)



Ilustración 62 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 63 Definición de acabados de fachada.

13.2.35. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEOMAR YIGETH VILLAREAL PERTUZ (Identificada como la vivienda #63)

- No se registraron trabajos en la vivienda en mes de marzo.

13.2.36. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS (Identificada como la vivienda #64).



Ilustración 64 Definición de acabados para entrega de vivienda.



Ilustración 65 Instalación de combo sanitario.

13.2.37. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES (Identificada como la vivienda #65)



Ilustración 66 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 67 Pintura de muros internos.

13.2.38. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ (Identificada como la vivienda #66



Ilustración 68 Instalación de puertas internas.



Ilustración 69 Definición de acabados para entrega de vivienda.

13.2.39. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEUBID JUDITH RAMOS MELENDEZ (Identificada como la vivienda #67)



Ilustración 70 Instalación de tejado.

13.2.40. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIBETH MARTINEZ VEGA (Identificada como la vivienda #68)



Ilustración 71 Fundación de plantilla.



Ilustración 72 Definición de acabados internos.

13.2.41. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ (Identificada como la vivienda #69)



Ilustración 73 Instalación de puertas internas.



Ilustración 74 Enchape de zonas húmedas.

13.2.42. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ROSA ELENA PEREZ ESTRADA (Identificada como la vivienda #70)

- No se registraron trabajos en la vivienda en el mes de marzo.

13.2.43. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARMEN ELENA VEGA TORRES (Identificada como la vivienda #71)



Ilustración 75 Fundación de plantilla.



Ilustración 76 Enchape de zonas húmedas.



Ilustración 77 Instalación de tejado.

13.2.44. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CINDY PAOLA JIMENEZ LUGO (Identificada como la vivienda #72)



Ilustración 78 Fundación de plantilla.



Ilustración 79 Acabados al interior de la vivienda.

13.2.45. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES HURTADO GALVAN (Identificada como la vivienda #73)



Ilustración 80 Acabados interiores.



Ilustración 81 Enchape de zonas húmedas.

13.2.46. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARLOS EFRAIN USTATE MARTINEZ (Identificada como la vivienda #74)

- No se registran actividades en la vivienda en el mes de marzo.

13.2.47. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIAN PAOLA MORENO REGALADO (Identificada como la vivienda #75)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de marzo.

14. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

14.1. Chequeo de trazados.

Una vez trazado todo el esquema correspondiente a las cimentaciones, se chequean las medidas entre ejes y la escuadra del trazado.



Ilustración 82 Chequeo de trazados.

14.2. Chequeo de dimensiones y niveles en cimentaciones.

Una vez fundidas las cimentaciones, se chequea que las vigas y zapatas cumplan con las dimensiones especificadas y con los niveles adecuados.



Ilustración 83 Chequeo de cimentaciones.

14.3. Chequeo de acero de refuerzo de cimentaciones.

Previamente a fundir las cimentaciones se chequea que el acero de refuerzo puesto para las mismas sea el especificado. Revisando diámetros, traslapos y todo lo relacionado con el tema.



Ilustración 84 Chequeo de acero de refuerzo.

14.4. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:

14.5. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.

Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.

14.6. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.

Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 85 Chequeo de mampostería.

14.7. Chequeo de refuerzo de mampostería.

Se revisa y garantiza que en el levantamiento de muros este presente el refuerzo de una varilla de ¼" cada dos hiladas.

14.8. Chequeo de tapones de estructuras metálicas.

Una vez levantadas las estructuras metálicas, se verifica que se coloquen los tapones en los lugares donde se requiera para evitar la infiltración de agua al interior de los perfiles metálicos.

14.9. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio.

- Anexos

15. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles mayor resistencia a las bases de la vivienda:

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.
- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.

- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

16. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

16.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: EDUARDO CAYON
- Maestro General: FRANCO LUIS MEJIA RAMOS, C.C: 19.516.430
- Inspector de Obra: RAMIRO SEGUNDO DE LA HOZ OROZCO, C.C:1.081.913.176
- Residente de obra: Dairo Pimienta
- Residente SISO: LORENZA CASTILLA NOVIA, C.C: 35.518.565
- Cuadrillas de mamposteria:
- Hector Pineda
- Richard Bolaño
- Luis Atencio
- Cuadrilla de enchape:
- Yorky Morales
- Ruben Gamez
- Cuadrilla de electricidad:
- Wilmer Estrada
- Duvan Florez
- Epimenio Herrera
- Filos en ventanas y varios:
- Fernando Rapalino
- Motocarga:
- Javier Morales
- Dainer Navarro
- Plomero:

- Gustavo Colina
- Equipo de pintura y acabados:
- Edgar Artiaga
- Fernando Navarro
- Jhonatan Robles

16.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoría: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoría: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS.

En el mes de marzo de 2022 se protocolizaron 24 viviendas adicionales a las 28 viviendas ya protocolizadas, una vez revisadas y recibidas por interventoría, comfacesar y la alcaldía municipal. En esta segunda etapa protocolización, se les entregó vivienda a los siguientes 24 beneficiarios:

Tabla 10. Relación de viviendas protocolizadas.

No. VIVIENDA	BENEFICIARIO	BARRIO
29	DIANA CAROLINA SUAREZ USMA	17 DE FEBRERO
30	DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA	17 DE FEBRERO
31	LUCINDO MONTERO SALDAÑA	17 DE FEBRERO
32	MARIA DELFINA MENDOZA LLANES	17 DE FEBRERO
33	ORLANDO NIETO TORRES	17 DE FEBRERO
34	JORGE ENRIQUE GELVIS	17 DE FEBRERO
35	TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ	VILLA ESPERANZA
36	ANGELICA MARIA CARO GOMEZ	BELLO HORIZONTE
37	CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ	LUIS CARLOS GALAN
38	MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS	LUIS CARLOS GALAN
39	TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ ARENGAS	LUIS CARLOS GALAN
40	WILMER CARO GOMEZ	LUIS CARLOS GALAN
41	KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ	17 DE FEBRERO
42	LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA	17 DE FEBRERO
43	EDILSON PEDROZA ROBLES	LUIS CARLOS GALAN
44	EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES	LUIS CARLOS GALAN
45	GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ	LUIS CARLOS GALAN
46	MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE	17 DE FEBRERO
47	RUBY SANCHEZ	BRISAS DEL NORTE
48	HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES	BRISAS DEL NORTE
49	BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA	VILLA ESPERANZA
50	NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO	17 DE FEBRERO
51	ALBA YASMIN CRUZ PAEZ	LUIS CARLOS GALAN
52	CONSUELO BALLENA CLAVIJO	VILLA ESPERANZA

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS

A lo largo de la ejecución del proyecto se han realizado diversas modificaciones a lo establecido en los planos por distintas razones. Ya sea por las condiciones únicas de la ubicación del lote de cada beneficiario, por facilidad y mayor seguridad o por incongruencias que se han encontrado en los diseños establecidos.

Las modificaciones que se han realizado a lo largo del proyecto son las siguientes:

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS

En la ejecución del proyecto se presentaron viviendas en las cuales la estructura metálica se levantó con columnas unidas mediante cordones de soldadura y en todas las viviendas se han utilizado flanches (los cuales transmiten la carga de las columnas a las cimentaciones) con soportes de varillas de 3/8' corrugadas soldadas por debajo del elemento, en vez de utilizar un sistema apernado. Ante lo cual, el municipio manifestó su preocupación, por lo que el contratista decidió solicitar el concepto de un ingeniero especialista en estructuras para aclarar si era necesario cambiar estos elementos o su funcionamiento sigue cumpliendo su propósito bajo las condiciones dadas. Dicho concepto fue revisado por interventoría y por COMFACESAR los cuales le otorgaron validez.

- Anexo. Concepto estructural con anexo de aprobación interventoría y COMFACESAR.

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- En el mes de marzo no se presentaron contratiempos por mal estado del tiempo o cualquier otro evento de fuerza mayor.

En total, desde que inició el proyecto hay un total de **142.5** horas perdidas por fuerza mayor.

MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA

Representante legal

ASSI INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S

ANEXOS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22728001
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-03-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZON SOCIAL	ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACION	900847519	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	8 menos a 200 empleados
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	MZ D CASA 16 A ACUARELA	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	ASSII.SAS@OUTLOOK.COM	TELEFONO	5921199
FAX	3187074601	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACION	56059305	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDA		

PERIODO COTIZACION PENSION		PERIODO COTIZACION SALUD		FORMA DE PRESENTACION
Año: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 03	Unico
Nro. DE TRABAJADORES		VLr. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$13.600.000		22728001

Pagina 1 2022-03-09 15:30:47 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificacion	Tipo Vinculacion	Subtipo Cotizante	Horas mes	Colombiano en el	Dptno	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
									Salario Basico
CC-1234592953	01	No	No	No	20	1	Fijo	HERNANDEZ SERRANO CRISTIAN ANDRES	$2.800.000
CC-1063832779	01	No	No	No	20	1	Fijo	CASTRO FONSECA MARIO FELIX	$2.500.000
CC-56059305	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	$2.500.000
CC-1140894814	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ MOLINA YENNY YOHANNEL	$2.800.000
CC-17953822	01	No	No	No	20	1	Fijo	DIAZA GONZALEZ RAMON SANTO	$2.500.000

NOVEDADES

Identificacion	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	Fecha Inicio	Fecha Fin	IRL	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 1234592953									X										0		
CC - 1063832779																			0		
CC - 56059305																			0		
CC - 1140894814																			0		
CC - 17953822																			0		


SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificacion	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil.	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1234592953	COLPENSIONES	30	$2.800.000	0.14000000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 1063832779	PORVENIR	30	$2.500.000	0.14000000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 56059305	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.14000000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1140894814	PORVENIR	30	$2.800.000	0.14000000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 17953822	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.14000000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificacion	EPS	Dias Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Ant Dia	Valor UPC	Num Ant Liq	Valor Liq	Dias Cot	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: IBC Riesgos	Clase de RT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1234592953	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	1	0.0069000	$194.000
CC - 1063832779	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	1	0.0069000	$174.000

Pagina 2 2022-03-09 15:30:47 ASOPAGOS SA -

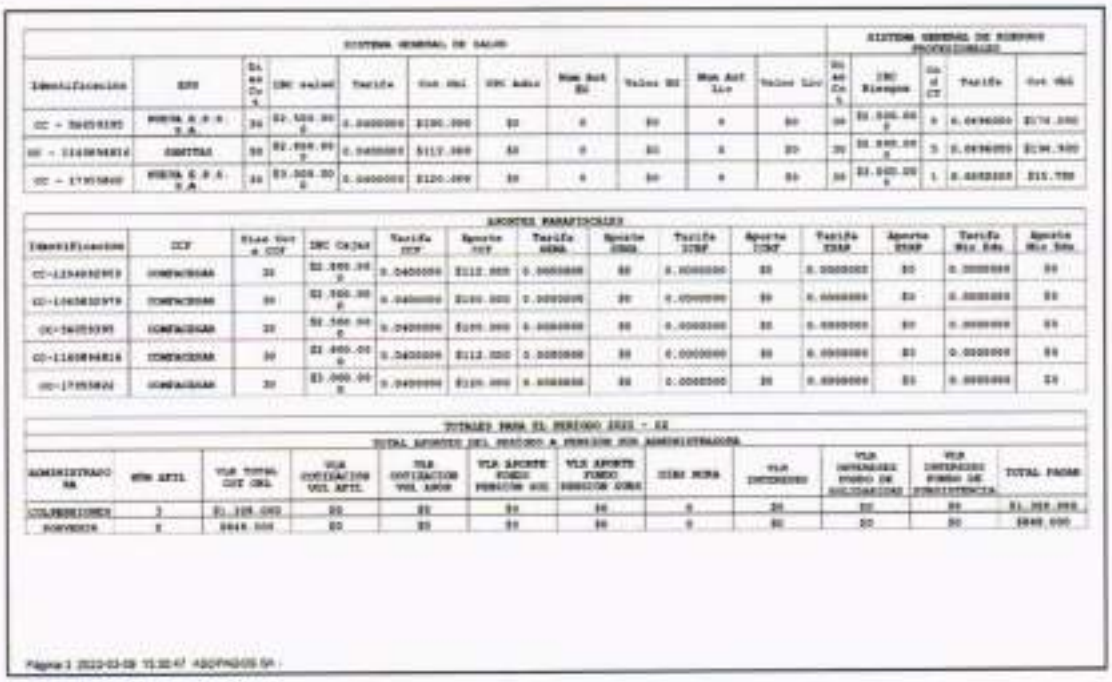


SISTEMA GENERAL DE SALUD												SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot.	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	IBC Adic	Mon Aut Sal	Valor Sal	Mon Aut Lic	Valor Lic	Días Cot.	IBC Riesgos	Cla. de CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 36659395	MUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.520.000	0.0400000	$100.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.520.000	5	0.0696000	$174.000
CC - 1143894816	SANITAS	30	$2.556.000	0.0400000	$117.360	$0	0	$0	0	$0	30	$2.556.000	5	0.0696000	$196.900
CC - 1795840	MUEVA E.P.S. S.A	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0052200	$15.700

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Caja	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Sdo	Aporte Min Sdo
CC-1234892959	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0300000	$0	0.0200000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065810979	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0300000	$0	0.0200000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36659395	COMFACESAR	30	$2.520.000	0.0400000	$100.800	0.0300000	$0	0.0200000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143894816	COMFACESAR	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0300000	$0	0.0200000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1795840	COMFACESAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0300000	$0	0.0200000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 02

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	MIN AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO SOLIDAR SUBS	SUBS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1.328.040	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.328.040
PORVENIR	2	$848.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$848.000

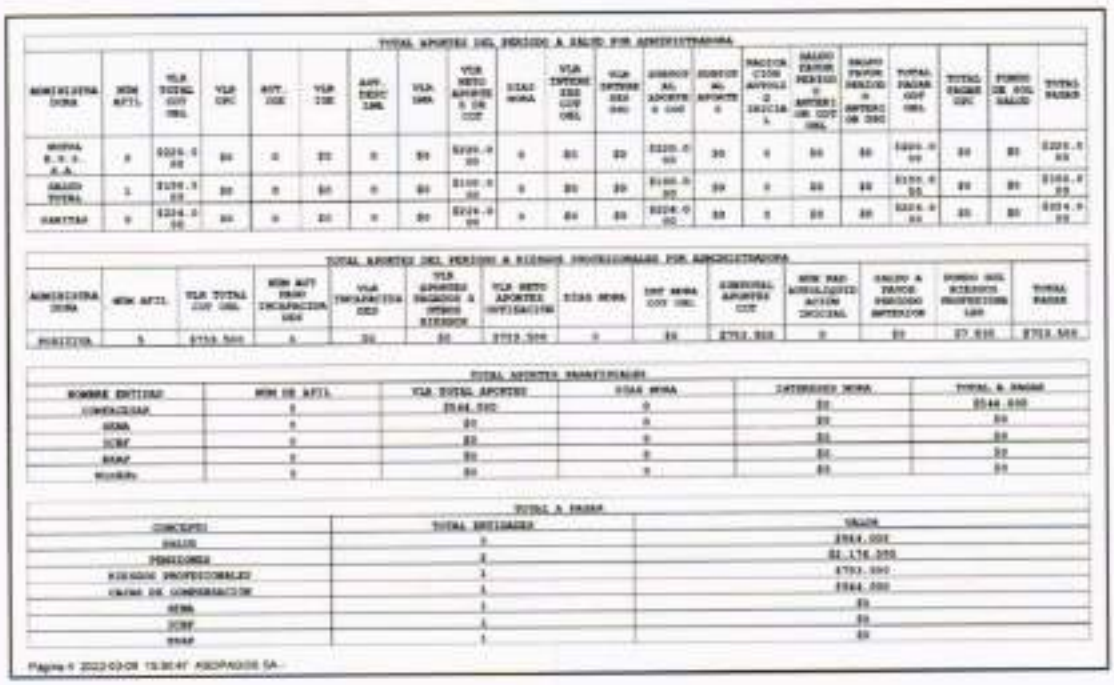

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	MIN AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AVT. UGE	VLR UGE	AVT. TECC IML	VLR IML	VLR NETO APORTES A UPC COT	DIAS MORA	VLR INTERESES MORA COT OBL	VLR INTERESES MORA	SUBSIDIO AL APORTE A CARGO	SUBSIDIO AL APORTE	RACION CION APORTE 2 DECIAR A	SALDO FAVOR PERIODO O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR SALDO A ANTERIO OR DEU	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MUEVA E.P.S. S.A.	4	$224.000	$0	0	$0	0	$0	$224.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$464.000	$0	$0	$224.000
SALUD TOTAL	1	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000
SANITAS	0	$224.000	$0	0	$0	0	$0	$224.000	0	$0	$0	$224.000	$0	0	$0	$0	$224.000	$0	$0	$224.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	MIN AFIL	VLR TOTAL COT OBL	MIN AUT PARA INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DIAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBSIDIAL APORTES COT	MIN PAG AUXILIO/DIF ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO DEL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	$753.500	0	$0	$0	$753.500	0	$0	$753.500	0	$0	$7.630	$753.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES


NOMBRE ENTIDAD	MIN DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	3	$544.000	0	$0	$544.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
Minhda	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL EMPLEADOS	VALOR
SALUD	3	$564.000
PENSIONES	2	$2.176.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$753.500
CAJAS DE COMPENSACION	1	$544.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

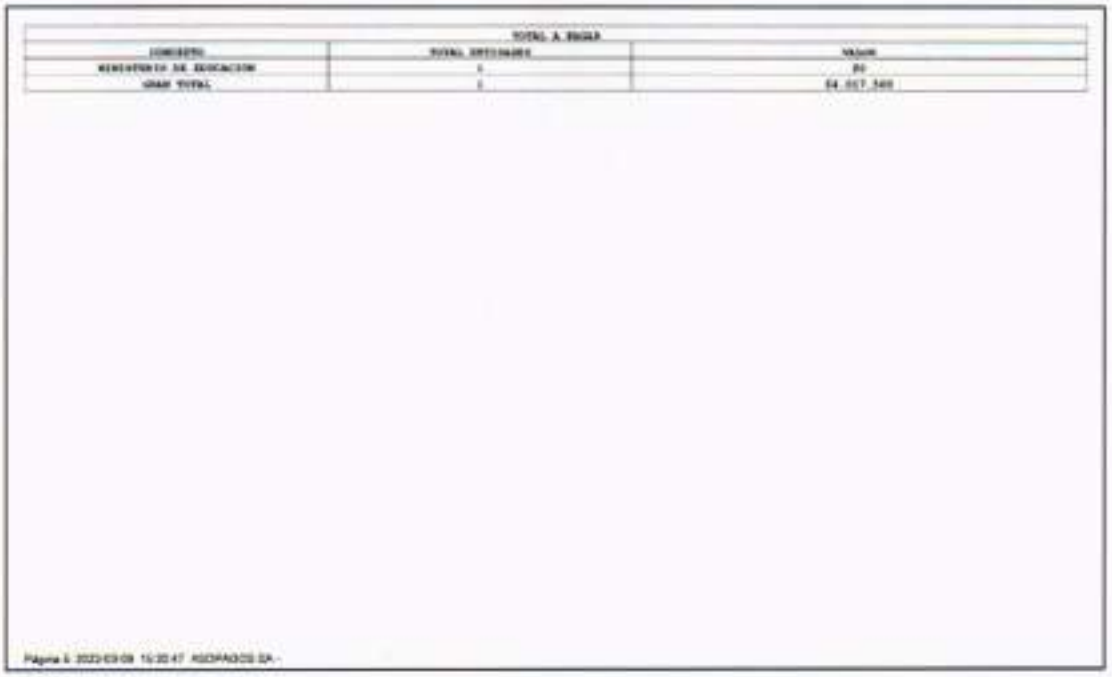

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL OPCIONES	VALOR
RENDIMIENTO DE EDUCACION	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.017.500

Página 1 2023-03-08 15:20:47 ASOPAGOS SA -

A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA GENERADA





ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA GENERADA



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

A3- PÓLIZAS CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica CIA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-000-05-CUPA05-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
NIT: 9014815263 Telf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

OBJETO DEL CONTRATO

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCOM CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

EN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 6/89.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 2760730-1347-NOV-00-CUMP05-0001

'ADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815253 Teléf. 3003258780	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCGD07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-MTP-06-RCGD05-0001

OMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
JONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Telél. 3003258790	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CATON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

Cjp/89

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1247-NEF-06-RC0005-0002

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Telef. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 dias contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o despleme de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-ESP-06-RCEGOS-2001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9014815263 Telèf. 3003258780	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 21072020-1347-MRP-06-RCG005-0005

Berkley Colombia Seguros
La Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
NSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Telef. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL RIESGO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ Jolis9.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27012020-1347-MEP-06-RC0005-0001

A4- PÓLIZAS INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO 16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A BEDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA RISBA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 090 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-58 L101 - TELEFONO: 5850000 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO
CARRERA 9 NRO. 16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153880	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO CUANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-58 L.101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 110152000173305 (3900) 0000009888 (30) (96) 20220507

REFERENCIA PAGO: 110152000173305

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ASSI - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.847.519-0
DIRECCIÓN: MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELEFONO: 3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR		NIT: 892.399.989-8
DIRECCIÓN: CARRERA 9 NRO.16 A 48	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELEFONO 5857777
BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-00 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA RISRA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 080 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSI-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******1,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA REASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850068 - VALLEDUPAR

47-40-101005082
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.515-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia · Carulla · éxito · Gigigol · Efecty

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****378,241.00	$ ******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ ******52,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153000	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-58 L101 - TELEFONO: 5880069 - VALLEDUPAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

A5- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Abril de 2020	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.9006475190

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN.....	4
1	INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.....	5
2	OBJETIVOS.....	8
3	ALCANCE.....	8
4	DEFINICIONES.....	8
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S.....	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.....	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA.....	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S	16
9	MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION EN INTERVENTORÍAS.....	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS....	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS.....	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora "ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoría Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoría de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoría con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoría que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoría.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoria encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoria.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoria y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoria que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoria.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoria en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**, proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.ses@outlook.com

ASSII ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoria
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoria
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoria se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoria
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoria se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoria

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehículo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assli.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoría se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoría

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorías y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoría, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoría (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoría se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoría

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

reportarán al director de interventoría y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoría, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.

- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.

- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoria con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoria avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia minima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de camaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoria, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al dia (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como minimo dos veces al dia.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguendo las instrucciones dadas.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
  seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
  generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
  organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.9008475190

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoría descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoria en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoria para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoria, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoria.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para asi poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo  Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Gerente Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

A6- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

LA JAGUA DE IBIRICO,
JUNIO 2021.

120
Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Junio 2021	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA SAGRA DE MONICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	4
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	5
2	OBJETIVOS	8
3	ALCANCE	9
4	DEFINICIONES	9
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DEL CONSORCIO VIVIENDA VIVEURB 2021	16
9	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adeptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de
bioseguridad de la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2020", ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	**CONSORCIO VIVEURB 2021**
NIT.	901.481.526 - 3
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	5901119
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Cayón Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas	V

1.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar

Actualmente se encuentra adelantando obras de construcción de 271 soluciones de viviendas del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado "CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDAS URBANA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m, para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la obra.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagio al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la obra.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y desinfección.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de obra y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personaspositivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
- Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra.

1.4.6. Proveedor

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.
- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.
- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las obras en construcción por parte del CONSORCIO VIVEURB 2021, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo al decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de dos (2) carteleras informativa en el área de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse laboca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la obra se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Obra
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de obra
5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Obra
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y	Permanente	Supervisor de Obra

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.		
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Obra
5.14.	El vehículo operativo de la obra solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de obra
5.15.	En la obra se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Obra
5.16	Se dispondrá en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de obra
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST
5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la obra, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONAVIRUS y seráa quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la obra se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de obra

6. **MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES**

- **CONSORCIO VIVEURB 2021** cumplirá con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19

7. La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algúntrabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
8. Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
9. Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la obra se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
10. Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
11. No se realizarán reuniones innecesarias en la obra, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
12. Los Supervisores y Líderes de Áreas en las obras garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
13. Los Líderes de Obras estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos, se comunicarán en la Re-inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re-inicio de las actividades en la obra.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar las actividades necesarias en la obra, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.
- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Obras y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se les informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

La totalidad de los trabajadores de CONSORCIO VIVERURB 2021, deben de implementar lassiguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapaboces en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DE CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias paraminimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de la obra se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a la obra

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se reportarán al director de obra y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.
- Todas las personas que ingresen a la obra deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de la Obra:

- Todo personal al salir de la obra debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.
- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra.
- La entrega de información será efectuada por el director de la de obra, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.
- Cada zona de la obra contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la obra con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la obra avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.
- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.
- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de obra, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.
- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA OBRA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Obra, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología
- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo
- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de CONSORCIO VIVEURB 2021, se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN OBRA Y ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas a seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la obra descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de obra en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a obra para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la obra.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de obra, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la obra a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de obra.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por:	**Revisado y aprobado por:**
César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	Luis Eduardo Cayón Medina MP N° 25202-280053 CND
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante Legal
Firma Fecha: Junio de 2021	Firma: Fecha: Junio de 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A7- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.**, en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.**, in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado Certificate **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ACREDITADO ONAC

ANSI

DIACO S.A. — Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Anexo Certificado / *Certificate*	CSR - CER2649688		
Fecha de Aprobación: / *Approval Date:*	2013-09-27	Fecha Última Modificación: / *Last Modification Date:*	2018-03-09
Fecha de Renovación: / *Renewal Date:*	2016-08-17	Fecha de Vencimiento: / *Expiration Date:*	2022-09-26

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Mufla: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado: *Certificate* **CSR - CER269686**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-09-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilometro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUSADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilometro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilometro 2.5 Via Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibito, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilometro 2.5 Via Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibito, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilometro 2.5 Via Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibito, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilometro 2.5 Via Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibito, Cundinamarca, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER2589688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-09-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mula: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mula: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ½ Pulgada	1 ½ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	**Consecutivo Nº:**	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	**Remisión:**	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	**Cliente:**	HIERROS HB S.A-SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmX6m	**N° Orden:**	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, min.
50	0,25	1,35	0,035	0,04	275	380	16

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900025793-0
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia
PBX: 57-5-3716100
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000316391
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA)

FECHA 26.02.2021
PAG. 1 DE 1

MATERIAL: 1100A1 - Malla#6 N 100a100-4 0.6500 A500C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A500/NTC 4526 GRADO C

LOTE No	0008939195					
COLADA No	5384407					
PESO	2.557,800 kg					
PORCENTAJE DE CARBONO	0,160 %					
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,860 %					
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,020 %					
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %					
LÍMITE ELÁSTICO	443 MPa					
RESISTENCIA MÁXIMA	602 MPa					
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	25 %					

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6629 - CEL. 300 610 17 92

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	LOCALIZACIÓN:	
		COLOR:	AMARILLADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	NOTA:	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ms	Kg	3,534	3,684	3,631	3,573	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,506	6,581	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	5,765	5,894	5,869	5,768	5,789	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,218	0,238	0,248	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,38	11,82	12,34	11,96	11,79
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,59	2034,52	1954,90	1953,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmáx	N	89400	83500	74600	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	5,765	5,894	5,869	5,768	5,789	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m³	1946,59	2034,52	1954,90	1953,49301	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2897000	2942000	2968000	2893000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	199	200	195	199	199	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14611,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,61	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIT. 900891467-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PLACAS ONDULADAS DE FIBRO CEMENTO

Fabricado por **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, en la **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

Manufactured by **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, in the **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4694 (2002)

Placas onduladas de fibrocemento para cubiertas y revestimientos

Fiber-cement corrugated sheets for covering and sheating

SECTOR ICS 91.100.40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "CI-4-PO-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "CI-4-PO-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado CSC - CER326441
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date	2016-08-08	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date	2020-08-14
Fecha de Renovación: Renewal Date	2021-07-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date	2023-08-07

La autenticidad del certificado ya alcance se puede consultar en el correo electrónico clientes@icontec.org

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado por ONAC (el certificado está en el anexo).

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

(El alcance hace parte integral de este certificado)

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado. ICONTEC Avenida Calle 26 No. 69-76 Torre 4 Piso 3 Bogotá D.C. Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A8- AFILIACIÓNES DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

La empresa ***CONSORCIO VIVEURB 2021*** *identificada con Nit nro 901.481.526-3 con número de afiliación* ***9006465****, se encuentra afiliada con la ARL AXACOLPATRIA, desde el 07* ***de Julio*** *y que el personal relacionado a continuación se encuentra afiliado bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, según se describe a continuación:*

IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE INICIO	TASA DE RIESGO
12550976	CC	EDUARDO	JOSÉ	CAYON	MARQUEZ	7/07/2021	6,960%
15704553	CC	LUIS	ALBERTO	VERGARA	CARRASCAL	7/07/2021	6,960%
1065589300	CC	CLARA	INES	CAYON	OCHOA	7/07/2021	6,960%
1006105497	CC	ANDREA	CAROLINA	SANCHEZ	ROJAS	7/07/2021	6,960%
1065607433	CC	GILBERTO	ANTONIO	IBARRA	MEDINA	7/07/2021	6,960%

La presente se expide a solicitud de la empresa, a seis (06) días del mes de julio de 2021.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, con gusto será suministrada en nuestro centro de atención al cliente, 4235757 opción 4

Dirección Operativo
Administradora de Riesgos Laborales
AXA COLPATRIA
Elaborado por DIVE.

ARL | sura

Medellín, 23 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	24/06/2021		29193618	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:54:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 186.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1051908l	ANDRADE GARCIA MIGUEL	08/07/2021		200V1341	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:08:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.166.126, 186.143.41.16, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C72194464	RODRIGUEZ ESCORCIA JOSE LUIS	08/07/2021		35156128	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:09:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.166.126, 190.143.41.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de Junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1006864125	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	22/06/2021		234G3490	DEPENDIENTE
C1081913176	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	22/06/2021		T172846g	DEPENDIENTE
C1063563203	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	22/06/2021		61206228	DEPENDIENTE
C1003291192	FLOREZ GUZMAN DUVAN	22/06/2021		17637237	DEPENDIENTE
C18974763	LOPEZ SUAREZ FERNEL	22/06/2021		ZP423713	DEPENDIENTE
C1064113798	MARIN RIOS RICARDO ANDRES	22/06/2021		15334331	DEPENDIENTE
C19516430	MEJIA RAMOS FRANCO	22/06/2021		16321518	DEPENDIENTE
C12524688	ORTIZ BELEÑO GUILLERMO SEGUNDO	22/06/2021		109*1283	DEPENDIENTE
C12522725	RIOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	22/06/2021		91533614	DEPENDIENTE
C1065586802	RUDA JIMENEZ DANIEL	22/06/2021		13321715	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782117464671

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 186.143.41.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1084109858	ARRIETA HERNANDEZ JULIO	25/06/2021		25s13614	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2021 20:41:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.183.104, 186.143.41.18, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENIJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1094107021	RAMOS ROSADO JEISER	02/07/2021		A2002401	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:11:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12524436	BRACHO PUENTES SAUL ANTONIO	02/07/2021		18422922	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:04:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.129.91, 186.143.61.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
CI 2523254	MUÑOZ BOLIVAR RIQUELME	24/07/2021		402188141	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:12:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Los coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.86, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1064120693	COLINA COLINA GUSTAVO JAVIER	24/07/2021		M2191543	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:08:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 12 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENIJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
CC9291281	ROJAS VANEGAS LUIS HUMBERTO	13/07/2021		18312615	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2021 09:34:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.172.76, 198.143.41.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
CC1354977	CONTRERAS AVILA ANJAR	23/07/2021		16621520	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 16:11:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Los coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de Julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENJAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1079655884	PARENTA RADA JAVIER	23/07/2021		187R1311	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782120371422

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:50:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 168.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001	PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1063287421	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	24/07/2021	34157205		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:15:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.109.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de Trabajo: 0800009001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1064122571 SENCIAL MELO		24/07/2021		32K72101	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:19:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Los coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1076852 2	CANTILLO CADENA ELVIS	23/07/2021	88208255	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 20:06:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Expedido con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C1050458471	CANTILLO CADENA JOSE DEL CARMEN	23/07/2021		2221/8424	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:56:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellin, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C13498018	MORALES VIÑAS JAVIER	23/07/2021		46174126	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 18:14:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.158.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	0,96 %	
C1004120798	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	24/07/2021	18721351		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 10:14:18.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.188.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización	6,96 %	
CC5446836	ZAPATA PEREZ ERLIS ENEBIS	11/08/2021	19158186	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:52:15.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1005122573	MARTINEZ LOPEZ JEAN CARLOS	10/08/2021		19148172	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:25:59
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C1003249M3	CARDENAS RODRIGUEZ NAIR	10/08/2021		L1415520	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:15:57.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5		Porcentaje Cotización 8,96 %	
C1007986071	MIRECHS CABARCAS EDINSON JOSE	11/08/2021		1671B037	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:55:46.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.177.167, 186.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1064109526	VEGA MOJICA EDWIN JOSE	10/08/2021		14571261	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:27:16.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.108.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	6,96 %	
C1064116074	OROZCO JIMENEZ BREYNER	10/08/2021		19624020	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:21:23.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	8,96 %	
C1064710486	ROJAS JIMENEZ CAMILO ANDRES	11/08/2021		12322522	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:53:54.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.187, 190.143.41.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C1092390123	CRIADO GUERRERO JUAN CARLOS	11/08/2021		12946149	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:50:31.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.177.167, 190.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	6,96 %	
C2761166	BELEÑO SARIEGO CARLOS ANTONIO	15/08/2021	222285V9		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 19:32:21.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.108.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12524132	RODRIGUEZ MOYA JOSE	10/08/2021		41169ie4	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 16:18:59.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.106.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12524508	BOLAÑO GARCIA RICHARD	10/08/2021		94245182	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:23:05.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.108.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C12524538	BOLAÑO GARCIA RICHARD	10/06/2021		84245182	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 19:23:05.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.16, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 19 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C12524657	FERNANDEZ QUINTERO EDUARDO	20/08/2021		91196185	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/08/2021 09:02:55.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12587335	JAMIOY HERNANDEZ CARLOS	10/08/2021		52021892	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:14:11.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 19 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C12584583	ORELLANOS RODRIGUEZ HUGO	20/08/2021		417w129*	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/08/2021 15:44:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	8,96 %	
C12685229	DOMINGUEZ DE LA CRUZ ONOBYS ISAIAS	1/08/2021		23062352	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:59:02.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.107, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellin, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1f605652	TETTE DE LA ROSA EBRAITT SEGUNDO	10/08/2021		1251272	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:24:42.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellin, 26 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1899867 3	ROMERO CARRILLO LUIS	27/06/2021		100P2364	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/08/2021 20:43:19.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.106.179.170, 186.143.41.25, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellin, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C1960732	RUEDAZ TORRES EDGAR	10/09/2021	93227221		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:30:38
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.106.170.18, 196.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A9- BITACORA DE OBRA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

BITACORA DE OBRA.

Datos de la obra:

Objeto: Construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio

Localización: Cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar

Contrato de Obra: No 088 de 2021
Valor: $15.977.378.542.00.
Duración: Dieciocho (18) meses.
Fecha de inicio: Dieciocho (18) de Mayo de 2021
Fecha de conclusión: Dieciocho (18) de Noviembre de 2022

Datos del contratista:

Nombre: Consorcio Unidad 2021 La Jagua de Ibirico
Dirección: Carrera 11 # 15 - 66 / Edificio Granahorrar / Oficina 505
Teléfono: 590 1119
Representante legal: Luis Eduardo Cogón Medina

Datos del interventor:
Nombre: ASSII- Ingeniería y Arquitectura S.A.S
Dirección: Manzana D Casa 14 A / Conjunto Cerrado Acuarela
Teléfono: 3004403421
Gerente General: María Fernanda Berg Aragón

Responsable de Obra:
Director de Obra: Jorge Luis Medina.
Residente de interventoría Gustavo Andres Bayuelo Serrano: Gustavo Bayuelo
Residente de Obra: Luis Vergara:

Nota No.001 Fecha: 28/05/2021

Hoy, viernes 28 de mayo de 2021 siendo las 7:30am se da apertura a la bitacora de obra. En la cual se expondrá las actividades realizadas en la construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y una (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la pagoa de Zitivica, departamento del Cesar. Dicho proyecto tiene como meta controlados el inicio y la finalización en un plazo no mayor a 18 meses.

Gustavo Bayona

Nota No.002 Fecha: 28/05/2021

Con esta nota se hace constancia que entre las 8:00am y las 9:00am el contratista realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios del barrio Pollo Hinchante. Donde, además, estuvieron presente representantes de la alcaldía municipal, el presidente de la junta de acción comunal y la interventoría.

Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No 0003 Fecha: 31/05/2021
Personal del contratista, empezó a visitar a los beneficiarios en sus respectivos lotes propios a la altura de las 9:30am. Donde se le pide llevar un acta de poder para que CONTACELSAR adelante el proceso de las escrituras del predio. Además, el contratista verifica que el lote cumple con los requisitos, recolecta información general del lote y realiza las actas de vecindad correspondientes.
Justin Bayona


Nota No 0004 Fecha 31/05/2021
El lote de la beneficiaria Maria Angelica Caro cumple con las dimensiones para la construcción de la vivienda. Sin embargo, la beneficiaria manifiesta que no quiere demoler una sección del predio correspondiente a cocina, habitación, baño y patio ubicado que está construido en material, la que deja un area disponible para construir en el predio de 7.20m de ancho por 4.30m de fondo, lo que imposibilita un nuevo diseño para esta vivienda en especifico.
Justin Bayona

Nota No 0005 Fecha 01/06/2021
El vecino del este del beneficiario Eudaldo Escobar no permite el ingreso a los alrededores de su predio para la realización de las actas de vecindad.
Justin Bayona

Nota No 0006 Fecha 02/06/2021
Con esta nota se hace constancia que a las 11:00 AM llegaron los materiales requeridos para empezar la construcción de la casa modelo, y la ing. empezó el trabajo de soldado del techo el cual fue suspendido a las 2:00 PM por lluvia.

Escaneado con CamScanner

Nota 0007 Fecha: 04/06/2021
A las 10:00 AM inicié la socialización con los beneficiarios del barrio El Progreso y el terreno asignado a cada uno de los beneficiarios en sus respectivos lotes. Donde se encontró que la beneficiaria Yadira Parejo cuenta con un lote que no cumple las dimensiones requeridas (En el Dibujo No 1 se plasman las dimensiones del lote). Por otro lado, el trazado en la casa modelo quedó listo y se iniciaron las excavaciones.

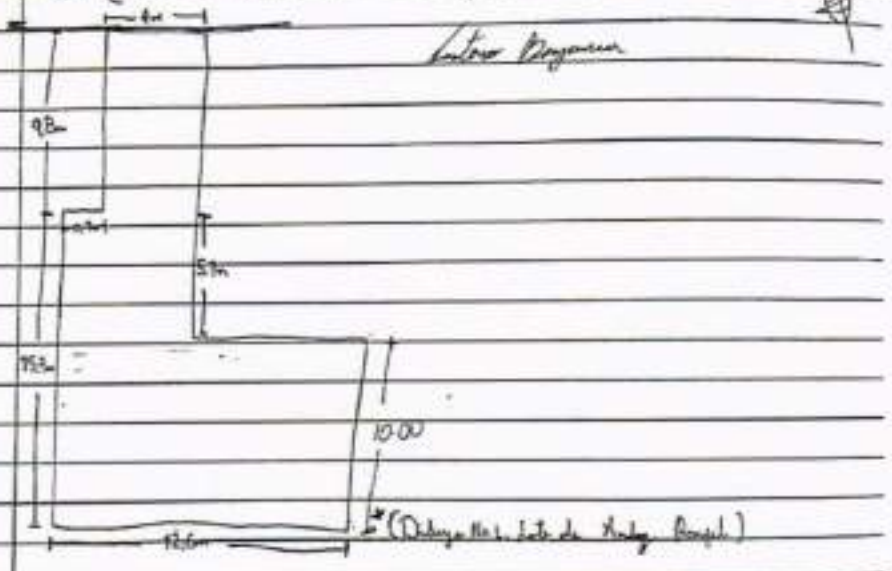

Dibujo No 1. Lote de Yadira Parejo

Nota 10 0008 Fecha: 09/06/2021 Estado del tiempo: Lluvia desde la 1:00PM hasta las 2:30 PM
A las 2:30PM se inició a fundir el concreto correspondiente a las cimentaciones de la casa modelo. Una vez se terminaron las medidas y niveles requeridos.

Nota 10 0009 Fecha: 10/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 auxiliares
Equipos/Herramientas: Pisos compactadores, Vibradores, herramientas menores.
Actividades: Corte del material correspondiente a las columnas, relleno de material excavaciones y trazados.

Nota No 0010 Fecha: 11/06/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 auxiliares
Equipos/Herramientas: Pisos compactadores, Vibradores, herramientas menores.
Actividades: Trazados, Excavaciones, Rellenos.

Escaneado con CamScanner

Nota No 0011	Fecha: 11/06/2021 Se realizó una charla de seguridad al personal en obra. Videos, se hizó entrega de cascos de seguridad, tapabocas, guantes tipo ingenieros, gafas de seguridad y todos en buen estado. Cristian Bayona
Nota No 0012	Fecha: 12/06/2021, Estado del tiempo: Nublado hasta las 3:30 pm Personal en Obra: 4 cuadrillas. Equipo y herramientas: Volqueta, equipo soldadores, mezclador de concreto y herramientas menores. Actividades: Tendido de cimentaciones y relleno de material Cristian Bayona
Nota No 0013	Fecha: 13/06/2021, Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y herramienta: Equipo de soldadura y herramienta menores. Actividades: Instalación de perfiles metálicos. Cristian Bayona.
Nota No 0014	Fecha: 14/06/2021, Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y herramienta: Equipo de soldadura, Vibrocompactador, herramienta menor. Actividades: Instalación de vigas metálicas, excavaciones y [illegible] compactación Cristian Bayona.
Nota No 0015	Fecha: 15/06/2021, Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y herramienta: Vibrocompactador, Equipo de soldadura, tranpa mezclador y herramienta menor. Actividad: En la hora de la mañana se inicia y empieza el lab. del bonificación Costa Rica, se continua el proceso de soldadura de vigas metálicas, se culminaron detalle de soldadura en el refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las cimentaciones correspondientes a una vivienda. Cristian Bayona
Nota No 0016	Fecha: 16/06/2021, Entre las 2:00pm y las 3:30pm no hubo fluido eléctrico en la zona de trabajo. Cristian Bayona

Escaneado con CamScanner

6

Nota No 0017 Fecha: 17/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, herramientas menores
Actividades: Trazado y excavación, soldadura y montaje de estructura, fundido de cimentaciones.
Gustavo Bayona

Nota No 0018 Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores
Actividades: Se realizó trazado y excavación en 3 viviendas y se hizo trabajo de montura de estructura en 2 viviendas.
Gustavo Bayona

Nota No 0019 Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Lluviosa
El trabajo en Obra fue suspendido a las 4:00PM por lluvia
Gustavo Bayona

Nota No 0020 Fecha 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, vibrador, carretillas, herramientas menores.
Actividades: Se hizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se realizó trazado y excavación en 3 viviendas y se fundió una base de concreto ciclopeo en la vivienda del beneficiario Cristo Hernández, este quedó en el día de hoy con un mayor soporte para las cimentaciones.
Gustavo Bayona

Nota No 0021 Fecha 21/06/2021 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores
Actividades: Se realizaron trabajos de soldadura, trazado, excavación y cimentaciones.
Gustavo Bayona

Nota No 0022 Fecha 22/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, vibrador, Mezcladora de concreto y herramientas menores.
Actividades: Se realizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se fundieron las cimentaciones de 1 vivienda y se adelantó trabajo de trazado y excavación en 2 viviendas.
Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota N. 0023 Fecha 23/06/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 5 ayudantes
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, taladro, mezclador de concreto y herramientas menores
Actividades: Se realizó trabajo de trazado, nivelación y excavación en una vivienda, se fundió la cimentación de una vivienda, se realizó trabajo de soldadura en una vivienda y se inició la instalación del tejado de la casa modelo.
Cristian Benjumea

Nota N. 0024 Fecha 24/06/2021
A partir de las 6:00AM iniciaron fuertes lluvias hasta las 9:30AM, a partir de ahí permanecio en zona de intensidad moderada hasta las 10:00AM. El resto del día permaneció medianamente nublado.
Cristian Benjumea

Nota N. 0025 Fecha 25/06/2021
En la ubicación del lote de la beneficiaria Ana Maria Castro se presentó la señora Yesin Vera quien dice ser quien vendió ese lote. La señora Vera asegura que el lote de la beneficiaria esta corrido 1 metro hacia la derecha, por lo que la construcción de la vivienda esta invadiendo 1 metro del lote de la izquierda, que pertenecia al familiar fallecido Ana Maria, quien seria su madre. Luego de hablar con la beneficiaria y los humanos se acordó que en la ocasión del lote el metro invadido será otorgado a la beneficiaria. Por lo que se decide continuar con la construcción.
Cristian Benjumea

Nota N. 0026 Fecha 26/06/2021. Estado del tiempo: nublado. Personal en Obra: 5 ayudantes
Equipo y herramientas: Herramientas menores y equipo de soldadura
Actividades: Se terminaron los preparativos en el lote de la beneficiaria. Ana para poder fundir las cimentaciones y se inicio el trabajo de excavación en el lote de Luis Enrique Montero que en el lote de Jose Urueta se inició la instalación de la estructura metálica.
Cristian Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0027 Fecha 28/06/2023, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla, Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, herramienta menor, Actividades: Traslado de cimentaciones en la vivienda de Viviana Madrid, Cimentacion en la vivienda de Luis Camargo, Pega de bloques de acompañamiento en la vivienda de Isabella escobar, Traslado en el horario el programa de mallas en la vivienda de Angie Ortiz y Dora Martinez. Cristian Bayona

Nota No 0028 Fecha 29/06/2023, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla, Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, retroexcavadora, herramienta menor y Vehiculo. Actividades: Traslado de cimentaciones en la vivienda de Luis Camargo, cimentacion en la vivienda de Angie Ortiz, acompañamiento y relleno en la vivienda de Yeraime Pedraza, levantamiento de muros en la vivienda de Isabella Escobar, Levantamiento de estructuras en la vivienda de Viviana madrid, pintura de cerramiento en la vivienda de Juan Pareja

Cristian Bayona

Nota No 0029 Fecha 30/06/2023, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla, Equipo y herramientas: Formaleta menor, retroexcavadora, vehiculo, Actividades: Se continua con el levantamiento de muros en la casa modelo, relleno y compactacion en la vivienda de Angie Ortiz y Dora Martinez, y se realizaron las preparativos para fundir las cimentaciones en la vivienda de Juan Pareja. Cristian Bayona

Nota No 0030 Fecha 01/07/2023 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla, Equipo y herramientas: Levantamiento de muros en la vivienda de Isabella Escobar, Traslado en la vivienda de Angie Ortiz, relleno en la vivienda de Yeraime Pareja y Yeraime Hernandez, Traslado de cimentaciones en la vivienda de Juan Pareja

Cristian Bayona

Nota No 0031 Fecha 01/07/2023, Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones El traslado de las cimentaciones en la vivienda de juan pareja fue suspendido a la 4:15PM por fuertes lluvias.

Cristian Bayona

Nota No 0032 Fecha 01/07/2023

Al sabado de las 4:30PM inicio la socializacion del barrio Brisas del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para protegernos de la lluvia. Cristian Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota N.0033 Fecha 02/09/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipos y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores
manuales.
Actividades: Se termina de fundir las cimentaciones en la vivienda de Yesica Perez,
se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continua
el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Gustavo Bayonas

Nota N.0034 Fecha 03/09/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramientas menores.
Actividades: Se inicia la instalación de la estructura metalica en la vivienda
de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la
vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria
Yoselin Acosta para fundir cimentaciones. Gustavo Bayonas

Nota N.0035 Fecha 06/09/2021. Estado del tiempo: Nublado. Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Talquista, herramientas menores.
Actividades: Levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y
Yanelis Cabillos, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yenfer Arrieta,
trazados y excavaciones en la vivienda de Dora Martinez

Gustavo Bayonas

Nota N.0036 Fecha 06/09/2021
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por racionamiento
a las 9:00 AM, se informa que retornó el servicio a las 5:00PM
por lo que no se pudo avanzar con los trabajos relacionados
con soldadura.

Gustavo Bayonas

Nota N.0037 Fecha 06/09/2021
Inicia el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Horizonte, el
cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios

Gustavo Bayonas

Escaneado con CamScanner

Nota No 0038	Fecha: 07/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 candidatos Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores. Actividades: se retiraron escombros en la vivienda de doña martha y madeleine Bermudez, fundieron de nuevo en las viviendas de yamile Castillo y juan diaz y terminado en la vivienda de Yudey Rangel. Carlos Bayona
Nota No 0039	Fecha: 08/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 candidatos Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, vibrador, herramientas menores. Actividades: Excavacion en la vivienda de Yudey Rangel, instalacion de estructura metalica en la vivienda de yenifer Parada, Alba en la vivienda de Madeleine Bermudez y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Dora Gordillo.
Nota No 0040	Fecha: 09/07/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 candidatos Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, herramientas menores Actividades: fundicion de estructuras en la vivienda de Dora martinez, retiro de escombros en la vivienda de Yury Jimenez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yudey Rangel, fundicion de muro en la vivienda de Juan Diaz.
Nota No 0041	Fecha: 10/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 candidatos Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, vibrador y herramientas menores. Actividades: fundicion de estructura en la vivienda de Yudey Rangel. Excavacion en la vivienda de Yuris Granados y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Madeleine Bermudez, la cual no completaron por que se quedo sin el mezclador de concreto.
Nota No 0042	Fecha: 12/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. personal en Obra: 4 candidatos Equipo y herramientas: vibrador, equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto y herramientas menores. Actividades: se continuo con la instalacion de la estructura metalica en la vivienda de Yudey Rangel con la fundicion del concreto de cimentacion en la vivienda de Madeleine Bermudez, Alba Competencias y terminado con la vivienda de Yuris Jimenez y fundicion de muros en la vivienda de Juan Diaz.

Escaneado con CamScanner

Nde B. 0043	Fecha: 08/07/2021 Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Valle Grande a la altura de los 5:30PM Carlos Bayona
Nde B. 0044	Fecha: 12/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metálica en la vivienda de Yesica Granados y Madelaine Hernandez. Se rellenó y compactó el lote de Yovana Pabon y Nidelys Ramirez, Evacuamos en la vivienda de Jorge Jimenez y se continuó con el levantamiento de muros. Tambien se fundió concreto ciclopeo en la casa de Jorge. Carlos Bayona
Nde B. 0045	Fecha: 14/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se realizaron las evacuaciones en la vivienda de Nidelys Ramirez, Jenifer Ortiz y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de los Jimenez. De igual forma se continuó con el levantamiento de muros. Carlos Bayona
Nde B. 0046	Fecha: 15/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metálica en la vivienda de los Jimenez y se empezó en relleno de lotes y evacuaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Nidelys Ramirez. También se encontró que los muros de esta vivienda se estaban colocando de forma errónea. Se capacitó encargado el levantamiento de muros. Carlos Bayona
Nde B. 0047	Fecha: 16/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metálica en la vivienda de Nidelys Ramirez, se empezó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Jenifer Ortiz. Carlos Bayona
Nde B. 0048	Fecha: 19/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se empezó en las evacuaciones de la vivienda de Yovana Pabon y Oscar Baldovino. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Baldovino y se continuó avanzando con el levantamiento de muros. Carlos Bayona
Nde B. 0049	Fecha: 19/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se fundió un cabezal para que sirva de base para las cimentaciones de Yovana Pabon se empezó en relleno de lotes, levantamiento de muros y estructura. Carlos Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No 0050	Fecha: 20/03/2021. Estado del tiempo: Despejado Se arregla en relleno de lotes, levantamiento de muros y se fundieron los cimientos en la vivienda de Yorsina Polo. Cristian Bayona
Nota No 0051	Fecha: 22/03/2021. Estado del tiempo: Despejado Se arregla en trabajos de relleno y compactación de lotes, se inicio el levantamiento de muros en la vivienda de Magnolia y Ruth Perez. Tambien se inicio el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo se encontró que el dimensionamiento de las columnas no es el que corresponde a la obra, se pospone el lote de Luis Avila para ser fundido el dia siguiente, se reconocieron y reforzo listones. Cristian Bayona
Nota No 0052	Fecha 22/03/2021. Estado del tiempo: Despejado Se arregló el trabajo de relleno y compactación en el barrio Brisas del Norte, se arregló el levantamiento de muros en las viviendas de Magno Nibia, Jose Urueta, Juan Diaz y Coste Rica. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila. Cristian Bayona
Nota No 0053	Fecha: 23/03/2021 Se arregló el trabajo de relleno, compactación y trazado en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron los cimientos en la vivienda de Juan Gutierrez y se arregló el levantamiento de muros en las viviendas de Coste Rica, Viviana Mendiel, Magno Nibia y Jose Urueta Cristian Bayona
Nota No 0054	Fecha: 24/03/2021. Clima: Despejado El dia sabado 24 de julio se dejaron terminados arreglados y una estructura metalica mas alzada. Sin embargo, durante el fin de semana hubieron fuertes lluvias lo que dañó los cimientos y arreglos realizados inclusive se inundo medio dia de retraso aproximadamente. Cristian Bayona

Escaneado con CamScanner

Fecha: 26/09/2021 Ana Deppado
Se avanzó en trabajos de tapado, nivelación y compactación. El equipo de soldadura retomó estructuras ya instaladas para la instalación de los cercos y se avanzó en el levantamiento de muros.
Carlos Bayona

Fecha: 26/09/2021
Mediante esta acta se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo José Goyeneche Marquez.
Carlos Bayona

Fecha: 27/09/2021
Se avanzó en trabajos de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y la instalación de cercos en estructuras faltantes. En el barrio Brisas del Norte se fundió una base de construcción en concreto exclusivo para dos viviendas. Adicionalmente se pintó con anticorrosivo los cercos de algunas viviendas.
Carlos Bayona

Fecha: 27/09/2021
Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron al menos 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñada.
Carlos Bayona

Fecha: 29/09/2021 Ana Deppado
Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Brisas del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de cercos y levantamiento de muros en Brisas del Norte.
Carlos Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No 0060 | Fecha: 29/07/2021. Obra: Mariana
Se arregló con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el traspaldo de una cuarta vivienda. Se arregló el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se estableció y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.

Nota No 0061 | Fecha: 30/07/2021. Obra: Despacho
Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte, Hicieron un empalme de aguas para el levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.

Nota No 0062 | Fecha 31/07/2021. Obra: Despacho
Este día sábado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de Brisas del Norte

Nota No 0063 | Fecha 02/08/2021; Obra: Despacho
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldaduras, levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se estableció una vivienda del barrio Villa Esperanza.

Nota No 0064 | Fecha 03/08/2021. Obra: Mariana
Se continuó con trabajos de excavación y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuerte lluvias.

Nota No 0065 | Fecha 04/08/2021. Obra: Despacho
Se levantó la estructura metálica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se rellenaban, fundaban y estableían otras 3 lotes del mismo barrio.

Escaneado con CamScanner

Nota No 0060	Fecha: 29/07/2021. Cine: Ilusione Se avanzó con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el lanzado de una nueva vivienda. Se avanzó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bella Alborada y en el barrio Villa Esperanza se retiró y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.
Nota No 0061	Fecha: 30/07/2021. Cine: Despacho Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se avanzaba de segundo frente en levantamiento de muros y la adecuación de cuatro (4) estructuras faltantes.
Nota No 0062	Fecha 31/07/2021. Cine: Despacho Este día sábado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de brisas del Norte
Nota No 0063	Fecha 02/08/2021. Cine: Despacho Este día no hubo trabajo de ningún tipo en cuanto a soldaduras, levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se retiró una vivienda del barrio Villa Esperanza.
Nota No 0064	Fecha 03/08/2021. Cine: Ilusione No continuó con trabajos de excavación y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Cenon en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuerte lluvias.
Nota No 0065	Fecha 04/08/2021. Cine: Despacho Se levantó la estructura metálica en el barrio Brisas del Norte, Mientras se culminaban excavaciones y estabilizaban otras 2 lotes del mismo barrio.

Escaneado con CamScanner

Fecha: 05/08/2021 Obra: Deprisa
Se arranca en la instalación de la red hidrosanitaria de las viviendas Ventilación Entrada, junto con la instalación de las cubiertas de la vivienda y la fundida de la losa del baño. Por otro lado se fundió concreto y bloque en el barrio Brisas del Norte y Cantarana y Villa esperanza.
Carlos Reyes

Fecha: 06/08/2021 Obra: Hospicio
Se empezaron a realizar las instalaciones eléctricas en las viviendas de Ventilación Entrada y Entrada Colonia, junto con el vaciado de concreto para la plantilla de las viviendas. También se arranca en trabajo de pañete y terminaciones de baño. Sin embargo, las actividades fueron suspendidas a las 2:30pm por fuerte lluvias.
Carlos Reyes

Fecha: 09/08/2021 Obra: Deprisa
Se fundieron cimentaciones en la vivienda de Wilson Sanchez y se levantaron estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte.
Carlos Reyes

Fecha: 09/08/2021 Obra: Deprisa
Se continuó la instalación de correas metálicas en estructuras del barrio el progreso y se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte.
Carlos Reyes

Fecha 10/08/2021 Obra Deprisa.
→ en el día de hoy se presento manifestaciones por parte de la Comunidad, presidente de las acciones Comunales de los Barrios Barrio Horizonte, 13 de febrero, villa esperanza donde alegan que el Consorcio vive que no están Cumpliendo con el Compromiso de ofrecer trabajos a los habitantes del Sector ó municipio de la jagua, también manifiestan que los pactos entre el consorcio y los trabajadores

16

no es justo y digans para ellos tal el motivo ellos tomaron la decisión de paran todo tipo de trabajo de obra, que este realizando el Consorcio hive vers en los barrio Bello Horizonte y el progreso, antes del mediodía, vella esperamos al punto se llegue a una reunion entre las partes para Conciliar todas peticiones hechas por ellos.

nota: al ing. eduardo Cayon les manifestó por vía telefonica que se realizara un acta donde ellos (comunidad) paran las obras por los motivos expuestos para así no Afectar la programacion y ejecucion de las actividades, donde ellos no Aceptaron firmar ningun acta, pero manifestaron que no dejaran trabajar a ninguno del consorcio hasta que se presente la reunión y tengan un Concilio ante las partes.

Arq. Luis Vargas R.
R. Vive CRS.

Nota No 0071 Fecha: 12 de agosto de 2021. Estado del tiempo: Lluvioso los alrededores campo fueron intervenidos hoy fuimos a partir de las 7:00 AM. Con la novedad de la renuncia del residente de obra. Por lo que momentaneamente la dirección y/o ejecución de la obra esta a cargo del inspector de la obra Ramiro de la Hoz y el director de la obra Eduardo Cayon.

Ramiro de la Hoz

dd 0092 Fecha: 12/08/2021, Clima: Llovio
En el día de hoy se retomaron actividades correspondientes a rellenos, compactación y excavaciones en los barrios Brisas del Norte y Villa Esperanza. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanza en el trabajo de las instalaciones eléctricas y se fundieron plantilla en 2 viviendas. Sin embargo, las actividades se suspendieron a las 3:30 PM por fuertes lluvias.

Gestora Bayona Ramiro de la hoz.o

dd 0093 Fecha: 13/08/2021. Clima: Despejado
Por razones de lluvia del día anterior, se dañaron todas las excavaciones de las viviendas que estaban listas para fundir por lo que se tuvo que realizar el trabajo de nuevo. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanzó en las cimentaciones de dos viviendas.

Gestora Bayona Ramiro de la hoz.o

dd 0094 Fecha: 14/08/2021. Clima: Despejado
Por causa de las lluvias durante el fin de semana se tuvo que volver a iniciar las actividades de excavaciones por lo que no se ha podido fundir cimentaciones.

Gestora Bayona

dd 0095 Fecha: 18/08/2021. Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
En el barrio Bella Horizonte se adelantó trabajo de relleno de aguas en algunas viviendas, fundición de losa del baño y se realizaron excavaciones y trazado en el barrio 17 de febrero.

Gestora Bayona

dd 0096 Fecha: 19/08/2021. Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
se fundieron las primeras cimentaciones de la semana en el barrio Villa Esperanza, mientras en el barrio Bella Horizonte se continuo con la instalación de aguas negras, fundición de losas de baño y mejoras

Gestora Bayona Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

18

Nota N. 0077 Fecha: 20/08/2024, Ama: Dayana
se avanzó en el trabajo de instalación de tejados en el barrio Bella horizonte. Se fundieron cimentaciones en el barrio Bosques del Norte; se hicieron estructuras metálicas y mampostería en el barrio Nueva Esperanza. De igual forma, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Nueva esperanza y en el barrio el progreso se adelantó el trabajo de fundición de losas de techo.

Cristina Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0078 Fecha: 23/08/2024, Ama: Dayana
En el barrio Bella horizonte se avanza en trabajos de instalación de puertas y ventanas, pintura de pueblos metálicos y levantamiento de muros. De igual forma, en el barrio El Progreso se avanza en levantamiento de muros y la instalación de tejados. Se fundieron también las cimentaciones de la tienda Tulia Zlotnik.

Cristina Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0079 Fecha: 24/08/2024 Ama: Dayana
Se fundió la plantilla del beneficiario Cristo Rey, también se avanzó con la instalación de puertas y ventanas en Bella Horizonte, levantamiento de muros en el barrio El Progreso y trazado, relleno y compactación en el barrio 17 de febrero. Ramiro de la hoz.o

Cristina Bayona

Nota N. 0080 Fecha: 25/08/2024, Ama: Natalia
se instalaron puertas y ventanas sanitarias en el barrio Bella Horizonte, se fundieron cimentaciones y se trazaron lotes en el barrio 17 de febrero y en el barrio el progreso se continuó levantando muros e instalando tejados.

Cristina Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0081 Fecha: 26/08/2024
Se realizó la primera supervisión del avance de obra del proyecto en conjunto entre la alcaldía, Comfacesar, el contratista e interventoría.

Cristina Bayona
Contratista

Escaneado con CamScanner

L 6 0082 Fecha: 27/08/21 Clima: Despejado
Se realizaron calicos y excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se le hicieron retoques a los acabados de la casa modelo y se fundió plantilla en otras viviendas. En el barrio El progreso y Brisas del Norte se avanzó con el trabajo de levantamiento de muros.

Gestor Bayona Ramiro de la hoz.o

L 6 0083 Fecha: 28/08/21 Clima: Despejado
Con este acto se da constancia de que el día 26 de agosto de 2021 se realizó la socialización del barrio Luis Carlos Galan en el parque de dicho barrio y con la participación de todos los beneficiarios y el contratista.

Gestor Bayona Ramiro de la hoz.o

L 6 0084 Fecha 30/08/21 Clima: Nublado
En el barrio Bello Horizonte se inicia la definición de acabados del beneficiario Cristo Rey, la instalación del techo de la beneficiaria Doris Montero. Mientras que en el barrio 17 de febrero se avanzó con el calicoo y compactación de lotes, excavaciones y se fundieron los cimientos de una vivienda.

Gestor Bayona Ramiro de la hoz.o

L 6 0085 Fecha 31/08/21, Clima: Lluvioso
Se adelantaron las excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se instalaron redes eléctricas y se fundió plantilla de una vivienda.

Gestor Bayona Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

N Nota de campo	Fecha: 01/09/21. Clima: Humedo Se adelanto el trabajo de levantamiento de muros en los barrios Brisas del Norte y el progreso. Mientras que en Bella Horizonte se fundio una plantilla y se adelanto los acabados de una vivienda Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. D
Nota de campo	Fecha: 02/09/21. Clima: Despejado
N	En el barrio Bella Horizonte se fundio plantilla en una vivienda mientras que en otras se adelanto el trabajo de acabados. En dos barrios se continuó el levantamiento de muros. No se han fundido instalaciones ni levantado nuevas estructuras Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. D
N Nota de campo	Fecha: 03/09/21. Clima: Despejado En el barrio Bella Horizonte se continuó fundiendo plantilla en diversas viviendas junto con redes hidrosanitarias y electricas mientras en los demas barrios intervenidos se continua con
N	el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. D
Nota de campo	Fecha: 06/09/21. Clima: Despejado En el barrio Bella Horizonte se avanza en la instalación de puntos hidraulicos de acabados y fundición de plantilla. Mientras que
N	en el barrio el progreso se instalaron redes hidrosanitarias y electricas y en los demas barrios se continua el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. D
Nota de campo	Fecha: 07/09/21. Clima: Humedo En el barrio El progreso se adelantó la instalación de redes
N	hidrosanitarias y electricas. Aplicación de acabados y fundición de plantilla. De igual forma, el contratista avanzo de manera significativa en la aplicación de anticorrosivo en las varillas de la estructura y la instalación de los tirados para proteger las estructuras Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. D

Escaneado con CamScanner

Fecha 07/09/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en obra fueron suspendidos al rededor de las 3:00PM por fuertes lluvias.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Fecha: 08/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el trabajo de hormigueado de interiores metálicos en el barrio Villa Esperanza. Con las viviendas de Blanca Galvis, Lucas Mieres y Tula Tobías. Esta última la cual había sido suspendida por disgustos en el lote. Sin embargo, la alcaldía de la mano de Miguel Rivera dieron el aval para continuar la misma.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Fecha: 09/09/21, Clima: Despejado
se continuó el hormigueado de muros en los barrios Villa Esperanza, 17 de febrero y Brisas del Norte. Se fundió placa-piso en el barrio El progreso y Villa esperanza. En el barrio Bella Horizonte se continuo con la división de acabados y la instalación de puertas.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Fecha: 10/09/21 Clima: Despejado
Se continuó con la instalación de tejados, redes hidrosanitarias eléctricas y la fundición de placas de techo.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Fecha: 11/09/21, Clima: Despejado
En los barrios Bella horizonte y el progreso se trabajo acabados y mampostería al igual que en los barrios Brisas del norte y Villa esperanza.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Fecha: 12/09/21
Durante todo el día no hubo fluido eléctrico en la ciudad, lo que atrasó todo el cronograma de actividades de la obra, debido a que se depende en gran medida de los soldadores.

Gustavo Bonjorno Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Nota No 0099	Fecha: 14/09/2021, Clima: Despejado Se continuó levantando muros en todos los barrios donde se está trabajando, a excepción del 17 de febrero donde se fundieron cimentaciones. En el barrio Bella Horizonte se fundió una plantilla. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o
Nota No 0098	Fecha: 15/09/2021, Clima: Despejado Se continuó el levantamiento de muros en otros frentes de trabajo se encuentran fundiendo plantillas y por otros fundiendo cimentaciones a la vez, se avanza en la definición de alcobados. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o
Nota No 0099	Fecha: 16/09/2021, Clima: Despejado En el día de hoy solo se adelantó el trazado y excavación de una vivienda en el 17 de febrero se aplicó pintura a algunos enchapes y perfiles metálicos. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o
Nota No 0100	Fecha: 16/09/2021, Clima: Lluvioso Durante toda la jornada de la tarde se fue posible trabajar en campo debido a fuertes lluvias. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o
Nota No 0101	Fecha: 17/09/2021, Clima: Despejado En el barrio El Paraguas avanzó el trabajo de definición de enchapes, enchape de zonas humedas y la instalación de cableado eléctrico. Mientras que, en Brisas del Monte se adelantó y fundió la plantilla de una vivienda. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o
Nota No 00102	Fecha: 20/09/2021, Clima: Despejado Se fundieron cimentaciones en el barrio 17 de febrero donde también se levantó una estructura. Mientras que en los barrios Villa Esperanza y Brisas del Monte se enlucieron zonas humedas y se instalaron aparatos. Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Ficha N. 0104 Fecha: 21/09/21. Clima: Despejado
Se fundieron los cimientos de la bodega en Anglica Cano, la cual tardó porque no había domicilio ni vivienda hasta que personal de la alcaldía se la solicitó. En otra fuente de trabajo se fundió plantilla, enchapo zona humedas y se instaló cableado eléctrico.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. C

Ficha N. 0105 Fecha: 22/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bella Horizonte se y el progreso se instalaron puertas y ventanas, mientras que en el 17 de febrero se trajo y encasó una vivienda y se levantó la estructura de otra. En Bella Horizonte se fundió la plantilla de Doña Norbey

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. C

Ficha N. 0105 Fecha: 23/09/21 Clima: Despejado
En el barrio 17 de febrero se fundió un cimiento. En Bella Horizonte y El Progreso se instalaron puertas y ventanas. En Brisas del Norte y Villa Esperanza se enchapó zonas humedas y se trabajó en la definición de acabados.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. C

Ficha N. 0106 Fecha: 24/09/21. Clima: Nublado (no afectó)
Se avanzó en la instalación de puertas en el progreso En el 17 de febrero se trajo y encasó otra vivienda y en Brisas del Norte se continuó levantando muros y se fundió una plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. C

Ficha N. 0107 Fecha: 25/09/21. Clima: Despejado
Se avanzó el trabajo de pintura en anticorrosivo en rejilla instalada.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. C

Ficha N. 0108 Fecha: 27/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Villa Esperanza se avanzó en la definición de acabados, enchapado e instalación de accesorios. En el 19 de Mayo se fundió un cimiento

Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0109 Fecha: 29/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bosque del norte se continuó el levantamiento de muros y fundición de plantillo. En el 17 de febrero se trabajó y excavo en lote.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Nota No 0110 Fecha: 29/09/21, Clima: Nublado
No fueron encontrados en el 17 de febrero. Donde también se cultivó unos lotes y se empezó levantamiento de muros. En el barrio Bosque del Norte se fundió plantillo y, en Villa Esperanza se empezaron los excavados e instalación de accesorios.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Nota No 0111 Fecha: 29/09/21, Clima: Nublado
Las actividades en la jornada de la tarde se suspendieron por fuerte lluvias.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Nota No 0112 Fecha: 30/09/21, Clima: Despejado
Se trabajo excavo en el barrio 17 de febrero y vivienda, se fundió cimientos.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Nota No 0113 Fecha: 04/10/21, Clima: Despejado
No se registraron actividades en campo durante el día
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Nota No 0114 Fecha: 05/10/21, Clima: Despejado
Durante el día se hizó un recorrido visitando a viviendas recogiendo basuras dejadas. También se trabajó en el levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte, 17 de febrero y Brisas del Nor
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.

Escaneado con CamScanner

Fecha: 06/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la Hoz O
Se trabajó únicamente levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero y trabajo de acabados en el barrio Bella Horizonte en la vivienda de Dora Mabey

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Fecha: 07/10/21, Clima: Despejado
Durante la jornada completa se trabajó Gustavo en las mismas actividades y viviendas del día anterior

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Fecha: 11/10/21, Clima: Despejado
Durante los días 08, 09, 10 No se realizaron actividades en campo por falta de material. El día de hoy solo se reanudó el trabajo de levantamiento de muros en el 17 de febrero.

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Fecha: 12/10/21 Clima: Nuboso
Se trabajó el trazado y excavación en la vivienda de Orlando Nieto (17 de febrero) y Wilmer Pico (El Golán). También se levantó el sistema estructural metálico de las viviendas de Jorge Sandoval y Nathan Koco (17 de febrero). Las actividades en campo se suspendieron a las 3:40PM por lluvias

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Fecha: 13/10/21, Clima: Nuboso
En el barrio el progreso se realizaron cajillas de inspección. Mientras que en el 17 de febrero se continuó levantando mampostería y se realizaron las cimentaciones de Orlando Nieto. Se firmó el acta de vecindad que permite construir la vivienda de Tania Jimenez, pegada de arriba. Se suspendieron actividades a la 4:00PM por lluvias

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Escaneado con CamScanner

26

Nota N. 0120 Fecha: 14/10/21 Clima: Despejado Ramiro de la Hoz. O
Se levantó la estructura metálica de la beneficiaria Ana Darian en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galán se trasportaron, excavaron y fundieron 2 viviendas.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O


Nota N. 0121 Fecha: 15/10/21 Clima: Despejado
Se le realizó inspección puntual al contratista Primero Ingeniería para verificar el manejo de las alcantarillas, mallas y fundir las excavaciones dejando utilizar ladrillos debidamente cocidos. Tercero, utilizar el nivel correcto para fundir las viviendas y evitar inundaciones.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota N. 0122 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado
Se levantaron las estructuras metálicas y se trasportaron, excavaron, instalaron y fundieron 2 viviendas. Se continua el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero junto con las losas de techo.

Cristian Benjumea Ramiro de la Hoz. O

Nota N. 0123 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado
Se presentó una particularidad en el lote de la beneficiaria Tania Jimenez en el barrio Luis Carlos Galan. Donde la vivienda tal cual está diseñada no cabe en el lote.

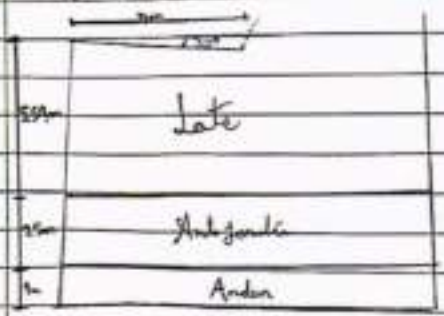

* El dibujo no está a escala

Ramiro de la Hoz. O

Cristian Benjumea

Mz A 0124 Fecha: 16/10/21 Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones del beneficiario Edilser Pedroza ubicado en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Bayonas Ramiro de la hoz.O

Mz A 0125 Fecha: 19/10/21 Clima: Despejado
se trabajó en los acabados de los beneficiarios de Juan Granados y Luis Avila en el barrio El Progreso Adicional se continuó el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galan se fundieron las cimentaciones de 2 viviendas.

Gustavo Bayonas Ramiro de la hoz.O

Mz A 0126 Fecha: 20/10/21 Clima: Nublado
Se trabajó en los acabados de la beneficiaria Josefina Ortega. Se instaló la ventanería a la vivienda de Martha Dominguez. En el barrio 17 de febrero se continuó el levantamiento de muros y se trabajaron excavaciones y entablaron 3 viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Se suspendieron las actividades entre las 2:00 pm y 3:00 pm por lluvia.
Gustavo Bayonas

Mz A 0127 Fecha: 21/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se fundieron las cimentaciones de los beneficiarios Alba Cruz y Nelson patiño. se trabajó excavó la vivienda de esperanza Julio. Se instalaron las ventanas a Martha Dominguez y se instaló el cableado electrico a Josefina Ortega. En el barrio 17 de febrero se trabajo en el levantamiento de muros y en Villa esperanza se trabajó en los acabados

Gustavo Bayonas Ramiro de la hoz.O

Escaneado con CamScanner

Nota N.128 Fecha: 22/10/21, Clima: Despejado
Se llegó y ejecutó la vivienda de Jaimen Villarreal y se fortificaron las columnas de esperanza Salazar, Alegría se encargó con el levantamiento de mureros en el barrio El Carmen.

Gustavo Bayuelo Ramos de la hoz D.

Nota N. 129 Fecha: 23/10/21 Clima: Despejado
Se fortificaron las columnas de la beneficiaria Mirelis Martínez y a la vez se continuó el levantamiento de mureros en el barrio Alcalá.

Gustavo Bayuelo Ramos de la hoz. D

Nota N. 130 Fecha: 25/10/21, Clima: Despejado
Mediante esta nota se hace constar que tanto como el contratista, como interventoría y personal de la alcaldía, le hicieron cobro a la beneficiaria Lady Martínez que no demoliera su vivienda, hasta que se dijeramos nuestra situación, ya que el lote no cumple con las medidas. Sin embargo, la beneficiaria demolió su vivienda por sugerencia de un concejal llamado "Víctor Ballesta" Asistente, la beneficiaria se encuentra pagando arriendo.

Gustavo Bayuelo Ramos de la hoz. D

Nota N. 0131 Fecha: 26/10/21, Clima: Despejado
Se trabajo únicamente en el levantamiento de mureros en los barrios 17 de febrero y el galan Xdeen, se reportó material de relleno en los puntos donde se requería

Gustavo Bayuelo Ramos de la hoz. D

Nota N. 0132 Fecha: 27/10/21, Clima: Lluvioso
Se continuó el tramo de levantamiento de Muros en el barrio El Carmen donde también se rellenaron varias viviendas (3 Und). Se instaló el tejado de Lucinda Martínez y en el barrio el progreso se trabajo en cerchados y se instaló un cubierta plástica que Eduardo Hoyos dio.

Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Nota N. 0133 Fecha: 27/10/21 Area: Unión
Los trabajos en campo estuvieron suspendidos por la mañana debido a fuertes lluvias

Gustavo Bonjour Ramiro de la hoz. O

Nota N. 0134 Fecha: 28/10/21 Area: Despacho
Se fundieron las cunetas de la beneficiaria Ramona Villareal del barrio Luis Carlos Galán. Donde también se nivelaron y compactaron 4 dalientes latin.

Gustavo Bonjour Ramiro de la hoz. O

Nota N. 0135 Fecha: 29/10/21 Area: Despacho
Se continuó con el nivelado y compactación de diferentes viviendas en el barrio Luis Carlos Galán. Donde también se subieron escaleras.

Gustavo Bonjour Ramiro de la hoz. O

Nota N. 0136 Fecha: 30/10/21 Area: Despacho
Se fundieron las cunetas de la beneficiaria Edna Paloza y en el barrio Villa Horizonte se avanzó con el trabajo de la instalación de muro drill y la instalación de tanque de agua. También se fundió las cunetas de Gabriell Jimenez.

Gustavo Bonjour Ramiro de la hoz. O

Nota N. 0137 Fecha: 02/11/21 Area: Despacho
El viaje trabajo registrado en campo fue la instalación de tejados en el barrio 17 de febrero y la instalación de muro drill en el barrio Villa Horizonte

Gustavo Bonjour Ramiro de la hoz. O

Escaneado con CamScanner

Nota N.0139 Fecha: 03/11/21, Clima: Despejado
El unico trabajo registrado en campo fue la conexión de detalles en losa de techo de algunas viviendas y se entregó el cableado de una vivienda en Villa Esperanza.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota N.0139 Fecha 09/11/21, Clima: Despejado
se adelantó trabajo de instalación de acometida electrica y se fundió la plantilla de una bodeguería en el barrio Bella Horizonte.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota N.0140 Fecha: 10/11/21, Clima: Despejado
se avanzó con la instalación de techos de viviendas que ya estaban levantadas en estructura y se preparaban otras viviendas para fundir plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Nota N.0141 Fecha: 11/11/21, Clima: Despejado
se trajo la primera vivienda del barrio Juan Pinto, mientras que en el barrio el golan se levantaron dos estructuras metalicas y se fundió una plantilla en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Benjumea

Nota N.0142 Fecha: 12/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.o
En el barrio Villa Esperanza se fundieron la plantilla de una vivienda. En el barrio El Golan se fundió la cimentación de una vivienda y se levantaron la estructura metalica de 2 viviendas. Tambien se inició el levantamiento de muros en 5 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Fecha: 13/11/21. Cliente: Departado
Se levantó la estructura metálica de 3 viviendas en el barrio El Golan y se instaló el techo de 1 vivienda

Carlos Benjumea Ramiro de la hoz o

Fecha: 16/11/21 Cliente: Departado
Se instalaron dos techos en el barrio el golan. y se fundió una plantilla en el barrio el golan. Donde también se rellenó y se encofró otra vivienda

Carlos Benjumea Ramiro de la hoz o

Fecha: 17/11/21 Cliente: Departado
Se inició el levantamiento de muros en dos nuevas viviendas y se fundió una cimentación en el barrio El Golan y otra en el barrio Juan Pablo, donde también se trazó y encofró otra vivienda

Carlos Benjumea

Fecha: 18/11/21. Cliente: Departado Ramiro de la hoz o
Se funde una plantilla en el barrio Villa Esperanza. En el golan se levantaron dos estructuras metálicas y se instalaron 3 viviendas y también se fundió 3 losas de techo y una cimentación

Carlos Benjumea Ramiro de la hoz o

Fecha 19/11/21. Cliente: Departado
Se fundió una cimentación en el barrio Juan Pablo y otra en el Juan Pablo Golan. Se instalaron 2 techos y se realizó levantamiento de otra vivienda y se levantó una estructura metálica

Carlos Benjumea Ramiro de la hoz o

Fecha 22/11/21. Cliente: Hunicar
Durante la mañana se replantearon 2 viviendas para fundir cimentación y 1 para plantillo para los trabajos se suspendieron por fuerte lluvias en la tarde.
Carlos Benjumea Ramiro de la hoz o

Escaneado con CamScanner

Nota No 149 Fecha: 22/11/21
Han llegado reportes de que todos los lotes del barrio Villa olvido tienen un ancho de frente de entre 5.5-6.1m lo que no es suficiente para la construcción de la vivienda.

Gestora Bonjemos. Ramiro de la hoz.o

Nota No 0150 Fecha: 23/11/21 Hora: Despejado
Se continuó el enchape de varias viviendas y se fundió una plantilla del barrio 17 de febrero. Además se avanzó en la pintura de la fachada de las primeras viviendas.

Gestora Bonjemos Ramiro de la hoz.o

Nota No 0151 Fecha: 24/11/21
Se realizó la socialización al barrio Pedro Castro

Gestora Bonjemos Ramiro de la hoz.o

Nota No 0152 Fecha: 24/11/21 Hora: Despejado
Se continuó con la pintura de las primeras viviendas y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero y se fundió una cimentación en el barrio Juan Romero

Gestora Bonjemos Ramiro de la hoz.o

Nota No 0153 Fecha: 25/11/21, Hora: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una vivienda en el barrio Juan Romero y una plantilla en el barrio 17 de febrero

Gestora Bonjemos Ramiro de la hoz.o

Nota No 0154 Fecha: 29/11/21.
Se realizó la segunda supervisión técnica a las primeras 22 viviendas que estan entre un 95% y 98% de ejecución. En compañía con el supervisor de Confacesar y la alcaldía.

Gestora Bonjemos

Supervisor Confacesar

Escaneado con CamScanner

Vb B. 0155 Fecha: 30/11/21, Clima: Despejado
se fundieron dos plantillas (1 en el 17 de febrero y otra en el galan). También se levantó una estructura metalica en el galan y otra en Juan Ramón. Además, se trabajó en culminar los detalles pendientes de las primeras viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz-0

Vb B. 0156 Fecha: 01/12/21 Clima: Despejado
Se inició el relleno del lote de una beneficiaria faltante en el barrio Brisas del Norte y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz-0

Vb B. 0157 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
Se levantaron 2 estructuras metalicas en el barrio Juan Ramon. Se instalaron puertas y ventanas en los barrios Brisas del Norte y Bella Horizonte. En el barrio 17 de febrero se fundió una plantilla.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz-0

Vb B. 0158 Fecha: 03/12/21, Clima: Despejado
se fundió una plantilla en el barrio bella horizonte. Oficialmente el contratista decidió no fundir mas viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz-0

Vb B. 159 Fecha: 06/12/21, Clima: Despejado
Se avanzó en el trabajo de acabados de las primeras viviendas que habian quedado atras. Junto con la instalación de puertas, ventanas, levantar y accesorios. Se fundio una plantilla en Bella Horizonte

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz-0

Escaneado con CamScanner

Nota No 160	Fecha: 10/12/21, Clima: Despejado Se cobbiaron viviendas en el barrio Villa Esperanza, donde también se corrigieron algunos detalles de acabados. Se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D
Nota No. 161	Fecha: 13/12/21, Clima: Despejado se fundieron 2 plantillas en el barrio el galan. También se replantearon otras 2 viviendas mas para fundir plantilla. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D
Nota No. 162	Fecha: 14/12/21, Clima: Despejado En el barrio el galan, se fundieron 2 plantillas, Mientras que en el barrio Brisas del Norte se trabajo en acabados de 2 viviendas. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D
Nota No. 163	Fecha: 15/12/21, Clima: Despejado En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. También se realizaron las ultimas correcciones en dos primeras viviendas que se deben entregar Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D
Nota No. 164	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. Se continuó el trabajo de acabados en Brisas del Norte. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D
Nota No. 165	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado Oficialmente, la interventoría le recibió 29 viviendas listas para entregar al contratista Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D

Escaneado con CamScanner

Nota de Obra 166 Fecha: 29/12/21. Clima: Despejado:
De la mano del alcalde del municipio Ortiz firmamos, se realizo la protocolización de 24 vivienda a los beneficiarios que corresponden. Quedaron restando 4 viendas de beneficiarios que no fue posible contactar.

Gestores Bayuma Ramiro de la hoz O

Nota de Obra 167 Fecha: 21/01/22. Clima: Despejado
Durante los recientes días del mes de enero se ha trabajado en la definición de los acabados de la parte interna y externa de las viendas, junto con las actividades necesarias para instalar el cableado de las viendas.

Gestores Bayuma Pedro Pinto

Nota de Obra 168 Fecha: 24/01/22
Se identificaron dos problemáticas durante la ejecución del proyecto. En primer lugar, en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sanchez se presentó el levantamiento de una vivienda al lado derecho, la cual impidió la definición de los acabados de esta. En segundo lugar, la beneficiaria Blanca Galan pasaste toda la vivienda, ocasionando más todo la perforación y modificando los acabados de la vivienda.

Gestores Bayuma Pedro Pinto

Nota de Obra 169 Fecha: 28/01/22
Se realizó la supervisión a las casas 1 y casa 2 de la mano con comfaoca y la alcaldía y esto se realizó ellos los días 27 y 28 de enero.

Gestores Bayuma Pedro Pinto

Escaneado con CamScanner

Nota No 170 Fecha: 31/01/22
Se ha avanzado en el levantamiento de muros en una vivienda de Juan Ramón y 1 en el galpón. Se avanzó en la fundición de zapata de inspección, e instalación de tuberías.

Gastón Benjumea Ramón Pinto

Nota N. 171 Fecha: 01/02/22, Clima: Despejado
Se ha estado trabajando en el levantamiento de muros en los barrios Juan Ramón y El Galpón. En el barrio 17 de febrero se ha avanzado en la definición de acabados internos de las viviendas.

Gastón Benjumea Ramón de la Hoz.O

Nota N. 172 Fecha: 02/02/22, Clima: Despejado
En el barrio Juan Ramón hay 1 ciudadela levantando muros y otra instalando tuberías. En el barrio 17 de febrero hay 4 ciudadelas definiendo acabados y el galpón 1 y otras 3 de soporte

Gastón Benjumea Ramón de la Hoz.O

Nota N. 173 Fecha: 03/02/22, Clima: Despejado
se continuó el trabajo de levantamiento de muros y definición de acabados

Gastón Benjumea Ramón de la Hoz.O

Nota N. 174 Fecha: 07/02/22, Clima: Despejado
se retomó el trabajo de la instalación de cableado eléctrico y se continuó la definición de acabados en el 17 de febrero.

Gastón Benjumea
Ramón de la Hoz.O

Escaneado con CamScanner

Act N 175 Fecha: 09/02/2022. Ciudad: Despejado
Se instaló las puertas metálicas y rejas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y se instaló el cableado de la vivienda en el mismo barrio.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Act N 176 Fecha: 09/02/2022, Ciudad: Despejado
Se instaló las puertas metálicas y rejas de dos viviendas en el barrio 17 de febrero y a la vez se instaló el cableado eléctrico.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Act N 177 Fecha: 10/02/2022, Ciudad: Despejado
Se trabajó en el levantamiento de muros en 3 viviendas del barrio Juan Romero. En el barrio Bella Horizonte se instaló las puertas, rejas y red eléctrica de una vivienda. En el barrio El Cabrí se trabajo en el levante de muros de dos viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Act N 178 Fecha: 15/02/2022, Ciudad: Despejado
Se instalaron las puertas, rejas y red eléctrica de 3 viviendas mas, a la vez, se empezó el trabajo de afinación de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Act N 179 Fecha: 16/02/2022. Ciudad: Despejado
Se instaló las puertas, rejas y redes eléctricas de 3 viviendas y de igual forma se trabajó en la afinación de acabados de 3 viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Escaneado con CamScanner

Nota No 180 | Fecha: 17/02/2022, Cargo: Despegador
Se enchapó la zona humeda de 3 viviendas y se instaló el combo sanitario y redes electricas de dos viviendas.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 181 | Fecha: 18/02/2022, Cargo: Despegado
El unico trabajo registrado en la instalación del enchape de zonas humedas de dos viviendas
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 182 | Fecha: 21/02/2022, Cargo: Despegado
Se enchapó la zona humeda de dos viviendas se instaló el combo sanitario de dos mas. Tambien se trabajo en el levantamiento de muros de dos viviendas en el barrio el galan
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 183 | Fecha: 22/02/2022, Cargo: Despegado
Se instaló los puertas y ventanas de dos viviendas y la instalación de tanque de agua de 10 viviendas
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No. 184 | Fecha 26/02/2022, Cargo: Despegado
Se enchapó las viviendas restantes del barrio 17 de febrero y 4 del barrio El Galan. Tambien se instalaron los accesorios y dos accesorios como combo sanitario a las mismas viviendas.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Escaneado con CamScanner

Bitácora No 185 Fecha: 28/02/2022, Clima: Despejado
Se retocaron los perfiles metálicos y se retocaron almas detalles de acabados para realizar entrega de viviendas

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Bitácora No 186 Fecha: 01/03/2022 Clima: Despejado
Se inventario recibir 6 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gustavo Bayuelo

Bitácora No 187 Fecha: 02/03/2022, Clima: Nublado
Se inventario recibir 4 viviendas al contratista con total satisfacción por parte de los beneficiarios

Gustavo Bayuelo Ramiro de la Hoz O

Bitácora No 188 Fecha: 02/03/2022
Se presentaron fuertes precipitaciones entre las 2:30 y 5:00 pm.

Gustavo Bayuelo. Ramiro de la Hoz O

Bitácora No 189 Fecha: 07/03/2022. Clima: Despejado
Se trabajo en la instalación de puertas internas de las viviendas y remate de detalles de acabados en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Bayuelo Silvio Pinilla

Bitácora No 190 Fecha: 08/03/2022. Clima: Despejado
Durante las ultimas dias se ha enfocado el trabajo en las 12 viviendas a entregar, en los barrios 17 de febrero, Luis Carlos Galan y Brisas del Norte.

Gustavo Bayuelo Silvio Pinilla

Escaneado con CamScanner

Fecha: 19/09/22
Nota de 193 → Ama: Despacho.
Se verifica la correcta instalación de los puertas y ventanas en el barrio Brisas del Norte. También se chequea el correcto enchape en el barrio Villa Esperanza.

Gustavo Bejarano Dilio Pinto

Fecha: 19/09/22
Nota de 192 → Ama: Despacho.
Se verificó la correcta instalación de puertas internas en el barrio Villa Esperanza al igual que los acabados de las viviendas del mismo barrio.

Gustavo Bejarano Dilio Pinto

Fecha: 15/09/22
Nota de 193 → Ama: Despacho
Se verificó la correcta instalación de puertas y ventanas en el barrio Brisas del Norte, al igual que el enchape y los acabados de las viviendas. De igual forma en el 17 de febrero

Gustavo Bejarano Dilio Pinto

Fecha: 19/09/22
Nota de 194 → Ama: Despacho
Se empezó a intervenir la primera vivienda del barrio Pedro Castro se le realizó el trazado.

Gustavo Bejarano Dilio Pinto

Fecha: 18/09/22 → Ama: Despacho
Nota de 195 se acabó y finalizó las primeras averiguaciones del barrio Pedro Castro. Mientras que a las personas de viviendas a entregar se le verificó que tengan las acometidas correctamente instaladas.

Gustavo Bejarano Dilio Pinto

Escaneado con CamScanner

Fecha: 21/09/22 → Obra: Depósito.
Hoja N. 196 Se trazó, excavó y fundió las zapatas cimentación en el barrio Pedro Castro. En los demás barrios se instaló tejados y se instala acometidas en las viviendas faltantes.

Gustavo Benjumea Dios Bendiga

Fecha: 22/09/22 → Obra: Deposito
Hoja No. 197 En el barrio Pedro Castro se trazó y fundió la tercera cimentaciones. Se recibieron 12 viviendas terminadas del contratista

Gustavo Benjumea Dios Bendiga

Fecha: 23/09/22 → Obra: Deposito
Hoja N. 198 Se trazó, excavó y fundió las cuartas cimentaciones en el barrio Pedro Castro. Se empezaron los trabajos para terminar las primeras 12 viviendas priorizadas en el barrio 17 de febrero y el galan.

Gustavo Benjumea Dios Bendiga

Fecha: 26/09/22 → Obra: Deposito
Hoja N. 199 Se fundió una plantilla en el barrio Juan Carlos Cortes y a la vez se intercalaba el trabajo de acabados en el mismo barrio. En Pedro Castro se fundieron 12 cimentaciones


Gustavo Benjumea Dios Bendiga

Fecha: 27/09/22 → Obra: Deposito
Hoja N. 200 Se fundió una plantilla en el barrio el galan. También se reparó la plantilla de la beneficiaria Dios Bendiga. Mientras que en Pedro Castro se fundieron 12 cimentaciones.

Gustavo Benjumea Dios Bendiga

Fecha: 28/09/22 → Obra: Deposito
Hoja N. 201 se excavo y fundió la quinta cimentación en el barrio Pedro Castro. Mientras que en los demas barrios se continuo alistando detalles para entregar las 12 viviendas

Gustavo Benjumea Dios Bendiga

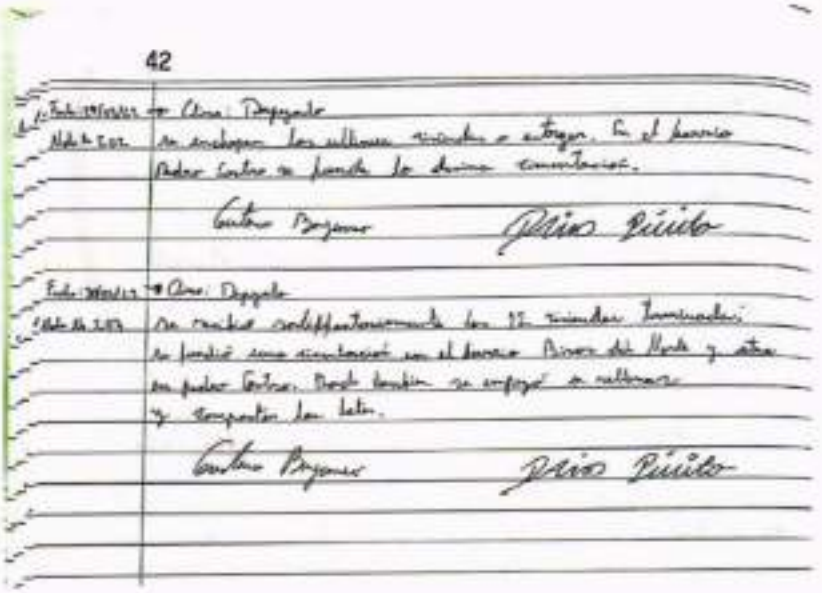

42

Fecha: 19/10/22 — Hora: Diagonal
Nota: Se realizaron las visitas técnicas a entregar. En el barrio Pedro Castro se fumiga la última manzana.

Gustavo Bayona — Julio Pinto

Fecha: 20/10/22 — Hora: Diagonal
Nota: Se realizó satisfactoriamente las 12 viviendas programadas; se fumigó una manzana en el barrio Brisas del Norte y otra en pedro Castro. Nadie también se empezó a voltear y terminar las latas.

Gustavo Bayona — Julio Pinto

Escaneado con CamScanner

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A10 – CONCEPTO ESTRUCTURAL CON DEBIDAS APROBACIONES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

Valledupar, 02 de septiembre de 2021.

Ingeniera.
MARYCARMEN OSPINA GUERRA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Referencia: ANEXO No.1 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 616-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PRENOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Cordial saludo

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los compromiso del acta # 02, nos permitimos adjuntar el concepto estructural por parte del ingeniero especialista sobres los cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de la vivienda propuesta en el contrato de obra 088 del 2021, junto con el aval de la interventoría de obra.

Esta gerencia avala el concepto emitido por parte de la interventoría de las viviendas que han sido intervenidas hasta la fecha, sin embargo se dará instrucciones al constructor a interventoría que solo se utilizara elementos continuos sin uniones de soldadura para las estructura de pórticos.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

DEIMER A. PEREZ SOLANO
Coordinador de Proyectos de Vivienda
Comfacesar

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

La Jagua de Ibirico, 31 de agosto de 2021

Señores,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, COMFACESAR
Ingeniero DEIMER PEREZ SOLANO
Coordinador Técnico de Vivienda.
Valledupar- Cesar

Con respecto al concepto estructural presentado por el ingeniero civil, DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO, especialista en estructuras. Me permito informar lo siguiente:

Luego de comprobar de que las credenciales del ingeniero especialista estuvieran vigentes, se comprobó que en efecto el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010, NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2. estipula bajo que condiciones y/o especificaciones es viable la utilización de soldadura tipo Filete en elementos metálicos. De igual forma, la norma establece las siguientes limitaciones o indicaciones para el uso de este tipo de soldadura:

F.2.10.2.2.2 — Limitaciones — El tamaño de una soldadura de filete no deberá ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni menor que el mínimo según la tabla F.2.10.2-4. Estos requisitos no se aplican a soldaduras de filete usadas como refuerzo de soldaduras acanaladas de penetración parcial o completa.

Tabla F.2.10.2-4
Tamaño Mínimo de Soldaduras de Filete

Espesor de la parte más delgada a unir, mm	Tamaño Mínimo de la Soldadura de Filete[a] mm
Hasta 6.4 inclusive	3
mayor que 6.4 a 12.7	5
mayor que 12.7	6
mayor que 19.1	8

[a] Dimensión del lado de la soldadura de filete. Debe aplicarse en una sola pasada.
Nota: Véase el numeral F.2.10.2.2.2 para el máximo tamaño de soldaduras de filete

El tamaño máximo de las soldaduras de filete será:

(a) A lo largo de los bordes de un material con espesor menor que 6 mm: el espesor del material.
(b) A lo largo de los bordes de un material con espesor de 6 mm o más: el espesor del material menos 1.6 mm, excepto cuando la soldadura se haya detallado en los planos para obtener el espesor completo de la garganta. En la soldadura ejecutada, se permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 1.6 mm siempre y cuando el tamaño de la soldadura sea claramente verificable.

Ilustración 1 Limitaciones de soldadura tipo Filete. Tomado de: NSR-10

Luego de realizar el estudio del concepto y verificar todo lo relacionado, como interventoría se concluye que los cambios propuestos y avalados por el ingeniero especialista son viables y no contraria lo estipulado en la NSR-10 Titulo F sección

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 9008475190

2.10.2. por lo que no sería necesario el cambio de estos elementos metálicos. Sin embargo, a partir de la fecha, se recomienda la no utilización de elementos estructurales unidas por cordones de soldadura. Tales como; columnas, vigas y correas en futuras viviendas a construir para garantizar un extra de seguridad.

Atentamente.

Gustavo Benjumea

Ing. Gustavo Andres Benjumea Serrano
Residente de Interventoría

- Se anexo Copia del Concepto Técnico del Especialista

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
ASSI – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Atn
Gustavo Benjumea.

CONS.VIVIURB-INTERVENTORIA-002

REFERENCIA: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PERNOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Mediante la presente, solicito la revisión y aprobación de los siguientes cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de las casas propuestas en el contrato de obra 088 de 2021, con el objeto de construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Adjunto los siguientes documentos:

- Concepto estructural por parte del ingeniero especialista.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Titulo F, sección 2.10.2 y sección 2.2.3.5.
- Tarjeta profesional, ingeniero especialista.
- Registro fotográfico.

Atentamente

Luis Eduardo cayón Medina
Representante legal

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
CONSORCIO VIVE URB 2021
Atn
Ingeniero Luis Eduardo Cayon Medina

Con respecto a la revision del cambio del sistema de conexion apernado a conexión por soldadura, me permito informar lo siguiente:

1. La soldadura permite la correcta transmisión de cargas en los elementos estructurales, es un método de unión avalado por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en su título F sección 2.10.2.

2. El estado límite de resistencia para elementos sometidos a compresión axial pura está controlado en general por la fluencia a la compresión o por el pandeo de la sección. El pandeo a compresión depende a su vez de factores como la esbeltez del elemento, las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva, la excentricidad y variabilidad de la carga, y la resistencia a la fluencia y variabilidad de esfuerzos residuales en la sección, condiciones que se garantizan cuando se unen dos elementos estructurales que presentan similitud en los materiales, dado que al ser materiales similares se garantiza la continuidad del material y sus propiedades mecánicas y químicas.

Dicho esto, concluimos que no es necesario reemplazar los elementos estructurales tipo columnas que presenten este tipo de uniones, ya que estas al igual que las no soldadas garantizan la transmisibilidad de cargas y la continuidad de las propiedades estructurales del elemento.

Este mismo concepto aplica para justificar el cambio del sistema de conexión apernado entre la columna, la platina y las zapatas de cimentación, por el sistema soldado entre ellas.

Atentamente,

Ing. Diego Fernando Quiroga Santiago
Mp N°: 68202052070 STD
CC: 13861922 de Bucaramanga

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@fgcon.com.co
Valledupar - Cesar

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONEXIÓN POR SOLDADURA

F.2.2.3.5 — *Diseño de conexiones* — Los elementos de conexion deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales F.2.10 y F.2.11. Las fuerzas y deformaciones usadas en el diseño deben ser consistentes con el funcionamiento esperado de la conexión y con las suposiciones formuladas en el análisis estructural. Se admiten deformaciones autolimitadas en las conexiones. En sus puntos de apoyo, las vigas y armaduras deberán estar restringidos contra la rotacion alrededor de su eje longitudinal, excepto cuando mediante análisis se pueda demostrar que dicha restriccion no es necesaria

F.2.10.2 — SOLDADURAS — Se deben cumplir todas las provisiones del Codigo de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1, excepto que se aplicarán los siguientes requisitos del Capitulo F.2 en lugar de las secciones del codigo AWS correspondientes:

Numeral F.2.10.1.6 en lugar de AWS D1.1 — Sección 5.17.1
Numeral F.2.10.2.2.1 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2.3.2
Tabla F.2.10.2-2 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.1
Tabla F.2.10.2.5 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.3
Tabla F.2.11-1 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.4
Numerales F.2.2.3.10 y F.2.11 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2, Parte C
Numeral F.2.13.2.2 en lugar de AWS D1.1 — Secciones 5.15.4.3 y 5.15.4.4

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA



ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

MP. 682020-92070 STD

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1: Conexión por soldadura Colomna-Zapata



Imagen 3: Conexión por soldadura Colomna-Zapata



Imagen 2 Conexión por soldadura Colomna-Zapata



Imagen 4 Columna de acero

A11 – RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com




Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A12 – ACTAS DE TERCERA SUPERVISACION TECNICA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

12

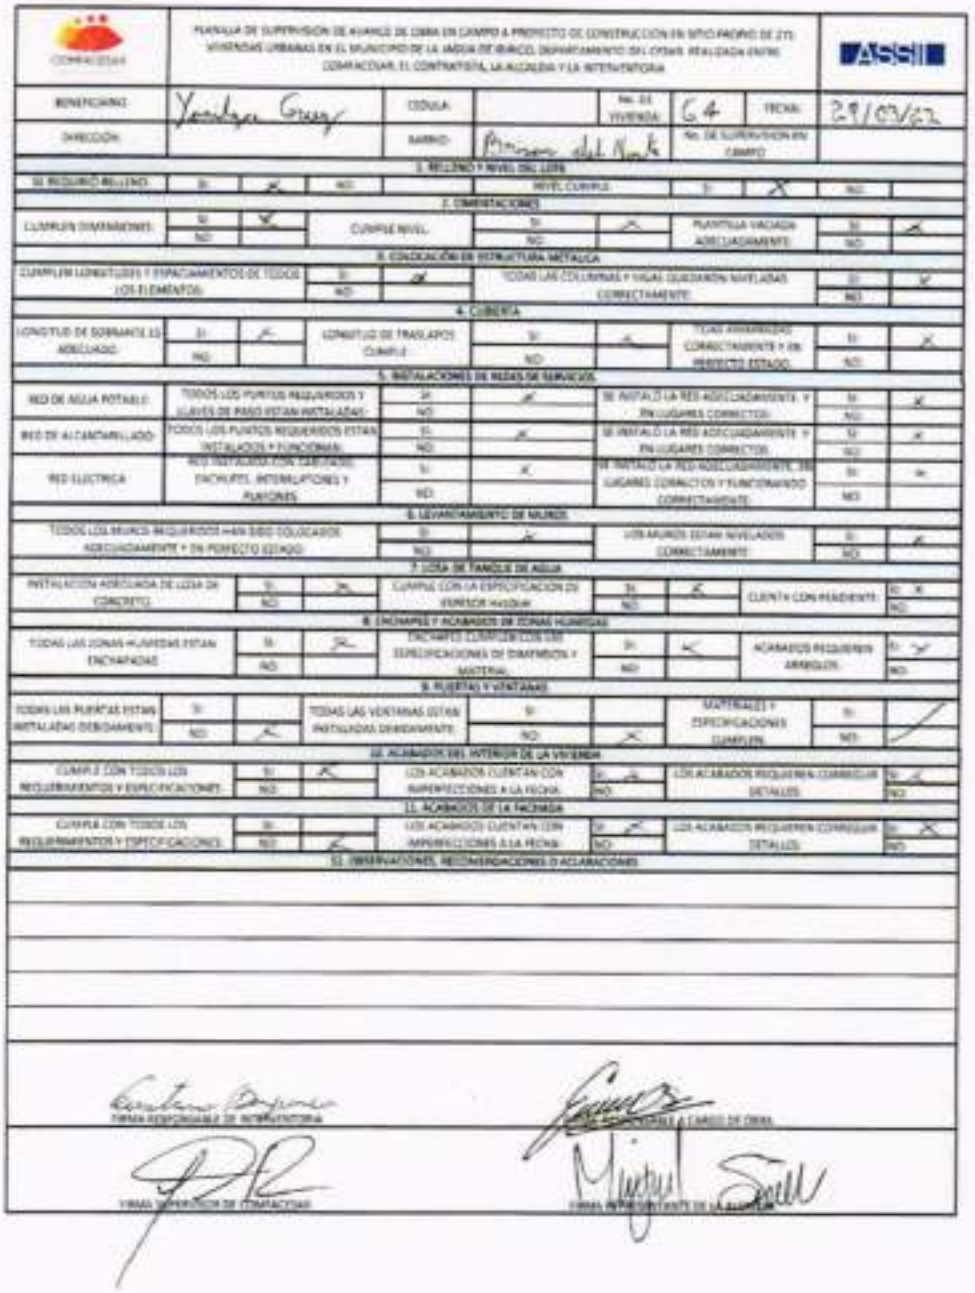

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 270 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ACCIONISTA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Yenidys Gray		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	64	FECHA:	29/07/22	
DIRECCION:			BARRIO:	Manzanares del Norte	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIO RELLENO:	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE:	SI	X	NO	
2. EMBRATACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. COCADA DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:				SI	X	
	NO						NO		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TEJAS ANCLADAS CORRECTAMENTE Y DE PERFECTO ESTADO:	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI	X	
		NO					NO		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI	X	
		NO					NO		
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:			SI	X	
		NO					NO		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:			SI	X	
		NO					NO		
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR MINIMO:	SI	X	CUENTA CON REFUERZO:	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES Y MATERIAL:	SI	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI	X	
	NO			NO			NO		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI		
	NO	X		NO	X		NO		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X	
	NO			NO			NO		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X	
	NO	X		NO			NO		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISION DE ITEMACTIVAS

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ACCIONISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: ANA HURTADO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROMO 20 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA.					ASSI
BENEFICIARIO:	Ana Hurtado	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	63	FECHA: 29/03/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:	Villa Fundación	No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO:		

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE								
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:	NIVEL CUMPLE	SI:	X	NO:	
2. CIMENTACIONES								
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA								
CUMPLEN LONGITUDES Y GANCHAMIENTOS EN TODOS LOS ELEMENTOS	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS ELISTARON INSTALADAS CORRECTAMENTE				SI:	X
	NO:						NO:	
4. CUBIERTA								
LONGITUD DE SOBRANTES ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE	SI:	X	TEJAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN BUEN ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS								
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI:	X		
		NO:			NO:			
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI:	X		
		NO:			NO:			
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, DUCHAFOS, INTERRUPTORES Y PUNTOS	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI:	X		
		NO:			NO:			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS								
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI:	X	LOS MUROS ESTAN INSTALADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X			
	NO:			NO:				
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA								
INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR (+-10cm	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS								
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI:	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL	SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
9. PUERTAS Y VENTANAS								
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI:	X	TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:	X	MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	
11. ACABADOS DE LA FACHADA								
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:			NO:	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES								

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA	FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR	FIRMA RESIDENTE SISAS CONSULTORES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: CINDY JIMENEZ

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

10

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 270 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

BENEFICIARIO:	Cindy Jaramillo		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	62	FECHA:	29/03/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:	Jagua Ibirico	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIO RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:		SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	
3. COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X			TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:			SI:	X
	NO:							NO:	
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:		SI:	X	TODO ASEGURADOS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	
5. INSTALACIONES DE AGUA Y SANITARIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS		SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI:	X
			NO:					NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN		SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI:	X
			NO:					NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CAJAS, CHOLITES, INTERRUPTORES Y PLAFONES		SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:			SI:	X
			NO:					NO:	
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:			SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:			SI:	X
			NO:					NO:	
7. LOSA DE TARQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE DISEÑO f'c=320Kg/cm2:		SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y MATERIAL:		SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:		SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X			NO:	X		NO:	/
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA:		SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:				NO:			NO:	
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA:		SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X			NO:			NO:	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

Cantero Benjamin
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONFACESAR

FIRMA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: CARMEN VEGA.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

9

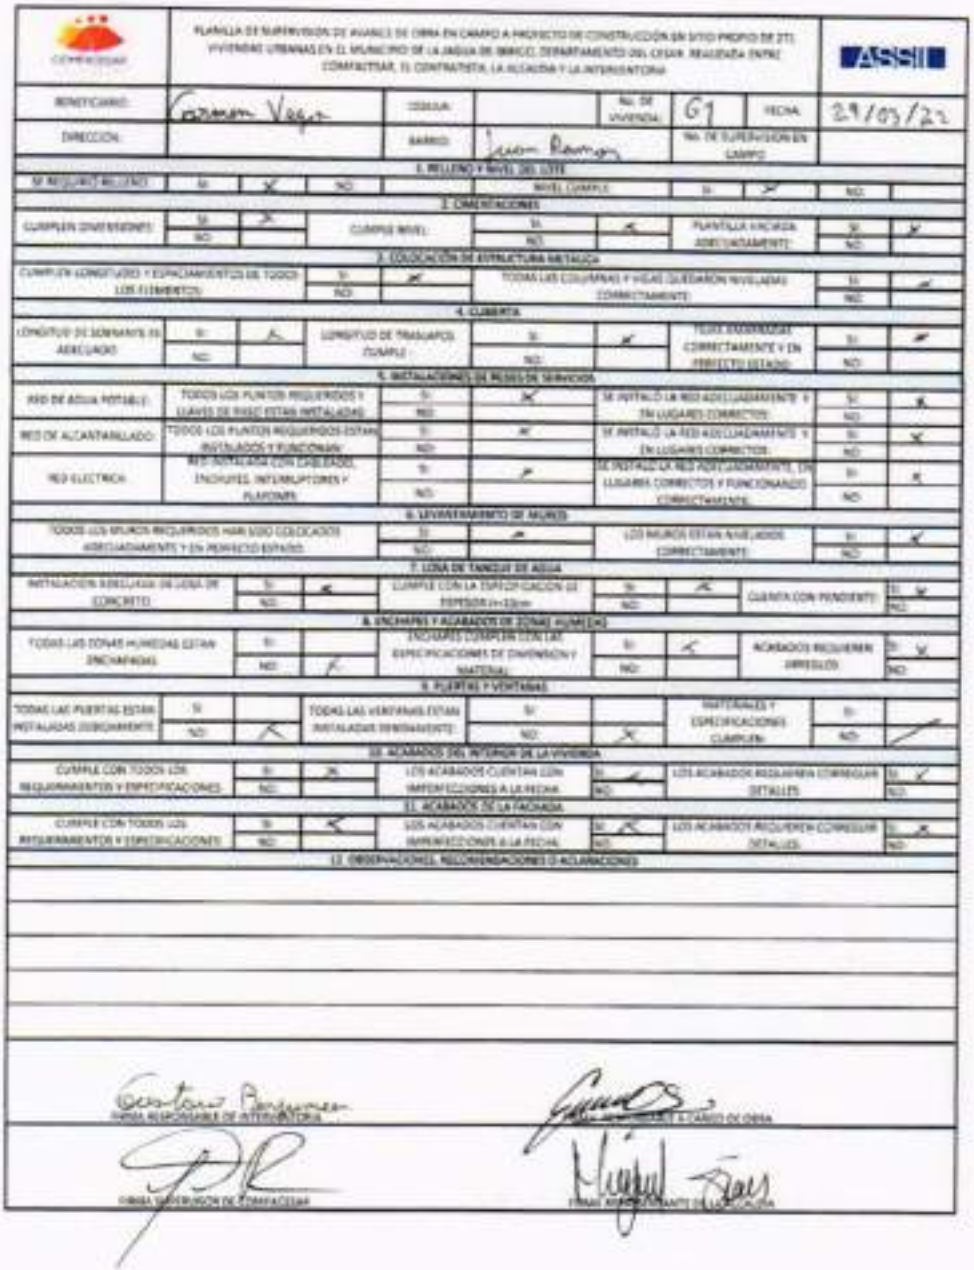

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATISTAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Gustavo Vega	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	61	FECHA:	29/03/22	
DIRECCION:		BARRIO:	Juan Bautista	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIERE RELLENO	SI	X	NO	NIVEL CUMPLE	SI	X	NO	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE	SI	X	
	NO			NO		

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE	SI	X	TEJAS ENSAMBLAN CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	
	NO			NO			NO		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X	
		NO			NO		
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X	
		NO			NO		
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONADOS CORRECTAMENTE	SI	X	
		NO			NO		

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X			
	NO			NO				

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR (>=10cm	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X
	NO			NO			NO	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL	SI	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI	X
	NO	X		NO			NO	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI	
	NO	X		NO	X		NO	/

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES	SI	X
	NO			NO			NO	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGUIR DETALLES	SI	X
	NO			NO			NO	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISION DE CONSTRUCESAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: DENIS JIMENEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

6

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO & PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA.

BENEFICIARIO:	Dora Jaimes		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	60	FECHA:	29/03/22		
DIRECCION:			BARRIO:	17 de febrero	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:					
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE										
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE:	SI	X	NO		
2. CIMENTACIONES										
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA HECHIZA ADECUADAMENTE:	SI	X		
	NO			NO			NO			
3. COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA										
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:				SI	X		
	NO						NO			
4. CUBIERTA										
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TEJAS ENSAMBLADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X		
	NO			NO			NO			
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS										
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS		SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI	X		
			NO				NO			
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN		SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI	X		
			NO				NO			
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:		SI	✓	SE TESTEÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:		SI	✓		
			NO				NO			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS										
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:			SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:		SI	X		
			NO				NO			
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA										
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=0.20m	SI	✓	CUENTA CON PENDIENTE:	SI	✓		
	NO			NO			NO			
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS										
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI	X	ACABADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI	X		
	NO			NO			NO			
9. PUERTAS Y VENTANAS										
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI			
	NO	X		NO	X		NO	/		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X		
	NO			NO			NO			
11. ACABADOS DE LA FACHADA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X		
	NO			NO			NO			
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES										

FIRMA INTERVENTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.ses@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: LILIBETH MARTINEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica




1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

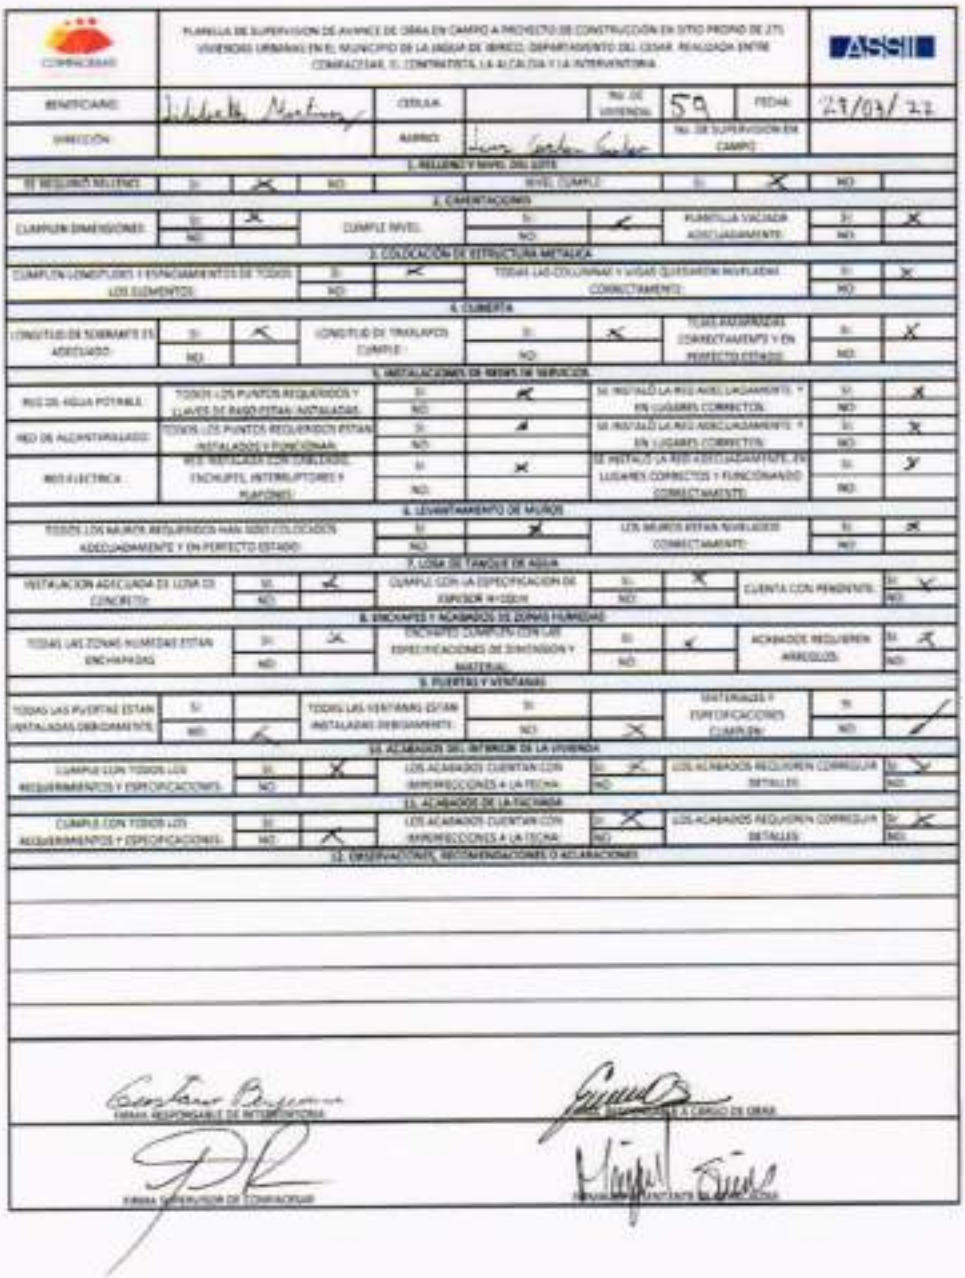

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

BENEFICIARIO	Libardo Martinez		CEDULA		No. DE VIVIENDA	59	FECHA	29/03/22	
DIRECCIÓN			BARRIO	Divino Cordero Cortes	No. DE SUPERVISION EN CAMPO				
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
EL RELLENO ES EL ADECUADO	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE				SI	X	
	NO						NO		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE TORNAMESA ES ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE	SI	X	TODAS AGUANIEVES CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALÓ LA RED AVELLAMIENTO Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X	
		NO					NO		
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X	
		NO					NO		
RED ELECTRICA	RED REVISADA CON SOBRECARGA (TACHUELA, INTERRUPTORES Y PLAFONES)	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE			SI	X	
		NO					NO		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO EJECUTADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO		SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE			SI	X	
		NO					NO		
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR N=0.05	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL	SI	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI	X	
	NO			NO			NO		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		VENTANAS Y PUERTAS CUMPLEN	SI		
	NO	X		NO	X		NO	/	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI	X	
	NO			NO			NO		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI	X	
	NO	X		NO			NO		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATANTE

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: AMALIA MORA.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

6

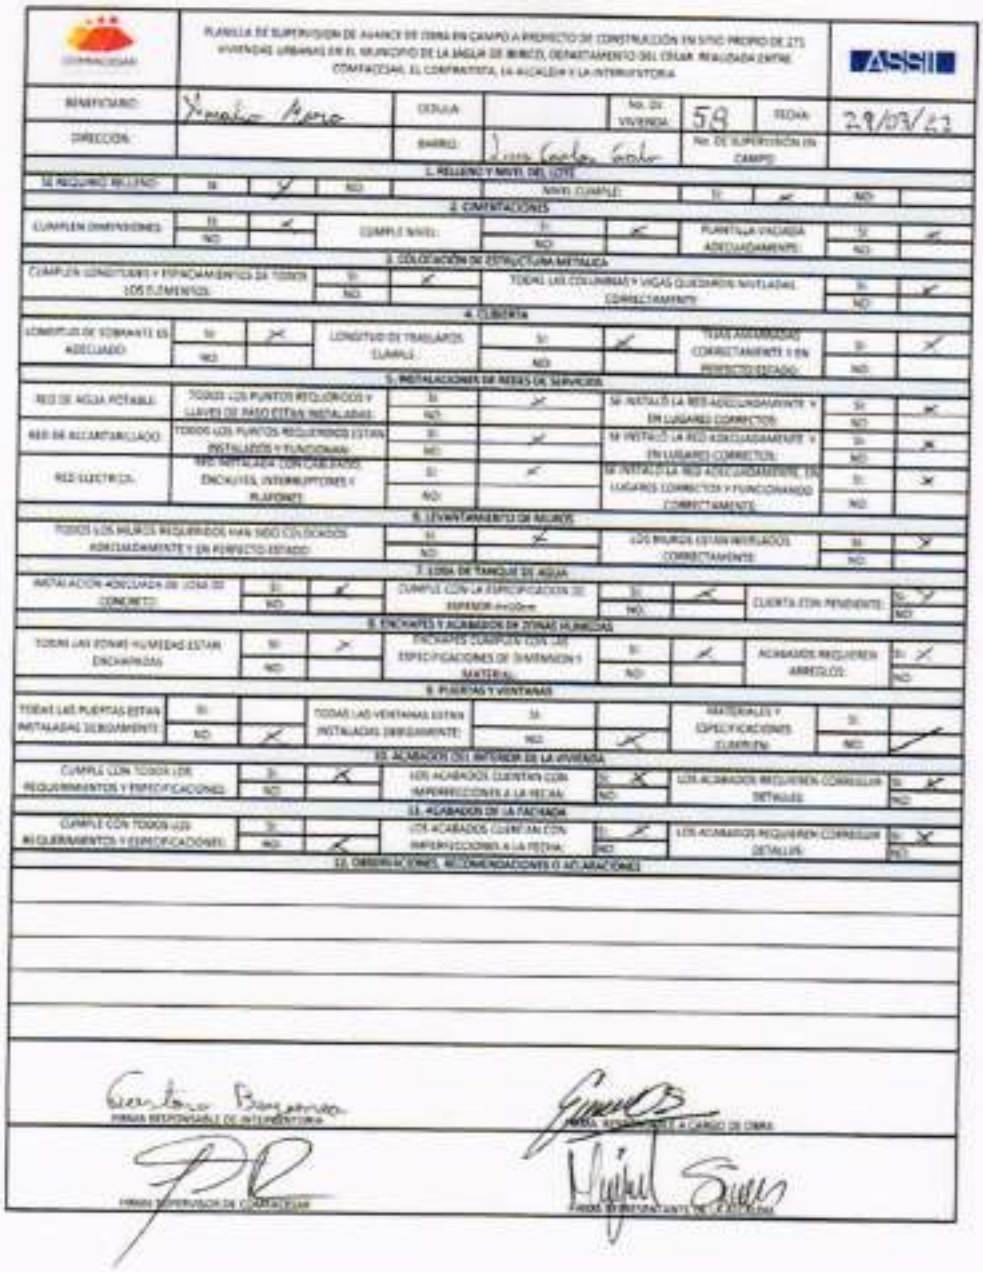

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATISTAS, EL CONTRATISTA, LA ALCALDÍA Y LA INTERVENTORIA.

ASSII

BENEFICIARIO:	Amalia Mora	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	58	FECHA:	29/03/22	
DIRECCION:		BARRIO:	Divino Niño	No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO:				

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIO RELLENO:	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE:	SI	X	NO	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PUNTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X
	NO			NO			NO	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI	X
	NO			NO	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TODAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X
	NO			NO			NO	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI	X
		NO			NO	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI	X
		NO			NO	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO ENCAUSTO, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI	X
		NO			NO	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI	X
	NO			NO	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR de=10cm:	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI	X
	NO			NO			NO	

8. ENCHAPES Y ACABADOS EN ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION Y MATERIAL:	SI	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI	X
	NO			NO			NO	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI	
	NO	X		NO	X		NO	/

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X
	NO			NO			NO	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI	X
	NO	X		NO			NO	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATISTA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: YARIS THOMAS.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5

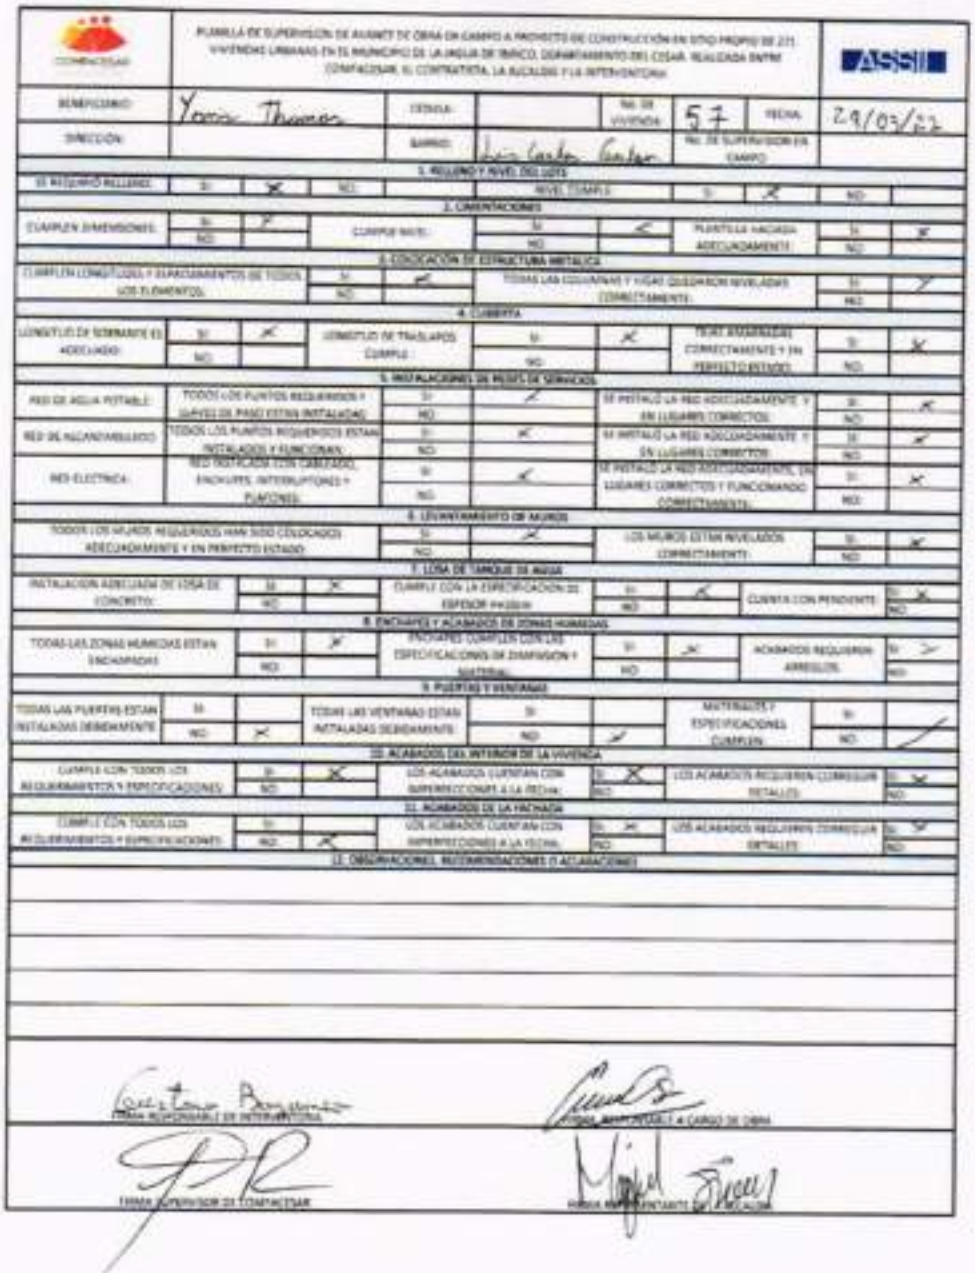

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Yomaira Thomas	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	57	FECHA:	29/03/22	
DIRECCIÓN:		BARRIO:	Los Cardos Center	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL COMPLE:	SI:	X	NO:

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE MALLA:	SI:	X	PUNTILLA HACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y EMPALMAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X			
	NO:			NO:				

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI:	X	TEJAS ENSAMBLAN CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y GRIFOS DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X	
		NO:			NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y DEMAS:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X	
		NO:			NO:		

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X			
	NO:			NO:				

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR PROPUESTA:	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON SUPERFICIES CONFORME A LA TECNICA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON SUPERFICIES CONFORME A LA TECNICA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:			NO:	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATAR

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: ESPERANZA BELEÑO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación.



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROMO DE 275 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA.

ASSII

BENEFICIARIO:	Esperanza Bolaño	CESAR:		No. DE VIVIENDA:	56	FECHA:	29/03/22	
DIRECCION:		BARRIO:	Juan Carlos Solano	No. DE SUPERVISION EN CAMPO				

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI:		NO:	X	NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS EN TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI:	X	TODAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:	X
		NO:			NO:	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PUNTOS:	SI:	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:	X
		NO:			NO:	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO EDIFICADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI:	X
	NO:			NO:	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR MINIMO:	SI:	X	CUENTA CON REVESTIDO:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:	X	REVISTIERE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y MATERIAL:	SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:	
	NO:	X		NO:	X		NO:	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:			NO:			NO:	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:	X
	NO:	X		NO:			NO:	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

FIRMA SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATISTA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: LINA SANCHEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Luisa Sanchez		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	55	FECHA:	29/03/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:	Luis Carlos Galan	No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIO RELLENO:	SI:		NO: X	NIVEL CUMPLE:	SI: X		NO:		
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI: X NO:		CUMPLE NIVEL:	SI: X NO:	PLANTILLA VACIADA ANTES DE ARMADOS:	SI: X NO:			
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI: X NO:			TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:		SI: X NO:			
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI: X NO:		LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI: X NO:		TEJAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI: X NO:		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:		SI: X NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI: X NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:		SI: X NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:		SI: X NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PUNTOS:		SI: X NO:		SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:		SI: X NO:		
6. EMPAMAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:			SI: X NO:		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:		SI: X NO:		
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI: X NO:		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR:	SI: X NO:		CUENTA CON RENDIJAS:	SI: X NO:		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI: X NO:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI: X NO:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI: X NO:		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: NO: X		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI: NO: X		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI: X NO:		
10. ACABADOS DE INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: X NO:		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: X NO:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI: X NO:		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI: NO: X		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI: X NO:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI: X NO:		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES:									
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA				FIRMA RESPONSABLE DE CONTRATISTA					
FIRMA SUPERVISOR DE COMFACESAR				FIRMA RESPONSABLE DE LA ALCALDIA					

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: MELISSA PADILLA.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

2

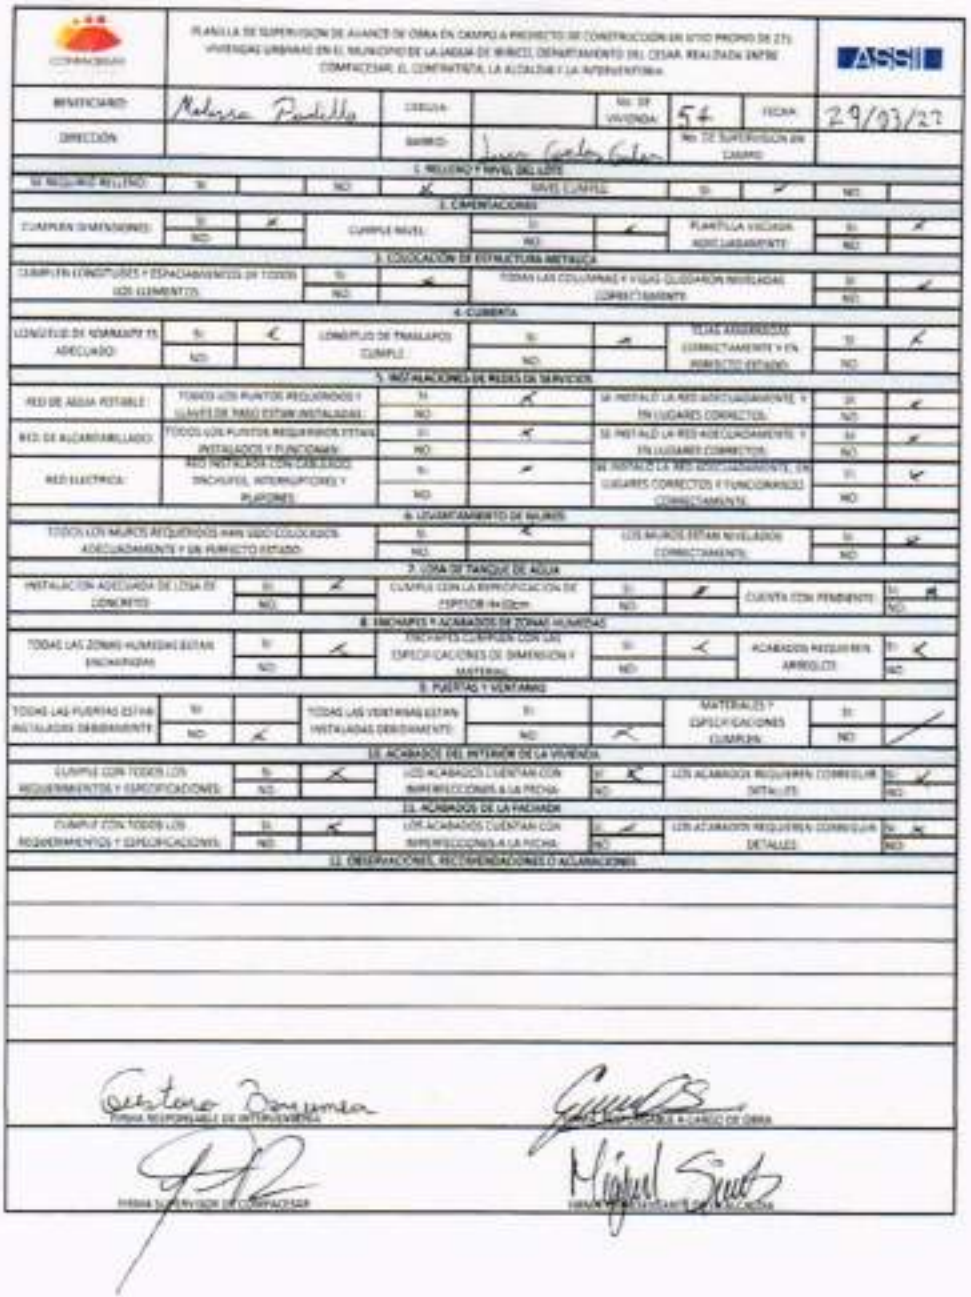

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONVIVIENDAS, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Melissa Padilla		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	54	FECHA:	29/03/22	
DIRECCIÓN:			BARRIO:	Juan Carlos Cabrera			No. DE SUPERVISION EN CAMPO:		
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIERE RELLENO:	SI		NO	X	NIVEL CUMPLE:	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X		TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:			SI	X	
	NO						NO		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE VOLADIZO ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	VIGAS ASSEGURAS CORRECTAMENTE Y EN AMBOS EXTREMOS:	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI	X	
		NO					NO		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI	X	
		NO					NO		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:			SI	X	
		NO					NO		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:			SI	X	
		NO					NO		
7. VIVA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR de 10cm	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI	X	ACABADOS RECIBIDOS ADECUADAMENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS SATISFACTORIAMENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS SATISFACTORIAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	/	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI	X	
	NO			NO			NO		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI	/	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI	X	
	NO			NO			NO		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONVIVIENDAS

FIRMA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: MINELLIS MARTINEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica




1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

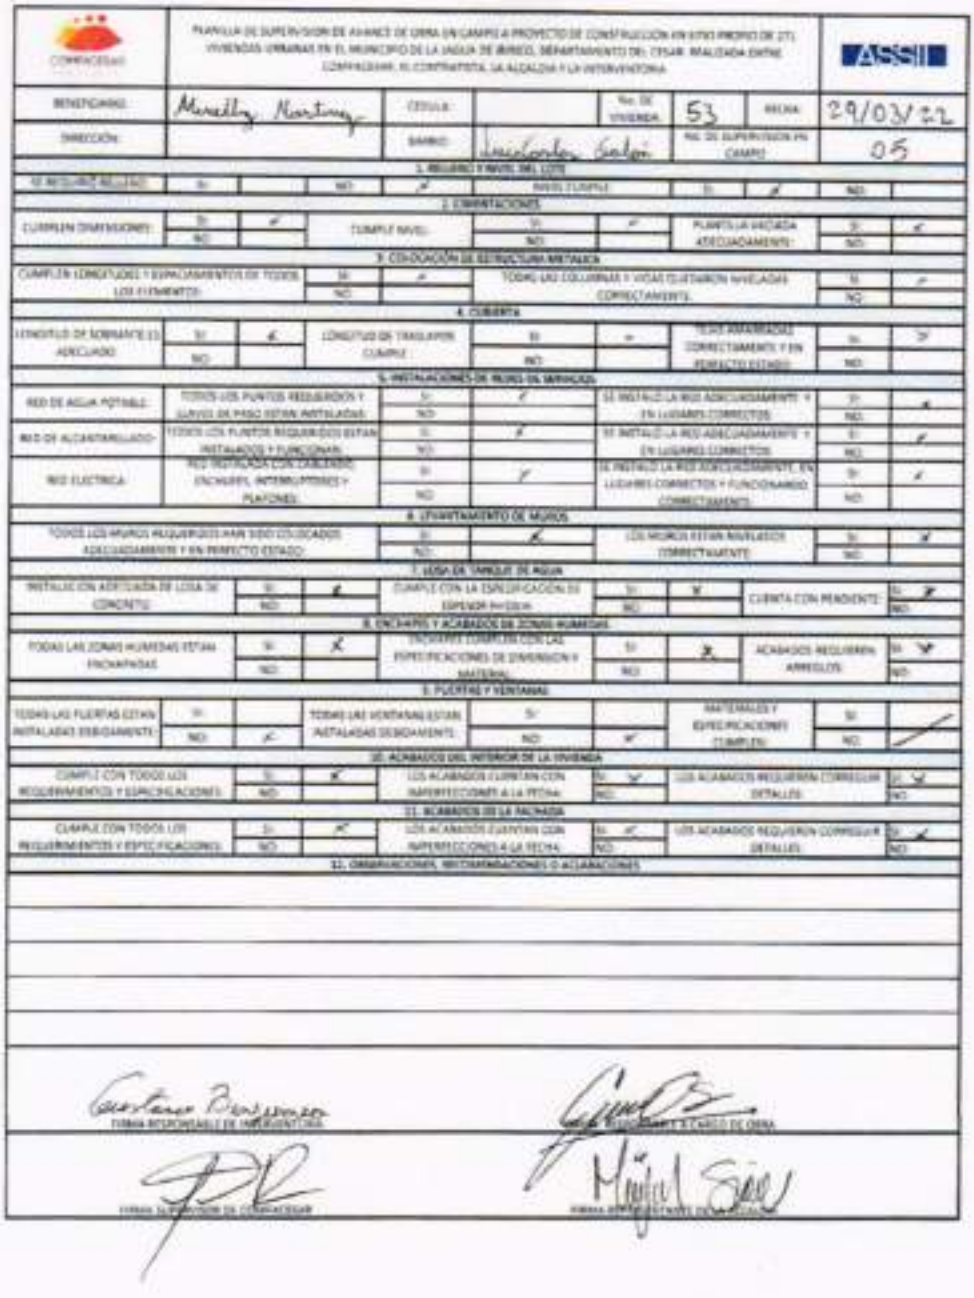

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONVIVIENDAS EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Mireilly Martinez		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	53	FECHA:	29/03/22	
DIRECCION:			BARRIO:	Invicorbe Galan	NO. DE SUPERVISION EN CAMPO:	05			
1. ALINEACION Y NIVEL DEL LOTE									
¿EL ALINEAMIENTO RELLENO?	SI:		NO:	X	NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
3. CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS ESTABAN NIVELADAS CORRECTAMENTE:				SI:	X	
	NO:						NO:		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI:	X	TEJAS ANCLADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
5. INSTALACIONES DE MUROS DE MAMPOSTERIA									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y SUAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI:	X	
		NO:					NO:		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:			SI:	X	
		NO:					NO:		
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHAPES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:			SI:	X	
		NO:					NO:		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:				SI:	X	
	NO:						NO:		
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALOC CON ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR (m=10cm):	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL:	SI:	X	ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:		
	NO:	X		NO:	X		NO:	/	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPACIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI:	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONVIVIENDAS

FIRMA BENEFICIARIO DE VIVIENDA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: WILSON SANCHEZ

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitacion




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13

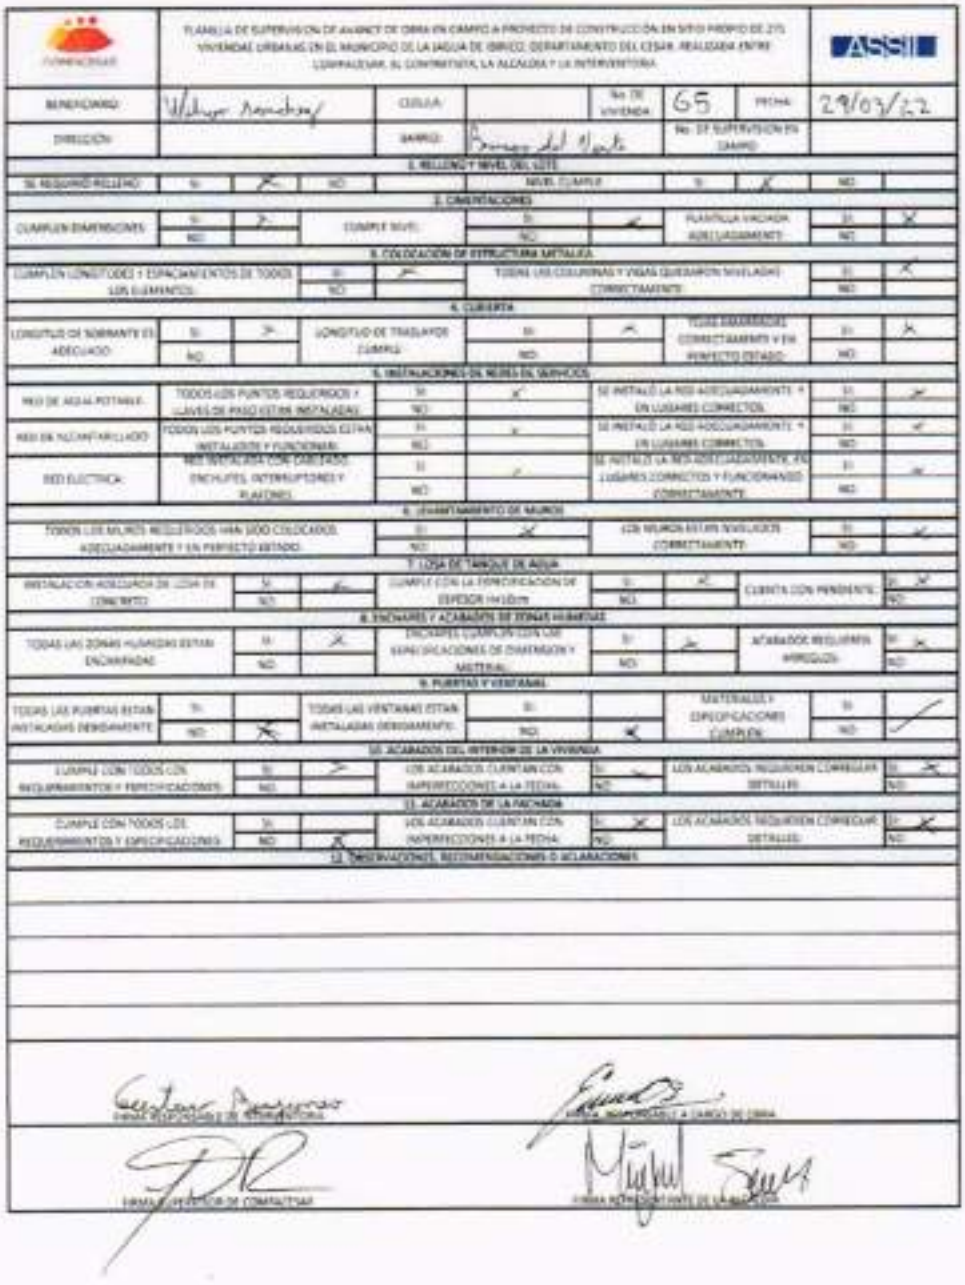

PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 215 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONPAZUCAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA.

ASSII

BENEFICIARIO	Wilson Navarro		CEDULA		No. DE VIVIENDA	65	FECHA	29/03/22		
DIRECCION			BARRIO	Barrio del Norte		No. DE SUPERVISION EN CAMPO				
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE										
SE REQUIRIÓ RELLENO	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE	SI	X	NO		
2. CIMENTACIONES										
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X		
	NO			NO			NO			
3. COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA										
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE				SI	X		
	NO						NO			
4. CUBIERTA										
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE	SI	X	TODAS ESTRUCTURAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X		
	NO			NO			NO			
5. INSTALACIONES EN MUROS EN SECO										
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS			SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
				NO			NO			
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN			SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
				NO			NO			
RED ELECTRICA	NO SOBRECARGA CON CABLEADO ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES			SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X		
				NO			NO			
6. ENMARRAMIENTO DE MUROS										
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO				SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X		
				NO			NO			
7. LOZA DE TANQUE DE AGUA										
INSTALACION ADECUADA DE LOZA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR H=10cm	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X		
	NO			NO			NO			
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS										
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL	SI	X	ACABADOS REQUIRIEN RETOQUES	SI	X		
	NO			NO			NO			
9. PUERTAS Y VENTANAS										
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI			
	NO	X		NO	X		NO	✓		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	~	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI	X		
	NO			NO			NO			
11. ACABADOS DE LA FACHADA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI	X		
	NO	X		NO			NO			
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES										

FIRMA RESPONSABLE DE CONSTRUCTORA

FIRMA INTERVENTOR DE CONTRATISTA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: YARITZA CRUZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A13 – ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION DE BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS ENTREGADAS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingenieria y arquitectura s.a.s
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Heivis Yohana Nuñez Payares, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.111.009; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Diosdel Monte con coordenadas 9.573181. -73.334341.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16° CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assisas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Jorge Enrique Gelvis, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 12.524.779; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 03 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.570343, -73330847.

JORGE GELVIS
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16 CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Katerine Yohana Caro Ortiz, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1064.111.690; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Mayo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.569855, -73.332382.

Katerine Caro
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Lizze Nayth Guzman Becerra, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1.007.624.732; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 19 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 14 de Febrero con coordenadas 9.540976 -73.331113.

Lizze GuzmanBecerra
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Manuel Del Rosario Mercado Mena, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" identificado(a) con el documento 19.584.911; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de Febrero con coordenadas 9.570366, -73.337968.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, María del Carmen Pacheco Ramos, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.115.946 ; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 02 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Los Cedros Golan con coordenadas 9,570976, -73,330031

María Pacheco
Firma del beneficiario(a).

Arturo Bayuelo
Firma de responsable de interventoría

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Noraidith Gonzalez Castillo, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.107.075; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 23 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 19 de febrero con coordenadas 9.571648, -73.331074.

NORAIDITH GONZALEZ C.
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Ruby Sanchez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" identificado(a) con el documento 36.572.290; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 19 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Barrio El Nuevo con coordenadas 9.593111, -73.334625.

RUBY Sanchez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Barrios
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.9006475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Trinidad Antonio Rodriguez Arenas, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 6.791.292; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 04 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio Luis Carlos Galan con coordenadas 9.570000, -73.330216.

Antonio Rodiloz
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Tulia Rosa Ibáñez Muñoz, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 26.947.431; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 02 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza con coordenadas 9.570389, -73.333880

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoria

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Wilmer Rios Sanchez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 9.691.791; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 02 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Las Cañas Bolas con coordenadas 9.5412.04, -73.330611.

wilmER R. oS
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Angelica Maria Cano Gomez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.573.978; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.569237, -73.337407

Angelica Maria Cano G.
Firma del beneficiario(a). 36 573 978

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Diana Carolina Suarez Urina, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" identificado(a) con el documento 1.064.109.348 ; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.571216, -73.331810.

Diana Suarez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bonguero
Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.9008475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Dalys Emilia Fuentes Mendoza, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 36.570.098; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.569291, -73332243.

Dalis Fuentes
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bayuelo
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Luciano Montero Saldaña, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 12.521.269; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2012, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.571369, -73.331929.

Luciano Montero
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Reyes
Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, María Delfina Mendoza Homes, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.390.660; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9.569218, -73.331778.

María Mendoza
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Orlando Nieto Torres, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 3.949.051; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 01 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio 17 de febrero con coordenadas 9,571414, -73.332252.



Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bonnemeo
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Alba Yasmin Cuy Pay, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.523.027; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 23 de Marzo de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Las Cruces con coordenadas 9.571951-73.320373.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Blaidys Esther Galan Noriega, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.622.644; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza con coordenadas 9.531403, -73.334355.

Blaidys E. Galan Noriega
Firma del beneficiario(a).

Cristian Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.ces@outlook.com

ASSI ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT.9009475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Casandra Rodriguez Martinez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.115.699 ; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 02 de Marzo de 2023, la cual se encuentra ubicada en el barrio Luis Carlos Galan con coordenadas 9.570156, -73.330527

Casandra Rodriguez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bermudez
Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 9008475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Consuelo Ballena Clavijo, beneficiario(a) del proyecto "CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR." Identificado(a) con el documento 57.271.734; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 23 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza con coordenadas 9.573792, -73.333846.

Consuelo Ballena C.
Firma del beneficiario(a).

Cristina Bayuelo
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

Escaneado con CamScanner

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Edixon Pabuena Robles, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.122.122; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 13 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Luis Carlos Galan con coordenadas 9.5+1732,-73.330093.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Edina Esther Pedroza Pablo, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.574.057; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Marzo de 2022, la cual se encuentra ubicada en el barrio Luis Carlos Galan con coordenadas 9.571579, -73.33128.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoria.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Gloriath Cecilia Jimenez Diaz, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1.003.115.386; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 18 de Marzo de 2024, la cual se encuentra ubicada en el barrio Luis Carlos Galán con coordenadas 9.569093, -73.329793.

Gloriath Jimenez
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assiass@outlook.com

A14 – ACTAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UNE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.904.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UNO	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 6 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES. CANUELAS, MARCOS EN ANGULOS Y REFUERZ INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE HT SILLAS YEE DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. +/-1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	5.70 MS	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE CU THHN 2x8+8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION 1F DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
PELO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	5	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO + MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIGUETAS UNP-M6.5X80 + PINTURA	481 KG	X		X		Instalada y anclada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y ancladas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.3M	2.70 M3	X		X		Construidas y ancladas a los muros según planos estructurales
PLACA LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI +/- 7 CM	3.12 M2	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901 401 026-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO OSMAN HORRAD OFICINA 505	TELEFONO	5961119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT / IDENTIFICACIÓN	900 847 519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004630421

DATOS DE LA VIVIENDA


VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	MARIA DELFINA MENDOZA LLANES
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	36.306.069
No. VIVIENDA	34	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/1/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.20	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.50	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.5 M DE)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entocquillado
GRANOLITO PARA FACHADA	GRANOLITO	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MARTO EDIL)	MARTO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA CALETERIA CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.00 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.85 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

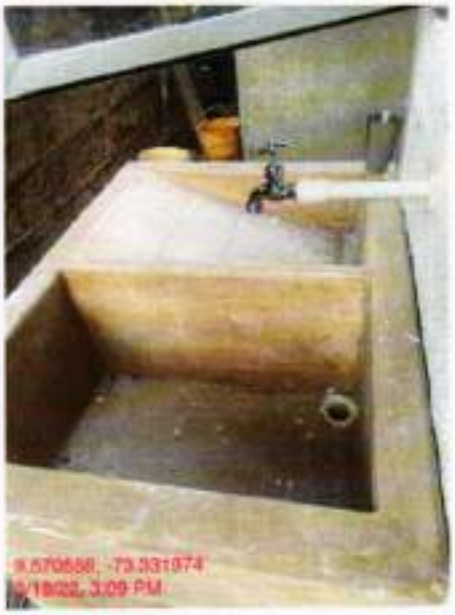

FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
LAVAMANOS BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA 50 PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 6" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	16.59ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO, INSTALACION DE MT SILLAS PEE DE 8"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR BURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + 1#8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA (INFAMESA + PINTURA)	441 KG	X		X		Instalada y almada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.5 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	0.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales
OBSERVACIONES GENERALES						

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS (200) DE TREINTA Y UN (31) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	000 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.461.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRAMAHORMAR OFICINA 505	TELEFONO	5001119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004405927

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	19.384.911
No. VIVIENDA	46	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/19/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.70	X		X		Con su respectivo ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.22	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde Frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO EDIL)	MANTO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN PARTES CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PORO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.40 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.55 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1 2 Y 3 (1.2 mts x 1.8 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com







FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE DAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.853
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (ENSAMBLE)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAMPARA (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.55ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X80CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HIERRROS, CANGILONES, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4" SILLAS YEE DE 4"X 4 X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.5M PARA RED DE CONDONA ALCANTARILLADO. INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR SUBIDO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2X8+8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120v	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120v	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	2.8 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 4+/- 1 CM	5.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	091 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.220 M2	NOMBRE COMPLETO	LUCINDO MONTERO SALDAÑA
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	12.521.269
No. VIVIENDA	31	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/1/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.55	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.22	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA DE MUROS	112.00	X		X		
FACHADA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entregulleado
CIELORASO PARA FACHADA	DRYWALL	X		X		En colores Amarillo y Verde Frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑITO STEL)	BAÑITO STEL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	METALADO SI	METALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA ENTRADA CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.50 mts x 1.60 mts)	ALUMINIO HORIZ	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mt)	ALUMINIO HORIZ	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO HORIZ	3	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.064.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.553
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estrutura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 40x40x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3 000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CABLEVIAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8"C INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DOMICILIO 1/2"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SALIDAS YEE DE 90 PVC 3"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIONES ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	0.75 MI	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8+1T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA (SIN BIBLIAR + PINTURA	443 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.5 MI	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 MI	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM	3.12 MI	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	068 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 16-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519-0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	1.007.024.732
No. VIVIENDA	42	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/18/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.33	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.50	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.1 M 2D)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE AIRE (MANTO ESIL)	MANTO ESIL	X		X		Impermeabilizada con manto esil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PEMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 mt x 1.40 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.2 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.063.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.963
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts. de altura en promedio
REJILLA DE PISO (CHORA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (MODELO INDICADO)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
PORCELANAS PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3. INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPA	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4. INCL. EXCAVACION Y TAPA	14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X80 CM. EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN H= CONGLOMERADO PROF. =+1.50 PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + N DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION "P" DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	5	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	2.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	006 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO--CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEJIRI 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901 481 526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACION	900 647 518 - 3
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	1.064.111.650
No. VIVIENDA	61	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/16/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
LAMINAS EN CONCRETO 3.000 PSI	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA ENMUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANPLAST PARA FACHADA	GRANPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MURO	RESANE Y PINTURA	X		X		En color Blanco
MAMPOSTERIA DE LADRILLO (PLACA DE BAÑO, MANTO ESC.)	MANTO ESC.	X		X		impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA ENTRE LOS CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PEMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.50 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE CAB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES MENJAREZ SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts. de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DRENAJE)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.19ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UNID	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UNID	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES. CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UNID	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS SANITARIO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS PEG DE 4"X 4"	1 UNID	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO CONGLOMERADO PROF <= 1.5M PARA RED DE CONEXION ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	0.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 3x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION ADHERIDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA CINTAMUAR + PINTURA	401 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
CIMENTAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.5 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS (200) VIVIENDAS Y UN (1) EQUIPAMIENTO DE MODALIDAD URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	000 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.505-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA				DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2			NOMBRE COMPLETO	JORGE ENRIQUE GELVIS
BARRIO	17 DE FEBRERO			DOCUMENTO	12.524.779
No. VIVIENDA	39			FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/3/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOLAZT PARA FACHADA	GRANOLAZT	X		X		En colores Amarillo y verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESBL)	MANTOSBL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA DOBLE CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA PATIO CORPRIMADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PUNO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.00 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.65 mts x 1 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BONJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.00 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástico en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA EN MAMPOSTERIA DE 60X60X80CM. EN CONCRETO DE 21 K 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS PEG DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PSOF +/- 1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8+8T ENDO. MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO + MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.25	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI +/- 7 CM	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.401.529-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-60 EDIFICIO GERMAN HORMAR OFICINA 505	TELEFONO	5851115
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.226 MC	NOMBRE COMPLETO	HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	1.064.111.009
No. VIVIENDA	40	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/16/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.06	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
CERAMICA P/ PARA FACHADA	CERAMICA	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
PISO Y PINTURA EN MURO	PISO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PLACA DE BARRO (MANTO VISTA)	MANTO VISTA	X		X		Impermeabilizado con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PICO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mts x 1.20 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 M X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.59ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x80CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 1"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SALIDA PCA DE Ø1/2"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y EL CONGLOMERADO PROF. <= 1.50 PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROMINENTE DE LA EXCAVACION	3.70 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" + ALAMBRE Cu THWN 3x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA (INFANCIAS + PINTURA	431 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	0.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS 200 CASAS Y UN (1) APARTAMENTO DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN LA JAGUA DE IBIRICO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	006 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901 461 526-9
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900 847 519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403431
DATOS DE LA VIVIENDA			
VIVIENDA		**DATOS DEL BENEFICIARIO**	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	1.003.115.386
No. VIVIENDA	45	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/18/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para amplias áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en losas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.50	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONA HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaguillado
GRANOLITICO PARA PISOS	GRANOLITO	X		X		En colores Amarillo y Verde fronter y Blanco lateral
PISO Y PINTURA EN MURO	PISO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESTU)	MANTO ASFA	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA METALICA CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PICADO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris planeado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.50 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts x 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.054.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
LAVAMANOS BLANCO	CERAMICO	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICO	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DAÑINA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
PORCELANAS PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
RED SANITARIA PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE		7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE		1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE		5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE		14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES. CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 2 1/2"X3/16" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"		7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4"T SILLAS Y 90 DE 4"X 4"		1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL CONSERVIO CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION		3.75 MT	X		X		Ensayado y funcionando
INSTALACIONES ELECTRICAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + 1#8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
ASPECTOS ESTRUCTURALES		**CANT**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA		441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20X0.30		2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM		2.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales
OBSERVACIONES GENERALES							

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (270) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	006 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901 461 326-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-46 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.510 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.228 M2	NOMBRE COMPLETO	EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	36.574.057
No. VIVIENDA	44	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/18/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.48	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y sanitarios
AREA ENGUAYO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.40 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
GRANOLITO PARA FACHADA	GRANOLITO	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ASFALTICO)	MANTOSA	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 22	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN PANGOLA CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.55 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.65 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1






FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVES DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.55ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60M. EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES. DOBLELLAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16"E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS RED DE 6"X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.50 MA PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO. INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR BUJIA MONOFASICA A 120v EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE CU THWN 3x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120v	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120v	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120v	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	821 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO f'c 3000 PSI	3.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE f'c 3000 PSI	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI f'c 7 CM	2.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	CONFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	004 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.126-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.647.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.225 M2	NOMBRE COMPLETO	EDILSON PEDROZO ROBLES
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	1.064.112.122
No. VIVIENDA	43	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/10/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambos áreas
ALCOBA 1	9.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.22	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.50	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑITO ESE)	BAÑITO ESE	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.00 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts x 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6



FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com







FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.053
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE		7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE		1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE		5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE		14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE P=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"		7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 6"X 6"		1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION		3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando
INSTALACIONES ELECTRICAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120v EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRES Cu THHN 2x6+1T EQUIPADA CON MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION INTERIOR A 120V		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
ASPECTOS ESTRUCTURALES		**CANT**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PARTIDA		941.63	X		X		Instalada y anexada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20		2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM		3.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales
OBSERVACIONES GENERALES							

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SE TENTA Y UN(271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	004 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACION DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-60 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA			
VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	DOLYS ENELSA FUENTES MENDOZA
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	36.570.808
No. VIVIENDA	33	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/1/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.33	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.76	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.76	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.33	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.58	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.40 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
CERAMICA PARA FACHADA	CERAMICA	X		X		En colores Amarillo y verde frontal y Blanco lateral
PEGO Y PINTURA EN MURO	PEGO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MATERIAL)	MANTO ASFALTICO	X		X		impermealizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 m x 1.80 m)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 m X 1 m)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.ses@outlook.com




FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UNO 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
LAVATARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento. en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts. de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7 TRAL.	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	16,50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANALETAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7,5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAS 150 DE Ø 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN H=0 CONSTRUIDO PREF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIONA ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2,75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE CU THWN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	1	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	6	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	3	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	681 KG	X		X		instalada y alineada segun planos estructurales
DINTAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0,5 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE f'c 3000 DE	2,72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3,12 M2	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN LOTE PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901.49 I 526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANJAHORRAH OFICINA 505	TELEFONO	5921110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3054403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.208 M2	NOMBRE COMPLETO	DIANA CAROLINA SUAREZ USMA
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	1.065.156.348
No. VIVIENDA	32	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/1/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	22.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA ENMURO	112.65	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embocquillado
GRANOLIDIT PARA FACHADA	GRANOLIDIT	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MURO	RESANE Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑITO EDIL)	IMPERMEABILIZANTE	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA ENTRADA CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIS	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mt x 1.80 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.65 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE CRB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. CERAMICA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 6" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UNI	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6" SILLAS YEE DE 6"X 6"	1 UNI	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. 0-1.5 MTS PARA RED DE CONEXION A CASAS EMPALMADAS INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2.75 MT	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	5	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PARTIDA	321 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	2.5 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	2.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DIC 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-65 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5501119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	CONSUELO BALLENA CLAVIJO
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	57.271.734
No. VIVIENDA	57	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/23/2022

AREA UTIL	MT	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA DE MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZOCALO (AMBIENTE 21.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOLITHIC PARA FACHADA	GRANOLITHIC	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESQ.)	MANTUTOX	X		X		Impermeabilizada con manto-asfi en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA DA TRAS ES CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.0 mt)	ALUMINIO VIDRIO	3	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4


Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



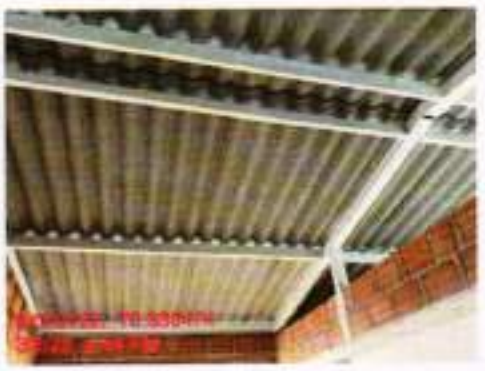

FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE OÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1.UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5.UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI, IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACOMETIDA DIAMETRO 1"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SALAS PSE DE 6"X 5.5"	1.UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO DE MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO HASTA 1.15M PARA RED DE CONEXION A SUMIDERO LADO. INCLUYE 1.00M CONMATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8+8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VARIAS A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120v	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120v	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.5 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 1000 PSI e= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	058 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANJA-CERRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT I IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004457421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.225 M2	NOMBRE COMPLETO	CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	1.064.115.599
No. VIVIENDA	36	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/2/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.20	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.58	X		X		
TERRAZA	3.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MURO	RESANE Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑITO ETA.)	MANTELADA	X		X		Impermeabilizada con manto asfi en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.50 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1.00)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1






FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	16.16ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c= 210PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANALES, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 1"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE MT SALIDAS DE 3/4"X 2"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	1.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120v EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIGUETAS UNIPANELAR + PINTURA	641.4/2	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PUNTILLA PARA CONCRETO DE 3000 PSI 4½ 1 CM	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901 481 526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT I IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004635621

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.225 M2	NOMBRE COMPLETO	SUEDIS ESTHER GALAN MARRIAGA
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	36.622.544
No. VIVIENDA	40	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	9/18/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.75	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA ENMURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
GRANOLITO PARA FACHADA	GRANOLITO	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MUROS	RESANE Y PINTURA	X		X		En color Blanco
MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL PLACA DE BARRO (MARCA EDIL)	MARCA EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIS	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mts x 1.50 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA EE. COCINA (0.55 mts X 1 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BRAUMER SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	16.59ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X80CM, EN CONCRETO DE f'c=3,000 PSI, IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CINCELADA, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE 200 Ø 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN H2 CONFORMADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE CU THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	481 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM	2.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE NOVENTA SETENTA Y UN (071) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.401.525-3
DIRECCION	CARRERA 11# 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004657421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.220 M2	NOMBRE COMPLETO	TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ ARENGAS
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	6.791.292
No. VIVIENDA	43	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	5/03/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.48	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.50	X		X		
CUBIERTA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOPLAS T PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ASFALTICO)	MANTO ASFALTICO	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PVMC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 MTS X 1.00 MTS)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.80 MTS X 1 MT)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MTS X 1.0 MT)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.892.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (ENGRA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
RAMAL SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
RAMAL SANITARIO PVC 3" - INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x80CM EN CONCRETO DE f'c=1.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACION Y TAPE. TAPA Y HERRAJES. CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8"X 6. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS Y/O DE 6"X 3"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >1.50 PARA RED DE CONEXION ALCANTARILLADO. INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR SUBTERRANEA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 +1X8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION "P" DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VARIAS A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	447 KG	X		X		Instalada y elevada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y elevadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.60X0.20	2.72 MD	X		X		Construidas y elevadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	0.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA NOVECIENTOS SESENTA Y UN (971) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERACION	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-84 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505.	TELEFONO	5301119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403021

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.229 M2	NOMBRE COMPLETO	ANGELICA MARIA CARO GOMEZ
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	26.573.976
No. VIVIENDA	28	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	31/1/2022

AREA UTIL	BI	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas areas
ALCOBA 1	9.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.20	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.05	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y alrededores embaquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BANITO YESO)	BANITO ESA	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1 (1.1 (1.2 mt x 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UR6 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE OÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
PORCELANAS PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.55ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x80CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO , INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 1/2"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SALIDAS DE 20 (F.F.H 1/2"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	5.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TH DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y aliviada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y aliviadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.3X0.25	2.72 M3	X		X		Construidas y aliviadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO #VEURS 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901 481 526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5501119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACION	900 847 519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	ALBA YASMIN CRUZ PAEZ
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	36.573.027
No. VIVIENDA	31	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/23/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.00	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y aconomico
AREA DE MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entorquillado
GRANOLAST PARA FACHADA	GRANOLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BARTO EDIL)	BARTO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	5	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.6 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.062.950
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAMPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en tubo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
MONOTACONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INTS. EXCAVACION Y TAPE	16.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANALETAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/4"E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE Ø 6"X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. =<1.50 PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 MS	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2x8+8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y aliviada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y aliviadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MS	X		X		Construidas y aliviadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM	3.12 MS	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (270) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN LOTE PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	008 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 506	TELEFONO	5561119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004405421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	WILMER RIOS SANCHEZ
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	9.081.791
No. VIVIENDA	30	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/2/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.76	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.76	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y aceptable
AREA EN MUROS	110.65	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
DRAINPLAST PARA FACHADA	DRAINPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑO EDIL)	BAÑO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mts x 1.80 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UNB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.1ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UNI	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UNI	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.5ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x80CM EN CONCRETO DE 21+0.00PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CARUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UNI	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 6"X 4"	1 UNI	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.72 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 3x8 +8" DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	447 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVICUBE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5501115
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004405421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.225 M2	NOMBRE COMPLETO	TULIA ROSA IBAÑEZMUÑOZ
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	26.947.431
No. VIVIENDA	28	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/2/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.09	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.33	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
CERAMPLAST PARA FACHADA	CERAMPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco latina
PEGO Y PINTURA EN MUROS	PEGO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (BAÑITO EDIL)	BAÑITO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA FORO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mts x 1.80 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE 1968 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE DAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.604.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con cuo desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC A INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.60 PD IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CINCELAR, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS SANITARIAS 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROLLAVE DE 3/4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5m PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.35	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI f'c= 7.0N	5.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	068 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO I DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT I IDENTIFICACIÓN	901.461.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-06 EDIFICIO GRANAVORMAR OFICINA 505	TELÉFONO	5561119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT I IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004603401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.225 M2	NOMBRE COMPLETO	RUBY SANCHEZ
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	36.572.280
No. VIVIENDA	47	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/18/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.46	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.33	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.65	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embocquillado
DRAINPLAST PARA FACHADA	DRAINPLAST	X		X		En colores Amarillo y verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA EN BAÑO (MANTO ICOL)	MANTO ICOL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platiado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris platiado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platiado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platiado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.60 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.0 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE OÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estrutura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PARA MARMOLEO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.95ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 2 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 8" Y 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.0M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	5.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120v EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + N° 10 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120v	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120v	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120v	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.35	3.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7.5M	5.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN(271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEJIRI 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5821118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004409421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	ORLANDO NIETO TORRES
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	3.949.051
No. VIVIENDA	30	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/1/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	3.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y acabados
AREA EN MURO	112.58	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
PEGO Y PINTURA EN MURO	TEXTO PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACAS (MURO MANTO EDIL)	MANTO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris palteado
PUERTA EN TABLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris palteado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris palteado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris palteado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 m x 1.60 m)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 m X 1 m)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.063.804.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo parillado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.55ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 40x40x60CM. EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS 150 DE 2"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMBINADO CONGLOMERADO PROF. <1.5 M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHW 3x8 + 8" DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y anexada según planos estructurales
ZAPATAS En CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y ancladas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y ancladas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 1000 PSI H= 7 CM	5.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	058 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901 491 526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5001110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900 847 519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.328 M2	NOMBRE COMPLETO	NORANDITH GONZALEZ CASTILLO
BARRIO	17 DE FEBRERO	DOCUMENTO	1.064.107.978
No. VIVIENDA	30	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/23/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.76	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y arrimables
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO MORTERO CEM.	IMPERMEABILIZANTE	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.85 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.8 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUR DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO DUCHA	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ASERIO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus lavaguas
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE		7.19ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 6" INCL. EXCAVACION Y TAPE		1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE		5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE		14.55ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X80CM EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CHIBELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"		7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 6"X1/2"		1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN		5.75 MT	X		X		Ensayado y funcionando
INSTALACIONES ELECTRICAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
ACOMETIDA GENERAL POR BAJO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
ASPECTOS ESTRUCTURALES		**CANT**	**INSTALADO SI**	**INSTALADO NO**	**ESTADO BUENO**	**ESTADO MALO**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (CERCHA UNIFAMILIAR + PREFUGA		441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		0.0 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3.0 [illegible]		2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM		3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales
OBSERVACIONES GENERALES							

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA NOVENTOS SETENTA Y UN (171) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIJPB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-60 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 305	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS
BARRIO	LUIS CARLOS GALAN	DOCUMENTO	1.064.115.946
No. VIVIENDA	35	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	3/2/2022

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.05	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.58	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESBJ)	MANTO ESBJ	X		X		Impermeabilizada con manto esbj en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.00 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mt x 1.0 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A15 – INFORME SOCIAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

MARZO - 2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de marzo el area social caracterizó y se realizó levantamiento de suspensión en los barrios 17 de febrero , Juan Ramon y bello horizonte, del municipio de la jagua de ibirico con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reuniones de socialización con la comunidad, en acompañamiento con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visitas a domicilio casa por casa para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN BARRIO PEDRO CASTRO

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el dia de hoy 19 de marzo de 2022, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion y levantamiento de suspensión realizada en los barrios 17 de febrero,Juan Ramon y bello horizonte, en conjunto con los beneficiaros y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer a los beneficiarios datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las politicas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por su bienestar asi mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorias visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion de levantamiento y suspension en viviendas de aplicación
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- Los beneficiarios junto con el presidente del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se concientizo a los beneficiarios acerca del tema de espera de la demolicion de las casas en las cuales residen y se les explico los tiempos de entrega.
- Se tomo asistencia de los beneficiarios.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**OBJETO:** CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	
	CONTRATANTE:	CONFACESAR
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA TACHIRA DE IBARCO	FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		DIRECCION:	
EDAD:		BARRIO:	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTEZCO	EDAD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

_____

C.C

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLUCIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"***, por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"**, particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____, ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ (_____ **M2**) y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura pública de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 15-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR			FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA	MES	AÑO	
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO			**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**		
Nombre			**Nombre**		
Cedula			**Cedula**		
Dirección			**Dirección**		
Celular / Tel. fijo			**Celular / Tel. fijo**		
C. Electrónico			**C. Electrónico**		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible

ANEXOS LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
CONTRATANTE:	CONFACESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO:	Los Ramos, Bello horizonte, 17 de febrero

19/03/2022

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Ramon de Jesus Ro	1.020.901.[illegible]	[illegible]	17 Febrero	3126197028	contratista	[illegible]
	Gustavo Benjumea	1.234.892.993	[illegible]	"	3009331469	Interventoria	[illegible]
	Kevin Aleman J.	1.071.657.[illegible]	Ing. [illegible]	17 febrero	3154744812	Contratista.	[illegible]
	Jhon Cuy.	1.065.219.320	Ing Sst	Centro	3002[illegible]	Contratista	[illegible]






Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy
A21solzzajfyr-afli



ANEXO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento			
Dirección			Cedula catastral			
Matricula inmobiliaria			☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	Cual?			
	☐ Madera	☐ Otro?	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ En Construccion	☒ Lote Baldio	☐ Otro:	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	Numero de niveles (pisos)			
Longitud de frente	Mts.					

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote vacio, sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN: 01
		Página: 3 de 3

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13.10.2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD **OBRA** Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS			
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS		
Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardin	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala		
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala		
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

No se pudo dar información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara puede demorar en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN: 01
		Página: 3 de 3

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

VIVEURIS 2021

ACTA DE VECINDAD

FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
VERSION: 01

LA JAGUA - CESAR

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD **OBRA** Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación: [X] Urbano [ ] Rural — Barrio/ Corregimiento: Juan Bonon

Dirección:

Matrícula inmobiliaria: — Cedula catastral:

Tipo de Construcción: [ ] Concreto [X] Ladrillo [ ] Bloque [ ] Prefabricado [ ] Bahareque [ ] Madera [ ] Otro? Cual?

Tipo de predio: [X] Residencial [ ] Comercial [ ] Institucional [ ] Industrial [ ] Lote sin edificar [ ] Recreacional [ ] Bien Cultural [ ] En Construcción [ ] Lote Baldío [ ] Otro

Longitud de frente: Mts — Numero de niveles (pisos): 1

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre: Socorro Barrera
Cedula: 36 571 795
Dirección: Trans V 16 # 5-44
Celular / Tel. fijo: 314 528 3626
C. Electrónico: No
Notificación E-mail: [ ] Si [ ] No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre:
Cedula:
Dirección:
Celular / Tel. fijo:
C. Electrónico:
Notificación E-mail: [ ] Si [ ] No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

			Observaciones
Electricidad	[X] Si	[ ] No	
Gas domiciliario	[ ] Si	[X] No	
Teléfono Fijo	[ ] Si	[X] No	
Agua	[X] Si	[ ] No	
Acueducto	[X] Si	[ ] No	
Alcantarillado	[X] Si	[ ] No	
Recolectores	[X] Si	[ ] No	
Televisión cable	[ ] Si	[X] No	
Otro	[ ] Si	[ ] No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	[ ] Si	[X] No
Uso	[ ] Garaje	[ ] Comercial
Garaje	[ ] Si	[ ] No
En uso	[ ] Si	[ ] No
Rampas especiales	[ ] Si	[X] No
Antejardin	[ ] Si	[X] No

La entrevistación incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

VIVEURBE 2027	**ACTA DE VECINDAD**	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025 VERSION: 01 Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Andén	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☒ Si ☐ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☒ Si ☐ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Trujillo.		Socorro Barrera
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	cc 36571795
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página 1 de 3

LA JAGUA - CESAR

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

ACTA DE VECINDAD **OBRA** Construcción de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación: X Urbano — Rural — Barrio/ Corregimiento: Juan Ramon

Dirección:

Matrícula inmobiliaria: — Cedula catastral:

Tipo de Construcción: X Concreto — Ladrillo — Bloque — Prefabricado — Bahareque

Madera — Otro? — Cual?

Tipo de predio: Residencial — X Comercial — Institucional — Industrial — Lote sin edificar

Recreacional — Bien Cultural — En Construccion — Lote Baldio — Otro

Longitud de frente: Mts — Numero de niveles (pisos): 1

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre: Hiram Arias

Cedula: 49 693 916

Dirección: Trans. 16

Celular / Tel. fijo: 311 916 1075

C. Electronico: No

Notificación E-mail: Si — No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre:

Cedula:

Dirección:

Celular / Tel. fijo:

C. Electronico:

Notificación E-mail: Si — No

4. SERVICIOS PUBLICOS

			Observaciones
Electricidad	X Si	No	
Gas domiciliario	X Si	No	
Telefono Fijo	Si	X No	
Agua	X Si	No	
Acueducto	X Si	No	
Alcantarillado	X Si	No	
Recolectores	X Si	No	
Television cable	X Si	No	
Otro	Si	No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	Si	X No
Uso	Garaje	Comercial
Garaje	Si	No
En uso	Si	No
Rampas especiales	Si	X No
Antejardin	X Si	No

La información incorrecta, incompleta y poco clara caerá dentro de la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	X Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	X Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	X Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos		☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	X Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	X Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	X Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas		Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas		☐ Expuesta
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

La vivienda cuenta con cielo raso en PVC en buen estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.		Hilda Del Cid
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	CC 49693426
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

A16 – INFORME DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

VIVEURB 2021

PERIODO: MARZO DEL 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
MARZO 2022

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 3
2. OBJETIVOS. 4
2.1. Objetivos especificos. 4
2.2. Objetivos específicos. 4
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 5
4. MARCO JURIDICO Y LEGAL. 6
4.1. Dentro de las leyes se encuentran: 6
4.2. Los decretos referentes a este sistema son: 6
5. PLAN DE TRABAJO. 7
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE SST - 2022 7
6.1. Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son: 7
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MES 8
7.1. Seguridad Industrial. 8
7.2. Señalización. 9
7.3. Desvió de tráfico vehicular. 10
7.4. Capacitación y/o charlas de seguridad industrial. 11
7.5. Cronograma de charlas y/o capacitaciones diarias. 11
7.6. Identificación de peligros, evaluación de riesgos. 12
8. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 13
8.1. Entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (epp). 13
8.2. Reporte e investigación de accidentes laborales. 14
8.3. Uso adecuado de elementos de protección personal (epp). 14
9. CONCLUSIÓN. 15
10. ANEXOS. 16
10.1. ENTREGA DE EPP 16
10.2. CHARLAS DE SEGURIDAD 38
10.3. LAVADO DE MANOS. 44
10.4. ANALISI DE TRABAJO SEGURO. 54
10.5. ANALISI DE TRABAJO INSEGURO. 80

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCION.

El modo de proceder de los trabajadores es un factor fundamental hacia la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Por esta razón se hace necesario que todos los funcionarios, contratistas y sub contratistas, independientemente de su vinculo con la entidad asuman su responsabilidad, y compromiso hacia el autocuidado, la aplicación de las medidas de seguridad, uso adecuado de los EPP (Elementos de Protección Personal), en fin, todas las medidas que permitan controlar los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores y que pueden generar accidentes y/o enfermedades laborales.

Este informe describe el compromiso asumido por el CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo una Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual está relacionada con las diferentes actividades en la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores en los diferentes frentes de obra, ubicados en el Municipio de la Jagua de Ibirico.

El presente documento constituye el informe mensual del seguimiento y control a cada componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S.I.S.O) realizado por el VIVEURB 2021, el cual ha sido muy riguroso en el cumplimiento de lo establecido por la ley.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos especificos.

Propender por la felicidad de nuestros funcionarios, contratistas y subcontratistas con el desarrollo de actividades tendientes a lograr condiciones de trabajo seguras y saludables en la Empresa en el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

2.2. Objetivos especificos.

- ✓ Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dándole cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable, para los funcionarios, contratistas y subcontratistas en el desempeño de sus labores.
- ✓ Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la entidad.
- ✓ Realizar dotación de campamento.
- ✓ realizar entrega de elementos de protección personal.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida, pedro castro y villa chelsy.



MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9°24' de latitud norte y 73°20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

4. MARCO JURIDICO Y LEGAL.

4.1. Dentro de las leyes se encuentran:

- Ley 1523 de 2012: "Por la cual se adopta la politica nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".

- Ley 1562 de 2012: "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".

- Ley 1010 de 2006: "Por la cual se definen, previenen, corrigen y sancionan las diversas formas de agresión, maltrato, trato ofensivo y desconsiderado y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública".

- Ley 776 de 2002: "Se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Esta Ley modifica las prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos Profesionales".

4.2. Los decretos referentes a este sistema son:

- Decreto 171 de 2016: "Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".

- Decreto 1072 de 2015: "Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Trabajo".

- Decreto 0472 de 2015: "Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y Riesgos Laborales".

- Decreto 1443 de 2014: "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. PLAN DE TRABAJO.

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE SST - 2022

Con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de SST-2022, se viene implementando el cronograma indicador de cumplimiento.

El cronograma y demás fases señaladas en el plan general podrán ser ajustados de conformidad con el desarrollo de los procesos de la EMPRESA y los recursos asignados para tal fin.

6.1. Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son:

- ✓ Semana de la salud.
- ✓ Exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso y periódicos).
- ✓ Aplicación de batería de riesgo psicosocial.
- ✓ Elaborar programa de riesgo cardiovascular - Entorno Laboral Saludable.
- ✓ Implementar Programa de Vigilancia Epidemiológica en conservación visual.
- ✓ Campaña prevención del tabaquismo y consumo de drogas.
- ✓ Realizar jornadas de Orden y Aseo.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL MES.

7.1. Seguridad Industrial.

Se viene estableciendo las medidas de seguridad industrial que buscan eliminar por completo la ocurrencia de accidentes y/o incidentes durante la ejecución de la obra.

Para el desarrollo de las actividades de seguridad industrial y salud ocupacional propuestas en la presente guia, el contratista debe contar con el apoyo de la ARP a la cual se encuentran afiliados sus trabajadores y con el de entidades de carácter especializado, como: Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Entidades de Atención y Prevención de Desastres.



SEGURIDAD INDUSTRIAL



SEGURIDAD INDUSTRIAL

MEDIDAS ADOPTADAS.


- Adopción de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional contempladas en la legislación laboral vigente.
- Control de los riesgos a partir de la definición del panorama de los factores de riesgo propio para el proyecto.
- Difusión amplia entre los trabajadores del panorama de los factores de riesgo para cada actividad y del conjunto del proyecto.
- Inducción para el uso adecuado de los elementos de protección personal, acordes con el panorama de los factores de riesgo.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.2. Señalización.

Se están adelantando acciones que nos permitan prevenir accidentes laborales y de terceros mediante el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de la obra.

Implementar el uso de señales preventivas, reglamentarias e informativas durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.

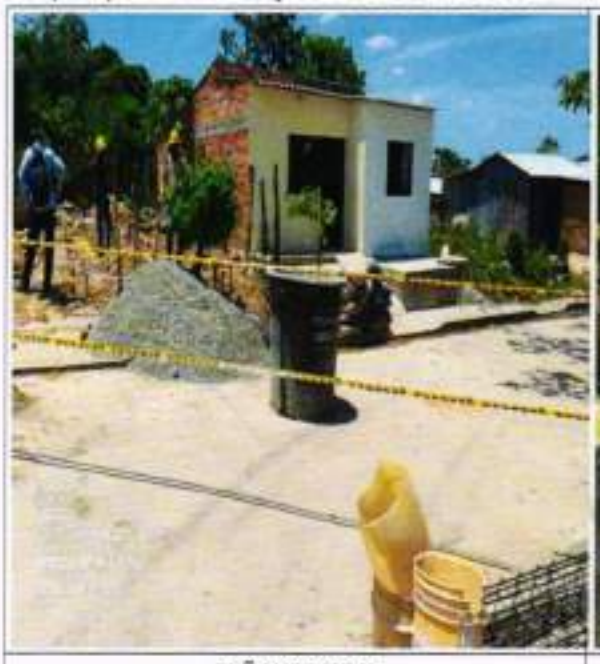	
SEÑALIZACION	SEÑALIZACION

MEDIDAS ADOPTADAS.

- El Contratista por medio de sus profesionales viene demarcando el perímetro de la obra, para evitar incomodidades a la comunidad por las actividades de construcción.

- Se deben retirar los elementos de aislamiento y demarcación durante el día siguiente de la terminación de las obras. Sobre los cruces de fuentes superficiales se colocarán señales indicando al personal del contratista la importancia de conservar los recursos naturales.

- Se deben aislar y demarcar los diferentes sectores de la obra, como oficinas, bodegas, depósito de materiales, servicios sanitarios, vestidores, almacén, comedor, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades de la obra y evitar riesgos al personal.


carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.3. Desvió de tráfico vehicular.

Se viene programando adecuadamente el manejo y operación del tráfico en los alrededores del proyecto, que nos permitan proteger a los trabajadores y transeúntes durante el transporte de equipos y en la obra.



DESVIO VEHICULAR

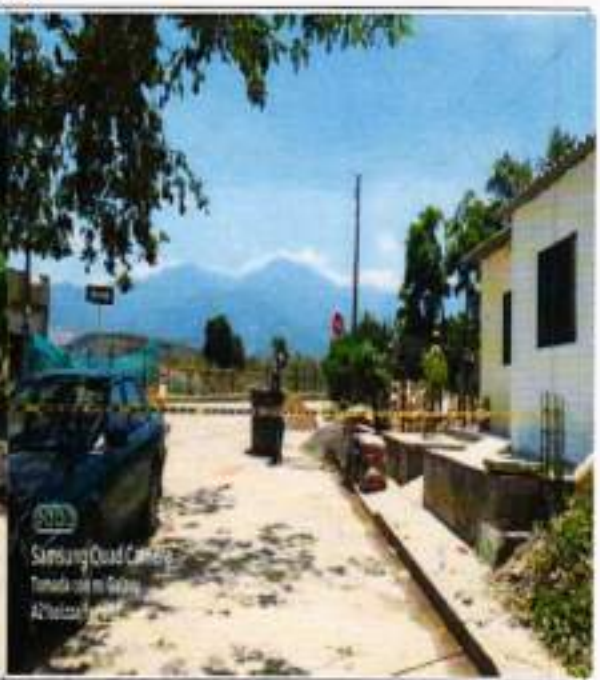

DESVIO VEHICULAR

MEDIDAS ADOPTADAS.

- Se realizan rutas de desvios. Se Concreta y define con las autoridades de tránsito y transporte el manejo de los desvios e identificación autorizados.
- Dirigir la circulación en forma ágil y segura en las zonas de trabajo y alrededores.
- Se viene Imponiendo límites de velocidad, direcciones, controles y disposiciones especiales.
- Se le Informa a la comunidad sobre desvios, medidas de seguridad acorde con los manuales de ministerio de obras públicas y del transporte.
- Se diseñan Pasos provisionales, se viene construyendo e instalando pasos temporales para peatones y vehículos y mantenerlos debidamente.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.4. Capacitación y/o charlas de seguridad industrial.

Antes del inicio de las actividades diarias se realiza la oración a DIOS todo poderoso para recargarnos espiritualmente y charlas de seguridad.

Consiste en la preparación y realización de sensibilización y capacitación dirigido a todo el personal que labora en la empresa tanto al área de campo como administrativa.
Todos los trabajadores antes de ingresar a laborar en la obra (oficinas y campo) pasan por el programa de inducción. El Contratista de la obra, diseñó un programa de inducción en entrenamiento en seguridad industrial y salud ocupacional.



CHARLAS



CAPACITACION

7.5. Cronograma de charlas y/o capacitaciones diarias.

IONOGRAMA DE CAPACITACION DE CHARLA DE SEGURIDAD MES DE MARZO DEL 20 HORA:06:30 am

MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES
1	2	3	4	5	7
La prevención de los actos inseguros	Manipulación segura del extinguidor de fuego	El peligro inminente en SST	Actos y condiciones inseguras	Que es un riesgo laboral	Habitos alimenticios
8	9	10	11	12	14
Investigacion de accidentes	Proteccion de los pies	Herramientas manuales	Riesgo electrico	Proteccion de brazos y manos	Equipios de proteccion para la cara y ojos
15	16	17	18	19	21
Trabajar correctamente	Manejo de escombros	Habitos saludables	Psusas activas	Objectos que caen	Levantamiento de carga
22	23	24	25	26	28
Elementos de proteccion personal	Primeros auxilios	cuidado con las manos	Manejo de desechos peligrosos	Demarcacion a puntos criticos	Excavaciones
29	30	31			
Elementos de proteccion personal	Primeros auxilios	Uso de botas de seguridad			

Nota: Todos los dias se socializara tema relacionado al covid-19, lavado de manos y distanciamiento social.

Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7.6. Identificación de peligros, evaluación de riesgos.

Con el objetivo de Prevenir accidentes laborales y a terceros se está implementando el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de las obras.

Se realizó la identificación de los peligros de las actividades de coordinación de diseño por tareas, y se identifica que los más recurrentes son los riesgos psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fisicos.

	
DOTACION DE CAMPAMENTO.	DOTACION DE IJPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MEDIDAS ADOPTADAS.

- Se adelantan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo donde se evalúan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y se dan las recomendaciones para evitar incidentes y accidentes laborales.

- Para minimizar los riesgos de caidas, ingreso de personal no autorizado y el distanciamiento social, se procedió a señalizar las áreas de circulación y ubicación del personal acorde con las actividades a desarrollar.

- En la obra se dispone de elementos de emergencias, tales como botiquines, camillas, extintores, los cuales se revisan de manera periódica para verificar su estado de limpieza y funcionamiento, para garantizar una atención oportuna ante una eventualidad.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

El Programa de Salud Ocupacional, consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas.

8.1. Entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (epp).

Elemento de Protección Personal (Abreviatura: EPP): Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos grave.



ENTREGA DE EPP



USO ADECUADO DE EPP

MEDIDAS ADOPTADAS.

- Disposición final: Hace referencia a la eliminación definitiva conforme normas ambientales, de los EPP que han cumplido su vida útil, bien sea por deterioro o por caducidad.
- Se contratista viene haciendo entrega de elementos de protección personal que ingresa en la obra, así mismo viene realizando cambio de aquellos que ya cumplieron su tiempo de uso aquellos que están deteriorados.
- Se deja evidencia fotográfica de las actividades realizadas así como una planilla donde se deja constancia de la fecha y la persona que se le entregan los epp.
- Se viene acatando las sugerencias por la interventoría y sus profesionales de campo y se hacen las respectivas correcciones.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8.2. Reporte e investigación de accidentes laborales.

Durante el mes de MARZO 2022, no se presentaron accidentes laborales, debido a los controles operacionales implementados y ejecutados por la profesional en campo del contratista.

8.3. Uso adecuado de elementos de protección personal (epp).

Los EPP se suministran a los funcionarios al momento de ser contratados, según las actividades que cada funcionario y contratista realicen, según la matriz de identificación de peligros de la entidad y matriz de elementos de protección personal; mediante los profesionales en campo del contratista e interventoría se hace seguimiento a los trabajadores para que hagan uso adecuado de estos elementos de protección.



USO ADECUADO DE EPP	USO DE EPP

MEDIDAS ADOPTADAS.

- sancionar a los trabajadores que no cumplan con el uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Capacitar sobre el tiempo y uso de los elementos de protección personal.
- Adoptar las observaciones realizadas por los profesionales de la interventoría y hacer las respectivas correcciones.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

9. CONCLUSIÓN

- El Consorcio VIVEURB 2021 por medio de sus profesionales viene realizando continuamente planes de mejoras, así mismo viene haciendo inspecciones de trabajos con el objetivo de reducir al máximo los posibles accidentes laborales.

- Se viene realizando jornadas de capacitaciones tanto a los trabajadores como a los habitantes aledaños al proyecto este último con el fin de generar sentido de pertenencia por la obra construida y también para que eviten que sus familiares entre todos los niños no hagan ingreso a la obra y se expongan en peligro.

- Se está cumpliendo con las metas de tener cero incidente y cero accidente laboral gracias a la buena implementación del sistema de gestión SG- que a diario hace la profesional siso del CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoria y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

Lizeth K Moreno C.

LIZETH KARINA MORENO CASTRILLO.
TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10. ANEXOS.

10.1. ENTREGA DE EPP

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yorgui Morales		
CÉDULA:	17.579.398	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	14-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	22-03-22	1
2	Guantes tipo ingeniero	22-03-22	3
3	Gafas de seguridad	22-03-22	3
4	Tapabocas	22-03-22	5
5	Kit de desinfección	22-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Yorguis Morales
CC 17579398

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daimer Navarro		
CÉDULA:	1.128.150.086	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	14-08-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	22-08-22	3
2	Tapabocas.	22-08-22	5
3	Gafas de seguridad.	22-08-22	3
4	Kit de desinfección	22-08-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Ineth L. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Daimer NAVARRO
CC 1128150086

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Edwin Vega		
CÉDULA:	1.064.109.526.	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	24-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	28-03-22	3
2	Tapabocas	28-03-22	5
3	Gafas de seguridad	28-03-22	3
4	Kit de desinfeccion	28-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Edwin Vega
CC 1064109526

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Ruda		
CÉDULA:	1.065.586.802	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	29-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	28-03-22	3
2	Tapabocas	28-03-22	5
3	Kit de desinfección	28-03-22	1
4	Gafas de seguridad	28-03-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA:

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Daniel Ruda
CC 1065586802

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Feinel lopez		
CÉDULA:	18.979.763	OCUPACIÓN:	Maestro.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	24-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	28-03-22	3
2	Tapabocas.	28-03-22	5
3	Kit de desinfección	28-03-22	1
4	Gafas de Seguridad	28-03-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Liseth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Liseth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Feinel López S.
18974763

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Angulo.		
CÉDULA:	1.006 854.125	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	24-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	28-03-22	3
2	Tapabocas	28-03-22	5
3	Kit de desinfección	28-03-22	1
4	Gafas de seguridad	28-03-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Ineth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SST.	FIRMA:	Ineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Mi compromiso a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Juan Angulo
CC 1006854125.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Fernel lopez		
CÉDULA:	78.974.763	OCUPACIÓN:	Maestro
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes de seguridad.	08-03-22	3
2	Casco de seguridad	08-03-22	1
3	Gafas de seguridad	08-03-22	3
4	Tapabocas.	08-03-22	5
5	Kit de desinfección.	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Fernel López S.
CC 78974763

Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Jose Carreño		
CÉDULA:	12.521.843.	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	28-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	30-03-22	3
2	Gafas de seguridad.	30-03-22	3
3	Tapabocas	30-03-22	5
4	KH de desinfección	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Ineth L. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

José Carreño
CC 12.521.843

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Jose Argulo.		
CÉDULA:	1.068.348.049	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	28-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	30-03-22	3
2	Gafas de seguridad	30-03-22	3
3	Tapabocas	30-03-22	5
4	Kit de desinfección	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

CC. 1068348049

Carrera 11 N. 15-66 Oficina 306 Edf. Granadino
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Ernesto Arias		
CÉDULA:	1064.121822	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	08-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	14-03-22	3
2	Gafas de seguridad	14-03-22	3
3	Casco de seguridad	14-03-22	1
4	Tapabocas	14-03-22	5
5	Kit de desinfectdo	14-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046
CARGO:	Siso	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Juan Arias
CC 1064121822

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Jesus Cortes		
CÉDULA:	24.951.570	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	28-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	30-03-22	3
2	Gafas de seguridad	30-03-22	3
3	Tapabocas.	30-03-22	5
4	Kit de desinfeccion	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

CC 24951570

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daimer Navarro.		
CÉDULA:	1.128.150.086	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	28-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	30-03-22	3
2	Gafas de Seguridad.	30-03-22	3
3	Tapabocas	30-03-22	5
4	Kit de desinfección	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Izeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.084.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Izeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Daimer NAVARRO
CC 1128150086

Correo electrónico: proyectosjaguari.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Duban Flores		
CÉDULA:	1.003-291-192	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	30-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	30-03-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	30-03-22	3
3	Tapabocas	30-03-22	5
4	Kit de desinfeccion	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Duban Flores
CC 1003291192

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Epimenio Herrera		
CÉDULA:	85.440.724	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	30-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Gafas de seguridad.	30-03-22	3
2	Guantes tipo ingeniero	30-03-22	3
3	Tapabocas	30-03-22	5
4	Kit de desinfección	30-03-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	lizeth V. Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permitan minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Epimenio Herrera
CC 85440724

Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 305 Edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Fidel Rios		
CÉDULA:	12.522.725	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes de seguridad	08-03-22	3
2	Gafas de seguridad	08-03-22	3
3	Casco de seguridad	08-03-22	1
4	Tapabocas	08-03-22	5
5	Kit de desinfeccion	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Fidel Rios
CC 12522525

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yuris Mojica.		
CÉDULA:	1.064.789.296	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	14-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	22-03-22	1
2	Guantes de seguridad	22-03-22	3
3	Gafas de seguridad.	22-03-22	3
4	Tapabocas.	22-03-22	5
5	Kit de desinfección.	22-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Izeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Izeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Yuris Mojica Rojas
1064789296

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Fernando Bayalino		
CÉDULA:	12-521-642	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion.	FECHA:	08-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	14-03-22	1
2	Gafas de seguridad	14-03-22	3
3	Guantes. tipo ingeniero	14-03-22	3
4	Tapabocas	14-03-22	5
5	Kit de desinfectio	14-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Montero C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	Siso.	FIRMA:	Lizeth Montero

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Fernando Bayalino
12521 642.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@ocon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ruben Gamez		
CÉDULA:	19.600.698.	OCUPACIÓN:	Maestro.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	08-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad.	14-03-22	1
2	Guantes de seguridad	14-03-22	4
3	Gafas de seguridad	14-03-22	4
4	Tapabocas.	14-03-22	5
5	Kit de desinfección	14-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C	CÉDULA:	1.064 113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Ruben Gamez
CC 19600698

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edwin Vega.		
CÉDULA:	1.064.109.526	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	08-03-22	1
2	Guantes de seguridad	08-03-22	4
3	Gafas de seguridad	08-03-22	3
4	Tapabocas.	08-03-22	5
5	Kit de desinfección	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Edwin Vega
CC 1064109526

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRASAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Peña.		
CÉDULA:	1.065.586.801	OCUPACIÓN:	Ayudar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	08-03-22	1
2	Guantes de seguridad	08-03-22	3
3	Gafas de seguridad	08-03-22	3
4	Tapabocas.	08-03-22	5
5	Kit de desinfeccion	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno.

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

CC Daniel Peña
1.065586802

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ivon Angulo.		
CÉDULA:	1.006.854.125	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	08-03-22	1
2	Guantes de seguridad	08-03-22	3
3	Gafas de seguridad.	08-03-22	3
4	Tapabocas.	08-03-22	5
5	Kit de desinfección	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Ivon Angulo
CC 1006854125.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Yainer Caraballo		
CÉDULA:	5.164.672	OCUPACIÓN:	Auxiliar
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	01-03-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes de seguridad	08-03-22	4
2	Gafas de seguridad	08-03-22	3
3	Casco de seguridad	08-03-22	1
4	Tapabocas	08-03-22	5
5	Kit de desinfección	08-03-22	1
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SSO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad

CC 5 16 46 72

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.2. CHARLAS DE SEGURIDAD

01-03-22 la Jagua de Ibirico
Prevención de los Actos Inseguros

Yorgui Morales	17-339 398	Oficial	Construcción	N/A		Yorgui S
Fernando Bapulino	12-321-682	Oficial	Construcción	N/A		
Johan Arias	1 064 16 656	Auxiliar	construcción	N/A		
Ruben Gomez	19 650 678	Auxiliar	construcción	N/A		
Juan A. Arias	1 064 18 135	Oficial	Construcción	N/A		
Daimer Navarro	1118 150 082	Auxiliar	Construcción	N/A		
Javier Morales	13 449 018	Conductor	Construcción	N/A		
Juan Ernesto Arias	1064 11 811	Auxiliar	Construcción	N/A		
Jorge Mejia	1 064 16 698	Auxiliar	Construcción	N/A		
Jose Carreño	12 321 843	Auxiliar	Construcción	N/A		
JORGE						

02-03-22 la Jagua de Ibirico
Manipulación segura del extintor de fuego

Yorgui Morales	17-339 378	Oficial	Construcción	N/A		Yorgui S
Fernando Bapulino	12-321-682	Oficial	Construcción	N/A		
Juan Andres Arias	1 064 16 135	Auxiliar	construcción	N/A		
Ruben Gomez	19 650 678	Oficial	Construcción	N/A		
Johan Arias	1 064 16 656	Auxiliar	Construcción	N/A		
Daimer Navarro	1 118 150 082	Auxiliar	construcción	N/A		
Javier Morales	13 449 018	Conductor	construcción	N/A		
Juan Ernesto Arias	1 064 11 811	Auxiliar	Construcción	N/A		
Jorge Mejia	1 064 16 698	Auxiliar	Construcción	N/A		
Jose Carreño	12 321 843	Auxiliar	construcción	N/A		

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

08-03-22 la jagua de ibirico
Investigacion de Accidentes

Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	Construccion	N/A	
Juan Ernesto Arias	1.069.111.882	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jose contreras	12.529.885	Auxiliar	construccion	N/A	
Hector Pineda	12.521.889	Oficial	construccion	N/A	
Yorgui Morales	17.594.998	Oficial	Construccion	N/A	

09-03-22 la jagua de ibirico
Proteccion de los pies

Hector Pineda	12.521.889	Maestro	Construccion	N/A	
Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	79.600.638	Oficial	Construccion	N/A	
Luis Atencio	17.583.985	Oficial	Construccion	N/A	
Yorgui Morales	17.594.998	Oficial	Construccion	N/A	
Yorgui Morales	17.594.998	Oficial	Construccion	N/A	

17-03-22 la jagua de ibirico
Habitos saludables

Fidel Dios	12.522.715	Auxiliar	Construccion	N/A	
Daniel Ruda	1065.886.801	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yaimel Caraballo	3.169.672	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yeyo Angulo	1.065.884.115	Auxiliar	Construccion	N/A	
Eduin Llerena	1.069.118.526	Auxiliar	Construccion	N/A	
Ferrel Lopez	78.994.793	Maestro	Construccion	N/A	
Jon ernesto Arias	1.069.111.882	Auxiliar	construccion	N/A	
Ruben Gomez	79.600.638	Auxiliar	construccion	N/A	
Luis Molina	1.069.989.796	Oficial	construccion	N/A	
Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	Construccion	N/A	
Deiban Ibañez	1065.891.192	Auxiliar	Construccion	N/A	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

22-03-22 la Jagua de Ibirico
Elementos de protección personal

Daniel Ruda	1065 386 861	Auxiliar	Construcción	N/A	David Ruda
Edwin Vega	1.049.109.526	Auxiliar	Construcción	N/A	
Juan Angulo	1.002.889.125	Auxiliar	Construcción	N/A	
Fidel Rios	12.522.725	Auxiliar	Construcción	N/A	Fidel Rios
Feiner Lopez	5.169.692	Maestro	Construcción	N/A	Feiner Lopez
Yeiner Cordoba	18.979.263	Auxiliar	Construcción	N/A	
Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	Construcción	N/A	Carmona
Yoiner Morales	77.579.396	Oficial	Construcción	N/A	Yoiner
Jesus Cortes	79.951.590	Auxiliar	Construcción	N/A	
Juan Jose Angulo	1065 386 049	Auxiliar	Construcion	N/A	

23-03-22 la Jagua de Ibirico
Primeros Auxilios

Daniel Ruda	1065 386 861	Auxiliar	Construcción	N/A	Daniel Ruda
Edwin Vega	1.049.109.526	Auxiliar	Construcción	N/A	
Juan Angulo	1.002.889.125	Auxiliar	Construcción	N/A	
Fidel Rios	12.522.725	Auxiliar	Construcción	N/A	Fidel Rios
Feiner Lopez	18.979.263	Maestro	Construcción	N/A	Feiner Lopez
Yeiner Cordoba	5.169.692	Auxiliar	Construcción	N/A	
Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	Construcción	N/A	Jose Carmona
Yoiner Morales	77.579.396	Oficial	Construcción	N/A	Yoiner
Jesus Cortes	79.951.590	Auxiliar	Construcción	N/A	
Juan Jose Angulo	1065 386 049	Auxiliar	Construcción	N/A	

24-03-22 la Jagua de Ibirico
Cuidado con los Ruidos

Feiner Lopez	18.979.263	Maestro	Construcción	N/A	Feiner Lopez
Juan Angulo	1.002.889.125	Auxiliar	Construcción	N/A	Juan Angulo
Fidel Rios	12.522.725	Auxiliar	Construcción	N/A	Fidel Rios
Yeiner Cordoba	5.169.692	Auxiliar	Construcción	N/A	
Daniel Ruda	1065 386 861	Auxiliar	Construcción	N/A	David Ruda
Edwin Vega	1.049.109.526	Auxiliar	Construcción	N/A	Edwin Vega
Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	Construcción	N/A	Fidel Rios
Yoiner Morales	77.579.396	Oficial	Construcción	N/A	Carmona
Jesus Cortes	79.951.590	Auxiliar	Construcción	N/A	Yoiner
Juan Jose Angulo	1065 386 049	Auxiliar	Construcción	N/A	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar

25-03-22 la jagua de ibirico
Manejo de desechos Peligrosos

Yainer Carabullo	5.149.692	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fidel Rios	17.522.725	Auxiliar	Construccion	N/A	Fidel Rios
Daniel Ricardo	106.386.801	Auxiliar	Construccion	N/A	Daniel Ricardo
Eduin Vega	1.064.149.526	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yeimi Lopez	18.974.763	Maestro	Construccion	N/A	
Juan Angulo	1.006.149.125	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yorgen Morales	17.579.398	Oficial	Construccion	N/A	
Jose Carmona	12.521.693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Alberto Florez	1.065.781.188	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan E. Arias	1.064.131.632	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan Jose Angulo	1.065.786.069	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jesus Cortes	29.951.570	Auxiliar	Construccion	N/A	

26-03-22 la jagua de ibirico
Demarcacion a puntos Criticos

Yeimi lopez	18.974.763	Maestro	Construcción	N/A	
Juan Angulo	1.006.149.125	Auxiliar	Construccion	N/A	
Eduin vega	1.064.149.526	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yainer Carabullo	5.149.692	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fidel Rios	17.522.725	Auxiliar	Construccion	N/A	
Daniel Ricardo	106.386.801	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yorgen Morales	17.579.398	Oficial	Construccion	N/A	
Jose Carmona	12.521.693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Alberto Florez	1.065.781.188	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan E. Arias	1.064.131.632	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan Jose Arias	1.065.786.069	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jesus Cortes	29.951.570	Auxiliar	Construccion	N/A	

28-03-22 la jagua de ibirico
Excavaciones

Yeimi lopez	18.974.763	Maestro	Construccion	N/A	
Juan Angulo	1.006.149.125	Auxiliar	Construccion	N/A	
Eduin vega	1.064.149.526	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yainer Carabullo	5.149.692	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fidel Rios	17.522.725	Auxiliar	Construccion	N/A	Fidel Rios
Daniel Ricardo	106.386.801	Auxiliar	Construccion	N/A	Daniel Ricardo
Yorgen Morales	17.579.398	Oficial	Construccion	N/A	
Jose Carmona	12.521.693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Alberto Florez	1.065.781.188	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan E. Arias	1.064.131.632	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan Jose Angulo	1.065.786.069	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jesus Cortes	29.951.570	Auxiliar	Construccion	N/A	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

29-03-22 la Jagua de Ibirico.
Elemento de proteccion Personal

Fenel lopez	18.979.763	Maestro	Construccion	NIA		Fenel López
Juan Angulo	1065 [illegible] 125	Auxiliar	construccion	NIA		Juan Angulo
Edwin cega	1065 109 526	Auxiliar	construccion	NIA		
yainer caraballo	5 164 672	Auxiliar	construccion	NIA		
Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	construccion	NIA		Fidel Rios
Daniel Ruda	1065 [illegible]	Auxiliar	construccion	NIA		David Ruda
yoiber Morales	73 514 378	oficial	construccion	NIA		YOISER
Jose camaño	12 521 643	Auxiliar	construccion	NIA		Camaño
Alberto Florez	1065 291 186	Auxiliar	construccion	NIA		
Juan E. Arias	1064 [illegible] 622	Auxiliar	construccion	NIA		
Juan Jose Arias	1065 [illegible] 089	Auxiliar	construccion	NIA		
Jesus Cortes	29 921 570	Auxiliar	construccion	NIA		

30-03-22 la Jagua de Ibirico
Primeros Auxilios

Fenel lopez	18.979.763	Maestro	Construccion	NIA		Fenel López
Juan Angulo	1065 109 125	Auxiliar	construccion	NIA		Juan Angulo
Edwin cega	1065 109 526	Auxiliar	construccion	NIA		
yainer caraballo	5 164 672	Auxiliar	construccion	NIA		
Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	construccion	NIA		Fidel Rios
Daniel Ruda	1065 [illegible]	Auxiliar	construccion	NIA		Daniel Ruda
yoiber Morales	73 514 378	oficial	construccion	NIA		YOISER
Jose camaño	12 521 643	Auxiliar	construccion	NIA		Camaño
Alberto Florez	1065 291 186	Auxiliar	construccion	NIA		
Juan E. Arias	1064 [illegible] 089	Auxiliar	construccion	NIA		
Juan Jose Angulo	1065 [illegible] 622	Auxiliar	construccion	NIA		
Jesus Cortes	29 921 570	Auxiliar	construccion	NIA		

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

03-03-22 la jagua de ibirico
El peligro inminente en SST

Ruben Correa	19 600 678	Oficial	Construccion	N/A	
Jobin Arias	1.08[illegible]696	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fernando Espalino	12 521 692	Oficial	Construccion	N/A	
Juan Ernesto Arias	1069 10 822	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jorge Mejia	1069 10 698	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jose Cogollo	12 521 693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jorge Morales	17 397 398	Oficial	Construccion	N/A	

04-03-22 la jagua de ibirico
Actos y condiciones inseguras

Fernando Espalino	12.521.692	Oficial	Construccion	N/A	
Jose cogollo	12.521.693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jorge Morales	17.397.398	Oficial	Construccion	N/A	

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.3. LAVADO DE MANOS.

01-03-22 la Jagua de Ibirico
Prevencion de los Actos Inseguros

Yorgui Morales	17.599.398	Oficial	Construccion	NIA	
Fernando Bapulino	12.521.642	Oficial	Construccion	NIA	
Johan Arias	1.064.16.646	Auxiliar	construccion	NIA	
Ruben Correa	19.650.098	Auxiliar	construccion	NIA	
Juan A Arias	1.064.16.015	Oficial	Construccion	NIA	
Dairner Navarro	1.198.150.085	Auxiliar	Construccion	NIA	
Javier Morales	13.449.018	Conductor	Construccion	NIA	
Juan Ernesto Arias	1.064.17.852	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jorge Mejia	1.064.16.698	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jose Contreras	12.521.8965	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jorge					

02-03-22 la Jagua de Ibirico
Manipulacion segura del extintor de fuego

Yorgui Morales	17.599.398	Oficial	Construccion	NIA	
Fernando Bapulino	12.521.642	Oficial	Construccion	NIA	
Juan Andres Arias	1.064.16.135	Auxiliar	Construccion	NIA	
Ruben Correa	19.650.098	Oficial	Construccion	NIA	
Johan Arias	1.064.16.646	Auxiliar	Construccion	NIA	
Dairner Navarro	1.198.150.085	Auxiliar	construccion	NIA	
Javier Morales	13.449.018	Conductor	construccion	NIA	
Juan Ernesto Arias	1.064.17.852	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jorge Mejia	1.064.16.698	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jose Contreras	12.521.8965	Auxiliar	construccion	NIA	

08-03-22 la Jagua de Ibirico
Investigacion de Accidentes

Fernando Bapulino	12.521.642	Oficial	Construccion	NIA	
Juan Ernesto Arias	1.064.17.852	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jose contreras	12.521.8965	Auxiliar	construccion	NIA	
Hector Pineda	12.521.887	Oficial	construccion	NIA	
Yorgui Morales	17.599.398	Oficial	Construccion	NIA	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

09-03-22 la jagua de ibirico
Proteccion de los pies

Hector Pinedo	12.521.669	Maestro	Construccion	NIA	
Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	79.600.018	Oficial	Construccion	NIA	
Luis Atencio	12.523.965	Oficial	Construccion	NIA	
Yorgen Morales	77.579.398	Oficial	Construccion	NIA	
Yorgen Morales	77.579.398	Oficial	Construccion	NIA	

23-03-22 la jagua de ibirico
Habitos saludables

Fidel Rios	12.522.725	Auxiliar	Construccion	NIA	
Daniel Pinto	1.065.582.861	Auxiliar	Construccion	NIA	
Yenner Caraballo	5.169.672	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan Angulo	1.065.614.125	Auxiliar	Construccion	NIA	
Edwin Vega	1.069.109.526	Auxiliar	Construccion	NIA	
Feinel Lopez	78.979.753	Maestro	Construccion	NIA	
Jan ernesto Arias	9.169.111.822	Auxiliar	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	79.600.018	Auxiliar	Construccion	NIA	
Luis Mojica	1.069.789.786	Oficial	Construccion	NIA	
Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	Construccion	NIA	
Dubian Perez	1.065.691.192	Auxiliar	Construccion	NIA	

22-03-22 la jagua de ibirico
Elementos de proteccion personal

Daniel Pinto	1.065.582.861	Auxiliar	Construccion	NIA	
Edwin Vega	1.069.109.526	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan Angulo	1.065.614.125	Auxiliar	Construccion	NIA	
Fidel Rios	12.522.725	Auxiliar	Construccion	NIA	
Feinel Lopez	5.169.672	Maestro	Construccion	NIA	
Yenner Caraballo	18.979.203	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jose Garrido	12.521.693	Auxiliar	Construccion	NIA	
Yorgen Morales	77.579.398	Oficial	Construccion	NIA	
Jesus Cortes	24.751.390	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan Jose Angulo	1.065.616.049	Auxiliar	Construccion	NIA	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

23-03-22 la Jagua de Ibirico
Primeros Auxilios

Daniel Ruda	1065 386 821	Auxiliar	Construcción	NIA	Daniel Ruda
Eduin Vega	1 044 89 526	Auxiliar	construcción	NIA	
Juan Angulo	1006 884 125	Auxiliar	construcción	NIA	Fidel Rios
Fidel Rios	12 522 725	Auxiliar	construcción	NIA	Juan Angulo
Fernel Lopez	18 979 763	Maestro	construcción	NIA	Fernel Lopez
Yainer Caraballo	5 169 672	Auxiliar	construcción	NIA	
Jose Carmona	12 521 843	Auxiliar	construcción	NIA	Jose Cortes
Yorgui Morales	77 579 398	Oficial	construcción	NIA	
Jesus Cortes	24 931 530	Auxiliar	construcción	NIA	
Juan Jose Angulo	1006 386 049	Auxiliar	construcción	NIA	

24-03-22 la Jagua de Ibirico
Cuidado con las Manos

Fernel Lopez	18 979 763	Maestro	Construcción	NIA	Fernel Lopez
Juan Angulo	1006 884 125	Auxiliar	construcción	NIA	Juan Angulo
Fidel Rios	12 522 725	Auxiliar	construcción	NIA	Fidel Rios
Yainer Caraballo	5 169 672	Auxiliar	construcción	NIA	
Daniel Ruda	1065 386 821	Auxiliar	construcción	NIA	David Ruda
Eduin Vega	1 044 89 526	Auxiliar	construcción	NIA	Eduin Vega
Jose Carmona	12 521 843	Auxiliar	construcción	NIA	Fidel Rios
Yorgui Morales	77 579 398	Oficial	construcción	NIA	Carmona
Jesus Cortes	24 931 530	Auxiliar	construcción	NIA	Yorgui Cortes
Juan Jose Angulo	1006 386 049	Auxiliar	construcción	NIA	

25-03-22 la Jagua de Ibirico
Manejo de desechos Peligrosos

Yainer Caraballo	5 169 672	Auxiliar	Construcción	NIA	
Fidel Rios	12 522 725	Auxiliar	construcción	NIA	Fidel Rios
Daniel Ruda	1065 386 821	Auxiliar	construcción	NIA	Daniel Ruda
Eduin Vega	1 044 89 526	Auxiliar	construcción	NIA	Eduin Vega
Fernel Lopez	18 979 763	Maestro	construcción	NIA	Fernel Lopez
Juan Angulo	1006 884 125	Auxiliar	construcción	NIA	Juan Angulo
Yorgui Morales	77 579 398	Oficial	construcción	NIA	Yorgui
Jose Carmona	12 521 843	Auxiliar	construcción	NIA	Carmona
Alberto Perez	1 065 771 188	Auxiliar	construcción	NIA	
Juan E. Arias	1 044 11 832	Auxiliar	construcción	NIA	Juan Arias
Juan Jose Angulo	1 006 386 049	Auxiliar	construcción	NIA	Juan Jose Angulo
Jesus Cortes	24 931 530	Auxiliar	construcción	NIA	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

26-03-22 la Jagua de Ibirico
Demarcacion a puntos Criticos

Ferrel lopez	18.979.763	Maestro	Construcción	NIA	Ferrel López
Juan Angulo	1006 89 125	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Angulo
Edwin cega	1006 89 526	Auxiliar	Construccion	NIA	
Yoiner Caraballo	5 169 672	Auxiliar	Construccion	NIA	
Fidel Rios	17-522-725	Auxiliar	Construccion	NIA	Daniel Ruda
Daniel Ruda	1065 86 561	Auxiliar	Construccion	NIA	Fidel Rios
Yoiner Morales	17 579 398	Oficial	Construccion	NIA	Yoiner
Jose Carreño	12 521 693	Auxiliar	Construccion	NIA	Carreño
Alberto Florez	1 063 791 188	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan E. Arias	7 064 111 622	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan Jose Arias	1 063 798 469	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Jose
Jesus Cortes	29 951 570	Auxiliar	Construccion	NIA	Jesus Cortes

28-03-22 la Jagua de Ibirico
Excavaciones

Ferrel lopez	18.979.763	Maestro	Construccion	NIA	Ferrel López
Juan Angulo	1006 89 125	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Angulo
Edwin cega	1006 89 526	Auxiliar	Construccion	NIA	
Yoiner Caraballo	5 169 672	Auxiliar	Construccion	NIA	
Fidel Rios	17-522-725	Auxiliar	Construccion	NIA	Fidel Rios
Daniel Ruda	1065 86 561	Auxiliar	Construccion	NIA	Daniel Ruda
Yoiner Morales	17 579 398	Oficial	Construccion	NIA	Yoiner
Jose Carreño	12 521 693	Auxiliar	Construccion	NIA	Carreño
Alberto Florez	1 063 791 188	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan E. Arias	7 064 111 622	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Jose
Juan Jose Angulo	1 063 798 469	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Jose
Jesus Cortes	29 951 570	Auxiliar	Construccion	NIA	Jesus Cortes

29-03-22 la Jagua de Ibirico.
Elemento de Proteccion Personal

Ferrel lopez	18.979.763	Maestro	Construcción	NIA	Ferrel López
Juan Angulo	1006 89 125	Auxiliar	Construccion	NIA	Juan Angulo
Edwin cega	1065 89 526	Auxiliar	Construccion	NIA	
Yoiner Caraballo	5 169 672	Auxiliar	Construccion	NIA	
Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	Construccion	NIA	Fidel Rios
Daniel Ruda	1065 86 561	Auxiliar	Construccion	NIA	Daniel Ruda
Yoiner Morales	17 579 398	Oficial	Construccion	NIA	Yoiner
Jose Carreño	12 521 693	Auxiliar	Construccion	NIA	Carreño
Alberto Florez	1 063 791 188	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan E. Arias	1 064 111 622	Auxiliar	Construccion	NIA	
Juan Jose Arias	1 063 798 469	Auxiliar	Construccion	NIA	
Jesus Cortes	29 951 570	Auxiliar	Construccion	NIA	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

30-03-22 la jagua de ibirico
Primeros Auxilios

Jeanel Lopez	18.994.203	Maestro	Construccion	N/A	
Juan Angulo	1064 109 135	Auxiliar	Construccion	N/A	
Edwin Ussa	1064 10 902	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yainer Caballo	5 164 672	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fidel Rios	12-522-325	Auxiliar	Construccion	N/A	
Daniel Ruda	1065 826 561	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yorgui Morales	77-599-398	oficial	Construccion	N/A	
Jose Carreño	12 521 693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Alberto Perez	1064 241 186	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan E Arias	1064 [illegible]	Auxiliar	Construccion	N/A	
Juan Jose Angulo	1064 [illegible]	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jesus Cortes	77-51-570	Auxiliar	construccion	N/A	

03-03-22 la jagua de ibirico
El peligro inminente en SST

Ruben Garcia	19 600 078	oficial	Construccion	N/A	
Jobsin Arias	1064 [illegible]	Auxiliar	Construccion	N/A	
Fernando Bapulino	12 521 692	oficial	Construccion	N/A	
Juan Ernesto Arias	1064 111 822	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jorge Mejia	1064 [illegible]	Auxiliar	Construccion	N/A	
Jose Carreño	12 521 693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yorgui Morales	77 599 398	oficial	Construccion	N/A	

04-03-22 la jagua de ibirico
Actos y Condiciones Inseguras

Fernando Bapulino	12-521-692	oficial	Construccion	N/A	
Jose Carreño	12-521-693	Auxiliar	Construccion	N/A	
Yorgui Morales	77 599 398	Oficial	Construccion	N/A	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

01-03-22 la jagua de Ibirico
Picado de Minas

1	Yorgui Morales	17.579.398	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Yorguis
2	Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
3	Johan Arias	1.069.116.056	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Johan Arias
4	Juan A. Arias	1.069.113.135	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
5	Ruben Gomez	19.600.678	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Go
6	Javier Morales	13.499.018	Conductor	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Javi
7	Dalmer Navarro	1.128.150.056	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Dalmer
8	Juan Ernesto Arias	1.069.121.872	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
9	Jorge Mejia	1.069.118.698	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jorge melin
10	Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Carmona

CONSORCIO VIVEURB 2021

02-03-22 la jagua de Ibirico
Picado de Minas

1	Yorgui Morales	17.579.398	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Yorguis
2	Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
3	Johan Arias	1.069.116.056	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Johan Arias
4	Juan A Arias	1.069.113.135	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
5	Ruben Gomez	19.600.678	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Go
6	Javier Morales	13.499.018	Conductor	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Javi
7	Dalmer Navarro	1.128.150.056	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Dalmer
8	Juan Ernesto Arias	1.069.121.872	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
9	Jorge Mejia	1.069.118.698	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jorge melin
10	Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Carmona

CONSORCIO VIVEURB 2021

03-03-22 la jagua de Ibirico
Picado de Minas

1	Ruben Gomez	19.600.678	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Go
2	Johan Arias	1.069.116.056	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Johan Arias
3	Fernando Rapalino	12.521.692	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
4	Juan Ernesto Arias	1.069.121.872	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
5	Jorge Mejia	1.069.118.698	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jorge melin
6	Jose Carmona	12.521.893	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Carmona
7	Yorgui Morales	17.579.398	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Yorguis

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 07-03-22 la jagua de Ibirico — Lavado de Manos

1	Fernando Bapalino	12.521.692	Oficial	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
2	Jose Contreras	12.521.893	Auxiliar	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
3	Yorgui Morales	17.579.398	Oficial	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
4							
5							

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 08-03-22 la jagua de Ibirico — Lavado de Manos

1	Fernando Bapalino	12.521.692	oficial	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
2	Juan Ernesto Arias	1.064.121.678	Auxiliar	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
3	Jose Contreras	23.432.605	Auxiliar	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
4	Hector pineda	1.064.120.778	Maestro	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
5	Yorgui Morales	17.579.398	Oficial	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
6							
7							
8							

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 09-03-22 la jagua de Ibirico — Lavado de Manos

1	Hector pineda	1.064.120.778	Maestro	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
2	Fernando Bapalino	12.521.692	OFICIAL	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
3	Ruben Gamez	19.600.698	Oficial	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
4	Luis Atencio	12.525.955	Maestro	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
5	Yorgui Morales	17.579.398	OFICIAL	07:00 AM	12:00 PM	05:00 PM	
6							

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 17-03-22 la jagua de Ibirico
CAPACITACION: Lavado de manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	HORA DE LLEGADA PACIENTE	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Fidel Rios	12.521.725	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fidel Rios
2	Daniel Rada	1.065.886.861	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
3	Yulner Caraballo	5.169.672	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
4	Juan Angulo	1.006.691.105	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Angulo
5	Edwin Vega	1.049.109.526	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
6	Feinel Lopez	18.979.763	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Feinel Lopez
7	Juan Ernesto Niño	1.001.112.822	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
8	Ruben Gomez	19.400.670	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
9	Yuris Mojica	1.064.789.896	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
10	Fernando Espinoza	12.521.642	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	

CONSORCIO VIVEURB 2021

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 22-03-22 la jagua de Ibirico
CAPACITACION: Lavado de manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	HORA DE LLEGADA PACIENTE	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Daniel Rada	1.065.886.861	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
2	Edwin vega	1.049.109.526	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Edwin
3	Fidel Rios	12.521.725	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fidel Rios
4	Juan Angulo	1.006.691.105	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Angulo
5	Feinel Lopez	5.169.672	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Feinel Lopez
6	Yulner Caraballo	18.979.763	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
7	Jose Carreño	12.521.643	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
8	Yurgen Morales	17.579.398	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
9	Jesus Cortes	24.951.570	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
10	Jan Jose Angulo	1.065.898.091	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	

CONSORCIO VIVEURB 2021

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 23-03-22 la jagua de Ibirico
CAPACITACION: Lavado de manos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	HORA DE LLEGADA PACIENTE	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Daniel Rada.	1.065.886.861	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
2	Edwin vega	1.049.109.526	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Edwin
3	Fidel Rios	12.521.725	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fidel Rios
4	Feinel Lopez	18.979.763	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Feinel Lopez
5	Juan Angulo	1.006.691.105	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Juan Angulo
6	Yulner Caraballo	5.169.672	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
7	Jose Carreño	12.521.643	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
8	Yurgen Morales	17.579.398	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
9	Jesus Cortes	24.951.570	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	
10	Jan Jose Angulo	1.065.898.091	Auxiliar	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@igcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 24-08-22 la jagua de Ibirico — Inicio de labores

1	Jemel lopez	18.974.363	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
2	Juan Angulo	1006[illegible]125	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
3	Daniel Ruda	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
4	Yainer Caraballo	5.184.692	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
6	Eduin Vega	1004[illegible]516	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
7	Jose Camaño	12-521-693	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
8	Jesus Cortes	24-951-590	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
9	Yorgui Morales	17-579-598	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
10	Juan Jose Angulo	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 25-08-22 la jagua de Ibirico — Inicio de labores

1	Yainer Caraballo	5.184.692	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
2	Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
3	Daniel Ruda	1065[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
4	Eduin Vega	1004[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Jemel lopez	18.974.363	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
6	Juan Angulo	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
7	Yorgui Morales	17-579-598	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
8	Jose Camaño	12-521-693	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
9	Alberto Perez	1003[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
10	Juan Jose Angulo	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
11	Jesus Cortes	24-951-590	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
12	Juan E. Arias	1064[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 26-08-22 la jagua de Ibirico — Inicio de labores

1	Jemel lopez	18.974.363	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
2	Juan Angulo	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
3	Eduin Vega	1004[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
4	Yainer Caraballo	5.184.692	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Fidel Rios	12-522-725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
6	Daniel Ruda	1065[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
7	Yorgui Morales	17-579-598	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
8	Jose Camaño	12-521-693	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
9	Alberto Perez	1003[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
10	Juan E. Arias	1064[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
11	Juan Jose Angulo	1006[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
12	Jesus Cortes	24-951-590	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 28-03-22 La Jagua de Ibirico — Picado de Manos

1	Ferrel Lopez	18.997.763	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Ferrel Lopez
2	Juan Angulo	1.006.109.775	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Angulo
3	Edwin Vega	1.049.609.524	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Edwin
4	Yulmer Carabello	5.169.672	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Fidel Rios	12.527.725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Fidel Rios
6	Daniel Pada	1.065.586.801	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Daniel Pada
7	Yorgis Morales	17.579.398	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	YORGIS
8	Jose Carmaño	12.521.643	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Carmaño
9	Juan E. Arias	1.049.121.832	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
10	Juan Jose Angulo	1.065.398.049	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Jose
11	Alberto Florez	1.065.791.885	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
12	Jesus Cortes	21.931.530	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Jesus Cortes

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 29-03-22 La Jagua de Ibirico — Picado de Manos

1	Ferrel Lopez	18.997.763	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Ferrel Lopez
2	Juan Angulo	1.006.109.775	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Angulo
3	Edwin Vega	1.049.609.524	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Edwin
4	Yulmer Carabello	5.169.672	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Fidel Rios	12.527.725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Fidel Rios
6	Daniel Pada	1.065.586.801	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Daniel Pada
7	Yorgis Morales	17.579.398	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	YORGIS
8	Jose Carmaño	12.521.643	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Carmaño
9	Alberto Florez	1.065.791.885	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
10	Juan E. Arias	1.049.121.832	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Jose
11	Juan Jose Angulo	1.065.398.049	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Jose
12	Jesus Cortes	21.931.530	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Jesus Cortes

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 30-03-22 La Jagua de Ibirico — Picado de Manos

1	Ferrel Lopez	18.997.763	Maestro	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Ferrel Lopez
2	Juan Angulo	1.006.109.775	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Angulo
3	Edwin Vega	1.049.609.524	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Edwin
4	Yulmer Carabello	5.169.672	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
5	Fidel Rios	12.527.725	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Fidel Rios
6	Daniel Pada	1.065.586.801	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Daniel Pada
7	Yorgis Morales	17.579.398	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	YORGIS
8	Jose Carmaño	12.521.643	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Carmaño
9	Juan E. Arias	1.049.121.832	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Jose
10	Juan Jose Angulo	1.065.398.049	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Juan Jose
11	Jesus Cortes	21.931.530	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Jesus Cortes
12	Alberto Florez	1.065.791.885	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	
13	Ruben Gimez	19.610.629	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Ruben Gimez
14	Epimenio Herrera	85.446.208	OFICIAL	07:00AM	12:00PM	05:00PM	Epimenio Herrera
15	Dubin Florez	1.065.791.885	Auxiliar	07:00AM	12:00PM	05:00PM	

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

10.4. ANALISI DE TRABAJO SEGURO.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 01 03 22

Reban Gomez — 1

Enchape de baño — Contadora, nivel, Regante

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1 Traslado del Material.	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2 Material	Golpes	Residuos	uso de Punto
3 Peñete del	Hachuones	Generacion de	Ecologico.
4 baño.		Material Particl	Proteger los
5 Niveles		Colado	Frentes de trabajos
6 Inicio de			Para Minimizar
7 Enchape.			los Riesgos
8			
9			

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y PELIGROSAS


TAREAS VERSUS RESPONSABLE		MATRIZ PERFIL PELIGROSO		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICO		
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUIMICO		
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICO		
	TRABAJO CON RIESGO ELECTRICO		LOCOMOCION HUMANA PELIGROSA		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES IDENTIFICAN SUS RESPONSABILIDADES, SUS FUNCIONES LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLAROS LOS CONTROLES EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Johan Arias	Johan Arias
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

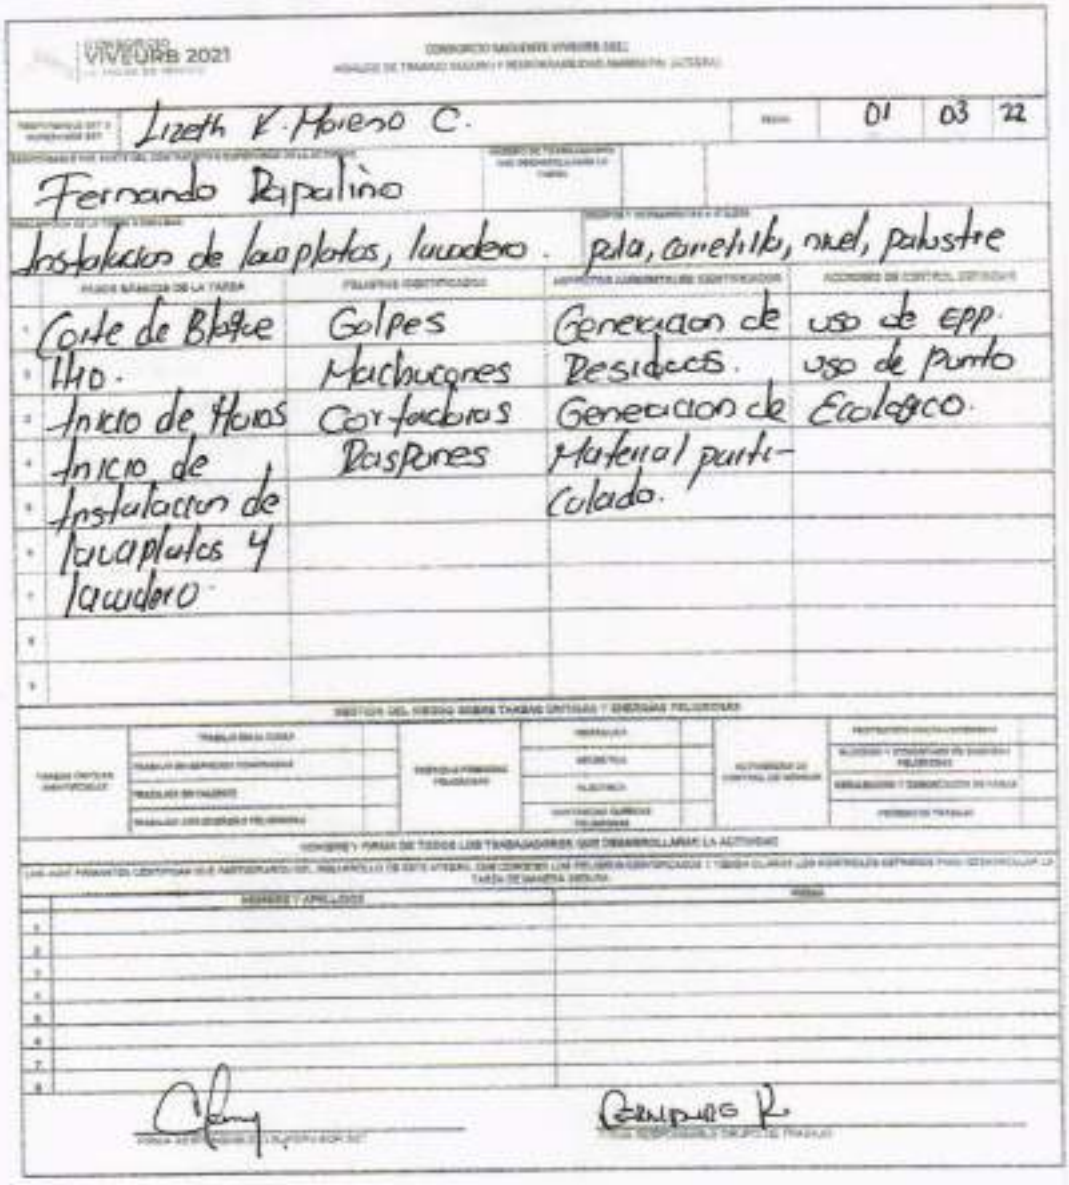

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 01 03 22

Fernando Rapalino

Instalacion de lavaplatos, lavadero. — pala, carretilla, nivel, palustre

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1	Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Llo.	Machucones	Residuos.	uso de punto
3	Inicio de Horas	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Inicio de	Raspones	Material particulado.	
5	Instalacion de			
6	lavaplatos y			
7	lavadero.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS: TRABAJO EN ALTURAS; TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS; TRABAJOS EN CALIENTE; TRABAJOS CON ELEMENTOS PELIGROSOS

ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS: MECANICA; HIDRAULICA; NEUMATICA; ELECTRICA; SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS: PERMISO DE TRABAJO; ANALISIS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PELIGROSOS; CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TAREA

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCION DE LA TAREA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 02 03 22

Yorquis Morales

Enchape de baño. — Cantidad, nivel, Regante.

	FASES BÁSICAS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del	Golpes	Generacion de	uso de epp.
2	Material	Cortadura	Residuos.	uso de punto
3	punto del	Herbucones	Generacion de	Ecologico.
4	baño.		Material parti-	
5	niveles		Culado.	
6	Inicio de			
7	Enchape.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y SITUACIONES PELIGROSAS

TAREAS PETICIAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS	PERSONAL FRANJAS PELIGROSAS	RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	ACCIONES CASO EMERGENCIA
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUIMICO		RECURSOS Y RESPONSABLES DE ACCIONES PELIGROSAS
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICO		ORGANIZACION Y SEÑALIZACION DE OBRA
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		PERMISOS DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/PTS, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y HEMOS CUMPLIDO LOS CONTROLES EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Yorquis Morales

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

	Lizeth K. Moreno C.	FECHA	02	03 22
	Fernando Bapulino.			
	Instalacion de lavaplatos y lavadero		Pala, cinetilla, nivel, pulustre	

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL ESPECIFICAS
1	Corte de Bloque	Machucones	Generacion de	uso de epp.
2	IHO.	Golpes	Residuos	uso de punto
3	Inicio de	Raspones	Generacion de	Ecologico.
4	Muros.	Cortaduras	Material parti-	
5	Inicio de		culado.	
6	instalacion de			
7	lavaplatos y			
8	lavadero.			
9				

MATRIZ DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		TAREAS O PROCESOS PELIGROSOS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HERRAMIENTAS		
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		MECANICA		
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICO		
	TRABAJOS CON MATERIALES PELIGROSOS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DIALOGO DE ESTE FORMATO, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARAS LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA Y CARGO DEL SUPERVISOR SST

FERNANDO R.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 02 03 22

Juan Arias — 2

Dellero. — Pala, carretilla. nivel.

	TAREAS BASICAS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Material.	Machacones	Residuos.	uso de Punto
3	Inicio del	Raspones	Generacion de	Ecologico
4	Relleno. en		Material punti-	Proteger los
5	la Vivienda.		Colado.	Frentes de trabajos
6				Para Minimizar
7				los Riesgos
8				
9				

GESTION DEL RIESGO MIRAS TAREAS CRITICAS Y ENFOQUE PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS		PELIGROS PRIMARIOS PRESENTES		ACCIONES DE CONTROL DE RIESGOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		HERIDAS		
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUEMADAS		
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICO		
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		CAIDAS DIFERENTES NIVELES		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/PETA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN LA MAYOR LOS CONOCIMIENTOS EXPUESTOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Jorge Helia.	Jorge Mejia
3	Jose Cadmano	Camacho
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA TAREA

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO GACOSETA VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RECONOCIMIENTO AMBIENTAL (ATS/ATR)

RESPONSABLE DEL ATS / SUPERVISOR SST:	Lizeth K. Moreno C.	FECHA:	03	03	22
TRABAJADOR QUE HARA USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS: Ruben Gamez	NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1				
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Enchape de baño.		DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR: Cortadora, nivel, Pegante.			

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del Material.	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2	Niveles.	Golpes	Residuos.	uso de Punto
3	Inicio de Enchape.	Machacones.	Generacion de Material Particulado.	Ecologico.
4				
5				
6				
7				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ESPACIOS PELIGROSOS

TIPOS DE TRABAJO		PELIGROS PRIMARIOS IDENTIFICADOS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO	
TRABAJOS CRITICOS (MARQUE)	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICO		PERMISO CONTRACTUAL
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		BIOLOGICO		ESTUDIO Y ENTREGA DE ESPACIOS PELIGROSOS
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICO		ENRAMADAS Y SEÑALIZACION DE OBRA
	TRABAJO CON ENERGIA PELIGROSA		QUIMICO (AGENTES QUIMICOS PELIGROSOS)		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/ATR, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES EXISTENTES PARA CONTROLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Johan Arias	Johan Arias
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

Ruben Gamez
FIRMA RESPONSABLE DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.



CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SACRISTE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ALTERNA

Lizeth K. Moreno C. — 03 03 22

Fernando Rapalino.

Adecuación tanque elevado. — Pegante, nivel, Escalera.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del	Caidas	Generacion de	Uso de EPP.
2	Tanque.	Golpes	Residuos.	Uso de Punto
3	Inicio de la	Raspones	Generacion de	Ecologico.
4	Instalacion del		Material punti	
5	Tanque.		Cortado.	
6				
7				
8				
9				
10				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENTORNO PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS	PERSONAL TRABAJOS PELIGROSOS	ENTORNOS	ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		QUIMICO		RIESGOS Y AMENAZAS DE ORDEN PUBLICO
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICO		EMERGENCIAS Y SIMULACROS DE CODE
	TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS		CONDICIONES SANITARIAS PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS AQUI FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE DICHA ATENCION, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA TAREA — FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

	Liceth K. Moreno C.		03	03 22
Juan E. Arias		2		
Relleno.		Pala, Carretilla, nivel		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL ESPECIFICAS
1	Traslado del Material.	Golpes Raspones Hachuras	Generacion de Residuos. Generacion de Material Particulado	uso de EPP. uso de Punto ecologico. Proteger los frentes de trabajos para Minimizar los Riesgos.
2	Inicio del Relleno en el lote.			
3				
4				
5				
6				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE ENERGIA	PERMISO PARA INTERVENIR	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA			
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		HIDRAULICA		RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICA		CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS DE LA TAREA	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		OTRAS FUENTES ENERGIAS PELIGROSAS		HORARIO DE TRABAJO	

NOMBRES Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA ATPERA, QUE DURANTE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES OPTIMOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2	Jorge Mejia	Jorge mejia
3	Jose Colmenares	Colmenares
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Juan Arias
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.



CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO CALIDETT VIVEURB 2021

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y ACTIVIDADES CON AMENAZA CRITICA

RESPONSABLE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA DE LA ACTIVIDAD: Ivett K. Moreno C.

Fecha: 09 01 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA DE LA ACTIVIDAD: Fernando Rapalino.

NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA:

NOMBRE DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de Tubena Sanitaria

EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pegante, Pala, Pico, Carretilla.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
1	Medidas.	Machucones	Generacion de	Uso de EPP.
2	Traslado del	Golpes	Residuos.	Uso de punto
3	Material	Raspones	Generacion de	Ecologico
4	niveles.	Cortaduras	Material punti-	
5	Instalacion de		Golado.	
6	la Tubena.			
7				
8				
9				

REVISION DEL PERMISO PARA TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJOS EN ALTURAS		SEÑALES PREVENTIVAS PELIGROSAS	HERRAMIENTAS		ESTUVIERON LAS CONTROLES NECESARIOS	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS			MAQUINAS			ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICO			RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA	
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS			CONDICIONES PUESTO DE TRABAJO			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN SU PARTICIPACION DEL DESARROLLO DE ESTA TAREA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA SUPERVISOR Y RESPONSABLE DEL AST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth Y. Moreno C. — 01 03 22

Fernando Rapalino.

Instalacion de bvaplatos y lavadero | Pala, corretilla, mach. Pulustre.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	EFECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL EXISTENTES
1	Corte de Bloque	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
2	Llo	Golpes	Desidos.	uso de punto
3	Inicio de	Raspones	Generacion de	Ecologico
4	Horos	Cortaduras	Material parti-	
5	Inicio de		culado.	
6	la instalacion.			
7				
8				
9				

MATRIZ DEL PERMISO PARA TAREAS CRITICAS Y ESPACIOS CERRADOS

TIPOS DE TAREAS CRITICAS		PERMISOS REQUERIDOS		ACTIVACIÓN DE CONTROLES DE ENERGÍA	
	TRABAJOS EN ALTURAS		MECÁNICO		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		NEUMÁTICO		ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELÉCTRICO		INTERFERENCIA Y COMUNICACIÓN EN EL SITIO
	TRABAJOS CON EXCAVACIÓN Y TELESCOPIA		SISTEMAS QUÍMICOS Y TELEMETRÍA		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL TRABAJO EL DE ESTE STEAM, QUE CONOCEN LOS PELIGROS CONTENIDOS Y TOMARON CLARA LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR DE TURNO DE HASTA (00:00)

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FERNANDO RAPALINO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@ocon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SACCIENTE VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C.		07	05	22
Fernando Dupulino.				
Instalacion de lavaplatos	Pala, carretilla, Cortadora mad			

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL SUGERIDAS
1	Corte de Bloque	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
2	Alto.	Golpes	Residuos.	uso de Punto
3	Inicio de	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	Horas.	Cortaduras	Material/ Punti-	
5	Instalacion de		Calado.	
6	lavaplatos			
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRÍTICAS Y ESPACIOS PELIGROSOS

	TRABAJO EN ALTURAS		HERIDAS		
	TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO		GRAVEDAD		
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICO		
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		ELECTRICOS QUIMICOS PELIGROSOS		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Fernando Dupulino

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@ocon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Ineth V. Moreno C. 08 03 22

Fernando Dapulino.

Instalacion de lavadero. Cortadora, nivel, Pala, cuerdilla.

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
1	Corte de Bloque	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2	Hilo	Machucones	Residuos	uso de punto
3	Inicio de	Golpes	Generacion de	Ecologico.
4	Hilos	Posiones	Material punti-	
5	Instalacion de		Culado.	
6	lavadero.			
7				
8				
9				

GESTIÓN DEL TRABAJO SOBRE TAREAS CRÍTICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS		ENERGÍAS PRIMARIAS PELIGROSAS	HERIDAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			MOVILIDAD			REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PELIGROSOS	
	TRABAJO EN CALIENTE			ELECTRICA			EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DE LA ZONA	
	TRABAJOS CON MATERIALES PELIGROSOS			ENFERMEDADES LABORALES PELIGROSAS			TRABAJO EN TRANSITO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE FORMATO, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DESCRITA ARRIBA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Fernando Rapulino

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Izeth R Abero C. | 08 | 03 | 22

Hector Pineda.

Pañete de baño. | Cortadora, nivel, pegante, espatula.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL DEFINIDOS
1	Traslado del	Cortaduras	Generacion de	uso de epp.
2	Material.	Machucones	Desechos	uso de punto
3	niveles	Golpes	Generacion de	Ecologico.
4	Inicio de	Raspones	Material Particu-	
5	Enchape.		lado.	
6				
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ORDENES PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS	PELIGROS PRESENTES	MATERIALES	ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	TRANSPORTE MANEJO Y DISPOSICION
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		ESTRUCTURA		RUIDOS Y VIBRACIONES DE EQUIPOS PELIGROSOS
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICO		RADIACION Y CONTAMINACION DEL AIRE
	TRABAJO CON MANEJO TELEFONICO		CONTENCION GERMICA TELEFONICA		TERMINO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE Y SUPERVISOR SST | FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 09 / 03 / 22

Fernando Dapalino.

Instalación de lavaplatos y lavadero. Cortadora, pala, carretilla, nivel.

	TAREAS BÁSICAS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL EXISTENTE
1	Corte de Bloque	Cortaduras	Generacion de	uso de EPP.
2	Llo.	Golpes	Residuos	uso de punto
3	Inicio de	Machucones	Generacion de	ecologico.
4	Horas	Raspones.	Material punti-	
5	Inicio de la		Culado.	
6	Instalacion del			
7	lavaplatos y			
8	lavadero.			
9				

RELACIÓN DEL PERSONAL SOBRE TAREAS CRÍTICAS Y ENERGÍAS PELIGROSAS

TAREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS		TAREAS PERSONAL PELIGROSO	MECÁNICA		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			HIDRÁULICO			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
	TRABAJO EN CALIENTE			ELÉCTRICO			CONSIGNACIÓN Y BLOQUEO DE FUENTES	
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS			EXCAVACIÓN Y/O ZANJAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA ATPRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y VERIFICARON LOS CONTROLES EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Fernando Dapalino

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth V. Moreno C. — 09 05 22

Hector Pineda.

Pañete de baño — Cortadora, mud, pegante, espatula

	PUESTOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del Material.	Cortaduras Machucones	Generacion de Residuos.	uso de EPP. uso de punto
2	Niveles.	Golpes	Generacion de	Ecologico
3	Inicio de	Raspones	Material Punti-	
4	Pañete.		Colado.	
5				
6				
7				
8				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ESPACIOS PELIGROSOS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS		MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS	MANUALES		ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS	
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS			MECANICAS			
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICAS			
	TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO			CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES			

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE ESTA TAREA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y HEMOS CLARO LOS CONTROLES DISPUESTOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR SST — FIRMA RESPONSABLE Y/O JEFE DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.



CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth V. Moreno C. — 11 / 03 / 21

Luis Atencio.

Enchape de baño. — Cortadora, nivel, pegante

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	AFECTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del Material	Cortaduras	Generacion de Residuos.	uso de EPP
2	Niveles,	Golpes	Generacion de	uso de Punto
3	Inicio de	Machucones	Material Punto -	Ecologico
4	Enchape.		Cortado	
5				
6				
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS		LA PERSONA DE CONTROL DE ACCESO	
	TRABAJOS EN ALTURA			MECANICA		TRABAJOS CON PRODUCTOS QUIMICOS
	TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES			ENERGIA		ALTURAS Y ESPACIOS DE ACCESOS PELIGROSOS
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELECTRICA		MANIPULACION Y MOVIMIENTO DE CARGA
	TRABAJOS CON ACCESOS PELIGROSOS			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL REGISTRO DE ESTA TAREA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS EXISTENTES Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Luis Atencio Ordoñez.
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

	Izeth V. Moreno C.			11	05	22
	Hector Pineda.				
	Enchape de baños		Carretilla, nivel, pesante.		

	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES
1	Traslado del	Machucones	Generacion de	uso de Epp.
2	Material	Cortaduras	Residuos.	uso de Punto
3	Niveles	Golpes	Generacion de	Ecologico.
4	Inicio de	Raspones.	Material Particulado.	
5	Enchape.			
6				
7				
8				
9				

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO, VALORACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

TAREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS	TRABAJOS EN ALTURAS		EMERGENCIAS PREVISIBLES	INCENDIOS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE PELIGROS	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS			EXPLOSIVOS			ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
	TRABAJOS EN CALIENTE			ELÉCTRICOS			ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
	TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS			SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS AQUÍ FIRMANTES CERTIFICAN QUE HAN PARTICIPADO DEL DESARROLLO DE ESTA ATS/AR, QUE CONOCEN LOS PELIGROS EXISTENTES Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O SUPERVISOR SST

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@ocon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

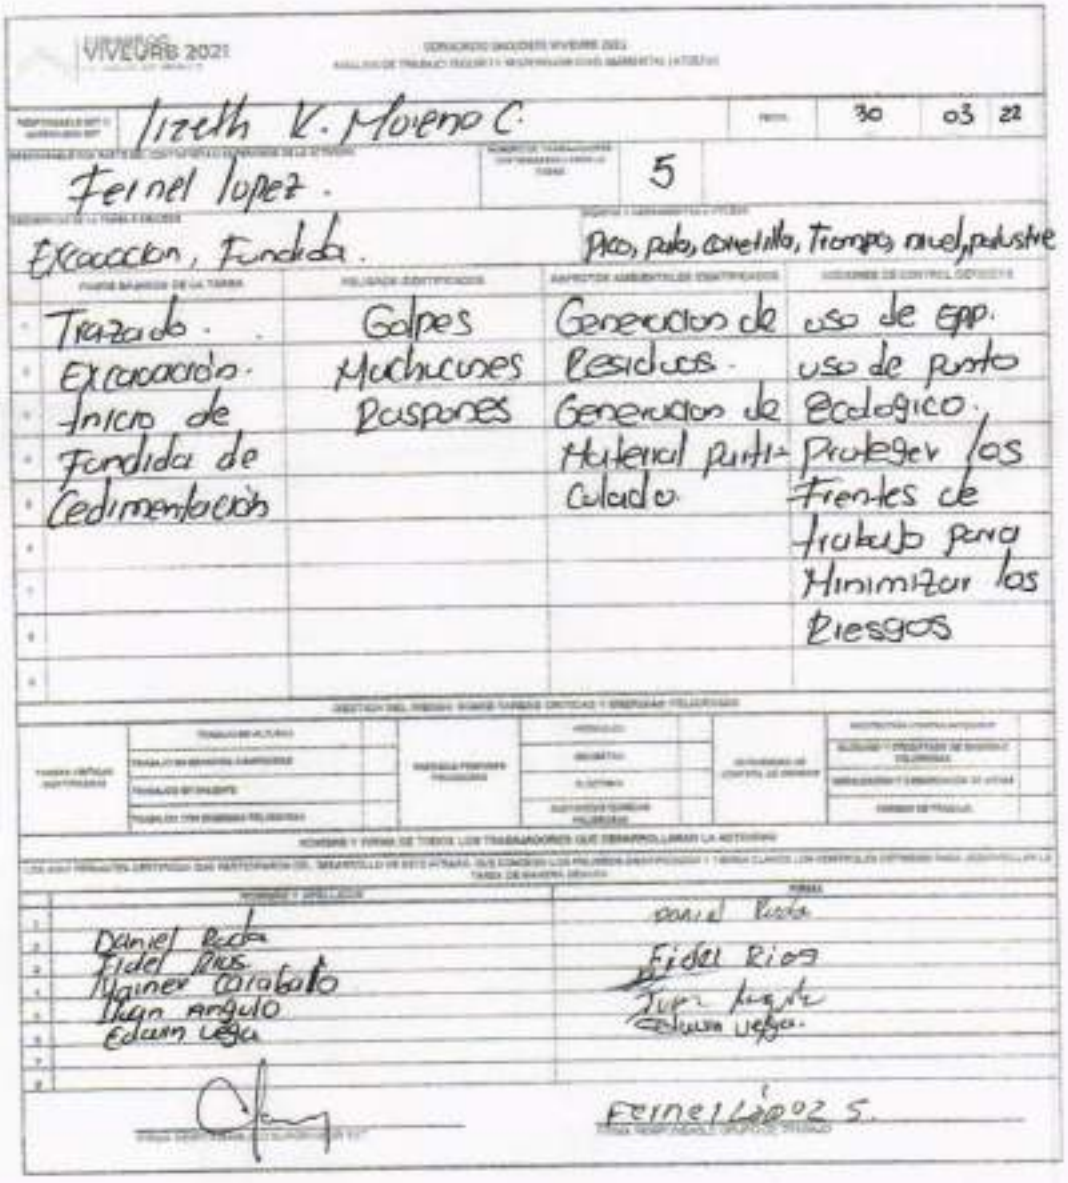

VIVEURB 2021

Lizeth V. Moreno C. | 30 | 03 | 22

Feinel lopez. | 5


Excavacion, Fundida. | Pico, pala, cuerdilla, Trompo, nivel, polvorin

Trazado.	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
Excavacion.	Machucones	Residuos.	uso de punto
Inicio de	Raspones	Generacion de	ecologico.
Fundida de		Material punti-	Proteger los
Cedimentacion		culado.	Frentes de
			trabajo para
			Minimizar los
			Riesgos

Daniel Pacha	Daniel Pacha
Fidel Rios	Fidel Rios
Yainer Carabalo	Yainer Carabalo
Ivan Angulo	Ivan Angulo
Edwin Vega	Edwin Vega.

Feinel Lopez S.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

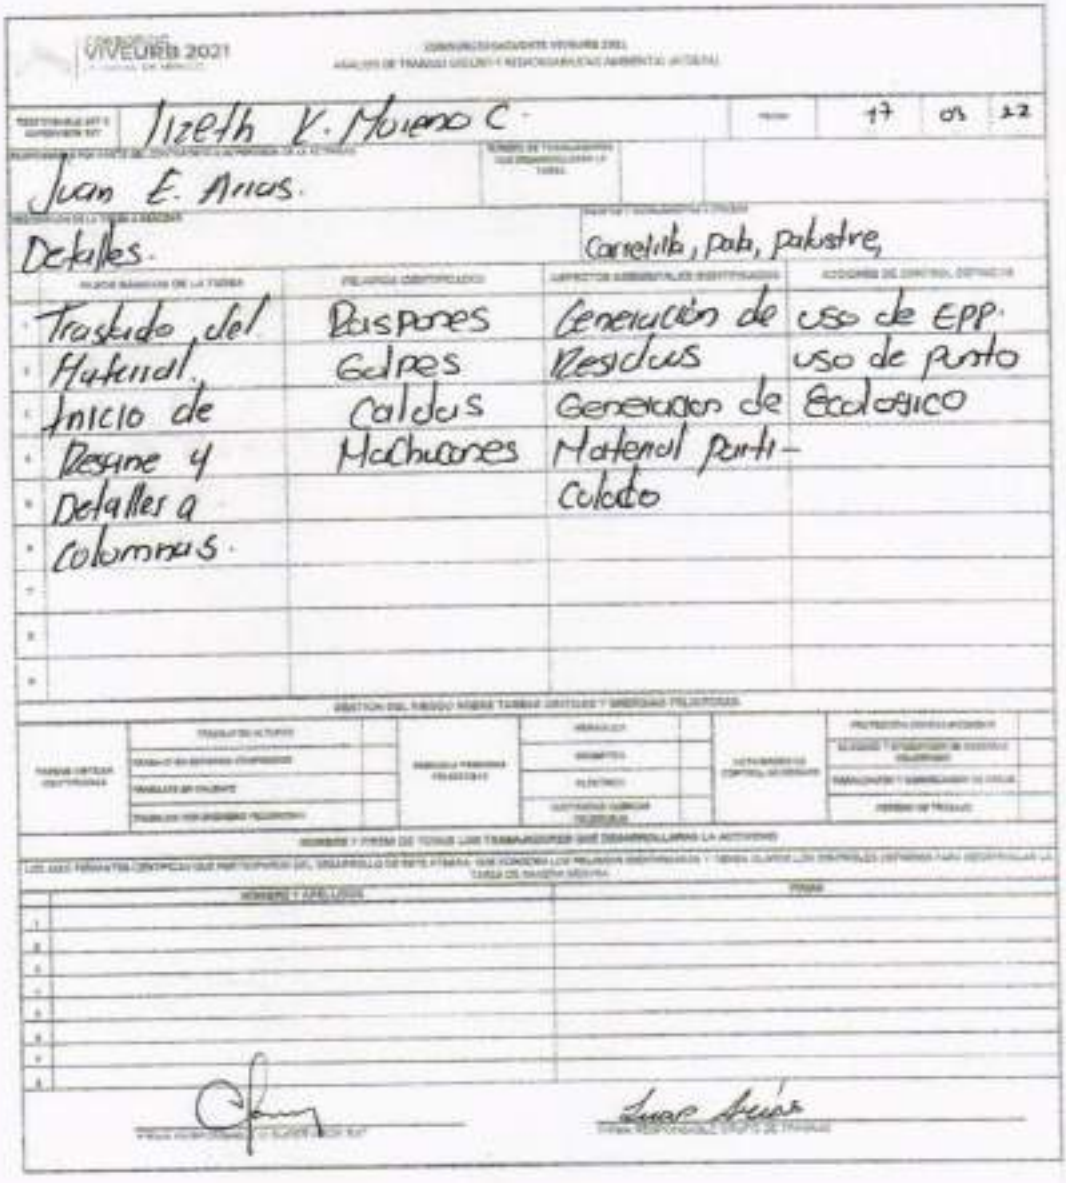

CONSORCIO VIVEURB 2021

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL INTEGRAL

	Lizeth V. Moreno C.		—	17	05 22
Juan E. Arias.					
Detalles.			Carretilla, Pala, Palustre,		

	FLUJO BASICO DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL DEFINIDAS
1	Traslado del	Raspones	Generación de	uso de EPP.
2	Material.	Golpes	Residuos	uso de punto
3	Inicio de	Caidas	Generacion de	Ecologico
4	Resane y	Machucones	Material punti-	
5	Detalles a		Culado	
6	columnas.			
7				
8				
9				

GESTION DEL RIESGO PARA TAREAS CRITICAS Y MEDIDAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		PERSONAL PARA TRABAJOS		ACTIVIDADES CON CONTROL DE ENERGIA	
	TRABAJOS EN ALTURAS		MECANICO		PROTECCION CONTRA ACCIDENTE
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		ELECTRICO		ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICO		PARA CONTROL Y SEÑALIZACION DE AREA
	TRABAJOS CON MATERIALES PELIGROSOS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		OTROS DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/PTA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA LABOR DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA SUPERVISOR Y/O EJECUTOR DEL ATS

FIRMA RESPONSABLE SSTA DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

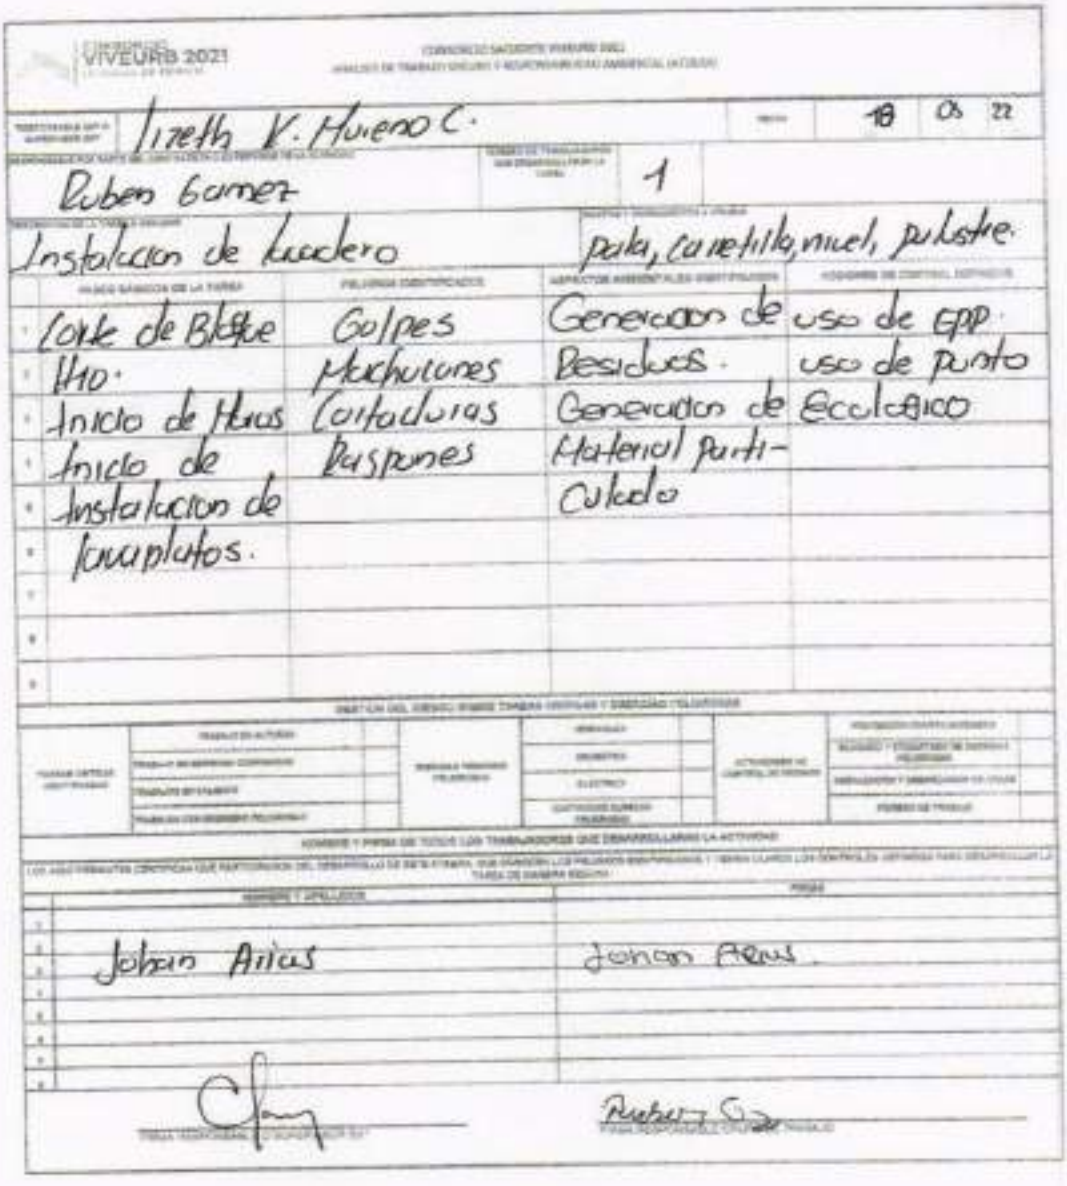

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth V. Hueso C. — 18 05 22


Ruben Gomez — 1

Instalacion de tuberia — pala, carretilla, nivel, pulistre.

	PASO BASICO DE LA TAREA	PELIGRO IDENTIFICADO	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROL ESTABLECIDO
1	Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	Izado.	Machucones	Residuos.	uso de punto
3	Inicio de Horas	Cortaduras	Generacion de	Ecologico
4	Inicio de	Raspones	Material parti-	
5	Instalacion de		Culado	
6	Accesorios.			
7				
8				
9				

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Jobain Arias	Jobain Arias

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

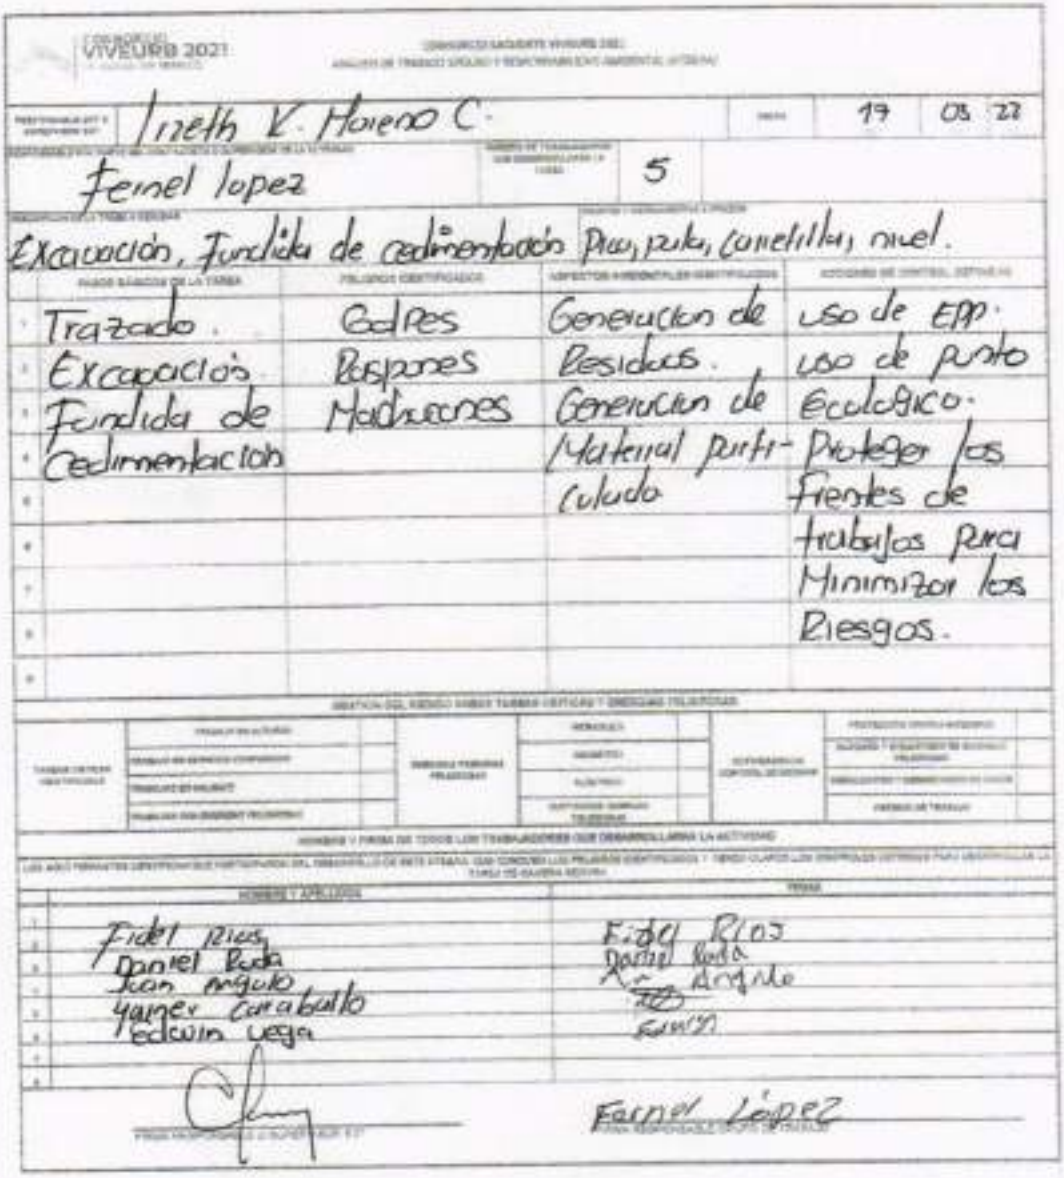

CONSORCIO VIVEURB 2021

Izeth V. Moreno C. — 17 / 03 / 22

Fernel lopez — 5

Excavación, Zanjeda de sedimentación — Pico, pala, cordelillo, nivel.

	Pasos básicos de la tarea	Peligros identificados	Aspectos ambientales identificados	Acciones de control definidas
1	Trazado.	Golpes	Generacion de	Uso de EPP.
2	Excavación	Raspones	Residuos.	Uso de punto
3	Zanjeda de	Madrazones	Generacion de	Ecologico.
4	Sedimentacion		Material particulado	Proteger los frentes de trabajos para Minimizar los Riesgos.
5				
6				
7				
8				

GESTION DEL RIESGO PARA TAREAS CRITICAS Y ORDENES PELIGROSAS

Trabajo en altura
Trabajo en espacios confinados
Trabajos en caliente
Trabajos con energias peligrosas

Mecanico
Quimico
Electrico
Condiciones ambientales de trabajo

Protección contra incendios
Bloqueo y etiquetado de equipos peligrosos
Permisos de trabajo


FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE PARTICIPAMOS DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/AIS, QUE CONOCEMOS LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TENEMOS CLARO LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE FORMA SEGURA

	Nombre y apellidos	Firma
1	Fidel Rios	Fidel Rios
2	Daniel Roda	Daniel Roda
3	Juan Angulo	Juan Angulo
4	Yamer Caraballo	
5	Edwin Vega	
6		
7		

Firma responsable de la actividad: Fernel López

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

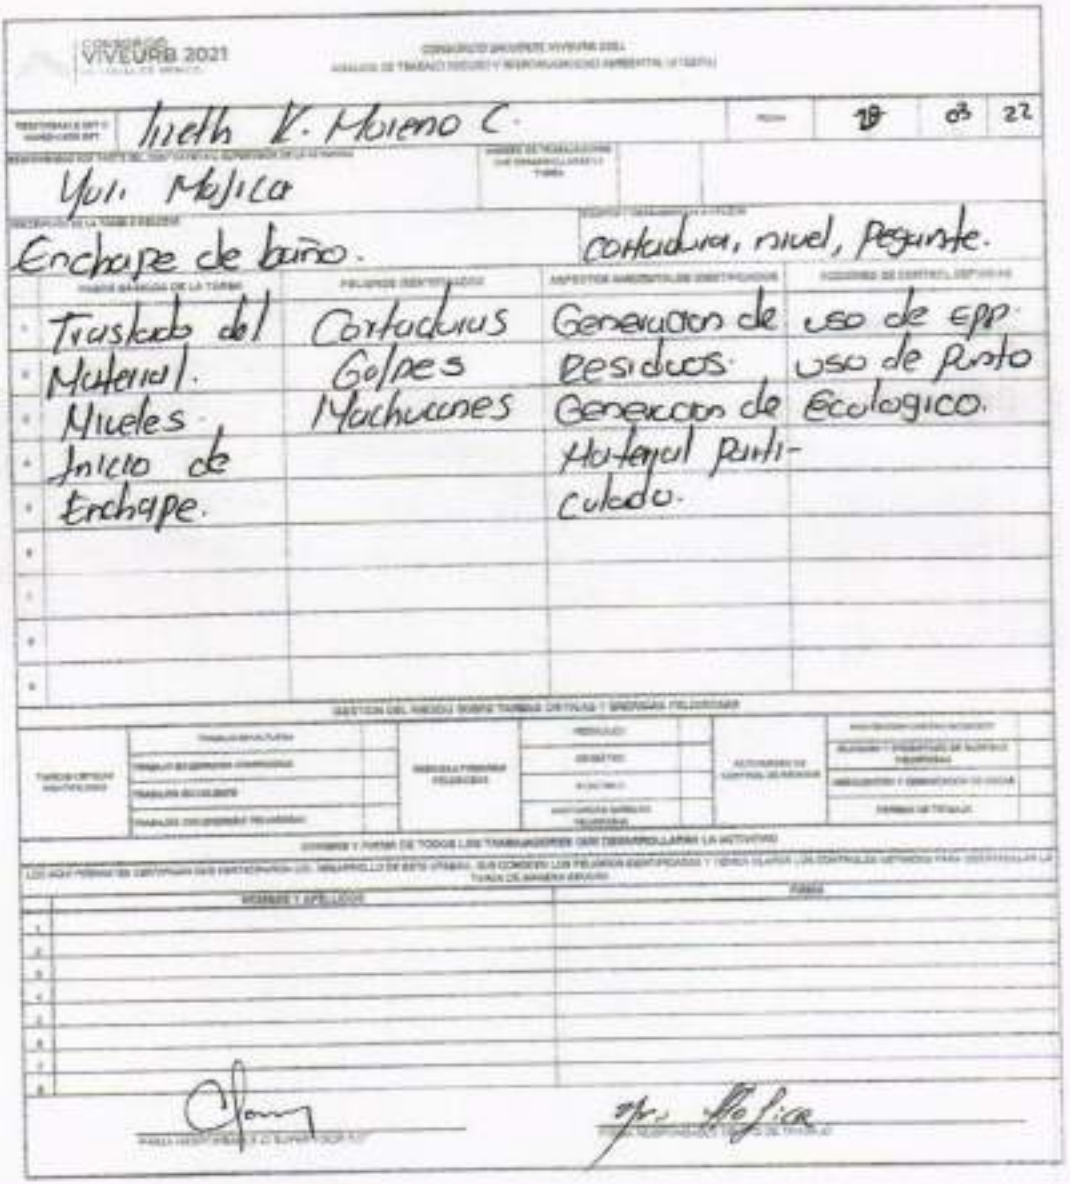

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO JAGUEYE VIVEURB 2021

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RECONOCIMIENTO AMBIENTAL (ATS/ATO)

RESPONSABLE DEL ATS Y NOMBRE DEL CARGO	Lizeth V. Moreno C.	FECHA	18	03	22
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SUPERVISA DE LA TAREA	Yuli Mojica	NOMBRE DE PERSONAS QUE DESARROLLARAN LA TAREA			
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR	Enchape de baño.	RECURSO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	Cortadora, nivel, Pegante.		

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL IDENTIFICADOS
*	Traslado del Material.	Cortaduras Golpes	Generacion de Residuos.	uso de EPP. uso de punto
*	Niveles.	Machucones	Generacion de	Ecologico.
*	Inicio de Enchape.		Material punti- culado.	
*				
*				
*				
*				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJO EN ALTURAS	ENERGIAS PRESENTES PELIGROSAS	HERIDAS	ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		CHOQUES		ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SUMINISTRO TRADICIONALES
	TRABAJOS EN CALIENTE		ATRAPAMIENTO		HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS DE USO COMUN
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		ANOTACIONES GENERALES PELIGROSAS		PERMISO DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ACA FIRMAN SE CERTIFICAN QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE ESTE ATS/ATO, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y CONOCEN CUALES LOS CONTROLES OPTIMOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

MANDO INTERMEDIO O SUPERVISOR

RESPONSABLE DEL ATS/ATO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021

Lizeth V. Moreno C.			16	03	22
Fernel lopez	5				
Funcion de Cedimentacion		Pala, pico, carretilla, nivel, Plastre			

	TAREAS RUTINARIAS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL EXISTENTES
1	Trazado.	Golpes	Generacion de	Uso de EPP.
2	Excavacion	Machucones	Residuos.	Uso de Punto
3	Inicio de	Caspones	Generacion de	Ecologico.
4	Cedimentacion		Material Parti-	Proteger los
5			Culado.	Frentes de traba-
6				jos para Minimi
7				zar los Riesgos
8				
9				

OBJETIVO DEL ORDEN PARA TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS	TRABAJOS ACTUALES		ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS	HERRAMIENTAS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	PROTECTORES CONTRA EL RUIDO	
				OBJETOS				
				EQUIPOS				
				SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			ARNESES DE TRABAJO	


NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CONFIRMAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTA ATPRA, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CLAVE IDENTIFICADAS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	Fidel Rios	Fidel Rios
2	Daniel Ureda	Daniel Ureda
3	Juan Angulo	Juan Angulo
4	Yamel Carabalio	Carabalio
5	Edwin Vega	Edwin
6		
7		
8		

Fernel López

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar

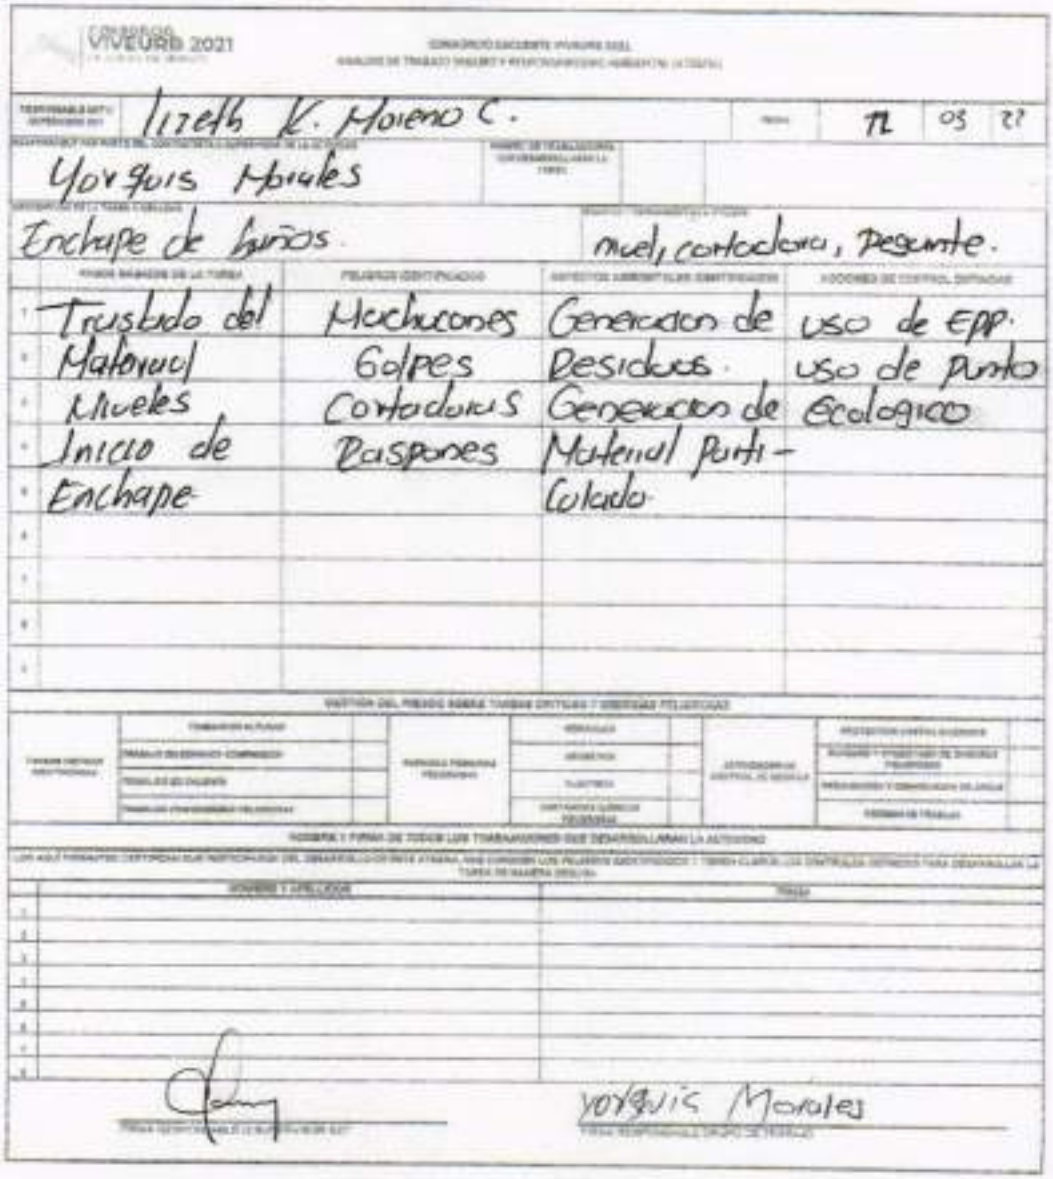

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y PREVENCION DE RIESGOS AMBIENTALES (ATS/ATA)

RESPONSABLE ATS / SUPERVISOR ATS: lizeth K. Moreno C.

FECHA: TL 05 22

RESPONSABLE DEL CONTRATO O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: Yorguis Morales

NOMBRE DE TRABAJADORES QUE REALIZARAN LA TAREA:

ACTIVIDAD DE LA TAREA A REALIZAR: Enchape de baños.

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA A UTILIZAR: nivel, cortadora, Pesante.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL DISPUESTAS
1	Traslado del	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
2	Material	Golpes	Residuos.	uso de punto
3	Muebles	Cortaduras	Generacion de	Ecologico
4	Inicio de	Raspones	Material punti-	
5	Enchape		Colado	
6				
7				
8				
9				

VALIDACION DEL PERSONAL SOBRE TAREAS CRITICAS Y DIRECTRICES PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS			PERSONAL PERMITIDO PELIGROSAS			ESTIPULACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD		
	TRABAJOS EN ALTURAS			ARENADO			PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS			ARGOLLAS			ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	TRABAJOS EN CALIENTE			TUBOTECO			MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	
	TRABAJOS ELECTRICOS RELEVANTES			CONTRATISTAS CLINICOS PELIGROSAS			PERMISO DE TRABAJO	

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD


LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATS/ATA, HAN CONOCIDO LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TIENEN CLARO LOS CONTROLES DISPUESTOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE DE LA TAREA: Yorguis Morales

FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

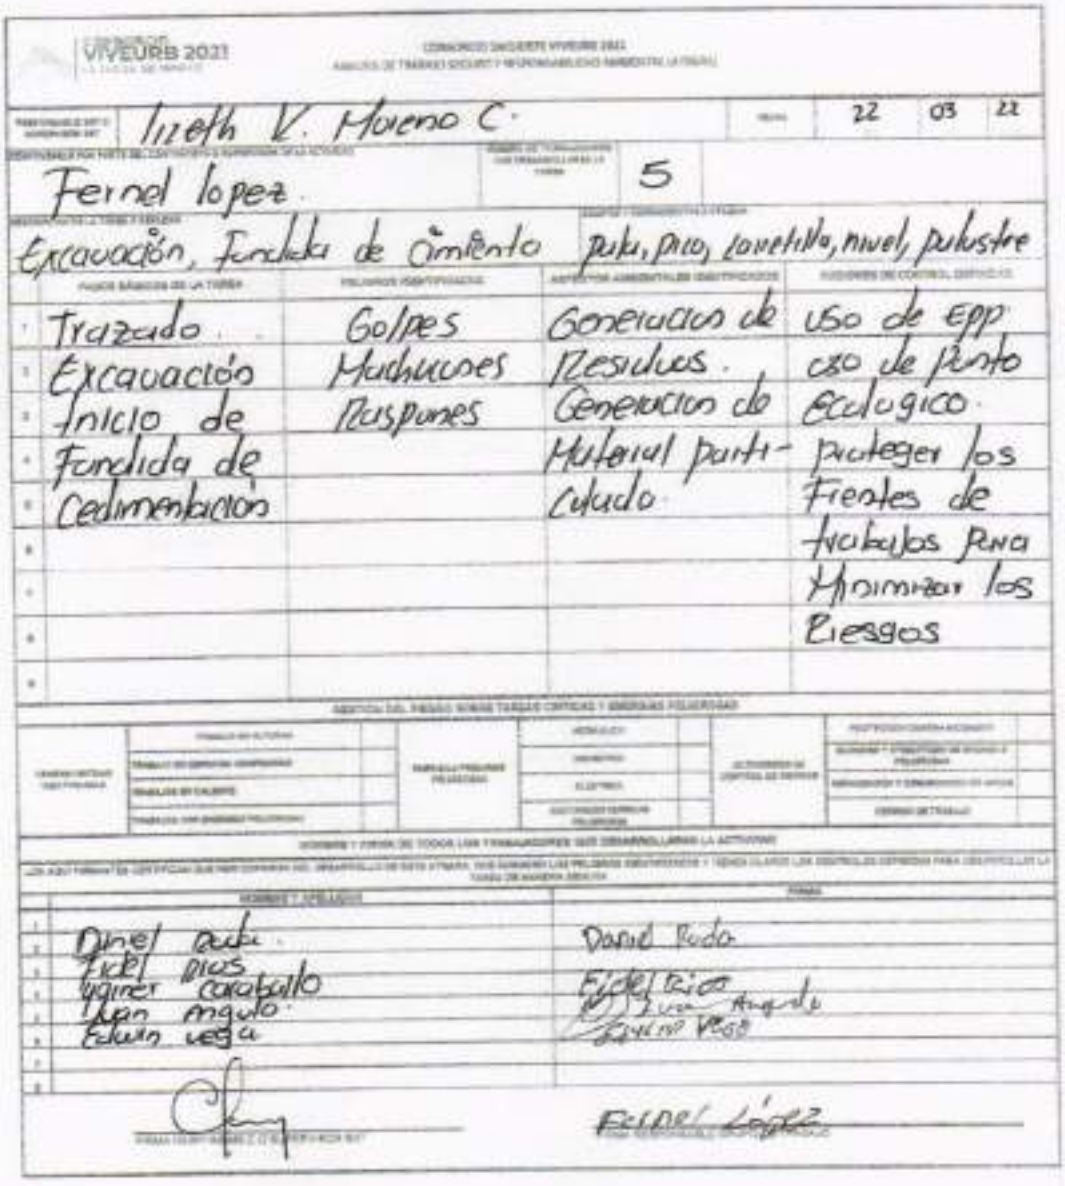

VIVEURB 2021

Lizeth V. Moreno C.		22	03	22
Fernel lopez.	5		
Excavación, Fundida de Cimiento	Pala, Pico, Carretilla, nivel, plomada		

	TAREAS BÁSICAS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	CONTROLES DE CONTROL EXISTENTES
1	Trazado.	Golpes	Generacion de	Uso de EPP
2	Excavación	Machucones	Residuos.	Uso de punto
3	Inicio de	Resbalones	Generacion de	Ecologico.
4	Fundida de		Material parti-	proteger los
5	Cedimentacion		culado	Frentes de
6				trabajos para
7				Minimizar los
8				Riesgos
9				

GESTION DEL PELIGRO SOBRE TAREAS CRITICAS Y EMERGENCIAS POTENCIALES

TAREAS CRITICAS		PELIGROS PRESENTES		CONTROLES DE CONTROL DE PELIGRO	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICO		
	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		LOCATIVO		
	TRABAJOS EN CALIENTE		ELECTRICO		
	TRABAJOS CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS		

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE HEMOS CONOCIDO DEL DESARROLLO DE ESTA TAREA, HEMOS SUMINISTRADO LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y HEMOS CLARO LOS CONTROLES EXISTENTES PARA CONTROLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA


	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Daniel Pedo	David Pedo
2	Fidel Rios	Fidel Rico
3	Yoiner Carabello	Juan Angulo
4	Juan Angulo	Edwin Vega
5	Edwin vega	
6		
7		
8		

FIRMA QUIEN REALIZA EL ATS Y PERMISO DE TRABAJO

FIRMA RESPONSABLE SST

Fidel López

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

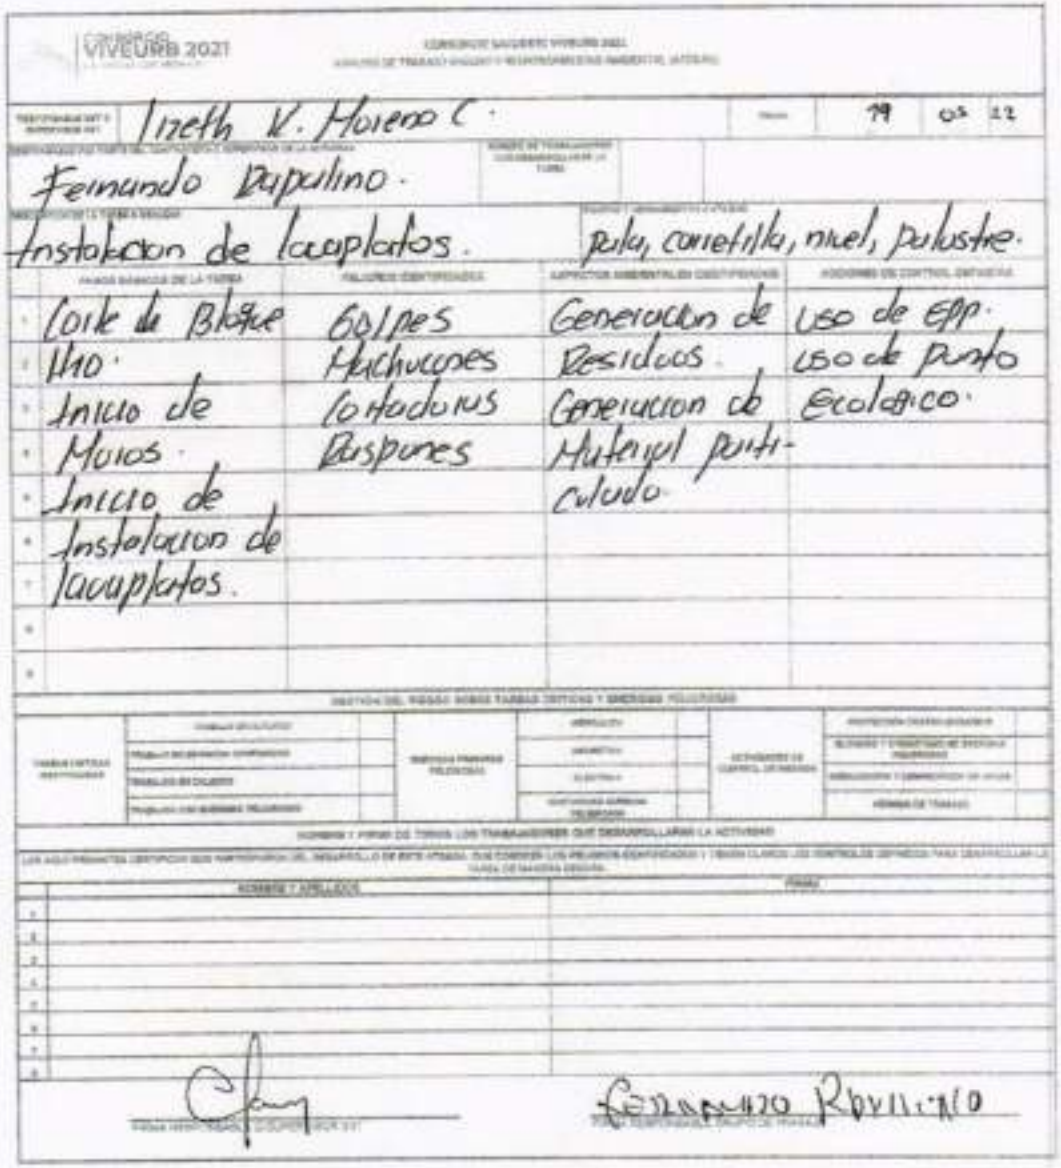

CONSORCIO VIVEURB 2021

Izeth V. Herrera C. 29 05 22

Fernando Dapulino.

Instalacion de lavaplatos. Pala, carretilla, nivel, palustre.

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL EMITIDAS
1	Corte de Bloque	Golpes	Generacion de	Uso de EPP.
2	Llllo.	Machucones	Residuos.	Uso de punto
3	Inicio de	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
4	Muros.	Raspones	Mutagil punti-	
5	Inicio de		culado.	
6	Instalacion de			
7	lavaplatos.			
8				
9				

GESTION DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y ENERGIAS PELIGROSAS

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS | TRABAJO SEGURO | TRABAJO DE EXCAVACION CONFINADOS | TRABAJOS EN CALIENTE | TRABAJOS CON ALTURAS PELIGROSAS | ENERGIAS PRIMARIAS PELIGROSAS | MECANICA | HIDRAULICA | ELECTRICA | SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS | ELEMENTOS DE CONTROL DE ENERGIAS | INSPECCION PARA ESCALERAS | ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS | INSPECCION Y CONDICIONES DE USO | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN SUS PARTICIPACION DEL DESARROLLO DE ESTE PERMISO, SUS CONOCER LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CLAVES DE CONTROLES DEFINIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA.

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		


FIRMA PERSONA QUE SUPERVISA LA TAREA

Fernando Rapulino
FIRMA RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO


carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.


10.5. ANALISI DE TRABAJO INSEGURO.



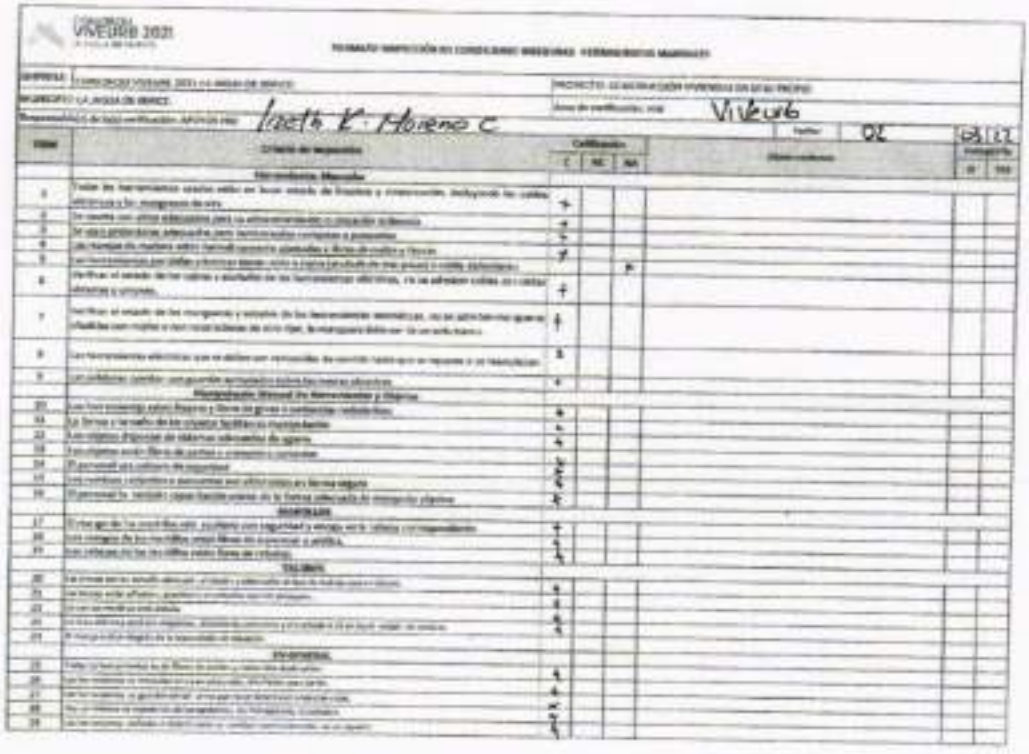



carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

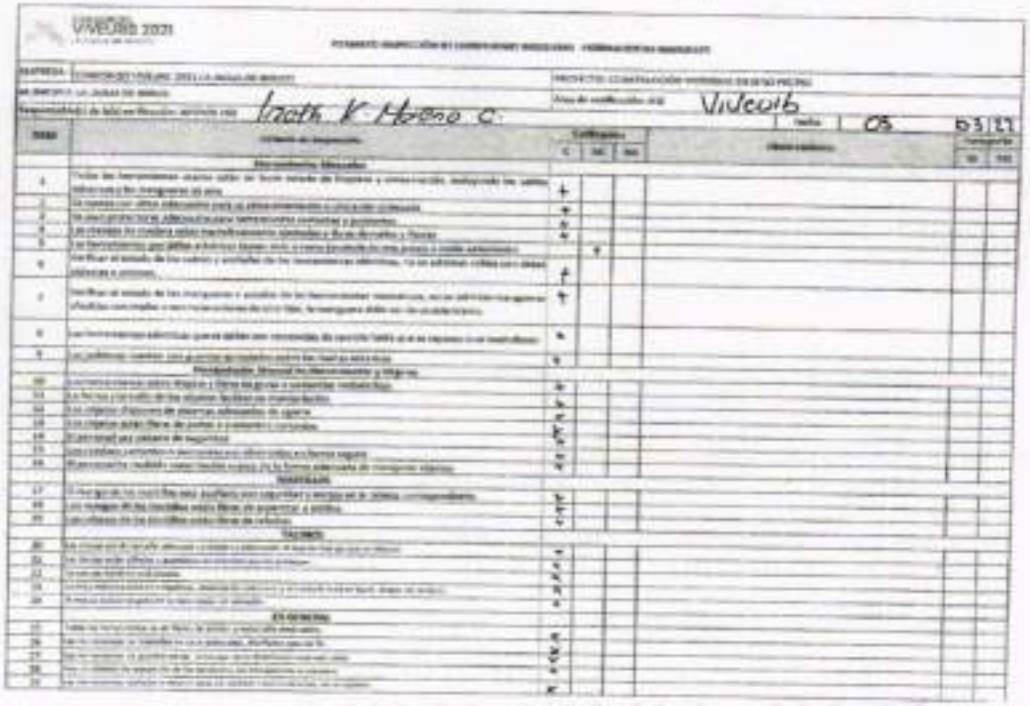

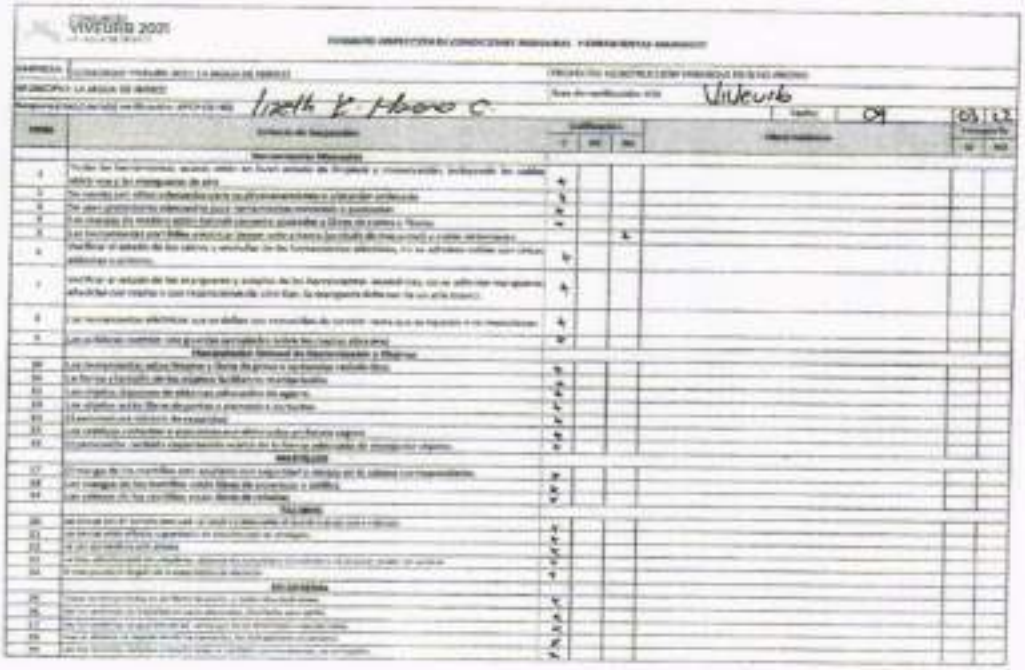



carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

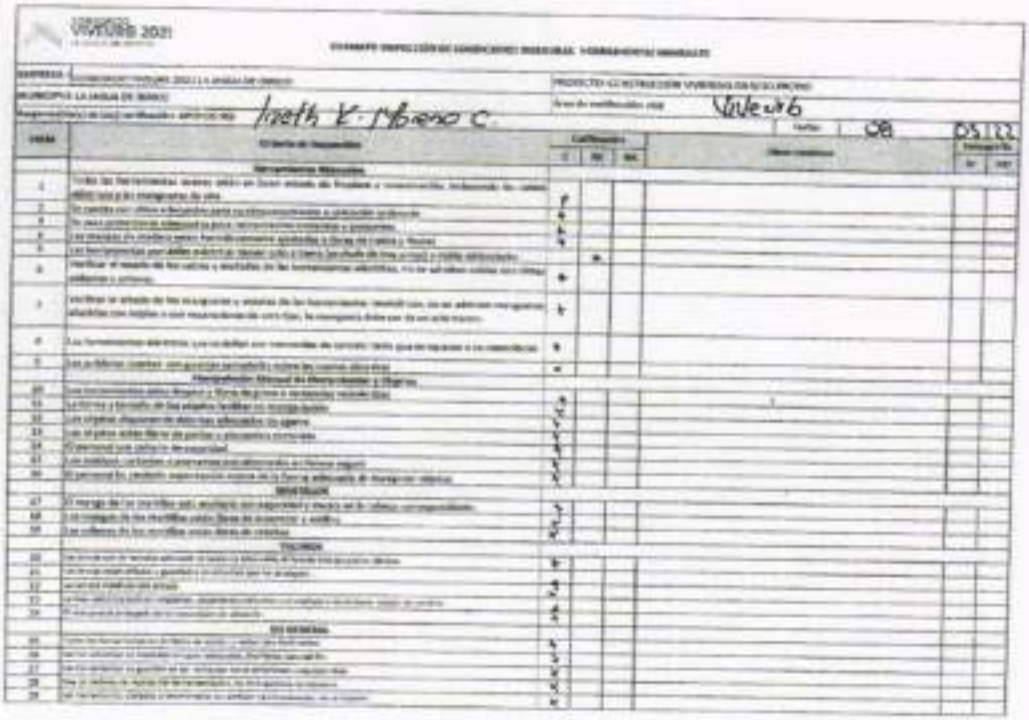

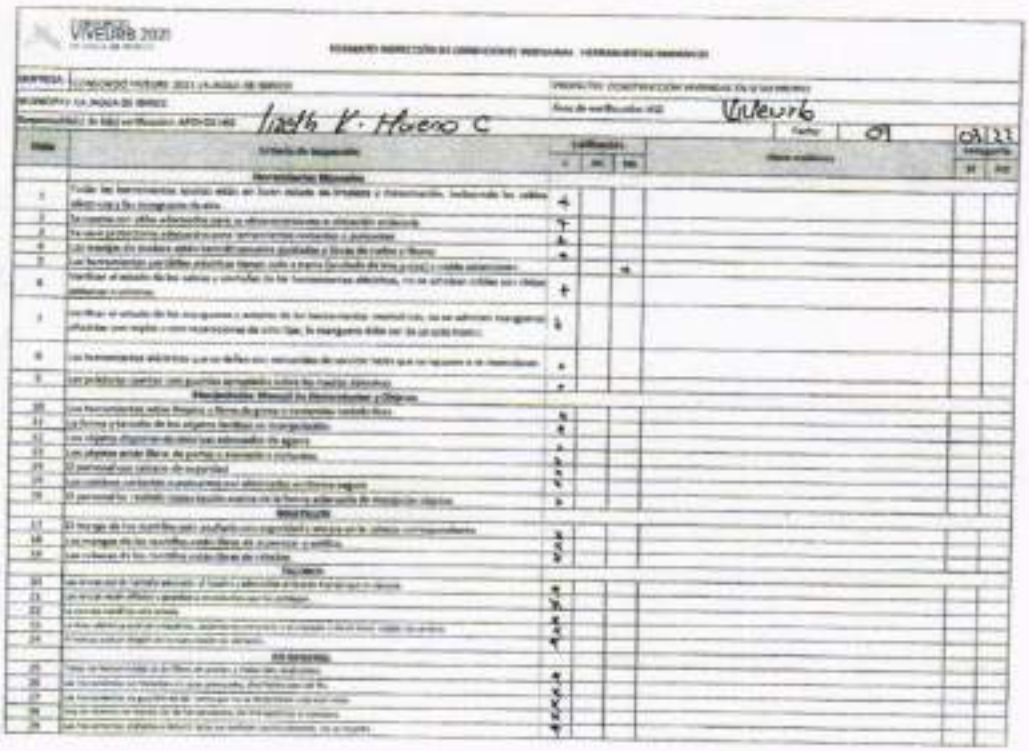



carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

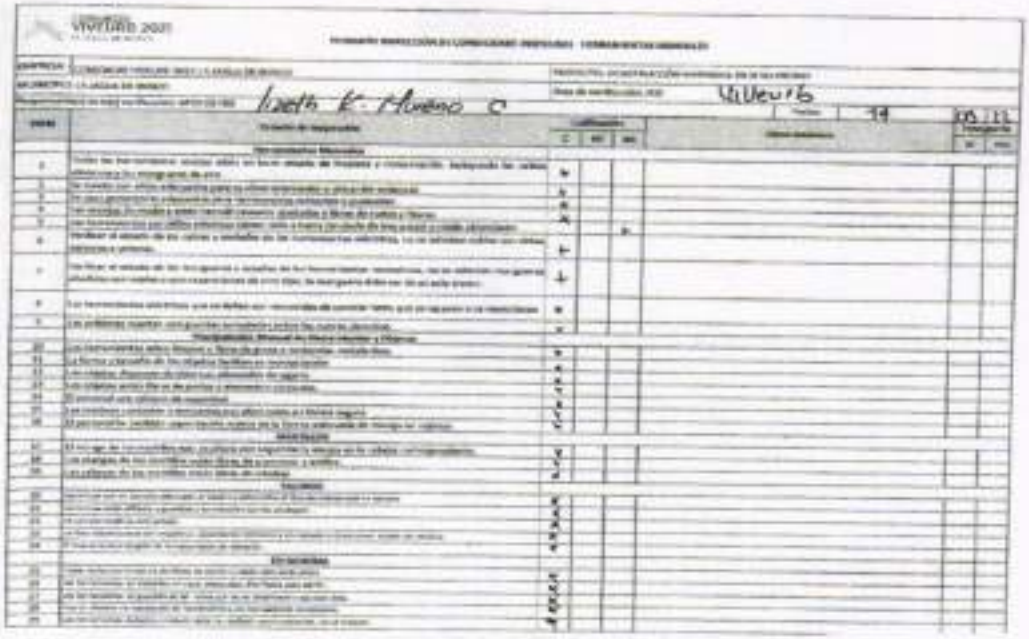

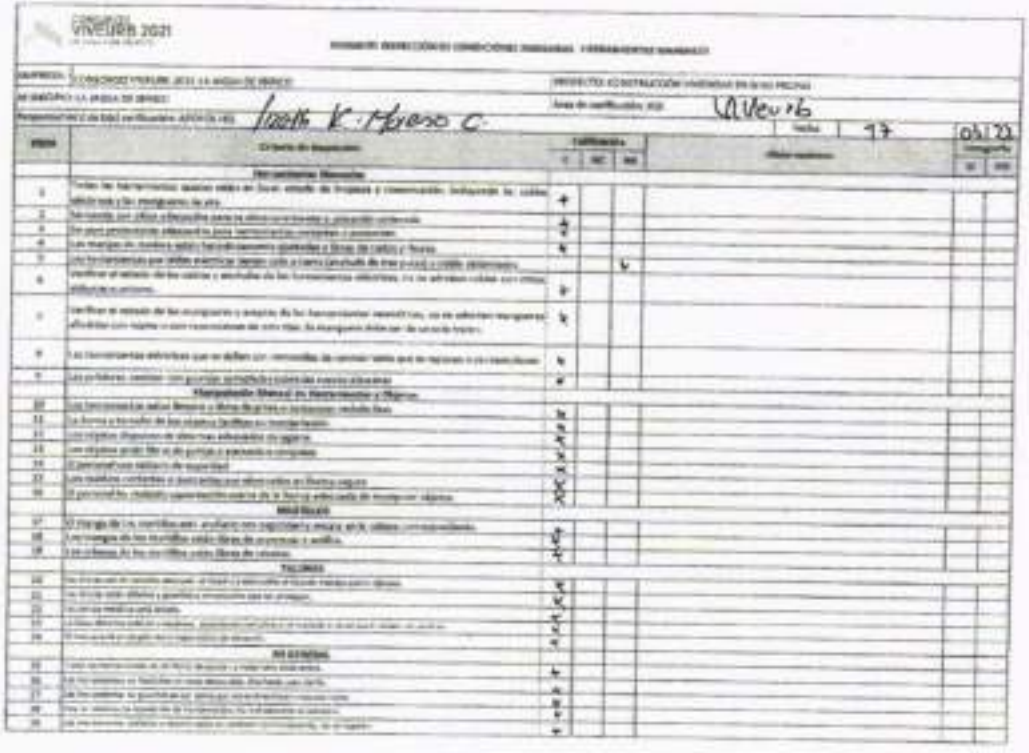



carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

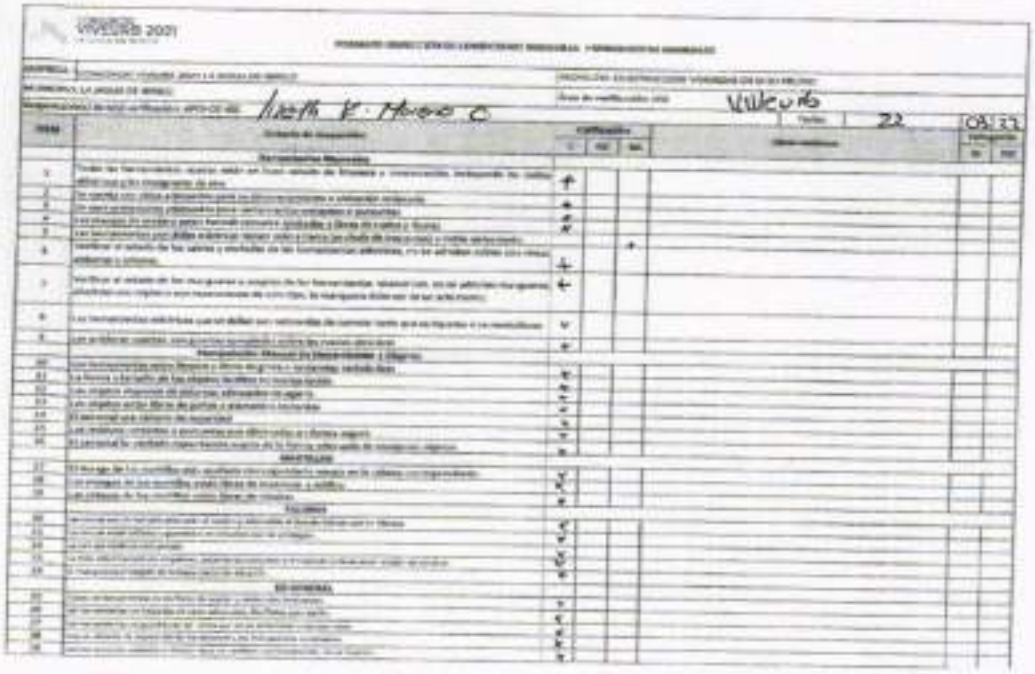

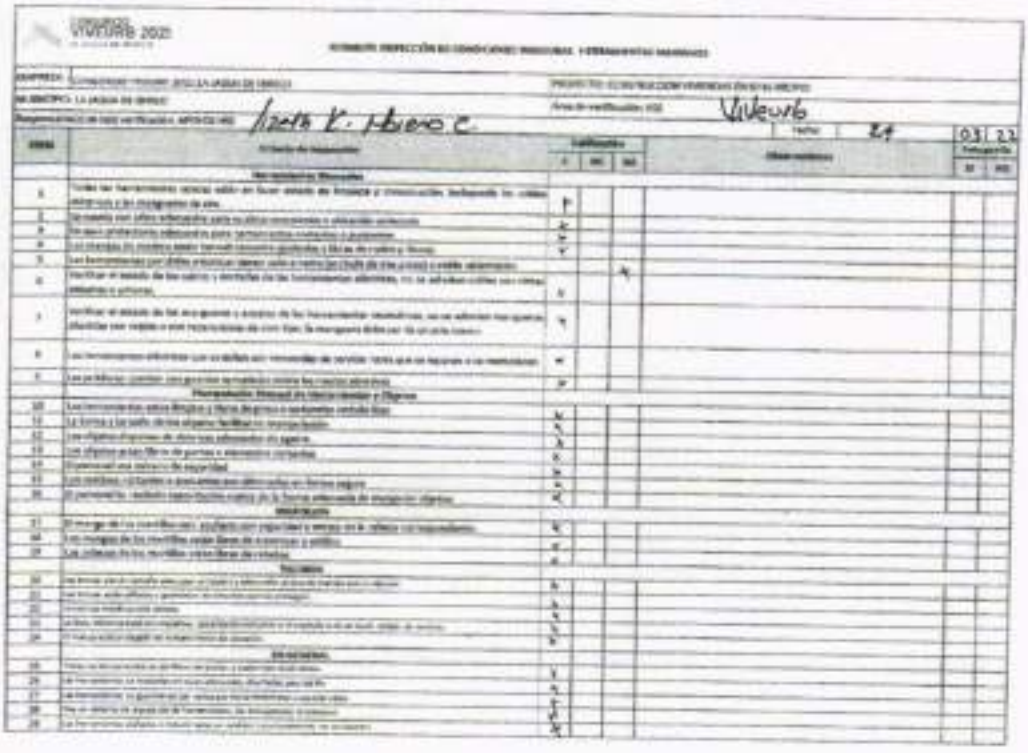



carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

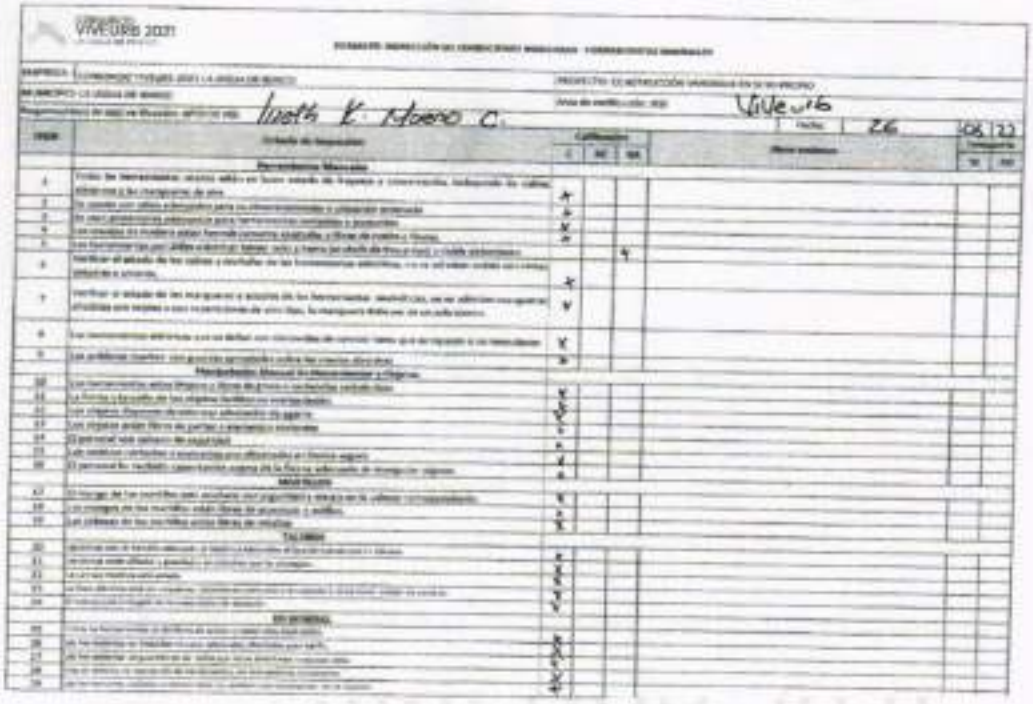

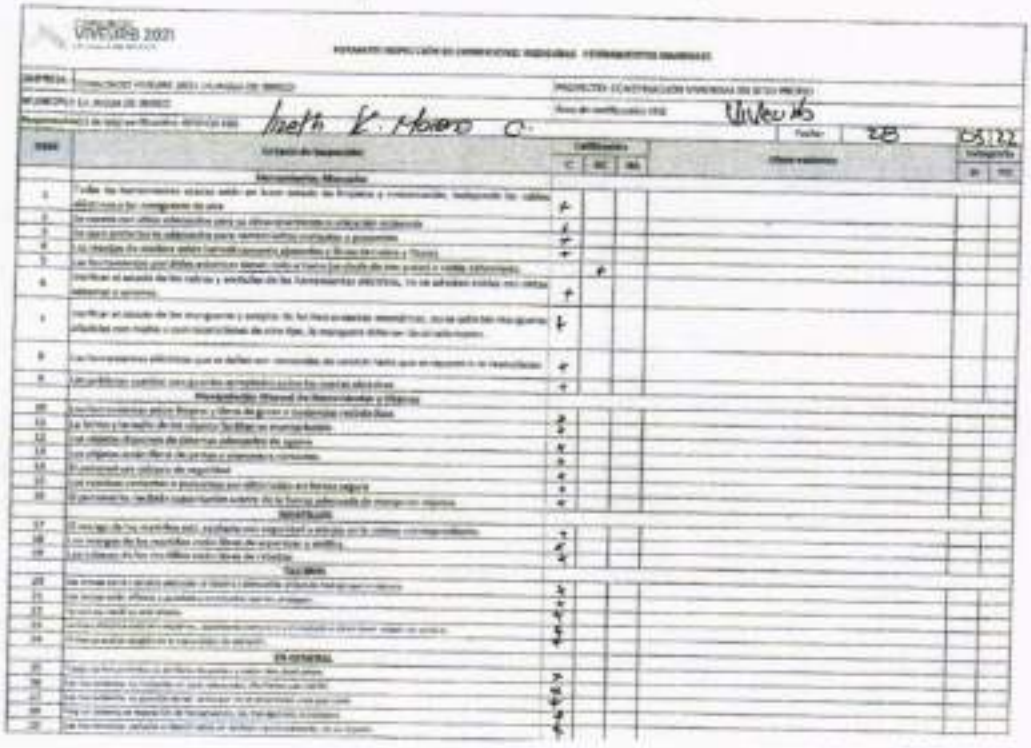

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

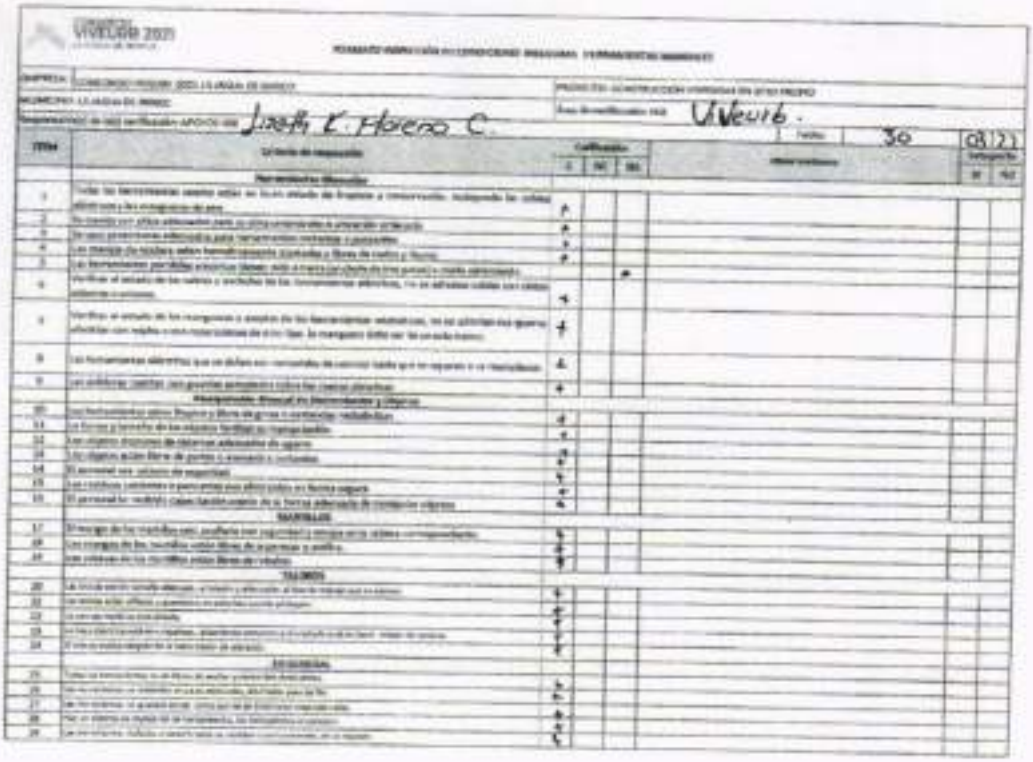

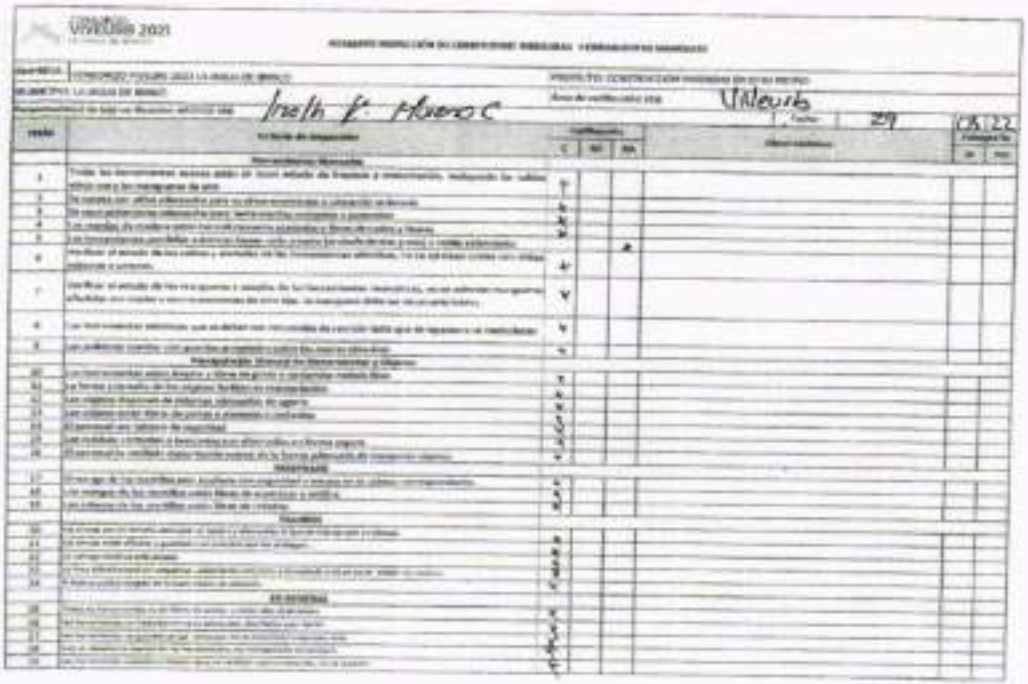

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

A17 – INFORME AMBIENTAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORME DE GESTION AMBIENTAL

MARZO DEL 2021

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
(IMPLEMENTACION DEL P.M.A)

CONSORCIO VIVE URBE 2021

PERIODO: MARZO del 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
MARZO 2022

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTROUCCION 4

2. OBJETIVOS 5

2.1 GENERAL 5
2.2. ESPECIFICOS 5

3. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 6

4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA 6

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO 6

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 8

6.1. Educación ambiental y cultura al trabajador. 8
6.2. Participación ciudadana de la zona de influencia. 9
6.3. Control de Emisiones a la Atmósfera y Ruido. 10
6.4. Movimientos de tierra. 11
6.5. Manejo y disposición de material sobrante. 12
6.6. Manejo y disposición de recurso agua. 13
6.7. Apertura de zanjas, instalación de tuberías. 14
6.8. Limpieza de la obra y manejo de residuos sólidos. 15

7. CONCLUSION. 16

8. ANEXOS 17

8.1. FORMATO DE RESIDUOS SOLIDOS 17

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

1. INTROUCCION

Se afirma que una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados, como constructores, comunidad vecina, usuarios, entes de planeación y autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada.

Al Consultor o Contratista de la obra vial le corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y construir con mínima generación de contaminación, respondiendo a las necesidades de desarrollo socioeconómico en su área de influencia.

Para contrarrestar los posibles impactos potenciales el contratista diseña un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y cierre.

Hoy en día se exige que las obras de ingeniería sean compatibles con el medio ambiente, es decir, que su construcción y operación se hagan guardando un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los bienes y elementos de la Naturaleza, incluyendo principalmente el ser humano.

Para este propósito se han requerido los estudios ambientales en la construcción de las obras civiles, como una dimensión ambiental que llega a convertirse en un factor determinante para las bondades y decisiones de los proyectos de desarrollo.

- **NOMBRE PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

En este documento se encuentran los principales resultados de los ejercicios realizados por la implementación del P.M.A.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Seguir Implementando todas las actividades encaminadas a Mitigar, Reducir, y/o Compensar las posibles afectaciones al Ambiente en la construcción DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021.

2.2. ESPECIFICOS

- Continuar con las respectivas inspecciones a cada uno de los puntos de actividades donde se presente generación de residuos sólidos.
- determinar los factores Ambientales según la afectación y colocarlos en plan de mejora.
- Realizar Capacitación y charlas ambientales al personal sobre la importancia del ambiente y sus componentes.
- Realizar jornadas de limpiezas semanales.
- Hacer cumplir el uso permanente en obra de los puntos ecológicos.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

3. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021. en el Municipio De La Jagua De Ibirico – Cesar, surge como necesidad de integrar niños, adultos y personas de la tercera edad los cuales serán los directamente beneficiarios del proyecto que adjudicó el gobierno local.

Este proyecto tiene como objetivo completar los procesos culturales, tecnológicos y recreativos al servicio de toda la comunidad anteriormente mencionada.

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos, frecuentemente derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, efectos fisicos de la ruta como barrera y otros. Incluye al Área Operativa, Área de Influencia Directa e Indirecta, y su delimitación debe realizarse a través de un equipo interdisciplinario que evalúe la extensión del espacio donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra

Para la determinación de las áreas de influencia se tomó como base los siguientes aspectos.

- ✓ Actividades a desarrollar con la ejecución del proyecto.
- ✓ División político administrativa del municipio.
- ✓ Actividades socioeconómicas pertenecientes al área de influencia del proyecto.
- ✓ Análisis de trascendencia de los posibles impactos por la ejecución de las actividades a desarrollar.

4. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA AL TRABAJADOR.
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ZONA DE INFLUENCIA.
- CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y RUIDO.
- MOVIMIENTOS DE TIERRA.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RECURSO AGUA.
- APERTURA DE ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.
- LIMPIEZA DE LA OBRA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24' de latitud norte y 73º20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza, juan ramón, florida



MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9º24' de latitud norte y 73º20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

6.1. Educación ambiental y cultura al trabajador.

Se viene capacitando al personal adscrito al proyecto en la protección y conservación del medio ambiente, la prevención de impactos negativos al ambiente atribuible al proyecto y el cuidado de la salud tanto de los trabajadores como de las personas que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.

De la misma forma se viene capacitando a la comunidad ubicada dentro del área de influencia del proyecto sobre la importancia de proteger el medio ambiente mediante un uso adecuado de los servicios prestados.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Prohibir el uso de recursos naturales no autorizados por la autoridad ambiental para actividades del proyecto (estacas para señalización, mojones, etc).
- ✓ Realización de charlas al personal adscrito al proyecto sobre la normatividad ambiental vigente.
- ✓ Controlar la intervención de trabajadores y/o vehículos en la vida cotidiana de los residentes.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.2. Participación ciudadana de la zona de influencia.

Buscar la articulación de los contenidos del proyecto, con las expectativas y necesidades de las comunidades.

Los talleres y reuniones comunitarias servirán para la expresión de las inquietudes de las comunidades y por tanto, para asumir la interventoría social a los proyectos.

Se están recibiendo actualmente todas las hojas de vida de carácter administrativo como para trabajos de campo, aquí se le da prioridad a las personas más cercanas a la obra coordinando con los presidentes de juntas para corroborar con la información. Desde la alcaldía contamos con participación constante para el enganche de personal así se busca que todas las entidades estemos trabajando con el mismo objetivo.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Elaboración del Plan de Manejo Ambiental que contemple el manejo de los residuos humanos.
- ✓ Coordinación con las oficinas de generación de empleo de la administración municipal, juntas de acción comunal y contratista.
- ✓ Intercambio para el uso adecuado de los mecanismos de participación establecidos.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.3. Control de Emisiones a la Atmósfera y Ruido.

Establecen las medidas a desarrollar en aquellas actividades y acciones que pueden generar un incremento en los niveles de material particulado, gases y ruido, por efecto la operación de maquinaria y equipos y el transporte de materiales durante la construcción o en la etapa de operación por el funcionamiento de equipos.

No se permite el uso de bocinas o pitos accionados por sistema de compresor de aire, o de sirenas. El personal expuesto al ruido debe usar protectores para oídos y cuando se trabaje con niveles altos.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Se prohiben las prácticas de quemas a cielo abierto de cualquier tipo de material.
- ✓ Se deben humedecer periódicamente las áreas o focos de emisión de material particulado.
- ✓ Construir barreras protectoras de ruido en los frentes de obra urbano.
- ✓ Construir barreras protectoras de ruido en las instalaciones operativas.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.4. Movimientos de tierra.

Se están Implementando las medidas de manejo ambiental que mitiguen y/o controlen los efectos que el movimiento de tierras ocasiona sobre el medio ambiente.

Cuando se utilice el espacio público, el tiempo de almacenamiento no deberá ser superior a 24 horas. La ubicación del material de excavación no deberá poner en peligro la estabilidad de la obra y no deberá interferir con las demás actividades y labores cotidianas del sector.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ El material de corte, si el diseño lo especifica, podrá ser utilizado como material de relleno. El resto se debe disponer en la zona de disposición de material sobrante.

- ✓ En ningún caso se permite el vertimiento de las aguas de drenaje de la excavación sobre las vias o zonas superficiales aledañas a la obra.

- ✓ Se deben tomar medidas para evitar que al momento de la excavación se deslicen materiales hacia las zonas de protección.


carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.5. Manejo y disposición de material sobrante.

En esta actividad se viene disponiendo los materiales sobrantes generados durante las obras en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Esto incluye la disposición temporal y el manejo dentro de la obra.

El sitio para disposición de materiales se ubica en lo posible sobre terreno de topografía plana a ondulada, buscando siempre la mejor estabilidad.

En ocasiones se hace donación sin ánimo de lucro a personas que solicitan el material con la condición de que se haga buen uso del material.

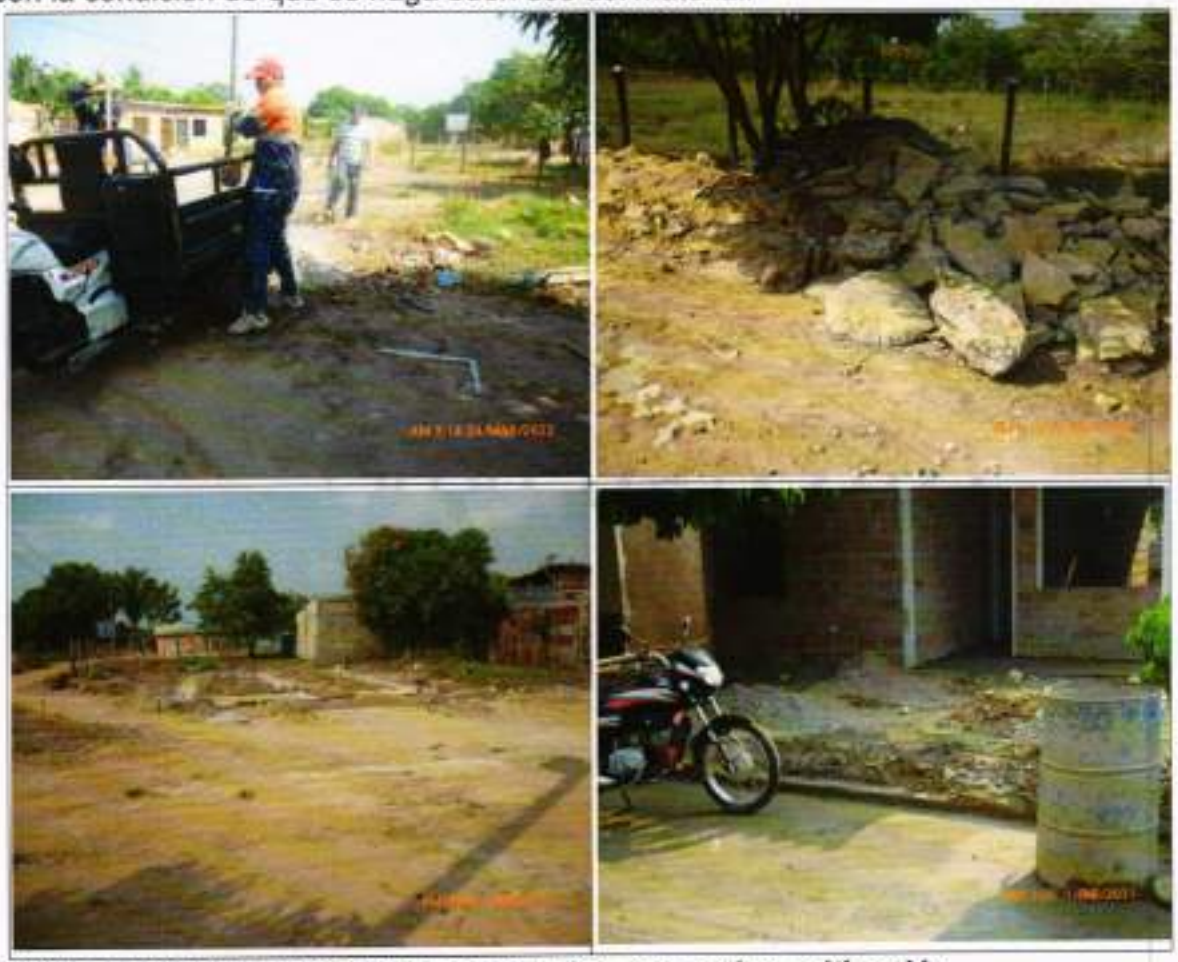

TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Las volquetas deben estar en buen estado y no tener fisuras que dejen salir el material transportado.
- ✓ El material sobrante debe transportarse y disponerse en la escombrera definida en el plan de ordenamiento territorial.
- ✓ Se debe seleccionar y demarcar una zona dentro del sitio de la obra para el almacenamiento temporal de los sobrantes producidos.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.6. Manejo y disposición de recurso agua.

Se adelanta siempre las acciones que permiten el buen manejo y disposición de los residuos líquidos durante la construcción de la obra, tal que, no haya afectación sobre los cuerpos de agua cercanos al área dispuesta para la ejecución de la obra.

Se recolecta y evacuan de forma adecuada los residuos liquidos generados en la zona de la obra y disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental correspondiente.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Se deben construir cunetas perimetrales alrededor del área del proyecto para el encauzamiento de las aguas superficiales.
- ✓ Las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático en las excavaciones, serán dispuestas en los canales pluviales, alcantarillas o cuerpos de agua.
- ✓ No deberan las aguas vertidas a las vías públicas ni cunetas que desemboquen a cuerpos de aguas naturales.

carrera11 N. º 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@qcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.7. Apertura de zanjas, instalación de tuberías.

Se dieron las recomendaciones de manejo para minimizar los efectos producidos por el manejo de la tubería, excavaciones y rellenos de las zanjas para la instalación de las mismas.

El sitio de acopio queda en un predio cercano al sitio de la instalación. El lugar es preparado con anterioridad a la llegada de la tubería, realizando actividades de descapote si es necesario.

Los impactos que se generen al suelo por la maquinaria que hace el transporte interno de la tubería, deberan corregir al terminar esta actividad, conformando de nuevo el suelo y revegetalizando.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ La manipulación de la tubería debe hacerse cuidadosamente para no causar daños en su estructura.

- ✓ Las apertura de las zanjas solo debe hacerse cuando la tubería esté lista para su instalación y la zona debe acordonarse

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

6.8. Limpieza de la obra y manejo de residuos sólidos.

Son medidas que se vienen tomando adecuadamente para la presentación de la obra y manejo adecuado de los residuos sólidos.

Se viene disponiendo de la mano de obra necesaria para realizar las labores de limpieza permanente de las áreas tanto dentro como fuera de la zona del proyecto, que sean intervenidas por el mismo.
La obra deberá permanecer limpia, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de escombros y desechos por muchos tiempos prolongados.



TIPO DE MEDIDA ADOPTADA: preventiva, correctiva, mitigación.

- ✓ Los residuos sólidos provenientes de roturas de estructuras, se podrán reciclar previa autorización del interventor.

- ✓ Está terminantemente prohibido el arrojar basuras en las áreas aledañas al sitio de la obra.

- ✓ Se deberá efectuar la limpieza inmediata de las zonas en las que se depositen desechos sin autorización del interventor.

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

7. CONCLUSION.

Para este periodo podemos anotar que se continúa implementando de manera contundente las acciones encaminadas a prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos generados por la construcción o ejecución de cada una de las actividades propias del proyecto en mención.

Los profesionales de obra del contratista y de interventoría vienen trabajando de la mano con el único objetivo de encaminar al desarrollo de la obra de manera armónica con el ambiente y tratar de minimizar o evitar aquellas acciones que puedan generar daño al ecosistema aledaño al perímetro intervenido por la obra.

Para este periodo se priorizó la sensibilización de los nuevos integrantes de las cuadrillas de trabajo, estas actividades se están ejecutando como capacitación de inducción.
Se continuará recepcionando todas esas observaciones realizadas por cada uno de los integrantes de la interventoría con el fin de hacer correcciones adecuadas que nos lleven a mejorar cada día.

Clara Cayón
INGENIERO AMBIENTAL

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

8. ANEXOS

8.1. FORMATO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONTROL DE RESIUDOS SOLIDOS

FECHA	NO RECICABLES		RECICLABES					
	RESIDUOS ORDINARIOS		PAPEL CARTON		PLASTICO		CHATARRA	
	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG	# BOLSAS	KG
FEBRERO	4	3	3	4	2	2	0	0
MARZO	8	4	5	3	3	1	2	2
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								

carrera11 N. ° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Teléfono 310-6404017
Valledupar – Cesar.

A18– PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021
MARZO 2022

LA JAGUA DE IBIRICO
MARZO 2022.

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCION 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 5

2.1. Centros de trabajo 5

2.2. Descripción de las actividades. 5

2.3. Horario de trabajo 5

3. OBJETIVOS 6

3.1. Objetivo general. 6

3.2. Objetivos específicos. 6

4. ALCANCE. 7

5. MARCO NORMATIVO 7

6. DEFINICIONES 8

7. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021. 9

8. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES. 9

9. PLAN DE TRABAJO PAPSO. 10

9.1. Programación de actividades, personal y turnos. 10

9.2. Medidas que deben adoptar los trabajadores al ingresar 11

9.3. Medidas de control durante la jornada laboral 12

9.4. Medidas de control para la salida de la obra. 12

9.5. Elementos de Protección Personal 14

10. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO. 15

10.1. Medidas frente a la persona. 15

10.2. Atención y emergencias. 15

11. CONCLUSIÓN. 16

1. INTRODUCCION

Debido a los hechos de salud pública registrados en los últimos días por el brote del coronavirus conocido como COVID-19 y en donde se ha visto afectada la población colombiana con la implementación del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, imposibilitando el normal funcionamiento de los sectores económicos que se dedican a la construcción a surge la necesidad de Implementar un protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, con el fin de reducir el riesgo de la propagación y transmisión del virus.

El protocolo de bioseguridad para las actividades propias de la obra de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR proyecta orientar a sus trabajadores hacia la implementación de procedimientos de protección para minimizar el contagio del COVID-19, mediante prácticas sanas y seguras durante el desarrollo del seguimiento y control en la jornada laboral.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	NIT. 901.457.886-9
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	3106404017
REPRESENTANTE LEGAL	Gilberto Antonio Ibarra Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Karina Paola Mina Centena
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

2.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	construcción de viviendas de interés social en sitio propio en el municipio la jagua de ibirico, departamento del cesar	V

2.2. Descripción de las actividades.

Consorcio constituido para la construcción del escenario recreo deportivo en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

2.3. Horario de trabajo.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m., para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general.

Continuar implementando los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID – 19).

3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.
- ✓ Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- ✓ Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- ✓ entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

4. ALCANCE.

Es aplicable al proyecto "**proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**", a los trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes en el cumplimiento de las fases en que se encuentra el proyecto y hasta la entrega del mismo.

5. MARCO NORMATIVO.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación delCOVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos hasta el 31 de mayo de 2020".

Que el referido acto administrativo, ordenó a los jefes y representantes legales de centros laborales públicos y privados, adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19, además de impulsar la máxima prestación del servicio a través del teletrabajo, en el entendido que le corresponde a las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias que permitan la adopción de una cultura de prevención y la minimización del riesgo.

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró "el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por término de treinta (30) días" con el fin de adoptar todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.

Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la Circular 021 del 17 de marzo de 2020, se señaló que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", razón por la cual dicho Ministerio previó una serie de mecanismos con el fin de protegerlo y garantizar la actividad productiva.

6. DEFINICIONES.

***Aislamiento*:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellosque no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediantelos mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizarel factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vidade las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se habíavisto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

***Hipoclorito*:** es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad demicroorganismos.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayudaa bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, quepodrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.


Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos comovirus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de laspartículas que se encuentran en el aire.

7. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR EL CONSORCIO VIVEURB 2021.


A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

8. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR,INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.

El CONSORCIO VIVEURB 2021 viene cumpliendo con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19.

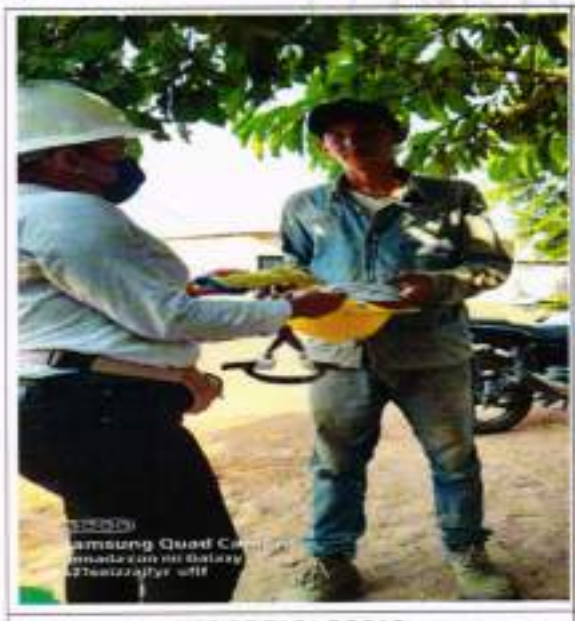

USO DE TAPA BOCAS

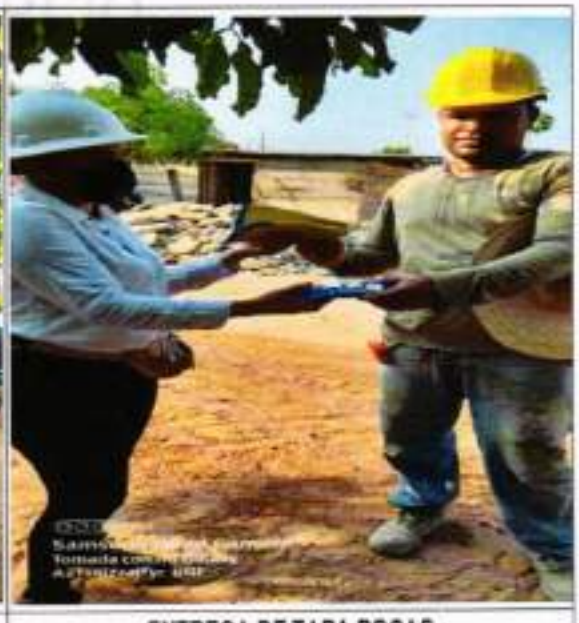

ENTREGA DE TAPA BOCAS

Se están implementando estrategias como de AUTOCUIDADO Y CUIDADO GRUPAL, las cuales se refuerzan en las charlas diarias de seguridad, se vela por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.

9. PLAN DE TRABAJO PAPSO.

El **Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO)** debe entenderse como un programa detallado de estrategias y actividades que estarán sujetas a evaluación por entidades de control. De esta manera es importante planear de manera adecuada las actividades y que estas sean coherentes con el tamaño y complejidad de cada una de las obras en sus diferentes etapas.

De esta manera, el equipo interno debe tener no solo el PAPSO, sino además los soportes de su diseño e implementación, de tal manera que pueda ser validado y justificado.
En la etapa de diseño se deben tener los análisis que justifiquen el actuar y la programación de las actividades allí plasmadas. En la validación, se debe llevar de forma sistemática y continua los soportes de la realización de las actividades, como registros de control, actas y evaluaciones.

9.1. Programación de actividades, personal y turnos.

En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.

Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.



CONTROLES VARIOS




CONTROLES VARIOS

9.2. Medidas que deben adoptar los trabajadores al ingresar.

Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.

Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.

Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.

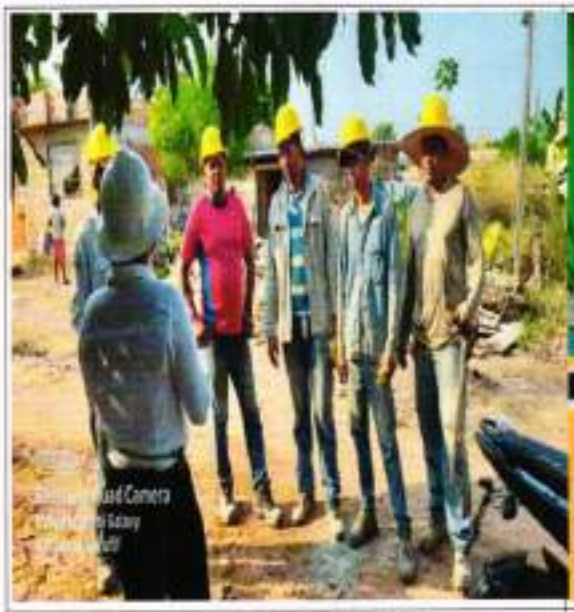

CONTROLES DE INGRESO



CONTROLES DE INGRESO

Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.

Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

9.3. Medidas de control durante la jornada laboral.

Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.

Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior.

Se recomienda hacer tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un distanciamiento minimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19.



CONTROLES DURANTE EL DIA



CONTROLES DURANTE EL DIA

Tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previos y posteriores a la reunión.

Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores o jefes de cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias.

9.4. Medidas de control para la salida de la obra.


El siguiente listado de medidas debe contemplarse durante la salida del personal de obra:

- ✓ Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- ✓ Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- ✓ Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.
- ✓ En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, desinfectarlos antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de limpieza de manos a la subida de las personas.
- ✓ Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el propio trabajador manipule sus elementos.

CONSORCIO



CONTROLES DE SALIDA

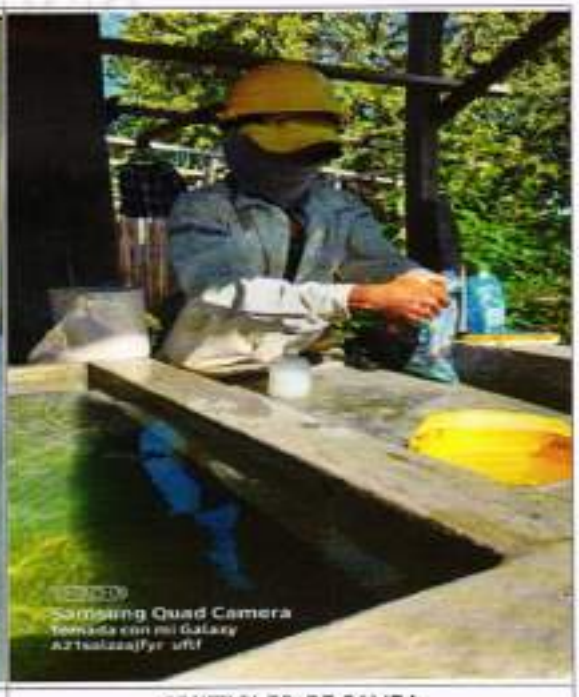

CONTROLES DE SALIDA

- ✓ Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores. Turnos diurnos y nocturnos, si es posible. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta.


9.5. Elementos de Protección Personal.

Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajoy protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.

La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.



USO DE EPP

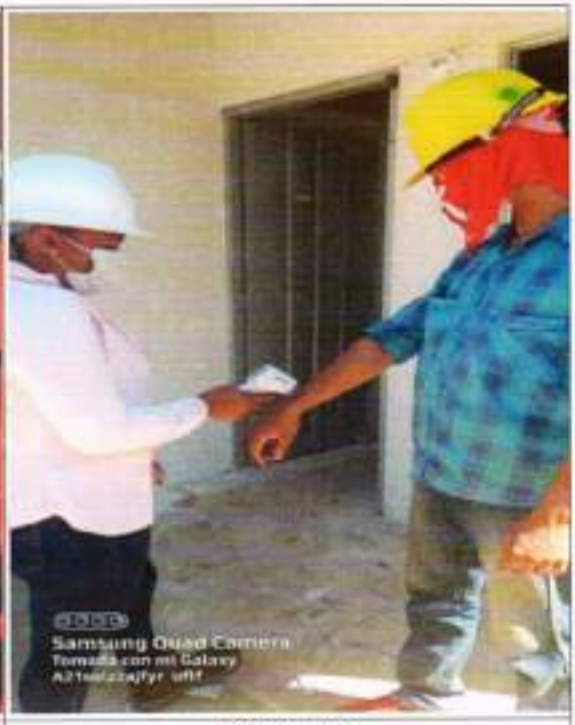

USO DE EPP

Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.

Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.

Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades laborales.

En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

10. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO.

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

10.1. Medidas frente a la persona.

Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.

No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde puedaestar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.

Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.

10.2. Atención y emergencias.

Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.

Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.

Se Realizará verificación de estados de salud de colaboradores por personal médicoidóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). En caso de ser necesario.

11. CONCLUSIÓN.

Para este periodo se continúa con la implementación de todas las medidas de bioseguridad de manera rigurosa por parte de los profesionales de obra, esto con el fin de mantener la obra lo menos vulnerable frente algún contagio del covid-19.

Se continúa con un porcentaje de cero casos de covid 19 detectado.

El consorcio VIVEURB 2021 seguirá estableciendo canales entre los profesionales de campo y los trabajadores con el fin de establecer cada vez más medidas que nos permitan seguir con este firme objetivo.

Se pondrá a disposición todo el recurso humano necesario para hacer conciencia entre los trabajadores de la obra sobre la importancia del autocuidado y las medidas necesarias para contrarrestar la propagación y contagio del virus en este cuarto pico que atraviesa el país.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
