INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 07 al 16 de julio de 2022 - Semana 1

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
1	3,89%	0,00%	0,58%	0,00%
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

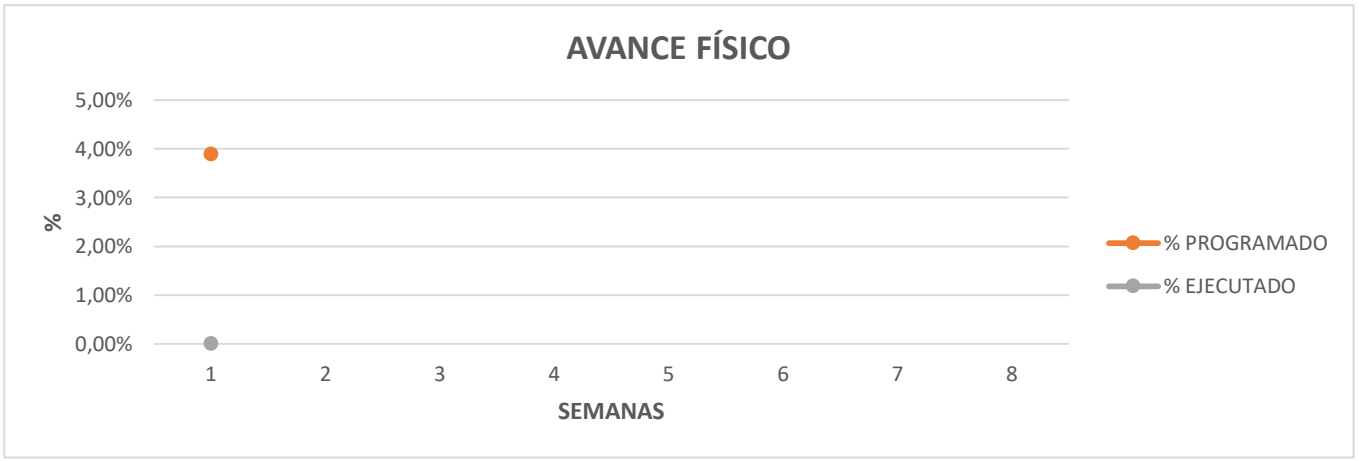

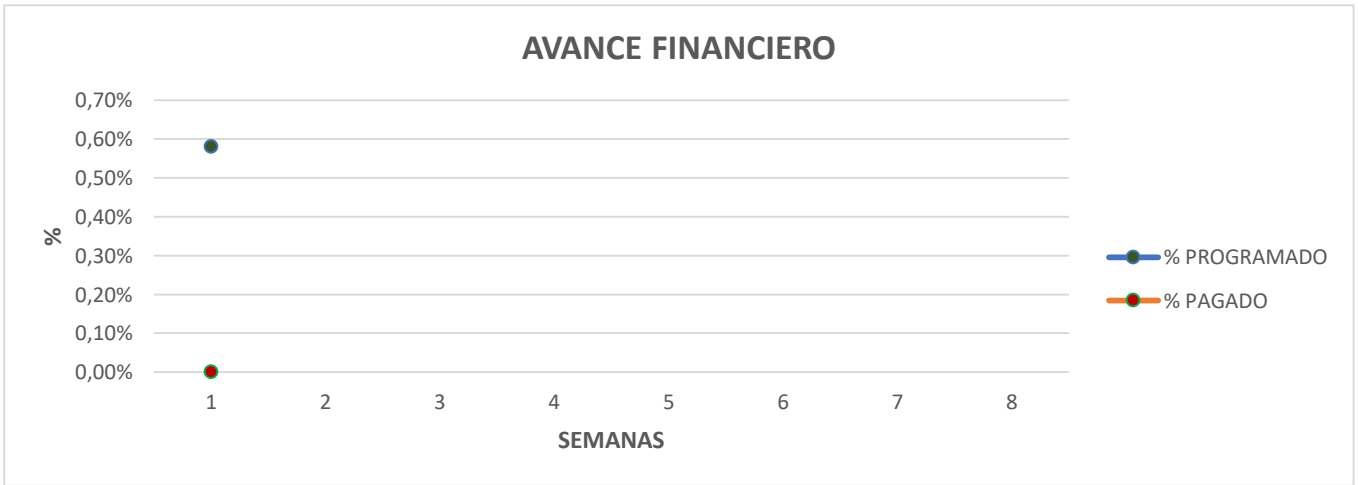

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

07 de julio se firma acta de inicio del contrato No. CTO 459 MT 2022 - Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

Se adjunta la documentación contractual de obra e interventoria en cuanto a los contratos iniciales, actas de inicio, polizas iniciales y actualizadas del proyecto, y planillas de seguridad social.

Se adelanta la revisión de estudios previos, pliego de condiciones, programación, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas e información financiera, tambien revisando si aplican las hojas de vida del personal propuesto y los protocolos de bioseguridad.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

La semana 1 se tomo desde el jueves 7 al 16 de julio con un total de 72 horas laborales.

El estado del tiempo en la categoria nublada tuvo un total de 27 horas, lluvias 27 horas y tiempo seco 18 horas.

Desde inicios del año 2022 en todo el territorio ha estado en temporada de invierno.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

El personal de SST del contratista esta trabajando en el plan de calidad, programa de bioseguridad, para la revisión y aprobación por parte de la interventoria.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

En la primera semana la inteventoria ha tenido un papel importante en el aspecto técnino, administrativo, legal y ambiental. de esta manera generando un avance en los parámentros del contrato para poder obtener los resultados concretos que guíen al cumplimiento de los objetivos de este.

Es importante que cada persona dentro del contrato tenga pleno conocimiento del objeto de esté, para la correcta ejecución de la obra.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
