INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 16 al 20 de agosto de 2022 - Semana 6

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
1	3,89%	0,00%	0,58%	0,00%
2	7,78%	0,00%	2,83%	0,00%
3	11,67%	0,00%	3,15%	0,00%
4	15,56%	0,00%	3,92%	0,00%
5	19,44%	0,00%	4,99%	0,00%
6	23,33%	0,00%	5,99%	0,00%
7				
8				

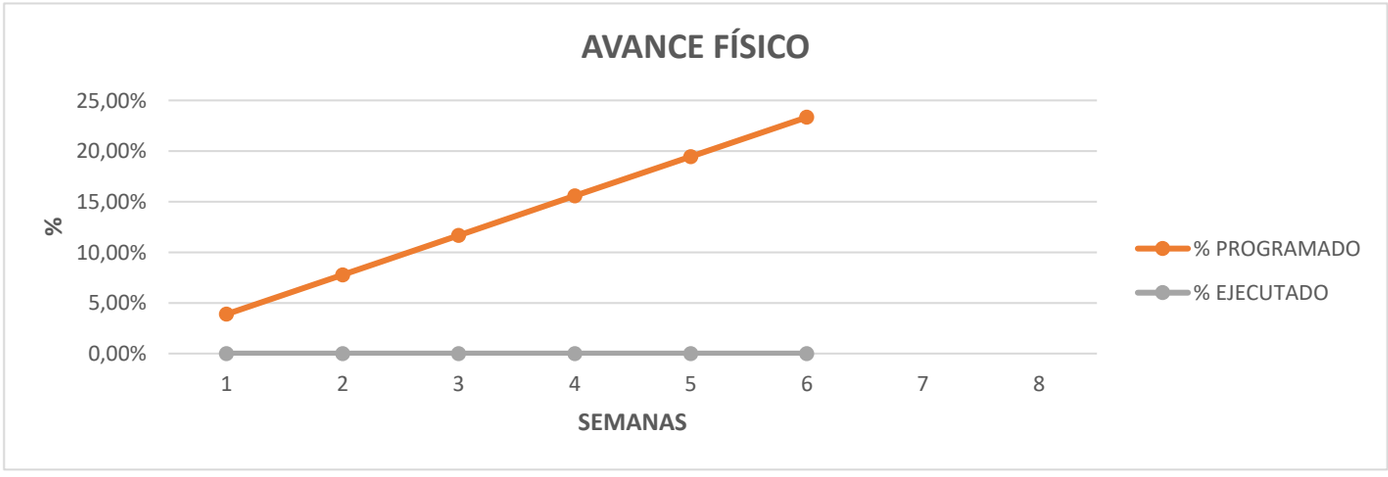

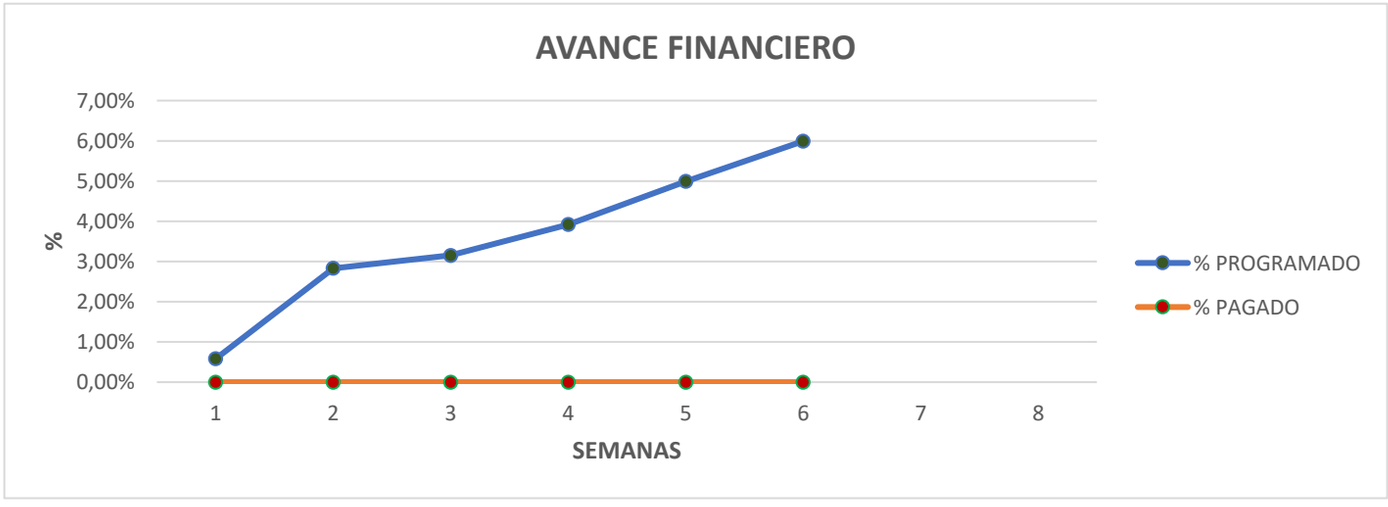

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se actualizarón las polizas del contrato de obra y fueron subidas a la plataforma Secop II
Se actualizarón las polizas del contrato de interventoria y fueron subidas a la plataforma Secop II
El contratista de obra ha manifestado que se sigue trabajando en los siguientes documentos; balance financiero,
protocolos de bioseguridad, plan de calidad, y programación inicial.
Se pasó un oficio a ENEL CODENSA para que avalen que tipo de transformador esta autorizado para este tipo de proyectos, para saber su especificación.
Se solicito una cotización de un transformados pedestal malla 15KV 75 KVA, con accesorios DPS a la empresa
nacional de transformadores tesla.
Se tuvo que empezar a modificar el item de tramites codensa en cuanto a solicitud de factibilidad, radicación del
proyecto y aprobación por parte de ENEL CODENSA.
Se dejo instalada la valla en sitio del contrato CTO 440 MT 2022.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 16 horas, lluvioso 16 horas y tiempo seco 8 horas.
Las lluvias estan más arriba de lo normal.
En la semana 6 se tuvo un día festivo, 15 de agosto.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
El plan de calidad y programa de bioseguridad sigue en ejecución ya que se debia completar y ser más especificos
en algunas actividades.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
No se ha trabajado en obra.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
Para el día martes 23 de agosto el contratista debe presentar el balance financiero final al supervisor para realizar
la revisión pertinente.
El avance fisico y financiero sigue en 0,00%, no se a podido aprobar el plan de calidad y bioseguridad.
Se comento que se podia empezar a ejecutar las divisiones de los baños por parte del contratista de obra.
Por otro lado, el contratista manifesto que se esta ejecutando el diseño de la caseta para las bombas y equipos de
presión de agua potable.
En lo referente al cambio de residente de interventoría, en oficio SI-954 del 17 de agosto de 2022, donde se manifiesta que las certificaciones de experiencia remitidas no corresponden a lo requerido. Donde la experiencia exigida por la administración municipal: “experiencia laboral acreditada como residente de interventoría de obras en dos (02) contratos para la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura". Se anexo la experiencia solicitada, se adjuntó y se envió tanto al correo de la supervisión como también se entregó en la alcaldía con radicado No 5912 del 29 de agosto de 2022.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Valla en sitio del contrato CTO 440 MT 2022.
