INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 22 al 27 de agosto de 2022 - Semana 7

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
1	3,89%	0,00%	0,58%	0,00%
2	7,78%	0,00%	2,83%	0,00%
3	11,67%	0,00%	3,15%	0,00%
4	15,56%	0,00%	3,92%	0,00%
5	19,44%	0,00%	4,99%	0,00%
6	23,33%	0,00%	5,99%	0,00%
7	27,22%	0,00%	6,70%	0,00%
8				

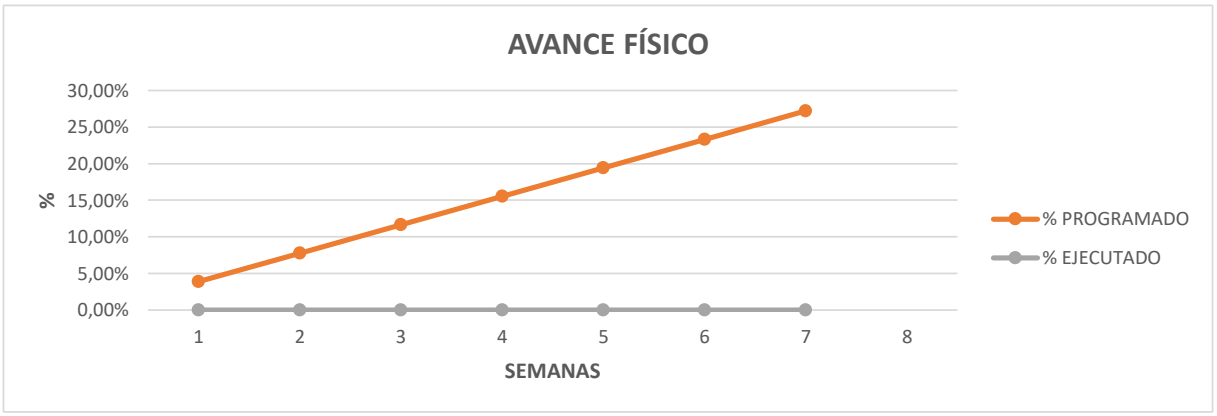

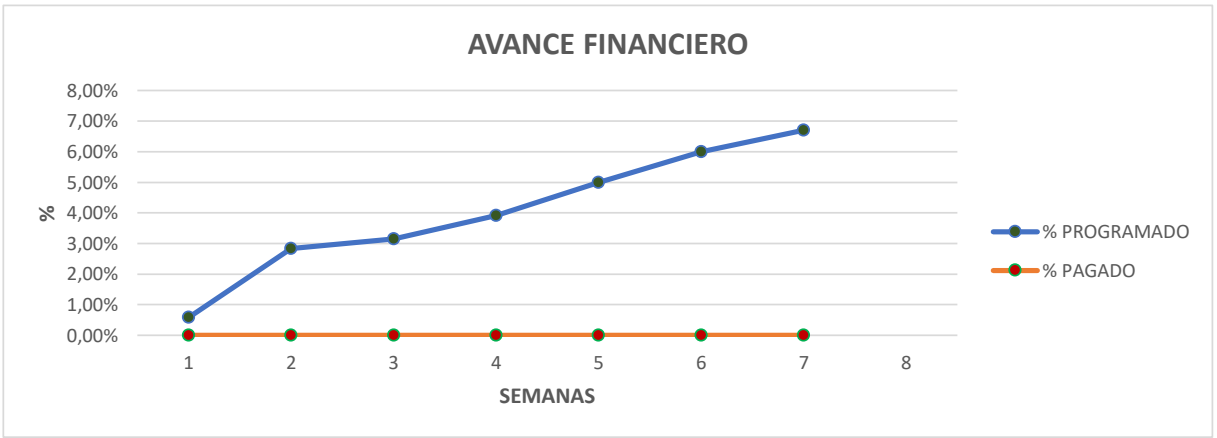

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

El contratista de obra ha manifestado que se sigue trabajando en el balance financiero, ya que se están incluyendo nuevos ítems, ya que en el ICCU no se encuentran contemplados, por lo tanto se ha estado buscando tres cotizaciones por cada material, actualmente los precios han estado subiendo constantemente, en consecuencia a esto los distrubuidores no han dado cotizaciones por que no pueden sostener el precio.
Tambien el balance financiero sigue en ejecución por que se tuvo que verificar primero las cantidades contratadas con las cantidades que realmente se requieren ejecutar.

Se presento el balance financiero incompleto, contratista se comprometio a entregarlo el día martes 30 de agosto.
Se sigue trabajando en la ejecución del diseño de la caseta para bombas y equipos de presión de agua potable.

Se averiguo y fue informado que el dato de cual transformador esta autoizado para este proyecto lo define el ingeniero de codensa que este asignado en este proyecto, tambien para la radicación del mismo para que sea revisado y pueda ser avalado.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria lluvioso tuvo un total de 29 horas, nublado 12 horas y tiempo seco 5 horas.

Las lluvias estan más arriba de lo normal.

El informe se la semana 7 se tomo desde el 22 al 31 de agosto, con un total de 72 horas laborales.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

El plan de calidad ya se encuentra en un 80 % de ejecución para poder ser aprobado, aún faltan especificar el control registros del plan.

El programa de bioseguridad se encuentra en un 60 %, falta por concluir la información de EPP y mantenimiento de este y elaborar un capítulo de las medidas de control al ingresar a la obra, durante la jornada laboral y salida de obra.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra.

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

El avance fisico y financiero sigue en 0,00%, no se a podido aprobar el plan de calidad y bioseguridad.

No se ha empezado a ejecutar las divisiones de los baños por parte del contratista de obra.

Sigue en ejecución el diseño de la caseta para las bombas y equipos de presión de agua potable.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
