

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL EDIFICIO "EDIFICIO SALA AMBIENTAL"**	**130 días**	**jue 12/01/23**	**mié 12/07/23**
1	**1. GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES**	**112 días**	**jue 12/01/23**	**vie 16/06/23**
2	**1.1 PRELIMINARES**	**23 días**	**jue 12/01/23**	**lun 13/02/23**
3	**1.1.1 DESCAPOTE**	**6 días**	**jue 19/01/23**	**jue 26/01/23**
4	1.1.1.1 DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	6 días	jue 19/01/23	jue 26/01/23
5	**1.1.2 SOBREACARREOS, RETIROS**	**12 días**	**vie 27/01/23**	**lun 13/02/23**
6	1.1.2.1 EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	6 días	vie 27/01/23	vie 03/02/23
7	1.1.2.2 RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	6 días	vie 27/01/23	vie 03/02/23
8	1.1.2.3 SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	6 días	lun 06/02/23	lun 13/02/23
9	1.1.2.4 SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	6 días	lun 06/02/23	lun 13/02/23
10	**1.4.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**5 días**	**jue 12/01/23**	**mié 18/01/23**
11	1.4.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	5 días	jue 12/01/23	mié 18/01/23
12	**1.2 EXCAVACIONES**	**15 días**	**jue 19/01/23**	**mié 08/02/23**
13	**1.2.1 MANUALES**	**15 días**	**jue 19/01/23**	**mié 08/02/23**
14	1.2.1.1 EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	15 días	jue 19/01/23	mié 08/02/23
15	**1.3 CIMENTACION**	**18 días**	**jue 09/02/23**	**lun 06/03/23**
16	**1.3.1 CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA**	**4 días**	**jue 09/02/23**	**mar 14/02/23**
17	1.3.1.1 CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	4 días	jue 09/02/23	mar 14/02/23
18	**1.3.2 CONCRETO ZAPATAS**	**6 días**	**mié 15/02/23**	**mié 22/02/23**
19	1.3.2.1 CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	6 días	mié 15/02/23	mié 22/02/23
20	**1.3.3 CONCRETOS VIGAS Y PISOS**	**8 días**	**jue 23/02/23**	**lun 06/03/23**
21	1.3.3.1 CONCRETO VIGA CIMENTA 34,5MPa(4000 PSI) Premezclad	8 días	jue 23/02/23	lun 06/03/23

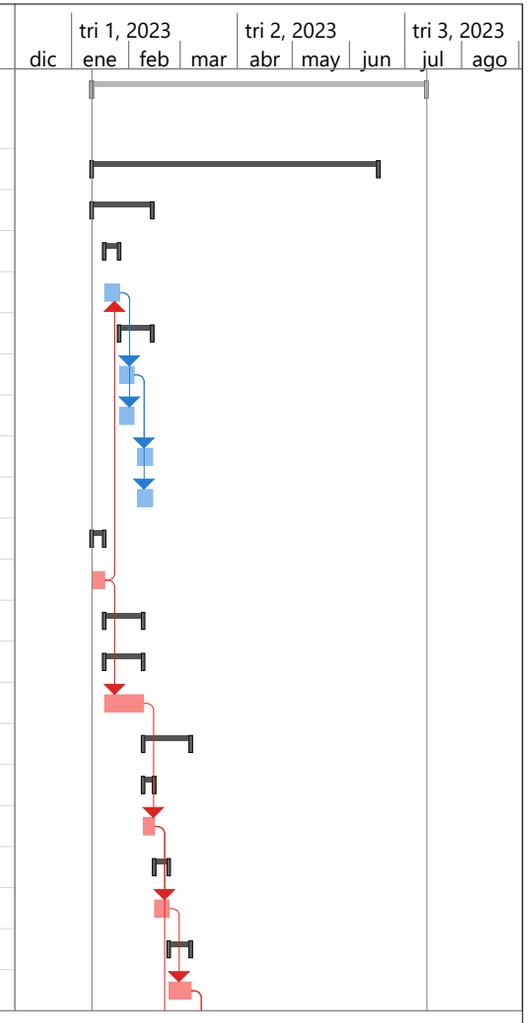

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22	**1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**7 días**	**mar 07/03/23**	**mié 15/03/23**
23	**1.4.1 PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS**	**7 días**	**mar 07/03/23**	**mié 15/03/23**
24	1.4.1.1 PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35*50	7 días	mar 07/03/23	mié 15/03/23
25	**1.5 ESTRUCTURAS METALICAS**	**30 días**	**mié 15/02/23**	**mar 28/03/23**
26	**1.5.1 ACERO ESTRUCTURAL**	**30 días**	**mié 15/02/23**	**mar 28/03/23**
27	1.5.1.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	30 días	mié 15/02/23	mar 28/03/23
28	**1.6 ESTRUCTURAS EN MADERA**	**35 días**	**jue 23/03/23**	**mié 10/05/23**
29	**1.6.1 ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA**	**35 días**	**jue 23/03/23**	**mié 10/05/23**
30	1.6.2 AULA AMBIENTAL - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA + CUBIERTA SEGÚN DETALLES - NO INCLUYE TEJA	35 días	jue 23/03/23	mié 10/05/23
31	**1.7 MAMPOSTERIA**	**20 días**	**mar 07/03/23**	**lun 03/04/23**
32	**1.7.1 MUROS**	**20 días**	**mar 07/03/23**	**lun 03/04/23**
33	1.7.1.1 BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4	20 días	mar 07/03/23	lun 03/04/23
34	**1.8 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS**	**15 días**	**jue 16/03/23**	**mié 05/04/23**
35	**18.1 REDES LLUVIAS**	**15 días**	**jue 16/03/23**	**mié 05/04/23**
36	1.8.1.1 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	15 días	jue 16/03/23	mié 05/04/23
37	1.8.1.2 CODO PRESION EN PVC D=3/4"	15 días	jue 16/03/23	mié 05/04/23
38	1.8.1.3 TEE PRESION EN PVC D=3/4"	15 días	jue 16/03/23	mié 05/04/23
39	1.8.1.4 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	15 días	jue 16/03/23	mié 05/04/23
40	1.8.1.5 CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	15 días	jue 16/03/23	mié 05/04/23
41	**1.9 CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**15 días**	**jue 11/05/23**	**mié 31/05/23**
42	**19.1 VENTANAS**	**15 días**	**jue 11/05/23**	**mié 31/05/23**
43	1.9.1.1 VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 3890 BATIENTE VIDRIO LAMINADO 4+4	15 días	jue 11/05/23	mié 31/05/23

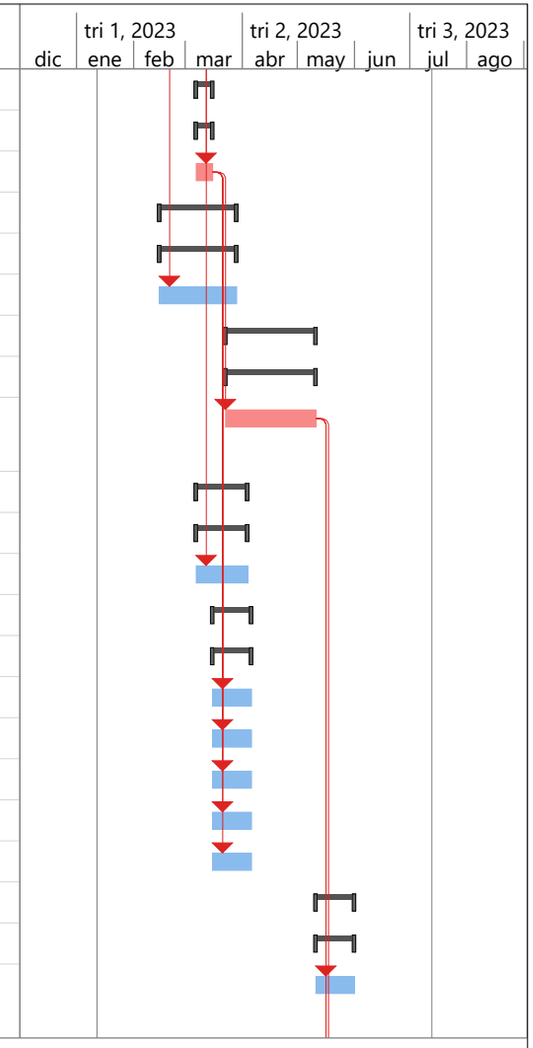

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
44	**1.10 PINTURA**	**14 días**	**jue 11/05/23**	**mar 30/05/23**
45	**1.10.1 IMPERMEABILIZACIONES**	**8 días**	**jue 11/05/23**	**lun 22/05/23**
46	1.10.1.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	8 días	jue 11/05/23	lun 22/05/23
47	**1.11.1 PINTURA, MARMOLINA,ESTUCO**	**3 días**	**vie 26/05/23**	**mar 30/05/23**
48	1.11.1.1 ESTUCO TIPO VENECIANO PERLATTO CON EFECTO PERLESCENTE	3 días	vie 26/05/23	mar 30/05/23
49	**1.12 ACABADOS ESPECIALES**	**1 día**	**jue 18/05/23**	**jue 18/05/23**
50	**1.12.1 MUROS**	**1 día**	**jue 18/05/23**	**jue 18/05/23**
51	1.12.1.1 MURO DRYWALL UNA CARA, CAL.6 mm inc Pintura	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23
52	**1.13 RED CONTRA INCENDIOS - Y GAS**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**jue 01/06/23**
53	**1.13.1 RED CONTRAINCENCIO**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**jue 01/06/23**
54	1.13.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXITONTRES CLASE ABC	2 días	mié 31/05/23	jue 01/06/23
55	**1.14 REDES E INSTALACIONES MECÁNICAS**	**15 días**	**lun 29/05/23**	**vie 16/06/23**
56	**1.14.1 INSTALACIONES MECÁNICAS**	**15 días**	**lun 29/05/23**	**vie 16/06/23**
57	1.14.1.1 Suministro e instalacion de Equipo de aire acondicionado tipo mini split capacidad de enfriamiento nominal de 24,000 Btu/hr (2,0TR), R-410a. 220 VAC. PH-1, Tecnologia INVERTER.	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23
58	1.14.1.2 1Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire axial tipo muro de 150 cfm 120 VAC -HAE-150	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23
59	1.14.1.3 Suministro e instalacion Tuberia de cobre rigida tipo L de 3/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23

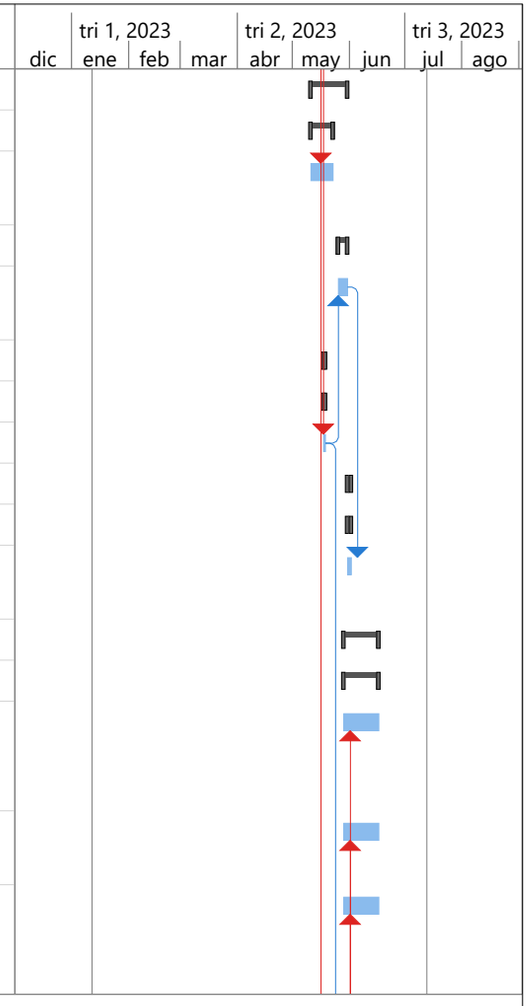

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
60	1.14.1.4 Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 5/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23
61	**1.15 CARPINTERIA MADERA**	**15 días**	**lun 29/05/23**	**vie 16/06/23**
62	**1.15.1 PUERTAS**	**15 días**	**lun 29/05/23**	**vie 16/06/23**
63	1.15.1.1 PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO. CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23
64	1.15.1.2 PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCOOCULTO.ACABADO EXTERIOR EN TABLEROCONTRACHAPADO DE MADERA O PLYWOOD,REFERENCIA"DUNA"DE PELIKANO O SIMILAR.CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL,DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFELCOLORACERO ACABADO	15 días	lun 29/05/23	vie 16/06/23
65	**1.16 CUBIERTAS**	**12 días**	**jue 11/05/23**	**vie 26/05/23**
66	**1.16.1 BAJANTES, CANALES Y SIFONES**	**12 días**	**jue 11/05/23**	**vie 26/05/23**
67	1.16.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD = 1,20 METROS	4 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
68	1.16.1.2 Caja tragante para evacuación de aguas con doble espigo de 4" en lamina cal 20, acabado y soldadura iguales a canal del item anterior	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
69	1.16.1.3 Cubierta Teja Standing Seam Roof Ø1-1/2" cal 26 con Poliestireno 38MM : En lámina galvanizada y/o Aluzinc, calibre 26, pintura poliéster estándar blanco al exterior y al interior	8 días	mié 17/05/23	vie 26/05/23
70	**2. GRUPO OBRAS ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO**	**39 días**	**vie 19/05/23**	**mié 12/07/23**

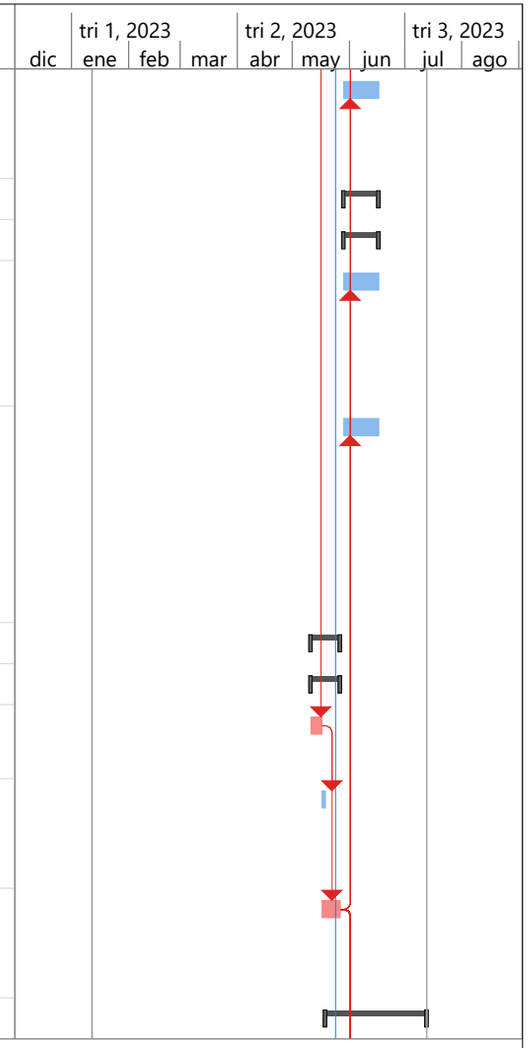

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
71	**RED ELECTRICAS**	**39 días**	**vie 19/05/23**	**mié 12/07/23**
72	**2.1.1 SALIDAS ELÉCTRICAS**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
73	2.1.1.1 SALIDA DE ILUM EMERGEN INC.TUB EMT 1/2 Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
74	2.1.1.2 SALIDA DE ILUM EVACUAC INC.TUB EMT 1/2” Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
75	2.1.1.3 SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2” y ACC (SIN LUMINARIA)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
76	2.1.1.4 SALIDA DE ILUMIN PANEL LED 60x60 CM INC TUB EMT 3/4” y ACC (SIN LUMINARIA)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
77	2.1.1.5 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB EMT3/4" Y COND 2N12+12	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
78	2.1.1.6 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
79	2.1.1.7 SALIDA INTERRUPTOR CONMULTABLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
80	2.1.1.8 SALIDA TOMACORRI MONOFASIC110V INC, TUB 1/2 EMT	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
81	2.1.1.9 SALIDA PARA TOMA GFCI	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
82	2.1.1.10 SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
83	2.1.1.11 SALIDA TOMACORRI BIFA 220V H=1.4M INC.TUB1/2 Y AC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
84	2.1.1.12 SALIDA TOMACORRIEN TRIF H=1.4M INC.TUB 3/4 Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
85	2.1.1.13 SALIDA SENSOR MOVIMIENTO INC. SEN. TUBE 3/4, COND 2N12+12 Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
86	**2.1.2 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**	**5 días**	**lun 03/07/23**	**vie 07/07/23**

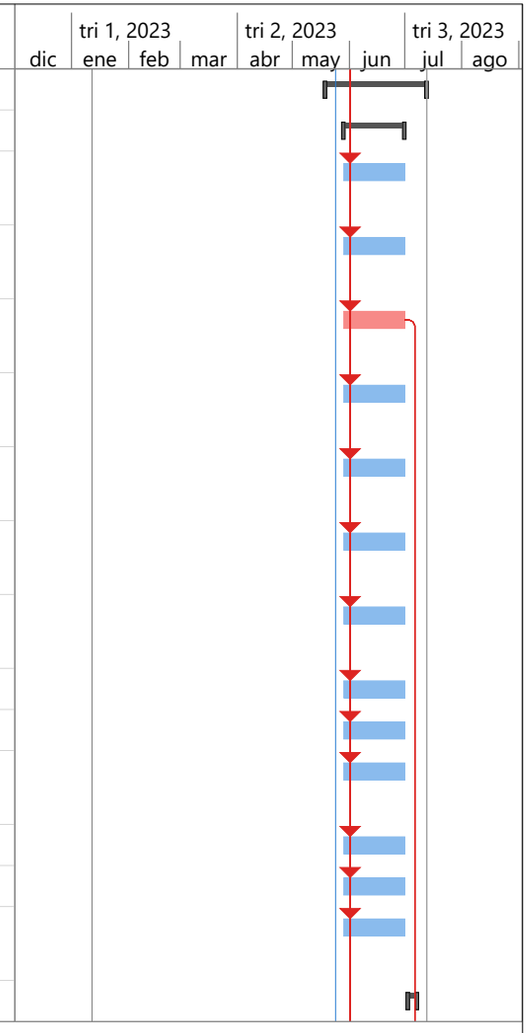

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
87	2.1.2.1 SUMIN EINST LAMPARA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W	5 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
88	2.1.2.2 SUMIN EINST LUMINARIA AVISO EVACUACIÓN	5 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
89	2.1.2.3 LAMPARA LED TIPO BALA DE 20W	5 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
90	2.1.2.4 SUMIN E INST LUMINARIA SPOT LED 20 W	5 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
91	2.1.2.5 SUMIN E INST PANEL LED 60X60 CM	5 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
92	**2.1.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
93	2.1.3.1 SUMIN E INST CANALIZACIÓN PERIMETRAL 12X5 CM CON DIVISIÓN SPT CABLE NO. 10 DESNUDO Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
94	2.1.3.2 CANALIZACION PARA 1 DUCTO PVC 2"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
95	2.1.3.3 SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
96	2.1.3.4 TUBERIA EMT 3/4"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
97	**2.1.4 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
98	2.1.4.1 ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T Ducto PVC 1"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
99	2.1.4.2 ACOMETIDA PARCIAL 4No 10 + 10T	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
100	2.1.4.3 ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
101	**2.1.5 TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
102	2.1.5.1 SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TBP-AULA AMBIENTAL DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
103	2.1.5.2 TABLERO PARCIAL12 CIRCUITOS.Inc totalizador,interr	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
104	2.1.5.3 TABLERO PARCIAL18CIRCUITOS,inc totalizador,interru	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
105	2.1.5.4 SUM EINST BREAKER INDUSTRIAL 3x50A 25KA	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
106	2.1.5.5 SUM EINST BREAKER INDUSTRIAL 3x30A 25KA	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
107	**2.1.8 EQUIPOS**	**25 días**	**vie 19/05/23**	**jue 22/06/23**
108	2.1.8.1 SUMIN E INST UPS 3 KVA, INC COND. CONEXIONADO	25 días	vie 19/05/23	jue 22/06/23

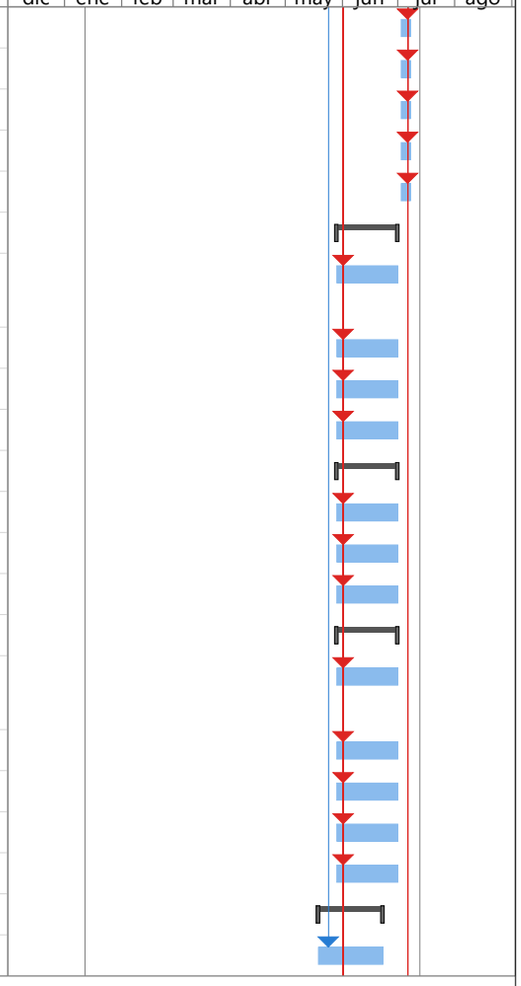

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
109	**2.1.9 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO**	**33 días**	**lun 29/05/23**	**mié 12/07/23**
110	**2.1.9.1 EQUIPOS ACTIVOS**	**5 días**	**jue 06/07/23**	**mié 12/07/23**
111	2.1.9.1.2 SWITCH POE+ 24 PUERTOS, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6, ADMINISTRABLE	5 días	jue 06/07/23	mié 12/07/23
112	2.1.9.1.3 SUMIN E INST CÁMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080 INC ACC	5 días	jue 06/07/23	mié 12/07/23
113	2.1.9.1.4 SUMIN E INST CÁMARA TIPO MINIDOMO 2 MP - 1080 INC ACC	5 días	jue 06/07/23	mié 12/07/23
114	**2.1.9.2 EQUIPOS PASIVOS**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
115	2.1.9.2.1 SUMIN E ISNT GABINETE RACK DE PARED CON 19 UR INC ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
116	2.1.9.2.2 SUMIN E INST ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
117	2.1.9.2.3 SUMIN E INST PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
118	2.1.9.2.4 SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
119	2.1.9.2.5 SUMIN E INST BANDEJA PORTAEQUIPOS INC ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
120	2.1.9.2.6 SUMIN E INST KIT FAN OUT SC/LC FIBRA MUILTIMODO OM4 INC ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
121	2.1.9.2.7 SUMIN E INST CONECTORES LC PARA FIBRA MULTIMODO OM4	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
122	2.1.9.2.8 SUMIN E INST PDU VERTICAL PARA RACK 12 RECEPTACULOS	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
123	2.1.9.2.9 SUMIN E INST PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/LC (PAR)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23

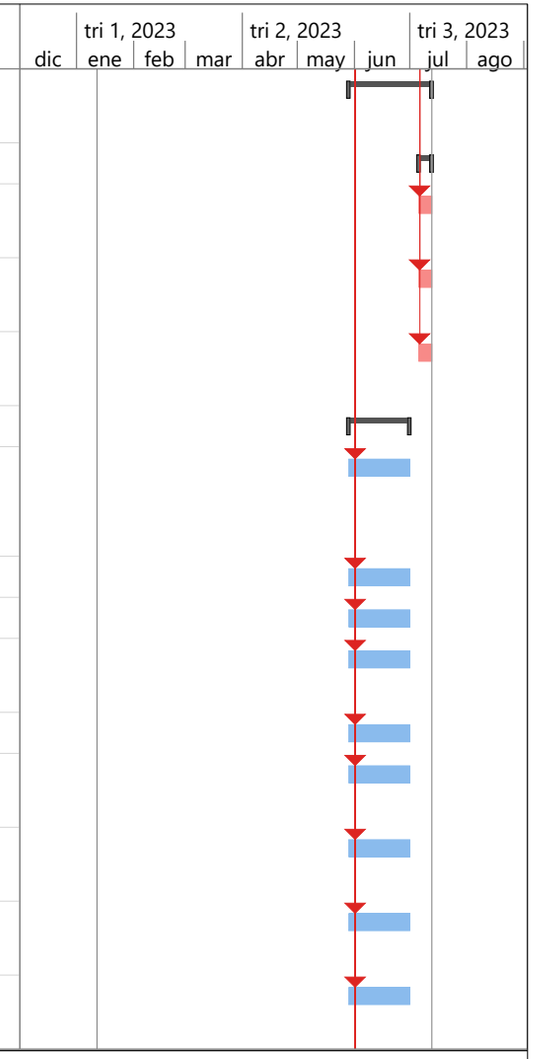

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
124	2.1.9.2.10 CERTIFICACIÓN DE CONECTORIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (POR PAR)	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
125	2.1.9.2.11 SUMIN E INST PARLANTE PARA TECHO DE 30, INC ACC DE POTENCIA Y CONEXIÓN	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
126	**2.1.9.3 SALIDAS DE COMUNICACIONES**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
127	2.1.9.3.1 SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT 3/4" INC ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
128	2.1.9.3.2 SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A EN CANALETA 12X5CM	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
129	2.1.9.3.3 SALIDA DE SONIDO INC TUB EMT 3/4" Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
130	2.1.9.3.4 SALIDA HDMI INC TUB EMT 1 1/4" Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
131	2.1.9.3.5 SALIDA DE TV INC TUB EMT 3/4" Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
132	2.1.9.3.6 SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 3FT	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
133	**2.1.9.4 CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**
134	2.1.9.4.1 TUBERIA EMT 2"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
135	2.1.9.4.2 TUBERIA EMT 1 1/2"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
136	2.1.9.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
137	2.1.9.4.4 TUBERIA EMT 3/4"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
138	2.1.9.4.5 CABLE UTP CAT 6A LSZH.	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
139	2.1.9.4.6 CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
140	2.1.9.4.7 CABLE COAXIAL RG6, INC ACC DERIVACION	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
141	2.1.9.4.8 CABLE SONIDO 2X16 AWG DESOXIGENADO	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
142	**2.1.9.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**	**25 días**	**lun 29/05/23**	**vie 30/06/23**

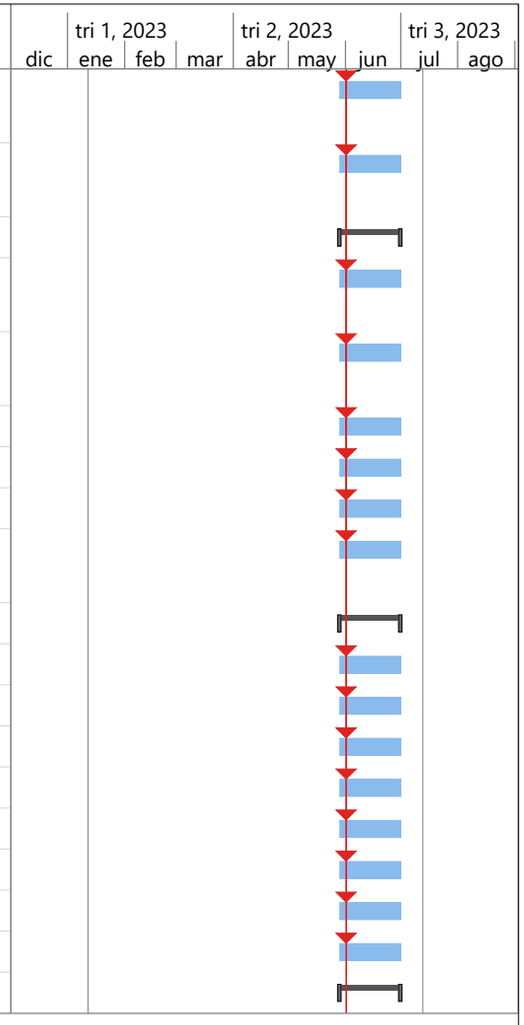

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
143	2.1.9.5.1 TUBERIA EMT 3/4"	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
144	2.1.9.5.2 CABLE ANTIFLAMA CERTIFICADO FPLR 1X2X16 AWG.	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
145	2.1.9.5.3 SUMIN E INST SALIDA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA INC SENSOR Y ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
146	2.1.9.5.4 SUMIN E INST ESTACIÓN MANUAL INC ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
147	2.1.9.5.5 SUMIN E INST LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA INC ACC	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23
148	2.1.9.5.6 SUMIN E ISNT FUENTE DE ALIMENTACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA / SIRENA CON 2 BATERÍAS DE 12V 7AMP - BATERÍA	25 días	lun 29/05/23	vie 30/06/23

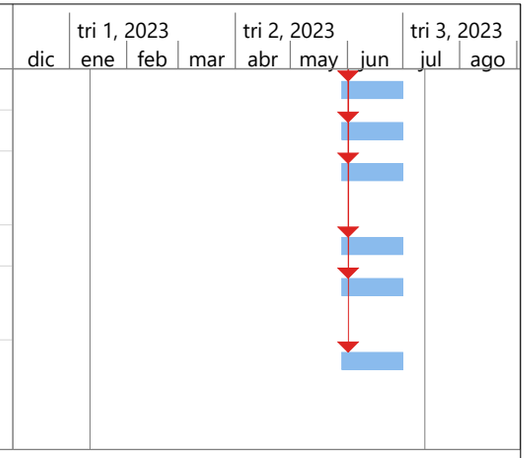

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
