


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL "SENDERO TIPO 4"**	**66 días**	**vie 07/04/23**	**vie 07/07/23**
1		**GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES**	**66 días**	**vie 07/04/23**	**vie 07/07/23**
2		**1.1 PRELIMINARES**	**19 días**	**vie 07/04/23**	**mié 03/05/23**
3		**1.1.1 DESCAPOTE**	**3 días**	**mié 12/04/23**	**vie 14/04/23**
4		1.1.1.1 DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
5		**1.1.2 SOBREACARREOS, RETIROS**	**8 días**	**lun 24/04/23**	**mié 03/05/23**
6		1.1.2.1 EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	4 días	vie 28/04/23	mié 03/05/23
7		1.1.2.2 RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	4 días	vie 28/04/23	mié 03/05/23
8		1.1.2.3 SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23
9		1.1.2.4 SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23
10		**1.1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**3 días**	**vie 07/04/23**	**mar 11/04/23**
11		1.1.3.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	3 días	vie 07/04/23	mar 11/04/23
12		**1.2 EXCAVACIONES**	**11 días**	**vie 07/04/23**	**vie 21/04/23**
13		**1.2.1 MANUALES**	1 día	vie 07/04/23	vie 07/04/23
14		1.2.1.1 EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
15		**1.3 CIMENTACION**	**8 días**	**lun 24/04/23**	**mié 03/05/23**
16		**1.3.1 CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA**	**8 días**	**lun 24/04/23**	**mié 03/05/23**
17		1.3.1.1 CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	3 días	lun 24/04/23	mié 26/04/23
18		1.3.1.2 CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	5 días	jue 27/04/23	mié 03/05/23
19		**1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**7 días**	**jue 04/05/23**	**vie 12/05/23**
20		**1.4.1 PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS**	**7 días**	**jue 04/05/23**	**vie 12/05/23**
21		1.4.1 PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35*50	5 días	jue 04/05/23	mié 10/05/23

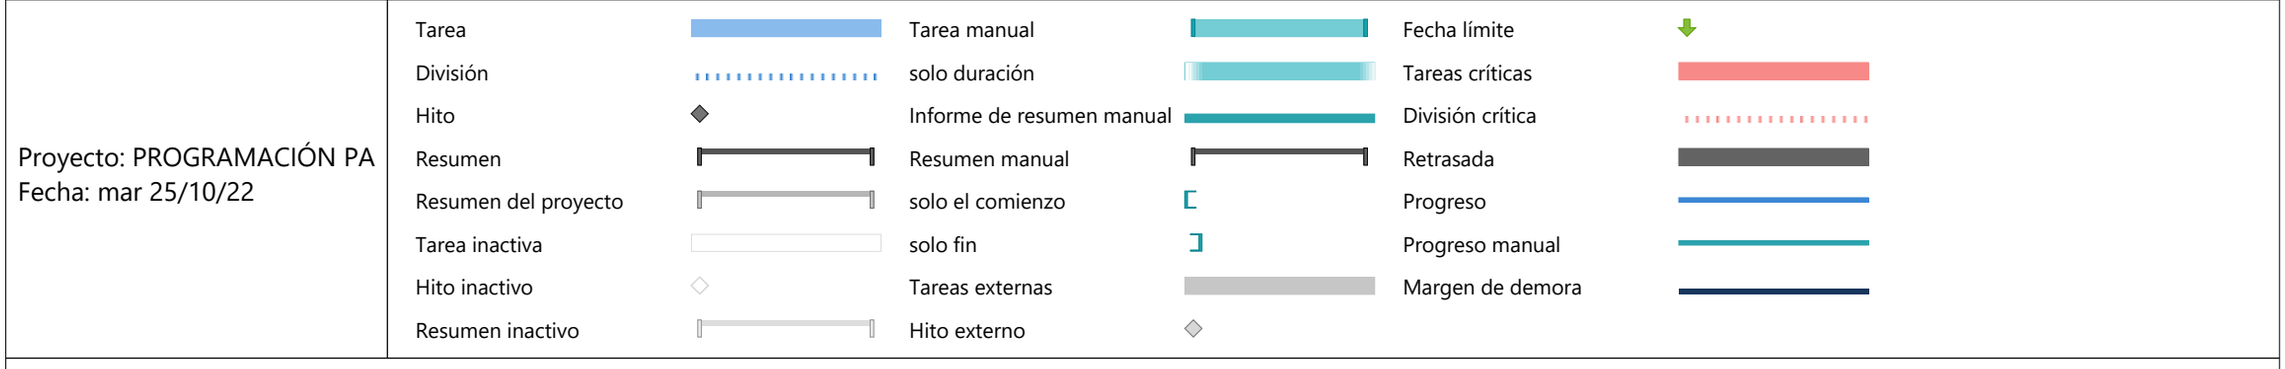


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		1.4.1.1 MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M - 0.40X0.40M), TIPO SIKAGROUT®-212 O SIMILAR. E=0.03M	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23
23		**1.5 ESTRUCTURAS METALICAS**	**30 días**	**jue 27/04/23**	**mié 07/06/23**
24		**1.5 ACERO ESTRUCTURAL**	**30 días**	**jue 27/04/23**	**mié 07/06/23**
25		1.5.1.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	10 días	jue 27/04/23	mié 10/05/23
26		1.5.1.2 ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin	20 días	jue 11/05/23	mié 07/06/23
27		**1.6 PINTURA**	**4 días**	**mar 04/07/23**	**vie 07/07/23**
28		**1.6.1 IMPERMEABILIZACIONES**	**4 días**	**mar 04/07/23**	**vie 07/07/23**
29		1.6.1.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	4 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23
30		**1.7 ESTRUCTURAS MADERAS INMUNIZADAS**	**18 días**	**jue 08/06/23**	**lun 03/07/23**
31		**1.7.1 MADERAS INMUNIZADAS ESTRUCTURALES**	**18 días**	**jue 08/06/23**	**lun 03/07/23**
32		1.7.1.1 SENDEROS TIPO 4 PUENTE - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA	18 días	jue 08/06/23	lun 03/07/23

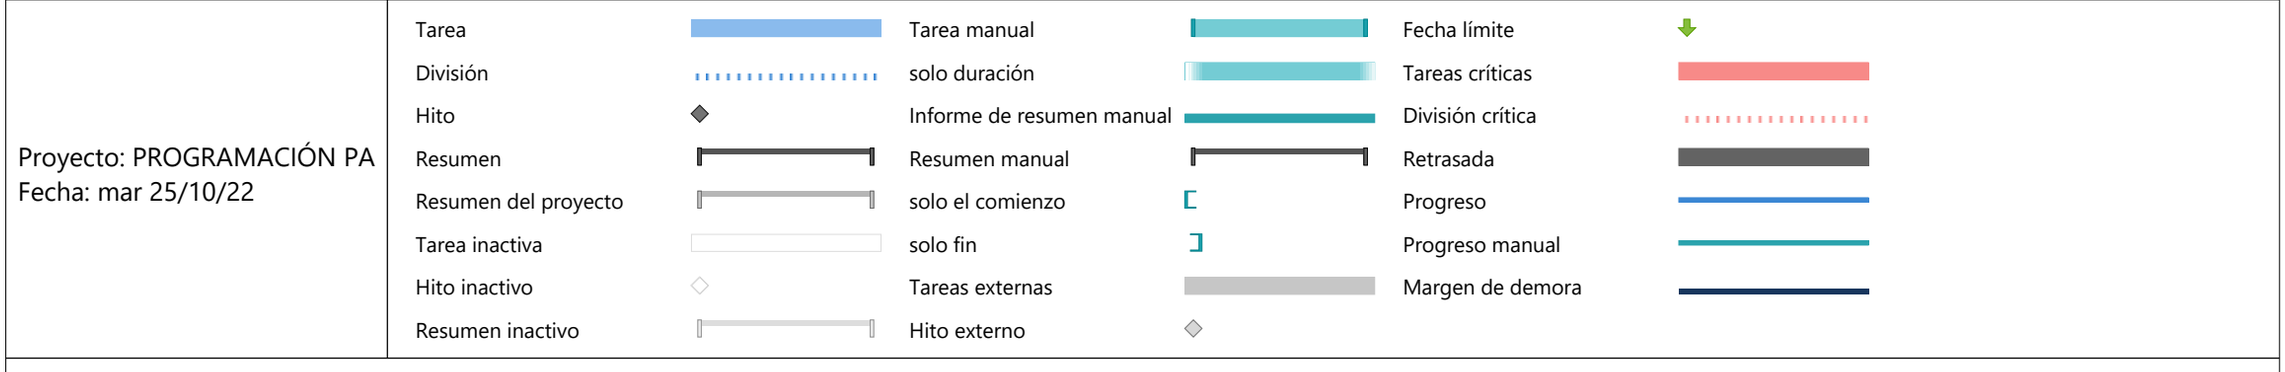

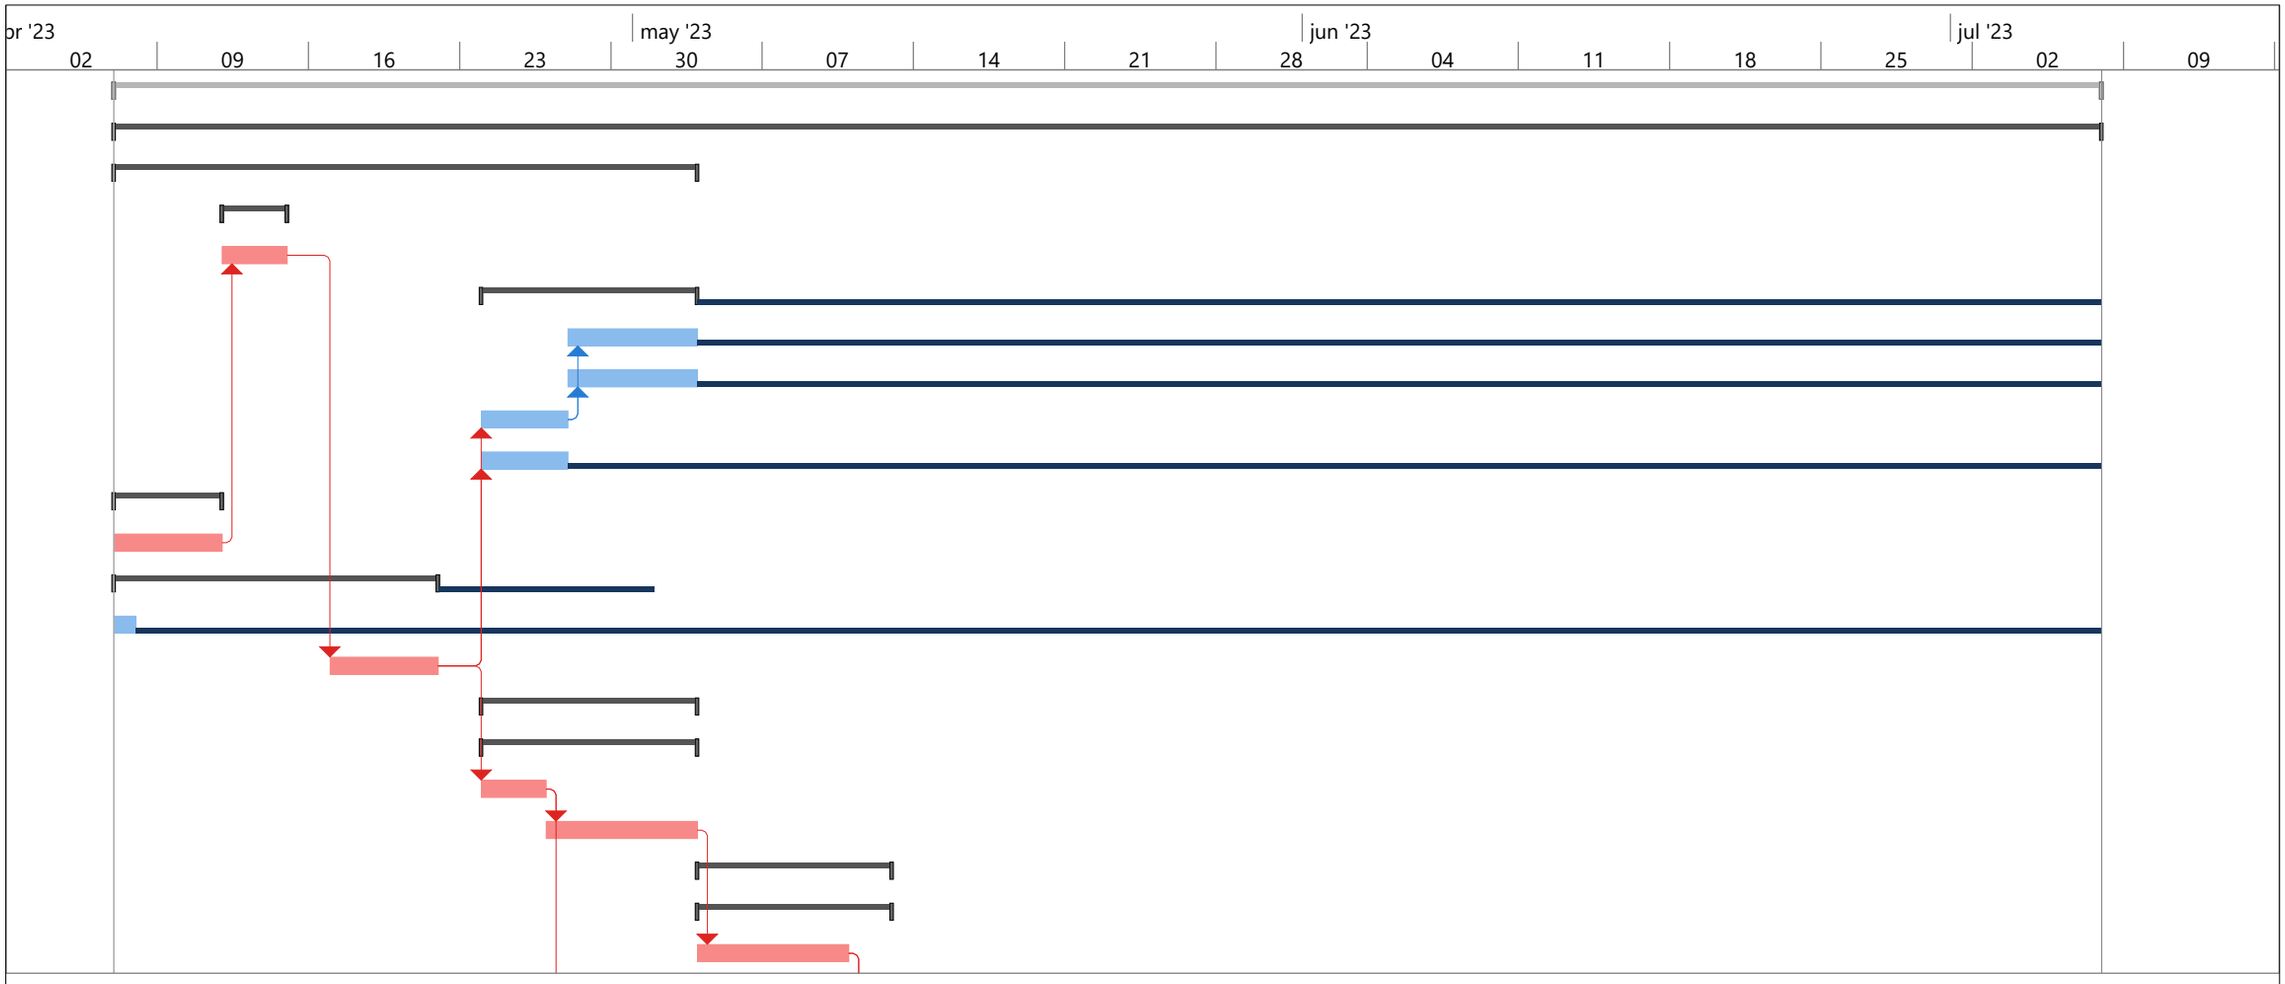

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			

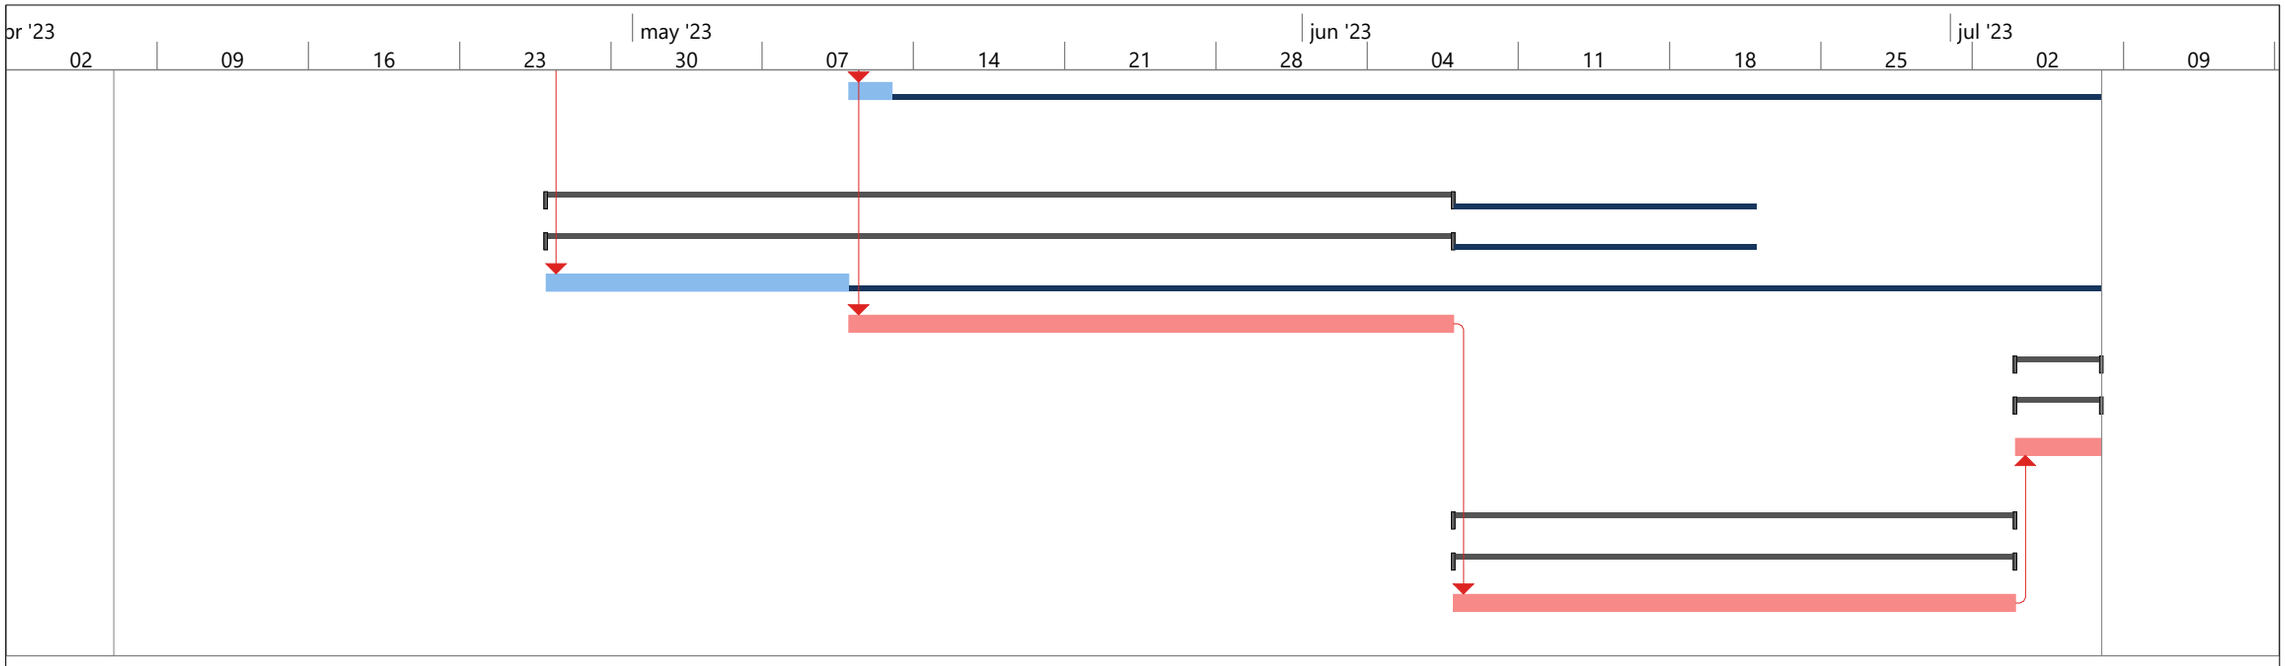

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			
