

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
0		**PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL "PUENTE DE CONCRETO 2"**	**106 días**	**lun 27/02/23**
1		**GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES**	**106 días**	**lun 27/02/23**
2		**1.1 PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 27/02/23**
3		**DESCAPOTE**	**2 días**	**jue 02/03/23**
4		1.1.1 DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	2 días	jue 02/03/23
5		**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**3 días**	**lun 27/02/23**
6		1.1.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	3 días	lun 27/02/23
7		**1.2 EXCAVACIONES**	**12 días**	**lun 06/03/23**
8		**1.2.1 MANUALES**	**12 días**	**lun 06/03/23**
9		1.2.1.1 EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	12 días	lun 06/03/23
10		**1.3 CIMENTACION**	**11 días**	**mié 22/03/23**
11		1.3.1 CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	3 días	mié 22/03/23
12		1.3.2 CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	8 días	lun 27/03/23
13		**1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**70 días**	**jue 06/04/23**
14		**1.4.1 COLUMNAS**	**20 días**	**jue 06/04/23**
15		1.4.1.2 CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	20 días	jue 06/04/23
16		**1.4.2 VIGAS**	**25 días**	**jue 04/05/23**
17		1.4.2.1 VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). premez.	25 días	jue 04/05/23
18		**1.4.4 PLACAS**	**25 días**	**jue 08/06/23**
19		1.4.4.8 PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27.6MPa, (4000psi) PREMEZ	25 días	jue 08/06/23
20		**1.4.6 PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS**	**22 días**	**jue 06/04/23**
21		1.4.6.4 CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	20 días	jue 06/04/23

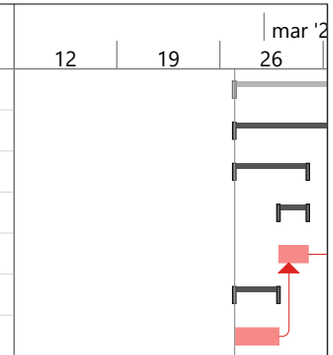


Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
22		1.4.6.6 APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 180MMX180MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0.25MX0.60MX0.03M	2 días	jue 04/05/23
23		**1.5 ESTRUCTURAS METALICAS**	**30 días**	**lun 27/02/23**
24		1.5.1.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	30 días	lun 27/02/23
25		**1.6 CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	**jue 13/07/23**
26		**1.6.1 REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS**	**8 días**	**jue 13/07/23**
27		1.6.1.1 BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	8 días	jue 13/07/23

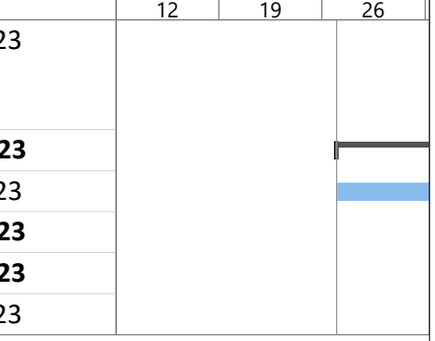


Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

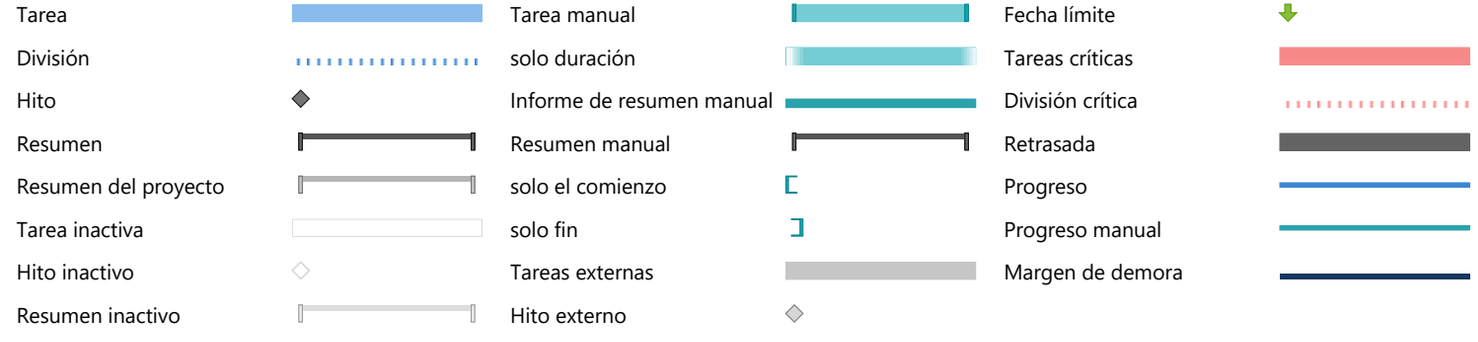

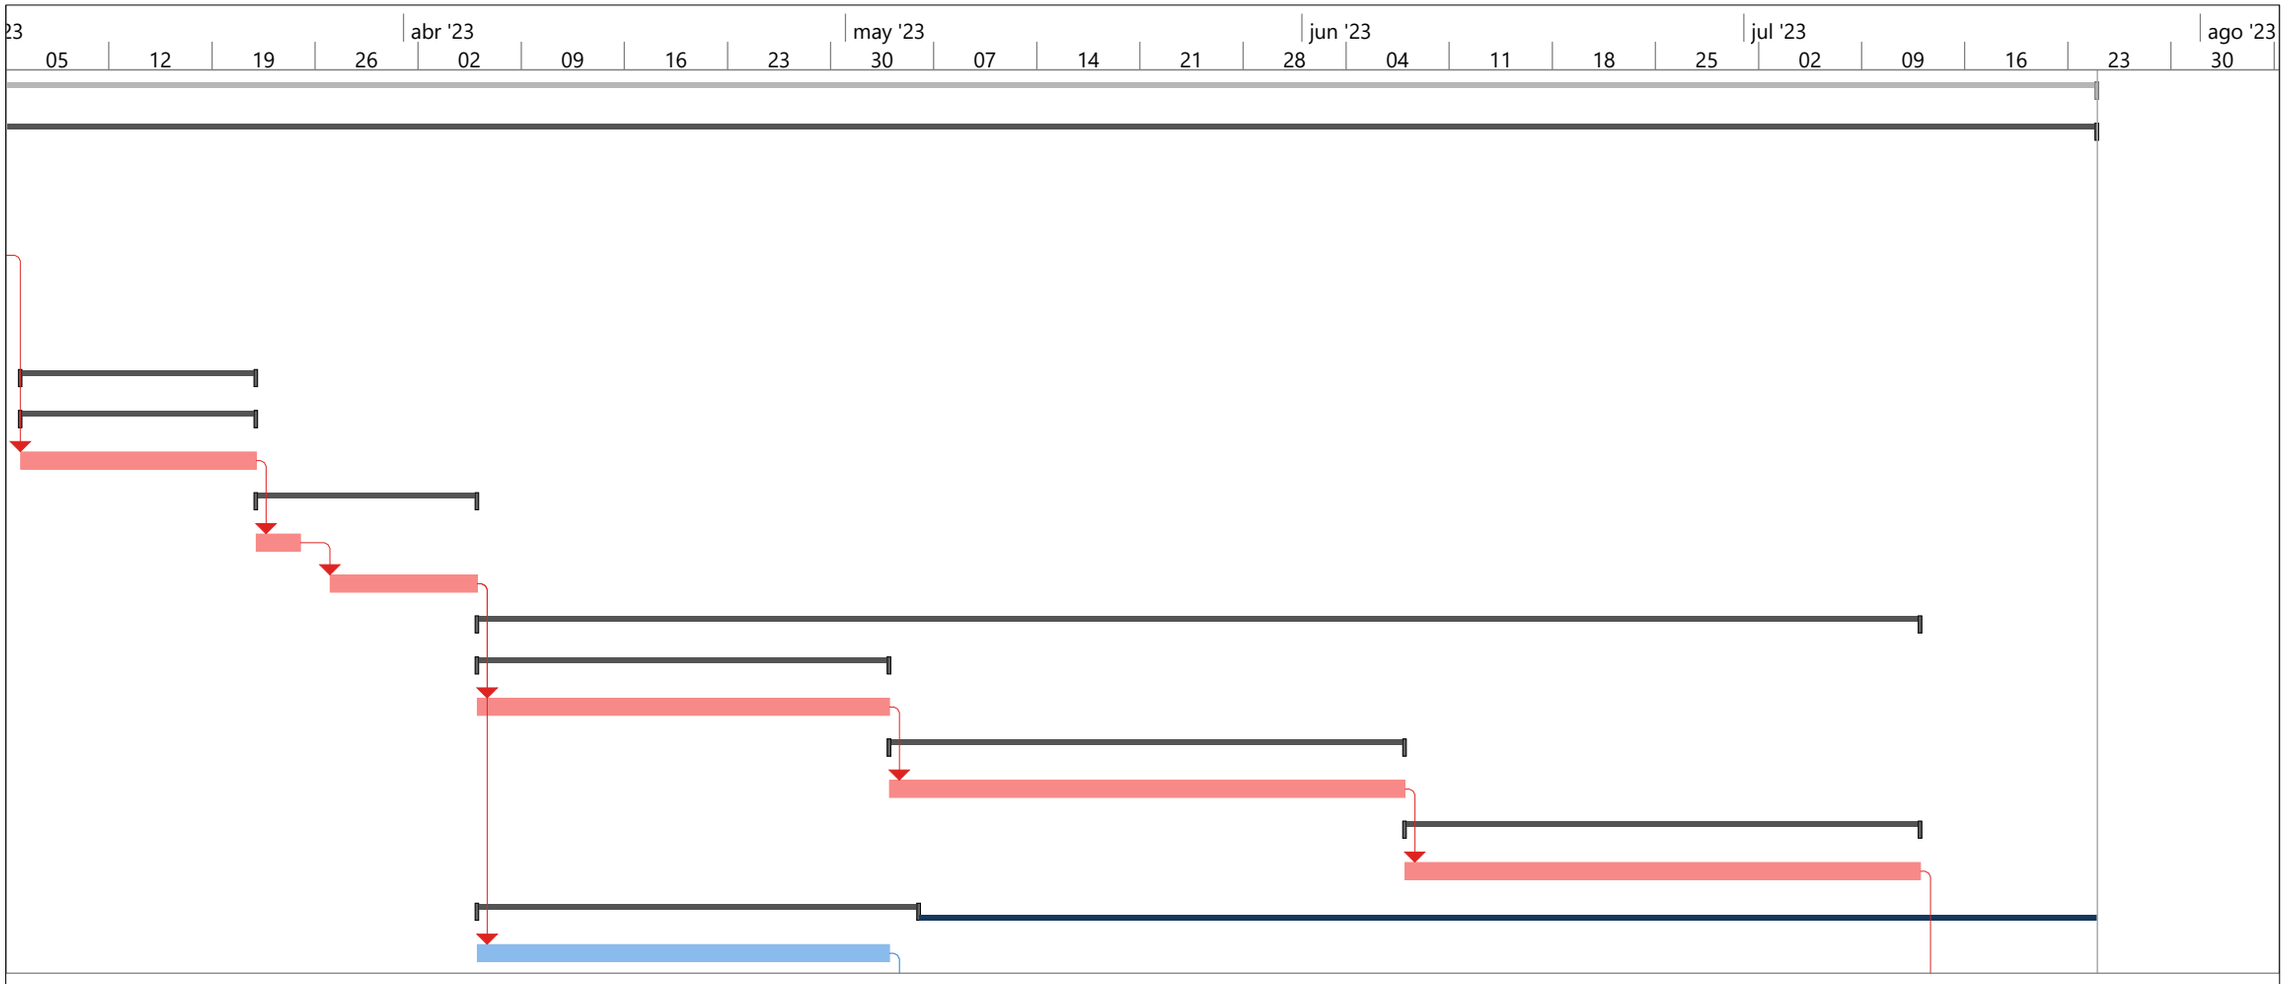

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Retrasada
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso
Tarea inactiva	solo fin	Progreso manual
Hito inactivo	Tareas externas	Margen de demora
Resumen inactivo	Hito externo	

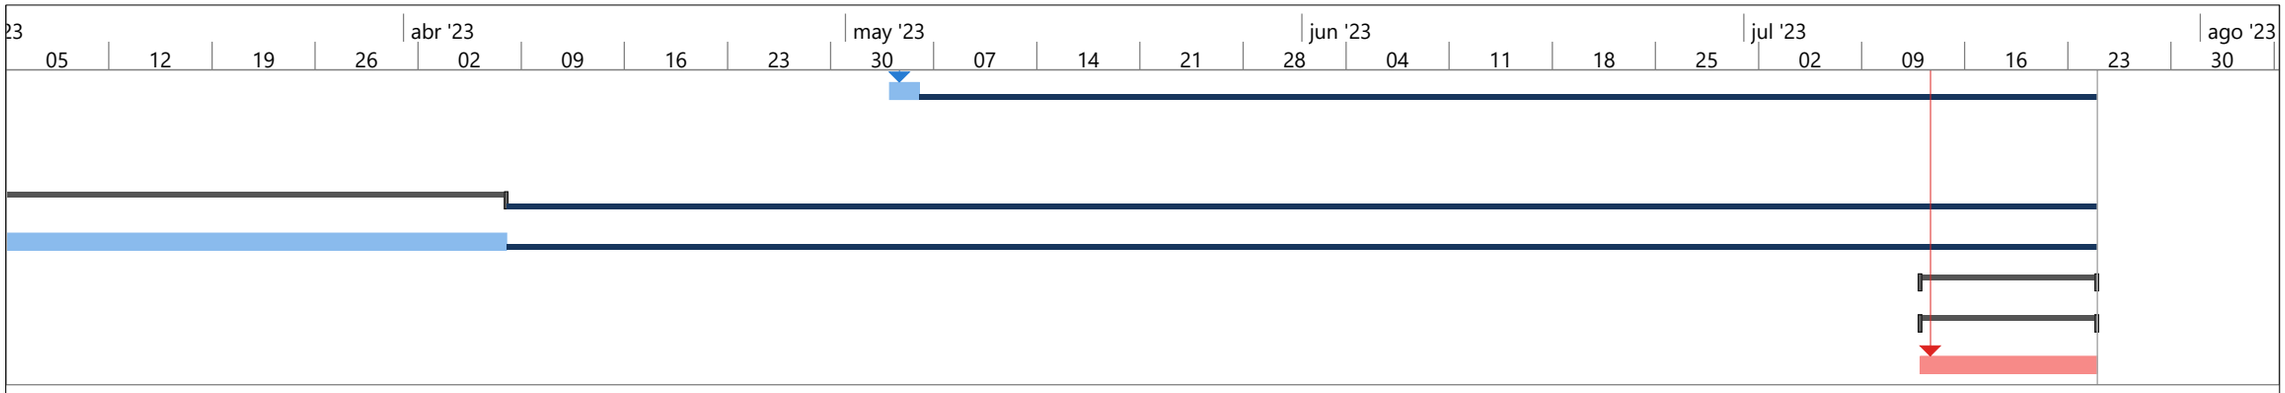

Proyecto: PROGRAMACIÓN PA
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Retrasada
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso
Tarea inactiva	solo fin	Progreso manual
Hito inactivo	Tareas externas	Margen de demora
Resumen inactivo	Hito externo	
