INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe No.	**7**	**Periodo del informe**	**JUNIO de 2022**	**Fecha de elaboración**	**DD/MM/AA**
					05/07/22

1. Datos Generales

1.1. Contrato No.	142 de 2021
1.2. Objeto	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI.
1.3. Contratista	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -DISPAC
1.4. Contratante	IPSE

1.5. Valor

No. 1 “PROYECTO SISFV PAILITAS	$ 8.037.852.682
No. 2 “PROYECTO SISFV ALBANIA	$ 17.340.848.490
No. 3 “PROYECTO SISFV BARRANCAS	$ 5.149.942.784
No. 4 “PROYECTO SISFV HATO NUEVO	$ 815.058.882
No. 5 “PROYECTO SISFV MAICAO	$ 21.909.038.358
No. 6 “PROYECTO SISFV MANAURE	$ 12.035.788.761
No. 7 “PROYECTO SISFV RIOHACHA	$ 4.744.162.281
No. 8 “PROYECTO SISFV VILLANUEVA	$ 5.005.024.118
No. 9 “PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ- NUQUÍ - CHOCÓ”	$ 3.204.320.959
Valor total del contrato	**$ 78.242.037.315,00**

1.6. Plazo inicial	31 julio de 2022
1.7. Fecha Acta de inicio	13 diciembre de 2021

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

1.8. Prórrogas, suspensiones y/o modificaciones	• El día 7 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el Modificatorio N°. 1 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el numeral 3 de las "OBLIGACIONES DEL IPSE" contenidas en la cláusula cuarta – Obligaciones de las partes; se modificó la cláusula sexta GARANTÍAS; se incluyó la cláusula de MULTAS, se incluyó la cláusula PENAL y se aclaró el ítem segundo del segundo desembolso contenido en la cláusula segunda – Valor del contrato interadministrativo y formas de desembolso. • El día 18 de marzo de 2022, las partes suscribieron el Modificatorio N° 2 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el Alcance del objeto – objetivos específicos, ajustando los valores y cantidad de usuarios, se modificó igualmente la Cláusula 2 – Valor del contrato interadministrativo y forma de desembolso, en la cual se mantiene el presupuesto contrato sin embargo se realiza la redistribución de recursos en los proyectos y se prorroga el plazo contractual establecido hasta el día 30 de diciembre de 2022.
1.9. Fecha de terminación	**30 diciembre de 2022**

1.10. Póliza	**Asegurador:**	**PREVISORA SEGUROS S.A.**	
	No. Póliza:	**1006248 y 3000175**	
	Riesgo cubierto	**Vigencia**	
		Inicio	**Final**
	CUMPLIMIENTO	**10/11/2021**	**30/06/2023**
	CALIDAD DE SERVICIO	**10/11/2021**	**30/12/2023**
	RESPONSABILIDAD C Y E.	**31/07/2022**	**30/12/2022**

2. Información del proyecto

PROYECTO	VEREDA	MUNICIPIO	DPMENTO	USUARIOS	TIPO SOLUCIÓN	CAPACIDAD POR USUARIO
No. 1 "PROYECTO SISFV PAILITAS	ANDES 1; ANDES 2; ARROYO HONDO; BELLO HORIZONTE; BOBALI 1;; BOBALI 2; BOLAZUL; CAÑO ARENAS; CARACOLI; EL TERROR; GUARUMERAS; LA ESPERANZA; LA ESTRELLA ; LA PEDREGOSA; LAS; LLAVES; LOS CORAZONES; LOS ENCANTOS; LOS LLANOS; MUNDO NUEVO; QUEBRADA CHIQUITA; QUEBRADA HONDA; RAYA GRANDE; RAYITA ORIENTAL; SAN ISIDRO; VILLANUEVA 1; VILLANUEVA 2	PAILITAS	CESAR	423	SISFV	800Wp

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

No. 2 "PROYECTO SISFV ALBANIA	ACUARUT, AIPIAPULE, Airraschon, AISHIMANA, ALITAMANA, ANARAIPA, AWAYAJAURI, BELEN, CAÑAWATAMANA, CELESTIAL, CHINGOLITO, CHIRRATUI, CHUSIRRA, COPOYOMANA, GUAYAVITAL, ishischon, itaka 2, JALALOU, JAVIYITO, Jirrumana, JIYUITCHON, juchimana, JUYASIRAIN, KACHALEROI 1, KACHUTZAO, Kainshaipa, KALINASIRRA, KAMUCHASEN, KANSHAIPA, KETPANA, KOKOMANA, KOLOYOSU, LA FORTUNA, LA SIERRITA, Las palmitas, MALANWAIPA, MANAMON, MAÑUI, Murrenakat, NUEVO HORIZONTE, Orillamana, OROLEE, Paraíso, Paraíso 1, PARRITCHON, PESUAN, POROIKA, PUEBLITOS, PUSIRRAIRRAKAT, RANCHO NUEVO, RULEACHON, SALAKAT, SERRILLAMANIA, SOLDADO PARATE BIEN, TAPARITA, TOROMANA, URRAICHIQUEPU, VILLA ONE, WAJALETU, WANAPAREPO, WANETURUMANA, WAREWAREN, WARRARATCHON, WOTTOIN	ALBANIA	GUAJIRA	872	SISFV	800Wp
No. 3 "PROYECTO SISFV BARRANCAS	BARRANCON; CAURINA; COCOTAZO; EL SIERRON; EL SILENCIO; LAGUNITAS; LAS PAVA; LAS PAVAS; LOS BRITOS; LOS ESTADOS; MAPURITO; MONTE LAGUA; MONTEFRESCO; PALOTAL; PARAJI; POTRERITO; PUNTO CLARO; SIERRA AZUL; SURIMENA	BARRANCAS	GUAJIRA	235	SISFV	810 Wp
No. 4 "PROYECTO SISFV HATO NUEVO	BAÑADERO; CAÑA BRAVA; LA LOMITA; LOMAMATO; LOS CORAZONES; VEREDA ANGOSTURA	HATO NUEVO	GUAJIRA	40	SISFV	800 Wp
No. 5 "PROYECTO SISFV MAICAO	AMARICHI; AMUSICHON; ATSAULIA; BELLO MONTE; BOTONCHON 2; CADENITA; CARAQUITA; CEURA; CRUZ CAPILLA; CUATRO VIAS; IRRAMASIRA; IRRUWAIN; ISHAIN; JASALIMA; JATTO; JEPIMANA; JOTOJOROY; JUTTIAL; JUYARUTPAMANA; KALENTISUMANA; KANASUMANA; KANASUMANA 2; KARAQUITA; KARROUYACHON; KASICHI; KASPOLIMANA; KOJONMANA; KOURIPANA; KULI; KULINATCHI; KULIRRILI; LA AVENTURA; LOMA FRESCA; LOS MANANTIALES; MAICAO; MAIMAJASAY; MAKU; MALANGUE; MANAURE; MARAÑAMANA; MASAMANA; MASHI; OOROKO; PAJANKIRRU; PAKIMANA; PANAMÁ; PARAÍSO; PATAJATAMANA; PESUAPA; SAN ANTONIO DE GUAMAYAO; SANTA LUCÍA; SANTA MARÍA; SARARAO; SIRRUTMACHI; TEKIA; TOLOMANA; TRANQUETH; ULAIN; ULAIN 2; URUWAMANA; WAITAPÁ; WAMAYAO; WARARALAIN; WAYUUMANA; WILIJITSUMANA; WUAMAYAO; WUIMPESHI; WULISTMANA; YOTOJOROTCHI; YOTOJOROY; YOULEPU; YOUYOUPANA; YULEP; YUTAO	MAICAO	GUAJIRA	1113	SISFV	800 Wp
No. 6 "PROYECTO SISFV MANAURE	AMOUC, ANOTPALOU, BARARCHAN, BUENOS AIRES, CALANCATA, CAPUSHAMANA, CEYBOTA , COICHINAMA, COOMANA, CORRAL, DANERAICA, EKIEKAT, ERUMANA, GALAN, IRRAKAULE, JARAJAULIA, JASUISIRO, JAWAPIAKAT, JEUCHAN, JULATSHI, KALIYUSEN,	MANAURE	GUAJIRA	566	SISFV	740

	KALOUYACHAN, KASPOTSHI, LA PUNTACHON, LICHOSAMANA, LOMACHAN, MACHOMANA, MAJALI, MANTAPOW, MANTOKERA, MAPUAYN, MASHALERAKAT, MOLOKONSIRAT, MOUWASHIRA, MOUWATERO, MURALEN, MUSHULECHON, OLOESHAN, PALONEGRO, PANERAKA, PANSUAKAT, PIRIACHON, PISANMANA, RUTKAIN, SABANA VERDE, SABANACHON, SAMUTCHAN, SHALERAKA ,SHAWAINAMANA, SHOSHIKA, SICHICHAN, SISPA, SITSHON, SUCUTULAN, TAMASIKUMANA, TOSITOMANA, TRIYACHAN, WASHAISIRA, WASHINTON, WINPIRAREN, WOTOKOT, YOROLOMAKAT					
No. 7 "PROYECTO SISFV RIOHACHA	Ipamana, Ishamana, Jayapamana, Kamutchasain, Kewirrashi, Limonal, Maichichi, Mangomana, Namunao, Okushimana, Panterramana, Toloponokat, Usimana, Uyatpana	RIOACHA	GUAJIRA	220	SISFV	800
No. 8 "PROYECTO SISFV VILLANUEVA	EL ENEAL; EL HORNO; EL MORRO; EL TEMPLAO; JUNCALITO; LA CULEBRERA; LA NOVEDAD; LA SARALITA; LA SELVA; LA TRANCA; LAS FLORES; LOS ESTADOS; LOS PLANES; LOS QUEMADOS; NOLASCO; OROZUL; POTRERO GRANDE; SIERRA NEGRA; VILLA PALMA; ZANJONES	VILLANUEVA	GUAJIRA	237	SISFV	740 Wp
No. 9 "PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ- NUQUÍ - CHOCÓ"	COQUI	NUQUI	CHOCO	88	HIBRIDO	99,36kWp

2.1. Resumen de las instalaciones realizadas	A la fecha el contrato se encuentra en etapa de contratación de obra e interventoría.

3. Ejecución presupuestal

3.1. Valor total del contrato

No. 1 "PROYECTO SISFV PAILITAS	$ 8.037.852.682
No. 2 "PROYECTO SISFV ALBANIA	$ 17.340.848.490
No. 3 "PROYECTO SISFV BARRANCAS	$ 5.149.942.784
No. 4 "PROYECTO SISFV HATO NUEVO	$ 815.058.882
No. 5 "PROYECTO SISFV MAICAO	$ 21.909.038.358
No. 6 "PROYECTO SISFV MANAURE	$ 12.035.788.761
No. 7 "PROYECTO SISFV RIOHACHA	$ 4.744.162.281
No. 8 "PROYECTO SISFV VILLANUEVA	$ 5.005.024.118

3.2. Valor ejecutado

Valor del contrato	$ 78.242.037.314
Valor desembolsado	$ 24.653.393.145
Valor Pendiente por desembolsar	$53.588.644.170

3.3. Valor disponible por ejecutar

Valor total Vigencia 2022: $53.588.644.170

No. 9 “PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ-NUQUÍ - CHOCÓ”	$ 3.204.320.959			
Valor total del contrato	**$ 78.242.037.315**			

3.4. Adiciones

A la fecha no se han presentado adiciones

3.5. Resumen ejecución presupuestal

Valor Contrato	**$ 78.242.037.315**	**Hitos**
Primer desembolso	$ 24.653.393.145	**1.** Cronograma **2.** Plan de trabajo **3.** Publicación términos referencia **4.** Encargo Fiduciario
Segundo Desembolso	$ 22.690.190.821	**1.** Copia suscripción de contrato de obra e interventoría **2.** Órdenes de compra de equipos importados y nacionales **3.** Informe de socialización preliminar
Tercer desembolso	$ 22.690.190.821	**1.** Acta de Arribo de materiales y nacionalización de equipos importados **2.** Acta de Arribo de materiales y equipos nacionales en los centros de acopio **3.** Informe de avance de ejecución de trabajos del 50% **4.** Informe de avance de capacitación del 50%
Cuarto Desembolso	$ 8.208.262.528	**1.** Acta de recibo a satisfacción **2.** Entrega de las liquidaciones de los contratos **3.** Entrega y aprobación del informe final

Se autorizó el primer desembolso mediante radicado No. 20211330086522 del 16 de diciembre de 2021 por un valor de $24.653.393.145.

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

El porcentaje de ejecución de contrato interadministrativo 142 -2021 es del 14.24%, para cada uno de los Nueve proyectos, DISPAC S.A. E.S.P. ha cumplido con las actividades propias de la etapa No. 1 – Actividades previas a la contratación e inicio de la etapa 2 actividades de contratación según el cronograma.

CRONOGRAMA	
CONTRATO IPSE 142 DE 2021	
OBJETO	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO	

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación							
1	Suscripción de encargo fiduciario	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Contrato encargo fiduciario	2,0%	2,0%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Certificación	2,0%	2,0%
3	Plan de trabajo	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Documento plan de trabajo	2,0%	2,0%
4	Revisión, aceptación y aprobación de los diseños	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Oficio	2,0%	2,0%
5	Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Oficio	2,0%	2,0%
6	Elaboración de pliegos de contratación de obra e interventoría	15	10/nov/2021	25/nov/2021	Oficio	2,0%	2,0%
b) Etapa 2 – Actividades de contratación							
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	3	25/nov/2021	28/nov/2021	Enlace proceso SECOP	0,4%	0,4%

4.2. Actividades realizadas

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
El día 27 de mayo se adjudicó el proceso SPAO-DG-037-2022 cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV EN LAS	Se han desarrollado reuniones de seguimiento con el IPSE, en donde se han expuesto los avances en las actividades desarrolladas a lo largo de las semanas y se han resuelto inquietudes respecto al contrato.	14.24%	*Se mantiene el porcentaje de avance 14,24% en el cronograma de todos los subproyectos, a excepción del porcentaje de avance correspondiente al proyecto de Hatonuevo dado que se adjudicó y aumentó a 21,9%.*

COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE HATO NUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA a la firma INGELCOR INGENIERIA SAS.			

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato

4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar
Imposibilidad de expedición de garantías para amparar el contrato 142 de 2021	El día 7 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el Modificatorio N°. 1 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el numeral 3 de las "OBLIGACIONES DEL IPSE" contenidas en la cláusula cuarta – Obligaciones de las partes; se modificó la cláusula sexta GARANTÍAS; se incluyó la cláusula de MULTAS, se incluyó la cláusula PENAL y se aclaró el ítem segundo del segundo desembolso contenido en la cláusula segunda – Valor del contrato interadministrativo y formas de desembolso.	Mesas de trabajo entre DISPAC E IPSE.
Desbalance financiero en razón a incrementos de los precios de los materiales y equipos del proyecto a implementar, así como también el incremento del salario mínimo de acuerdo al decreto 1724 del 15/12/2021.	Suscripción de Modificatorio No. 2 del contrato donde se realiza ajuste del alcance de los proyectos	Mesas de trabajo entre DISPAC E IPSE.

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

A la fecha no se han realizado modificaciones técnicas al proyecto, ejecución de obra y presentaciones de informes que contengan ejecución del componente técnico.

6.2. Componente Ambiental y Social
A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente ambiental y social.
6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo
A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente de Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.
6.4. Componente Jurídico
A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente de Jurídico.
6.5 Componente Financiero
A la fecha se tienen los siguientes pendientes: 1. Ajustes a los informes expedidos por el administrador de los meses de diciembre, enero y febrero de 2022, los informes remitidos con asunto "subsanación" no se evidencia con ajustes en el componente financiero. 2. Informe expedido por el administrador correspondiente al mes de junio de 2022. 3. Informe de la Fiduciaria correspondiente al mes de junio de 2022.

7. Análisis de riesgos

A continuación, se relacionan cada uno de los riesgos plasmados en el estudio previo para la suscripción del contrato 142-2021:

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3.Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Cambio en el precio de materiales y equipos.	Contratista	si	Análisis de mercado para todos los proyectos y ajuste del alcance del contrato.
2. Realización de Huelgas, paros y asonadas.	IPSE/Contratista	No	
3. Actos terroristas	IPSE/Contratista	No	
4. Hurto de materiales y equipos	Contratista	No	
5. Condiciones climáticas adversas que imposibilitan acceso o desarrollo de la obra.	Contratista	No	
6. Dificultades en la adquisición y transporte de materiales y personal.	Contratista	No	

7. Fallas en materiales y equipos y/o mala operación del sistema.	IPSE/Contratista	No	
8. Dificultades en la adquisición, avales, licencias y/o permisos ambientales	Contratista	No	
9. Dificultades en los tramites de consulta previa que deben surtirse para algunas comunidades.	Contratista	No	
7.5. Resumen general de los riesgos	Se materializa el primer riesgo evaluado en relación a el Cambio en el precio de materiales y equipos, así como también el incremento del salario mínimo de acuerdo al decreto 1724 del 15/12/2021.		

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 20211391203001 42E

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes

Relación de documentos ingresados al expediente:

Radicado	Fecha	Descripción
20221330043282	30/06/2022	PROGRAMACIÓN DE ENCUENTRO PARA ACLARACIÓN DE DUDAS SURGIDAS A RAÍZ DE SOCIALIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DE IPSE Y DISPAC
20221520012131	29/06/2022	RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA VEEDURÍA COMITÉ CAFETERO BOBAÍ, RADICADOS EN EL IPSE No. 20221330040272 y No. 20221330040562. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 142 -2021.
20221330042642	24/06/2022	COMUNICACIÓN 20226000008601-ENCARGO FIDUCIARIO IPSE 142 DE 2021
20221330042042	22/06/2022	INFORME DE REPLANTEO Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CAPACITACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 159 DE 2021.
20221330040682	15/06/2022	COMUNICACIÓN 20226000008031-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL IPSE 142 DE 2021
20221520025453	15/06/2022	LEGALIZACION COMISION PAILITAS - SERGIO SILVA
20221330040572	15/06/2022	COPIA 2022600007321-CARTA DE INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO CUYO OBJETO ES DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES Y

	20221330040562	15/06/2022	2022600008171-REUNIÓN PARA ACLARACIÓN DE DUDAS, GENERADAS A PARTIR DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PAILITAS REALIZADA EL 9 DE JUNIO DE 2022, A LA VEEDURÍA CIUDADANA DE PAILITAS CESAR CONFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 023 DEL 01 DE MARZO DE 2022.
	20221520025333	14/06/2022	Orden de comisión a Maicao Guajira Germán Hernández
	20221330040272	14/06/2022	SOLICITUD DEL DISEÑO TECNICO APROBADO POR BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE PAILITAS CESAR
	20221330040192	13/06/2022	065282: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - INFORME DE GESTIÓN FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 142 - 052022
	20221520011231	13/06/2022	SOLICTUD INFORME DE REPLANTEO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 142 DE 2021.
	20221520024913	13/06/2022	INFORME DE MAYO DE 2022 - CONTRATO 142-2021
	20221330038322	6/06/2022	OFICIO. EXT. DA. NRO.100.071.2022-CARTA COMPROMISO ACEPTACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN COBERTURA
	20221550023813	6/06/2022	Reiteración Seguimiento a la Contratación Compromisos del Componente Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento al Capítulo VI del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.
	20221330037522	3/06/2022	CERTIFICACIÓN DE SALDOS MAYO IPSE 142 DE 2021
	20221520010681	3/06/2022	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO 142 DE 2021


9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

En el seguimiento del contrato interadministrativo 142 de 2021 se solicitó a DISPAC S.A. E.S.P. mediante oficio No. 20221520010681 del 03/06/2022 el cumplimiento de las obligaciones contractuales, toda vez que no se ha llegado el informe correspondiente para el mes de abril de 2022, de igual forma mediante oficio radicado No. 20221550023813 del 06/06/2022 se reiteró el cumplimiento de los compromisos adquiridos en lo relacionado al componente de seguridad y salud en el trabajo.

El día Jueves 9 de junio de 2022 se realizó el acompañamiento a la socialización del proyecto de Pailitas donde se adelantaron las siguientes actividades:

1. Presentación de los actores institucionales que participan en la ejecución del proyecto, se da inicio al encuentro de socialización del proyecto con la presentación del personal que asiste. Se contó con la participación del alcalde y funcionarios de la Administración Municipal, funcionarios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, funcionarios de la Empresa Distribuidora de Energía del Pacífico DISPAC, el contratista de obra Dimel Ingeniería S.A. y la interventoría Consorcio Ingsolar Pailitas.

2. Como supervisor del contrato 142 de 2021 IPSE se dio inicio con la presentación del IPSE y las actividades que realiza, adicionalmente comparten como fue el proceso de construcción del proyecto, la selección de los usuarios y el trabajo articulado con la administración municipal. También se socializa el marco institucional en el que se gesta el proyecto. Se realizó una socialización general de los tiempos en los que se desarrollará el proyecto, se hace mención a la Administración Operación y Mantenimiento AOM y el acompañamiento que se brindará una vez sean instaladas las soluciones solares individuales fotovoltaicas para verificar su correcto funcionamiento. Se socializa de manera general el esquema de sostenibilidad, donde el Gobierno nacional otorgará un subsidio y el usuario debe asumir el pago de una cuota mensual.

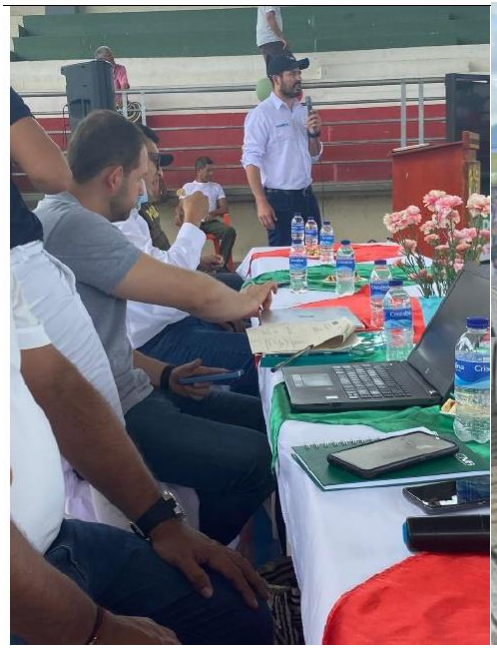



Se establecieron compromisos relacionados con que para la contratación de la mano de obra calificada y la no calificada sean priorizadas las personas de la comunidad, adicionalmente el secretario de la veeduría ciudadana conformada por el comité de cafeteros para hacerle seguimiento a la obra, informa que ellos ya realizaron la conformación de la veeduría, la inscribieron ante la personería municipal, comparten documentación. Revisar documentación de la conformación de la veeduría ciudadana y establecer contacto con la comunidad para informar sobre la forma en que se desarrollará el componente social.

En aras de dar una guía para la presentación del informe de replanteo de los nueve proyectos, la supervisión remite oficio radicado No. 20221520011231 del 13/06/2022, donde se establecen los formatos a diligenciar y el listado mínimo de actividades a desarrollar en la ejecución de dicha actividad, adicionalmente se enumeran los criterios de validación de los usuarios nuevos en el caso de que aplique.

Mediante radicado IPSE No. 20221520012131 del 29/06/2022, se dio respuesta a las solicitudes elevadas por la VEEDURIA COMITÉ DE CAFETEROS, en relación al proyecto de Pailitas donde se solicitó la información

relacionadas con el diseño técnico del proyecto a ejecutar, para lo cual se comparte el link con la información solicitada, de igual forma la Veeduría solicito un espacio con personas con capacidad de toma de decisiones al interior del IPSE y DISPAC, para aclarar las diferentes inquietudes e inconformidades que se generaron a raíz de la socialización realizada el día 09/06/2022, por lo cual esta se agenda para el día 22 de julio de 2022 a las 9:00 am en las instalaciones de la alcaldía municipal de Pailitas – Cesar.

Finalmente, según lo informado por DISPAC en el mes de junio de 2022 se tiene el siguiente avance frente a la contratación de obra e interventoría de los nueve proyectos, así:

Proyecto	Contrato	Fecha de adjudicación	Contratista	Estado contrato y acta de inicio
PAILITAS	Obra	3/06/2022	Dimel Ing S.A.S	No está firmado, máximo al 22/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría INGSOLAR Pailitas (Alianza solidaria, Cooperativa Multiactiva de profesionales y Segen ingeniería SAS)	Firmado 15/06/2022
ALBANIA	Obra	6/06/2022	Consorcio Flamingo (Medini Ing SAS,Spectra Ing y Electroredes del Caquetá)	No está firmado, máximo al 24/06/2022
	Interventoría	2/06/2022	Consorcio INT SOLAR Albania 2022 (Lyansa Ltda Proincelect SAS y Civel SAS)	No está firmado, máximo al 22/06/2022
BARRANCAS	Obra	Pendiente	Consorcio Watta Kai Barrancas 2022 (Beta ingeniería, Consener SAS)	Inicio proceso de contratación 17/06/2022 – 31/07/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)	No está firmado, máximo al 24/06/2022
RIOHACHA	Obra	3/06/2022	Consorcio Solar Riohacha (Ingelcor SAS, Solar Plus)	No está firmado, máximo al 24/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)	No está firmado, máximo al 24/06/2022
HATONUEVO	Obra	27/05/2022	Ingelcor Ingeniería AS	No está firmado, máximo al 22/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)	No está firmado, máximo al 24/06/2022
VILLANUEVA	Obra	6/06/2022	UT ZNI VILLANUEVA (ESCO SAS, Solar Plus)	No está firmado, máximo al 22/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)	No está firmado, máximo al 24/06/2022

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

MAICAO	Obra	6/06/2022	Consorcio solar Maicao (ER ingeniería, A&A ingeniería, Medidas eléctricas)	No está firmado, máximo al 22/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio INT Solar Maicao (Proincelect SAS y Segen ingeniería SAS)	Firmado 15/06/2022
MANAURE	Obra	6/06/2022	UT ZNI MANAURE (ESCO SAS, Solar Plus)	No está firmado, máximo al 22/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio INT Solar MANAURE (Proincelect SAS y Segen ingeniería SAS)	Firmado 17/03/2022
COQUI NUQUI	Obra	25/05/2022	Dimel Ing S.A.S	Firmado 13/06/2022
	Interventoría	16/02/2022	Consorcio Interventoría INGSOLAR nuqui (Alianza solidaria, Cooperativa Multiactiva de profesionales y Segen ingeniería SAS)	No está firmado, máximo al 24/06/2022

FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO
