DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LOTE 2.

Id	Nombre de tarea	Und	Cant	Duración	Comienzo	Fin
1	CONTRATO No. 2116 DE 2022			181 días	mar 10/05/22	lun 14/11/22
2	INICIO DEL PROYECTO			0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22
3	Localizacion y replanteo	M2	1650,39	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22
4	Demolición de pavimento existente	M2	1225,00	6 días	lun 13/06/22	sáb 18/06/22
5	excavacion mecanica sin clasificar	M3	1359,41	18 días	sáb 18/06/22	jue 7/07/22
6	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	101,15	7 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22
7	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	313,70	18 días	mar 27/09/22	sáb 15/10/22
8	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	11699,05	18 días	jue 8/09/22	mar 27/09/22
9	Corte de Pavimento	ML	389,55	12 días	mié 19/10/22	mar 1/11/22
10	Sellado de Juntas	ML	1410,83	12 días	mar 1/11/22	lun 14/11/22
11	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	0,00	0 días	lun 14/11/22	lun 14/11/22
12	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	0,00	0 días	lun 14/11/22	lun 14/11/22
13	Retiro de Escombros	M3	1009,96	15 días	jue 7/07/22	sáb 23/07/22
14	Demoliciónes de concreto reforzado	M3	23,67	4 días	jue 30/06/22	mar 5/07/22
15	Excavacion Manual humeda	M3	57,08	10 días	mar 5/07/22	vie 15/07/22
16	Concreto Ciclopeo 3000 PSI	M3	19,33	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
17	Instalacion de Concreto incluye formaleta (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	61,65	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
18	Cinta PVC V-15 para juntas	ML	45,00	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
19	Manejo de aguas	GLB	1,00	10 días	vie 15/07/22	lun 25/07/22
20	Relleno para estructuras con recebo	M3	162,28	5 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
21	Riego de liga (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	1 día	sáb 20/08/22	lun 22/08/22
22	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	1 día	lun 22/08/22	lun 22/08/22
23	Mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) (Incluye transporte del material)	M3	4,90	1 día	mar 23/08/22	mar 23/08/22
24	Baranda de protección en tuberia metalica	ML	16,00	3 días	mar 23/08/22	vie 26/08/22
25	Base estabilizada con cemento 6%	M3	170,12	5 días	lun 22/08/22	vie 26/08/22
26	Curado de Concreto hidraulico con Antisol	M2	1859,54	4 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
27	Suministro e Instalación de Geomembrana	M2	996,04	7 días	jue 11/08/22	jue 18/08/22
28	Conformación y compactacion de la Subrasante	M2	1494,68	4 días	sáb 6/08/22	jue 11/08/22
29	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	166,00	3 días	mié 17/08/22	sáb 20/08/22
30	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	UND	3,00	3 días	vie 26/08/22	mar 30/08/22
31	Demolición sardinel	ML	90,00	2 días	mar 30/08/22	mié 31/08/22
32	Instalación de concreto para vigas riostras de confinamiento	ML	129,75	4 días	sáb 15/10/22	mié 19/10/22
33	Sumnistro e Instalación de Tuberia de 12" PVC	ML	96,00	3 días	jue 7/07/22	lun 11/07/22
34	Suministro e Instalación de Silla Yee 12" x <= 6"	UND	13,00	3 días	sáb 16/07/22	mar 19/07/22
35	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	60,00	5 días	mar 19/07/22	lun 25/07/22
36	Suministro e instalación de tubería alcantarillado ≤ 6"	UND	52,00	3 días	lun 25/07/22	mié 27/07/22
37	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	34,00	4 días	mié 27/07/22	lun 1/08/22
38	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado ≤ 6"	UND	13,00	4 días	lun 1/08/22	jue 4/08/22
39	Excavacion Manual en material común	M3	27,04	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22
40	Corte de Concreto	ML	26,00	2 días	jue 4/08/22	sáb 6/08/22
41	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	66,00	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
42	Filtro con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	41,28	2 días	mar 26/07/22	mié 27/07/22
43	Suministro e Instalacion de Base Granular	M3	201,12	3 días	jue 18/08/22	lun 22/08/22
44	Diagnostico Box Culvert	UND	1,00	20 días	jue 9/06/22	jue 30/06/22
45	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
46	COMPONENTE SST	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
47	COMPONENTE SIG	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
48	DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO	GLB	1,00	30 días	mar 10/05/22	jue 9/06/22
49	FIN DEL PROYECTO			0 días	lun 14/11/22	lun 14/11/22

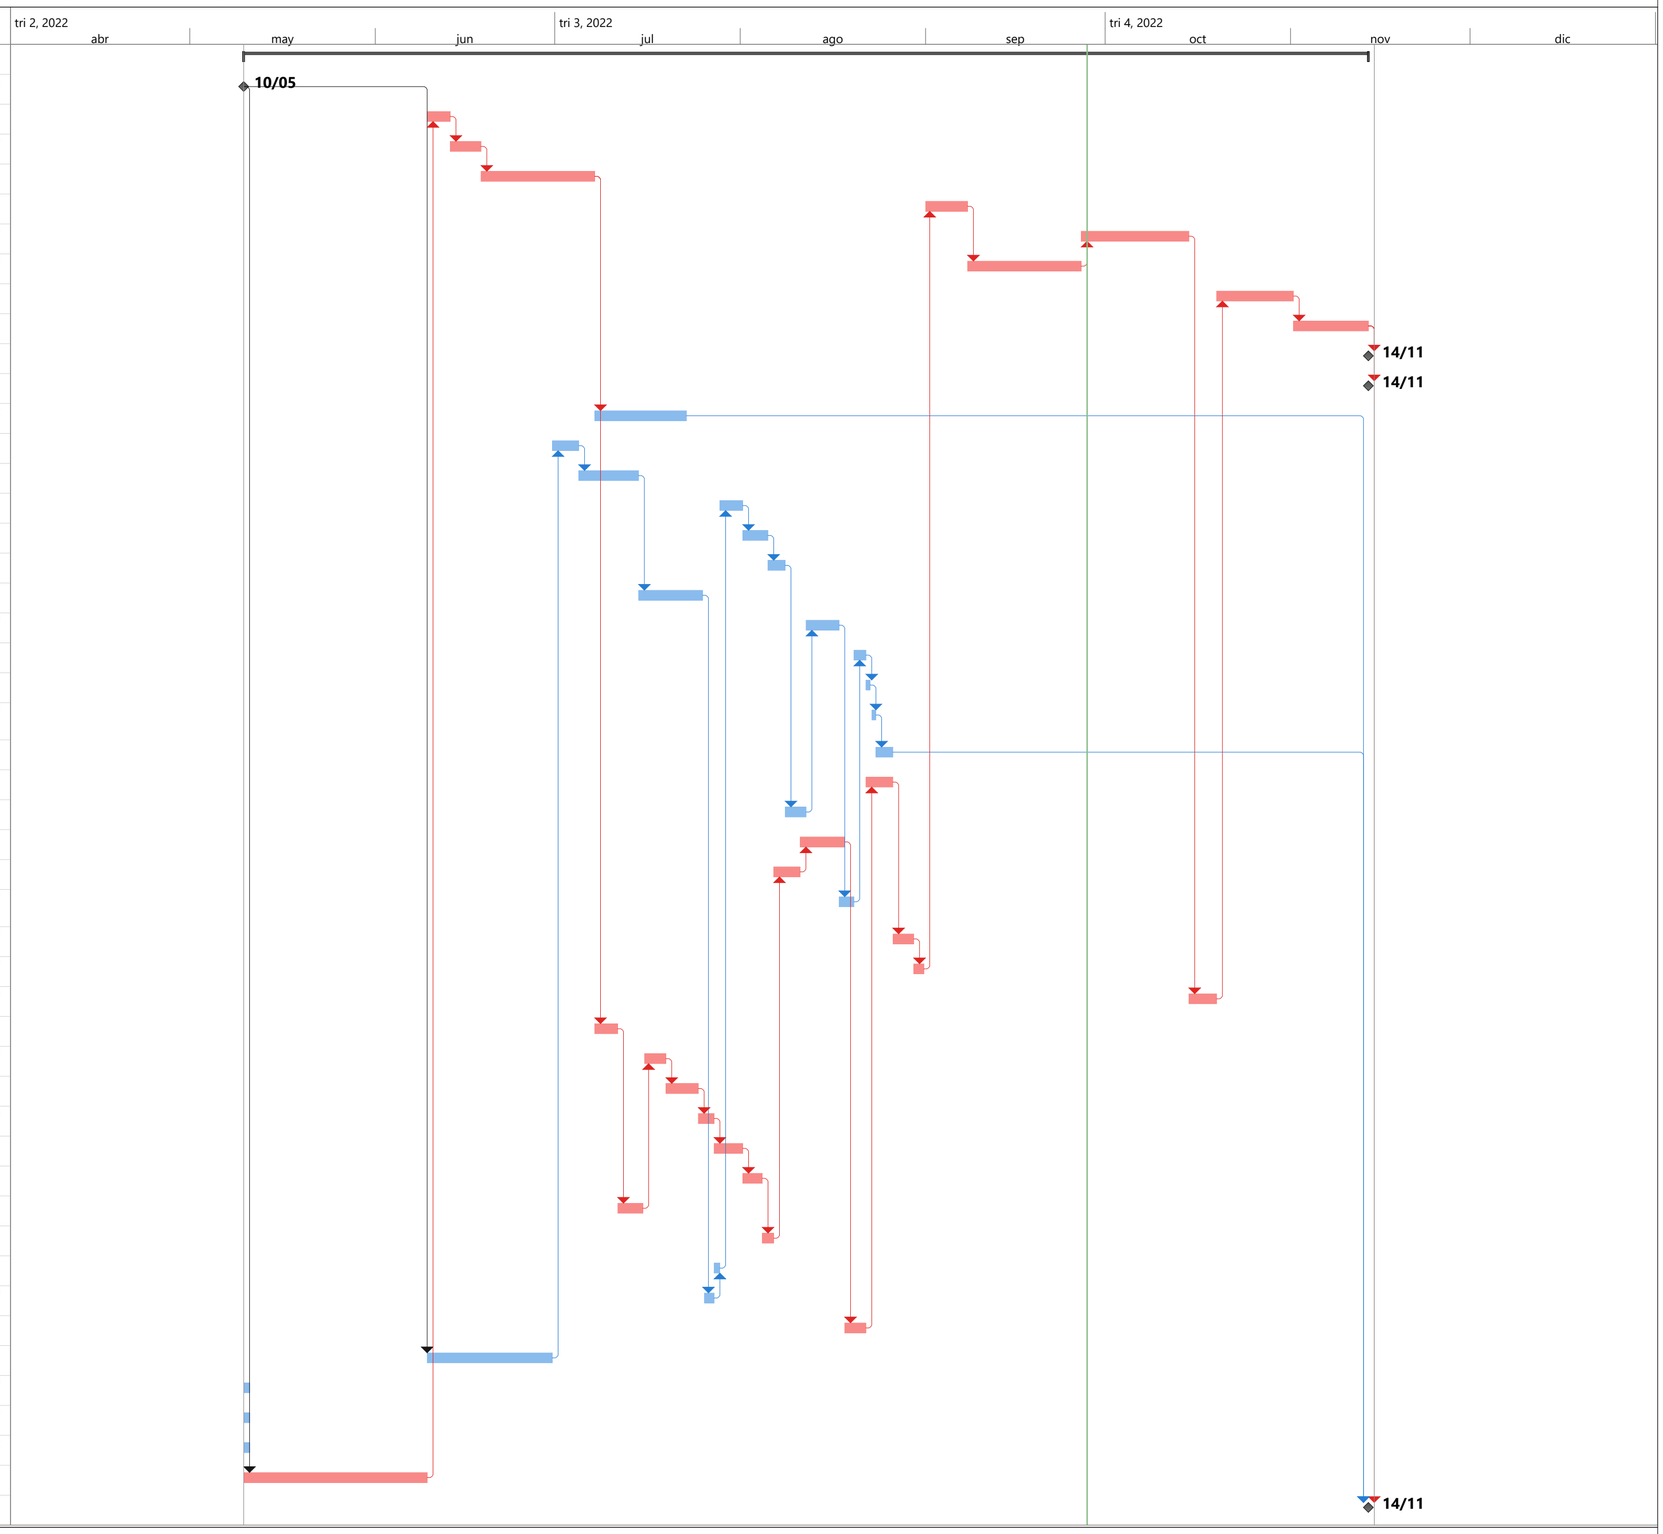

Proyecto: VIAS CUCUTA
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2022

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso		
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual		

SINCOC SAS
R/L JAIRO E. RINCON VELANDIA
CONTRATISTA
