ANEXO 11

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja 1 de 1	INFORME No	1
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO		
		8 DE SEPTIEMBRE DE 2022	8 DE OCTUBRE DE 2022	
		DESDE	HASTA	
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
12/09/2022	LP-SPM-008-2022-031	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	LABORATORIOS DE SUBBASE	VIA EMAIL
12/09/2022	LP-SPM-008-2022-033	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	ENTREGA DE PAGOS A LOS APORTES PARAFISCALES , AFILIACIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTACION DE MAQUINARIA-RESPUESTA AL COMUNCADO ESASIM-037-2022	VIA EMAIL
12/09/2022	LP-SPM-008-2022-034	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	RESPUESTA AL COMUNICADO ESASIM-036-2022	VIA EMAIL
15/09/2022	LP-SPM-008-2022-037	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N°1 AL CONTRATO EN REFERENCIA	VIA EMAIL
24/09/2022	LP-SPM-008-2022-041	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA EN TERRENO	VIA EMAIL
3/10/2022	LP-SPM-008-2022-042	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	PROBLEMAS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	VIA EMAIL
6/10/2022	LP-SPM-008-2022-043	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	TIEMPO DE ESPERA A LAS INDICACIONES DEL DISEÑADOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	VIA EMAIL
0610/2022	LP-SPM-008-2022-044	JORGE ANDRÉS CARRASCAL PÉREZ Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CARRERA 8F SUR # 6-68	ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ	MONTERÍA - CÓRDOBA	CERTIFICACION DE TALA DE ARBOLES	VIA EMAIL

VBO - Interventor

Contratista de Interventoria: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA
Contrato No: CMA-SPM-007-2022	Contrato No. LP-SPM-008-2022
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Laboratorios de materiales

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 16:01
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com, esfigsal@gmail.com

11 adjuntos

- **CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA.pdf** 116K
- **EQUIVALENTE DE ARENA.pdf** 157K
- **ENSAYO DE CBR - LABORATORIO.pdf** 184K
- **GRANULOMETRIA.pdf** 177K
- **DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.pdf** 178K
- **LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.pdf** 548K
- **SULFATO MAGNESIO.pdf** 104K
- **SULFATO DE SODIO.pdf** 133K
- **PROCTOR MODIFICADO.pdf** 324K
- **PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS MONTERIA.xlsx** 924K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 031. Laboratorios.pdf** 77K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 031

Montería - Córdoba. 12/09/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Laboratorios de Subbase

Mediante el presente se hace la entrega de los nuevos ensayos de laboratorio para la subbase granular.

Agradezco su atención, colaboración y apoyo oportuno.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

entrega del pago de Aportes parafiscales, afiliaciones y documentación de maquinaria.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 16:53
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com, esfigsal@gmail.com, Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>

6 adjuntos

- **geiner_202209121147.pdf** 297K
- **minicargador ángel Alvarez.pdf** 5184K
- **oscar luis _202209121149.pdf** 313K
- **pajarita angel ing.pdf** 3345K
- **Pago de Seguridad Social. - 2022-09-12.pdf** 409K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 033. Afiliaciones.pdf** 123K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 033

Montería - Córdoba. 12/09/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Entrega de pagos a los aportes parafiscales, afiliaciones de personal y documentacion de maquinaria. Respuesta al comunicado ESASIM-037-2022.

Mediante el presente se le hace entrega del soporte del pago a los aportes parafiscales del personal del proyecto, afiliación del mismo y documentacion de maquinaria. .

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Reprogramación de comité

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 17:09
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com, esfigsal@gmail.com, Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 034. Comite Pre..pdf
79K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 034

Montería - Córdoba. 12/09/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Respuesta al comunicado ESASIM-036-2022.

Mediante el presente se le da respuesta al comunicado ESASIM-036-2022 emitido por la interventoría el día 12-09-22; Donde se solicita al representante legal a un comité técnico presencial en las instalaciones de la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Montería el día jueves 15 de septiembre del 2022 a las 10:00 a.m. Así mismo se le informa a la interventoría que por motivos personales el representante legal del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA se encuentra esta semana por fuera de la ciudad de Montería y no podrá asistir a dicho comité. Respetuosamente se solicita una reprogramación de este, para el día jueves 22 de septiembre del 2022.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Solicitud de suspensión

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 9:51
Para: elkinrojasa@gmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>
Cc: Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 037. Suspension.pdf
857K

202

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 037

Montería - Córdoba. 15/09/22

Señor
GERMÁN QUINTERO MENDOZA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor del Contrato

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Solicitud de Suspensión No 1 al contrato en referencia.

Respetados señores,

En calidad de Contratista del referenciado con el debido respeto me dirijo a ustedes a solicitarles suspensión del contrato a partir de la fecha, con base en los siguientes fundamentos:

1. No es de desconocimiento de ustedes que hemos tenido inconveniente con el suministro de materiales procedente de cantera. Como les comunique mediante oficio LP-SPM-008-2022-032. Donde manifesté respuesta del porqué del atraso en el relleno de subbase y relleno con piedra rajón, que, por motivos ajenos al proyecto, la comunidad aledaña a la cantera chicoral de donde se está suministrando el material para el mejoramiento, está protestando y tienen la vía cerrada y bloqueando el acceso de los volcos. Esta problemática se está presentando desde el 02/09/2022, y nos está ocasionando tener atrasos en el proyecto de al menos 13 días. Anexo enlace noticias.
   https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/monteria-le-pone-la-lupa-a-problemas-generados-por-relleno-sanitario-HC5325292.

2. En aras de buscar una solución a lo antes mencionado, se realizaron cotizaciones de materiales con las canteras aledañas a la zona que contaran con los permisos ambientales que requiere el ente contratante, que en la ciudad de Montería no todas las canteras cuentas con dichos requisitos. Teniendo como una opción la cantera

JOMEVE ubicada a las afueras del municipio de Ciénega de oro – Córdoba que cumple con la documentación ambiental necesaria. Pero esta cantera no maneja subbase tipo clase C, si no subbase clase A y B un poco más costosa y traer el material de dicha cantera sobrepasan los costos del presupuesto de obra. Por otra parte, también la vía de Ciénega de oro en diferentes oportunidades se han presentado bloqueos y protestas por parte de la comunidad reclamando por el relleno sanitario. Se anexa enlace de la noticia.
https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/bloqueos-en-la-tierra-del-presidente-electo-por-fetidos-olores-del-relleno-CD6757172

3. Es preciso recordar que desde el mes de abril empezó la temporada invernal a nivel nacional, la cual se ha mantenido hasta la fecha y según los informes de las autoridades meteorológicas - IDEAM, estas seguirán presentando hasta prácticamente finalizar el año. Por sus especiales condiciones geográficas y ambientales, en la Subregión de Córdoba, donde se ubica el proyecto, las precipitaciones se tornan muy fuertes y reiterativas generando incluso inundaciones.

   Estas fuertes precipitaciones han implicado una parálisis total de las actividades constructivas, no solo los días que se presentan sino en los subsiguientes; Queremos hacer nuevamente hincapié en que la lluvia del día o de la madrugada no solo afecta en el momento en que esta se da, si no que el resto de la jornada se ve afectada en su totalidad con el agravante de que esta afectación va hasta el día siguiente y muchas veces un día de lluvia se traslapa o se superpone con el anterior lo que causa que no se logre en algunos casos evacuar del todo las aguas de la lluvia anterior.

   Ahora bien, en el mes de agosto y septiembre el incremento en la cantidad e intensidad de las lluvias diarias es muy evidente, lo que acrecienta aún más la situación de atraso en la obra. Todas estas novedades, cuando se presentan, se vienen anotando de manera puntual en la bitácora de la obra del frente de trabajo. Lo anterior, consideramos nosotros, sigue siendo un factor de incertidumbre mayor que nos resulta poco controlable desde el punto de vista de la programación de la obra muy a pesar nuestro, es por esto, que anotamos todo lo anterior, buscando saber cuál es su posición al respecto y cuáles serían sus directrices. Según nuestras estimaciones, el impacto en la ejecución del contrato por las fuertes y reiteradas precipitaciones, ha tenido hasta la fecha un impacto en tiempo de ejecución en 9 días, los cuales, deberán ser compensados al Contratista en caso que el plazo de ejecución faltante del proyecto no llegare a alcanzar para realizar todas las actividades.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

Con todo estamos haciendo todos los esfuerzos y ajustes al cronograma de cara a no necesitarlo, pero si eventualmente se presentare un atraso en las entregas se ha debido al tema en comento. Cabe resaltar, que sigue siendo nuestro compromiso realizar las entregas pactadas en las fechas propuestas. De manera anexa se evidencia lo anterior mediante registro fotográfico de las lluvias de los meses agosto y septiembre, y registro del IDEAM.

Así, lo anterior no sólo afecta el rendimiento el día de la precipitación, sino que también afecta los días subsecuentes a las precipitaciones como mínimo, ya que para actividades como el pavimento que son completamente a cielo abierto y que no son estacionarias, implican necesariamente esperar a que el terreno adquiera nuevamente las condiciones de humedad, manejabilidad, transitabilidad, entre otros, para poder maniobrar de manera normal y eficaz.

Las anteriores consideraciones vistas aisladamente tendrían prioridad para justificar ante la entidad contratante una suspensión del contrato de (1) un mes partiendo del día lunes 19 de septiembre, sin embargo, la conjunción o sumatoria de las mismas conllevará ciertamente una parálisis de hecho en la ejecución del contrato, lo cual afectaría el normal desarrollo del proyecto pues se alteraría la correspondencia entre lo programado y lo ejecutado.

En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicitamos que, como interventoría técnica y administrativa, y conocedores de primera mano de la situación antes descrita, se nos apruebe una suspensión, hasta que sean superados los motivos que conllevaron a la misma.

Quedamos atentos a su respuesta sobre el particular.

Con un cordial saludo,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ANEXOS












13 sep. 2022 07:13:40
2-80 Carrera 8f Sur


10 sep. 2022 06:59:13

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS
INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	AGO - 25		AGO - 26
Apto. SAN ANDRES	1,5	31,3	25,8
Apto. PROVIDENCIA	2,7	30,8	25,6
Apto. SANTA MARTA	0,0	33,5	25,2
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ci	1,1	X	X
Apto. CARTAGENA	0,1	30,6	25,7
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	32,1	24,4
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciuda	11,5	X	X
Apto. RIOHACHA	0,0	33,3	25,4
Apto. VALLEDUPAR	41,5	32,9	21,4
Apto. MONTERIA	4,4	29,5	22,3
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	1,2	X	X
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	31,4	30,0	21,6
Apto. BARRANCABERMEJA	1,0	33,2	22,0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	0,0	26,7	18,5
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	0,0	X	X
Apto. CUCUTA	X	33,5	22,1
Apto. APARTADO	1,1	28,7	23,5
Apto. MEDELLIN	3,2	29,1	17,4
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,4	X	X
Apto. RIONEGRO	0,0	23,0	13,0
Apto. La Nubia (Manizales)	2,0	X	X
Apto. PEREIRA	9,3	27,3	17,6
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0,0	28,0	17,8
Apto. IBAGUE	0,0	30,7	20,1
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	0,0	20,0	9,0
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	0,0	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0,0	X	X
Apto. ELDORADO	0,0	18,2	8,0
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,0	30,1	19,8
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	0,0	25,0	10,2
Apto. NEIVA	0,0	34,8	24,7
Apto. PASTO (Municipio Chachaqui)	0,3	24,9	13,9
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. IPIALES	0,0	11,4	3,8
Apto. QUIBDO	2,9	28,6	22,6
Apto. BUENAVENTURA	0,0	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira)	2,0	X	X
Apto. YOPAL	0,0	34,0	24,0
Apto. ARAUCA	0,0	31,8	24,7
Apto. PTO. CARREÑO	4,2	33,6	25,0
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	31,8	21,4
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0,0	X	24,0
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	0,0	33,0	23,0
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	0,0	30,2	21,0
Apto. LETICIA	0,0	33,0	22,6

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	AGO - 29		AGO - 30
Apto. SAN ANDRES	13,0	31,5	24,4
Apto. PROVIDENCIA	0,7	30,6	25,4
Apto. SANTA MARTA	0,0	30,9	24,0
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ci	0,0	X	X
Apto. CARTAGENA	0,0	30,5	24,8
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	29,7	24,3
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciuda	0,0	X	X
Apto. RIOHACHA	0,3	29,0	24,0
Apto. VALLEDUPAR	0,2	29,9	23,4
Apto. MONTERIA	0,2	32,1	23,8
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	6,1	31,0	25,0
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0,2	30,6	27,6
Apto. BARRANCABERMEJA	1,2	31,8	23,0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	2,9	25,4	17,8
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	0,0	X	X
Apto. CUCUTA	X	34,8	23,3
Apto. APARTADO	0,1	31,4	23,6
Apto. MEDELLIN	0,7	27,3	17,8
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. RIONEGRO	1,5	21,2	12,8
Apto. La Nubia (Manizales)	0,6	X	X
Apto. PEREIRA	1,6	26,4	17,5
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	1,0	28,0	17,2
Apto. IBAGUE	0,0	29,4	19,6
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	2,2	20,6	9,4
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	0,0	23,0	9,0
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0,3	X	X
Apto. ELDORADO	0,4	16,4	7,9
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,0	32,0	18,2
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	0,0	26,8	10,8
Apto. NEIVA	0,0	30,8	23,6
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	25,3	14,2
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. IPIALES	0,3	14,0	6,4
Apto. QUIBDO	0,1	32,4	22,4
Apto. BUENAVENTURA	0,0	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira)	0,0	X	X
Apto. YOPAL	22,8	28,6	20,4
Apto. ARAUCA	1,2	30,8	22,5
Apto. PTO. CARREÑO	19,2	30,4	23,6
Apto. VILLAVICENCIO	26,7	26,2	19,0
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	12,5	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	23,6	X	21,6
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumanbo)	30,7	28,0	21,6
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	42,8	25,0	18,0
Apto. LETICIA	17,8	29,5	21,7

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAÍS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	AGO - 31		SEP - 1
Apto. SAN ANDRES	12,5	32,1	23,9
Apto. PROVIDENCIA	85,9	31,8	23,6
Apto. SANTA MARTA	3,3	33,2	22,4
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	3,5	X	X
Apto. CARTAGENA	3,6	32,5	25,2
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	33,1	24,8
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	0,4	X	X
Apto. RIOHACHA	0,0	34,3	25,3
Apto. VALLEDUPAR	0,0	33,4	23,3
Apto. MONTERIA	19,9	34,8	22,7
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	6,3	33,2	23,6
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0,0	30,8	23,8
Apto. BARRANCABERMEJA	2,8	32,0	23,8
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	14,4	27,1	17,6
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	39,6	X	X
Apto. CUCUTA	X	35,0	23,7
Apto. APARTADO	1,9	31,8	22,9
Apto. MEDELLIN	0,0	28,4	17,7
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,1	X	X
Apto. RIONEGRO	0,0	22,7	13,0
Apto. La Nubia (Manizales)	13,0	X	X
Apto. PEREIRA	5,2	25,2	17,5
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	10,4	25,7	17,3
Apto. IBAGUE	0,0	30,8	19,7
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	0,0	19,3	9,2
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	5,8	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0,8	X	X
Apto. ELDORADO	0,9	18,4	10,3
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,1	31,3	19,5
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	2,8	25,0	14,0
Apto. NEIVA	0,0	34,6	21,6
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	24,2	12,6
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. IPIALES	0,0	15,0	1,2
Apto. QUIBDO	58,8	31,0	21,8
Apto. BUENAVENTURA	64,0	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira - Fuera del casco urbano)	3,8	30,4	22,8
Apto. YOPAL	0,0	33,6	23,0
Apto. ARAUCA	4,2	31,2	22,5
Apto. PTO. CARRENO	4,4	30,6	23,6
Apto. VILLAVICENCIO	1,5	29,8	20,2
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	7,7	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0,0	X	23,6
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	1,0	32,0	23,8
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	0,0	28,0	18,9
Apto. LETICIA	0,2	31,7	22,7

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 3		SEP - 4
Apto. SAN ANDRES	0,3	31,4	26,1
Apto. PROVIDENCIA	0,1	31,0	27,4
Apto. SANTA MARTA	0,0	35,2	25,3
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ci	X	X	X
Apto. CARTAGENA	0,0	34,2	26,1
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	33,4	25,0
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciuda	X	X	X
Apto. RIOHACHA	0,0	33,0	24,2
Apto. VALLEDUPAR	21,2	34,8	24,0
Apto. MONTERIA	17,7	34,4	22,1
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	X	X	X
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	X	X	X
Apto. BARRANCABERMEJA	28,2	33,4	23,8
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	5,8	28,1	17,4
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	33,6	23,4
Apto. APARTADO	11,3	32,4	23,2
Apto. MEDELLIN	23,2	28,9	17,3
MEDELLIN (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. RIONEGRO	3,8	23,8	14,2
Apto. La Nubia (Manizales)	X	X	X
Apto. PEREIRA	17,8	29,4	18,5
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0,0	28,9	23,6
Apto. IBAGUE	0,0	30,4	20,6
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	X	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	X	X	X
Bogota (centro Ke. 10a. Cll 20 - centro)	X	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	X	X	X
Apto. ELDORADO	7,1	19,1	10,9
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,0	32,4	19,3
CALI (Sede IDEAM al Norte)	X	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	X	X	X
Apto. NEIVA	0,0	31,6	23,5
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	26,9	15,7
PASTO (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. IPIALES	0,2	15,2	7,6
Apto. QUIBDO	59,5	33,2	22,4
Apto. BUENAVENTURA	X	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira)	X	X	X
Apto. YOPAL	X	X	X
Apto. ARAUCA	26,2	31,8	23,1
Apto. PTO. CARREÑO	76,2	33,4	22,8
Apto. VILLAVICENCIO	36,7	26,4	20,6
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	X	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	X	X	X
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	X	X	X
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	X	X	X
Apto. LETICIA	12,7	33,5	22,4

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 5		SEP - 6
Apto. SAN ANDRES	6,6	30,5	25,3
Apto. PROVIDENCIA	0,2	30,8	26,7
Apto. SANTA MARTA	3,3	34,9	23,6
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ci	X	X	X
Apto. CARTAGENA	1,3	32,9	25,5
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	34,1	24,4
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciuda	X	X	X
Apto. RIOHACHA	0,2	31,8	24,5
Apto. VALLEDUPAR	0,0	32,1	23,7
Apto. MONTERIA	18,6	33,2	23,2
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	X	X	X
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	X	X	X
Apto. BARRANCABERMEJA	0,7	33,0	22,7
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	0,0	26,1	18,5
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	33,2	23,2
Apto. APARTADO	6,4	32,1	22,8
Apto. MEDELLIN	3,7	29,5	18,1
MEDELLIN (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. RIONEGRO	8,4	23,0	13,6
Apto. La Nubia (Manizales)	X	X	X
Apto. PEREIRA	0,0	28,0	18,6
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0,1	28,3	18,8
Apto. IBAGUE	0,0	31,3	20,9
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	X	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	X	X	X
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	X	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	X	X	X
Apto. ELDORADO	0,2	18,2	10,7
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,0	31,6	20,2
CALI (Sede IDEAM al Norte)	X	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	X	X	X
Apto. NEIVA	0,0	31,1	23,8
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	25,2	16,0
PASTO (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. IPIALES	0,7	12,6	5,0
Apto. QUIBDO	1,1	33,2	23,8
Apto. BUENAVENTURA	X	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira)	X	X	X
Apto. YOPAL	0,0	X	X
Apto. ARAUCA	15,4	30,1	23,6
Apto. PTO. CARREÑO	6,8	31,8	21,4
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	28,4	20,6
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	X	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	X	X	X
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	X	X	X
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	X	X	X
Apto. LETICIA	0,0	26,3	21,7

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA (DATOS PRELIMINARES)
DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAÍS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 7		SEP - 8
Apto. SAN ANDRES	45,3	31,6	24,2
Apto. PROVIDENCIA	0,0	31,1	27,1
Apto. SANTA MARTA	1,0	35,8	23,7
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0,0	X	X
Apto. CARTAGENA	34,5	32,1	23,5
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	33,6	23,7
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	37,5	X	X
Apto. RIOHACHA	0,7	32,1	24,2
Apto. VALLEDUPAR	0,6	33,9	22,9
Apto. MONTERIA	0,6	32,1	24,7
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0,0	31,4	24,8
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	44,5	32,8	23,8
Apto. BARRANCABERMEJA	15,2	32,8	22,7
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	0,0	26,8	18,8
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	0,0	X	X
Apto. CUCUTA	X	36,4	22,8
Apto. APARTADO	43,2	31,4	23,0
Apto. MEDELLIN	1,5	29,3	18,2
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,3	X	X
Apto. RIONEGRO	3,6	24,0	13,6
Apto. La Nubia (Manizales)	0,0	X	X
Apto. PEREIRA	0,0	28,1	18,7
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0,0	28,5	18,0
Apto. IBAGUE	0,0	32,1	20,1
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	0,0	19,0	6,0
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	0,0	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0,1	X	X
Apto. ELDORADO	0,0	20,8	8,3
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,0	32,9	19,5
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	0,0	26,3	10,2
Apto. NEIVA	0,0	36,6	21,0
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	26,7	13,6
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. IPIALES	0,0	14,4	1,2
Apto. QUIBDO	29,6	31,6	22,8
Apto. BUENAVENTURA	2,5	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira - Fuera del casco urbano)	1,0	31,1	22,6
Apto. YOPAL	0,0	32,0	23,6
Apto. ARAUCA	51,2	32,2	23,2
Apto. PTO. CARRENO	31,5	25,2	20,6
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	32,3	20,6
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0,0	X	22,6
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	0,0	32,4	23,4
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	0,1	26,4	19,4
Apto. LETICIA	0,0	33,1	21,5

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS
INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 8		SEP - 14
Apto. SAN ANDRES	1.2	31.6	26.1
Apto. PROVIDENCIA	0.0	31.8	26.6
Apto. SANTA MARTA	0.0	33.3	24.2
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0.0	X	X
Apto. CARTAGENA	0.0	31.4	26.1
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	31.0	25.6
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	3.9	X	X
Apto. RIOHACHA	10.1	32.4	24.8
Apto. VALLEDUPAR	7.7	31.2	21.9
Apto. MONTERIA	5.2	34.6	22.2
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	4.6	X	22.2
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0.0	33.0	23.0
Apto. BARRANCABERMEJA	1.9	31.0	22.3
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	1.8	27.2	17.1
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	33.2	22.4
Apto. APARTADO	1.3	33.2	23.8
Apto. MEDELLIN	13.7	27.7	16.5
MEDELLIN (Sede IDEAM)	16.0	X	X
Apto. RIONEGRO	12.2	24.6	12.2
Apto. La Nubia (Manizales)	2.0	X	X
Apto. PEREIRA	1.6	26.2	16.8
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0.1	28.0	16.8
Apto. IBAGUE	6.2	28.3	18.4
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0.0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	0.3	X	X
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	1.5	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	10.2	X	X
Apto. ELDORADO	2.8	20.4	8.9
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0.1	30.5	19.7
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0.3	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	16.5	27.0	12.0
Apto. NEIVA	0.0	33.0	20.6
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	1.6	24.5	13.0
PASTO (Sede IDEAM)	18.3	X	X
Apto. IPIALES	0.0	19.6	2.4
Apto. QUIBDO	0.5	30.2	23.4
Apto. BUENAVENTURA	7.3	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira-Fuera del casco urbano)	1.4	X	X
Apto. YOPAL	0.0	36.5	22.6
Apto. ARAUCA	2.1	32.2	22.5
Apto. PTO. CARREÑO	5.4	33.4	24.8
Apto. VILLAVICENCIO	14.2	31.6	21.4
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	21.1	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0.0	X	21.0
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	5.0	33.2	22.2
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	0.0	32.4	21.4
Apto. LETICIA	0.0	34.2	22.2

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 10		SEP - 11
Apto. SAN ANDRES	2.3	32.3	26.3
Apto. PROVIDENCIA	0.1	30.5	25.8
Apto. SANTA MARTA	0.4	34.2	23.8
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	8.2	X	X
Apto. CARTAGENA	4.4	33.1	25.4
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	32.9	25.6
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	6.0	X	X
Apto. RIOHACHA	0.0	35.4	27.3
Apto. VALLEDUPAR	0.5	34.4	23.3
Apto. MONTERIA	9.2	35.0	23.0
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	22.9	32.6	21.8
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	13.6	34.1	21.6
Apto. BARRANCABERMEJA	63.0	34.6	22.2
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	13.7	27.9	18.2
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	36.0	25.0
Apto. APARTADO	9.3	31.6	22.9
Apto. MEDELLIN	0.0	29.5	18.2
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0.0	X	X
Apto. RIONEGRO	2.0	23.4	12.5
Apto. La Nubia (Manizales)	0.0	X	X
Apto. PEREIRA	6.6	24.6	17.6
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0.0	27.4	17.7
Apto. IBAGUE	0.0	31.2	19.2
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0.0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	X	X	X
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	6.5	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0.2	X	X
Apto. ELDORADO	0.2	18.4	8.7
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0.3	30.6	18.7
CALI (Sede IDEAM al Norte)	7.1	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	0.0	26.3	14.0
Apto. NEIVA	0.1	33.0	22.0
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0.0	27.2	15.4
PASTO (Sede IDEAM)	0.0	X	X
Apto. IPIALES	1.9	14.2	7.6
Apto. QUIBDO	24.8	31.6	23.4
Apto. BUENAVENTURA	53.0	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira-Fuera del casco urbano)	1.5	X	X
Apto. YOPAL	10.1	29.4	21.6
Apto. ARAUCA	11.8	32.5	23.4
Apto. PTO. CARREÑO	0.0	32.2	24.8
Apto. VILLAVICENCIO	5.2	28.0	20.8
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	10.7	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0.0	X	24.6
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	0.0	X	23.6
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	12.4	X	20.0
Apto. LETICIA	31.8	30.8	21.7

X : Información no disponible

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS
INFORMACIÓN DIARIA DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPIALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	SEP - 11		SEP - 12
Apto. SAN ANDRES	6,5	32,4	25,2
Apto. PROVIDENCIA	5,7	31,2	25,6
Apto. SANTA MARTA	6,5	34,4	22,4
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ci	1,3	X	X
Apto. CARTAGENA	0,0	31,6	25,4
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	31,5	25,1
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciude	46,0	X	X
Apto. RIOHACHA	9,0	32,4	24,2
Apto. VALLEDUPAR	32,2	32,2	20,8
Apto. MONTERIA	0,0	33,8	23,6
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0,0	32,8	23,0
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0,0	32,2	23,0
Apto. BARRANCABERMEJA	129,9	29,8	22,0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	30,5	26,1	17,0
BUCARAMANGA (Est. La Floresta)	44,7	X	X
Apto. CUCUTA	X	33,3	21,5
Apto. APARTADO	86,3	33,2	22,9
Apto. MEDELLIN	6,7	28,0	16,7
MEDELLIN (Sede IDEAM)	2,5	X	X
Apto. RIONEGRO	0,1	22,0	13,6
Apto. La Nubia (Manizales)	6,7	X	X
Apto. PEREIRA	10,6	27,5	16,3
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	12,7	28,9	17,1
Apto. IBAGUE	2,3	30,8	19,1
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	2,4	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	2,8	20,0	7,4
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	10,8	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	3,8	X	X
Apto. ELDORADO	1,0	18,7	8,2
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	0,3	32,7	19,7
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,4	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	22,6	26,1	16,8
Apto. NEIVA	42,0	37,0	20,0
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	24,7	25,8	14,2
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. IPIALES	0,0	19,4	2,0
Apto. QUIBDO	3,0	31,8	23,4
Apto. BUENAVENTURA	1,6	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira)	0,0	X	X
Apto. YOPAL	12,9	32,1	21,0
Apto. ARAUCA	15,3	34,6	22,7
Apto. PTO. CARREÑO	0,1	31,6	24,5
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	31,4	21,6
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	0,0	X	X
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	20,0	30,0	21,4
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	0,0	X	21,2
Apto. LETICIA	0,0	33,0	22,5

X : Información no disponible

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

PROBLEMAS CON FILTRACIONES.

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 24 de septiembre de 2022, 17:02
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 041. Filtraciones.pdf
194K

217

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 041

Montería - Córdoba. 24/09/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Problemas de filtraciones de agua en terreno.

Mediante el presente le damos a conocer a la interventoría el problema que se está presentado en campo con filtraciones de agua en el terreno. Una vez intervenido el tramo entre los Pr 0+40 al P 0+120 y Pr 0+120 al Pr 0+160 con la excavación mecánica, podemos apreciar considerables hilos de agua superficial que salen debajo de las casas, por encontrase en las faldas del cerro colindante al proyecto. Por lo tanto, esto hace que se nos dificulte la estabilización de la subrasante una vez instalada la capa de piedra rajon y la capa de la subbase. Por lo cual solicitamos una visita de campo del diseñador del proyecto para que nos dé una solución a dicho problema.





Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Actividades no realizadas en obra

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 15:20
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 042. Atraso en las actividades.pdf
128K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 042

Montería - Córdoba. 03/10/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Problemas en la ejecución de las actividades.

Mediante el presente le recordamos a la interventoría el problema que se está presentado en campo con las filtraciones de agua en el terreno, descrito el radicado LP-SPM-008-2022 – 042 enviado el 24/09/22. Donde se obtuvo una respuesta por parte de ustedes en el oficio con radicado ESASIM-051-2022 del 28/09/22, en el que nos notifican que no se pueden continuar las actividades de excavación e instalación de la Subbase y concreto hidráulico, hasta que no llegue la visita a campo del consultor o especialista por parte de la entidad contratante y emita un concepto técnico por parte del mismo.
Este problema de la filtración de agua se está presentando también hasta el Pr 0+180, y posiblemente seguirá hasta el Pr 0+350, tramo donde finaliza la pendiente de las faldas del cerro colindante al proyecto.

Por otra parte, no se han iniciado las actividades de los andenes por el inconveniente que tenemos con la invasión del espacio público por parte de las viviendas a lo largo de la vía. En un comité técnico virtual del día 22 de septiembre con la interventoría, el supervisor de la alcaldía y el ingeniero de control urbano donde no se aclaró el tema de las intervenciones a las viviendas salidas de paramento. Ya que en lo contractual no tenemos contemplado demolición y/o reconstrucción de fachadas, rejas o antepechos. Cabe resaltar que los anden tienen un diseño de 1,2 mt de ancho en ambos costados.
Esta problemática se presenta ya la mayor parte de los propietarios se niegan a aceptar los costos que generarían las modificaciones en sus fachadas.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

respuesta de diseñador del ente contratante

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 14:26
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com, Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 043. Respueta del diseñador.pdf
80K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 043

Montería - Córdoba. 06/10/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Tiempo de espera a las indicaciones del diseñador de la entidad contratante.

Teniendo en cuenta lo plasmado en la visita de campo en el día de ayer 05 de octubre por parte del diseñador del ente contratante y en presencia del supervisor de secretaria de infraestructura, la junta de acción comunal del barrio Alfonso López, contratista e interventoría, donde se tocaron los temas de la problemática por las filtraciones de agua ocasionadas por el cerro aledaño al proyecto, asimismo por parte de la J.A.C se le solicito al diseñador una modificación al diseño del pavimento con respecto al remplazo de las cunetas a construir en las calles 3, 4, 5 y 6 por bateas en las mismas calles, para darle prioridad al manejos de las aguas lluvias que bajan del cerro, y por ultimo una modificación en la transición en el ancho del pavimento cuando cambia de 6mt a 5,50mt en el Pr 0+645.

Por lo tanto, se suspenderán las actividades de excavación, mejoramiento y fundida de concreto en los tramos que corresponde desde el Pr 0+80 al Pr 440, Hasta que se tenga una respuesta del diseñador del ente contratante a las solicitudes realizadas en la visita de campo antes mencionada.

Por otro lado; Se continuará con las actividades programadas desde el Pr 0+440 al Pr 0+798.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 044. Permiso de tala

1 mensaje

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 8 de octubre de 2022, 10:47
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <INTERVENTORIAMONTERIA007@gmail.com>, elkinrojasa@gmail.com
Cc: Durley Daza <presupuesto@constructorajipg.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 044. Permiso de tala.pdf
423K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

NIT. 901.609.836-4

RADICADO: LP-SPM-008-2022 - 044

Montería - Córdoba. 08/10/22

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SPM-008-2022, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: Certificación de tala de árboles.

Mediante el presente se reitera lo antes mencionado en el radicado: LP-SPM-008-2022 – 028 del 1 de septiembre de 2022, con respecto a la falta de la certificación por parte la CVS para el aprovechamiento en la tala de los árboles que están dentro del proyecto; Haciendo que se presente atrasos en algunas actividades. Cabe resaltar que esta certificación debe ser diligenciada por el ente contrate, Alcaldía de montería.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ
Director de obras. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ANEXO 12

COPIA DEL LIBRO DE OBRA

Miercoles 31 de Agosto del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector de Obra, 1 SISO, Comisión topografica, 1 Operador de Retroexcavadora, 1 Maestro, Ayudantes,

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador (Mal estado) 1 vibrocompactador y

Clima: lluvias en horas de la Tarde desde las 3:00 pm en adelante. (Fuertes).

Actividades

1. Se inicia con arreglo de terreno de Manera Manual

2. Se Sella la Subrasante con el vibrocompactador.
3. Se instala Geotextil y Se Coloca una Capa de rajón

4. Se Solicita a la Firma Contratista, Contar con mas volquetas para el suministro de Material Toda vez que Se cuenta hoy Solo con una y Se demora este Suministo de Material.

5. Se suspenden las actividades de obra por fuertes lluvias en la zona. en horas de la tarde.

Jueves 1 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Directo. 1 Resid. 1 S. 1

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador
1 Vibro Compactador, 1 Retro excavadora de llanta

Clima: Soleado

Actividades

1. Se continua arreglo de terreno de manera manual
2. Se Solicita a la Firma Contratista Contar con Mas Volquetas para el Suministro de Material
3. Se utiliza una motobomba para drenar las aguas lluvias que quedaron dentro la excavacion por la lluvia del dia anterior.
4. Se continua con la instalación de la capa de Piedra Bajon. del Pr 0+00 al Pr 0+040.
5. Se Solicita a la Firma Contratista Contar con material de Sobrante en obra.
6. Se debe Mejorar Señalización en obra
7. El Material de Sobrante Colocado en Campo No Cumple Con Las Normas Tecnicas

Viernes 2 De Septiembre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector de obra, 1 Siso
Comision fotografica, Operador de Retroexcavadora

20

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador
1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora
de Llanta

Clima: Sereno de 4 a 5 de la
tarde

Actividades

1. Se Inicion relleno en el primer tramo y Nivelacion desde la PR0+000.00 Hasta PR0+036.34

2. Se Instala el Material Geotextil y la Piedra rajon en PR0+120 hasta la 0+100

3. Se Solicita a la Firma contratista Contar Con Mas Volqueta Para el Somistro de Material

4. Se Solicita a la Firma Contratista Colocar material de Subbase granular en Campo que Cumpla Con Art. 320-13 Invias

5. No se Autoriza Instalación Subbase.

Sabado 3 de Septiembre de 2022

Personal de Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector de obra, 1 Siso
1 topografo, Comision topografi
1 operado de retroexcavador

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador
1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora
de Llanta.

Clima: Soleado y Lluvias en la tarde

Actividades

1. Continua la Instalación de material Geotextil y Piedra rajon

2. Se Solicita el Suministro de materiales en Obra.

3. Se Solicita a la Firma Contratista Colocar Material de Subbase Granular en campo que cumpla con el Art. 320-13 Invias

Lunes 5 de Septiembre del 2022

Personal de Obra; 1 Director, 1 Residente
1 Social, 1 Inspector, 1 Siso
1 topografo, Comiso Fotografia
1 operado de retroexcavadora

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Mini cargador
1 vibrocompactador, 1 Retroexcavadora de llantas

clima: soleado

Actividades

1. Se continua Instalación de material Geotextil y Piedra rajon

2. Se Solicita a la Firma Contratista el Sumistro del Materia Subbase que cumpla Art. 320-13 INVIAS

3. Se Solicita a la Firma colocar Material de Subbase granular en campo que Cumpla Con el Art. 320-13 Invias

4. Se presentan lluvias en la madrugada

Martes 6 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 Siso, 1 topografo
2 operado de retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora Oruga,
1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador
1 Retroexcavadora de llanta

Clima Soleado

Actividades

1. Se continua la Instalación y Nivelacion de la piedra rajon
2. Se sella con una capa pequeña desde la PROTO45 hasta la PROTO60 de Material Subbase No aprobado
3. Se Solicita a la Firma Contratista contar con mas Volquetas para el Suministro de material
4. Se Solicita colocar Material de Subbase granular Que cumpla Art. 320-13 Invias
5. Se Solicita Mejoras Señalizacion en obra

Miercoles 7 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Soáal
1 Inspector, 1 SISO, 1 topografo
2 operadore de retroexcavadoo

equipo en Obra: 1 Retroexcavadora oruga.
1 mini cargador, 1 vibrocompactador
1 Retroexcavadora de llanta.

Clima: llovios desde la 8am hasta 10a.m

Actividades

1. Se continua la instalacion y nivelacion de la piedra rajon

2. Se sella con una capa pequeña desde la PR+60 hasta la PR+0,80, de subbase no Aprobada

3. Se Solicita a la firma contratista contar con Maquina Para el suministro de material

4. Se Solicita a la Firma Contratista retiro de Material producto de excavación PR+0+0.

Jueves 8 de Septiembre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 SISO, 1 topografo
2. operadores de retroexcavadora.

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora Oruga
1 mini cargador, 1 vibrocompactador
1 Retroexcavadora de llanta.

Clima: lluvia de 3 a 5 PM

Actividades.

1. Se Inicia la capa de la Subbase en la abscisa 0+000.0 hasta la 0+036.34

2. Nivelacion de la capa de Subbasse. en el primer tramo.

3. Capa de relleno, desde la PR0+080 hasta la PR 0+100 de subbase No Aprobados.

4. No Se a podido recibir material por bloqueo de la carretera

5. Se solicita Colocación Material subbase en Campo que Cumpla Con Art. 320-13 Inviás.

Viernes 9 de Septiembre del 2022

Personal de Obra: 1 director, 1 residente
1 social, 1 Inspector
1 Siso, 1 topografo
2 operadores de retroexcavadora

Equipo en Obra: 1 Retroexcavadora de oruga
1 Minicargador, 1 Vibrocargador
1 retroexcavadora de llantas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Nivelación de la abscisa 0+000 hasta la 0+036.00

2. Desague desde la absasa 0+070 hasta 0+090

3. Todavia No Se a Podido recibir Material por bloqueo de la cantera
4. Se Solicita Colocacion de Material Subbase granular que Cumpla con Art 320-13 Invias
5. Se Solicita Afiliación de Nuevo operador de retroexcavadora de llantas.

Sabado 10 de Septiembre 2022

Personal de obra : 1 directo, 1 residente, 1 Social
1 Inspector, 1 Siso, 1 topografo
2 operadores de retroexcavadora

Equipo en Obra : 1 retroexcavadora de oruga
1 Mini cargador, 1 Vibrocargador
2 retroexcavadora de llanta,

Clima : Soleado

Actividades

1. Excavación desde el PR0+120 hasta el PR0+125 Sin Contar con Material Aprobado, se Suspenden la Actividad por lluvias en la zona.
2. Nivelación del primer tramo, desde el PR0+000 hasta PR0+036., con material Nuevo de Subbase, Se Solicita entregar ensayos de Materiales.
3. Instalación del Geotextil en el PR0+120 hasta la PR0+125, Se debio Instalar Rajon de Manera Imprevista e instalar Subbase granular
4. Todavia No Se ha Podido recibir Material Subbase por bloqueo de la Cantera

Si No Se Cuenta con el Material No se deberá hacer la Excavación por parte de la Firma Contratista los daños Ocasionados por la Subtrasante por Lluvias Responsabilidad del Contratista y debe ser Asumidos en Costo alguno al Contrato

Rodolfo Ortega

Lunes 12 de Septiembre de 2022.

Personal en obra : 1 Director, Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 Siso', 1 topografo
2 operadores de retroexcavadora
1 operador de Vibrocompactador
1 operador de Mini cargador

Equipo en Obra : 2 retroexcavadora de llanta
1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador

Clima : Fuerte lluvia 4 pm hasta la 5:30 pm

actividades

1. Continua Excavacion en el PROTIZO hasta la PROTIZ y Instalacion del Geotextil
2. Se le pide a la firma Contratista Contar con el Material Sub base granular en Campo para Sello de Tajos
3. Tambien Sigue el bloque de la Cantera donde Se Suministra Materiales Como Rajon y Sub base granular
4. Se Solicita nuevamente Afiliacion del Operador de la Nueva pajarita, No puede Laborar
5. Se Solicita Mejoras Sanitarias en obra

Rodolfo Ortega

Martes 13 de Septiembre de 2022.

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social
1 Inspector, 1 SISO, 1 topografo
2 Operadores de retroexcavadora
1 operador de Vibrocompactador
1 operado de mini cargador

Equipo en Obra: 2 retro excavadora de llanta
1. Mini cargado, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado

actividades

1. Se le pide a la firma contratista Contar con Material de Subbase granular en campo para Sello de rajon

2. Se le pide a la firma Contratista retirar el Material Contaminado, tanto Subbase como rajon

3. Se realiza Excavacion PK0+120 al PK0+130

4. Se evidencia agua filtrada a Excavación en bordes de Vivienda costado Derecho. Se debe realizar Filtros para Manejo de Aguas de Filtración (Desde PK0+040 al PK0+120).

Miercoles 14 de Septiembre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Inspector de obra, 1 topografo, 1 Cadenero, Ayudantes, 1 Maestro, 1 Oficial 2 operadores de Pajaritas, 1 Operador Vibro, 1 Operador Minicargador.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargadora, Volquetas.

Clima: Lluvias en horas de la Mañana

Actividades

- Se inicia la Mañana con fuertes lluvias, lo que impide Excavación PROTOYO al PRO+130.

- Se evacua agua de excavación con Motobomba

- Se inicia Cargo de Subbase granular PROTOOO al PROTO36.

- El contratista Instala Formaleta sin la Interventoría haber recibido la Subbase granular. El procedimiento es recibir Subbase por Cotas y Ensayo de Compactación en Campo.

- Se Solicita a la Firma Contratista Entregar tramos Cargados por topografía y ensayos de Compactación.

Jueves 15 de Septiembre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, Social, 1 Inspector de obra, 1 Topografo, Cadenero, 1 Maestro, Ayudantes, 1 Oficial 2 operadores de pajarita, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de Minicargador.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, volquetas

Clima: Lluvias Medio dia

Actividades.

1. Se instala Geotextil y Rajon PR41120 al PR41130.
2. Se instala Subbase granular, la cual Cumple Segun ensayos presentados en Fecha 12 de Sept/22 por parte de la Firma Contratista.
3. La Firma interventora Verificara Mediante ensayos. la Calidad de los Materiales enviados.
4. Se realiza Comite técnico entre Contratista, Interventoria y Entidad Contratante. para Revisar medidas a implementar por la Firma Contratista para Superar atraso presentado Segun Informe Semanal No. 5
   Programado: 23,31%, Ejecutado: 1.75%, Atraso: 21.56%
5. Se Solicita ala Firma Contratista entregar plan de Contingencia para Superar atraso.
6. Persisten problemas con el Cumplimiento de Subbase granular en Campo.
7. Se Solicita entregar Informes mensuales, Apoyo Contractuales.

Rodolfo Zuñiga

Viernes 16 de Septiembre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector, 1 S/SO, 1 topografo, 2 operadores de pajaritas, 1 Operador Vibro, 1 operador Mini cargador 1 Maestro, Ayudantes, 1 Oficial

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Mini cargador, 1 vibro, H. Menores, Volquetas.

Clima: lluvias de 1 a 3 pm.

Actividades

1. Se Corea Subbase Granular PRO 000 al PRO 036
2. Se recibe por topografía PRO 000 al PRO 036 tramo de Subbase.
3. Se realiza ensayos de compactación PRO 000 al PRO 036; Se instalan formaletas para pavimento.
4. Resto Actividades paralizadas.
5. Se deja listo Terreno PRO 000 al PRO 036 Costado Izquierdo para instalación de Concreto 36 ml.

Sabado, 17 Septiembre del 2022

Personal en obra:
1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector Obra, 1 topografo, 2 operadores de pajarita, 1 op. Mini cargador 1 Op. de Vibrocompactador, 1 Maestro, Ayudantes. 1 Oficial.


Equipo en obra: 3 pavimentadoras, 1 Minicargador, 1 Rodillo compactador, 4 Alguaciles.

Colocado

Actividades.


1 Nuevamente se chequea por topografía niveles de terminado en formaletas para Concreto. Se Solicita Correcciones en PRO+030 Costado Izquierdo.

2 Se Funde Concreto PRO+000 al PRO+030 Costado Derecho MR 38 kg/cm2.



3 Se Funden 12 placas de 3m x 3, se instalan dovelas en juntas transversales.

4. Se instala parrillas de refuerzo de Acero 1/2" Separadas 0,20 x 0,20; doble refuerzo, Se Solicito a la Firma Contratista utilizar para la parrilla del fondo ubicada a D/3. dela Subbase levantadores o monticulos donde instalar este refuerzo.



5. Se toman muestras de concreto en Viguetas para ensayos (03) Tres).

6. Se sigue presentando infiltraciones de agua desde Mojoyo al PRO+120 Costado Derecho, Se Solicita a la Firma Contratista hacer revision del tramo y Se Coordina Con diseñador para el Manejo de estas Aguas.

Lunes, 19 de Septiembre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Inspector, 1 SISO, 1 topografo, 2 operadores de Payloder, 1 Op. Vibrocompactador, 1 Op. Minicargador. 1 Maestro, 1 Oficial, Ayudantes

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Minicargador, 1 Vibro compactador, Volcos, H. Menores

Clima: lluvias en la Madrugada

Actividades

1. Se continua con Instalacion Subbase granular desde PRO+040 al PRO+120

2. Se inicia la Instalacion de formaletas para concreto desde PRO+000 al PRO+036 Costado Derecho

3. Se rectifican niveles de subbase y cota de Terminado o Acabado del concreto

4. Se presenta informe de Cunetas existentes y a Construir ala entidad Contratante, para que se revise con el diseñador del pavimento la viabilidad de la No Construcion de esta por las razones expuestas en el Comunicado ESASIM-042-2020 de Fecha 19/09/22

5. Demolicion Bordillo Desde PRO+000 al PRO+036

Notas en de Sobre

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Topografo, 1 SISO, 1 Ayudante, 2 Op. Perforadora, 1 Op. Motoniveladora, 1 Op. Vibrocompactador, 1 Maestro, 1 oficial, Ayudantes.

Equipo en obra: 2 pasadores, 1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador, Volcos, H. Mineros.

Clima: Dia Soleado.


Actividades.

1 Continuo la instalación de Subbase granular Protego al PRO+120.

2 Se instala Concreto MR 38 Kg/cm² en PRO1000 al PRO1036 costado Derecho.

3 Se instala Acero para pasadores cada 0.13cm en 1"

4 Se instala Acero de 1/2" en refuerzo de doble pasillos placas 1 y 12.



5 Se realiza Corte concreto en Ventana de Corte 6 horas despues de la primera Fundida o Concreto Colocado en Campo.

Rodolfo Arroyo

34

Martes 21 de Septiembre del 2021

Personal en obra: 1 director, 1 residente, 1 SISO, 1 Social
1 inspector, Ayudantes; 3 maestro, 8 operadores
de pajaritas, 1 operadores de vibro, 1 operador
de minicargador

2° turno en obra: 2 pajaritas, 1 minicargador
1 vibrocompactador, Volquetas

Clima: Lluvia en horas de la Mañana y Tarde

Actividades.

1. Se sigue presentado (repitiendo) en Contadores
derecho proceso al precio de agua proveniente
del Cano aledaño al proyecto.
2. Se tiene Material Solicitado por Guardas Varias
Pedidos en la región.
3. Se realiza excavación manual al predio,
Se retira Escombros y Pajon
4. Se presentan Lluvias nuevamente en la Tarde y
Se suspenden las actividades

Jueves, 22 Sept 21

Personal en obra: 1 director, residente, 1 SISO, 1 Social
1 Inspector, Ayudante, 1 Maestro, 8 operadores de
Pajarita, 1 operador de Vibro, 1 operador de
minicargador

Equipo de obra: 2 Pajaritas, 1 Nibro compactador
1 Mini cargador, Volquetas

Clima: Lluvias en la región en horas de la Mañana hasta 8:30 AM

Actividades

1. Se tiene material Saturado PRO+040 al PRO+120. Se debe hacer retiro de este material a causa de las filtraciones presentadas en el terreno.
2. Se realiza excavación PRO+140 al PRO+160 Y se presentan filtraciones de agua por debajo de los cotas
3. Se solicita a la Firma Contratista entregar afiliaciones del personal nuevo a entrar a obra antes de Iniciar Labores
4. Se realiza Movimiento interno de Material de rajon
5. Se instala Subbase a nivel desde PRO+040 al PRO+076. 36 ml.
6. Se presentan lluvias en horas de la Tarde nuevamente.

Rodolfo Arango

Viernes, 23 Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Socials
1 Inspector, Ayudante, 1 Maestro, 2 operadores de Pajarita, 1 operado de Vibro, 1 operador de mini cargador

Equipo en obra: 2 pajarita, 1 Vibrocompactador
1 Minicargador, Vdguetas

clima: lluvias en la region en la madrugada

Actividades

1. Se presentan Acolchamientos en Material de Sobrepase, Se Solicita a la Firma contratista hacer reemplazo de estos tramos, y hace la actividad del remplazo de material
2. La Firma Contratista instala tuberia para evacuar aguas de filtracion y lluvias en el tramo PR0+000 al PR0+120, Para Continuar con la instalacion de material
3. Continua Excavacion PR0+140 a PR0+170; y se Siguen presenciando filtraciones por debajo de las Casas
4. Se Daña una de la pajaritas.
5. Se realiza Recebamiento en PR0+790 a PR0+750 para nuevo frente de trabajo.

Sabado 24 de Sept

personal en obra: 1 Director, 1 residente, 1 Social, 1 SISO
1 Inspector, 2 operadores de pajarita, 1 operado de vibro, 1 operado de Mini, Ayudantes
1 Maestro

Equipo en obra 2 Pajarita, 1 Mini cargador
1 Vibrocompactador

clima: Dia Soleado - lluvias en Madrugada

Actividades

1. Se Solicita a la firma Contratista cumplimiento nivel de Subbase d Promo PRO+070 al PRO+080 en 4 anchos de 6m para instalación de formaletas y descimbres de haberse recibido por topografía y densidades.

2 La firma Contratista que como medida al plan de Contingencia trabajara el día Domingo 25Sep/22.

3 Se instala Subbase PRO+130 al PRO+150.

Rodolfo Uruaga

Domingo 25 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 Operadores de pajarita, 1 Operador de MINI, 1 operador de vibro.

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 MINcargador 1 Vibrocompactador, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Se cerro tramo PRO+044 al PRO+080 en subbase granular.
2. Se instaló formaletas para Concreto PRO+044
3. Se realizo excavación PRO+160 al PRO+170, se instaló Geotextil y Pajeno.
4. Se Solicita entrega de informes Mensuales Concluidos

Rodolfo Uruaga

Actividades

1. Se Solicita a la firma Contratista Corporación Vial de Subbase al Primer PROTRO al PRO1050 en un Ancho de 6m para instalación de formaletas y clavos de trabajos recibido por topografía y densidades.

2. La firma Contratista que Como medida al plan de Contingencia trabajara el día Domingo 25 Sep/22.

3. Se instala Subbase PRO1180 a/ PRO1150.

Rodolfo Uniago

Domingo 25 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 Operadores de pajarita, 1 Operador de mini, 1 operador de vibro.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 mini cargador 1 vibrocompactador, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades.

1. Se Corto tramo PRO1044 al PRO1080 en subbase granular.
2. Se instaló formaletas para Concreto PRO1044
3. Se realizo Excavación PRO1160 al PRO1170, se instaló Encofrado y Pegante.
4. Se Solicita entrega de Materiales Concretos

Rodolfo Uniago

38

Cuadrilla de empleados:
Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Mecanico, 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores de Mandantes, 1 operador de Minicargador, 1 operador de Vibro, 1 operador de Minicargador. Equipo en obra: 2 pajaritos, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, Volquetas.

Plan: Solicitado

Dificultades

1. Se le informa a la Firma Contratista no instalar concreto en tramo PROTO44 al PROT120 hasta tanto no se solucionen problemas de filtraciones presentados, las cuales fueron reportadas por la Firma Contratista mediante oficio Radicado LP-SPM-005-2022-41 en Fecha 24 de Sep/22

2. Se le informa a la Firma Contratista que la Firma interventoria en Fecha 19 de Sep/22 remitio oficio a la Entidad Contratante solicitando Visita del diseñador en Campo para revisar el tema de Cunetas a construir y problemas de infiltraciones presentado en el tramo PROTO44 al PROT120

Rodolfo Arriaga

3 Se inicia Excavación PROT98 Segundo frente - Se solicita traer otro Minicargador y mas Volqueta Para Retiro de Material, Excavación de 70 mts Aprox

4 Se Retira Material de Excavación desde el PROT120 al PROT100 producto de Excavación el cual no habia sido retirado

5. La firma Contratista pese a la Solicitud de la Interventoría dejo instalar concreto en el tramo PROTO44 al PROT120, Instaló Concreto 36 ml costado Derecho desde el PROTO44 al PROTO80.

6. La firma Contratista pasó los vehiculos con Concreto por el pavimento de 7 45 días de fundido sobre la calle 2 Sur PROTOOO al PROTO36. no esperando el tiempo adecuado para esta actividad.-

Rodolfo Uruguay

Martes, 27 de Sept/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, Ayudantes, 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores de pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de Mini cargadora.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 vibrocompactadora 1 Mini cargador, Volquetas.

Clima: Lluvias Moderadas en la Mañana

Actividades:

1. Se realiza Excavación desde el PROT790 al PROT780, cuentas, Se instala Geotextil y Pegón. Se libera tramo por topografia para Subbase
2. Continua Excavación en PROT720 al PROT680 Se le indica a la firma Contratista que antes de Subir a nivel de Subbase Se debe

Recibir a nivel de Lajón.

3. Debido al daño presentado de Tubería de agua de 3" se presenta encolchamiento desde el PK0+140 al PK0+180; se debe retirar Material y Mejorar este tramo.

4. Seguimiento al plan de Contingencia:

A Fecha de hoy 23 Sep/22 deberíamos tener:

- Frente 1: PK0+000 al PK0+040
Tramo PK0+000 al PK0+030.
Cuadrilla 3: 2 oficiales, 2 obreros, 1 Cano Carga bordillos.
Actividad: Construcción de Espacio público, con Inicio de Instalación de bordillos.
Cumplimiento: Se evidencia el No Cumplimiento de esta Actividad.

- Cuadrilla 4: 2 oficiales, 3 obreros, 1 cano Carga bordillos
Actividad: Espacio público
Cumplimiento: Se Evidencia el No Cumplimiento.

- Tramo PK0+040 al PK0+120.
Actividad: Pavimentación.
Cuadrilla 2: Concreto premezclado, Vibrador Concreto, Cortadora Concreto, 1 Maestro, 1 oficial, 4 obreros.
Cumplimiento: No se puede iniciar hasta no Solicionar Problemas de Infiltración de Agua Sobre excavación realizada.
No Cumple - Se espera respuesta del Diseñador

- Tramo PK0+120 al PK0+190
Actividad: Excavación, Lajón y Subbase granular.
Cuadrilla 1: 1 Mini cargador, 1 vibrocompactador, 1 obrero, Herramienta, 1 Cadenero.
Cumplimiento: A la Fecha Se esta salvaguardo esta Actividad. Cumple.

Frente 2: PROT440 al PROT798.
Tramo PRO T700 al PROT798.
Actividades: Excavación, Rajón y Subbase
Cuadrilla 5: 1 Pajarita, 1 Minicargador, 1 vibrocompactador
3 volquetas; 1 obrero, 1 topografo, 1 cadenero.
Cumplimiento: En la jornada se han excavado 20 mts lineales
- Se han instalado 10 ml de Rajón.
- No se ha instalado Subbase granular.
No Cumple.

Rodolfo Umaya

Miércoles, 28 de Sept/22
Personal en obra: 1 Residente, 1 Director, 1 SISO, 1 Social
1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, Ayudantes, 1 Maestro
1 oficial, 2 operadores de pajarita, 1 operador del Vibro
1 operador Minicargador

Equipo en obra 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador, 1 minicargo
Volquetas.

Clima: Día Soleado

Actividades
1. Instalación de Subbase PRO T798 al PROT780.
2. Se reemplazó material de Subbase costado Izquierdo PRO T780 al PRO T794, 12 ml x 3m
3. Se Demuele Registro Vivienda costado Derecho Progresiva de Tienda para Reubicación con Instalación de tubería de 6".
4. Actividades de Excavación Paralizadas en este frente de Obra PRO T120 al PROT190.

5. No se cuenta con suministro constante de Material de Rajón y Subbase granular. Se debe incrementar Suministro, Existe dificultad en el Suministro por parte de la Cantera

Jueves; 29 de Sept 22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 maestro, 2 operadores de Pajarita, 1 operado de Vibro, 1 operador de MINI

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 Vibrocompactador 1 MINI cargador, Volquetas

Clima: ~~Soleado~~, Lluvias toda Tarde

Actividades

- Continua excavación PR0+700 al PR0+770, Se averigua Equipo (Mini cargador)

- No se cuenta con materiales Suficientes de Rajón y Subbase granular para instalación en Campo. Hay dificultad en el suministro por la cantera

- Se reemplaza Material de Rajón y Subbase granular por Acolchamiento PR 0+090 al PR0+102. por aguas lluvias y filtraciones

- Se Solicita a la Firma Contratista que debe Realizar Cabezas de Excavación, Instalación de Geotextil, Rajón y Subbase en el Resto de tramo de vías a intervenir, Asumo se tiene respuesta del Director de la alcaldía

Se Solicita a la Firma Contratista Mejorar el Suministro de Materiales en obra.

Viernes, 30 de Sept/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sito, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 operadores de Pajaritas, 1 operador de Mini, 1 operador de Vibro

Equipo en obra: 2 operadores de Pajarita, 1 operador de Minicargador, 1 operador de Vibrocompactador

Clima: Lluvias en la Tarde, Noche.

Actividades.

1. Maquinaria en obra Varsola (2 pajaritas), Se Solicita al Contratista arrestar cuanto antes los equipos para Continuar Con las Excavaciones y Actividades en desarrollo del contrato.

2. Excavación de Aguas Excavación PK0+770 a/PK0+78 Por lluvias en la Tarde del día anterior

3. Se Solicita a la Firma Contratista fortalecer el pavimento del PK0+000 al PK0+036. Así mismo limpiar el Area de este pavimento, la Comunidad retira la Señalización.

4. Se evidencia el poco Suministro del Material de Base y Subbase, Por bloqueos y el mal estado de la Vía de la carrera, se dificulta el transporte de los materiales.

44

5. Se Solicita a la Firma Contratista mantener en campo el Suministro Constante de rajón y Subbase.

Rodolfo Urrego

Sabado, 1 de Octubre del 2022.

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SiSo, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 operadores de pajarita, 1 operador de Mini, 1 operador de Vibro

Equipo en obra: 2 pajaritas (Averiadas), 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

clima: Soleado

Actividades

1. Actividades paralizadas por Equipos (pajarita) Dañados.

2. Se realiza Filtro PK0+044 al PK0+120 costado Derecho, para evacuación de las aguas de filtración

3. Se Solicita a la Firma Contratista Realizar Trama protodo al PK0+036, el cual se encuentra pavimentado desde el 13 de Sep/22 costado Derecho y costado Izquierdo desde el 21 Sep/22

4. Se Solicita a la Firma Contratista Cambiar de Equipos si estos No Cumplen en Campo con las Actividades previstas para estos.

Lunes, 03 de Octubre del 2021.

personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro, 2 Operadores de pajarita, 1 operador de Vibrocompactador 1 de MiniCargador

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Continua Excavacion PRO7770 al PR 760

2. Se Instala la Piedra rajon en los PR 760 hasta la 770.

3. Se Solicita a la firma Contratista el arreglo de una pajarita y Mas Suministro de Material

1. Instalacion de Subbase en una parte del PR 760 PRO770

4. Se Solicita a la Firma contratista Señalizacion tramo Calle 2 SUR PRO000 al PRO036, toda vez que el tramo esta abierto para cualquier Vehiculo

Roberto Urrego

Martes 04 de octubre de 2021

Personal en Obra. 1 Director, 1 residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro 2 operadores de pajarita, 1 operador de VibroCompactador, 1 operador Minicargador.

Equipo en Obra. 2 Pajaritas, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima, Soleado.

10

Actividades

1. Relleno de la piedra razon en el PR 760 al PR 770, Recibido por parte de la Intervencion.

2. Nivelacion del terreno y Nivelacion de la Subbase.

3. Se Solicita a la firma Contratista Contar con el Suministro del material Subbase.

4. Se Solicita a la firma Contratista Retirar Material Suministrado a Campo en PROL 770 toda vez que se evidencia material plastico y Muy Fino cambiando el Material actual Utilizado en Campo. (Y asi lo Hizo, se cambio el material).

5. Se Solicita a la Firma Contratista Cumplir con el plan de Contingencia presentado a la Firma ~~Interventora~~.

Actualmente se tiene en Campo un frente de obra activo

Rodolfo Urvina

Miercoles 05 de octubre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 residente, 1 Siso 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro, Ayudantes, 2 operadores de Pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de Mini

Clima: Sobra lluvia de 10:30pm a 12:00pm

Actividad

1. Relleno de Subbase en el PR 760 al PR 780.

2. Nivelacion de Subbase. en el PR 760 al PR 780

3. excavacion del PR 760 al PR 750. Carril Izquierdo

3.1 Se realiza Visita de Diseñador por parte de la Alcaldia

4. Continua Pavimtacion desde el PR 44.33 hasta el PR 80. por el carril Izquierdo. Aprobado por la Interventoria

5. Se Solicita a la Firma Contratista presentar:

- Informes mensuales N°1 corregidos, Informes Mensuales N°2, Actas de Veracidad debidamente diligenciadas y Acta de Compromiso

6. Se Solicita Señalización calle 2 sur, toda vez que no tiene tiempo para apertura, Pero la comunidad quita la señalización

7. El contratista debe Continuar con las Actividades de Excavacion, Relleno a Subbase en los tramos Programados.

Jueves 06 de Octubre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente 1 SiSo, 1 Social 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro, 1 ayudantes 2 operadores de pajarita, 1 operador de Vibro, 1 operador de Mini

Equipo en Obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador. 1 MiniCargador, Volqueta.

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Excavacion del Prol760 al Prol750 Carril Derecho.

48

2. Tallen del material Subbase en el PR0+160 al PR0+150.

3. Se Solicita a la firma Contratista Contar con el Suministro del Materia Piedra roja y el material Subbase.

4. Se le Solicita a la firma Contratista Cumplir con el plan de Contingencia Prefente a la firma Interventora

5 Se realizan densidades en tramo PR0+198 al PR0+060; las cuales No Cumplen Se Solicita realizar mas Compactación a Subbase para poder Liberar tramo para pavimento.

6 Se Libra tramo por topografía, Se verifican Cotas de Subbase granular

7. Se Realizan nuevamente densidades en Campo y Cumplen para Liberación del tramo

8 Se Solicita a la firma Contratista Continuar Con la Colocación del tramo PR0+080 al PR0+115 (debemos en Cuentas que falta Concepto del Asentado.)
9 Llega a obra bordillos prefabricados a la calle 2 Sur.

Viernes 07 de octubre del 2022


Personal de obra: 1 Director, 1 residente, 1 SiSo, 1 Social
1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes, 1 operador de
Vibro, 1 operador de Mini, 2 operadores de pajarita
1 topografo, 1 Cadenero.

Equipo en Obra: 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador
1 Mini cargador.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Inicia Pavimentación en el Prot 798 al Prot 760 del carril Izquierdo



2. Se le Solicita a la firma Contratista Indicar el proveedor de los bordillos prefabricado y asi mismo Indicar ensayos del Material

3. Se hizo revision de los bordillos y se Marcaron los que estan quebrados, se retiran 25 unidades

4. Se le Solicita a la firma Contratista Contar con el Suministro de Subbase y rajon

5. Se Solicita Senalizaciones calle 2 Sur, ya que no tiene tiempo para apertura, Se a señalizado N veces y la comunidad N veces quita la señalizacion

6. Se Instala bordillo Prefabricado a la calle 2 Sur en un costado de Via.

Sábado 05 de octubre de 2022


Personal de Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sobrestante, 1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 2 operadores de pajarita

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 minicargador, 1 vibrocompactador,

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua pavimentación desde el PR 0+798 al PR 0+770



2. Se Solicita a la firma contratista contar con mas suministro de subbase y piedra cafeon

3. Se Solicita a la firma contratista las señalizaciones en la calle 2 Sur y la 9 con la Vuelta.

4. Se le Solicita a la firma contratista entregar ensayos de los elementos prefabricados antes de iniciar cualquier actividad

5. Se continúa la instalación de bordillos en la calle 2 Sur. Carril Derecho.

6. Se inician los cortes en pisos y su demolición para la construcción de andenes

Lunes 10 de Octubre de 2022

Personal de obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO. 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, ayudantes. 1 topografo, 1 Cadenero, 1 operado de mini cargador 1 operador de Vibrocompactador, 2 operadores de pajarita

Equipo en obra: 2 pajarita, 1 mini cargador 1 Vibro compactador, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Inicio de excavación de PROT750 hasta el PROT730

2. Se para la obra por Documentación de pajarita y operador, la cual se entrego a medio día

3. Se le Solicita a la firma Contratista Contar con el material Subbase y piedra tajon

4. Se Solicita a la firma contratista las Señalizaciones de la Calle 2 Sur y la 9, la cual fue instalado pero la comunidad la retiro.

ANEXO 13

INFOME SOCIAL No.2 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

INFORME SOCIAL No. 2 DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ORIGINAL

MONTERÍA – CÓRDOBA, OCTUBRE DE 2022

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. CONTRATO DE OBRA N° LP – SPM – 008-2022 - CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 4
2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA. 4
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES. 4
3.1. RECURSOS. 4
3.1.1. RECURSO HUMANO. 4
4. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES. 4
4.1. FUNCIONES RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 6
5. PROGRAMAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 6
5.1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. 8
5.1.1. ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES. 8
5.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 8
5.1.3. OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD OAC. 9
5.1.4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. 9
5.1.5. REUNIONES INFORMATIVAS 10
5.1.6. PIEZAS COMUNICACIONALES INFORMATIVAS. 10
5.1.7. CARTELERA INFORMATIVA. 11
5.1.8. VALLA INFORMATIVA Y PASACALLES. 11
6. PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 11
6.1. CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. 12
6.2. PROGRAMA INVENTARIO DE ESTADO DE PREDIOS. 12
6.2.1. LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD. 13
6.2.2. PERMISOS DE INTERVENCIÓN. 13
6.2.3. PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. 13
6.2.4. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 13
6.2.5. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA. 14
7. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
7.1. FUNCIONES DE INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 15
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 15
9. ANEXOS A INFORME SOCIAL. 16

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de Interventoría del componente del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS), corresponde al período comprendido entre el 01 de septiembre de 2022 al 08 de octubre de 2022 de las actividades ejecutadas por la firma contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, en desarrollo del contrato obra Nº. LP – SPM – 008-2022 cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, y son presentadas a ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS en calidad de firma Interventora, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-007-2022, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

A continuación, se describen los programas, estrategias y actividades ejecutadas por el contratista en cumplimento a las obligaciones contractuales y del plan de gestión social de obra.

2. CONTRATO DE OBRA N° LP – SPM – 008-2022 - CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONCEDENTE	ALCALDIA DE MONTERIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
CONTRATO Nº	LP – SPM – 008-2022
DIRECCIÓN	Carrera 2 # 31-48 Montería - Córdoba
TELÉFONO	E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com
SUPERVISIÓN	ING. GERMAN QUINTERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/07/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE DICIIEMBRE DE 2022
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES.

3.1. RECURSOS.

3.1.1. RECURSO HUMANO.

Se conforma un equipo interdisciplinario idóneo, con habilidades y conocimientos requeridos para articularse, aportar y apoyar el seguimiento y control a la Gestión Social de las obras, este equipo es garante del cumplimiento del Plan de Gestión Social de la Obra en los aspectos que tengan responsabilidad y competencia.

A continuación, se relaciona el perfil de los profesionales que integraran el equipo de la Gestión Social, tanto por parte de la interventoria, como del contratista, siendo el profesional en trabajo social o afín, el responsable directo y los demás profesionales apoyo a la gestión de acuerdo con el alcance del cargo:

RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

RECURSO HUMANO INTERVENTORIA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	**CARGO**
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA
VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR	INGENIERO CON POSGRADO EN VÍAS
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	PROFESIONAL SG-SST
SANDRA MILENA GARNICA CÁRDENAS	CONTADOR
YANETH PATRICIA RUEDA LANDINEZ	ABOGADO
AHIMELEC DANIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ	TOPÓGRAFO
JANITH SULAY JAIMES PABÓN	SECRETARÍA
GUSTAVO DAVID POLO SOTO	CONDUCTOR
MARCO DAVID RICARDO CASTRILLÓN	CADENERO

Tabla 1. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

RECURSO HUMANO	
NOMBRE	**CARGO / OFICIO**
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA
RODOLFO URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS
DIANA PALACIO MOSQUERA	ING ESPECIALISTA AMBIENTAL
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA
MARIA CAMILA CABALLERO	SECRETARIA
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO
NINI JHOANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL
ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO	AUXILIAR SISO
ESTEBAN FIGUEROA SALAS	ING. AUXILIAR DE OBRA
MATEO DE JESUS SEBÁ FERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO
ERICK PLAZA ARDINES	CADENERO
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR
JHONATAN LEON MARTINEZ	AYUDANTE
EDER LUIS BLANCO TABORDA	AYUDANTE
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	AYUDANTE

RECURSO HUMANO	
NOMBRE	**CARGO / OFICIO**
ALCIDES MANUEL NAVARRO VELAZQUEZ	AYUDANTE
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	OFICIO VARIOS
NANCY ESTHER URANGO ORTEGA	BODEGUERA
JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO	AYUDANTE
ELIER ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE
MIGUEL A GONZALES MORALES	OFICIO VARIOS
ALVARO MIGUEL GALARAGA ACOSTA	CONDUCTOR VOLQUETA
GEINER DAVID MESTRA MARTINEZ	OPERADOR MINICARGADOR
OSCAR LUIS ARRIETA LORA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
RAFAEL DARIO PASTRANA PASTRANA	OPERADOR EXCAVADORA
CARMELO ENRIQUE LLORENTE GALVAN	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
OSCAR DAVID NORIEGA MEJIA	OPERADOR DE VIBRO-COMPACTADOR

4. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES.

El personal social, desarrolla dentro de sus funciones el manejo del impacto social generado por las obras en la comunidad, de forma directa e indirecta impactadas por las mismas actividades constructivas adelantadas por las mismas. Por lo tanto, las funciones básicas y las actividades se direccionarán para prevenir, reducir, controlar y mitigar los impactos negativos generados por las obras en sus áreas de influencia, a través de los contratistas, trabajadores y demás actores que participan en la ejecución del contrato, así como potenciar los impactos positivos, con la consecuente apropiación por parte de la comunidad de las obras, construida mediante procedimientos de acompañamiento y de herramientas sociales adecuadas.

4.1. FUNCIONES RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA.

- Redactar los contenidos del componente social del PGS.
- Presentar insumos para los informes a la interventoría del contrato, incluyendo todas las actividades sociales del periodo
- Diligenciar las actas de reunión y formatos de visita.
- Realizar recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos críticos, identificando problemas y potencialidades, presentando el respectivo informe.

- Diseñar e implementar un sistema comunicacional asertivo entre la comunidad, contratista, interventoría, secretaria de infraestructura y la administración municipal.
- Elaboración de herramientas comunicativas y de acercamiento a la comunidad con la obra como: volantes, archivo fotográfico con la correspondiente fecha de captura de la imagen, y de prensa, levantamiento de actas de vecindad, instalación de puntos de atención personal y virtual.
- Realizar la recepción, atención y seguimiento a las PQRS y cerrarlas en el menor tiempo posible.
- Capacitar y entrenar al personal en temas sociales, con la periodicidad definida en el plan de manejo ambiental y/o cuando las condiciones de la obra así lo requieran.
- Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad, interventoría o Secretaría de Infraestructura.
- Convocar, preparar y moderar las reuniones de inicio y finalización de obra. Instalar, convocar, preparar y moderar el Comité ciudadano de obra que se reunirá según el caso
- Atender las solicitudes demandadas por la interventoría o por la Secretaría de Infraestructura.
- Atender, gestionar y brindar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la comunidad.
- Promover e impulsar la participación y las veedurías ciudadanas.
- Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación y divulgación de la obra.
- Gestionar y programar reuniones informativas y socializaciones del proyecto ante alcaldías y comunidad en general.
- Elaborar actas de entorno, actas de vecindad, actas de intervención del predio.
- Presentar programación y cronograma de actividades estipuladas en el plan de gestión social.
- Presentar el registro del personal de obra contratado para la ejecución del proyecto.
- detallar numero de empleos directos e indirectos generados en la comunidad, describiendo cuantos son mujeres y cuantos hombres
- Asistir a comités de obra y comités sociales.
- Reportar a la interventoría las actividades sociales realizada en el periodo reportado.

5. PROGRAMAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

5.1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Con el propósito de favorecer el buen desarrollo del proyecto, cumplir con el avance esperado y evitar al máximo los impactos negativos y las inconformidades, la empresa contratista brindó a la comunidad información clara, veraz y oportuna, relacionada con las situaciones que puedan generarse por la realización de las obras que se ejecutaran en el desarrollo del presente contrato, por lo anterior y considerando la importancia que tienen las buenas relaciones entre las partes que interviene en el desarrollo del proyecto desde el componente social, se implementaran diferentes estrategias de difusión, comunicación e información que tienen como propósito principal, la participación y vinculación activa de la población y minimizar de esta manera las afectaciones que se puedan generar con el desarrollo de la obra.

Para tal fin, dentro del Programa de Gestión Social se establecieron estrategias y acciones de intervención que se relacionaran a continuación, realizando la aclaración que a medida que se vayan implementando se les hará seguimiento con los resultados obtenidos en cada informe mensual.

5.1.1. ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES.

Durante la ejecución del proyecto, el contratista avanza con el acercamiento, identificación y recopilación de los datos con los diferentes actores institucionales, sociales y comunitarios, que están presentes en la zona de influencia del barrio Alfonzo López y los Araujos y donde paulatinamente se empieza a definir y ejecutar actividades del presente proyecto, para ello se ha tenido y se tendrán en cuenta los siguientes grupos de interés claves: actores políticos, actores económicos, actores religiosos, actores educativos, actores culturales, líderes comunitarios, agremiaciones y/o asociaciones, entidades públicas, entidades privadas y otros actores representativos en las subregiones que son relevantes para constituir una red de apoyo durante la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Social a lo lardo de todo el proyecto para facilitar y lograr de esta manera, la identificación de la población objeto de la obra.

Las informaciones correspondientes a los datos de contacto serán recopiladas en una base de datos, para su registro y acceso a disposición de las necesidades del proyecto. Esta será presentada en el siguiente informe mensual y se ira alimentando a medida que avance el desarrollo del contrato de obra en

mención. Durante el presente periodo se adelantaron presentaciones formales con alcaldías y JAC de la zona de influencia del contrato de obra.

5.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

En el marco del desarrollo del contrato de obra en mención, se han logrado identificar a los propietarios de las viviendas, la cual se encuentra ubicadas entre la CALLE 2 CRA 8E Y CALLE 9 CRA 8E donde se está adelantando las actividades de levantamiento de actas de vecindad.


Es de vital importancia mencionar, que los barrios Alfonso López y Los Araujos han brindado toda la información y acompañamiento pertinente al desarrollo del contrato de obra.

Durante este periodo se han realizado acercamientos con los beneficiarios del proyecto al momento de la realización de las actas de vecindad. Igualmente, a las reuniones de socialización con actores sociales, presidentes de JAC y entidades públicas de la zona de influencia del contrato de obra.

5.1.3. OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD OAC.

El contratista generará y dispondrá espacios de acercamiento y diálogo con la comunidad del área de influencia y con las autoridades locales, con el fin de mantener comunicaciones asertivas y relaciones armónicas que garanticen el cumplimiento del cronograma de actividades propuesto, así mismo, brindar información a la comunidad acerca de las obras en ejecución y atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que puedan generarse en el desarrollo de las obras. (PQRS)

El espacio que se constituye como Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) para la atención a la comunidad, es la oficina del contratista, en los horarios de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm y Sábado 7:00 am a 12:00 pm, la cual se encuentra ubicada en la CALLE 6 # 8E - 15 Diagonal a la Tienda Pimpinela del Barrio Alfonso López punto estratégico del desarrollo de la obra, se cuenta con la instalación dotada con los equipos de oficina requeridos para el desarrollo adecuado y efectivo de atención a la comunidad.

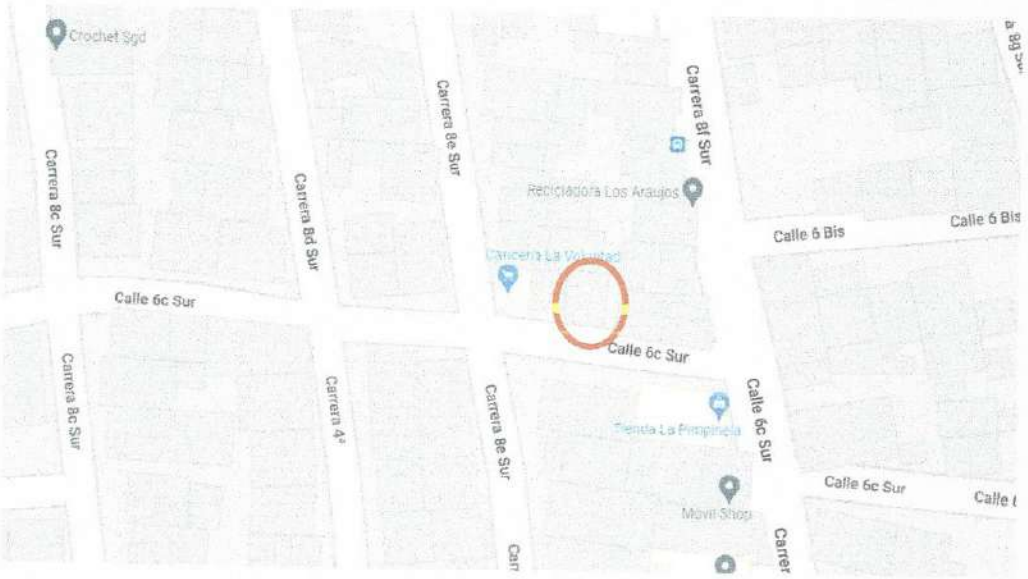



5.1.4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

Las estrategias de difusión y divulgación establecidas tienen como propósito dar a conocer la información completa del proyecto, además de procurar la participación y vinculación activa de la comunidad y minimizar las afectaciones que pueda generar la obra.

5.1.5. REUNIONES INFORMATIVAS

El contratista establecerá y adoptará la implementación de la estrategia de reuniones informativas de socialización con el propósito de fomentar la participación y vinculación activa de la comunidad con el

propósito de brindar información clara, veraz y oportuna, relacionada con las características generales del proyecto, objetivos y alcances de las obras.

Para ello, el contratista incluye, dentro del Plan de Gestión Social la ejecución de socializaciones y reuniones de articulación institucional cuando sean requeridas.

5.1.6. PIEZAS COMUNICACIONALES INFORMATIVAS.

A medida que avancen las obras y de acuerdo con las necesidades que presenten las mismas, el contratista diseñará y distribuirá piezas comunicacionales como estrategia de difusión y divulgación oportuna del proyecto.

Las herramientas de las que puede hacer uso para llevar a cabo este proceso serán:

- Carteleras informativas
- Volantes informativos

5.1.7. CARTELERA INFORMATIVA.

El objetivo de las carteleras informativas se centra, en la implementación de las mismas, para la difusión de cierres parciales de la vía o para informar del proyecto en ejecución. Estas se estarán actualizando constantemente para mantener informadas a las personas de la zona del área de influencia del contrato.

5.1.8. VALLA INFORMATIVA Y PASACALLES.

Ubicación de una (01) valla informativa del proyecto, la cual fue ubicada en la calle 3 Sur sobre la carrera 8E Sur



6. PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

6.1. CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS.

En la reunión de socialización del proyecto se invitó a los asistentes a esta, para que hagan parte del comité de veeduría ciudadana.

Este estará encargado de vigilar y controlar la gestión pública y los recursos asignados para la ejecución del proyecto. También a través de medios de divulgación y reuniones, se convocará a la comunidad para que haga parte de la veeduría. Una vez conformadas las veedurías, se contemplarán reuniones con las mismas para el desarrollo del presente proyecto con el fin de conocer su percepción sobre los avances en el proyecto, sus inquietudes y sugerencias, y de esta manera generar una conexión en pro de las actividades constructivas de las vías a intervenir. Los encuentros se programarán de acuerdo con las necesidades y conformación de esta.

Partiendo de la necesidad de la creación del comité veedor, se conforma el comité de veeduría del proyecto:

LISTADO DE VEEDORES			
NOMBRES	**DIRECCION**	**CEDULA**	**CELULAR**
Carlos González Esquivel	CRA 8E CRA # 3 - 32	78.749.127	3233582522
Rafael Daza Padilla	CRA 8E CRA # 4 – 32	78.706.956	3126895007
Gregorio Sepúlveda Díaz	CRA 8E CRA # 4 – 24	6.870.246	3126340769
Hernando Pereira Hernández	CRA 8B # 6 I - 49	78.709.760	3136027120
Henrry Luna Torrecilla	CALLE 4ª # 8ª - 56	78.748,901	3103677528
Astrid Gámez Doria	CALLE 9 # 8B - 7	34.991.039	3137667686
Adalgiza Espitia Vargas	CALLE 6 # 8 – 24	34.996.659	3045385051
Aura Estela Tao romero	CALLE 6 # 8 – 24	50.909.103	3016735514

Ver anexo No.2

6.2. PROGRAMA INVENTARIO DE ESTADO DE PREDIOS.

6.2.1. LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD.

Durante el presente periodo y de acuerdo con el desarrollo de las obras que actualmente se llevan a cabo fue necesario hacer levantamiento de actas de vecindad, toda vez que en los sitios en donde en este momento se llevan a cabo las actividades constructivas de la vía, se involucran viviendas a las que se les puede generar afectaciones de forma indirecta por la implementación de maquinara. **(Ver anexo 1)**

6.2.2. PERMISOS DE INTERVENCIÓN.

A la fecha se están realizando actas de intervención de predios para la construcción de espacio público sobre la vía en construcción.

6.2.3. PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Actualmente se esta contratando personal en mano de obra No califica de la calle donde se está realizando la construcción de la vía carrera 8E Sur.

Así mismo se han generado 23 empleos directos e indirectos, entre profesionales aprobados, Mano de obra No calificada, equipo topográfico y Operadores de maquinaria

PERSONAL EN OBRA ADMINISTRATIVO

PERSONAL EN OBRA ADMINISTRATIVO			
	CARGO	**PE**	**PC**
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO PAVIMENTO MONTERÍA	Director De Obra		1
	Ingeniero Residente		1
	Ing. Especialista En Vías		1
	Ing. Especialista Ambiental		1
	Ing. Eléctrico		1
	Profesional Sisoma		1
	Secretaria		1
	Mensajero		1
	Trabajadora Social		1
	Auxiliar Siso		1
	Ing. Auxiliar De Obra		1
Sub Total		**0**	**12**

PE) Personal Externo PC) Personal Contratado

6.2.4. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El contratista brindó cumplimiento al proceso de selección y contratación del personal requerido para la ejecución de las actividades establecido en Plan de Gestión Social, realizando la divulgación y definiendo los mecanismos para la búsqueda de aspirantes, garantizando la contratación de mano de obra no calificada.

PERSONAL EN OBRA OPERATIVO

PERSONAL EN OBRA ADMINISTRATIVO			
	CARGO	**PE**	**PC**
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO PAVIMENTO MONTERÍA	Maestro de obra		1
	Ayudantes		6
	Topógrafo		1
	Cadenero		1
	Operadores de equipos		5
	Conductores de volquetas		3
	Oficios varios		2
Sub Total		**0**	**19**

PE) Personal Externo PC) Personal Contratado

Para este periodo, el total del personal del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA es de 31 personas.

6.2.5. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA.

A continuación, mostramos el consolidado de la gestión social, en donde se presenta el resumen de las actividades ejecutadas por el componente social durante el periodo correspondiente a este informe.

CONSOLIDADO GESTIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD	CANTIDAD
N° de Actas de Vecindad	50
Fecha de Actualización	08/10/2022

7. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.

INFORMACIÓN GENERAL ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
ENTIDAD CONCEDENTE	MUNICIPIO DE MONTERIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATO Nº	CMA-SPM-007-2022
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
SUPERVISIÓN	SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/07/2022
FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2022

7.1. FUNCIONES DE INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA.

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento y verificación del desarrollo de las actividades realizadas por del **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** realizó las siguientes actividades y gestiones:

- Actas de vecindad y sus respectivos registros fotográficos para revisión y actualización.
- Acompañamiento y seguimiento a convocatoria y conformación de veeduría ciudadana.
- Elaboración de caracterización de personal en obra.
- Verificación de estrategias de atención y divulgación a la comunidad: buzón de sugerencias y carteleras institucionales y municipales.
- Reporte a la Alcaldía de Montería de frentes de trabajo activos y de zonas comunes y campamentos.
- Recorridos de obra con la entidad contratante
- Verificación el listado de contratación del personal.
- Gestión documental: elaboración de actas, reportes de actividades sociales, informes mensuales.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

✓ Desde el área de gestión social del proyecto se continúan desarrollando las actividades de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de la Obra y a los requerimientos de los avances en la obra civil del proyecto según las necesidades de cada frente que se está interviniendo.

✓ La firma contratista debe ser más ágil al momento de realizar las actas de vecindad de las viviendas aledañas al proyecto de obra

✓ El contratista deberá tener presente que, para la realización de la socialización de terminación de las obras, será necesario contar con el visto bueno de la supervisión y la interventoría del proyecto para la convocatoria, logística y realización de esta.

✓ Se hace énfasis al profesional social del contratista en la importancia de capacitar continuamente al personal que durante el desarrollo del proyecto se encuentre en obra; toda vez que es esencial para las relaciones interpersonales la sensibilización de las dinámicas sociales.

✓ El contratista deberá avanzar con la constitución de la veeduría ciudadana ante la personería del municipio de acuerdo con el alcance y el impacto de las obras.

✓ Es importante cumplir con este requerimiento establecido en el pliego de condiciones.

9. ANEXOS A INFORME SOCIAL.

Anexo 1. Actas de Vecindad

Anexo 2. Conformación de veedurías

ANEXOS

ANEXO 1

ACTAS DE VECINDAD

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM Julio AA 2017

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Felipe Santiago Alvarez Berbel
Dirección: Cra 8c 2-02
Teléfono: 3217384892 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts):
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 6876307

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [X] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros de Bloque de Cemento 1 piso	1 Habitacion
MUROS: Viga de Amarre.	1 Baño.
CUBIERTA: Eternit.	Local.
PISOS: Baldosa.	
FACHADA: Pintada y Estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 6876307

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Aline Romero
C.C. o NIT: 47666740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 22 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION
x El local pertenece al predio del taller de Soldadura - Mismo dueño. x presenta landen en Ceramica.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

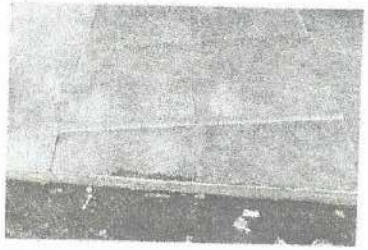


FOTO 1

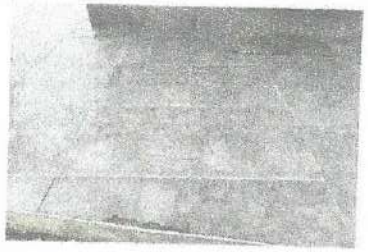


FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS Folios

Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 6876307

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Ninis Rapelo
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente Interventoría
Nombre: Efren Rojas Arenas
C.C. o NIT: 11.079.644

Calle 7 Sur

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA | Acta No.: 1 | Fecha de Diligenciamiento: DD 28 MM Julio AA 2017

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Maria Hernandez Ruiz
Dirección: Calle 2 Cra 8 E # 2-03
Teléfono: No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9mts X 18mts.
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 6.582736

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X	X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [X] NO [ ]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [X] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1 Piso Bloque de cemento Columna en concreto de Forma Circular	3 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre - Columnas. en Anden.	2 Baños
CUBIERTA: Eternit y Zinc.	1 Cocina
PISOS: Cemento Pulido con grietas.	
FACHADA: Pañete Liso	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 6557936

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Rolero
C.C. o NIT: 47606340

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Arregoces
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM Julio AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION

* La vivienda presenta columnas en concreto las cuales quedaran ubicadas dentro del diseño del espacio publico

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

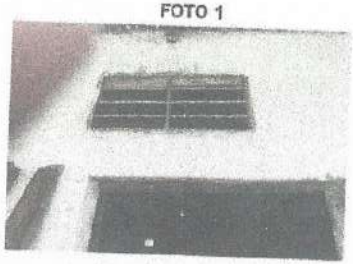


FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

X Jose Mendoza
Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 6987736

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre:
C.C. o NIT: 1066740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 28 MM 07 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Felipe Santiago Alvarez Bertel.
Dirección: Cra 8e 2-02
Teléfono: 321 738 4872 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 3mts X 13.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muro en 1 Piso Bloque de cemento Obra negra.	4 Habitaciones.
MUROS:	2 Baños.
CUBIERTA: Zinc y Eternit	1 Cocina.
PISOS: Plantilla en concreto.	
FACHADA: En obra negra.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS Folios

Firma Propietario

Nombre: X
C.C. o NIT: 6876307

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Adonis Pedero
C.C. o NIT: 49606 940

Rodolfo Arteaga

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION
El predio es el mismo que el local de la Droguería.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4




FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

X Polos

Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 68763074

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nilda J. Romero
C.C. o NIT: 49606748

ERA

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 28 MM 07 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yanaa Cuello Espitia

Dirección: CR 8F 2A-30

Teléfono: _____ No. de Pisos: _____

Longitud de Frente (mts): 9mts x 18mts

Matricula Inmobiliaria No.: _____

Cédula Catastral: _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable		X	
7. Otros			¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal		¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

¿Cuántos? _____

¿Tiene uso comercial?

SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda un piso con Muro en bloque. Maizo	UN local
MUROS: Columnas Viga de Amarre	UN SALON DE 8 mts con 18m.
CUBIERTA: Eternit.	
PISOS: Cemento Pulido Buen Estado	- Sobre la vía a construir Presenta anden en Concreto
FACHADA: Pintada y Estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

X _____

Firma Propietario

Nombre: Teofilo Barcos

C.C. o NIT: 78748171

Arrendado

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Flopero

C.C. o NIT: 49606744

Rodolfo Uneoma

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre: _____

C.C. o NIT: _____

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION

x presenta con Anden en Concreto parcial a la Intervencion de la via.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

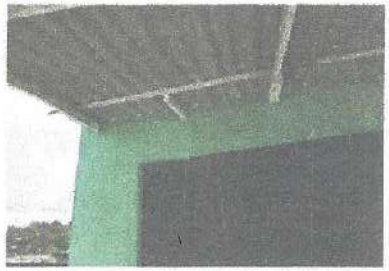


FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: Teofilo Garces
Arrendado, 7874817-1

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 22 MM 07 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jesusita del carmen Velasquez f
Dirección: Dva 8e # 2 - 13
Teléfono: No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9mts x 22 mts.
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 25764186

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		Recibe Medidor de gas.
6. Televisión Cable	X		
7. Otros			¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muro en Bloque de concreto 1 piso, Anden en piso pulido con Rejas y Columnas Graniles en concreto	4 Habitaciones
MUROS: columnas Viga de Amarre. Buen Estado	2 Baños
CUBIERTA: Eternit	Cocina
PISOS: Cemento Pulido Agrietado	Patio.
FACHADA: Pintada y estucada	OTRO, ¿Cuál? Presenta Rejas Metalicas y columnas en Fachada de Vivienda

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 25.764.186.

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Dimy Romero
C.C. o NIT: 49606240

Rodolfo Urrutia
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION La Vivienda esta en buen Estado no Presenta grietas ni Fisura.

* La Vivienda esta en la linea del paramento por lo que hay Corte de Piso y Reja. Hay una Fachada que hay que Demoler porque Pasa Sobre el Anden diseñado

* Se debe Reubicar Medidor de Gas.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

X Teresita Velez

Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 25-764786.

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Dini Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente


Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM 07 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

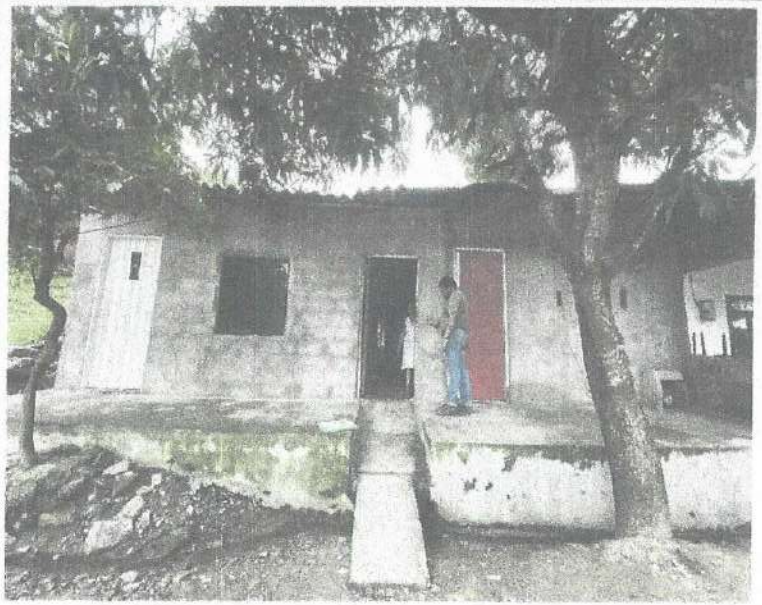

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Maria Meneses Correa
Dirección: Cra 3e # 2.05
Teléfono: _____ No. de Pisos: _____
Longitud de Frente (mts): 9mts x 20 mts
Matricula Inmobiliaria No.: _____
Cédula Catastral: 32115097

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos? _____
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Un piso con Muros en Bloque de Cemento	4 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre	1 Baño
CUBIERTA: Zinc + Eternit	1 Cocina
PISOS: Plantilla y Barro. En mal Estado	1 Patio.
FACHADA: pañete En obra gns.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS Blanca Meneses
Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 32115097

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Rodolfo Arregoces
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: _____
C.C. o NIT: _____

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	ACTA DE VECINDAD FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES		
	Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Acta No.: 1	Fecha de Diligenciamiento: DD 27 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION
x la vivienda tiene cm de mas.
x Vivienda presenta anden en Concreto Rustico.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1

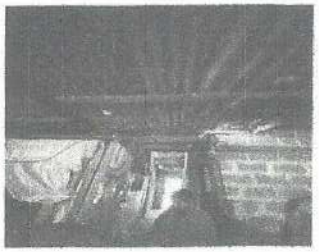


FOTO 2

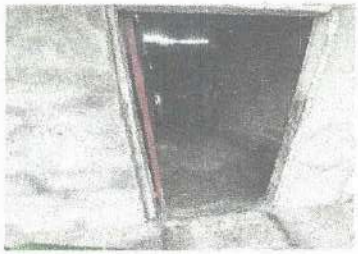


FOTO 3

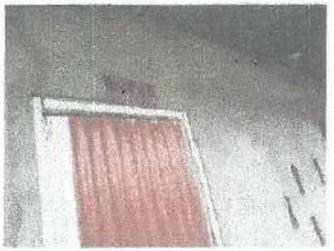


FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	ACTA DE VECINDAD FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES		
	Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Acta No.: 1	Fecha de Diligenciamiento: DD 27 MM 07 AA 2022

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DIA DE DE 2022

FIRMAS Blanca Meneses 32115097.
X Yessica Negrete Coy

Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 1192815571

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Dani J Rojero
C.C. o NIT: 49606240

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

3.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 22 MM 07 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rosa maria Arteaga Dona
Dirección: Cra 8 2 -21
Teléfono: 3145772256 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9mts - 18
Matrícula Inmobiliaria No.: 50.892 602
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque. de cemento, con Rejas.	3 Habitaciones.
MUROS: Viga de Amarre.	1 Sala
CUBIERTA: Eternit.	1 Comedor, Cocina
PISOS: Baldosa.	Patio.
FACHADA: Colonial Estucada - Buen Estado.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Rosa Arteaga D
Firma Propietario
Nombre: Rosa Arteaga
C.C. o NIT: 50892602

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Alexis Lopera
C.C. o NIT: 4960790

Rodolfo Arteaga
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 28 MM 07 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION La Vivienda En Buen Estado.

x Vivienda Presenta Rejas, anden en Concreto en frente de Vivienda.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

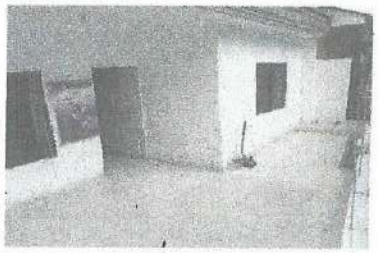


FOTO 1

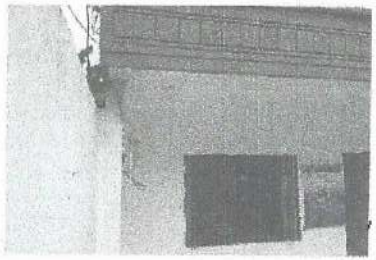


FOTO 2

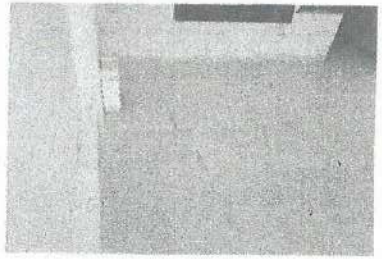


FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Rosa Maura O.
Firma Propietario

Nombre: Rosa Maura
C.C. o NIT: 58992652

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Anny Rivero
C.C. o NIT: 42606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 14 MM 09 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nilda Rosa Doria
Dirección: Calle # 2-
Teléfono: 3216762200 No. de Pisos: 1
Longitud de Frente (mts): 18 x 9. Mts
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muro de Bloque de Cemento # piso	3 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre Reja de metalica Columna en concreto	1 Baño
CUBIERTA: Eternit	1 Sala
PISOS: Ceramica.	1 cocina # Patio Pequeño.
FACHADA: Peñete Estucada Pintada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS Nilda Rosa Doria
Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 34957253.

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Ropero
C.C. o NIT: 49680740

Rodolfo Arteaga
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

9/24

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
* La vivienda sobre para el limite de paramento y se encuenta sobre el diseño del Espacio publico
* Esta contemplado el corte de Pisos y Rejas metalicas,

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6

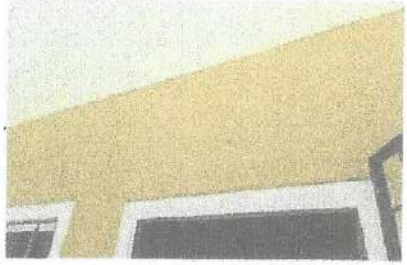


FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

X Matilde Rosa Paez

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 34957253

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nicol Lopez

C.C. o NIT: 49686740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 01 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: GUIDO ESPITIA JIMENES.
Dirección: CRA 8 #12-41
Teléfono: _____ No. de Pisos: _____
Longitud de Frente (mts): 9X 25 MTS
Matricula Inmobiliaria No.: _____
Cédula Catastral: 11.030441

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros			¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos? _____
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muro en Bloque de Cemento Viga de Amarre.	3 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre.	1 Sala
CUBIERTA: ETERNIT Y ZINC.	1 Cocina
PISOS: Cemento Pulido en Ceramica	1 Baño - Patio.
FACHADA: Pañete Liso Pintado.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Guido Espitia
Firma Propietario

Nombre: _____
C.C. o NIT: 11.030441

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Rapero
C.C. o NIT: 49 606740

Rodolfo Arregoces
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: _____
C.C. o NIT: _____

94

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
La Vivienda cuenta con corte de piso se encuentra dentro del paramento.
* Piso en Ceramica.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4




FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7

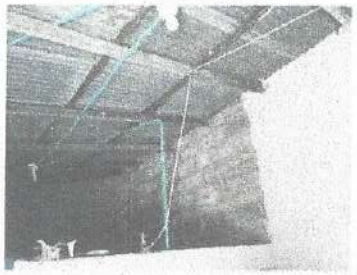


FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Guido Espitia

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 71.030.447

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Romero

C.C. o NIT: 49669140.

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 08 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolanda Romero Zapa

Dirección: Cra 2c # 2-47.

Teléfono: 304 468 4936 No. de Pisos:

Longitud de Frente (mts):

Matricula Inmobiliaria No.:

Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

¿Cuántos?

¿Tiene uso comercial?

SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque de cemento.	4 habitaciones
MUROS: Viga de Amare.	1 Cocina
CUBIERTA: Eternit.	1 sala 1 Patio.
PISOS: En cemento Pulido y Baldosa.	1 Baño.
FACHADA: Pañete y Pintada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS Yoreley Inez Zapa

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 34 987 071

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Lopero

C.C. o NIT: 49606740.

Rodolfo Arrieta

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION La vivienda esta por fuera del Parqueadero, lo que Amenta corte de muro que hace como Rejas dentro de la vivienda.
x Vivienda Con Antepecho, Piso en Concreto pulido

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5

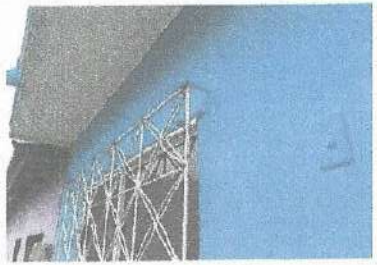


FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: Sorley ines Zapa

C.C. o NIT: 34 +87 071

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Ropero

C.C. o NIT: 42606740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA


ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 08 MM 03 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

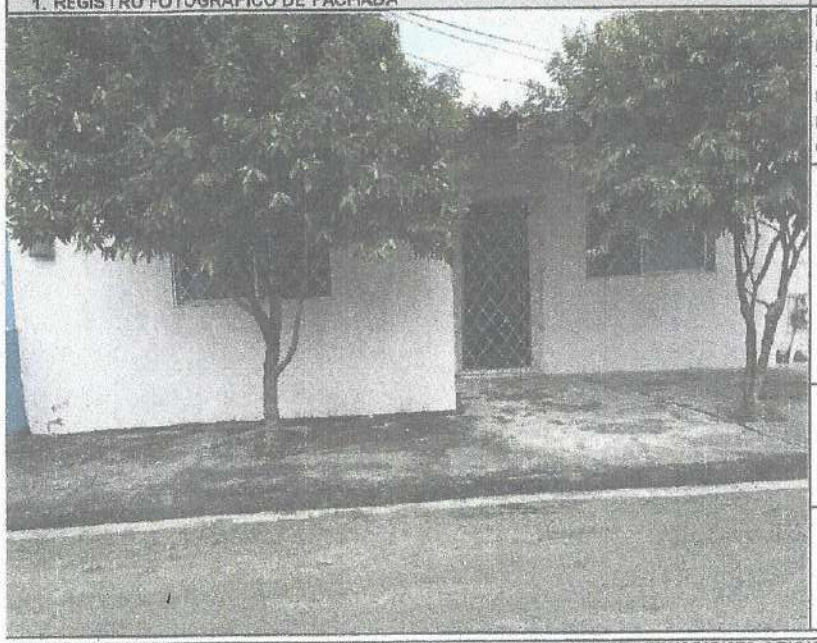

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yenys Rosario Angel Humanes
Dirección: Cra 8e # 2-57
Teléfono: 3217411093 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 8 x 15 mts
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque de cemento 1 Piso	3 Habitaciones
MUROS: en Bloque sin fisuras.	1 Baño
CUBIERTA: Tejas en zinc y eternit	1 cocina
PISOS: Cemento pulido con grietas.	1 patio.
FACHADA: Sencilla. PANETE	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Dolly Tous
C.C. o NIT: 34965390
madre

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nilda Ropero
C.C. o NIT: 19606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Urrea
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
Corte de piso y tala de Arboles se encuentran en la linea de paramento.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

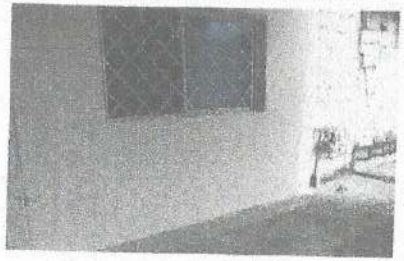


FOTO 1



FOTO 2

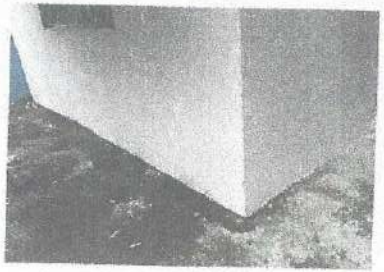


FOTO 3



FOTO 4

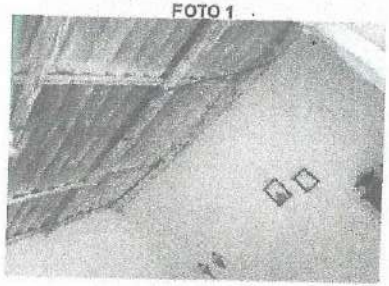


FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: Jorge Mora

C.C. o NIT: 34965340

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Rivera

C.C. o NIT: 1976067746

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 09 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marcelina Ines Alvarez Velasquez

Dirección: Cra 8e #42-67

Teléfono: 3012583623 No. de Pisos:

Longitud de Frente (mts):

Matricula Inmobiliaria No.: 25760715.

Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión Cable		X	
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal		¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

¿Cuántos?

¿Tiene uso comercial? SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1 Piso Bloque de cemento	3 Habitaciones.
MUROS: Viga de Amarre.	1 Patio
CUBIERTA: Zinc	1 Cocina
PISOS: Plantilla y Ceramica en cuartos	1 Sala. 1 Baño
FACHADA: En obra negra.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Marcelina Alvarez V
Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 25760715

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Diana Ramos

C.C. o NIT: 49606246

Roddy Urueta
Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
La vivienda esta en proceso y en construccion NO presenta grietas, el piso es en plantilla con gretes.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

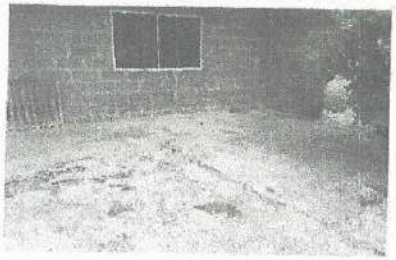


FOTO 1

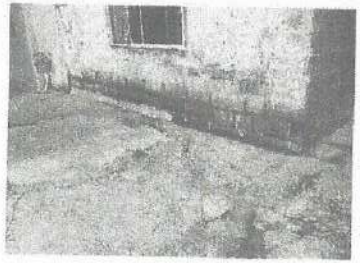


FOTO 2

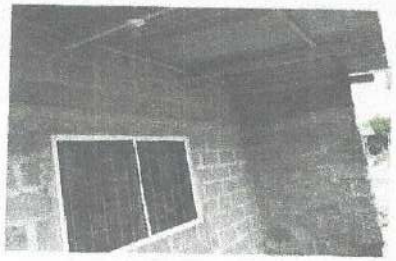


FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Marcelina Alvarez V
Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: X25760715

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Rojero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 09 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Miguel Antonio Arroyo Sevilla
Dirección: Cra 8c # 3-22
Teléfono: 3145914989 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 8 mts x 18
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 10.935329

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Bloque de Cemento	5 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre y muro	4 Baños
CUBIERTA: Eternit	1 Cocina.
PISOS: Baldosa	1 Sala.
FACHADA: Pintada y Afrucada Facha en Baldosa.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 10935329

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Lopera
C.C. o NIT: 42606748

Rodolfo Urrego
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	ACTA DE VECINDAD FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES		
	Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Acta No.: 1	Fecha de Diligenciamiento: DD 09 MM 08 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION

* Vivienda Presenta Muro Alto en bloque, con Revestimiento de Ceramica Rejas Metalicas Sobre Muro.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 10935329

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Lopera

C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 10 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eduardo Fernandez
Dirección: Cra 8E # 2 - 216.
Teléfono: _____ No. de Pisos: _____
Longitud de Frente (mts): 5X18.
Matrícula Inmobiliaria No.: _____
Cédula Catastral: _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal		¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO X
¿Cuántos? _____
¿Tiene uso comercial?
SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En de Cemento MUROS Bloque Viga de Amarre.	2 Habitaaones
MUROS: Rejas.	1 Sala
CUBIERTA: Eternit. cielo Raso PVC.	1 cocina 1 Baño
PISOS: Ceramica.	1 Patio.
FACHADA: Estuco. Pañete.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Eduardo Fernandez
C.C. o NIT: 78'693.918

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Ami J Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Arregoces
C.C. o NIT: _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
* LA VIVIENDA TIENT UNA REJA QUE SOBREPASA EL LIMITE DEL PARAMENTO.
* LA VIVIENDA ESTA EN BUEN ESTADO NO TIENT GRIETAS NI FISURA.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

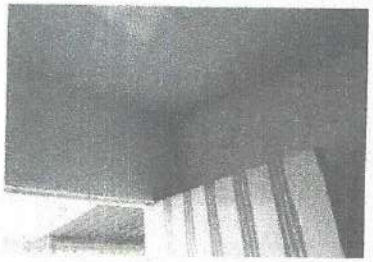


FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: X Eduardo Fernández

C.C. o NIT: 78'693.918

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Lopero

C.C. o NIT: 49606746

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 09 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ALEIDA MESTRE MASS
Dirección: CRA 8E # 2-52
Teléfono: 311 611 9116 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 7 X 14 MTS
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 32253621

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: BLOQUE (VIVIENDA 1 PISO).	2 HABITACIONES
MUROS: Muros en bloques	1 BAÑO
CUBIERTA: ETERNIT - ZINC	1 SALA
PISOS: CERAMICA	1 COCINA
FACHADA: Pañete - Estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: ALEIDA MESTRE MASS
C.C. o NIT: 32253621

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Kelin Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Uribe
C.C. o NIT:

EMA

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
* CASA POR CORTE DE PISO, ESTA DENTRO DEL PARAMENTO. Presenta Rejas Metalicas y piso en Ceramica.
* LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SIN GRIETAS Y SIN HUMEDAD.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

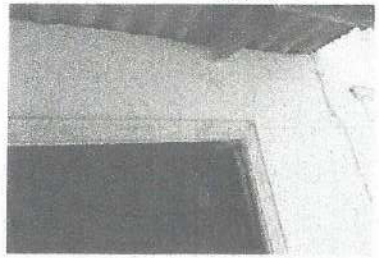


FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS 32253621

Algida Mestra MOLES

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT:

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Adriana Lucia Duque

C.C. o NIT: 1066340.

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 05 MM 03 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MIGUEL PAEZ MERCADO
Dirección: CRA 8E #2-66
Teléfono: 3214065145 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9 X 18 METRO.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 10995388

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [X] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda en un piso, con Rejas Metalicas	4 HABITACIONES.
MUROS: Muros en bloque	2 COCINA
CUBIERTA: Eternit	4 BAÑOS
PISOS: CERAMICAS	1 PATIO.
FACHADA: Pañete - estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Miguel Paez
Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 10995388

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49606740.

Rodolfo Arregoces
Revisó Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CPRA

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
* La vivienda se encuentra en buen Estado
* La casa sobre pasa el limite del paramento. Es decir que esta contemplado corte de Reja y Piso.
* Acceso A garaje

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

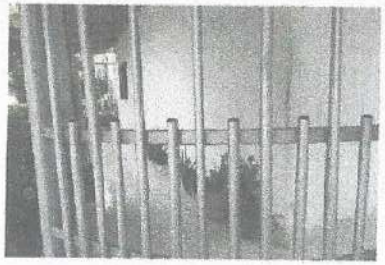


FOTO 1

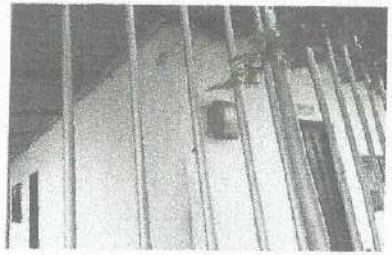


FOTO 2

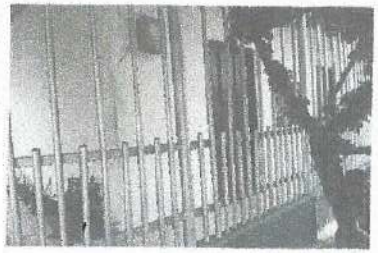


FOTO 3



FOTO 4

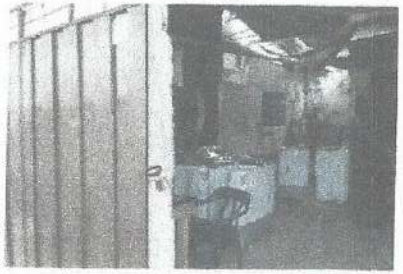


FOTO 5

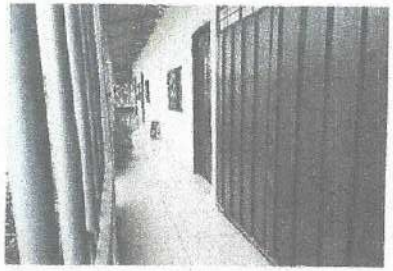


FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre:

C.C. o NIT: 1006

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Ropero

C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA


ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 10 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

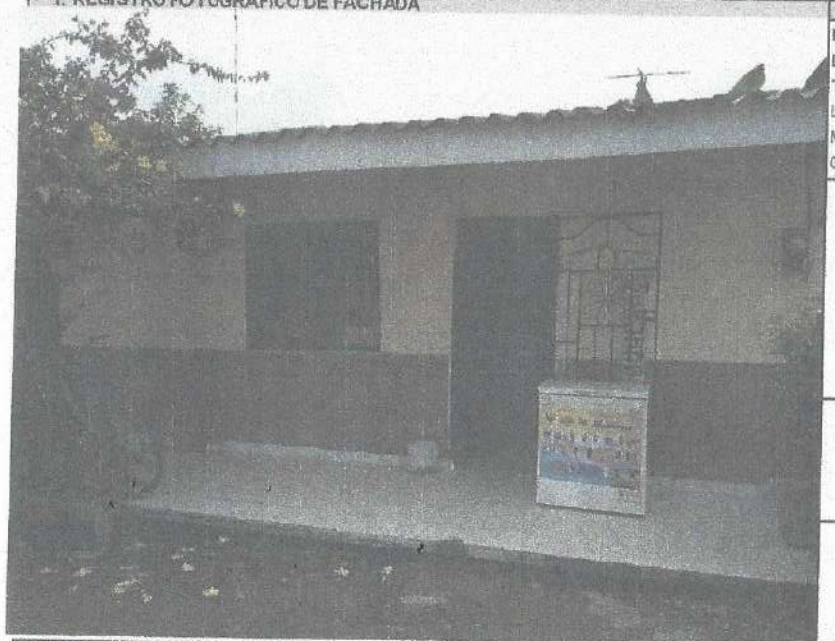

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sara Maria Hoyo Salgado
Dirección: Cra 8C # 3-10
Teléfono: 3156540823 No. de Pisos: 1
Longitud de Frente (mts): 9X18 mts
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 34959405.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1 Piso MUROS. En Bloque de cemento	2 Habitaciones
MUROS: Viga. de Amare	1 sala
CUBIERTA: Eternit	1 cocina
PISOS: ceramica en la sala en los cuarto Cemento pulido.	1 Patio 1 Baño.
FACHADA: Pared con Pintura y ceramica.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Sara Hoyos
Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 34959405

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49606240

Rodolfo Urrego
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")	
OBSERVACION	La vivienda no presenta agrietamiento, la vivienda esta sobre el limite de paramento y esta contemplado el corte de piso.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 34959405

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Ropero
C.C. o NIT: 49686740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA


ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 10 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

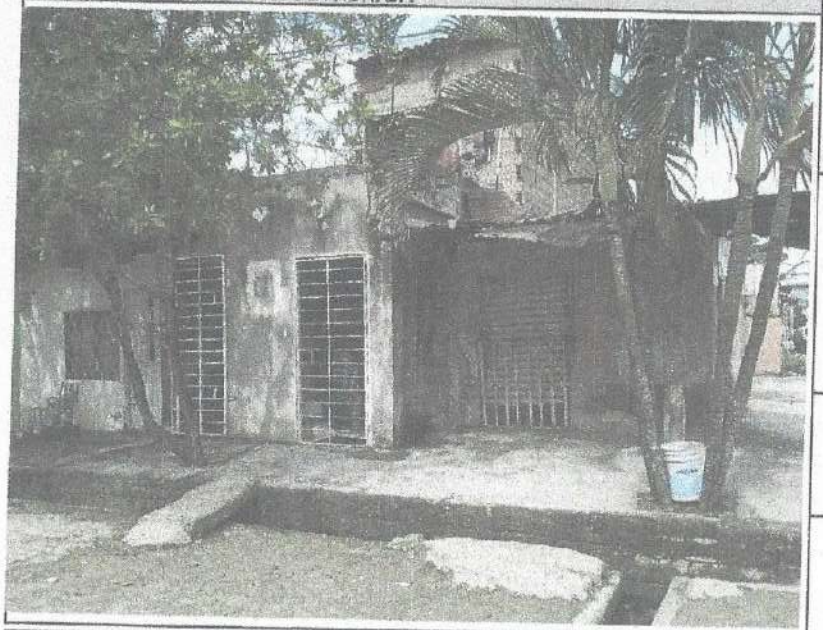

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yomaira Suarez Espitia.
Dirección: dia 8c # 8-51
Teléfono: 3205480935 No. de Pisos: 2 PISO
Longitud de Frente (mts): 9 X 18 mts.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 50.912.239

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal		¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [ ]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: MUROS En Bloque y Ladrillo. 2 PISOS La segunda esta en construccion	4 Habitaanes
MUROS: Viga de Amarre	4 Baños
CUBIERTA: Eternit y Zinc	2 Salas
PISOS: Ceramica y Plantilla.	1 Patio.
FACHADA: Pañete en gris.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS Yomaira Suarez
Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 50912239

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Rapero
C.C. o NIT: 49606740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION
Vivienda en Construcción en Buen Estado.
Piso en Ceramica en el Frnden.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1

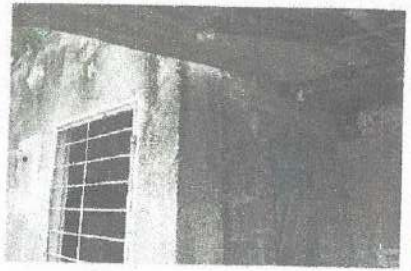


FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: 4 Jornadera suarez

C.C. o NIT: 5091239

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini Ropero

C.C. o NIT: 49086740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:

C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 09 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ACCION COMUNAL CASA MODELO
Dirección: CRA 8E # 3-39
Teléfono: 3218123498 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9x18 mts.
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros En 1 Piso. Bloque - Viga de Amarre.	2 Habitaciones
MUROS: de cemento.	1 Sala
CUBIERTA: Eternit	1 Cocina 1 Patio
PISOS: Cemento Pulido. y ceramica en la sala, cuarto	2 Baños
FACHADA: Pañete - Estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Yuley de Sobrado Serpa
C.C. o NIT: 26120225490
arrendatario

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49606740

Rodolfo Urrego
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION La vivienda se le hara corte de piso, no presenta grietas ni fisura.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: Kirley Dis Salgado Serpa
C.C. o NIT: 26 202 254

Arrendatario

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Ropero
C.C. o NIT: 49 606 748

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 10 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sara maria Hoyos salgado
Dirección: Calle # 3-10
Teléfono: 3156540885 No. de Pisos: 1 PISO
Longitud de Frente (mts):
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: MUROS En Bloque de cemento.	2 Habitaciones.
MUROS: Viga de Amarre.	2 Baños.
CUBIERTA: Zinc.	2 cocina
PISOS: plantilla Regular	2 Patio.
FACHADA: Pañete Pintada en Regular Estado	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS
Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: 34959405

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Romero
C.C. o NIT: 79826748

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 10 MM 08 AA 2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

OBSERVACION

* La vivienda no presenta gretas. ni fisura, casa en construcción.
* Casa sobre pasa el limite del parameto esta contemplado el corte del muro para el anden.
* La propietaria manifiesta que coloquen el mura, igual Alturaza que no corten para el bien de la obra.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

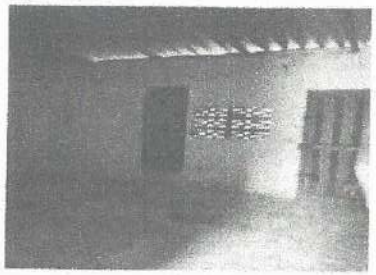


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

FOTO 5
SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

FIRMAS

X Firma Propietario

Nombre:
C.C. o NIT: 34959405

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre:
C.C. o NIT:

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Acta No.: 1

Fecha de Diligenciamiento: DD 11 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Olga Esquivel Acosta
Dirección: Cra 8 #3-32
Teléfono: 3016763330 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9 x 18 mts.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 25839599

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión Cable		X	
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque de Cemento.	4 Habitaciones
MUROS: Viga de Amarre - Rejas. Metalicas.	3 Baños
CUBIERTA: METALDE. CIELO RASO EN PVC.	1 Sala 1 Cocina
PISOS: Ceramica	1 Patio.
FACHADA: Terraza Basiada en concreto y Estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Olga Esquivel
C.C. o NIT: 25839599

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Pajaro
C.C. o NIT: 49606746

Reviso: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Urrego
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION La Vivienda No presenta Grietas, *Vivienda Con Rejas Metalicas

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

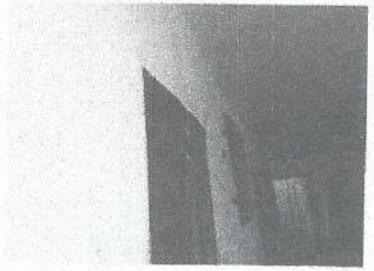


FOTO 4

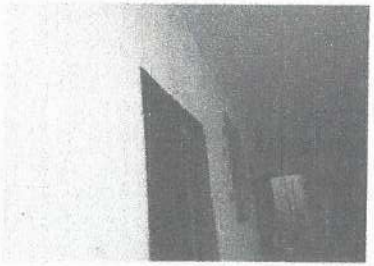


FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: Olga Esquivel
C.C. o NIT: 25/839 599

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: Nini J Rojero
C.C. o NIT: 1.9.606.740

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 12 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rafael Antonio Enjuncha Padilla
Dirección: Cra 2e #3-19
Teléfono: 3123812879 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 10 x 18 mts.
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 6.877722

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros			¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque de Cemento	3 Habitaanes.
MUROS: Viga de Amame	1 Sala
CUBIERTA: Eternit	1 Cocna 1 Patio.
PISOS: Plantilla Con grietas.	1 Baño.
FACHADA: En graniplas. y Pared en Bruto.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: X Rafael A Enjuncha
C.C. o NIT: 6877722

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nina Ropero
C.C. o NIT: 49606746.

Rodolfo Arreaga
Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION Corte y tala de Arboles. en espacio publico.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

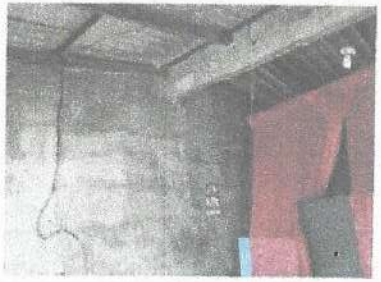


FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario

Nombre: [illegible]

C.C. o NIT: 6857722

Elaboró: Trabajadora Social Contratista

Nombre: [illegible]

C.C. o NIT: [illegible]

GPA

Revisó: Ingeniero Residente

Nombre:


C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 12 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

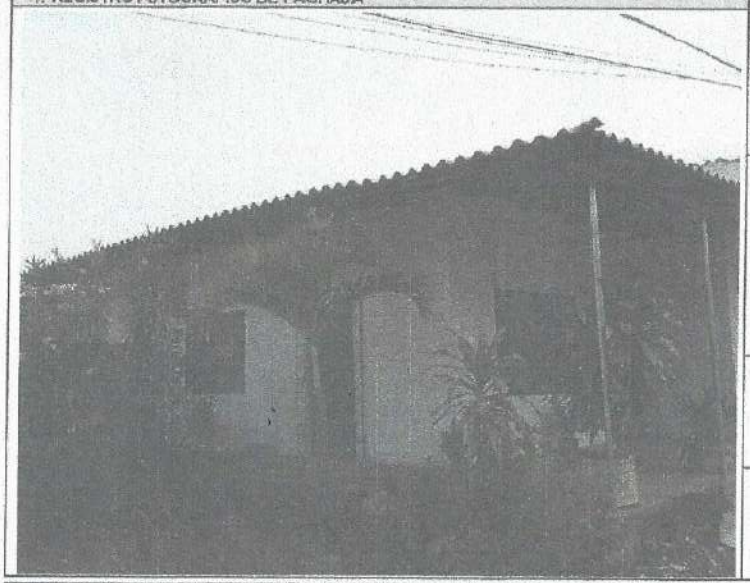

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: zunilda orozco vergara
Dirección: Calle 4 cra 3e # 16.
Teléfono: 3208017635 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9X18 mts.
Matrícula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 34962903

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros en Bloque Viga de Amarre	2 Habitaanes
MUROS: Columnas. metalicas - terraza.	1 Sala
CUBIERTA: Eternit.	1 cocna 2 Banos
PISOS: Plantilla a la vista.	1 Patio.
FACHADA: Panete estucada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS: Zunilda Oroz
Firma Propietario
34962903

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nini Ropero
4960740

Rodolfo Uneda
Revisó: Ingeniero Residente

EPA.

Nombre: Nombre: Nombre:
C.C. o NIT: C.C. o NIT: C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
La vivienda no presenta grietas.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

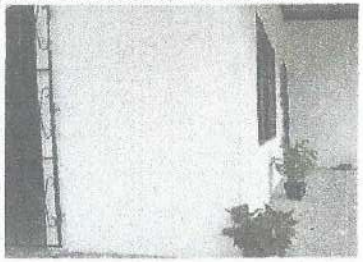

FOTO 1


FOTO 2

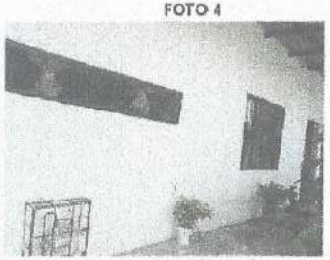

FOTO 3


FOTO 4


FOTO 5


FOTO 6


FOTO 7


FOTO 8

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Luisella Borrego
C.C. o NIT: 34962903

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Rapero
C.C. o NIT: 49006740

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 17 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zunilda Orozco Vergara
Dirección: Cra 8# 16 Apto 1
Teléfono: 320 8017635 No. de Pisos: 1
Longitud de Frente (mts): 8x18.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 34962903

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal	X	¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: 1 Piso. Bloque. de cemento	2 Habitaciones.
MUROS: viga de amarre, columnas metalicas.	1 Sala
CUBIERTA: eternit	1 cocina
	2 Baños.
PISOS: Cemento y Plantilla.	
FACHADA: Ranete en fachada.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre:
C.C. o NIT: Zunilda Orozco 34962903

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Lopera
C.C. o NIT: 1960674O

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre:
C.C. o NIT:

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
* Contemplado corte de piso. Casa en buen estado piso en plantilla de anden.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.

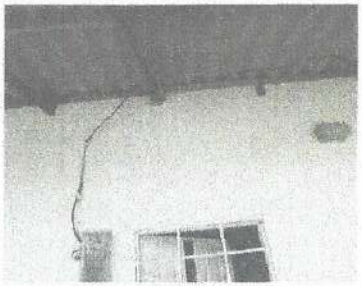


FOTO 1

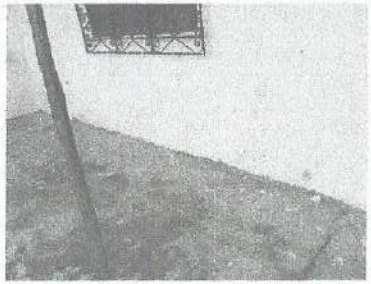


FOTO 2



FOTO 3

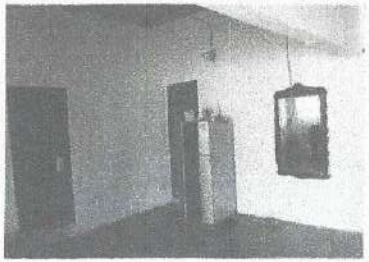


FOTO 4

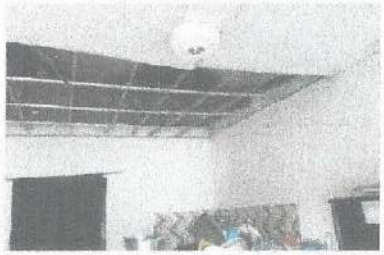


FOTO 5




FOTO 6



FOTO 7

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS

Firma Propietario	Elaboró: Trabajadora Social Contratista	Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Emilsa Eugenia	Nombre: Nini Rojero	Nombre:
C.C. o NIT: 34 962 903	C.C. o NIT: 49608740	C.C. o NIT:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ACTA DE VECINDAD
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Proyecto:	Acta No.:	Fecha de Diligenciamiento:
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	1	DD 15 MM 08 AA 2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Ines Guevara Orozco
Dirección: Cra 8e # 04
Teléfono: 3235275472 No. de Pisos:
Longitud de Frente (mts): 9 x 18 mts.
Matricula Inmobiliaria No.:
Cédula Catastral: 10679 19 600.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión Cable	X		
7. Otros		X	¿Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En Construcción	X
2. Valor Arquitectónico		6. Sin Edificar	
3. Valor Intermedio		7. Otro	
4. Valor Normal		¿Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Lote	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		¿Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
¿Cuántos?
¿Tiene uso comercial?
SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros En Bloque - 1 Piso, Presenta Estructura para Segundo piso Proyección.	4 Habitaciones.
MUROS: Columnas y Muro.	1 Sala
CUBIERTA: Metaldet	1 Cocina 1 Baño
PISOS: Plantilla y Ceramica.	
FACHADA: Pared - Estucada - Revolar.	OTRO, ¿Cuál?

FIRMAS

Firma Propietario
Nombre: Maria Ines Guevara Orozco
C.C. o NIT: 50 898 161

Elaboró: Trabajadora Social Contratista
Nombre: Nini Ropero
C.C. o NIT: 49606746

Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: Rodolfo Ornedo
C.C. o NIT:

apa

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
OBSERVACION
X Vivienda con Rejas Metalicas; Posiblemente ubicadas dentro del diseño del Espacio publico, Se debe verificar.

NOTA: ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

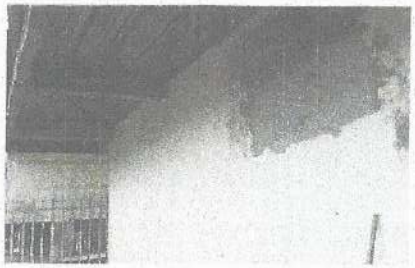


FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

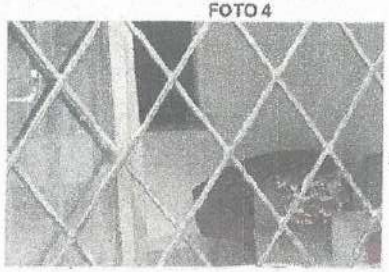


FOTO 7

SE ARCHIVA EN CD REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL REALIZADO EL DÍA DE DE 2022

FIRMAS María Ines Cuervo Ortiz

Firma Propietario	Elaboró: Trabajadora Social Contratista	Revisó: Ingeniero Residente
Nombre: María Ines Cuervo Ortiz	Nombre: Nini J Reyes	Nombre:
C.C. o NIT: 50 898 161	C.C. o NIT: 49 606 740	C.C. o NIT:

ANEXO 2

ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIAS

RESOLUCIÓN No. 0427 DE 31 DE OCTUBRE DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

LA PERSONERA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación de Funciones No. 0206-18 del 30 de abril de 2018, proferida por el despacho de la Personería de Montería, Ley 136 de 1994 y Ley 850 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 270, abre los espacios para que los ciudadanos a través de la participación ciudadana vigilen la gestión pública en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

Que la Ley 136 de 1994, en su artículo 178 numeral 22, dispone que es función de las Personerías, promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.

Que en el despacho se encuentra solicitud de reconocimiento e inscripción de la Veeduría Municipal **"ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS".** Que esta veeduría ciudadana tiene como **objeto**: Ejercer control y vigilancia en la ejecución de la obra a desarrollar en el contrato No. LP-SPM-008-2022 (Mejoramiento de las vías en los Barrios Alfonso López y Los Araujos en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba).

Que la solicitud se encuentra acompañada de los siguientes anexos:

Acta de constitución del día 8 de agosto de 2022, firma de los asistentes a la **"VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS"**;

fotocopia de documentos de identidad de los representantes y solicitud de reconocimiento e inscripción.

Los elegidos como veedores representantes de la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARUJOS"** son:

PRESIDENTE:

GREGORIO JOSÉ SEPULVEDA DÍAZ----------6.870.246

VICEPRESIDENTE:

AURA STELLA TAO ROMERO----------50.909.106

SECRETARIO:

CARLOS OMAR GONZALEZ ESQUIVEL ----------78.749.127

TESORERA:

ADALGIZA DEL ROSARIO ESPITIA VARGAS----------34.996.659

VOCAL:

RAFAEL ANTONIO DAZA PADILLA----------78.706.956

VOCAL:

HENRY MANUEL LUNA TORDECILLA----------78.748.901

VOCAL:

ASTRID ALICIA AGAMEZ DORIA----------34.991.039

VOCAL:

COPIA CONTROLADA

GREGORIA JOSÉ SEPULVEDA DÍAZ----------6.870.246

VOCAL:

HERNANDO FREY PEREIRA HERNANDEZ----------78.709.760

TERMINO DE DURACIÓN: La presente Veeduría Ciudadana funcionará por el término cuatro (4) meses contados desde el día de su inscripción.

DOMICILIO: Como domicilio téngase la carrera 8E No. 4 – 43 Barrio Alfonso López del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO: carlosgon@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO: auratao@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO: ada.espitia@hotmail.com

TELEFONO: 3045385051– 3103677528 - 3137667686

Que los documentos aportados por los representantes de la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARUJOS";** llena los requisitos exigidos por la ley 850 de 2003.

Que la Ley 850 de 2003, en su artículo tercero, faculta a las Personerías Municipales para inscribir las veedurías de su jurisdicción y llevar registro público de las mismas.

Que la vigilancia de las veedurías ciudadanas se ejercerá sobre entidades de cualquier nivel o sector de la administración, sobre particulares y organizaciones no Gubernamentales que cumplan funciones públicas, de acuerdo con las materias que interesen a aquellas, de conformidad con su acta de constitución, sin importar el domicilio en el que se hubieren inscrito.

Que las veedurías ejercerán vigilancia en el ámbito nacional, departamental, municipal y demás entidades territoriales, sobre la gestión pública y los resultados de estas.

COPIA CONTROLADA

Que la solicitud de reconocimiento e inscripción de la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARUAJOS",** se encuentra ajustada a la normatividad vigente, este Ente de Control adscrito al Ministerio Público en la parte resolutiva de este proveído la reconocerá y procederá a la respectiva inscripción en el libro de Registro Público de las Veedurías Ciudadanas del Municipio de Montería.

RESUELVE:

PRIMERO: Reconocer a la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARUJOS",** en los términos establecidos en la parte considerativa de esta Resolución.

SEGUNDO: Reconocer como miembro de la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARUAJOS"** a los señores:

PRESIDENTE:

GREGORIO JOSÉ SEPULVEDA DÍAZ ----------6.870.246

VICEPRESIDENTE:

AURA STELLA TAO ROMERO----------50.909.106

SECRETARIO:

CARLOS OMAR GONZALEZ ESQUIVEL----------78.749.127

TESORERA:

ADALGIZA DEL ROSARIO ESPITIA VARGAS----------34.996.659

VOCAL:

RAFAEL ANTONIO DAZA PADILLA----------78.706.956

VOCAL:

HENRY MANUEL LUNA TORDECILLA----------78.748.901

COPIA CONTROLADA

VOCAL:

ASTRID ALICIA AGAMEZ DORIA----------34.991.039

VOCAL:

HERNANDO FREY PEREIRA HERNANDEZ----------78.709.760

TERCERO: En firme la presente resolución, se ordena la inscripción en el Registro Público de Veedurías de esta entidad, a la **VEEDURÍA CIUDADANA "ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS"**.

CUARTO: Comunicar esta Resolución a los interesados.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIETH USTA VELLOJÍN
Personera Delegada
Para La Guarda y Protección De Los Derechos Humanos

COPIA CONTROLADA

ANEXO 14

INFOME SG-SST No.2 DE INTERVENTORÍA


INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-007-2022
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERIODO:
SEPTIEMBRE 01 DE 2022 – OCTUBRE 08 DE 2022

FIRMA		
NOMBRE	**ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ**	**ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ**
CARGO	Profesional SST	Directora de Interventoría
	Elaboró	Revisó

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVOS 4

1.1. OBJETIVO GENERAL 4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 5

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 5

3.1. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 5
3.1.1. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 5
3.2. HIGIENE INDUSTRIAL 7
3.2.1. INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO 7
3.2.2. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 8
3.2.3. CONTROL DE MORBILIDAD Y AUSENTISMO 9
3.2.4. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 11
3.2.5. INSPECCIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA. 12
3.2.6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN 12
3.3. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS 12
3.4. PROTOCOLO COVID-19 14
3.4.1. CONTROL EN OBRA 14

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta el seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, realizado por la interventoría ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS al contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA, desarrollada durante el periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2022 al 08 de octubre 2022.

Dando cumplimiento a los pliegos de los contratos No. CMA-SPM-007-2022 y LP-SPM-008-2022, se reportan las actividades del avance y cumplimiento de los controles establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, diseñadas para controlar los posibles impactos generados por las actividades relacionadas a la ejecución del Proyecto Mejoramiento De Las Vías En Los Barrios Alfonso López Y Araujos En El Municipio Montería, Departamento De Córdoba, con fecha de inicio 09 de agosto de 2022

Las personas que se involucren con la obra de forma directa e indirecta en las actividades diarias de la ejecución, como los habitantes del sector que presenten algún tipo de riesgo motivo de la construcción, se adoptaran medidas para proteger y mejorar positivamente la calidad de vida, a la comunidad, generando conciencia a los trabajadores que participen en la vigilancia, control y autocuidado sobre las inversiones realizadas para garantizar la calidad de servicio y el medio ambiente que los rodea.

El CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA debe tener en cuenta que el Plan de Seguridad Salud en el Trabajo de la Obra es un instrumento de planificación que busca garantizar la participación y el compromiso de la comunidad y de los trabajadores para el empoderamiento de la realización del proyecto.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

✓ Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad industrial, y salud ocupacional del proyecto Es Mejoramiento De Las Vías En Los Barrios Alfonso López Y Araujos En El Municipio Montería, Departamento De Córdoba.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

✓ Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

✓ Presentar el trabajo de supervisión y verificación del manejo e implementación del plan de gestión de obra (Seguridad y salud en el Trabajo del Contratistas que ejecuta las actividades del proyecto mejoramiento de tramos viales en los barrios Alfonso López y Araujos en el municipio montería, departamento de córdoba.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista se obliga a acatar los requisitos legales de nivel nacional y otros que el municipio de Montería suscriba en materia de seguridad y salud en el trabajo a desarrollar y asegurar para la ejecución de los contratos.

Cumplir con la resolución 0312 de 2019 que dicta los estándares mínimos para empresas riesgo V, y demás normas vigentes colombianas.

Nota: El Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo será de ejecución permanente durante el tiempo de vigencia del contrato y estará contenido en un documento firmado por el representante legal y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, y por la persona encargada de desarrollarlo.

El interventor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de la labor, si por parte del contratista existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Supervisor y/o interventor al respecto, o en el caso de peligro inminente a las personas o labor; en este último caso el Supervisor y/o interventor podrá recomendar inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias, sin que esto conlleve obligaciones por parte del Contratante

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1.MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.1.1. Evaluaciones médicas ocupacionales

La interventoría verifica la entrega de los exámenes de Ingreso de los trabajadores que realizaran las actividades de dentro del Proyecto Mejoramiento De Las Vías En Los Barrios Alfonso López y Los Araujos En El Municipio De Montería, Departamento De Córdoba.

Se solicito a la firma contratista entregar exámenes de ingreso de personal en obra.

Tabla 1. Relación Ingreso de Trabajadores 01–09- 2022 a 08-10-2022

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	RESPONSABLE EMPRESA	EXAMENES MEDICOS			FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
					ENTIDAD EXAMEN INGESO	ING	RET		
1	ALCIDES MANUEL NAVARRO VELAZQUEZ	AYUDANTE	1.073.825.317	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL			08/09/2022	
2	OSCAR LUIS ARRIETA LORA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	15.612.829	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	NO PRESENTA			9/09/2022	
3	OSCAR DAVID NORIEGA MEJIA	OPERADOR DE VIBRO-COMPACTADOR	1.065.008.414	L.J.C INGENIERIA SAS	NO PRESENTA			01/09/2022	
4	GEINER DAVID MESTRA MARTINEZ	OPERADOR MINICARGADOR	1.067.905.342	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	NO PRESENTA			13/09/2022	
5	JAIVER ANDRES DIAZ SOTO	SISO	1.066.186.999	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			01/10/2022	
6	JULISSA JULIO ARGUMEDO	ING. AUXILIAR DE OBRA	1.068.822.356	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			01/10/2022	
7	NANCY ESTHER URANGO ORTEGA	BODEGUERA	1.067.932.580	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			20/09/2022	
8	CAMILO ANDRES AYALA GARCIA	AYUDANTE	1.010.154.860	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			07/10/2022	
9	CESAR DAVID MARTINEZ CAMAÑO	AYUDANTE	1.067.870.213	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			05/10/2022	
10	MIGUEL ARMANDO MARTINEZ DIAZ	CADENERO	1.003.432.844	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			11/10/2022	
11	JULIO ALBERTO CONTRERAS BURGOS	OPERADOR	1.073.820.884	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			10/10/2012	
12	JOSE ERNESTO MARTINEZ VILLEGAS	AYUDANTE	1.143.337.094	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	SALUD OCUPACIONAL	X		16/10/2022	
13	OVER LUIS GASPAR BELTRAN	AYUDANTE	1.063.165.642	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	SALUD OCUPACIONAL	X		1910/2022	
14	RAFAEL SOTO RAMOS	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	7.382.146	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	SALUD OCUPACIONAL	X		23/10/2022	
15	ANA MARIA TORRES MORALES	AYUDANTE	1.067.883.437	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	SALUD OCUPACIONAL	X		25/10/2022	

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	RESPONSABLE EMPRESA	EXAMENES MEDICOS			FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
					ENTIDAD EXAMEN INGESO	ING	RET		
PERSONAL RETIRADO									
1	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO	AUXILIAR SISO	10.776.895	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		17/08/2022	
2	ESTEBAN FIGUEROA SALAS	ING. AUXILIAR DE OBRA	10.932.363	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		24/08/2022	26/09/2022
3	JHONATAN LEON MARTINEZ	AYUDANTE	1.003.452.457	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	SALUD OCUPACIONAL TOTAL S.A.S	X		08/08/2022	10/09/2022
4	RAFAEL DARIO PASTRANA PASTRANA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1.064.991.934	L.J.C INGENIERIA SAS	NO PRESENTA			23/08/2022	30/09/2022
5	CARMELO ENRIQUE LLORENTE GALVAN	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1.064.985.163	L.J.C INGENIERIA SAS	NO PRESENTA			09/09/2022	30/09/2022
6	ELKIN ALONSO ALVAREZ AGUDELO	AYUDANTE	6.891.351	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			05/10/2022	20/10/2022
7	ELIER ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE	10.967.449	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	NO PRESENTA			20/09/2022	30/09/2022

En el **ANEXO N° 1** se adjunta Exámenes de Ingreso del periodo

En el **ANEXO N° 2** se adjunta planillas de pagos a seguridad social

3.2. HIGIENE INDUSTRIAL

3.2.1. Inducciones y notificaciones de riesgo

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de la empresa y organización y la estructura de ésta.

Adicionalmente notificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en la ejecución de las actividades que se realizaran en el presente contrato.

- ✓ La firma contratista para este periodo no presenta inducciones a la interventoría pese a solicitud realizada

3.2.2. Programa de capacitaciones

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Salud Ocupacional, calidad y satisfacción.


3.2.2.1. Capacitaciones del Sistema de Gestión de salud ocupacional y seguridad en el trabajo

Para dar cumplimiento al programa de Salud y Seguridad en el Trabajo se realizan las siguientes capacitaciones.

- Manejo del estrés
- Estilos de vida
- Estilos de vida saludable
- Comunicación asertiva.

En el **ANEXO Nº 3** se adjunta los Formatos de Asistencia a Capacitaciones



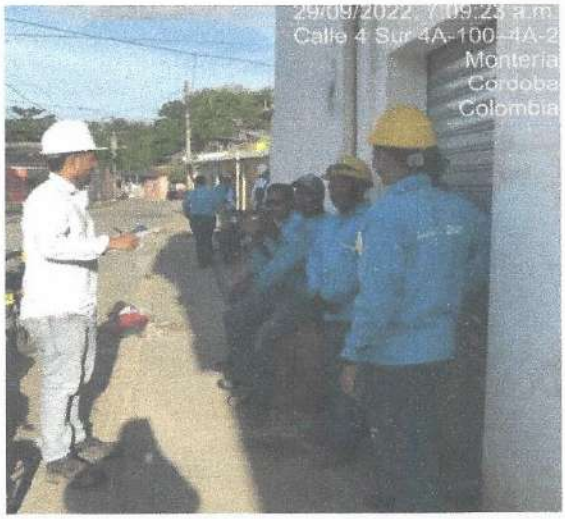

Evidencia de Capacitaciones

3.2.3. Control de morbilidad y ausentismo

3.2.3.1. Enfermedad común

No se presentaron enfermedades durante este periodo

3.2.3.2. Accidentes de trabajo

No se presentaron eventos de este tipo

3.2.3.3. Entrega y seguimiento de equipos de protección personal y dotación

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los trabajadores que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un busca de un busca de un buen resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

El personal está cumpliendo con el uso pertinente de los EPP en campo y el uso adecuado de su dotación.





En el **ANEXO N° 4** se adjunta el Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal durante el mes reportado

3.2.3.4. Verificación de pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral del personal en obra

La INTERVENTORÍA realiza el seguimiento y verificación del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de todo el personal en obra, incluyendo personal técnico, administrativo y operativo.

De igual forma se verificó el personal que ingreso nuevo a los distintos frentes que se maneja el proyecto, revisando que estas personas cuenten con la documentación al día y en regla. La Interventoría ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Al contratista se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, es por esto por lo que actualmente envían la documentación requerida y permanece en el archivo de

la oficina. Esta documentación es revisada por la Interventoría para garantizar el estricto cumplimiento de este requerimiento contractual.

En el **ANEXO No.2** se presenta planillas de afiliaciones a seguridad y salud en el trabajo y aportes parafiscales.

3.2.4. Manejo de Maquinaria y Equipo

La interventoría ha realizado evaluación periódica del registro de la maquinaria y equipos que se encuentran en los frentes de trabajo

Maquinaria en obra:

3.2.5. Inspección de maquinaria en obra.

La firma contratista no cumple con la realización de preoperacionales a los equipos pese a la solicitud realizada por la firma interventora

3.2.6. Aislamiento de la obra y señalización


Los elementos utilizados para la demarcación de los diferentes componentes se inspeccionaron y se encontraron en su mayoría limpios, se le ha solicitado al contratista mejorar las cintas amarillas de señalización, el cerramiento tipo 3, mejorar la señalización de los inicios de obra, ubicar señalización de trabajadores en la vía, y demás que sean necesarias para dar cumplimiento en la normatividad legal exigida.


Esta señalización debe contar con las unidades suficientes y e idóneos correspondientes a cada uso.

3.3. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS

El seguimiento a las actividades en seguridad, salud en el trabajo, se realiza a través de los objetivos específicos de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.



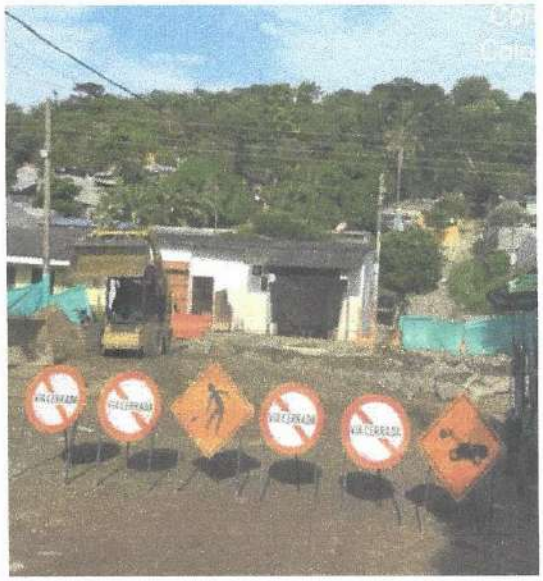

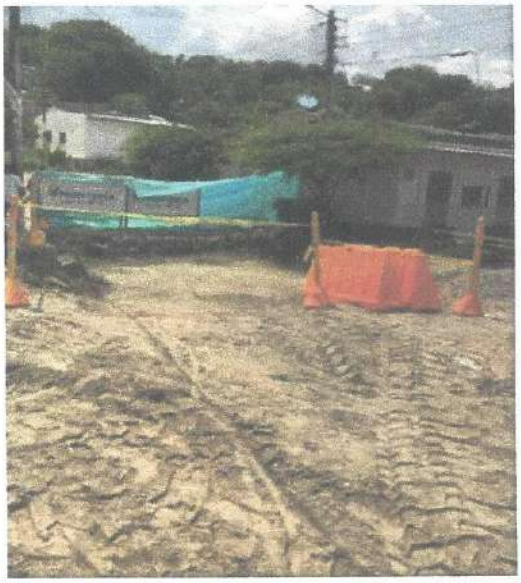



Señalización en obra

3.4. PROTOCOLO COVID-19

Durante el periodo de este informe la interventoría realizo verificaciones en el frente de trabajo y se evidencio que la firma contratista No cumple con la implementación de todos los protocolos de bioseguridad.

3.4.1. CONTROL EN OBRA

En esta sección la interventoría verifica las prácticas establecidas al momento de desarrollar actividades de infraestructura vial en el marco del contrato de CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA con el objetivo de minimizar el contagio durante la ejecución de actividades de la misma índole.

a. Toma de Temperatura de los Trabajadores

No se toma temperatura del personal en obra.

b. Desinfección de Maquinaria y Herramienta durante la Jornada

El contratista No realiza la desinfección de la Maquinaria y Herramientas

c. Verificación puntos de Desinfección

Cada centro de trabajo deberá contar con un punto de desinfección el cual contará con:

- ✓ Agua limpia
- ✓ Jabón líquido
- ✓ Toallas individuales
- ✓ Alcohol al 70 %
- ✓ Gel antibacterial
- ✓ Guantes de lates
- ✓ Tapabocas desechables
- ✓ Termómetro infrarrojo
- ✓ Pendones informativos sobre el COVID 19

- ✓ Canecas rojas de 120 lts
- ✓ Lavamanos portátil

La interventoría ha realizado la solicitud de implementar puntos de asepsia para el correcto lavado de manos en el frente de trabajo, se evidencia que a la fecha no han implementado el suministro de baterías sanitarias en los frentes de trabajo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente informe, se han mejorado las prácticas de seguridad y salud en el trabajo, aunque aún deben realizar la entrega total de los elementos de protección personal.

Se recomienda que este mejoramiento se realice con la sensibilización al personal a través de capacitaciones en temas de autocuidado y protección del medio ambiente, jornadas de limpieza de vías y frente de obra al inicio y fin de la jornada laboral, campañas de reciclaje, y mejoramiento del cuidado de los elementos de señalización.

La interventoría realizó las siguientes recomendaciones al contratista:

- ✓ Mantener al día el registro de mantenimiento de equipos.
- ✓ Realizar preoperacionales de los equipos y maquinarias en obra
- ✓ Implementar los protocolos de Bioseguridad antes iniciar las actividades en los Frentes de Trabajo.
- ✓ Hacer entrega oportuna de dotación y los elementos de protección a los trabajadores que se encuentran ejecutando actividades en los diferentes frentes de obra.
- ✓ Hacer entrega oportuna de afiliaciones del personal a ingresar
- ✓ Hacer entrega de capacitaciones realizadas en obra
- ✓ Mantener en todo momento el cerramiento Tipo 3 en los frentes a intervenir

ANEXOS

ANEXO No.1
EXAMENES DE INGRESOS

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
OCTUBRE 21-2022	1067885437

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
ANA MARIA TORRES MORALES	5 DIC 1985	B +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	MUTUAL SER	37 AÑOS	3126290180

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO PAVIMENTO MONTERIA	OSTEOMUSCULAR	OFICIAL EN OBRA	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	SI	apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR . 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Sensopsicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma del Paciente | **Firma Médico Especialista en SO**

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
SEPTIEMBRE/10/2022	1,073,825,317

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
ALCIDES MANUEL NAVARRO VELASQUEZ	SEPT/02/1994	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
SAHAGUN	MUTUAL SER	28 AÑOS	3003738681

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO PAVIMENTO MONTERIA	OSTEOMUSCULAR	OFICIAL PAVIMENTO	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	SI	apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR . 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Sensopsicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma del Paciente

Firma Médico Especialista en SO

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
OCTUBRE/18/2022	1063165642

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
OVER LUIS GASPAR BELTRAN	24JUNIO/1993	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
LORICA	COOSALUD	29 AÑOS	3218893318

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO PAVIMENTO MONTERIA	OSTEOMUSCULAR	OBRERO	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	SI	apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR . 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Sensopsicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma del Paciente

Firma Médico Especialista en SO

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

Salud Ocupacional

FECHA	C.C.
OCTUBRE/18/2022	1143337093

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
JOSE ERNESTOMARTINEZ VILLEGAS	10 ENERO 1989	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
CERETE	MUTUAL SER	30 AÑOS	3504859880

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO PAVIMENTO MONTERIA	OSTEOMUSCULAR	OBRERO	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	SI	apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR . 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Sensopsicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Aldana O

Firma del Paciente

Firma Médico Especialista en SO

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
OCTUBRE 21/10/2022	7382146

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL DE INGRESO

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
RAFAEL EDUARDO SOTO RAMOS	16 NOV 1975	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
CERETE	SALUD TOTAL	47 AÑOS	3205244770

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO PAVIMENTO MONTERIA	OSTEOMUSCULAR	OPERARIO	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA	SI	apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTES SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LA LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULAR.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR . 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Sensopsicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma del Paciente

Firma Médico Especialista en SO

ANEXO 2
PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	41244755	9441244755	E	2022/10/11	2022/10/12	BANCO AV VILLAS	1	$11,055,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTOS MONTERIA (32 Afiliados)						$36,186,002	$5,790,000			$36,186,002	$1,447,700			$36,186,002	$1,447,700			$36,186,002	$2,358,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON PAVIMENTOS MONTERIA (15 Afiliados)						$22,252,667	$3,560,500			$22,252,667	$890,200			$22,252,667	$890,200			$22,252,667	$1,549,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (15 Afiliados)						$22,252,667	$3,560,500			$22,252,667	$890,200			$22,252,667	$890,200			$22,252,667	$1,549,000		$0	$0
1	CC	1064985371	ALVAREZ LUIS	230201	30	$2,780,000	$444,800	EPS002	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-11	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
2	CC	10785279	ARCIA MEDARDO	25-14	11	$366,667	$58,700	EPS042	11	$366,667	$14,700	CCF16	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$25,600	11	$0	$0
3	CC	78696203	AYALA ABEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1003466270	AYALA ALVARO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	11000193	BERROCAL ALEXANDER	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	1069468639	CARRASCAL JORGE	25-14	30	$3,336,000	$533,800	EPS002	30	$3,336,000	$133,500	CCF16	30	$3,336,000	$133,500	14-11	30	$3,336,000	$232,200	30	$0	$0
7	CC	10932363	FIGUEROA ESTEBAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1067886516	PALACIOS DIANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	78747853	PEÑA SIMON	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	49606740	ROPERO NINI	25-14	30	$2,780,000	$444,800	EPS037	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-11	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
11	CC	1067947461	SEBA MATEO	230201	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-11	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
12	CC	78694807	SEJIN SERGIO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	10776895	TAMAYO ALEJANDRO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	1067932580	URANGO NANCY	230201	12	$400,000	$64,000	ESSC07	12	$400,000	$16,000	CCF16	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
15	CC	6889639	URRIAGA RODOLFO	230201	30	$2,780,000	$444,800	EPS048	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-11	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBREROS PAVIMENTOSMONTERIA (15 Afiliados)						$11,433,335	$1,829,500			$11,433,335	$457,500			$11,433,335	$457,500			$11,433,335	$796,100		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (15 Afiliados)						$11,433,335	$1,829,500			$11,433,335	$457,500			$11,433,335	$457,500			$11,433,335	$796,100		$0	$0
16	CC	10967449	ARGUMEDO ELIER	230201	11	$366,667	$58,700	ESSC07	11	$366,667	$14,700	CCF16	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$25,600	11	$0	$0
17	CC	15612829	ARRIETA OSCAR	230301	22	$733,334	$117,400	ESSC07	22	$733,334	$29,400	CCF16	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
18	CC	1003434734	BLANCO EDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
19	CC	6880515	GALARAGA ALVARO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
20	CC	1003394457	GOMEZ JEISON	230301	11	$366,667	$58,700	ESSC07	11	$366,667	$14,700	CCF16	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$25,600	11	$0	$0
21	CC	11004525	GONZALEZ LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
22	CC	1067934174	GONZALEZ MIGUEL	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC07	9	$300,000	$12,000	CCF16	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
23	CC	1003452457	LEON JHONATAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
24	CC	1064994981	LUCAS JUAN	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC07	9	$300,000	$12,000	CCF16	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
25	CC	1067905342	MESTRA GEINER	230301	18	$600,000	$96,000	EPS002	18	$600,000	$24,000	CCF16	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
26	CC	1073825317	NAVARRO ALCIDES	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
27	CC	1067926278	PLAZA ERICK	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
28	CC	78700712	RAMOS MEDARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	1067881471	RAMOS OSWALDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	MIN001	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
30	CC	10767500	URANGO GUSTAVO	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,200		$0	$0
31	CC	1003002882	CABALLERO MARIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
32	CC	106792643	LOPEZ JIMMY	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF16	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Total Afiliados(32)						$36,186,002	$5,790,000			$36,186,002	$1,447,700			$36,186,002	$1,447,700			$36,186,002	$2,358,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	41244755	9441244755	E	2022/10/11	2022/10/12	BANCO AV VILLAS	1	$11,055,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$5,790,000	$5,700	$0	$5,795,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$480,000	$500	$0	$480,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,357,300	$1,300	$0	$1,358,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,330,800	$2,300	$0	$2,333,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,621,900	$1,600	$0	$1,623,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,358,300	$2,300	$0	$2,360,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$2,358,300	$2,300	$0	$2,360,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,447,700	$1,400	$0	$1,449,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	32	$1,447,700	$1,400	$0	$1,449,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				32	$1,447,700	$2,100	$0	$1,449,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$40,000	$100	$0	$40,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$14,700	$100	$0	$14,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$100	$0	$40,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$151,200	$200	$0	$151,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$40,000	$100	$0	$40,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	$249,500	$300	$0	$249,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$235,200	$300	$0	$235,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$100	$0	$40,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$524,700	$600	$0	$525,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,400	$200	$0	$112,600
TOTAL				32	$11,043,700	$11,500	$0	$11,055,200

2022/10/13 05:57 PM

ANEXO 3
FORMATOS DE INDUCCION Y ASISTENCIA A CAPACITACION

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA.

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ARAUJOS EN EL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	MANEJO DE ESTRÉS.
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Prevenir y controlar el estrés cronico para evitar tener otros problemas médicos.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	01-09.2022
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO:	OBREROS Y ADMINISTRATIVOS OBRA ALFONSO LÓPEZ.
RESPONSABLE(S) CAPACITACIÓN:	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO.
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	Que es el manejo de estrés, importancia y como controlarlo.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de Ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
ALVARO AYALA GARCIA.	1.00.346.6270	OFICIOS VARIOS.	Álvaro Ayala.
JHONATAN LEON MARTINEZ.	1.00.3452.457	OBRERO	Jhonatan León
GUSTAVO URANGO GONZALEZ.	10.767.500	OBRERO	GUSTAVO
EDER BLANCO TABORDA.	1.003.434.734	OBRERO	NO FIRMA
NINI JOHANA ROPERO DAZA.	49.606.740	TRABAJADORA SOCIAL	Nini J Ropero
MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNANDEZ.	1.06.7947.461	INSPECTOR DE OBRA.	Mateo Sebá

CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA.

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ARAUJOS EN EL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Impulsar un plan de acción coordinado que promocionen la salud y prevengan las enfermedades.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	13/09/2022
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO:	OBREROS Y ADMINISTRATIVOS OBRA ALFONSO LÓPEZ.
RESPONSABLE(S) CAPACITACIÓN:	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO.
CONTENIDO DE LA CAPACITACION:	Como trabajar estilos de vida saludables y como generar y promover hábitos saludables en el trabajo.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de Ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
ALVARO AYALA GARCIA.	1.00.346.6270	OFICIOS VARIOS.	Alvaro Ayala
JHONATAN LEON MARTINEZ.	1.00.3452.457	OBRERO	Jhonatan Leon
GUSTAVO URANGO GONZALEZ.	10.767.500	OBRERO	NO FIRMA.
EDER BLANCO TABORDA.	1.003.434.734	OBRERO	NO FIRMA.
NINI JOHANA ROPERO DAZA.	49.606.740	TRABAJADORA SOCIAL	Nini J Ropero
MATEO DE JESÚS SEBÁ FERNANDEZ.	1.06.7947.461	INSPECTOR DE OBRA.	Mateo Sebá

CONSORCIO "PAVIMENTOS MONTERÍA"

CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA.

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ARAUJOS EN EL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	COMUNICACIÓN ASERTIVA.
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Enseñar a los trabajadores a adquirir formas eficaces de sortear varias situaciones productoras de ansiedad
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	20-09-2022.
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO:	OBREROS Y ADMINISTRATIVOS OBRA ALFONSO LÓPEZ.
RESPONSABLE(S) CAPACITACIÓN:	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO.
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	cual es el objetivo de la comunicación asertiva,que es y como se trabaja con ella.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de Ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
ALVARO AYALA GARCIA.	1.00.346.6270	OFICIOS VARIOS.	Alvaro Ayala
JHONATAN LEON MARTINEZ.	1.00.3452.457	OBRERO	Jhonatan leon
GUSTAVO URANGO GONZALEZ.	10.767.500	OBRERO	GUSTAVO
EDER BLANCO TABORDA.	1.003.434.734	OBRERO	NO FIRMA.
NANCY URANGO ORTEGA.	1.067.932.580	BODEGUERA	NANCY URANGO
JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO.	1.003.394.457	OBRERO	YEISON. GOMEZ
ALCIDES NAVARRO VELASQUEZ.	1.073.825.317	OFI. PAVIMENTO	ALCIDES NAVARRO
ELIER ARGUMEDO OJEDA.	10.967.449	OBRERO	ELIER ARGUMEDO
MIGUEL A. GONZALEZ MORALES.	1.067.934.174	OFICIOS VARIOS.	MIGUEL GONZALEZ
JUAN CARLOS LUCAS TIRADO.	1.064.994.981	OFI. PAVIMENTO	Juan Carlos Lucas
NINI JOHANA ROPERO DAZA.	49.606.740	TRABAJADORA SOCIAL	Nini Ropero
MATEO DE JESUS SEBÁ FERNANDEZ.	1.06.7047.461	INSPECTOR DE OBRA.	Mateo Sebá

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA

CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA.

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ARAUJOS EN EL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y TÉCNICAS DE AUTOCUIDADO.
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Sensibilizar a los trabajdores sobre la prevención y el autocuidado.
FECHA DE LA CAPACITACION:	29/09/2022.
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO:	OBREROS Y ADMINISTRATIVOS OBRA ALFONSO LÓPEZ.
RESPONSABLE(S) CAPACITACIÓN:	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO.
CONTENIDO DE LA CAPACITACION:	Plantear diferesntes tipo de riesgos en distintos escenarios, permitir la discusión sobre vulnerabilidades.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de Ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
ALVARO AYALA GARCIA.	1.00.346.6270	OFICIOS VARIOS.	Alvaro Ayala.
JHONATAN LEON MARTINEZ.	1.00.3452.457	OBRERO	Jhonatan León
GUSTAVO URANGO GONZALEZ.	10.767.500	OBRERO	GUSTAVO NO FIRMA.
EDER BLANCO TABORDA.	1.003.434.734	OBRERO	
NANCY URANGO ORTEGA.	1.067.932.580	BODEGUERA	Nancy Urango
JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO.	1.003.394.457	OBRERO	YEISON GOMES
ALCIDES NAVARRO VELASQUEZ.	1.073.825.317	OFI. PAVIMENTO	ALCIDES NAVARRO
ELIER ARGUMEDO OJEDA.	10.967.449	OBRERO	ELIER Argumedo
MIGUEL A. GONZALEZ MORALES.	1.067.934.174	OFICIOS VARIOS.	MIGUEL Gonzalez
JUAN CARLOS LUCAS TIRADO.	1.064.994.981	OFI. PAVIMENTO	Juan Carlos Lucas
NINI JOHANA ROPERO DAZA.	49.606.740	TRABAJADORA SOCIAL	Nini Ropero
MATEO DE JESUS SEBÁ FERNANDEZ.	1.06.7947.461	INSPECTOR DE OBRA.	Mateo Seba

ANEXO 4
FORMATOS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

INSPECCIÓN DE USO Y REPOSICIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ARAUJOS EN EL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

FECHA DE LA INSPECCIÓN:		19/09/2022	FRENTE DE TRABAJO:								ALFONSO LÓPEZ														
No.	No. DE CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO			TAPABOCAS			GAFAS DE SEGURIDAD			BOTAS DE CAUCHO			GUANTES			OVEROL O CONJUNTO CAMISA, PANTALÓN			BOTAS DE SEGURIDAD			CAMISA			OBSERVACIONES
			ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	ESTADO		REP	
			B	M		B	M		B	M		B	M		B	M		B	M		B	M		B	M		
1	10.932.363	ESTEBAN FIGUEROA SALAS.	X																		X			X			
2	49.606.740	NINI JOHANA ROPERO DAZA.	X																		X			X			
3	1.06.7947.461	MATEO DE JESUS SEBA FERNANDEZ.	X																		X			X			
4	10.776.895	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO.	X																		X			X			
5	1.00.346.6270	ALVARO AYALA GARCIA.	X			X			X			X			X			X			X				X		CAMISA ROTA POR UN COSTADO.
6	78.694.807	SERGIO SEJIN MACEA.	X																		X			X			
7	6.893.241	VIRGILIO FUENTES TORREGLOSO.	X			X			X			X			X			X			X			X			
8	1.00.3452.457	JHONATAN LEON MARTINEZ.	X			X			X			X			X			X			X			X			
9	10.767.500	GUSTAVO URANGO GONZALEZ.	X			X			X			X			X			X			X			X			
10	1.003.434.734	EDER BLANCO TABORDA.	X			X			X			X			X			X			X			X			
11	78.700.712	MEDARDO RAMOS SAENZ.	X			X			X			X			X			X			X			X			
12	1.067.926.278	ERICK PLAZA ARDINES.	X			X			X			X			X			X			X			X			
13	78.691.300	JOAQUIN SALVADOR MARTINEZ.	X																		X			X			
14	1.073.825.317	ALCIDES NAVARRO VELASQUEZ.	X			X			X			X			X			X			X			X			
15	1.067.932.580	NANCY URANGO ORTEGA.	X																		X			X			
16	10.785.279	MEDARDO ARCIA GARCIA.	X																		X			X			
17	1.003.394.457	JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO.	X			X			X			X			X			X			X			X			
18	10.967.449	ELIER ARGUMEDO OJEDA.	X			X			X			X			X			X			X			X			
19	1.067.934.174	MIGUEL A. GONZALEZ MORALES.	X			X			X			X			X			X			X			X			
20	1.064.994.981	JUAN CARLOS LUCAS TIRADO.	X			X			X			X			X			X			X			X			
21																											
22																											
23																											
24																											

ESTADO: BUENO (B) MALO (M).
EN LA CASILLA "REP" DIGNIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA LA REPOSICIÓN: P: PERDIDA, D: DETERIORO, MU: MAL USO

INFORME DE LA INSPECCIÓN

CONDICIÓN INSEGURA	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
CAMISA DE TRABAJO ROTA POR UN COSTADO	CAMBIO DE CAMISA	ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO	05/10/2022

INSPECCIONADO POR: ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO CARGO: ASISTENTE SST FIRMA:
