IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-5958
Fecha: **2022-11-01**
Calificación:

GENERÓ: DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ
RESPONSABLE: WEIMAR GAVIRIA
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: TERMINAL SANTA ROSA DE OSOS
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ SANTA ROSA/ TERMINAL SANTA ROSA/
CLASIFICACIÓN 1: OTROS CLIENTES
TIPO: TRACCION
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5
FECHA PROGRAMADA: 2023-06-09
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-01 13:48
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-01 14:26
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:37:19
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

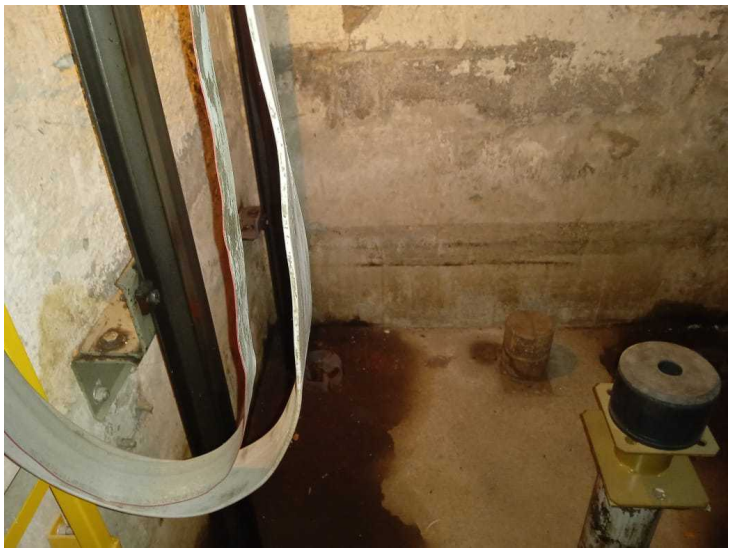
Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Se realiza mantenimiento preventivo en ascensor de pasajeros, se esta organizando el material para enviar tecnico a realizar cambio de repuestos.

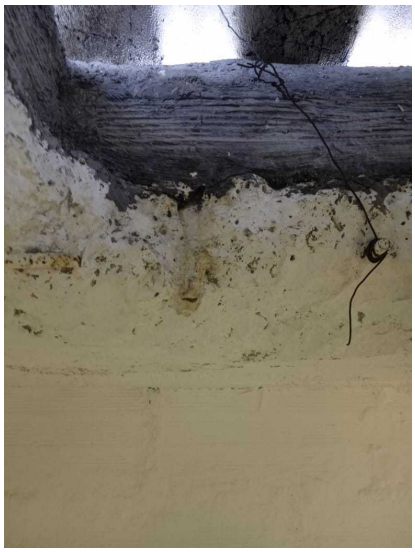
Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

STOP BANCADA -	
LIMITADOR VELOCIDAD CM -	
OPERADOR DE PUERTAS -	

 Todos los derechos reservados

TECHO -	

El tecnico no manejaba la plataforma de fracttal	DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ	WEIMAR GAVIRIA
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados
