FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 6

FECHA		DIA	3	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
SEMANA N°	6	DEL	jueves, 27 de octubre de 2022	AL	miércoles, 2 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	25-sep-21	FECHA TERMINACION INICIAL :	15-nov-22	NUEVO PLAZO DE EJECUCION	15-may-22		
No. 2 PRORROGAS		No. SUSPENCIONES		OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES	NIT O C.C.	3249514-5	CONTRATO N°	196-2022
CONTRATISTA	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	900844978-4	CONTRATO N°	209-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL ACUMULADO	ACTIVIDADES DESCRITAS POR ITEMS EJECUTADOS REFERENTES AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS DE ATRASO	ACUERDOS PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	25,00%			
INSTALACIONES ELECTRICAS	60,00%	47,00%	47,00%			
CUBIERTA	100,00%	100,00%	100,00%			
CIELO RASOS	35,00%	40,00%	0,76%			
PINTURA	10,00%	20,00%	0,09%			
ASEO	0,00%		4,14%			
	0,00%		10,42%			
	0,00%		0,19%			

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 171.644.227,01	SEMANA	$ 29.179.518,59	$ 49.176.071,04		17,00%	71,35%
		ACUMULADO	$ 122.468.155,97				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Residente	1	Oficial	2,00
Profesional HSQ	1	Ayudantes	3,00
Maestro	0	Ornamentacion	0,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

		FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0,00				NO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



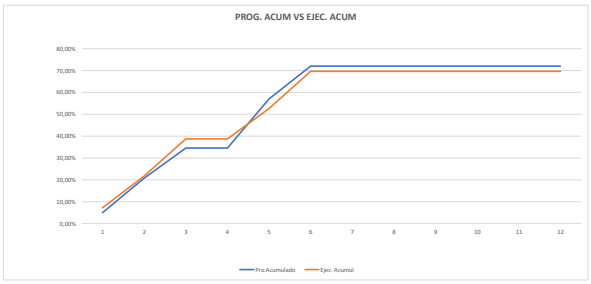

Semana	inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fecha	25/09/2021	2/10/2021	9/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	30/10/2021	6/11/2021	19/10/2021	26/10/2021	2/11/2021	9/11/2021	16/11/2021	23/11/2021
Pro. Semanal	2,00%	3,00%	15,74%	13,78%	0,00%	22,50%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Pro.Acumulado	2,00%	5,00%	20,74%	34,52%	34,52%	57,02%	72,02%	72,02%	72,02%	72,02%	72,02%	72,02%	72,02%
Ejec. Semanal	3,72%	3,50%	14,51%	17,00%	0,00%	15,62%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Ejec. Acumul	3,72%	7,22%	21,73%	38,73%	38,73%	52,65%	69,65%	69,65%	69,65%	69,65%	69,65%	69,65%	69,65%
Balance	1,72%	2,22%	0,99%	4,21%	4,21%	-4,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DESCRIPCION:

Se esta realizando la instalacion de la estructura para el cielo raso y se inicio el capitulo de pinturas.

CALIDAD

El contratista no ha entregado los certificados de calidad de las tejas que ha instalado.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el área SST se reciben entregables correspondientes de la semana, los cuales son charlas, inspección epp, permiso de trabajo en alturas.
Se recibe planilla de pago de seguridad social.

ADMINISTRATIVA

El contratista hizo entrega de la documentacion el dia miercoles 03 de noviembre y la interventoria esta en proceso de revision.

AMBIENTAL

Se realizo el retiro de 3 viajes sencillos de escombro al sitio de disposicion final. botadero aprobado.

JURÍDICA

Sin observaciones al respecto.

RECOMENDACIONES

Sin observaciones al respecto.

NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 6

SEMANA N°	6	DEL	jueves, 27 de octubre de 2022	AL	jueves, 3 de noviembre de 2022	
FECHA INICIO :	sep 22 2022	FECHA TERMINO :	15 nov. 2022	PAG	Pág. 2 de 2	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES	NIT O C.C.	3249514-5	CONTRATO N°	292
CONTRATISTA	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	900844978-4	CONTRATO N°	209 - 2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	ESTRUCTURA PARA EL CILO RASO.




UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	ESTRUCTURA PARA EL CILO RASO.



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	SE INICIA EL CAPITULO DE PINTURAS



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	SE INICIA EL CAPITULO DE PINTURAS

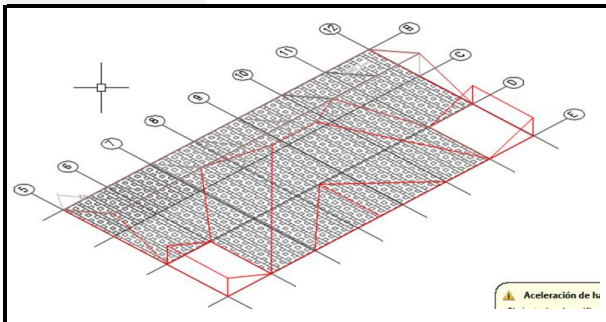

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	AREAS DE CIELO RASO



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	SE INICIA EL CABLEADO PARA LA ILUMINACION
