INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #7

FECHA DE CORTE: 1 DE JULIO DE 2022 – 31 DE JULIO DE 2022



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. INFORME DE GESTIÓN DE OBRA #7

1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1.1. Número de contrato: 2021040002

1.1.2. Objeto: Construcción del Centro de eventos, histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

1.1.3. Vr. contrato: $ 138.817.668.949,109

1.1.4. Plazo: 22 MESES

1.1.5. Fecha de Inicio: 12 de Julio de 2021

1.2. AVANCE DE OBRA

1.2.1. Cronograma de actividades programadas y ejecutadas para este corte

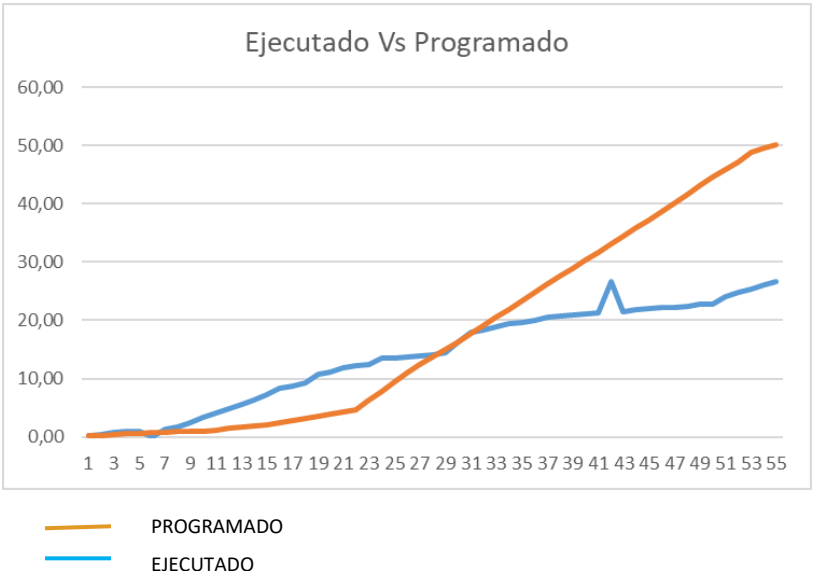


Imagen No. 1. Gráfico programado vs ejecutado

A la fecha se tiene un avance de obra **ejecutado de 23.29%** con un avance de obra **programado de 50.61%.**

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Izaje de estructura metálica

En esta actividad el montaje de la estructura se realizará desde la parte externa del proyecto, para lo cual se tienen habilitados distintos puntos de acceso para ingreso de la grúa hasta el lugar dispuesto para el posicionamiento, de acuerdo a los elementos a izar.

Previo al inicio del montaje, se hace la necesaria la instalación de elementos que permitan cargar las vigas de forma temporal (andamios de carga, plataformas, entre otros).

En este periodo se cobrarán 492.804,92 Kg de estructura Izada.






A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #7

FECHA DE CORTE: 1 DE JULIO DE 2022 – 31 DE JULIO DE 2022



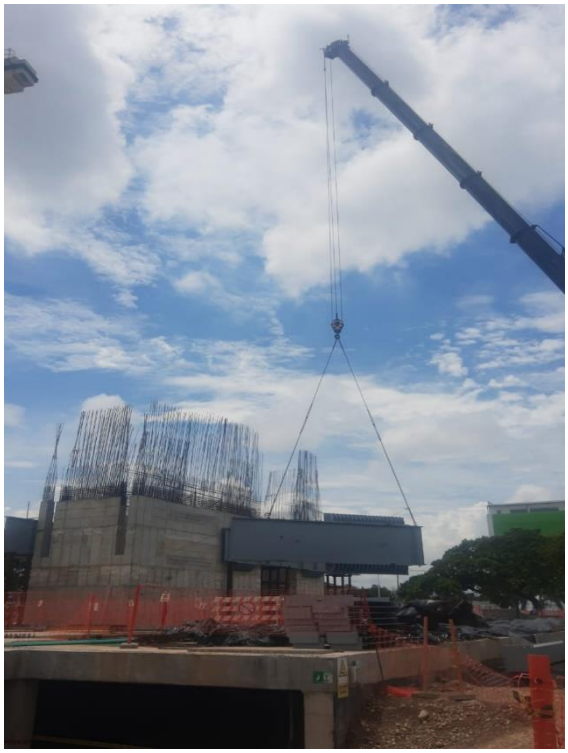







BITÁCORA DE OBRA
