383 31-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista no. programa actividades laborales para la presente fecha.

384 01-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua actividades de reparacion y resane en vigas, viguetas, riostras, losa del entrepiso del sotano. Continua con instalación de redes del sistema contraincendio. Continuan con los ajustes entre elementos de estructura metalica, instalación de pernos sobre los nodos Z32-Z34. Continuan con el armado de la tapa del tanque de abastecimiento de agua. El Contratista continua con el proceso de izaje de elementos de estructura metalica en el nodo Z35. En la presente fecha se realiza comite de diseño en el que participan personal del contratista, personal de interventoria y personal de la gobernación. La INTERVENTORIA recibe posición, nivelación y ubicación de platinas y mensulas instaladas en el nodo nucleo Z32, actividad que realiza el contratista para proceder el material epoxico - Mensula ubicada en el eje D y eje E; Se revisa ubicación, replanteo y aplome de muros y platinas ubicados en el nodo nucleo Z35.

385 02-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua instalación de redes contraincendio en el sotano. Continua instalacion de espuma y cordon de epoxico en juntas de dilatación de losa entrepiso. El contratista continua reparación y resane de de vigas, viguetas, riostras, de losa de entrepiso en el sotano. Continua armado de acero de la tapa del tanque de abastecimiento de

agua. El Contratista continua instalación de izaje y montajes de elementos de estructura metalica en el nodo Z35. El Contratista realiza excavación para posicionamiento de las patas de la torre grua para su posterior reubicación. El contratista continua instalación de formaleta para muros cortinas en el nodo Z33. Instalación de platinas. se continua ajustes entre elementos de estructura metalica y muros cortinas en el nodo Z32-Z34-Z35.

386 03-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua preparación y resane de vigas, viguetas, riostras, losa en el entrepiso del Sotano. El Contratista continua instalación de redes del Sistema Contraincendio en el sotano. El Contratista Continua instalación y aplicación del epóxico en juntas de dilatación en losa Contrapiso del sotano. El Contratista Realiza fundida de muros cortinas M-05(4)=So-j de la Z-33, del Muro M-03(3')=Sr-K y Muro cortina de el nodo Z-36 del Muro cortina M-03(4)=Sr-Kj M-08(K)=3'-4. El Contratista continua armado de formaleta para muros cortinas de la Z33. El Contratista continua proceso constructivo del izaje de los elementos de estructura metalica en el nodo Z35 y ajustes de Empalme, traslapo de elementos de estructura metalica en los nodos Z32-Z34-Z35. continuan con armado de acero de tapa del tanque de pagua.

387 04-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista Continua reparación y resane de vigas, viguetas, riostras, losa del entrepiso del sotano. El contratista continua instalación de redes contraincendio en el sotano. El Contratista ejecuta sellado de juntas de (Sotano) dilatación de losa Contrapiso. El Contratista Continua con actividades del muro cortina en el nodo Z33: Encofrado,

apuntalando, alineamiento, verticalidad. Continuan con los procesos de izaje en el nodo Z35. El Contratista continua con inyección del Epoxico en los empalmes de elementos estructurales del nodo Z32. El Contratista realiza curado de los nuevos concretos de los nodos, Z33.

388. 05-08-2022


ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.


ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua instalación de redes contraincendio en sotano. En la fecha del 04 de agosto/22 se recibe visita de periodistas y personal de la gobernación del cesar. El contratista continua reparación y resane de vigas, viguetas, riostras, losa del entrepiso que se encuentra en el sotano. El Contratista continua con el proceso de izaje de los elementos de la estructura metalica, inyeccion de epoxico en el nodo Z32. El Contratista continua apuntalamiento, encofrado, alineamiento, verticalidad del nodo Z33. El Contratista Realiza Fundida de la tapa del tanque de agua y Red del Sistema Contraincendio: 16.75 x 6.0 m x 0,25m = 24.13m^3.

Ing. Residente
A. Berbesi
04/08/2022

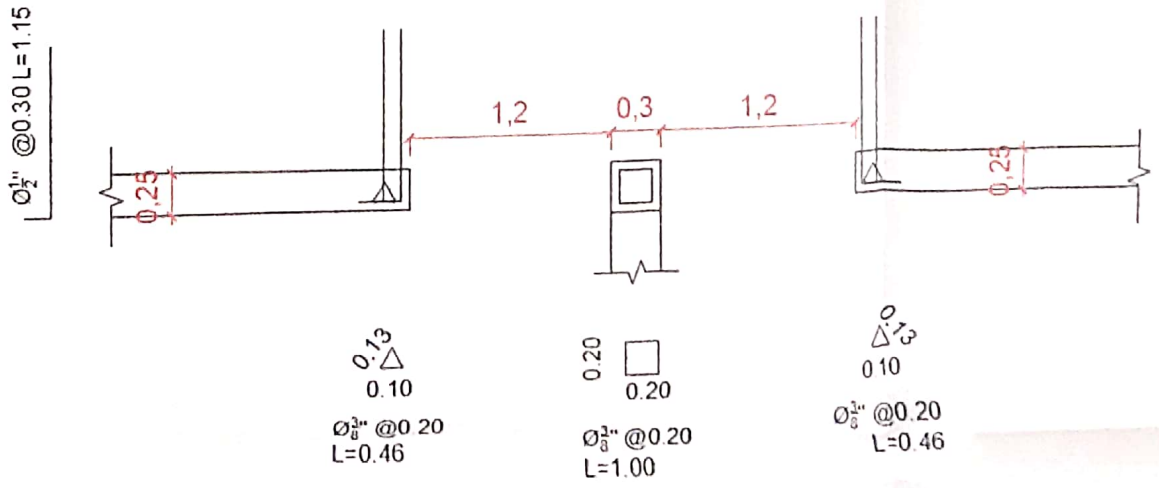

Detalle para refuerzo adicional en ventanas proyectadas construcción de muros superior para sabeta de tapa a talud en voladizo

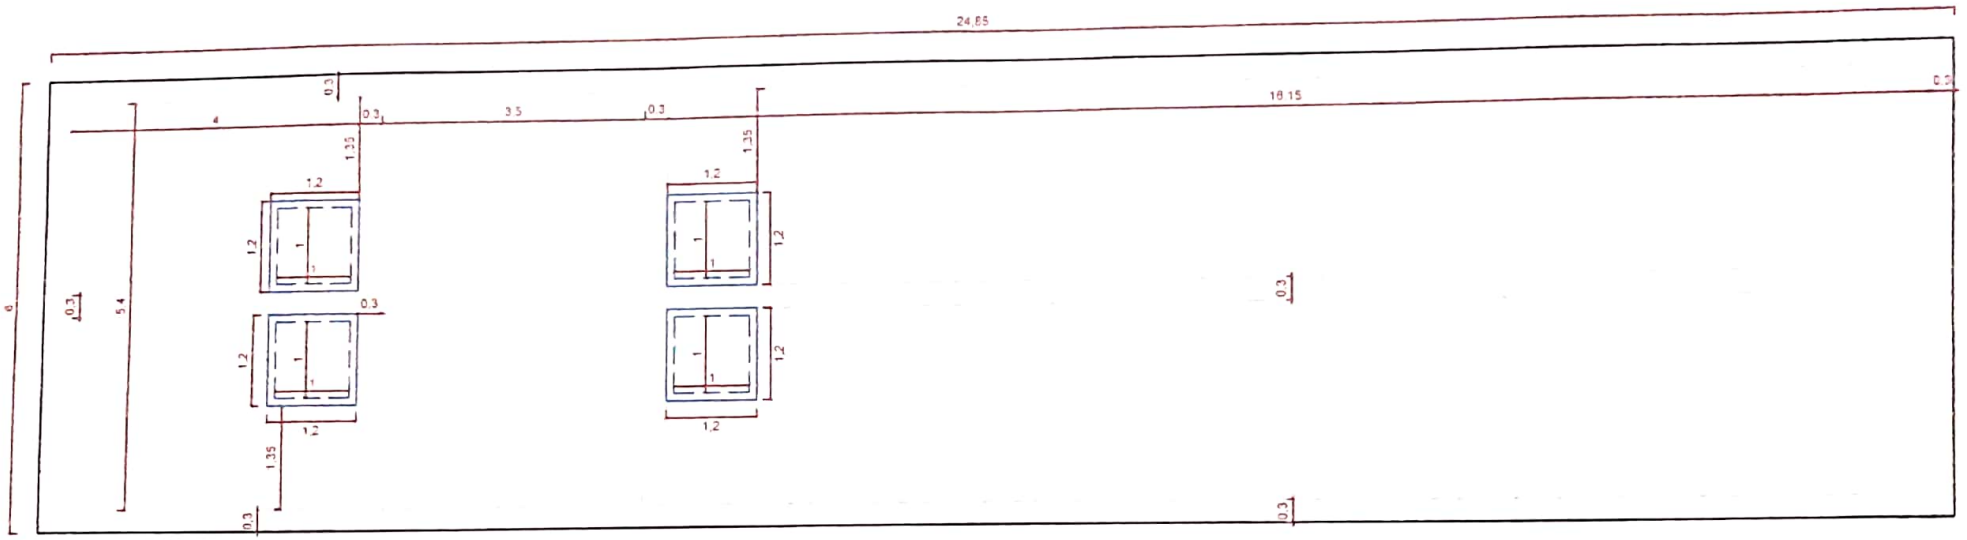

Ubicación de tapas de inspección para tanque RCI y agua potable, se amplia la sección para facilidad de acceso del personal al momento de realizar limpieza de los tanques y mantenimiento.

La sección inicial era de 1.00 x 1.00 m, se realiza cambio a 1.20 x 1.20 m

J.H. Castellanos
A. Constructor
04/08/2022

389 06-08-2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua actividades de reparacion en losa entrepiso = vigas, viguetas, losa en el sotano. Continuan con la instalación de red contraincendio. El contratista ejecuta fundida de muros cortinas en nodo Z35, No 2 / NODA. El contratista continua proceso constructivo del izaje de elementos de estructura metalica en el nodo Z32. Continuan ajustes de formaleta/encofrado de muro cortina para la fundida del nodo Z35. La INTERVENTORIA recibe localizacion, replanteo, alineamiento vertical y horizontal de formaleteria centrado, recubrimiento y aplome de acero de los muros cortinas ubicado sobre el nodo Z33, muro ubicado en el eje 3' entre H'-J y el muro ubicado en el eje H' entre eje 3'-4.

390 07-08-2022. DOMINGO.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista programa actividades laborales hasta la 1:00 pm. Ejecutan actividades de encofrado, aguntalamiento, alineamiento, verticalidad del nodo Z32 - nodo Z36.

391 08-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua con actividades de resane en losa entrepiso. Continua instalación de red contraincendio. En la presente fecha no se realiza izaje de elementos de estructura metalica por no haber elementos en obra, sopesar dientro la grua de 3 toneladas.

El contratista ejecuta instalación y armado de muro cortina en el nodo Z33 - Z36. El contratista ejecuta actividades de resane y reparación en hormigueros aplicando sikatop-122 plus, iniciando esta actividad el dia de hoy en la

losa de entrepiso = Vigas, viguetas, riostras. El contratista continua Procesos de la estructura metalica realizando. inyección del Epoxico en el nodo Z32 - Z35. El contratista continua armado de formaleta para muros cortinas en el nodo Z33/Z36.

392 09-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua procesos de la estructura metalica realizando inyeccion del epoxico en el nodo Z32-Z35. El contratista continua armando formaleta para muros cortinas en el nodo Z33-Z36. El contratista continua con actividades de reparación y resane en la losa de entrepiso. Continua. instalación de la red contraincendio. En la presente fecha no se realizo izaje de los elementos de la estructura metalica por no haber elementos en obra; se suspendiendo la Grua de 300 toneladas.
Contratista realiza limpieza y preparación de placas para columnas metalicas y realiza revisión y verificación de los ejes. (entre) Instalación de acero en muros cortinas de Z33 y Z36.

393 10-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

La INTERVENTORIA recibe localización replanteo alineamiento horizontal y vertical de formaleteria, cerchado y recubrimiento de acero de la cortina ubicados en el nodo nucleo 36-altura a fundir 1.80 m. Recibe localización replanteo alineamiento horizontal y vertical de formaleteria cerchado, aplome y recubrimiento de acero de la cortinas ubicados del muro ubicado en el eje 4 entre SO-J nodo 33, altura a fundir 1.80 m.o El Contratista continua con resane del entrepiso: Vigas, viguetas, riostras ubicado en el sotano. Continua con instalación de redes contraincendio. El Contratista realiza armado de muros cortinas-formaleta en el nodo Z33. El Contratista realiza proceso de izaje de columnas "(col2)" de estructura Metalica. (TRES). El contratista conti-

nua con los ajustes de los vigas de estructura metalica en el nodo 32-Z34-Z35. En la presente fecha se recibe visita del buro la obra CCMU en compañia del contratista, la interventoría y la Gobernación.

394 11-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista realiza resane y reparación en viga y viguetas, riostras de la losa entrepiso que cubre el sotano. El Contratista Continua ajustes en la instalación de formaleta de los muros cortinas del nodo Z-33 = muro ubicado en el eje H' entre 3'-4, muro ubicado en el eje 3' entre H'-J. El Contratista Continua limpieza de platinas de las columnas del tramo de la estructura metalica. El contratista Continua con los ajustes entre vigas, mensulas de la estructura metalica apoyado en los muros cortinas. La INTERVENTORIA recibe localizacion, replanteo, alineamiento horizontal y vertical de formaleteria, entrado aplome y recubrimiento de acero de la continuidad de los muros cortinas ubicados en el nodo Z33, muro ubicado en el eje H' entre 3'-4, muro ubicado en el eje 3' entre H'-J, altura a fundir 1.80m. En la presente fecha llega material de estructura metalica para el izaje. El contratista ejecuta fundida de concreto para muros cortinas del nodo Z-33 del muro 02(3')=H'-J / M-08A (H'=3'-4). El dia de hoy se realiza reunion en la sala de juntas de la obra en la cual participan el secretario de gobierno Municipal, asesor por parte de la secretaria de Gobierno departamental, miembros de la oficina de espacio publico municipal, vendedores informales estacionarios ubicados al rededor de la obra con sus apoderados judiciales, representantes por parte del contratista y la interventoria con el proposito de llegar a un acuerdo para el proceso de reubicacion temporal de los vendedores acatando fallo judicial de accion de tutela

interpuesta por los vendedores, finalmente se logro llegar a un acuerdo entre las partes para dicha reubicacion la que inicio a partir de la firma del acta de compromiso por parte de la secretaria de gobierno Municipal Claudia Hoyos

395 12-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. lluvias desde 5:00pm hasta 6:00 pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua reparacion y resane de vigas, viguetas, viguetas, riostras en losa contrapiso que cubre sotano. El contratista continua actividades en muro cortina = desencofre de formaleteria de los muros cortinos en el nodo Z36. El contratista realiza proceso constructivo de izaje de la estructura metalica; realizan soldadura en uniones de vigas metalicas en el nodo Z34. El contratista ejecuta actividades de la inyeccion de epoxico, e instalacion de empaque para los tubos pasantes.

396 13-08-2022 . SABADO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua desencofre de muro cortina del nodo Z38. Continuan con reparaciones en este caso en muros cortinos del nodo Z-36. El contratista inicia armado de apoyos en el nodo Z32 para darle continuidad al armado de acero. Continua con soldadura entre elementos de la estructura metalica en los nodos Z32-Z34-Z35. El contratista aplica actividades de inyectar el epoxico Hapeflex PU45 e instala empaque para los tubos pasantes.

397 14-08-2022 . DOMINGO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista programa actividades hasta la 1:00 pm. Las siglas actividades son ejecutadas por el

Contratista: armado de acero en muro de zapatas #32. Resane y reparación en muros cortinas del nodo 33 y 36, realizan inyección del epoxico Hapeflex PU45, instalan empaque para tubo pasante.

398. 15-08-2022. LUNES FESTIVO

ESTADO DEL TIEMPO

Día soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista programa actividades hasta la 1:00 pm.
El Contratista ejecuta actividades de armado de acero en muro de zapatas #32. Resane y reparación en muros cortinas del nodo Z33 - Z36. Continuan inyección del epoxico Hapeflex PU45. Continuan instalación de empaque para tubo pasante.

399 16-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Día Soleado. Lluvias desde los 4:00pm hasta 5:30pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista ejecuta armado de acero en muros cortinas del nodo 0 zapata #32. El contratista ejecuta soldaduras entre elementos de la estructura metalica = vigas, en el nodo Z32. El contratista realiza inyección del epoxico Hapeflex PU45 en el nodo Z35. El Contratista realiza reparación de muros cortinas en el nodo Z36. El Contratista continua actividades de resane y reparación de muros perimetrales en sotano, de vigas-viguetas-riostras de la losa de entrepiso que cubre el Sotano.

400 17-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Día soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista realiza grua desde el nodo Z35 al nodo Z33-36. El contratista continua armado de acero en muros cortinas del nodo Z32. Continuan con reparación en muros cortinas del nonodo Z33. El contratista continua soldadura entre vigas metalicas del proceso constructivo de estructura metalica.

El contratista continua con la inyección del epoxico mapeflex PU 45. El contratista continua reparación y resane de vigas, viguetas, riostras en la losa entrepiso que cubre el sotano. El contratista continua. con procesos de sacanucleos en muros cortinas del nodo Z33.

401 18-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista ejecuta izaje del proceso constructivo de estructura metalica sobre el nodo Z36. Continuan armado de acero en muros cortinas. del nodo Z-32. Continuan con la soldadura entre las Vigas metalicas en el nodo Z32. El contratista continua con la aplicación del epoxico mapeflex PU45 para los procesos constivos de la estructura metalica. Continuan con reparacion de losa entre piso que cubre el sotano y reparacion de muros cortinas.

402 19-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el p) El contratista ejecuta actividades de armado de acero en muros cortinas del nodo Z32 en un area aproximado de 3.0 metros de altura de la cota del segundo - piso. El contratista continua con soldadura entre vigas de la estructura metalica. El contratista continua con el izaje en el nodo Z36 - Z33. En la fecha del 18-08-2022 la interventoria realiza prueba de tinta de forma aleatoria en el nodo - nodo Z32. Continua con la reparacion de muros cortinas del nodo Z33. El personal de obra para actividades de reparación de muros cortinas y resane en el nodo Z33 realizaron actividades hasta los 9:30 pm aproximadas. Continuan con resanes y reparación de la losa entrepiso que cubre el sotano.

403 20-08-2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO
Dia soleado. lluvias durante la noche.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista realiza actividades de reparacion y resane en vigas, viguetas, riostras en la losa entrepiso. El Contratista continua armado de acero en muros Cortinas del nodo Z32 sobre el segundo piso- cota +7.18, a una altura aproximada de 3.0 metros y en el nodo Z35. El Contratista ejecuta armado de la tapa del tanque; instalacion de formaleta, acero pantalles, cerchas. El contratista continua relleno en zona lateral del tanque cerca a muro diagonal. El Contratista continua con la inyeccion del epoxico Hapeflex PU 45. El Contratista ejecuta instalacion de vigas de estructura metalica del proceso constructivo de izaje en el nodo Z-33.

404 21-08-2022. DOMINGO.
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia soleado. lluvias desde 7:00 a 8:00pm.
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
En la presente fecha no se programaron actividades laborales.

405 22-08-2022.
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia soleado. lluvias desde 7:30pm a 8:30pm.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista continua armado de acero en muros cortinas del nodo Z32-Z35. sobre la cota +7.18 del segundo piso. continua con el proceso constructivo del izaje o montaje de elementos de la estructura metalica en el nodo N Z-33. El Contratista continua con relleno permeable entre muro perimetral-diagonal y tanque de abastecimiento de agua y RCI para instalacion del fibra, tuberia de fibra para la conexion hacia el foso ejector. El contratista esta preparando zona para la instalacion del fibra para la conexion hacia el foso ejector. Continua con la construccion o trillo del foso ejector. El contratista sella zonas de cerbata. ubicadas en el muro externo del tanque de agua, muro externo que esta ubicado en

Gente del muro perimetral-Diagonal. El Contratista continua con resane, Reparación de la losa de entrepiso del sotano. La interventoria realiza revisión y seguimiento durante instalacion de filtro perimetral, longitud 20 metros de tubería instalados entre los ejes S1 al S4.

106. 23-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista realiza actividades de soldadura entre los elementos de la Estructura metalica del nodo Z34. El Contratista ejecuta armado de acero en muros cortinas del nodo Z32-Z35 sobre la cota +7.18 del segundo piso. El Contratista ejecuta actividades con la inyeccion del epoxico mapeclex pu45. En la presente fecha se realiza visita de la ingeniesa Ester Mendoza, secretaria de la infraestructura de la gobernación en conjunto con personal de la interventoria y personal del contratista para recorrido e inspección de obra. El Contratista ejecuta el proceso constructivo del izaje en el nodo Z33. Continuan con la instalacion del proceso constructivo para la conexión del filtro de drenaje hacia el foso ejectos. El Contratista continua armado de la tapa del tanque: armado de acero, armado de meso/formaleta con sus puntales, cerchas. Continuan con la construccion del foso ejectos.

107 24-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. lluvias desde 7:30 pm a 9:30 pm

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista continua armado de acero, pesa o formaleta con sus puntales, cerchas de apoyo. El Contratista ejecuta instalación de pernos, proceso de la estructura metalica en el nodo 33. El Contratista continua armado de acero en muros cortinas del nodo Z32-Z35 sobre la cota +7.18 del segundo piso. El contratista continua reparación y resane de vigas, viguetas, riostra y losa de entrepiso que cubre el sotano.

El contratista continua armado de acero, armado de mesa con sus puntales, cordas para tapa de tanque. El contratista continua con actividades de soldadura en el proceso constructivo de la estructura metalica. El contratista ejecuta actividades de inyección del epoxico-maseflex PU45 en nodo 34 y (nodo) nodo 36. El contratista realiza izaje de 2 columnas de la estructura metalica.

108 25-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. Lluvias desde 5:00 a 8:30 am.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua proceso constructivo de estructura metalica, izaje de una viga en el nodo 36. Ejecuta actividades de excavación para zapatas que serán de apoyo para los patas de la grua. El contratista continua actividades de armado de acero para muros cortinas, columnas del nodo 32-35. Ejecutan soldadura entre vigas de la estructura metalica del nodo 34. El contratista ejecuta armado de fibra al carbón para la red contraincendio en el sotano. El contratista ejecuta resanes y reparaciones de vigas, viguetas y losetas de la losa entrepiso que cubre el sotano. Ejecutan instalación de formaleta en el nodo 32 en el nivel del 2do piso. El contratista realiza saca nucleos en muros cortinas del nodo 34. El contratista inicia retiro de cerramiento del perimetro del proyecto CCMV por el area de la Cra 15.

109 26-08-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. Lluvias desde 1:30 am hasta 3:30 am

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realiza reparación y resane de vigas, viguetas, losetas de la losa entrepiso que cubre el sotano. Continuan con actividades del sistema de la red contraincendio. Continuan con procesos constructivos para el retiro del cerramiento del perimetro del proyecto CCMV por el area de la carrera 15. La Tu-

Tesventoría Socializa con el Contratista humedades por causa de la lluvia en muros perimetrales o de contención en el sotano, se recomienda revisar en conjunto la zona perimetral y se replizó evidenciando las zonas puntuales; el Contratista dice revisar el tema para hacerle corrección. El Contratista continua armado de acero de muros cortinas y de columnas en el 2do piso del nodo 32-35. El contratista ejecuta izaje de vigas de la estructura metalica en el nodo 33. Ejecutan Soldaduras entre 2 vigas Metalicas y aplicaron inyectan epoxico - mapeflex PU45 en el nodo 34.

110 27-08-2022. SABADO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista ejecuta instalacion de red contra incendio en el sotano. Continua con reparacion y resane de vigas, viguetes, riostras y de losa de entrepiso que cubre el sotano. El contratista ejecuta armado de acero para columnas y muros cortinas del nodo 32-35. Continua con inyeccion del epoxico. mapeflex pu 45. en nodo 34. y continuan con soldadura entre vigas de estructura metalica en el nodo 34-33. El Contratista ejecuta armado de formaleta para muros cortinas en el 2do piso del nodo 32. Ejecuta izaje de estructura metalica en el nodo . Continua con armado de acero en el 2do piso del nodo 32-35.

111 28-08-2022. DOMINGO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista programa actividades en el dia de hoy. Ejecuta instalacion del proceso constructivo de la estructura metalica: realiza izaje de vigas metalicas en el nodo 33.

112 29-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. (Lluvias) desde 3:00 am hasta 5:00 am, Sereno. Sereno

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista ejecuta actividades del proceso constructivo del izaje de estructura metalica: izaje de vigas metalicas, soldadura entre vigas metalicas, inyeccion de epoxico mapeflex pu45 en el nodo 34 y 36, Chequeo y ajuste de vigas y Dovelas en el nodo 34, izaje en nodo 32-33. El Contratista ejecuta actividades de armado de acero en nodo 32-34-35 Ejecuta instalacion de formaleta para muros y columnas en el nodo 32 sobre el 2do piso. El Contratista ejecuta reparacion pulida y resane de la losa contrapiso en el sotano. Ejecuta continuidad de actividades del cerramiento de la obra en el area de la cra 15. El Contratista ejecuta actividades de la instalacion de la red contraincendio.

113 30-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista ejecuta actividades de reparacion de losa entrepiso en el sotano. El Contratista continua con retiro del perimetro del proyecto ccmu por la cra 15. El Contratista continua con la instalacion y armado de formaleta de muros cortinas y columna del nodo 32 en el 2do piso. El Contratista continua armado de acero para muros cortinas del 2do piso en el nodo 32-34-35. Continua con el proceso constructivo de estructura metalica ejecutando chequeo y ajuste de vigas y mensulas en el nodo 34. Continua con la inyeccion del epoxico del nodo 34 y 36. El Contratista ejecuta tapa del tanque de abastecimiento de agua y zapatas para apoyo de patas de la grua por la clle 16. El Contratista ejecuta proceso constructivo de la estructura metalica izando vigas entre el nodo 33-36.

114 31-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista realiza curado de la tapa del tanque de agua. Continua con reparación y pulido de vigas, viguetas, riostras, de la losa entrepiso del sotano. Continua con el perí retiro del cerramiento de la obra CCMV por la cra 15. El Contratista ejecuta proceso constructivo de estructura metalica realizando izaje en el nodo 32-33, y columna. El Constratista Continua con armado de formaleta de muros cortinas y columnas del 2do piso del nodo 32. Continuan armado de acero en muros cortinas del 2do piso del nodo 32-34-35. Continua con proceso constructivo de estructura metalica ejecutando chequeo y ajuste de vigas y ponchas o mensulas del nodo 34. Ejecuta inyección del epoxico mapefloc pu45 (gel) en el nodo 34 y 36. El contratista ejecuta instalación de platinas del nodo 33 y 36. En la presente fecha se recibe para visita de obra personal de la gobernación personal de Acoustruir de Barranquilla, personal de Acoustruir de la obra, personal de Interventoría siendo prioridad el proceso constructivo y avance de la estructura metalica quedando como compromiso entrega de la programación de despache e izaje. El contratista ejecuta corte y figurado de acero en obra.

115 01-09-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

3 APDKM
