FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24/09/2022 (dd-mm-aa) **AL** 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))





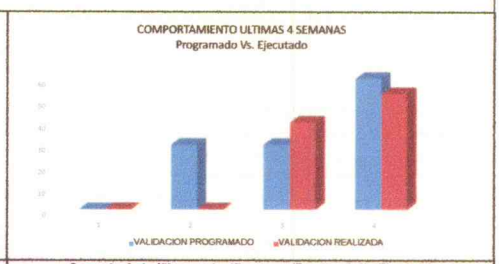

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	60	30%	53	26%	0%	-4%

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)			
Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
40	13	0%	33%


Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)												
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
1	0	0	2	30	0	3	30	40	4	60	53

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la semana se realizaron 13 validaciones correspondientes a los siguientes MV:
MVBF_1072, MVBF_1108, MVBF_1117, MVBF_1130, MVBF_1073, MVBF_1110, MVBF_1118, MVBF_1141, MVBF_1148, MVBF_1111, MVBF_1121, MVBF_1128 Y MVBF_1124
2. Según la programación se evidencia que a la fecha se debían haber realizado 60 validaciones, lo que indica que frente a las validaciones realizadas se presenta atraso, ya que con las 13 ejecutadas en la presente semana suma un total de 53 validaciones a la fecha.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

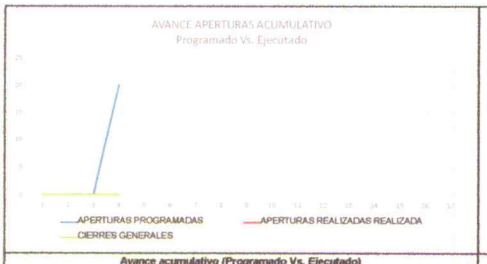





Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	20	10%	0	0%	0	-10%

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)			
Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
20	0	0	10%

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)												
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	20	0

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras debía iniciar el día 29 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió. Por lo tanto a la fecha el Contratista de Obra no presenta avance en ejecución de las viviendas.


Building SAS / UNIPLAYCO SAS	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24/09/2022 (dd-mm-aa) **AL** 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

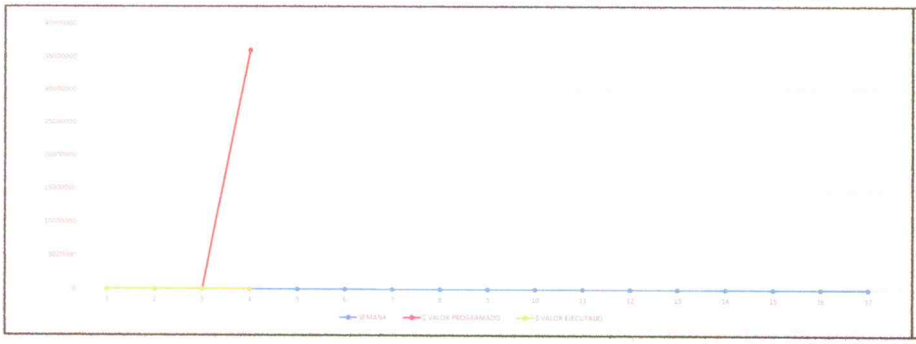

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 36.000.000		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
1%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 36.000.000		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
1%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): **$ 36.000.000**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **-1%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

A la fecha el Contratista presenta según el flujo de caja un avance programado de $36.000.000 lo que indica un 1% al no haber iniciado la ejecución de las viviendas no se muestra un avance en el aspecto financiero.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

Building SAS / INPLAYCO SAS	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24/09/2022 (dd-mm-aa) **AL** 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Se dio aprobación de los NP presentados por el Contratista, esto con el fin de completar la base técnica y dar aval para inicio de realización de los presupuestos.

2. Se le recuerda al Contratista que para efectos del contrato en ejecución, todos los materiales a utilizar deben de estar marcados dentro su programa de calidad y cumplir cabalmente los requisitos de compra.

3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-019 la entrega de la hoja de vida del profesional SST faltante, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta Interventoría.

4. Se evidencia que a la fecha el Contratista presenta atraso con el inicio de las obras ya que según la programación presentada debía de dar inicio el día 29 de Septiembre con 20 MV y al día de hoy no se ha evidenciado inicio en ninguna de las viviendas.

5. Se solicita al Contratista de obra justificar el porque no se realizo la validación de 19 viviendas las cuales se encontraban según programación para esta primer etapa de validaciones. Los MV son: MVBF_1187, MVBF_0715, MVBF_1321, MVBF_1354, MVBF_1098, MVBF_808, MVBF_805, MVBF_801, MVBF_820, MVBF_835, MVBF_0837, MVBF_0841, MVBF_0840, MVBF_850, MVBF_853, MVBF_854, MVBF_0789, MVBF_791 Y MVBF_0758

6. Durante el periodo se realizaron 13 caracterizaciones sociales, donde se hizo el acompañamiento por parte de los profesionales, se explicó a los beneficiarios nuevamente el proceso del mejoramiento de vivienda, las condiciones, las actividades que no se ejecutan etc.. A las viviendas con cambios de cubierta de las cuales se identificaron 2 por el área técnica, se informó de la mano con el área Sst que si las tejas a desmontar son de material de zinc no hay problema en dejárselas si así lo solicitan, pero si son de asbesto debe tener un proceso de retiro especial por lo tanto es imposible dejarlas en las viviendas. También se socializó en la misma visita del punto de atención PAC y los horarios de atención.

7. Se identificaron 3 viviendas para postulación a historias de vida, están pendientes las relatorías. el MVBF_0737 no hace parte del proceso.
MVBF_1050 FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ
MVBF_1118 LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES
MVBF_1148 LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y
SEMANA 4	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 4	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

Se realiza nueva revisión y correcciones de la documentación de PMA, CALIDAD, SST, CALIDAD y los documentos soporte. En esta semana no hay comité de obra, se realizó visita a la bodega de materiales, evidenciando orden y disposición de materiales, se encontraron fichas de seguridad cerca a los productos químicos.

Se hace oficio recordando el profesional SST faltante y otras observaciones del componente SST - AMBIENTAL

Contratista reporta la inducción de 13 personas, se recalco que el scan debe ser claro y legible.

Se realiza charla sobre divulgación del procedimiento de cubiertas asbesto cemento, dictada al personal de interventoría. Se hace acompañamiento SISOMA en las validaciones de vivienda

Se incluye las 13 profesionales del contratista aprobadas, sigue pendiente el Profesional SST, al cierre del informe se reciben 10 documentos de afiliación personal de obra no se incluyen por estar en revisión de documentos.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1: REPORTE VISITAS TECNICAS
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO VALIDACIONES TECNICAS
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los TRES (Día en letras) 3 (Día en números) días del mes del OCTUBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre(Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Reporte visitas técnicas

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR

ID_MV	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MVBF_1072	MARIA AURORA PERÉZ AVELLA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso, enchape de muro en cocina, mesón nuevo.
MVBF_1073	LEOPOLDO LEÓN MORALES	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, pañete parcial en baños, enchape de piso y de muro, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura en baño 1 y 2.
MVBF_1141	BLANCA FLOR TRIANA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso en alcobas, cocina, baño, hall y sala, adecuación de puntos hidráulicos y sanitarios en baño y cocina, enchape de muro en baño cocina y zona de ropas y posible mesón nuevo.
MVBF_1148	LUZ MARINA PIRAGAUTA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso, pintura, cielo raso en alcobas, instalación de enchape de piso y de muro e instalación de combo sanitario en baño 1, puertas en baños, pañete mochetas de mesón y enchape del mismo, enchape de muro en cocina, enchape de piso en comedor y alcoba niños.
MVBF_1110	FLOR TRIANA AVILA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, demolición de enchape de muro y de piso, alistado y enchape de muro y de piso en baño, cocina y zona de ropas, alistado y enchape de piso en alcobas y hall, preparación y aplicación de pintura en muros, demolición y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1118	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTÉS	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividad de cubierta, baño y cocina completos.
MVBF_1128	ISMELDA PEREZ GARCIA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, alistado y enchape de piso, demolición mesón de cocina, enchape de muro y mesón nuevo en cocina, muro en drywall para aislar la humedad en alcoba de adulto mayor, preparación de muros para nueva aplicación de pintura, enchape de muro en zona de ropas y pintura.
MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y grifería, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_1117	RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMORA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta parcial en alcobas, pañete, pintura, alistado y enchape de piso en alcobas, baño y cocina y enchape de muro en baño y cocina, instalación combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1111	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso en todo el apartamento, enchape de piso en baño 1, cambio de combo sanitario en baño 1 y 2, pintura, cielo raso y posible estuco.
MVBF_1124	HECTOR HERNANDO VELOSA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de alistado y enchape de piso, enchape de muro en zona de ropas y baño segundo piso, demolición enchape de piso e instalación de enchape nuevo en baño 1 y 2 y cambio de combo sanitario en baño 1.

ANEXO 2


Registro fotográfico validaciones técnicas

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1072 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

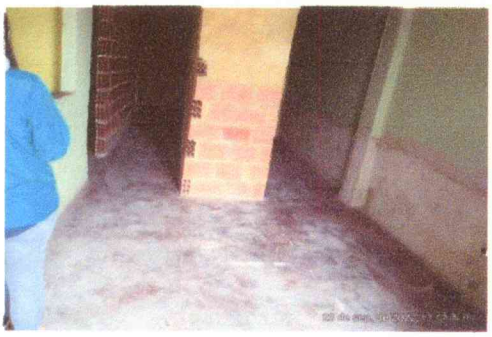

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

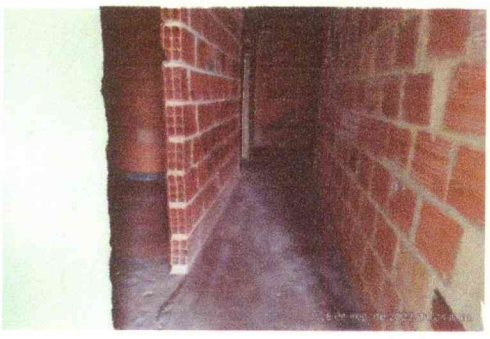

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1073 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO
MVBF_ 1141 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

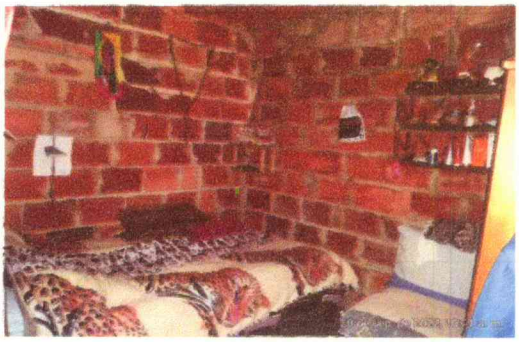

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall

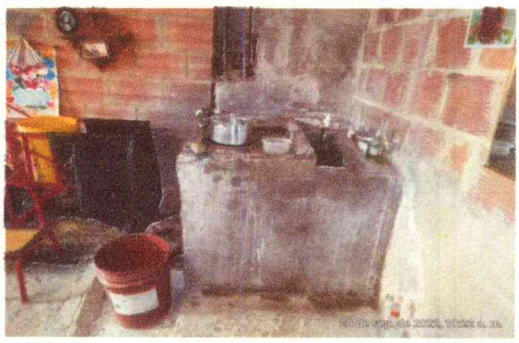


miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1148 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

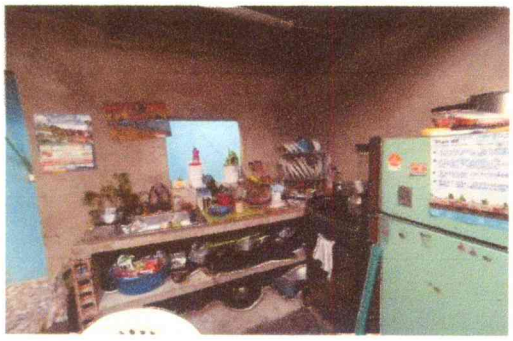


miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

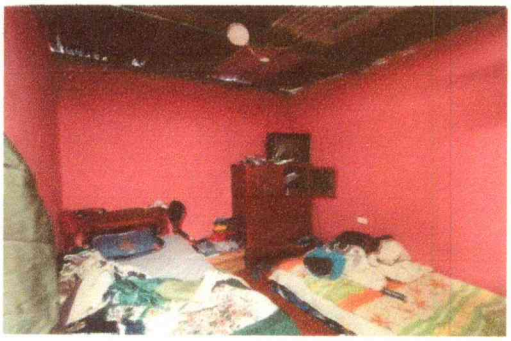


miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

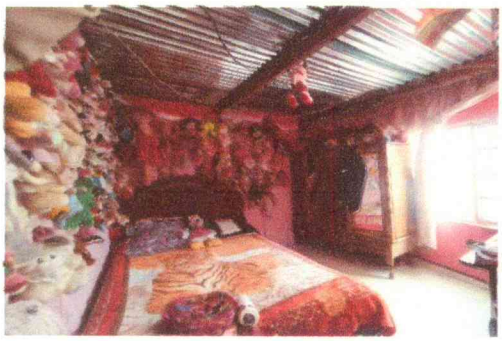

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

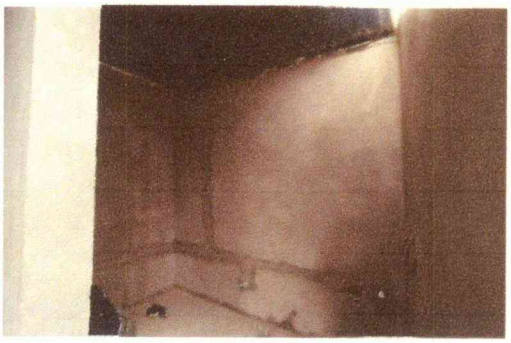

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

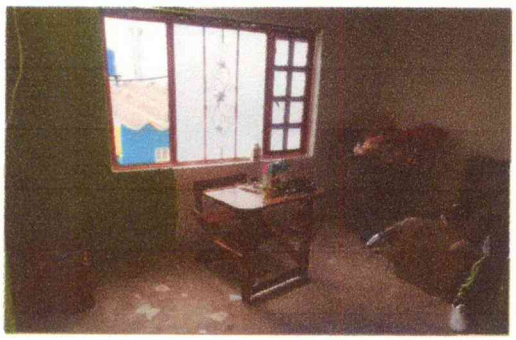

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual habitacion niños




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1110 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

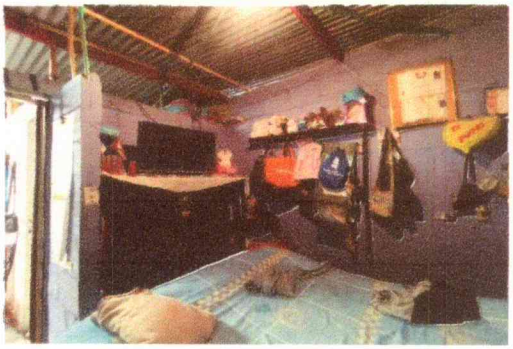


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

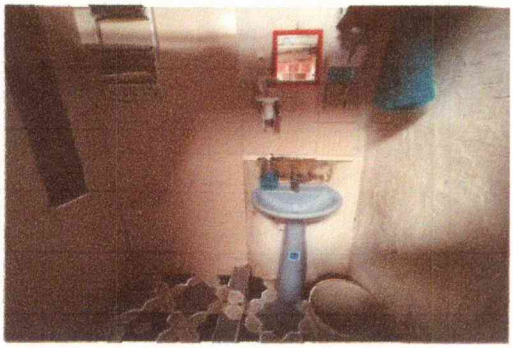

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

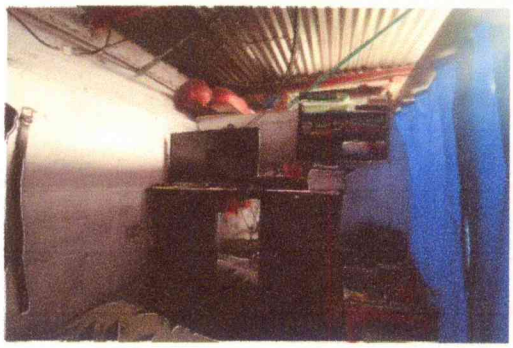


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1118 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

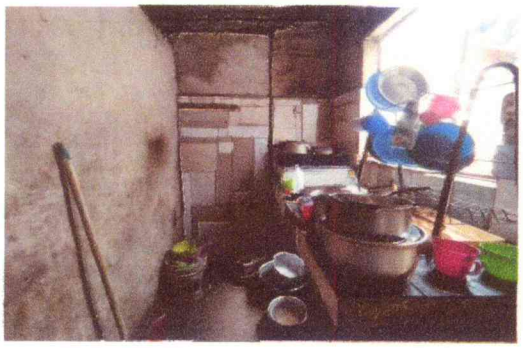


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

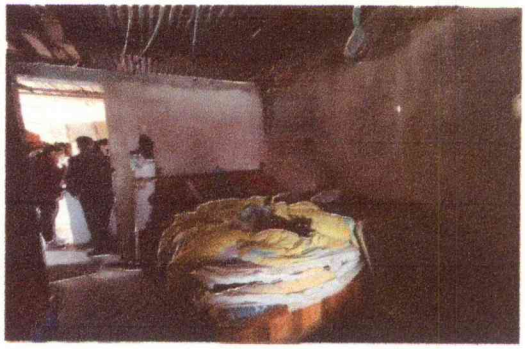


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

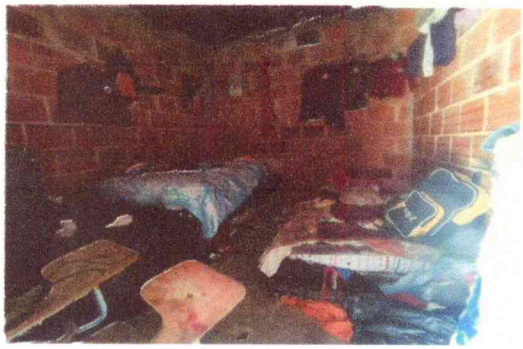


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

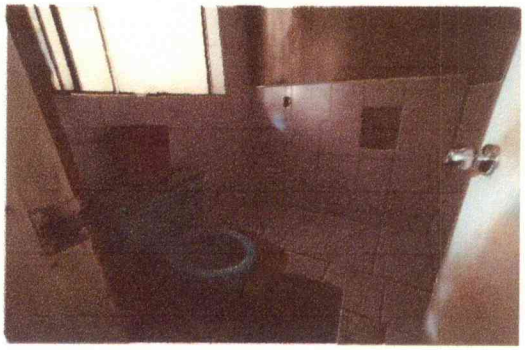

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

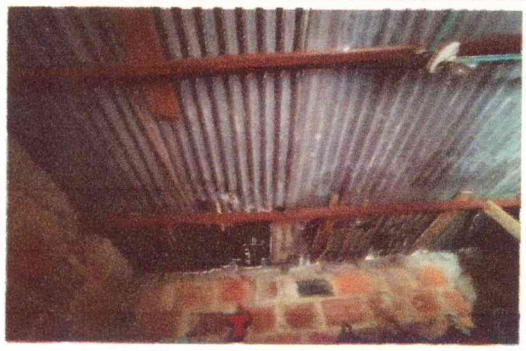

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta

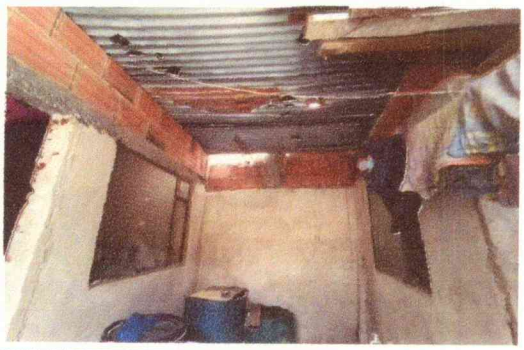


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1128 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

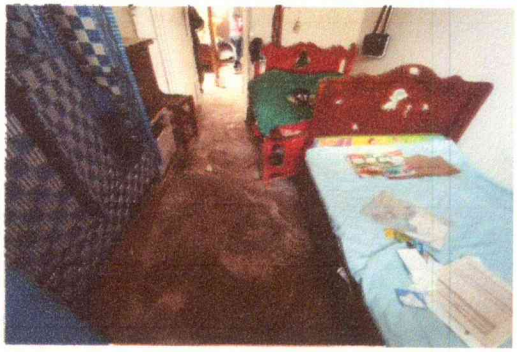


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

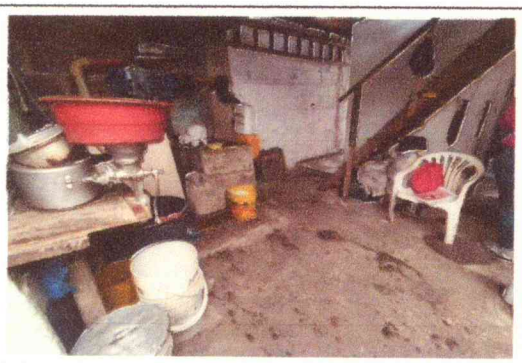

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1117 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

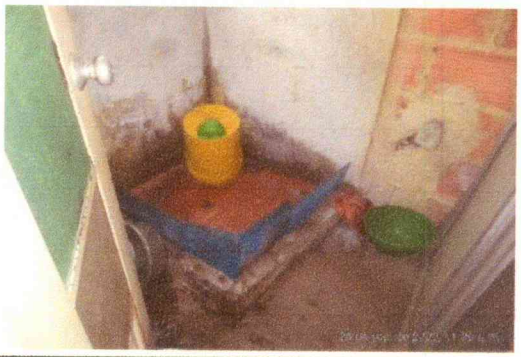

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

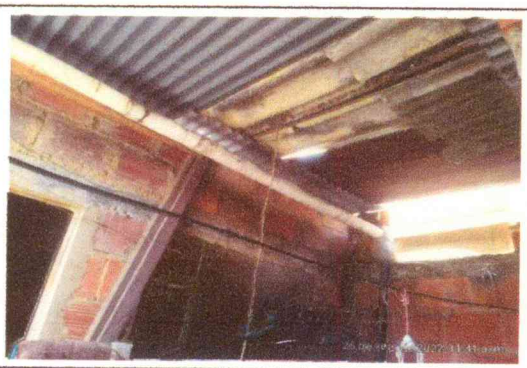


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1111 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

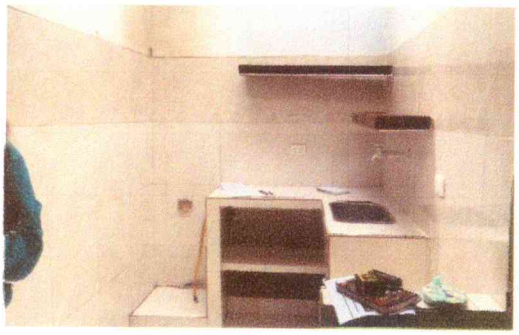

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1124 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

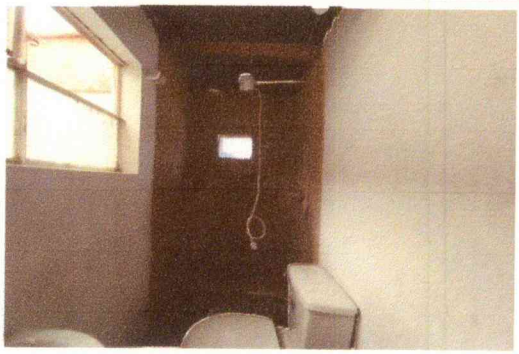

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2

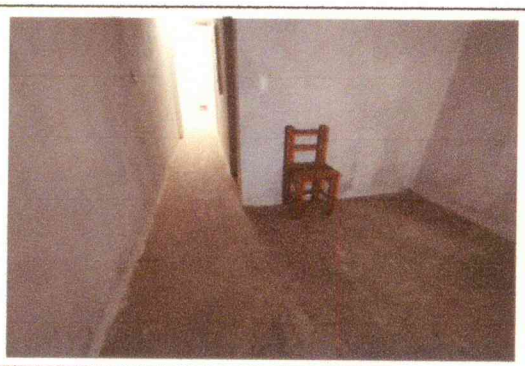

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall

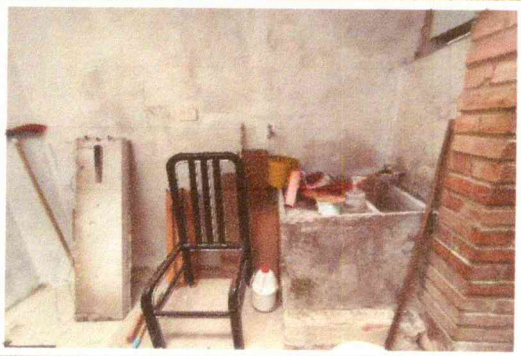


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1130 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

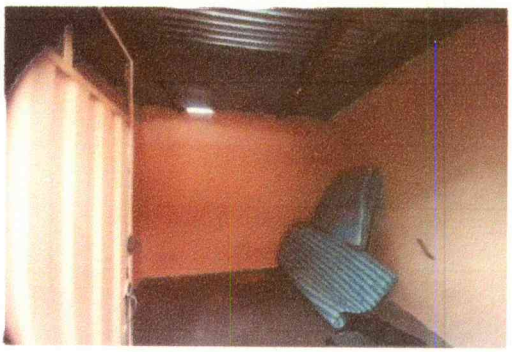


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala cocina

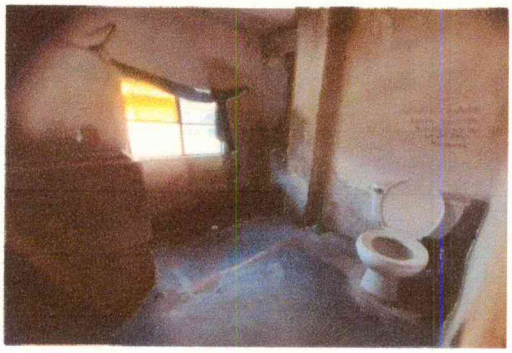

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

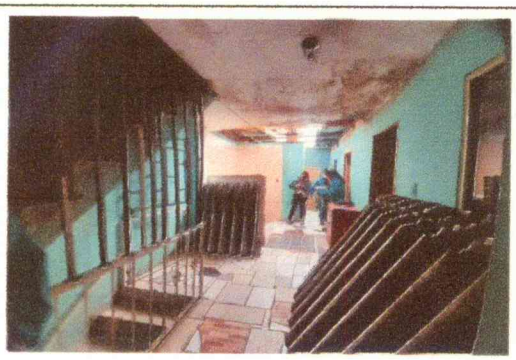


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1121 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

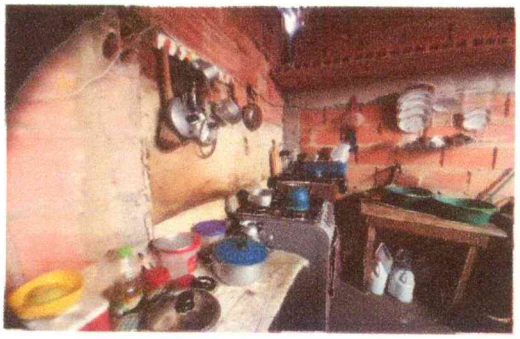


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

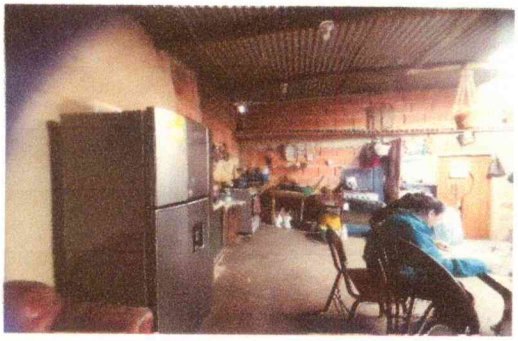


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

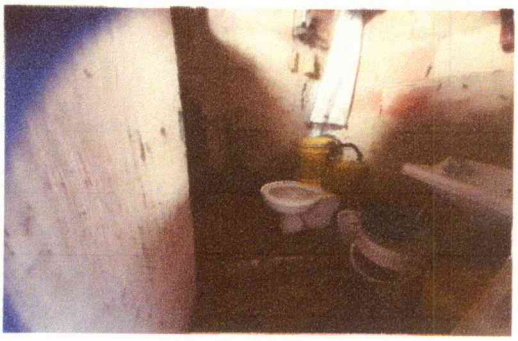

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

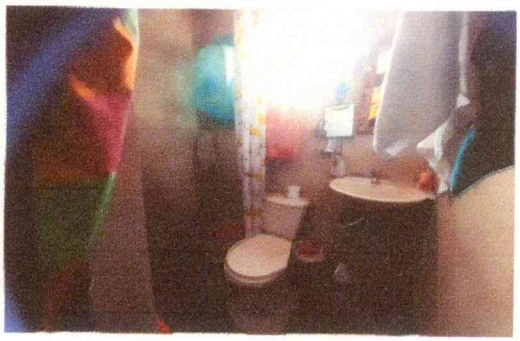


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de baño 2

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1108 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

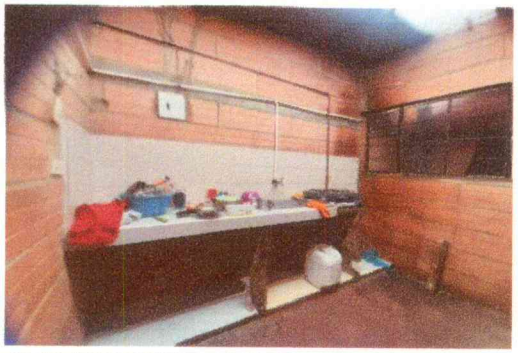

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

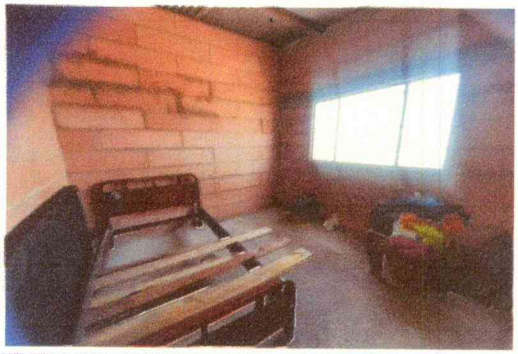


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

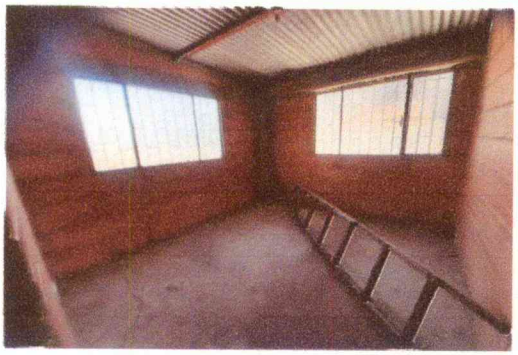


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2

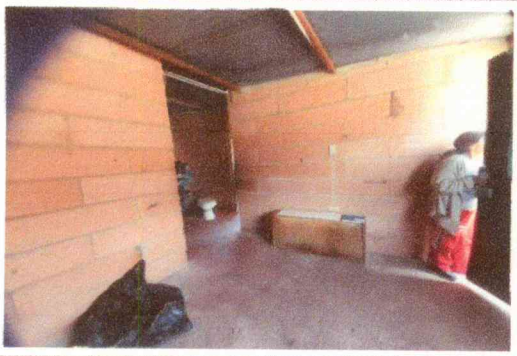

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala

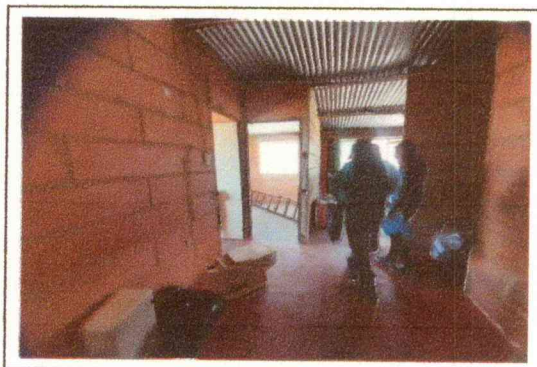


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual comedor


ANEXO 3

Registro fotográfico caracterizaciones sociales

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES

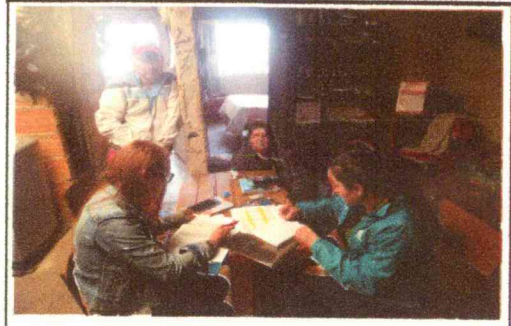

Actividad: Caracterización social
MVBF_1121
Fecha: 26/09/2022

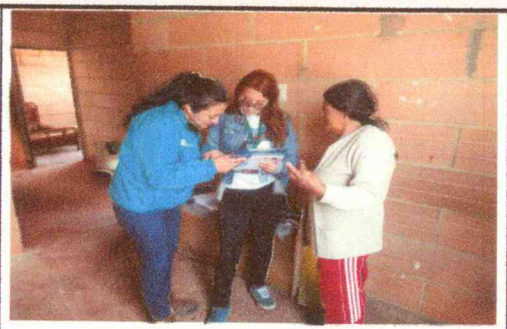

Actividad: Caracterización social
MVBF_1108
Fecha: 26/0/2022




Actividad: Caracterización social
MVBF-1130
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1117
Fecha: 26/09/2022




Actividad: Caracterización social
MVBF_1110
Fecha: 26/09/2022

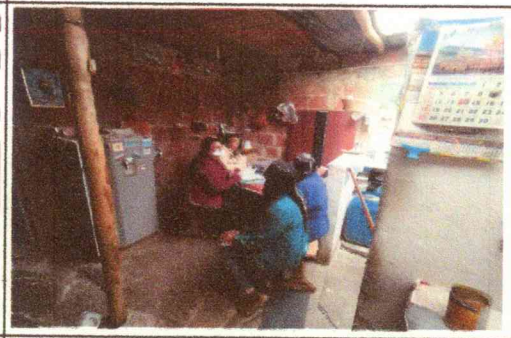

Actividad: Caracterización Social
MVBF_1128
Fecha: 26/09/2022




Actividad: Caracterización social
MVBF-1118
Fecha: 26/09/2022

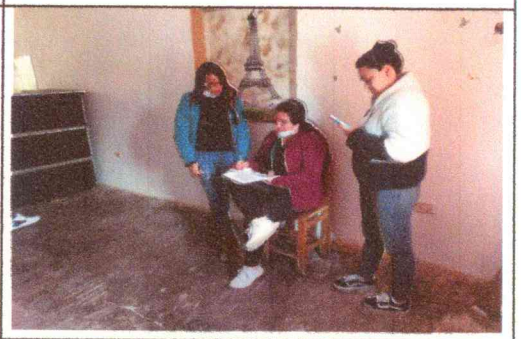

Actividad: Caracterización Social
MVBF_11124
Fecha: 26/09/2022




Actividad: Caracterización social
MVBF_1073
Fecha: 28/09/2022

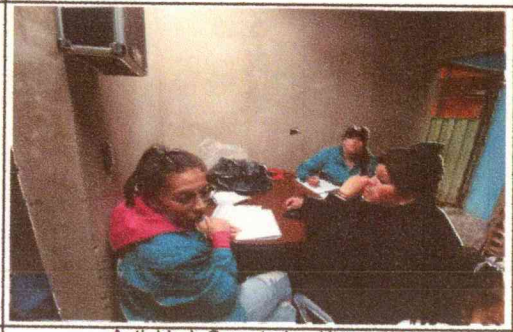



Actividad: Caracterización social
MVBF_1048
Fecha: 28/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1111
Fecha: 28/09/2022

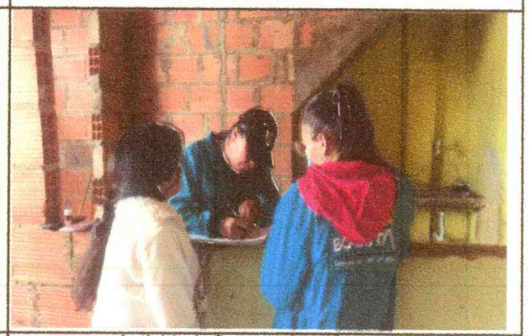

Actividad: Caracterización social
MVBF_1072
Fecha: 28/09/2022

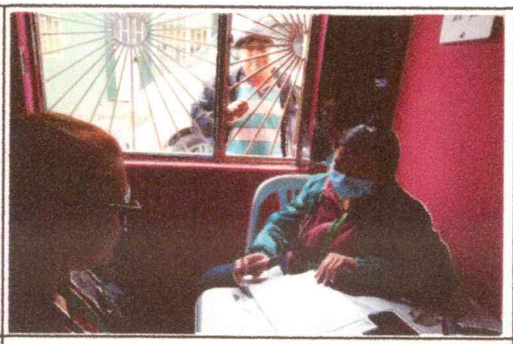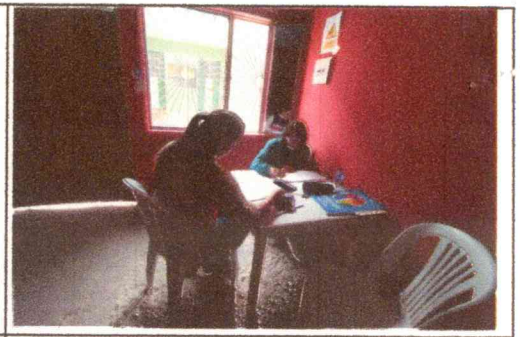			
Actividad: Caracterización social MVBF_1141 Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 26/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 1/10/2022
