
INFORME MENSUAL Nº1
GRUPO No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022
CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 02 -2022.

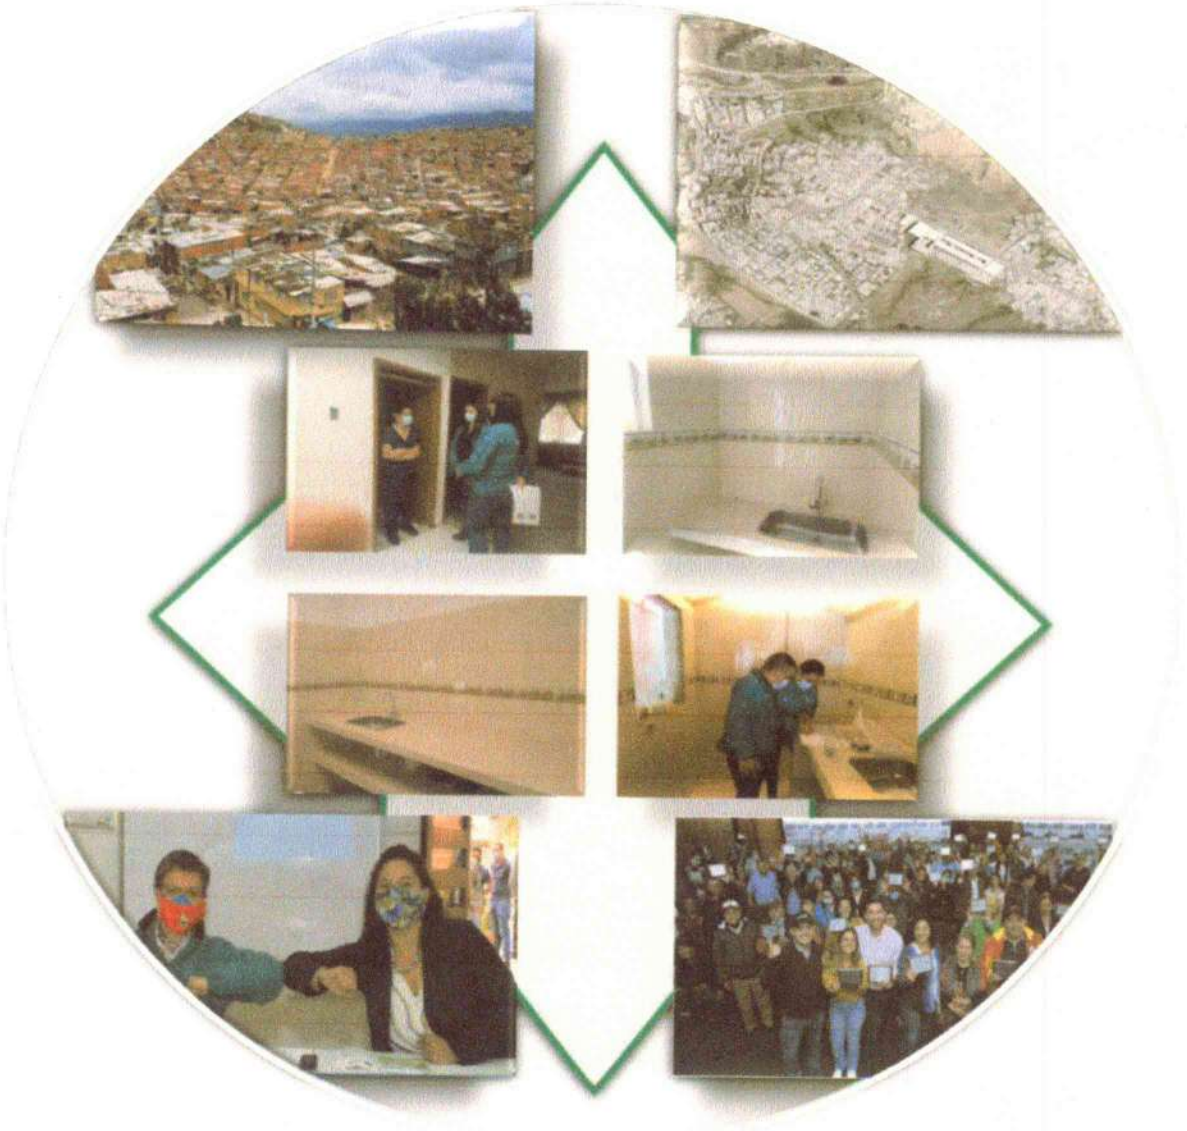

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1 ASPECTOS GENERALES 5
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2 CONTRATO DE OBRA 6

2 INTRODUCCION 7

3 FECHA EN LA CUAL SE RINDE ESTE INFORME 7
3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 7

4 ASPECTOS TÉCNICOS 8
4.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TÉCNICO, GENERAL Y POR VIVIENDA 8
4.2 ETAPA DE ESTUDIO Y RECIBO DE DOCUMENTACION 8
4.3 RELACION DE DOCUMENTACION 9
4.4 RELACION ESTADO DE PROGRAMACION VR EJECUCION 19
4.5 PROGRAMACION DE VALIDACIONES EN SU PRIMERA ETAPA 19
4.5.1 MV VALIDADOS – FECHA DE VALIDACION 22
4.6 EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. 22

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 23
5.1 PRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, SI FUERE EL CASO. 23
5.2 CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES.APORTES PARAFISCALES. 23
5.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE, EN EL PERIODO INFORMADO, SE HAYAN HECHO AL CONTRATISTA DE OBRA. SE ALLEGARÁ COPIA DE ESTOS Y DE SUS REPUESTAS, SI FUERE EL CASO. 23
5.3.1 REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 24
5.3.2 DOCUMENTACION ENVIADA 24
5.3.3 DOCUMENTACION RECIBIDA CONTRATISTA 26
5.3.4 DOCUMENTACION RECIBIDA ENTIDAD 26
5.4 INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO. 27
5.4.1 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO: 1009-2022. 27
5.4.2 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 27

6 ESTADO DEL TIEMPO MES DE SEPTIEMBRE 28
6.1 ASPECTOS SOCIALES 28
6.2 REGISTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, PQR. 28

6.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 29
6.4 AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 29
6.5 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA. 30
6.5.1 RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 1 30
6.6 RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 1, DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022. 30
6.7 INFORMACION RELATIVA PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO 30

7 INFORME SST 31
7.1 ACTIVIDADES GENERALES 31
7.2 DOCUMENTACIÓN AFILIACIONES O PAGOS AL SGSS 31
7.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 32
7.4 CUADRO DE ESTADISTICA GENERAL 34
7.5 CAPACITACIONES INTERVENTORIA 35
7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO 35

8 ASPECTOS AMBIENTALES 35
8.1 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 36

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.
Tabla 1: DATOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 1009 DE 2022 5
Tabla 2: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022 6
Tabla 3: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022 18
Tabla 4: PROGRAMACION 20
Tabla 5: TABLA CON MV VALIDADOS - INCLUIDA FECHA 22
Tabla 6: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA 26
Tabla 7: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA 26
Tabla 8: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD 26
Tabla 9: DATOS DE LA PÓLIZA 15-44-101266948 – RCE DE INTERVENTORÍA 27
Tabla 10: DATOS DE LA PÓLIZA AB000033– CONTRATO DE OBRA 27
Tabla 11: AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS ASPECTOS PRESUPUESTALES 29
Tabla 12: RELACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL NO 1 SEPTIEMBRE 30
Tabla 13: LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 31
Tabla 14: LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 32
Tabla 15: INDICADORES CONTRATISTA 35

ÍNDICE DE IMAGENES

Pág.
Imagen 1: LOCALIZACIÓN DE CIUDAD BOLIVAR 8

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Pág.

Gráfica 1: VALIDACIONES SEPTIEMBRE 2022 21
Gráfica 2: APERTURAS Y CIERRES MES DE SEPTIEMBRE 22
Gráfica 3: ANÁLISIS FINANCIERO PROGRAMADO Y EJECUTADO GENERAL 30
Gráfica 4 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO 33
Gráfica 5 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – CANTIDAD DE ACTIVIDADES 33
Gráfica 6 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS 34

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los siguientes son los datos del **Contrato Número 1009-2022**

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	INPLAYCO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 860.524.168- 8	
REPRESENTANTE LEGAL:	GONZALO LIÉVANO HOYOS	
OBJETO CONTRACTUAL:	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. grupo 02 -2022"	
IDENTIFICACIÓN:	**C.C.** Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	Inplayco@yahoo.com.mx inplaycosdh1009@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE ENERO DE 2023	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	
VALOR CONTRATO	$432.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	$432.000.000	

Tabla 1: DATOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 1009 DE 2022

1.2 CONTRATO DE OBRA

Los siguientes son los datos del **Contrato de Obra 904-2021**

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	BUILDING S.A.S	
OBJETO CONTRACTUAL	"Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupos 2 — 2022."	
APROPIACIÓN RESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL 02301160101000007715	
FIDUCIA	FIDUCIARIA POPULAR	
DIRECCIÓN:	CL 50 N.° 27 A 41 OFICINA 303	
TELÉFONOS:	76345900	buildinghabitat.grupo2@gmail.com
Consorciado No. 1.	BUILDING S.A.S	
NIT	804.002.715-3	
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO BUTRON	
C.C. R.L.	91.518.218	
SUPERVISOR	INPLAYCO SAS	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES	
VALOR CONTRATO	($ 3.600.000.000)	
VALOR TOTAL CONTRATO	($ 3.600.000.000)	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO	($ 3.600.000.000)	

Tabla 2: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.° 994 DE 2022

2 INTRODUCCION

Por intermedio de la secretaria Distrital del Hábitat, el distrito capital, ejecuta y adelanta las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados en ciudad bolívar en el Barrios Bella Flor; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así que, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el numero 1009-2022 con la empresa INPLAYCO S.A.S y el contrato de obra No 994 de 2022, con el BUILDING SAS, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios definidos por la entidad.

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad corresponden a aquellas que se señala en el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.- *"**Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad** Es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.*

La contratación tiene como propósito adelantar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

- Fase de validación: Donde la interventoría y el contratista deberá validar la información entregada por la SDHT, y verificar el estado de cada una de las viviendas, (componente técnico y social).

- Fase de ejecución de obras: El contratista procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda beneficiada, (componente técnico y social).

- Fase de cierre del proyecto: El contratista realizará entrega de las obras ejecutadas.

3 FECHA EN LA CUAL SE RINDE ESTE INFORME

La presente es el primer informe del Contrato de interventoría 1009 de 2022 y corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre 2022 al 30 septiembre 2022.

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El contrato se ejecutará en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Bella Flor



Imagen 1: LOCALIZACIÓN DE CIUDAD BOLIVAR

El área de influencia directa es la localidad número 19 del Distrito Capital, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas (ha), de las cuales 3.391 se clasifican como suelo urbano y 9.608 corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad.

Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana.

4 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TÉCNICO, GENERAL Y POR VIVIENDA

De acuerdo al acta de inicio, el proyecto comienza a partir del día 01 de septiembre haciendo el corte mensual el último día del mes, en este caso y para el mes de septiembre de 2022, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra según la programación presentada por Building SAS.

4.2 ETAPA DE ESTUDIO Y RECIBO DE DOCUMENTACION

En esta etapa se formaliza entre las partes la gestión documental y formalización de acciones a desarrollar, en este informe ejecutivo se presenta un resumen de las actividades realizadas en esta primera etapa.

Para la primera fase se recibió la documentación por parte de la entidad y se realizaron reuniones con el equipo técnico de interventoría y obra., se realizó la socialización de la reunión inicial con la presentación del contratista de interventoría de obra y la secretaria del Hábitat. Se efectúa la introducción sobre las actividades y procesos en el que se tendrán en cuenta la etapa de socialización con la comunidad. Durante este periodo se conoce y se empezará a organizar la documentación y material entregado por la SECRETARIA DEL HABITAT para así ser transmitido al contratista de obra **BUILDING SAS**, en esta reunión se plantean objetivos y alcances del proyecto.

4.3 RELACION DE DOCUMENTACION

En la etapa de gestión documental la secretaria del Hábitat hace la entrega de la relación de los expedientes para los mejoramientos de vivienda a intervenir a la interventoría, los cuales se encuentran discriminados con 200 expedientes para el Grupo 2 como se presenta a continuación:

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD_SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
1	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_022	AAA0172BOZE	KR 26H 75B 19 SUR MJ	BELLA FLOR	MARTHA HELENA PARDO CORTES	51652618	994 DE 2022	BUILDING SAS
2	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_027	AAA0147COEA	CL 76 SUR 26H 04	BELLA FLOR	LEONOR CHISCO SARAY	41741574	994 DE 2022	BUILDING SAS
3	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_046	AAA0147CWLW	CL 75B SUR 27 58	BELLA FLOR	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	23943497	994 DE 2022	BUILDING SAS
4	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_047	AAA0147CWKL	CL 75B SUR 27 52	BELLA FLOR	ANIBAL MORENO	80559301	994 DE 2022	BUILDING SAS
5	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_054	AAA0172BPYX	CL 75A BIS SUR 27 15	BELLA FLOR	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	1033749564	994 DE 2022	BUILDING SAS
6	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_058	AAA0172BPTO	CL 75A BIS A SUR 27 64	BELLA FLOR	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO	1033810928	994 DE 2022	BUILDING SAS
7	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_066	AAA0147CRNX	CL 75A BIS SUR 27 39	BELLA FLOR	GUMERSINDO SOLER SILVA	2934082	994 DE 2022	BUILDING SAS
8	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_071	AAA0147CREP	CL 75A BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA	3256255	994 DE 2022	BUILDING SAS
9	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_075	AAA0172BPPP	CL 75A SUR 27 27	BELLA FLOR	JAIDI RIAÑOS	38202862	994 DE 2022	BUILDING SAS
10	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_085	AAA0147CPUH	CL 75A SUR 27 63	BELLA FLOR	LUCIA HERRERA QUINTERO	24727583	994 DE 2022	BUILDING SAS
11	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_087	AAA0147CPRJ	CL 75A BIS SUR 27 58	BELLA FLOR	MARIA RUTH CORTES LOSADA	55173610	994 DE 2022	BUILDING SAS
12	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_089	AAA0147CPOM	CL 75A BIS SUR 27 46	BELLA FLOR	MARIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA	35486613	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
13	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_094	AAA0172BTRU	KR 26G 75A 08 SUR	BELLA FLOR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	28879603	994 DE 2022	BUILDING SAS
14	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_096	AAA0167CLZE	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	BELLA FLOR	MARISOL LATORRE DEVIA	52460646	994 DE 2022	BUILDING SAS
15	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1001	AAA0207MHSK	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	31257494	994 DE 2022	BUILDING SAS
16	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1013	AAA0147EMCX	KR 27B 73A 16 SUR	BELLA FLOR	EMILIANO PEREZ AVELLA	4297712	994 DE 2022	BUILDING SAS
17	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1045	AAA0147ENCN	KR 27A BIS 73 10 SUR	BELLA FLOR	MARIELA CARDONA CARDONA	24328098	994 DE 2022	BUILDING SAS
18	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1052	AAA0189ESSK	KR 27A 73 26 SUR	BELLA FLOR	OFELIA MEDINA ARCILA	24364928	994 DE 2022	BUILDING SAS
19	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_106	AAA0147DAJZ	KR 26F 75A 35 SUR	BELLA FLOR	CARMEN SEMANATE	41598201	994 DE 2022	BUILDING SAS
20	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1068	AAA0147ERUH	KR 27A 73 06 SUR	BELLA FLOR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	11250842	994 DE 2022	BUILDING SAS
21	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_107	AAA0147DAHK	KR 26F 75A 31 SUR	BELLA FLOR	CELINA CARAVALI GONZALEZ	35526752	994 DE 2022	BUILDING SAS
22	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1072	AAA0147ERPA	KR 27A 73 38 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	52459929	994 DE 2022	BUILDING SAS
23	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1078	AAA0172BJNN	KR 27 BIS A 73 64 SUR	BELLA FLOR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	26473577	994 DE 2022	BUILDING SAS
24	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1080	AAA0164CPKL	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	41738651	994 DE 2022	BUILDING SAS
25	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1083	AAA0147ETEP	KR 27 73B 15 SUR	BELLA FLOR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	52037700	994 DE 2022	BUILDING SAS
26	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1096	AAA0147ESPP	KR 27 BIS A 73 22 SUR	BELLA FLOR	LUCILA TRUJILLO	28851583	994 DE 2022	BUILDING SAS
27	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1100	AAA0147ESKL	KR 27 BIS A 73 70 SUR	BELLA FLOR	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	26473801	994 DE 2022	BUILDING SAS
28	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1108	AAA0172BHRU	CL 73C BIS SUR 27A 23	BELLA FLOR	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	41332143	994 DE 2022	BUILDING SAS
29	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1117	AAA0147ENYN	CL 73C BIS SUR 27 49	BELLA FLOR	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	19369086	994 DE 2022	BUILDING SAS
30	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_113	AAA0147CZWW	KR 26G 75 A SUR 22	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA SANABRIA	52306084	994 DE 2022	BUILDING SAS
31	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1130	AAA0147ENLF	CL 73D SUR 27 50	BELLA FLOR	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	13844873	994 DE 2022	BUILDING SAS
32	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1149	AAA0147EOZM	CL 73D SUR 27 75	BELLA FLOR	GUSTAVO MONROY FONSECA	6764955	994 DE 2022	BUILDING SAS
33	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_117	AAA0147CZRJ	KR 26G 75A 38 SUR	BELLA FLOR	MARIA EUGENIA GONZALEZ	51790417	994 DE 2022	BUILDING SAS
34	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1195	AAA0240NCOM	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	BELLA FLOR	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	53082240	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD_SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
35	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1196	AAA0209WJOE	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	BELLA FLOR	INES SOFIA REYES CASTRO	52058750	994 DE 2022	BUILDING SAS
36	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1197	AAA0209WJNN	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	BELLA FLOR	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	1032380518	994 DE 2022	BUILDING SAS
37	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1198	AAA0172BJBR	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	BELLA FLOR	CARMEN ELVIRA REYES CARO	41700162	994 DE 2022	BUILDING SAS
38	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1200	AAA0155AWXS	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	BELLA FLOR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	52881335	994 DE 2022	BUILDING SAS
39	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1255	AAA0172BLSK	CL 73C BIS A SUR 26C 90	BELLA FLOR	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS	1033736139	994 DE 2022	BUILDING SAS
40	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1264	AAA0172BMZE	CL 73B SUR 26F15 MJ	BELLA FLOR	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	4937396	994 DE 2022	BUILDING SAS
41	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1280	AAA0147FEUH	CL 73C SUR 26F 02	BELLA FLOR	MARINA NAVAS ROJAS	39715971	994 DE 2022	BUILDING SAS
42	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1295	AAA0147FFLW	KR 26F 73B 16 SUR	BELLA FLOR	VIRGELINA RODRIGUEZ	20408377	994 DE 2022	BUILDING SAS
43	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1302	AAA0172BMRJ	CL 73A SUR 26F 33 MJ	BELLA FLOR	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	1023913805	994 DE 2022	BUILDING SAS
44	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1303	AAA0172BMPA	CL 73A SUR 26F 45 MJ	BELLA FLOR	ANAYIBE CASTRO	21145488	994 DE 2022	BUILDING SAS
45	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1306	AAA0172BMMR	CL 73B SUR 26F 02 MJ	BELLA FLOR	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	24660532	994 DE 2022	BUILDING SAS
46	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1311	AAA0147FEAW	CL 73A SUR 26F 27	BELLA FLOR	JULIA MARTINEZ SEGURA	52008175	994 DE 2022	BUILDING SAS
47	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1314	AAA0147FDXR	CL 73B SUR 26F 38	BELLA FLOR	MARIELA SANDOVAL VERA	41315402	994 DE 2022	BUILDING SAS
48	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1315	AAA0147FDWF	CL 73B SUR 26F 32	BELLA FLOR	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	20407697	994 DE 2022	BUILDING SAS
49	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1330	AAA0147FEMR	CL 73B SUR 26C 90	BELLA FLOR	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	1022956909	994 DE 2022	BUILDING SAS
50	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1337	AAA0265ASSY	CL 73A SUR 26F 08 MJ	BELLA FLOR	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	52238329	994 DE 2022	BUILDING SAS
51	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1338	AAA0209WJZM	CL 73 SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR	IRIS SOTO	1033713372	994 DE 2022	BUILDING SAS
52	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1339	AAA0172BMJZ	CL 73A SUR 26F 20 MJ	BELLA FLOR	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES	41483662	994 DE 2022	BUILDING SAS
53	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1343	AAA0147FDOE	CL 73 SUR 26F 09	BELLA FLOR	AMANDA BERNAL ORTIZ	51740130	994 DE 2022	BUILDING SAS
54	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1347	AAA0147FDKL	KR 27 73 02 SUR	BELLA FLOR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	51613335	994 DE 2022	BUILDING SAS
55	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1354	AAA0147FDBR	CL 73A SUR 26F 02	BELLA FLOR	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	1033807926	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
56	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_145	AAA0172BROE	CL 75A BIS SUR 26F 47	BELLA FLOR	BERENICE RINCON TELLEZ	21116348	994 DE 2022	BUILDING SAS
57	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_149	AAA0147CSYX	CL 75A BIS SUR 26F 53	BELLA FLOR	LASTENIA PALACIOS MURILLO	43919733	994 DE 2022	BUILDING SAS
58	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_154	AAA0194JDZM	CL 75 SUR 27 A 05	BELLA FLOR	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE	52741337	994 DE 2022	BUILDING SAS
59	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_158	AAA0172BPKL	CL 75 SUR 27 39	BELLA FLOR	ISABELINA PATIÑO	65808595	994 DE 2022	BUILDING SAS
60	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_172	AAA0209WKSY	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	BELLA FLOR	LAURENTINO BURGOS RINCON	80386624	994 DE 2022	BUILDING SAS
61	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_223	AAA0147CUMS	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	BELLA FLOR	OMAR FERNEY NIÑO	80895688	994 DE 2022	BUILDING SAS
62	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_232	AAA0147CTXS	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	BELLA FLOR	HERMENCIA CHITIVA	28787016	994 DE 2022	BUILDING SAS
63	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_235	AAA0209WLJH	CL 75A SUR 26F 60 MJ	BELLA FLOR	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ	4171683	994 DE 2022	BUILDING SAS
64	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_236	AAA0172BTCX	CL 75 SUR 26F 29	BELLA FLOR	LILIANA RENDON LOZANO	24589579	994 DE 2022	BUILDING SAS
65	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_241	AAA0147CXLF	KR 27 75 24 SUR	BELLA FLOR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO	23777086	994 DE 2022	BUILDING SAS
66	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_287	AAA0172BRRU	CL 74B BIS A SUR 26F 38	BELLA FLOR	CARMEN ROSA GONZALEZ	52327599	994 DE 2022	BUILDING SAS
67	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_312	AAA0147CSAF	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	BELLA FLOR	VIRGINIA CORTES PARDO	28482942	994 DE 2022	BUILDING SAS
68	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_530	AAA0172BEPA	CL 73B 27B 33 MJ	BELLA FLOR	OMAR MEDINA ORTEGA	6460989	994 DE 2022	BUILDING SAS
69	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_536	AAA0147EDFZ	CL 73B SUR 27B 21	BELLA FLOR	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	1073507379	994 DE 2022	BUILDING SAS
70	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_549	AAA0147ECPP	CL 73 C SUR 27 B 78	BELLA FLOR	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ	80132273	994 DE 2022	BUILDING SAS
71	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_552	AAA0147ECMS	CLL 73C SUR 27B 62	BELLA FLOR	ORFANIDES LOSADA PERDOMO	51895481	994 DE 2022	BUILDING SAS
72	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_567	AAA0159LZLF	CL 73B SUR 27C 24	BELLA FLOR	FLORENTINO PICO BASTILLA	91105520	994 DE 2022	BUILDING SAS
73	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_585	AAA0147EHRJ	CL 73A SUR 27B 17	BELLA FLOR	ANDREA HERRERA RANGEL	41409242	994 DE 2022	BUILDING SAS
74	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_588	AAA0147EHNX	CL 73B SUR 27B 40	BELLA FLOR	JANETH MEDINA DIAZ	53040711	994 DE 2022	BUILDING SAS
75	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_589	AAA0147EHMR	CL 73B SUR 27B 34	BELLA FLOR	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	1033739994	994 DE 2022	BUILDING SAS
76	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_605	AAA0147EHAW	DG 73A BIS SUR 27C 28	BELLA FLOR	MISAEL MACANA	11384721	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
77	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_631	AAA0147EJCN	TV 27H 73 34 SUR	BELLA FLOR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	52428645	994 DE 2022	BUILDING SAS
78	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_645	AAA0147EKEA	DG 73 SUR 27B 11	BELLA FLOR	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA	26366802	994 DE 2022	BUILDING SAS
79	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_650	AAA0147EJZE	DG 73 SUR 27B 59	BELLA FLOR	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	1022940463	994 DE 2022	BUILDING SAS
80	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_660	AAA0147EJNX	DG 73 SUR 27B 13 MJ	BELLA FLOR	CUSTODIA LUGO QUESADA	38220773	994 DE 2022	BUILDING SAS
81	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_675	AAA0147EKSK	KR 27 B 72D 23 SUR	BELLA FLOR	CELIMO PADILLA VEGA	80559937	994 DE 2022	BUILDING SAS
82	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_676	AAA0147EKRU	KR 27B 72 D 11 SUR	BELLA FLOR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ	65807040	994 DE 2022	BUILDING SAS
83	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_683	AAA0147EKJH	DG 73 SUR 27B 54	BELLA FLOR	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	17090081	994 DE 2022	BUILDING SAS
84	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_745	AAA0255NSZE	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	BELLA FLOR	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	52238407	994 DE 2022	BUILDING SAS
85	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_770	AAA0147EUYX	KR 27 BIS 72C 50 SUR	BELLA FLOR	HERMINIA FORERO BUSTOS	41736233	994 DE 2022	BUILDING SAS
86	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_791	AAA0147EWYX	CR27 H 72C 34 SUR	BELLA FLOR	MARIA LIGIA ROJAS	51595274	994 DE 2022	BUILDING SAS
87	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_801	AAA0264SNYN	CL 72C SUR 26C 73 MJ	BELLA FLOR	AMPARO TIQUE ROMERO	52152205	994 DE 2022	BUILDING SAS
88	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_805	AAA0197KDFT	CL 72 C SUR No. 26 C 69	BELLA FLOR	MANUEL MONCADA FANDIÑO	5599492	994 DE 2022	BUILDING SAS
89	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_808	AAA0180LHYN	CL 72C SUR 26C 59	BELLA FLOR	JOSE FERMIN ROCHA	79579113	994 DE 2022	BUILDING SAS
90	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_820	AAA0147EYAF	KR 26F 72D 14 SUR	BELLA FLOR	LUIS CARLOS LOMBANA	3279905	994 DE 2022	BUILDING SAS
91	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_835	AAA0147EYLW	CL 72D BIS A SUR 26D 21	BELLA FLOR	NURY ESPERANZA MELO	35498062	994 DE 2022	BUILDING SAS
92	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_850	AAA0147EYYX	CL 72F SUR 26C 69	BELLA FLOR	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	79100762	994 DE 2022	BUILDING SAS
93	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_853	AAA0147EYUZ	CL 72F SUR 26D 23	BELLA FLOR	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	1023905084	994 DE 2022	BUILDING SAS
94	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_854	AAA0147EYTO	CL 72F SUR 26F 05	BELLA FLOR	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	35508882	994 DE 2022	BUILDING SAS
95	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_894	AAA0147FAUH	KR 26F 72H 60 SUR	BELLA FLOR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	1033754558	994 DE 2022	BUILDING SAS
96	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_948	AAA0147FCSY	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	BELLA FLOR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	52207124	994 DE 2022	BUILDING SAS
97	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_950	AAA0147FCPA	KR 27 72G 24 SUR	BELLA FLOR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	8242940	994 DE 2022	BUILDING SAS
98	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_964	AAA0147EUBR	KR 27 72G 17 SUR	BELLA FLOR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	51735225	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
99	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_983	AAA0147ETOM	KR 27 BIS 72G 15 SUR	BELLA FLOR	HERIBERTO VARGAS CAPERA	1036838682	994 DE 2022	BUILDING SAS
100	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0072	AAA0147CRDE	CL 74A BIS A SUR 27 22	BELLA FLOR	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	1032414775	994 DE 2022	BUILDING SAS
101	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0183	AAA0147CSSK	CL 75A BIS SUR 26F 60	BELLA FLOR	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	52656235	994 DE 2022	BUILDING SAS
102	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0225	AAA0147CUEA	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	BELLA FLOR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ	28554499	994 DE 2022	BUILDING SAS
103	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0531	AAA0172BEOM	CL 73B SUR 27C 05	BELLA FLOR	INES DIAZ	28696565	994 DE 2022	BUILDING SAS
104	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0540	AAA0147EDAW	CL 73B SUR 27C 29	BELLA FLOR	LUZ STELLA FRANCO DIAZ	39722355	994 DE 2022	BUILDING SAS
105	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0649	AAA0147EKAF	DG 73 SUR 27B 53	BELLA FLOR	OLGA MARIA ALONSO MORENO	51551543	994 DE 2022	BUILDING SAS
106	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0657	AAA0147EJRJ	DG 73 BIS SUR 27B 36	BELLA FLOR	SERGIO TORO	17640148	994 DE 2022	BUILDING SAS
107	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0837	AAA0147EYJH	KR 26 D 72D 45 SUR	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA	52279611	994 DE 2022	BUILDING SAS
108	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0840	AAA0265BAUZ	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	BELLA FLOR	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	51731350	994 DE 2022	BUILDING SAS
109	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0841	AAA0147EYHY	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	BELLA FLOR	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	28435285	994 DE 2022	BUILDING SAS
110	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0924	AAA0147FBNN	CL 73 SUR 26F 40	BELLA FLOR	ROSALBA ROJAS ROJAS	39746063	994 DE 2022	BUILDING SAS
111	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0938	AAA0172BLXR	KR 27 72G 68 SUR	BELLA FLOR	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	23623355	994 DE 2022	BUILDING SAS
112	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0966	AAA0147ETZE	KR 27 72G 09 SUR	BELLA FLOR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	1032385818	994 DE 2022	BUILDING SAS
113	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0972	AAA0278AAYN	KR 27 BIS 72G 38 SUR	BELLA FLOR	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN	3202905	994 DE 2022	BUILDING SAS
114	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0984	AAA0147ETNX	KR 27 BIS 72G 11 SUR	BELLA FLOR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	52725818	994 DE 2022	BUILDING SAS
115	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1073	AAA0147EROM	KR 27 A 73 46 SUR	BELLA FLOR	LEOPOLDO LEON MORALES	4111769	994 DE 2022	BUILDING SAS
116	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1081	AAA0154HZEA	KR 27 BIS A 73 28 SUR	BELLA FLOR	MELQUISEDEC ORTIZ	19494365	994 DE 2022	BUILDING SAS
117	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1110	AAA0172BHOE	CL 73 D SUR 27 86	BELLA FLOR	FLOR TRIANA AVILA	39700614	994 DE 2022	BUILDING SAS
118	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1118	AAA0147ENXS	CL 73 C BIS SUR 27 55	BELLA FLOR	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	79631680	994 DE 2022	BUILDING SAS
119	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1141	AAA0172BHTO	CL 73 D SUR 27 91	BELLA FLOR	BLANCA FLOR RINCON	41663712	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
120	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1148	AAA0147EPAW	CL 73 D SUR 27 45	BELLA FLOR	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	52445393	994 DE 2022	BUILDING SAS
121	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1220	AAA0172BNSK	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	BELLA FLOR	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	65726290	994 DE 2022	BUILDING SAS
122	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1240	AAA0168LHFZ	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	BELLA FLOR	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	79727898	994 DE 2022	BUILDING SAS
123	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1307	AAA0154JDYX	CL 73 A SUR 26F 15	BELLA FLOR	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	41620741	994 DE 2022	BUILDING SAS
124	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1324	AAA0160FHOM	CL 73 B SUR 26 C 74	BELLA FLOR	PURIFICACION CORTES	41596028	994 DE 2022	BUILDING SAS
125	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0157	AAA0172BPLW	CL 75 SUR 27 33	BELLA FLOR	ANA MILENA ABAUNZA	52255884	994 DE 2022	BUILDING SAS
126	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0286	AAA0269UKCN	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	BELLA FLOR	RAQUEL MENDEZ PEÑA	52373476	994 DE 2022	BUILDING SAS
127	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0558	AAA0147ECEA	CL 73C SUR 27B 26	BELLA FLOR	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO	52130951	994 DE 2022	BUILDING SAS
128	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0570	AAA0147EFUH	TV 27H 73A 36 SUR	BELLA FLOR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA	79637050	994 DE 2022	BUILDING SAS
129	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0595	AAA0172BFHY	DG 73A SUR 27C 57 MJ	BELLA FLOR	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS	30248898	994 DE 2022	BUILDING SAS
130	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0677	AAA0147EKPP	KR 27B 72D 05 SUR	BELLA FLOR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	23443742	994 DE 2022	BUILDING SAS
131	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0694	AAA0154FRWF	CR 27A BIS 72D 05 SUR	BELLA FLOR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA	14269244	994 DE 2022	BUILDING SAS
132	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0715	AAA0147EKUZ	KR 27B 72C 20 SUR	BELLA FLOR	JORGE ENRIQUE QUINONES MELO	79250214	994 DE 2022	BUILDING SAS
133	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0719	AAA0147ELXS	KR 27A BIS 72D 08 SUR	BELLA FLOR	URIEL CASALLAS MURCIA	82392453	994 DE 2022	BUILDING SAS
134	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0727	AAA0172BJUZ	KR 27A 72C 34 SUR MJ	BELLA FLOR	SALOMON URREA BAQUERO	5935899	994 DE 2022	BUILDING SAS
135	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0730	AAA0162BMFT	KR 27 BIS 72C 15 SUR	BELLA FLOR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	39566424	994 DE 2022	BUILDING SAS
136	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0731	AAA0162BMBR	KR 27A 72D 02 SUR	BELLA FLOR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO	41331200	994 DE 2022	BUILDING SAS
137	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0736	AAA0147EURU	KR 27 BIS 72C 33 SUR	BELLA FLOR	LUIS ALFONSO PIAY	6185068	994 DE 2022	BUILDING SAS
138	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0737	AAA0147EUPP	KR 27 BIS 72C 27 SUR	BELLA FLOR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	41348698	994 DE 2022	BUILDING SAS
139	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0741	AAA0147EULW	KR 27A 72C 22 SUR	BELLA FLOR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO	51759163	994 DE 2022	BUILDING SAS

INPLAYCO S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 16

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
140	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0749	AAA0194OMKL	KR 27 72C 27 SUR	BELLA FLOR	ESTHER MARINA YARA TIQUE	51906676	994 DE 2022	BUILDING SAS
141	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0760	AAA0147EWLW	KR 27 72C 33 SUR	BELLA FLOR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	5883598	994 DE 2022	BUILDING SAS
142	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0761	AAA0147EWKL	KR 27 72C 21 SUR	BELLA FLOR	GILDARDO MORALES VELEZ	19274929	994 DE 2022	BUILDING SAS
143	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0767	AAA0147EWCX	KR 27 BIS 72C 22 SUR	BELLA FLOR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	23923683	994 DE 2022	BUILDING SAS
144	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0780	AAA0172BJZM	KR 27 72C 40 SUR	BELLA FLOR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	65741895	994 DE 2022	BUILDING SAS
145	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0793	AAA0147EWWF	KR 27 72C 70 SUR	BELLA FLOR	ARISTOBULO TRIANA GARZON	19189748	994 DE 2022	BUILDING SAS
146	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0946	AAA0147FCTD	CL 73 SUR 26G 08	BELLA FLOR	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO	1031135392	994 DE 2022	BUILDING SAS
147	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0952	AAA0258PZHK	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	BELLA FLOR	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	1082687096	994 DE 2022	BUILDING SAS
148	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0622	AAA0155ETXR	DG 73 BIS SUR 27B 03	BELLA FLOR	MARIBEL HURTADO	24575764	994 DE 2022	BUILDING SAS
149	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0592	AAA0207EBKL	DG 73A BIS SUR 27C 34	BELLA FLOR	MARIA HELENA BAQUERO MACANA	52156811	994 DE 2022	BUILDING SAS
150	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0953	AAA0179WKUH	KR 27 BIS 72G 34 SUR	BELLA FLOR	LUIS MORENO VIUCHE	5970061	994 DE 2022	BUILDING SAS
151	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0975	AAA0207HSPP	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	BELLA FLOR	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	11450108	994 DE 2022	BUILDING SAS
152	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0979	AAA0172BJOE	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	BELLA FLOR	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	20905820	994 DE 2022	BUILDING SAS
153	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0985	AAA0147ETMR	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	BELLA FLOR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	80366834	994 DE 2022	BUILDING SAS
154	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0987	AAA0147ETKC	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	BELLA FLOR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	2110005	994 DE 2022	BUILDING SAS
155	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0990	AAA0245MWPA	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	BELLA FLOR	GILBERTO INFANTE MARINO	12192023	994 DE 2022	BUILDING SAS
156	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1007	AAA0147EMKL	CL 73 SUR 27A 21	BELLA FLOR	NUBIA HERRERA QUINTERO	39712925	994 DE 2022	BUILDING SAS
157	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1050	AAA0209WJRU	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	BELLA FLOR	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	35530377	994 DE 2022	BUILDING SAS
158	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1061	AAA0147ESCX	KR 27 BIS A 73 31 SUR	BELLA FLOR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	4269201	994 DE 2022	BUILDING SAS
159	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1111	AAA0164YESY	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	BELLA FLOR	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	1033754768	994 DE 2022	BUILDING SAS
160	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1121	AAA0147ENTD	CL 73 C BIS SUR 27 77	BELLA FLOR	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	51759078	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
161	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1128	AAA0147ENMR	CL 73D SUR 27 62	BELLA FLOR	ISMELDA PEREZ GARCIA	40277609	994 DE 2022	BUILDING SAS
162	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1213	AAA0258RKXR	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	BELLA FLOR	NORMA CONSTANZA MELO	42094265	994 DE 2022	BUILDING SAS
163	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1228	AAA0147FHBR	KR 27 73C 32 SUR	BELLA FLOR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	52238152	994 DE 2022	BUILDING SAS
164	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1234	AAA0172BNLW	CL 73C SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	6116305	994 DE 2022	BUILDING SAS
165	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1270	AAA0147FFEA	CL 73B SUR 26F 03	BELLA FLOR	ANA AURORA BECERRA VARGAS	37706467	994 DE 2022	BUILDING SAS
166	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1321	AAA0172BMUH	CL 73A SUR 26D 07	BELLA FLOR	TEOFILDE FORERO AGUILAR	63332847	994 DE 2022	BUILDING SAS
167	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1329	AAA0147FENX	CL 73A SUR 26D 19	BELLA FLOR	JULIO CESAR BUILES MURIEL	98792748	994 DE 2022	BUILDING SAS
168	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1363	AAA0147FDPP	CL 73A SUR 26D 04	BELLA FLOR	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE	51571444	994 DE 2022	BUILDING SAS
169	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0155	AAA0186UDDM	CL 75A SUR 27 22	BELLA FLOR	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	53002551	994 DE 2022	BUILDING SAS
170	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0294	AAA0147CWEA	TV 26C BIS 75C 16 SUR	BELLA FLOR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	36285832	994 DE 2022	BUILDING SAS
171	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0669	AAA0172BHCX	KR 27B 72D 29 SUR	BELLA FLOR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ VELASQUEZ	41551577	994 DE 2022	BUILDING SAS
172	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0679	AAA0147EKNN	TV 27H 72D 14 SUR	BELLA FLOR	POSIDIO HUERTA HUERTAS	19414665	994 DE 2022	BUILDING SAS
173	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0753	AAA0162JSCX	KR 27 BIS 72C 44 SUR	BELLA FLOR	LUZ DARY ALONSO PACHON	52440093	994 DE 2022	BUILDING SAS
174	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0758	AAA0147EWNN	KR 27 72C 45 SUR	BELLA FLOR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	51638001	994 DE 2022	BUILDING SAS
175	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0789	AAA0147EXAW	KR 27 72C 12 SUR	BELLA FLOR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA	19436227	994 DE 2022	BUILDING SAS
176	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1000	AAA0209WJMS	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	BELLA FLOR	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	7506142	994 DE 2022	BUILDING SAS
177	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1014	AAA0147EMBR	KR 27A BIS 73 27 SUR	BELLA FLOR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	79213212	994 DE 2022	BUILDING SAS
178	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1048	AAA0238NEXR	KR 27A 73 18 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA GLADYS TRIANA	51578449	994 DE 2022	BUILDING SAS
179	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1049	AAA0235XOBS	CL 73 SUR 27 43 MJ	BELLA FLOR	YAMILE DARLEY LONDOÑO CARDONA	1024503785	994 DE 2022	BUILDING SAS
180	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1076	AAA0247SEFZ	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	BELLA FLOR	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	39639396	994 DE 2022	BUILDING SAS
181	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1098	AAA0147ESMS	KR 27 BIS A 73 52 SUR	BELLA FLOR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	80129628	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
182	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1155	AAA0147EOTO	CL 73D BIS A SUR 27A 50	BELLA FLOR	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	51595874	994 DE 2022	BUILDING SAS
183	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1166	AAA0147EOEA	CL 73D BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	23574119	994 DE 2022	BUILDING SAS
184	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1167	AAA0147EODM	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	BELLA FLOR	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	1033781018	994 DE 2022	BUILDING SAS
185	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1187	AAA0147EPMR	KR 27B 74 14 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	60285679	994 DE 2022	BUILDING SAS
186	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1191	AAA0147EPJZ	KR 27B 74A 06 SUR	BELLA FLOR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	51753672	994 DE 2022	BUILDING SAS
187	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1201	AAA0147ERLF	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	BELLA FLOR	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	53081191	994 DE 2022	BUILDING SAS
188	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1276	AAA0147FEZE	CL 73C SUR 26F 38	BELLA FLOR	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ	35492802	994 DE 2022	BUILDING SAS
189	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1424	AAA0147EEHY	CL 74 SUR 27B 36	BELLA FLOR	CARLOS RODRIGUEZ	10163877	994 DE 2022	BUILDING SAS
190	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1455	AAA0172BESY	CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	28985573	994 DE 2022	BUILDING SAS
191	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1462	AAA0147EDRJ	CL 74A SUR 27B 25	BELLA FLOR	AENGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON	1022323071	994 DE 2022	BUILDING SAS
192	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1464	AAA0147EDOM	CL 74A SUR 27B 55	BELLA FLOR	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ	55182475	994 DE 2022	BUILDING SAS
193	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1465	AAA0147EDNX	CL 74A SUR 27B 61	BELLA FLOR	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	3253819	994 DE 2022	BUILDING SAS
194	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1496	AAA0147CUHY	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BELLA FLOR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES	25220503	994 DE 2022	BUILDING SAS
195	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1427	AAA0147EEDM	CL 74 SUR 27B 06	BELLA FLOR	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	52241361	994 DE 2022	BUILDING SAS
196	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1358	AAA0208TPAF	CL 73A SUR 26D 16	BELLA FLOR	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	79838964	994 DE 2022	BUILDING SAS
197	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1362	AAA0147FDRU	CL 73A SUR 26D 08	BELLA FLOR	ALICIA CARREÑO	52240299	994 DE 2022	BUILDING SAS
198	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_0925	AAA0147FBMS	CL 73 SUR 26F 16	BELLA FLOR	MARIA EVA PULIDO CELIS	52221942	994 DE 2022	BUILDING SAS
199	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1084	AAA0147ETDE	KR 27 73B 09 SUR	BELLA FLOR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	80559667	994 DE 2022	BUILDING SAS
200	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_1124	AAA0147ENRJ	CL 73C BIS SUR 27A 11	BELLA FLOR	HECTOR HERNANDO VELOSA	3202934	994 DE 2022	BUILDING SAS

Tabla 3: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

4.4 RELACION ESTADO DE PROGRAMACION VR EJECUCION

De acuerdo a la programación recibida con los ajustes correspondientes entregada a través del correo electrónico el 21 de septiembre de 2022, durante el periodo se programa la validación de 60 mejoramientos que equivalen al 30% del total de viviendas adjudicadas al contrato de obra 994 de 2022, de estas viviendas se validaron 53 que es el equivalente al 26% del total de mejoramientos por lo anterior se presenta una dilación del 4% referente a las validaciones., Por lo que en el comité de seguimiento de obra se le solcito premura en esta primera etapa.

4.5 PROGRAMACION DE VALIDACIONES EN SU PRIMERA ETAPA

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	VALIDACIÓN	**62 días**	**vie 9/09/22**	**sáb 19/11/22**
	BELLA FLOR	**62 días**	**vie 9/09/22**	**sáb 19/11/22**
1	MVBF_1196	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
2	MVBF_1197	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
3	MVBF_1200	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
4	MVBF_1198	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
5	MVBF_1201	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
6	MVBF_1166	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
7	MVBF_1167	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
8	MVBF_1191	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
9	MVBF_1187	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
10	MVBF_1155	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
11	MVBF_1141	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
12	MVBF_1149	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
13	MVBF_1148	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
14	MVBF_1130	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
15	MVBF_1128	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
16	MVBF_1121	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
17	MVBF_1110	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
18	MVBF_0715	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
19	MVBF_1124	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
20	MVBF_1321	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
21	MVBF_1111	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
22	MVBF_1118	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
23	MVBF_1117	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
24	MVBF_1073	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
25	MVBF_1072	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
26	MVBF_1052	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
27	MVBF_1048	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
28	MVBF_1068	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
29	MVBF_1049	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
30	MVBF_1050	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
31	MVBF_1061	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
32	MVBF_1354	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
33	MVBF_1078	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
34	MVBF_1098	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
35	MVBF_1084	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
36	MVBF_1080	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
37	MVBF_1081	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
38	MVBF_1096	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
39	MVBF_1083	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
40	MVBF_808	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
41	MVBF_805	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
42	MVBF_801	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
43	MVBF_820	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
44	MVBF_835	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
45	MVBF_0837	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
46	MVBF_0841	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
47	MVBF_0840	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
48	MVBF_850	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
49	MVBF_853	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
50	MVBF_854	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
51	MVBF_0789	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
52	MVBF_791	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
53	MVBF_0780	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
54	MVBF_0793	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
55	MVBF_948	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
56	MVBF_950	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
57	MVBF_964	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
58	MVBF_0966	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
59	MVBF_0758	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
60	MVBF_1195	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22


Tabla 4: PROGRAMACION

En el desarrollo de las actividades en el mes de septiembre 2022, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra



Grafica 1 RELACIÓN TOTAL DE VIVIENDAS Y EJECUCIÓN POR SECTOR.

Para el informe mensual 1, el contratista **Building SAS,** se encuentra cumpliendo con las actividades de validación según la programación de obra; ya que presentan 53 validaciones ejecutadas frente a 60 relacionadas en la programación de obra al 30-09-2022.

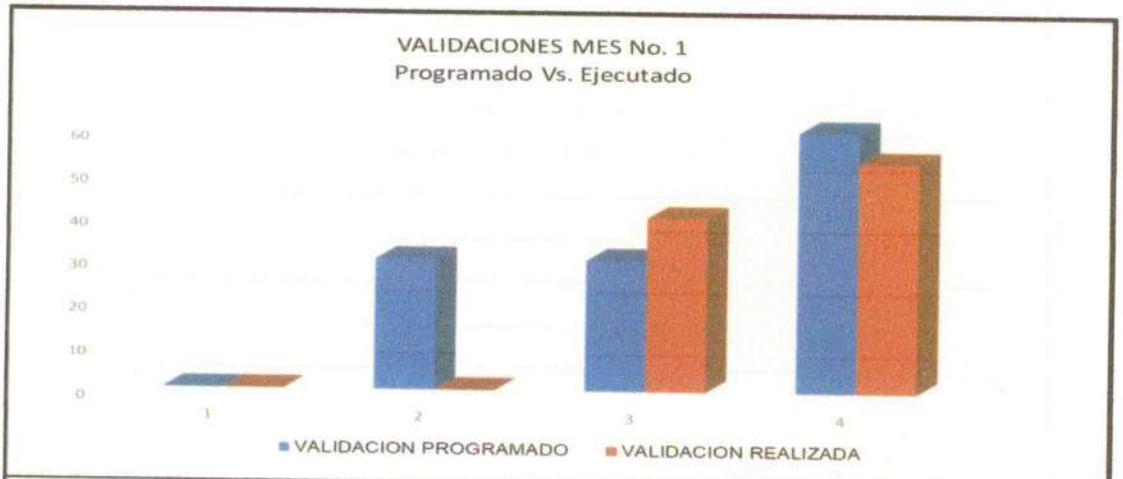

MES No. 1 (Programado Vs. Ejecutado)


Semana 1	Prog.	Ejec.	Semana 2	Prog.	Ejec.	Semana 3	Prog.	Ejec.	Semana 4	Prog.	Ejec.
	0	0		30	0		30	40		60	53

Gráfica 1: VALIDACIONES SEPTIEMBRE 2022

4.5.1 MV VALIDADOS – FECHA DE VALIDACION

Para dar claridad de los avances realizados en cuanto a las validaciones, la interventoría lleva la siguiente tabla de control, incluyendo la fecha efectiva de la validación de los predios:
¡Error! Vínculo no válido.
Tabla 5: TABLA CON MV VALIDADOS - INCLUIDA FECHA

Durante el periodo se programa el 10% de aperturas y cierres que equivale 20 viviendas de las cuales hasta el cierre del informe no se ha realizado la apertura de ninguna vivienda, lo que mostraría un atraso en la ejecución de 10%.

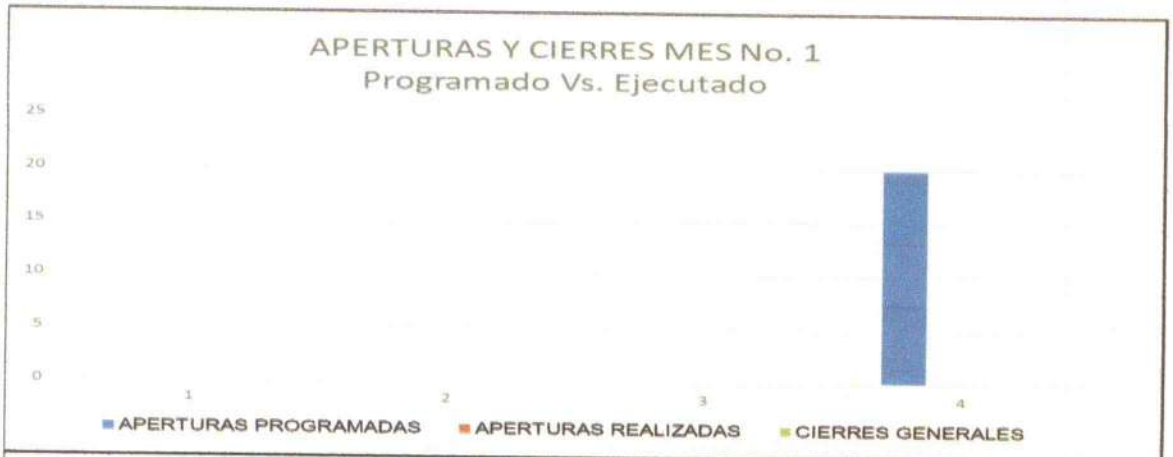

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)										
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	20	0

Gráfica 2: APERTURAS Y CIERRES MES DE SEPTIEMBRE

4.6 EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

A la fecha de este informe se realizan comité de seguimiento los cuales por parte del contratista de obra se comunica la necesidad de presentar nuevos ítems no previstos que no se encuentran en el contrato como son las cerámicas de piso pared para baño y cocina la cuales en su mayoría no se encuentran en el mercado por desabastecimiento, la inclusión de ítems como el relleno con material seleccionado y el desmonte, embalaje y disposición de láminas de asbesto cemento la cual por considerarse residuo RESPEL, requiere manejo en sitio de disposición final debidamente certificado por la autoridad ambiental.

- VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)
- DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TEJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)
- PLACA DE SOBRE PISO
- ENCHAPE PARA PISOS FORMATOS SUPERIORES A 35 * 35 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD
- RESANE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA
- SANITARIO ECONOMICO BLANCO SEGÚN DISPONIBILIDAD. CAPACIDAD 4,8 LITROS POR DESCARGA.
- ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. (INCLUYE VÁLVULA, MANGUERA).
- LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA. MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).
- LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.
- LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA. MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).
- LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 PRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, SI FUERE EL CASO.

Para la fecha de este informe el contratista se realizan las validaciones por lo que esta interventoría solicita comenzar en sus posibilidades el ingreso de mayor personal de obra.

5.2 CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES.APORTES PARAFISCALES.

(Cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

Como constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales, se anexan planillas de seguridad social de personal de interventoría y contratista se anexa CD.

5.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE, EN EL PERIODO INFORMADO, SE HAYAN HECHO AL CONTRATISTA DE OBRA. SE ALLEGARÁ COPIA DE ESTOS Y DE SUS REPUESTAS, SI FUERE EL CASO.

La comunicación entre las partes se realiza por diferentes medios electrónicos y físicos, los

requerimientos generalmente se realizan en oficios con su respectiva numeración.

5.3.1 REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

5.3.2 DOCUMENTACION ENVIADA

A continuación, se anexa la Información sobre los requerimientos que, en el periodo de septiembre de 2022, se han hecho al contratista de obra. Se anexa copia de estos y de las respuestas que se han recibido, si fuere el caso.

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP-SDHT-1009-2022-001	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	SDHT	5/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-002	DEVOLUCION HOJAS DE VIDA CONTRATO 994-2022	SDHT	29/08/22
INP-SDHT-1009-2022-003	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSION PARA CONTRATO DE OBRA DE 994	BUILDING SAS	3/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-003	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	BUILDING SAS	8/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-004	DEVOLUCION HOJAS DE VIDA V2 CONTRATO 994-2022	BUILDING SAS	6/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-004	APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 994-2022.	SDHT	7/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-005	SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL	BUILDING SAS	12/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-006	SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS	BUILDING SAS	6/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-007	ENTREGA DE REMPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	BUILDING SAS	13/09/2022
INP- SDHT-1009-2022-007	ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 DE 2022	SDHT	15/09/2022

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP- SDHT-1009-2022-008	ENTREGA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	SDHT	15/09/2022
INP- SDHT-1009-2022-008	OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022	BUILDING SAS	15/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-009	ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	BUILDING SAS	16/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-010	INFORME SEMANA 1 DEL 1 DE SEPT AL 12 DE SEPT	SDHT	19/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-011	INFORME SEMANA 2 DEL 16 DE SEPT AL 19 DE SEPT	SDHT	19/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-012	RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA N° 2-2022-56495 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022	SDHT	20/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-013	APROBACION DE PROGRAMACION DE OBRA	SDHT - BUILDING SAS	21/09/2022
INP- SDHT-1009-2022- 014	UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMACION AL PUBLICO DE LA ZONA QUE SE INTERVIENE EN EL CONTRATO No 994-2022.	SDHT - BUILDING SAS	21/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-015	ENTREGA EXPEDIENTES - RENUNCIAS MVBF_1100 Y MVBF_0801	SDHT	22/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-016	SOLICITUDES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA	SDHT - BUILDING SAS	22/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-017	RESPUESTA AL OFICIO Nº 4 HABITAT 994 - 2022 CON ASUNTO ENTREGA DE PLANES SST CALIDAD Y AMBIENTE	BUILDING SAS	21/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-018	HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA BUILIDING SAS	SDHT	26/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-019	SOLICITUD PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO N.º 2.	BUILDING SAS	26/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-020	RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA NR. 2-2022-57750 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022	SDHT	28/09/2022
INP- DHT-1009-2022-021	SOLICITUD A LA DOCUMENTACION REQUERIDA	SDHT - BUILDING SAS	29/09/2022

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP-SDHT-1009-2022-022	AJUSTE A LA PROGRACION	SDHT - BUILDING SAS	29/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-023	ENTREGA DE 2 EXPEDIENTES REMPLAZOS	BUILDING SAS-SDHT	30/09/2022

Tabla 6: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA

5.3.3 DOCUMENTACION RECIBIDA CONTRATISTA

No DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
994-2022-001 BUILDING SAS	RESPUESTA OFICIO INP-SDHT-1009-2022-006	INPLAYCO SAS	13/09/2022
994-2022-002 BUILDING SAS	ENTREGA DE AFILIACIONES DEL PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA	INPLAYCO SAS	15/09/2022
994-2022-003 BUILDING SAS	ENTREGA DE AFILIACIONES Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-004 BUILDING SAS	ENTREGA DE PLANES SST, CALIDAD, CUBIERTA Y AMBIENTAL	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-006 BUILDING SAS	INDISPONIBILIDAD DE MATERIAL 33*33 Y SOLICITUD DE INCORPORACION DE APU NUEVO	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-007 BUILDING SAS	SOLICITUD APROBACION DE APU NO PREVISTOS.	INPLAYCO SAS	28/09/2022

Tabla 7: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

5.3.4 DOCUMENTACION RECIBIDA ENTIDAD

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
2-2022-56495	RESPUESTA RADICADO 1-2022-38070 HOJAS DE VIDA PARA LA AEJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	INPLAYCO SAS	13/09/2022
2-2022-57750	RESPUESTA RADICADO 1-2022-38610 ENTREGA DE REEMPLAZO DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCION DELCONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	INPLAYCO SAS	20/09/2022

Tabla 8: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD

5.4 INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO.

5.4.1 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO: 1009-2022.

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE contratos:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	15-44-101266948	Calidad del servicio	18/08/2022	22/01/2025	$ 86.400.000
		Cumplimiento del contrato	18/08/2022	22/01/2026	$ 86.400.000
		Salarios y prestaciones sociales e indemnización	18/08/2022	22/01/2025	$ 43.200.000

Tabla 9: DATOS DE LA PÓLIZA 15-44-101266948 – RCE DE INTERVENTORÍA

5.4.2 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA


A continuación, se presentan la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE contratos contrato de obra número: 994 – 2022

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
EQUIDAD SEGUROS	AB000033	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/08/2022	10/04/2023	$ 1.080.000.000
		Cumplimiento del contrato	10/08/2022	10/04/2023	$ 720.000.000
		Salarios y prestacionessociales e indemnización	10/08/2022	10/12/2025	$ 360.000.000
		Estabilidad y calidad de la obra	10/12/2022	10/12/2024	$ 720.000.000
		Calidad del servicio	10/12/2022	10/12/2024	$ 720.000.000

Tabla 10: DATOS DE LA PÓLIZA AB000033– CONTRATO DE OBRA

6 ESTADO DEL TIEMPO MES DE SEPTIEMBRE

Como se menciona durante septiembre llovió 12 días, pero a pesar de ello la precipitación total recogido fue solo de 43,8 mm, inferior a la media de 49,9 mm, pero superior a la de los últimos años. La máxima precipitación fue de 15 mm el día 7, si bien la mayor intensidad de lluvia se produjo el día 9, con 81,8 mm/h a las 16 horas.

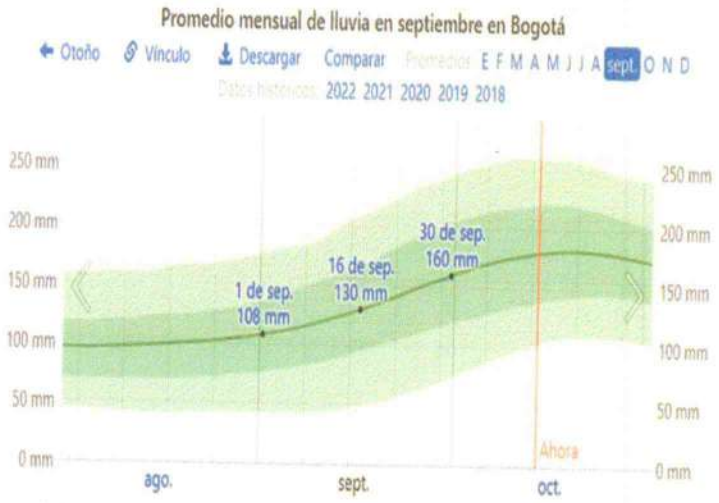

La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.

En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente la precipitación registrada durante los días en que llovió en Bogotá en el mes de septiembre.

Tomado de: https://es.weatherspark.com/m/23324/9/Tiempo-promedio-en-septiembre-en-Bogot%C3%A1-Colombia

6.1 ASPECTOS SOCIALES

Desde el área social se realiza el acompañamiento permanente en cada una de las fases a ejecutar durante el proyecto, procurando ser un veedor en la implementación de cada fase, siendo al mismo tiempo intermediario cuando sea necesario entre el contratista y los beneficiarios.

Durante el presente periodo se realizaron actividades de reunión de inicio y validaciones donde se interactuó con la comunidad en un primer acercamiento para conocer el proceso y apropiarse del mismo.

6.2 REGISTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, PQR.

Se realizó la ubicación del PAC de contratista e interventoría el cual está atendiendo en los siguientes horarios:
Lunes y miércoles de 8:30 am – 12:00 pm
Sábados de 9:00 am – 12:00 pm
Ubicado en la dirección: Kr 27 bis A 73-35 sur, bella flor.

Para el periodo de este informe no se presentan PQR.

6.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

El objetivo de la matriz del plan de acompañamiento social es supervisar, verificar y aprobar en forma eficaz y oportuna la acción de BUILDING SAS para el desarrollo de los productos contenidos en los componentes del Plan de Gestión Social y anexo técnico, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones sociales.

Se adjunta a este informe: CD con informe de metodología de Reunión de inicio, acta de Reunión, registro de llamadas, registros de asistencia a reunión de beneficiarios y profesionales - documentos originales.

6.4 AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DIFICULTADES SOCIALES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
DIFICULTADES CUALITATIVAS	Se evidencia zona de riesgos públicos para ubicación de punto de atención a la comunidad.	No se presentaron	Se evidencia zona de riesgo por inseguridad para profesionales y maestros de obra en el sector de las viviendas.	Durante la etapa de validación se presentó dificultad para ingresar a las viviendas MVBF_1455 MVBF_1187 MVBF_1427 MVBF_1462 Debido a los grupos ilegales que lideran la zona, donde se expende drogas y ven en nuestros profesionales un riesgo para ellos.
DIFICULTADES CUANTITATIVAS	Se presentan dos renuncias radicadas directamente a SDHT: • MVBF_801 a nombre de AMPARO TIQUE • MVBF_1100 a nombre OLGA LUCIA LOZANO	No se presentaron	No se presentaron	No se presentaron

Tabla 11: AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS ASPECTOS PRESUPUESTALES.

6.5 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA.

Al cierre del informe no se ha completado el trámite del anicipo debido a documentación incompleta por parte del contratista Building S.A.S

6.5.1 RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 1

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT						Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a Intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Validación		Ejecución				
				Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	Acta de Entrega a Satisfacción
		BELLA FLOR	200	53	147	9	0	0	191	0
			RENUNCIAS							
Subtotal			200	53	147	9	0	0	191	0

Tabla 12: RELACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL NO 1 SEPTIEMBRE

6.6 RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 1, DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.

Para el primer mes, el Building SAS se encuentra ejecutando actividades de validación e ingresando personal para comenzar ejecución de obra con costos promedios por unidad de vivienda. A la fecha no hay flujo de inversión a la fecha no hay información movimiento de inversión



Gráfica 3: ANÁLISIS FINANCIERO PROGRAMADO Y EJECUTADO GENERAL

6.7 INFORMACION RELATIVA PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO

Para este mes el contratista no presenta documentación para desembolso del anticipo.

7 INFORME SST

7.1 ACTIVIDADES GENERALES

Las principales actividades de la interventoría SST- AMBIENTAL se basaron en la revisión documental de los planes de gestión ambiental, plan de calidad y manual SST, ajustado al objeto y tiempo del contrato 994 de 2022, además de los formatos que en consenso se van a diligenciar para efectuar inspecciones, charlas, control de RCD, RESPEL y otros.

También se realizó el acompañamiento en las actividades en territorio, iniciando por la socialización realizada por el área social y la SDHT.

Se acompaña al área técnica y social en las visitas a los MV, a los cuales se les realiza la validación de actividades, verificando aspectos de seguridad industrial aplicables a las actividades que plantea el área técnica.

Administrativamente se realiza la revisión de los planes entregados, los cuales requirieron de reuniones entre las partes para lograr el documento final el cual se remite a la SDHT mediante oficio de la interventoría, así mismo, también a través de oficio, se da el aval de aplicación de los mismos durante el contrato ya que alcanzan a cubrir las actividades y objeto del contrato.

7.2 DOCUMENTACIÓN AFILIACIONES O PAGOS AL SGSS

La interventoría SST presenta la seguridad social de sus profesionales de acuerdo al siguiente listado.

		CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE	AGOS	SEP
GRUPO 2 CONTRATO 1009	1	DIRECTOR	ARQUITECTO	CESAR FUENMAYOR	X	X
	2	RESIDENTE 1	ARQUITECTO	EDWIN BAEZ		X
	3	RESIDENTE 2	ARQUITECTO	LUISA PINZON	X	X
	4	RESIDENTE 3	ARQUITECTO	LEONARDO SOLANO		X
	5	RESIDENTE 4	ARQUITECTO	MARTHA NEIRA		X
	6	COORDINADOR SOCIAL	TRAB SOCIAL	SHIRLEY VITOLA		X
	7	PROFESIONAL SOCIAL 2	TRAB SOCIAL	ANGIE QUINTERO		
	8	PROFESIONAL SOCIAL 3	TRAB SOCIAL	JESSICA SEPULVEDA	X	X
	9	PROFESIONAL SOCIAL 4	TRAB SOCIAL	DORA AREVALO	X	X
	10	PROFESIONAL SOCIAL 5	TRAB SOCIAL	KARELLYS BRIZO		X
	11	PROFESIONAL SISO	PROFESIONAL SST	ROBERT ROJAS TORRES		X
	12	PROFESIONAL SISO	PROFESIONAL SST	VALERIA ORCASITAS		
	13	APOYO SST	PROFESIONAL SST	LEDA LAMBIS		X

Tabla 13: LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En el informe del contratista anexo en formato Excel, se evidencia la cantidad de personal administrativo vigentes en el contrato por parte de Building SAS, no hay personal operativo, ya que al cierre del informe aún no se inician actividades de obra.

7.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA


De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, el cual se encuentra a continuación, se presentan las siguientes gráficas del seguimiento efectuado por semana y el acumulado mensual.

PLAN DE TRABAJO SG SST		SEPTIEMBRE			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	1-sep AL 9-sep	10-sep AL 16-sep	17-sep AL 23-sep	24-sep AL 30-sep
ELABORACIONES DE PLANES (AMBIENTAL, SST, CALIDAD)	Contratista	P E			
ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	Contratista	P E			
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES (AMBIENTAL, SST, CALIDAD)	Contratista		P E		
VERIFICACION DE LICENCIAS MINERAS PARA MATERIALES PETREOS	Contratista		P E		
VERIFICACION DE PROVEDORES EXTERNOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RCD	Contratista		P E		
VERIFICACION DE PROVEDORES EXTERNOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESPEL	Contratista		P		
REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS: PREINGRESO OCUPACIONALES	Contratista			P E	
VERIFICACION DE AFILIACION / DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGO LABORAL	Contratista			P E	
INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Contratista			P E	P E
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVOS	Contratista			P	P
DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACION DE RIESGO	Contratista			P E	P E
DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA	Contratista			P E	P E
CHARLAS INFORMATIVAS	Contratista				P E
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Contratista			P	P
ELABORACIONES DE INFORMES SEMANALES	Contratista	P E	P E	P E	P E
ELABORACIONES DE INFORMES MENSUALES	Contratista				
INSPECCIÓN DE CAMILLA	Contratista				P
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	Contratista				P
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	Contratista				P
INSPECCIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO	Contratista				P
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Contratista				P
INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Contratista				P
INSPECCIÓN DE PULIDORA	Contratista				P
INSPECCIÓN DE TALADRO	Contratista				P
INSPECCIÓN DE EPP	Contratista				P
INSPECCIÓN DE DOTACION OVEROL (VISUAL)	Contratista				P
REVISIÓN DE SOPORTES DE VALES DE ESCOMBROS Y PIN DE VOLQUETA	Contratista				P
REVISION DE DOCUMENTOS DE LA VOLQUETA Y EL CONDUCTOR	Contratista				P
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CUBIERTA	Contratista				P
DILIGENCIAMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO (DURANTE LA ENTREGA DE VIVIENDA)	Contratista				P
SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES CUANDO OCURRA	Contratista				P E
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL					
P	Programado	Actividades programadas	6	6	6	22
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	3	4	0	6
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	100.00%	90.00%	25.00%	27.27%


Tabla 14: LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

INPLAYCO S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 33

Como puede apreciarse no se realizaron inspecciones en el periodo, las inspecciones de herramientas, andamios, overoles y revisiones de documentos de volqueta y los vales, se debe a que no hubo actividades de obra, situación que ha sido tratada en el comité de obra; las inspecciones de equipos de emergencias no se realizan porque no han sido suministrados por el contratista estas dotaciones para el PAC. La no realización de estas actividades se puede apreciar en las figuras siguientes.

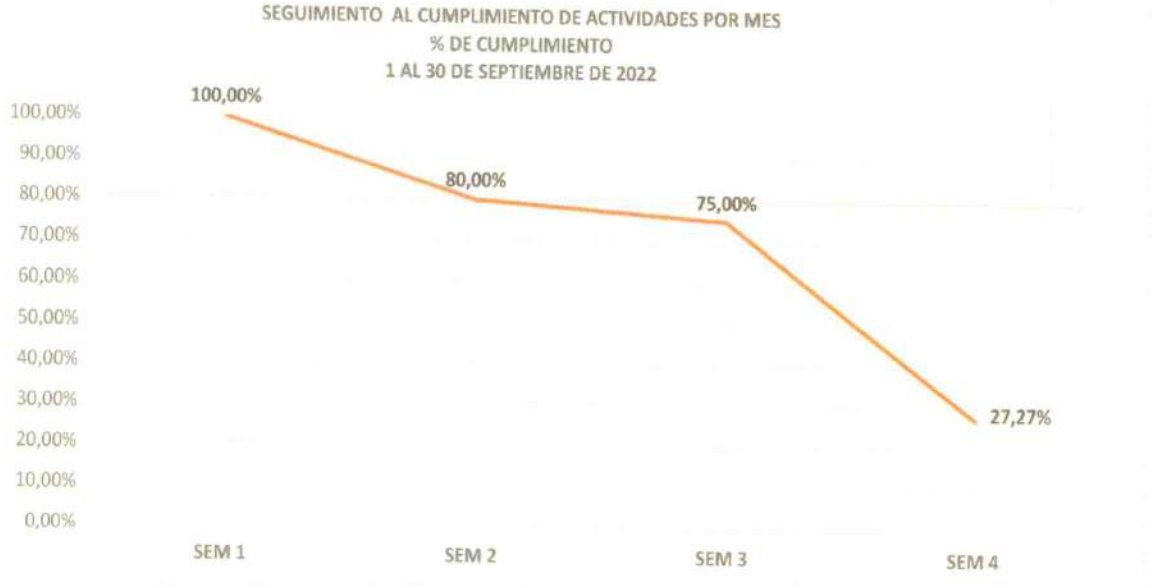

Gráfica 4 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO

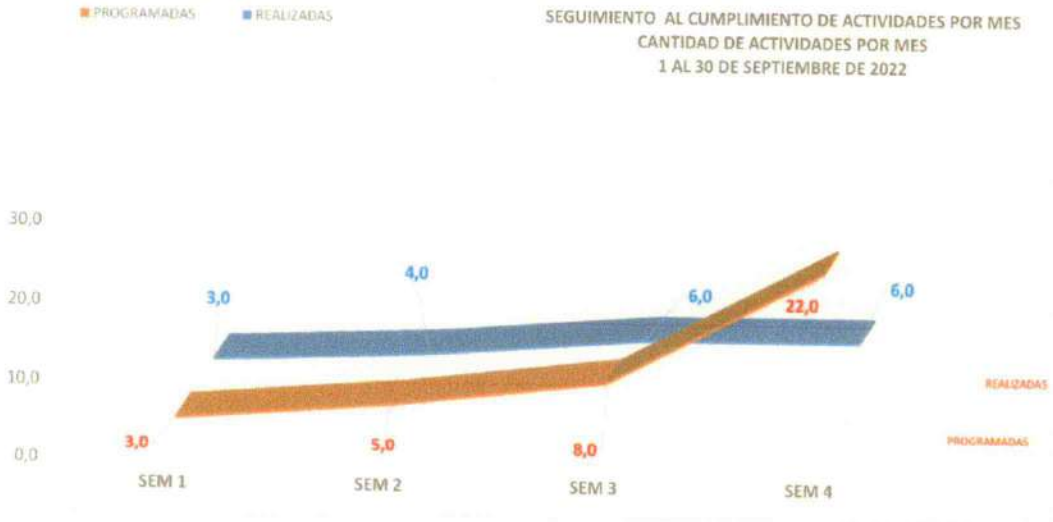

Gráfica 5 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Del total de actividades sólo se ejecutaron 20, el cumplimiento de ejecución ha sido muy bajo y se debe a que no se han contratado los dos profesionales responsables, sólo hay un profesional aprobado y contratado que se encarga del componente ambiental y un apoyo en el área, situación que también se trató en los comités de obra y se ha solicitado el cumplimiento del personal mínimo requerido a través de oficios, relacionados en el listado dentro del componente técnico.



Gráfica 6 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS

7.4 CUADRO DE ESTADISTICA GENERAL

INDICADOR SST	FRECUENCIA ACCIDENTALIDAD	N° ACCIDENTES MES	N° TRABAJADORES MES	FRECUENCIA	
		0	13	0%	
	FORMULA: (N° de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100				
	SEVERIDAD ACCIDENTALIDAD	N° DÍAS INCAPACIDAD MES	N° DÍAS CARGADOS MES	N° TRAB. MES	SEVERIDAD
		0	0	13	0%
	FORMULA: (N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + N° de días cargados en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100				
	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	N° DÍAS AUSENCIA MES	N° DÍAS PROGRAMADOS	AUSENTISMO	
		0	390	0%	
	FORMULA: (N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días de trabajo programados en el mes) * 100				

INDICADORES CALIDAD				
	NIVEL DE SATISFACCIÓN	MV ASIGNADOS	MV ENTREGADOS AL TIEMPO	SATISFACCIÓN
		200	0	0%
	FORMULA: N° de MV entregados a tiempo / N° total de MV asignados*100			
	NIVEL DE SATISFACCIÓN	N° REQUISITOS SOLICITADOS	N° REQUISITOS ENTREGADOS	CONFORMIDAD
		0	0	
	FORMULA: N° de requisitos que pide el cliente en relación a la calidad / N° de requisitos cumplidos por la organización*100.			
	NIVEL DE RECLAMOS	N° CARACTERISTICAS CUMPLIDAS	N° CARACTERISTICAS PEDIDAS	RECLAMACIONES
		0	0	
	FORMULA: N° de características de calidad cumplidas por el material/ N° de características de calidad pedidas*100			
	NIVEL DE CONFORMIDAD	N° NO CONFORMIDAD CORREGIDAS	N° NO CONFORMIDAD	CONFORMIDAD PROVEEDORES
		0	0	
	FORMULA: N° de NC corregidas/ N° total de NC*100			

Tabla 15: INDICADORES CONTRATISTA

7.5 CAPACITACIONES INTERVENTORIA

La interventoría ha realizado las capacitaciones correspondientes a Inducción general y notificación de riesgos a sus profesionales

- Divulgación de aspectos técnicos, SST, calidad y ambiental
- Inducción de SST y ambiental- notificación de riesgos
- Entrega de carnet proyecto 1009-2022
- Divulgación de flujograma Medevac y entrega Medevac bolsillo
- Divulgación procedimiento de cubiertas asbesto
- Uso correcto del lenguaje – evitar lenguaje sexista.

7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa registro fotográfico por MV en Anexos SST.

8 ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista entrega el plan ambiental para el proyecto, donde se hace un énfasis especial al manejo de RCD y RESPEL.

Adicional a esto se verificaron las licencias de Cemex para disposición de RCD y de proveedor de materiales pétreos.

8.1 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

No se ha realizado disposición de RCD, ni otros residuos de obra, porque no se inicia las actividades de ejecución. En cuanto a los residuos del PAC se dispone en los recorridos programados por las empresas públicas que cubren el sector, no cuantificados por ser mínima la cantidad.

ANEXOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

TABLA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL

Fecha: 3-oct-22

BUILDING S.A.S

Contrato de Interventoria	994 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"	Fecha de Terminacion	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte

INPLAYCO S.A.S.

Contrato de Interventoria	1009 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."	Fecha de Terminacion	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/Cte

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
					Validacion		Ejecución					
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Cesar Fuenmayor	BELLA FLOR	202	202	53	149	0	0	2	200	0,00%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			202	202	53	149	0	0	2	200	0,00%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											SEPTIEMBRE			
Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I		Tiempo Programación			% MENSUAL No. 1		SEMANA DEL 01 AL 09	SEMANA DEL 10 AL 16	SEMANA DEL 17 AL 23	SEMANA DEL 24 AL 30
No	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	Fecha de Validacion	Valor Liquidado	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
BARRIO: BELLA FLOR														
1	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO CORTES					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	MVBF_1052	KR 27A 73 28 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE					SIN VALIDAR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

21	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	MVBF_1100	KR 27 BIS A 73 70 SUR	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	RENUNCIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 99	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F 15 MJ	JOSE ALONSO MUÑOZ SCARPETTA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 62	MARINA NAVAS ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
56	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
57	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 65	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
59	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
62	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARRERO AGUDELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
67	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

68	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
73	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
74	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
77	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
78	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
79	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
82	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
86	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87	MVBF_801	CL 72C SUR 26C 73 MJ	AMPARO TIQUE ROMERO	RENUNCIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
88	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
93	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
95	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
96	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
97	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
98	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
99	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
101	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
102	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
103	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
104	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
105	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
106	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
107	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
108	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
109	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
110	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
111	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
112	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
113	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

114	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
115	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
116	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
117	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
118	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	26/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
119	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
120	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
121	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
122	MVBF_1249	CL 73 C BIS A SUR 26F 62 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
123	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
124	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
125	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
126	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
127	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
128	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
129	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
130	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
131	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 65 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
132	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUIÑONES MELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
133	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
134	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
135	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
136	MVBF_0731	KR 27A 72D 62 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
137	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
138	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
139	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
140	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
141	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
142	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
143	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
144	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
145	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
146	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
147	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
148	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
149	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
150	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
151	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
152	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
153	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
154	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
155	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
156	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
157	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
158	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
159	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	28/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

160	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	26/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
161	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	26/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
162	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
163	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
164	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
165	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
166	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
167	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
168	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
169	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
170	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
171	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ VELASQUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
172	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
173	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
174	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
175	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
176	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
177	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
178	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
179	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO CARDONA	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
180	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
181	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
182	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
183	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
184	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
185	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
186	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
187	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	20/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
188	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
189	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
190	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
191	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	AENIGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
192	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
193	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
194	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
195	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
196	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
197	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
198	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
199	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	21/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
200	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	26/0/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
201	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
202	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M - 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S.

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES No. 1 - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR

MVBF_1149	**GUSTAVO MONROY FONSECA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1195	**DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye la adecuación de las áreas de Baño, Cocina, Habitaciones Y Pisos ,en las cuales se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Aplicación de Base Acrílica + Pintura tipo Vinilo.
MVBF_1196	**INES SOFIA REYES CASTRO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1197	**LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 pintura interior tres manos, Puerta de Madera Área Baños e Instalación de CieloRaso PVC.
MVBF_1198	**CARMEN ELVIRA REYES CARO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicialen las cuales se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Armado y fundición Mesón Cocina, Enchape Pared Incluye Lavaplatos y Grifería.
MVBF_1200	**SANDRA PAOLA BEJARANO REYES**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1220	**MARIA NOHEMY MATTA LOZANO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación de Enchape Pared Cocina incluye Mesón + Lavaplatos + Grifería.
MVBF_1213	**NORMA CONSTANZA MELO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario.
MVBF_1228	**SANDRA YANETH REY VANEGAS**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 mielo raso en PVC, Instalación de Lavadero y Enchape Pared Patio Ropas y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1155	**ANA FELIZ DIAZ PATIÑO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica,Instalacion de Enchape Pared Cocina y Baño, e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baño.

MVBF_1166	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Instalación de Cubierta Arquitectonica,Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación de Enchape Pared Cocina y Baño
MVBF_1167	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario, Instalación de Enchape Pared cocina y Baño, Mesón cocina.
MVBF_1191	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación Enchape Pared Cocina y Baño, Mesón cocina incluye Lavaplatos + Grifería.
MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, enchape de muro en baño y zona de ropas, cambio de combo sanitario, preparación de muros para aplicación de pintura, demolición de enchape, alistado y enchape de piso y cielo raso.
MVBF_948	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, demolición de mesón, enchape de muro en cocina, mesón nuevo, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, preparación de pisos y enchape en alcobas y cielo raso.
MVBF_950	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan inicialmente actividades de cubierta, pañete, alistado de piso, enchape de muro en baño y cocina, cambio de combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_964	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de baño y zona de ropas, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón, enchape de muro y de piso en baño y cocina, mesón nuevo, adecuación de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0966	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de baño, alcobas y zona de ropas, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón, enchape de muro y de piso en baño y cocina, mesón nuevo en cocina, adecuación de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de alcobas y zona de ropas, demolición de enchape de pisos y de muro en cocina, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón y armado de uno nuevo, enchape de muro y de piso en cocina, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete y pintura en baño, cocina y alcobas inicialmente, preparación y alistado de pisos, enchape de piso en baño cocina y alcobas, enchape de muro en baño y cocina , movimiento de puntos en cocina y mesón nuevo, posible pañete y enchape de pisos en zona de ropas y zona social.
MVBF_0749	ESTHER MARINA YARA TIQUE	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: preparación de muros para nueva aplicación de pintura, demolición de enchape de pisos, demolición de enchape de muro en cocina, preparación y enchape de muros en baño y cocina, enchape de pisos, puerta de baño, cambio d combó sanitario y posible cielo raso.

MVBF_0760	**FERMIN MADRIGAL TIQUE**	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, adecuación de puntos en baño, demolición de mesón de cocina, de enchape de piso en baño y cocina, enchape de muro y de piso en baño y cocina, preparación para nueva aplicación de pintura, combo sanitario y puerta de baño.
MVBF_0761	**GILDARDO MORALES VELEZ**	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, demolición de enchape de muro y de piso en baño y cocina, alistado y enchape de piso y de muro en baño y cocina, mesón de cocina nuevo, pintura y cambio de combo sanitario.
MVBF_0767	**ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ**	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en hall, zona de ropas y alcoba, demolición de enchape de piso en cocina, alcobas, demolición de enchape de muro en baño y cocina, alistado y preparación para enchape de piso y de muro en baño y cocina, menos nuevo, instalación de combo sanitario, preparación para nueva aplicación de pintura y puerta de baño.
MVBF_0780	**ELIZABETH GIRALDO DELGADO**	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas y zona social, alistado y preparación de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura.
MVBF_0793	**ARISTOBULO TRIANA**	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas, zona social, baño y cocina, alistado y preparación de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario, puerta de baño y aplicación de pintura.
MVBF_1081	**MELQUISEDEC ORTIZ**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial; Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1061	**FLORENTINO JUEZ BARRETO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicia; Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario
MVBF_1052	**OFELIA MEDINA ARCILA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial; Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, enchape de Antideslizante baños y cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1049	**YAMILE LONDOÑO CARDONA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m en área de cocina y baño , Elaboración de dados de concreto para instalación de cubierta en el área prefabricada, Desmonte de cubierta, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica, Puerta de Madera Área Baños , suministro e instalación combo sanitario
MVBF_1050	**FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicialen las cuales se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. La casa tiene el Enchapa de la cocina en perfectas condiciones , se debe solo cambiar el enchape del Mesón.
MVBF_1083	**ROSA ELENA GÓMEZ QUINTERO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1078	**MARÍA NUBIA LOZANO CERQUERA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Desmonte de cubierta, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica. la casa tiene la fachada principal o de acceso con humedad.

MVBF_1096	**LUCILA TRUJILLO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños .Instalación de Enchape Pared Cocina, a la cocina le instalaron porcelanato en el área de la cocina y baño esta en perfecto estado , no demoler, instalar el entrepaño del mesón de cocina; las habitaciones posteriores tiene humedad que se filtra por la paca de techo.
MVBF_1068	**LUIS ALIRIO CORREA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete en muros , Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación de Enchape Pared Cocina y Baño. (tener cuidado al ingresar materiales esta casa los 2 primeros niveles están arrendados por varias personas y hay posibilidad de perdida de material)
MVBF_1080	**MARIA ROSARIO BÁEZ CHAPARRO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante Cocina, e Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. (la casa tiene bastante humedad ya que se filtra por debajo del pisos , lo beneficiarios demolieron varias paredes para encontrar por donde se filtra pero no lo han logrado encontrar.
MVBF_1048	**MARÍA GLADYS TRIANA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye , Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 instalación de Enchape Pared Cocina, Puerta de Madera Área Baños y en habitaciones . (en esta casa queda sobrando presupuesto debido a que no hay muchas actividades por realizar, se recomienda colocar puertas en todas las habitaciones y baños, tiene humedad en el primer nivel)
MVBF_1108	**MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	**MARIA ELBA ARIAS BONILLA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	**JUAN DE JESUS SEDANO AYALA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y grifería, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_0975	**LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Desmonte de cubierta y estructura, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica. La casa esta al lado de una vía que subo (montaña) lo cual hace que en la parte derecha exista bastante humedad y las paredes no estén en perfectas condiciones.
MVBF_1084	**FIDEL ANTONIO TÉLLEZ ESCARRAGA**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1072	**MARIA AURORA PERÉZ AVELLA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso, enchape de muro en cocina, mesón nuevo.
MVBF_1073	**LEOPOLDO LEÓN MORALES**	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, pañete parcial en baños, enchape de piso y de muro, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura en baño 1 y 2.
MVBF_1141	**BLANCA FLOR TRIANA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso en alcobas, cocina, baño, hall y sala, adecuación de puntos hidráulicos y sanitarios en baño y cocina, enchape de muro en baño cocina y zona de ropas y posible mesón nuevo.

MVBF_1148	**LUZ MARINA PIRAGAUTA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso, pintura, cielo raso en alcobas, instalación de enchape de piso y de muro e instalación de combo sanitario en baño 1, puertas en baños, pañete mochetas de mesón y enchape del mismo, enchape de muro en cocina, enchape de piso en comedor y alcoba niños.
MVBF_1110	**FLOR TRIANA AVILA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, demolición de enchape de muro y de piso, alistado y enchape de muro y de piso en baño, cocina y zona de ropas, alistado y enchape de piso en alcobas y hall, preparación y aplicación de pintura en muros, demolición y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1118	**LUIS ALBERTO CHITIVA CORTÉS**	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizа actividad de cubierta, baño y cocina completos.
MVBF_1128	**ISMELDA PEREZ GARCIA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, alistado y enchape de piso, demolición mesón de cocina, enchape de muro y mesón nuevo en cocina, muro en drywall para aislar la humedad en alcoba de adulto mayor, preparación de muros para nueva aplicación de pintura, enchape de muro en zona de ropas y pintura.
MVBF_1108	**MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	**MARIA ELBA ARIAS BONILLA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	**JUAN DE JESUS SEDANO AYALA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectiva lavaplatos y grifería, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_1117	**RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMORA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta parcial en alcobas, pañete, pintura, alistado y enchape de piso en alcobas, baño y cocina y enchape de muro en baño y cocina, instalación combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1111	**PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS**	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso en todo el apartamento, enchape de piso en baño 1, cambio de combo sanitario en baño 1 y 2, pintura, cielo raso y posible estuco.
MVBF_1124	**HECTOR HERNANDO VELOSA**	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de alistado y enchape de piso, enchape de muro en zona de ropas y baño segundo piso, demolición enchape de piso e instalación de enchape nuevo en baño 1 y 2 y cambio de combo sanitario en baño 1.

ANEXO 2

INFORMES SEMANALES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SEMANA No. 1

1/09/2022 – 9/09/2022

	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio.


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avnace semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022.


Building SAS / INPLAYCO SAS	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1/09/2022 (dd-mm-aa) **AL** 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

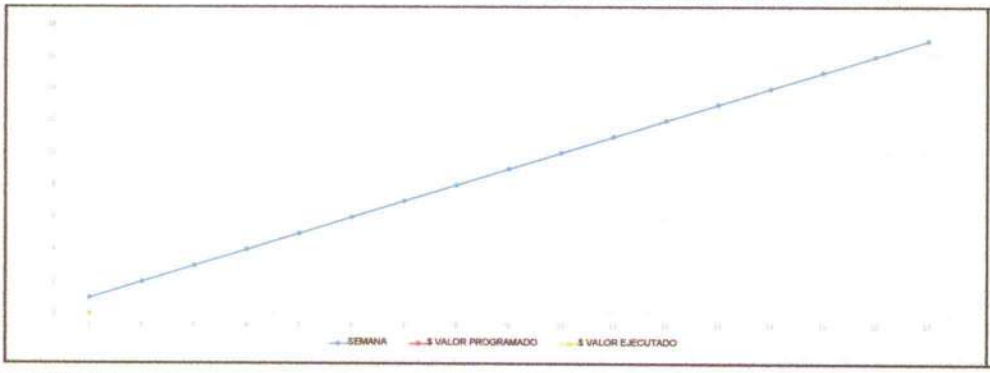

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la

Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-002 y INP-SDHT-1009-2022-004. Se realizo la remision de las hojas de vida de la Interventoria a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-001.
2. Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio, el archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.
3. Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. AB000035, Factura AB000282 y de CUMPLIMIENTO con No. AB000033, Factura AB000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 994 - 2022
4. El 3 de septiembre de 2022 se realizó la reunion de inico en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 200 beneficiarios, a los cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se entablò comunicacion por via telefonica. asistieron en totas 173 beneficiarios o familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los mejoramientos de vivienda a ellos adjudicados.
5. Se realizo reunion en las instalaciónes de la SDH en compañía del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a aspectos tecnicos, sociales y SST. Adicional se recibieron los 200 expedientes correspondientes al grupo 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA		
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas		
MES	septiembre			
SECTOR	BF			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO		0 M3

Participación en socialización y presentación a la contratista:
Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo mínimo requerido para el contrato.
Contratista Building entrega PMA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar par a disposición de residuos peligrosos y de otra índole, así como los certificados mineros y licencias de la cantera.
Personal del contratista está en cero (00), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.
Se hace reunión a interventoría informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se contó con la participación de director quien informa los aspectos técnicos y Social quien hace divulgación de su área específica.
Participación en SDHT de reunión con el personal SST y ambiental.
Reunión en las oficinas de interventoría entre las dos partes obra - interventoría donde se divulgan aspectos importantes y relevantes en todas las áreas, social, técnico, SST, MA y calidad.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL.

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los DOCE (Día en letras) 12 (Día en números) días del mes del SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A. JUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SEMANA No. 2

10/09/2022 – 16/09/2022

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE BARRIOS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) **DEL** 10/09/2022 (dd-mm-aa) **AL** 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	30	8%	0	0%	8%	-8%	30	0	0	-8%	1	0	0	2	30	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.


1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Según la programación presentada por el Contratista de Obra el día 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debía iniciar el día 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado.
3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado.


MVBF_022, MVBF_027, MVBF_046, MVBF_047, MVBF_054, MVBF_058, MVBF_066, MVBF_071, MVBF_085, MVBF_087, MVBF_089, MVBF_094, MVBF_096, MVBF_1001, MVBF_1015, MVBF_1045, MVBF_1062, MVBF_106, MVBF_1068, MVBF_107, MVBF_1072, MVBF_1078, MVBF_1080, MVBF_1085, MVBF_1096, MVBF_1100, MVBF_1108, MVBF_1117, MVBF_118

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciara a partir del día 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no indica ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.


FORMATO	
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA	
PROCESO	
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

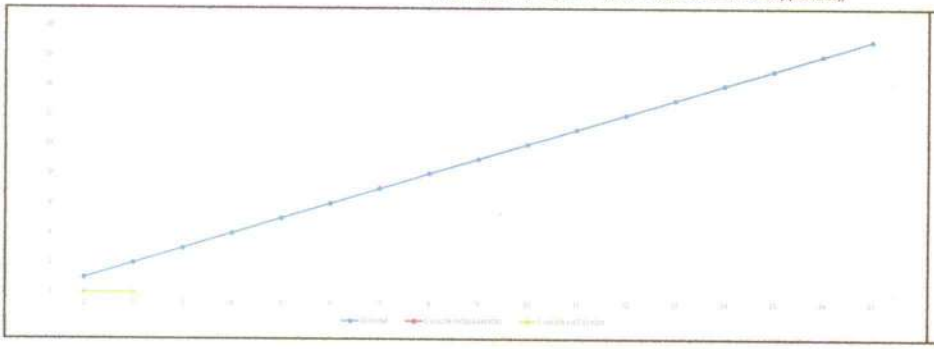

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Realizar analisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para

Durante la semana el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de validaciones ni de ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIERIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39166
	MVBF_1100	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

FORMATO	
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA	
PROCESO	
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HABITAT SUBDIRECCION DE BARRIOS	

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta interventoria se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, en el cual se evidencio que segun la programacion presentada por el Contratista Building SAS esta presenta atraso ya que a la fecha no se ha dado inicio a las labores contempladas, por tal motivo se realizo la solicitud de arranque de obra y observaciones de posibles incumplimientos mediante oficio No. INP -SDHT-1009-2022-008.
2. Pasados 16 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de Septiembre de 2022 se debió iniciar con 30 validaciones y a la fecha no ha iniciado.
3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-008 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta Interventoría.
4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, al mismo tiempo se radicaron mediante oficios No. INP -SDHT-1009-2022-007, PGS Building sas, radicado 1-2022-39024 y No. INP -SDHT-1009-2022-008 plan de acompañamiento de gestión social Inplayco sas radicado 1-2022-39023.
5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoría, en donde se realizo a presentación de los profesionales por parte de los contratistas Building SAS e Inplayco SAS, con respecto al balance de fiducia la Interventoría informa que se recibieron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el balance de validaciones y ejecución de obras la Interventoría manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)		No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA	
SEMANA 2	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas		N/A	
MES	Septiembre				
SECTOR	BF				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3		

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA		
SEMANA 2	0 M3			
MES	septiembre			
SECTOR	BF			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3	

Contratista Building entrega PMA el día viernes 9 de septiembre , se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final. no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continúan la falencia en la entrega de formatos y soportes adicionales.
Participación en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se aclara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por este motivo aun no aparecen activos, solo se dejan 3 sociales que tenían documentos completos para esta semana.
Se realiza charla de inducción al personal de interventoría, se tratan diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato
Se incluye solo 3 personas del contratista por ser las que están aprobadas y afiliaciones debidamente presentadas.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los DIECINUEVE (Día en letras) 19 (Día en numeros) días del mes del SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre(Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SEMANA No. 3

17/09/2022 – 23/09/2022

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 3 (Consecutivo) DEL 17/09/2022 (dd-mm-aa) AL 23/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 904.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Inicio	19/08/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Inicio	12/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	30	15%	40	20%	5%	0%	30	40	20%	0%	1	0	0	2	30	0	3	30	40	4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presentan atrasos indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante la semana se realizaron 40 validaciones correspondientes a los siguentes MV

MVBF_1200, MVBF_1196, MVBF_1197, MVBF_1198, MVBF_1167, MVBF_1201, MVBF_1166, MVBF_1195, MVBF_1155, MVBF_1191, MVBF_1149, MVBF_950, MVBF_904, MVBF_0966, MVBF_0780, MVBF_948, MVBF_0749, MVBF_0761, MVBF_0730, MVBF_0737, MVBF_0760, MVBF_745, MVBF_0793, MVBF_0767, MVBF_1061, MVBF_1061, MVBF_1052, MVBF_1049, MVBF_1050, MVBF_1083, MVBF_1078, MVBF_1096, MVBF_1068, MVBF_1080, MVBF_1048, MVBF_0975, MVBF_1084, MVBF_1213, MVBF_1228 Y MVBF_1220

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presentan atrasos indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciara a parte del día 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no indica ningun porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORIA

PROCESO

EJECUCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE BARRIOS


SEMANA No. 3 (Consecutivo) DEL 17/09/2022 (dd-mm-aa) AL 23/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance actualizado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Describir análisis y comentarios sobre el avance y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto, cumplimiento o no programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las razones y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

Durante la semana el Contratista de Obra no refleja en la programación inicio de ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
NOMBRE REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativos)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_901	BENEFICIERIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39186 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 20473601, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39912 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativos)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
NOMBRE REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

Building SAS / INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 3 (Consecutivo) DEL 17/09/2022 (dd-mm-aa) AL 23/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

8. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Se le solicita al Contratista para finalizar la etapa de validación presentar los NP solicitados en el comité de obra para de esta manera dar continuidad con el proceso y poder iniciar con la etapa de realización y revisión por parte de esta interventoría de los tramites para cada vivienda.

2. Se le recuerda al Contratista que para efectos del contrato en ejecución, todos los materiales a utilizar deben de estar marcados dentro su programa de calidad y cumplir cabalmente los requisitos de compra.

3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT -1009-2022-008 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta interventoría.

4. Durante el periodo se realizaron 40 caracterizaciones sociales, donde se hizo el acompañamiento por parte de los profesionales, se explicó a los beneficiarios nuevamente el proceso del mejoramiento de vivienda, las condiciones, las actividades que no se ejecutan etc. A las viviendas con cambios de cubierta de las cuales se identificaron 8 por el área técnica, se informó de la mano con el área Sst que si las tejas a desmontar son de material de zinc no hay problema en desarrollarlas si así lo solicitan, pero si son de asbesto debe tener un proceso de retiro especial por lo tanto es imposible desarlas en las viviendas. También se socalizo en la misma visita del punto de

5. Se identifico una vivienda para postular a posible reubora de vida. MVBF_0737. Evangelina Madrigal. Se realizará el seguimiento para la firma del documento donde acepte ser parte del proceso.

6. Desde el área social se realizo atención a Piac de contratista e interventoría el día sábado 24 de septiembre sin novedad.

7. Durante el proceso de validación sucedió una novedad especial en unos de los sectores de valla flor. El día martes 20 de septiembre hubo una situación de riesgo o amenaza a la integridad física de uno de los grupos de profesionales que estaban llevando a cabo la actividad de validación. Lo anterior debido a que, en una de las cuadras del barrio, existen personas que se dedican a expender drogas y permanecen cerca de algunas de las viviendas de los beneficiarios del subsidio de vivienda. Para estas personas, el grupo de profesionales representa una amenaza y al momento en que dicho grupo se dirigía a la casa de una de las beneficiarias, manifestaron en voz alta, que no les gustaba que estuvieran allí, porque después podía llegar un operativo de la policía y los profesionales podían estar encubiertos. Los siguientes días en los que se ha llevado a cabo las validaciones no se han presentado inconvenientes de ninguna índole.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICION RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)		No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y	
SEMANA 3	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas		N/A	
MES	Septiembre				
SECTOR	BF				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3		

DISPOSICION RESIDUOS		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA		
SEMANA 3	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas		
MES	septiembre			
SECTOR	BF			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3	

De acuerdo a la revisión #2 por la implementación del PMA, CALIDAD, SST, CALIDAD y en seguimientos soportes, personas las inconformidades, situación que fue comunicada al representante legal del contratista en el comité de obra que se realizo el jueves 22 de septiembre en la SDHT.

Se recibe subsanación de seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, está pendiente la entrega de la planilla del señor Sergio Esneider Alzate, ya que la planilla entregada no cuenta con el sello ni la marca de agua de pagado, se solicito al contratista validar la información antes del envío para evitar reprocesos.

Contratista reporta la inducción de 11 personas, mas no se reciben soportes de las mismas, por esta razón las capacitaciones del contratista se mantienen en Cero. (0)

Se realiza charla sobre uso correcto del lenguaje con Beneficiarios y maestros, respeto mutuo, dictada al personal de interventoria. Se hace acompañamiento SISOMA en las validaciones de vivienda.

De esas las 11 personas del contratista que ser les mas están aprobadas, al cierre del informe no se ha recibido información referente a documentos de maestros, oficiales o ayudantes.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1. REPORTE VISITAS TECNICAS
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO VALIDACIONES TECNICAS
ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES

Nota: Si lo requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los VEINTISEIS (Día en letras) 26 (Día en Numeros) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre(Nombre): Arq. CÉSAR A FUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoria

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INPLAYCO S.A.S.

ANEXO 1

Reporte visitas técnicas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	EMPLAYCO

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA No. 3 - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR

MVBF_1149	**GUSTAVO MONROY FONSECA**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Antideslizante baños y Cocina. Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1195	**DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye la adecuación de las áreas de Baño, Cocina, Habitaciones Y Pisos ,en las cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina.Aplicacion de Base Acriica + Pintura tipo Vinilo.
MVBF_1196	**INES SOFIA REYES CASTRO**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial.Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1197	**LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial.Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m,Pintura interior tres manos, Puerta de Madera Área Baños e Instalacion de CieloRaso PVC.
MVBF_1198	**CARMEN ELVIRA REYES CARO**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,en las cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica.Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.Armado y fundicion Meson Cocina,Enchape Pared incluye Lavaplatos y Griferia.
MVBF_1200	**SANDRA PAOLA BEJARANO REYES**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina.Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madero Área Baños.
MVBF_1220	**MARIA NOHEMY MATTA LOZANO**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye.Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina.Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.Instalacion de Enchape Pared Cocina incluye Meson + Lavaplatos + Griferia.
MVBF_1213	**NORMA CONSTANZA MELO**	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina.Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e Instalación Combo Sanitario.

MVBF_1228	SANDRA YANETH REY VANEGAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m,Cielo raso en PVC,Instalacion de Lavadero y Enchape Pared Patio Ropas y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1155	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Armado e Instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica,instalacion de Enchape Pared Cocina y Baño,e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baño.
MVBF_1166	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Pr.esupuesto Inicial, Instalacion de Cubierta Arquitectonica,Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños,Instalacion de Encahpe Pared Cocina y Baño
MVBF_1167	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario, Instalacion de Enchape Pared cocina y Baño,Meson cocina.
MVBF_1191	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños,Instalacion Enchape Pared Cocina y Baño,Meson cocina incluye Lavaplatos + Griferia.
MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, enchape de muro en baño y zona de ropas, cambio de combo sanitario, preparacion de muros para aplicacion de pintura, demolicion de enchape, alistado y enchape de piso y cielo raso.
MVBF_948	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, demolicion de meson, enchape de muro en cocina, meson nuevo, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, preparacion de pisos y enchape en alcobas y cielo raso.
MVBF_950	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan inicialmente actividades de cubierta, pañete, alistado de piso, enchape de muro en baño y cocina, cambio de combo sanitario y armado de meson nuevo en cocina.
MVBF_964	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en areas de baño y zona de ropas,alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson, enchape de muro y de piso en baño y cocina, meson nuevo, adecuacion de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0966	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en areas de baño, alcobas y zona de ropas,alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson, enchape de muro y de piso en baño y cocina, meson nuevo en cocina, adecuacion de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.

MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de alcobas y zona de ropas, demolicion de enchape de pisos y de muro en cocina, alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson y armado de uno nuevo, enchape de muro y de piso en cocina, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete y pintura en baño, cocina y alcobas inicialmente, preparacion y alistado de pisos, enchape de piso en baño cocina y alcobas, enchape de muro en baño y cocina , movimiento de puntos en cocina y meson nuevo, posible pañete y enchape de pisos en zona de ropas y zona social.
MVBF_0749	ESTHER MARINA YARA TIQUE	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: preparacion de muros para nueva aplicación de pintura, demolicion de enchape de pisos, demolicion de enchape de muro en cocina, preparacion y enchape de muros en baño y cocina, enchape de pisos, puerta de baño, cambio d ecombo sanitario y posible cielo raso.
MVBF_0760	FERMIN MADRIGAL TIQUE	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, adecuacion de puntos en baño, demolicion de meson de cocina, de enchape de piso en baño y cocina, enchape de muro y de piso en baño y cocina, preparacion para nueva aplicacion de pintura, combo sanitario y puerta de baño.
MVBF_0761	GILDARDO MORALES VELEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, demolicion de enchape de muro y de piso en baño y cocina, alistado y enchape de piso y de muro en baño y cocina, meson de cocina nuevo,pintura y cambio de combo sanitario.
MVBF_0767	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en hall, zona de ropas y alcoba, demolicion de enchape de piso en cocina, alcobas, demolicion de enchape de muro en baño y cocina, alistado y preparacion para enchape de piso y de muro en bañpo y cocina, meosn nuevo, instalacion de combo sanitario,preparacion para nueva aplicacion de pintura y puerta de baño.
MVBF_0780	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas y zona social, alistado y preparacion de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario y aplicacion de pintura.
MVBF_0793	ARISTOBULO TRIANA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas, zona social, baño y cocina, alistado y preparacion de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario, puerta de baño y aplicacion de pintura.
MVBF_1081	MELQUISEDEC ORTIZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial: Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1061	FLORENTINO JUEZ BARRETO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicia: Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario
MVBF_1052	OFELIA MEDINA ARCILA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial: Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, enchape de Antideslizante baños y cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.

MVBF_1049	YAMILE LONDOÑO CARDONA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m en area de cocina y baño , Elaboracion de dados de concreto para instalacion de cubierta en el area prefabricda, Desmonte de cubierta, Armado e instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica, Puerta de Madera Área Baños , suministro e instalacion combo sanitario
MVBF_1050	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,en las cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica,Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. La casa tiene el Enchpa de la cocina en perfectas condiciones , se debe solo cmabiar el anchap del Meson.
MVBF_1083	ROSA ELENA GÓMEZ QUINTERO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1078	MARÍA NUBIA LOZANO CERQUERA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye. Desmonte de cubierta, Armado e Instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica, la casa tiene la fachata principal o de acceso con humedad.
MVBF_1096	LUCILA TRUJILLO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños ,Instalacion de Encahpe Pared Cocina, a la cocina le instalaron porcelanato en el area de la cocina y baño esta en perfecto estado , no demoler, instalar el entrepaño del meson de cocina: las habitaciones posteriores tiene humedad que se filtra por la paca de techo.
MVBF_1068	LUIS ALIRIO CORREA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete en muros , Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños,Instalacion de Encahpe Pared Cocina y Baño, (tener cuidado al Ingresar materiales esta casa los 2 primeros niveles esatn arrendados por varias personas y hay posisbilidad de perdidad de material)
MVBF_1080	MARIA ROSARIO BÁEZ CHAPARRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante Cocina, e Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, (la casa tiene bastante humedad ya que se filtra por debajo del pisos , lo benefeciarios demolieron varias parades para encontrar por donde se filtra pero no lo han logrado encontrar.
MVBF_1048	MARÍA GLADYS TRIANA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye , Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m,Instalacion de Encahpe Pared Cocina,Puerta de Madera Área Baños y en habitaciones , (en esta casa queda sobrando presupuesto debido a que no hay muchas actividades por realizar, se recomienda colocar puertas en todas las habitaciones y baños, tiene humedad en el primer nivel)
MVBF_0975	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye. Desmonte de cubierta y estructura, Armado e Instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica. La casa esta al aldo de una via que subo (montaña) lo cual hace que en la parte derecha exista bastate humedad y las paredes no esten en perfectas condiciones.
MVBF_1084	FIDEL ANTONIO TÉLLEZ ESCARRAGA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial,Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

INPLAYCO SAS

ANEXO 2

Registro Fotográfico
Validaciones técnicas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1149 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1155 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1166 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL COCINA - SALA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1167 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PRIVADA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS

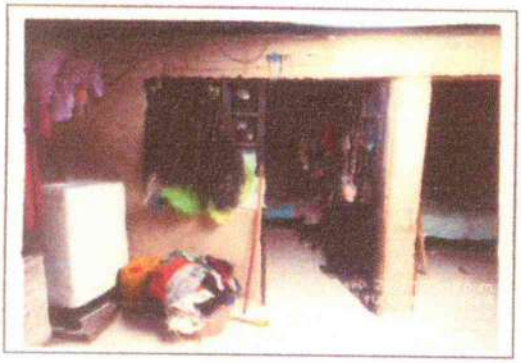


viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA

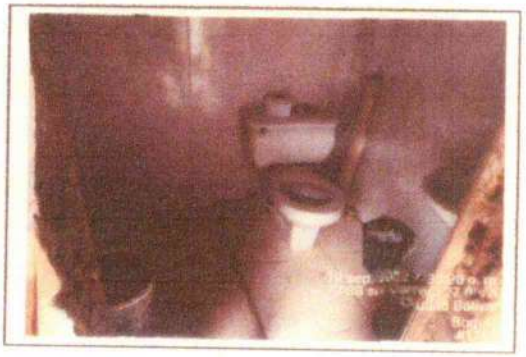

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1191 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1

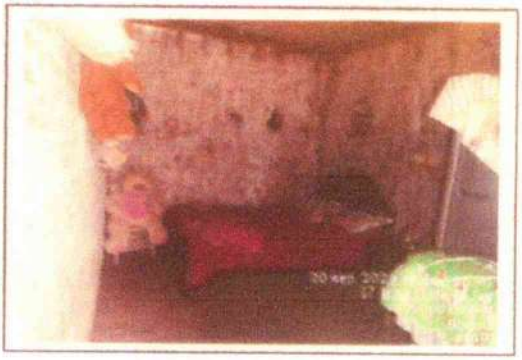

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1195 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1196 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1197 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL ALCOBAS




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1198 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

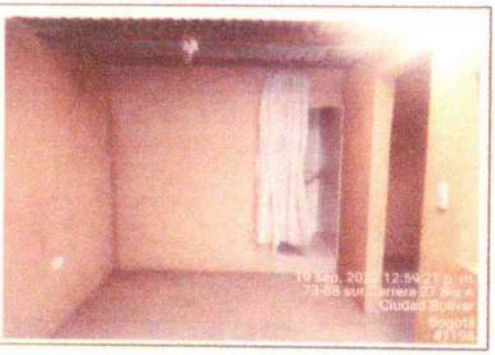

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1200 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)

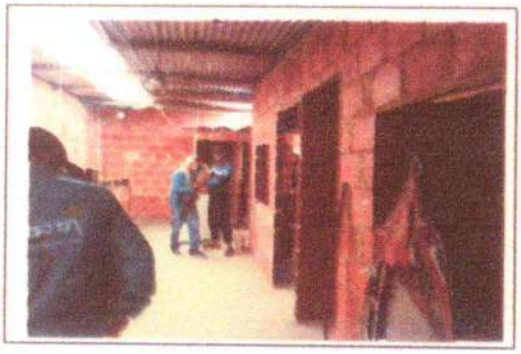


viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS

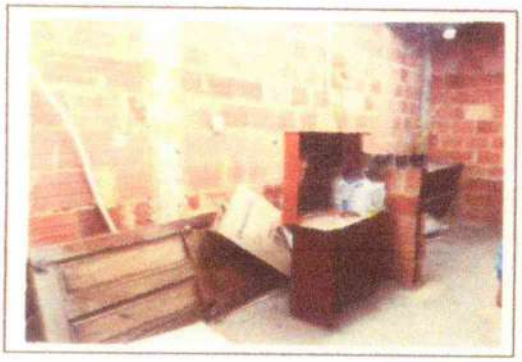

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES

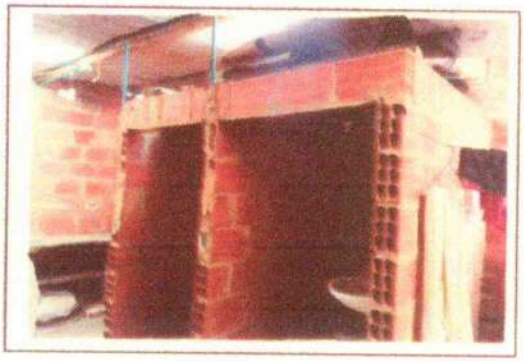

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1201 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1213 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1220 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1228 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR

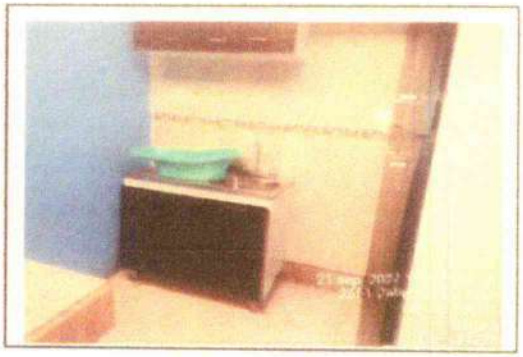

viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 950 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 964 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0966 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0780 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 948 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0749 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0761 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV8F_0730 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0737 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0760 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta sala



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta comedor



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 745 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala-comedor



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0793 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0767 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall




martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1081 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA

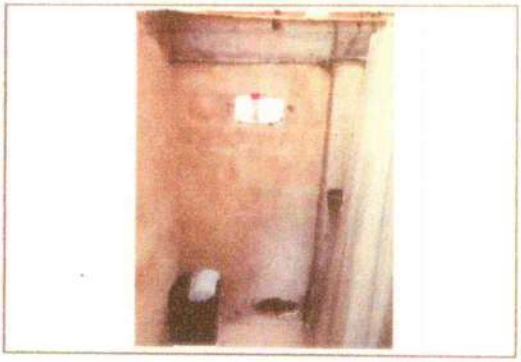

lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
ESTRUCTURA CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1061 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO




lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION - 2

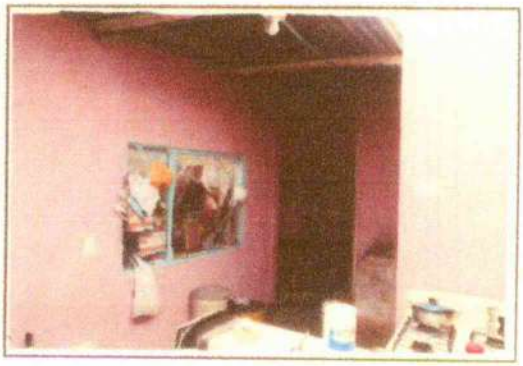

lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1052 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1049 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION

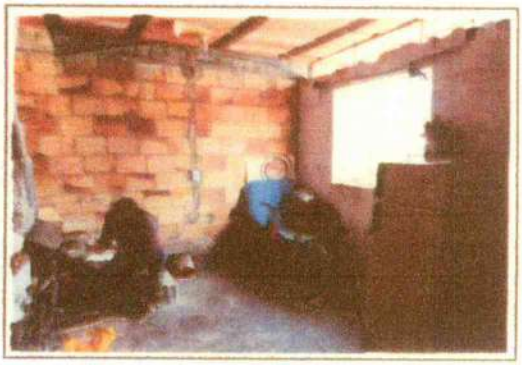

lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1050 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1083 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1078 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO




martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA

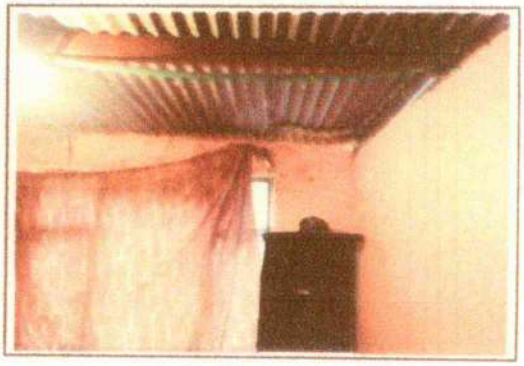

martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1096 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
ZONA DE ROPAS

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1068 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO

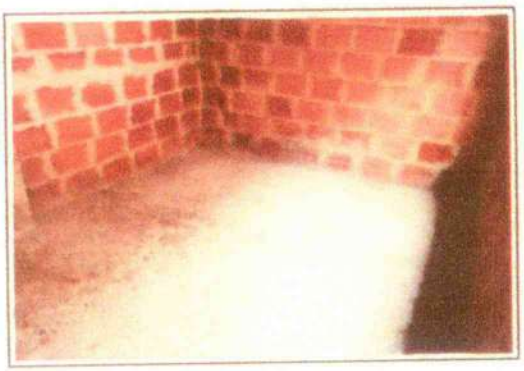

martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1080 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA- COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
PATIO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CABIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVBF_ 1048 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA- COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COINA 1 PISO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
PATIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0975 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA




miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA - COMEDOR

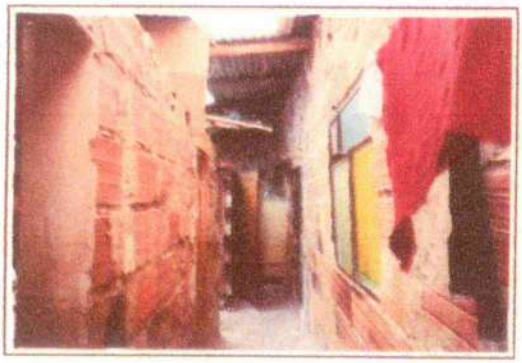

miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1084 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

INPLAYCO

108

ANEXO 3

Registro Fotográfico
Caracterizaciones Sociales

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES

 Actividad: Caracterización social MVBF_950 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_964 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_0966 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_948 Fecha: 19/09/2022
 Actividad: Caracterización social MVBF_0780 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF-1061 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_1052 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_1049 Fecha: 19/0/2022
 Actividad: Caracterización social MVBF-1081 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización Social MVBF_1200 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_1196 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización Social MVBF_1197 Fecha: 19/09/2022
 Actividad: Caracterización social MVBF-1050 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización Social MVBF_1198 Fecha: 19/09/2022	 Actividad: Caracterización Social MVBF_1167 Fecha:19/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_0749 Fecha: 20/09/2022
 Actividad: Caracterización Social MVBF_1201 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_0761 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_0760 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización Social MVBF_1166 Fecha:20/09/2022
 Actividad: Caracterización social MVBF_0730 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_0737 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_745 Fecha: 20/09/2022	 Actividad: Caracterización social MVBF_1083 Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1068
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1096
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1078
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1195
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1156
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1191
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1149
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1213
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1080
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0975
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1228
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0767
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1048
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0793
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1084
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1220
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Atencion PAC
Fecha: 24/09/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SEMANA No. 4

24/09/2022 – 30/09/2022

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 4 (Consecutivo) DEL 24/09/2022 (dd-mm-aa) AL 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS — NIT 860.524.166-6

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.	Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prorroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Inicio	10/9/2022	Fecha de Inicio	10/9/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación segun	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación segun	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023


SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	60	30%	53	26%	0%	-4%	40	13	0%	-33%	1	0	0	2	34	0	3	38	40	4	60	53


OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la Interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante la semana se realizaron 13 validaciones correspondientes a los siguientes MV:
MVBF_1072, MVBF_1108, MVBF_1117, MVBF_1130, MVBF_1073, MVBF_1110, MVBF_1118, MVBF_1141, MVBF_1148, MVBF_1111, MVBF_1121, MVBF_1128 Y MVBF_1124
2. Según la programación se evidencia que a la fecha se debían haber realizado 60 validaciones, lo que indica que frente a las validaciones realizadas se presenta atraso, ya que con las 13 ejecutadas en la presente semana suma un total de 53 validaciones a la fecha.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	20	10%	0	0%	0	-10%	20	0	0	-10%	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	20	0

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la Interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras debía iniciar el día 29 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió. Por lo tanto a la fecha el Contratista de Obra no presenta avance en ejecución de las viviendas.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE BARRIOS


SEMANA No. 4 (Consecutivo) DEL 24/09/2022 (dd-mm-aa) AL 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. V94 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCION FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 36.000.000		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
1%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 36.000.000		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
1%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($) $ 36.000.000

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) -1%

OBSERVACIONES: Relacionar retrasos y comentarios sobre el estado y avance de las actividades ejecutadas, indicar si se presenta atrasos respecto a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las medidas que se tomaran para recuperar el cronograma de ejecución.

A la fecha el Contratista presenta segun el flujo de caja un avance programado de $36.000.000 lo que indica un 1% al no haber iniciado la ejecución de las viviendas no se muestra un avance en el aspecto financiero

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_701	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39188 - 22-09-2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473601, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39512 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL INFORME				
SEMANA X				
SEMANA X				

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 4 (Consecutivo) DEL 24/09/2022 (dd-mm-aa) AL 30/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009 de 2022

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Se dio aprobación de los NP presentados por el Contratista, esto con el fin de completar la base técnica y dar aval para inicio de realización de los presupuestos.

2. Se le recuerda al Contratista que para efectos del contrato en ejecución, todos los materiales a utilizar deben de estar marcados dentro su programa de calidad y cumplir cabalmente los requisitos de compra.

3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-019 la entrega de la hoja de vida del profesional SST faltante, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta interventoría.

4. Se evidencia que a la fecha el Contratista presenta atraso con el inicio de las obras ya que según la programación presentado debía de dar inicio el día 29 de Septiembre con 20 MV y al día de hoy no se ha evidenciado inicio en ninguna de las viviendas.

5. Se solicita al Contratista de obra justificar el porque no se realizo la validación de 19 viviendas las cuales se encontraban segun programación para esta primer etapa de validaciones. Los MV son: MVBF_1167, MVBF_0715, MVBF_1321, MVBF_1354, MVBF_1098, MVBF_808, MVBF_805, MVBF_801, MVBF_820, MVBF_835, MVBF_0837, MVBF_0841, MVBF_0840, MVBF_850, MVBF_853, MVBF_854, MVBF_0789, MVBF_791 Y MVBF_0758.

6. Durante el periodo se realizaron 13 caracterizaciones sociales, donde se hizo el acompañamiento por parte de los profesionales, se explicó a los beneficiarios nuevamente el proceso del mejoramiento de vivienda, las condiciones, las actividades que no se ejecutan etc. A las viviendas con cambios de cubierta de las cuales se identificaron 2 por el área técnica, se informó de la mano con el área Sst que si las tejas a desmontar son de material de zinc no hay problema en dejárselas si así lo solicitan, pero si son de asbestio debe tener un proceso de retiro especial por lo tanto es imposible dejarlas en las viviendas. También se socializo en la misma visita del punto de atención PAC y los horarios de atención.

7. Se identificaron 2 viviendas para postulación a hidrosuit de vida, están pendientes las retalerías, el MVBF_0737 no hace parte del proceso.
MVBF_1050 FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ
MVBF_1118 LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES
MVBF_1148 LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y
SEMANA 4	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA	
SEMANA 4	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	
MES	septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

Se realiza nueva revision y correcciones de la documentación de PMA, CALIDAD, SST, CALIDAD y los documentos soporte. En esta semana no hay corte de obra, se realizó visita a la bodega de materiales, evidenciando orden y disposicion de materiales, se encontraron fichas de seguridad cerca a los productos quimicos.

Se hace oficio recordando el profesional SST faltante y otras observaciones del componente SST - AMBIENTAL.

Contratista reporta la inducción de 13 personas, se recalca que el scan debe ser claro y legible.

Se realiza charla sobre divulgacion del procedimiento de cubiertas asbesto cemento, dictada al personal de interventoria. Se hace acompañamiento SISOMA en las validaciones de vivienda.

Se incluyen las 13 profesionales del contratista aprobadas, sigue pendiente el Profesional SST, al cierre del informe se reciben 30 documentos de afiliación personal de obra no se incluyen por estar en revisión de documentos.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1: REPORTE VISITAS TECNICAS
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO VALIDACIONES TECNICAS
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES

Nota: Si es requerir

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los TRES (Día en letras) 3 (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Nombre(Nombre): Arq. CESAR A FUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoria

INPLAYCO SAS

ANEXO 1

Reporte visitas técnicas

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR

ID_MV	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MVBF_1072	MARIA AURORA PERÉZ AVELLA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso, enchape de muro en cocina, mesón nuevo.
MVBF_1073	LEOPOLDO LEÓN MORALES	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, pañete parcial en baños, enchape de piso y de muro, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura en baño 1 y 2.
MVBF_1141	BLANCA FLOR TRIANA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso en alcobas, cocina, baño, hall y sala, adecuación de puntos hidráulicos y sanitarios en baño y cocina, enchape de muro en baño cocina y zona de ropas y posible mesón nuevo.
MVBF_1148	LUZ MARINA PIRAGAUTA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso, pintura, cielo raso en alcobas, instalación de enchape de piso y de muro e instalación de combo sanitario en baño 1, puertas en baños, pañete mochetas de mesón y enchape del mismo, enchape de muro en cocina, enchape de piso en comedor y alcoba niños.
MVBF_1110	FLOR TRIANA AVILA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, demolición de enchape de muro y de piso, alistado y enchape de muro y de piso en baño, cocina y zona de ropas, alistado y enchape de piso en alcobas y hall, preparación y aplicación de pintura en muros, demolición y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1118	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTÉS	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividad de cubierta, baño y cocina completos.
MVBF_1128	ISMELDA PEREZ GARCIA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, alistado y enchape de piso, demolición mesón de cocina, enchape de muro y mesón nuevo en cocina, muro en drywall para aislar la humedad en alcoba de adulto mayor, preparación de muros para nueva aplicación de pintura, enchape de muro en zona de ropas y pintura.
MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y griferia, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_1117	RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMORA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta parcial en alcobas, pañete, pintura, alistado y enchape de piso en alcobas, baño y cocina y enchape de muro en baño y cocina, instalación combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1111	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso en todo el apartamento, enchape de piso en baño 1, cambio de combo sanitario en baño 1 y 2, pintura, cielo raso y posible estuco.
MVBF_1124	HECTOR HERNANDO VELOSA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de alistado y enchape de piso, enchape de muro en zona de ropas y baño segundo piso, demolición enchape de piso e instalación de enchape nuevo en baño 1 y 2 y cambio de combo sanitario en baño 1.

ANEXO 2


Registro fotográfico validaciones técnicas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1072 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño

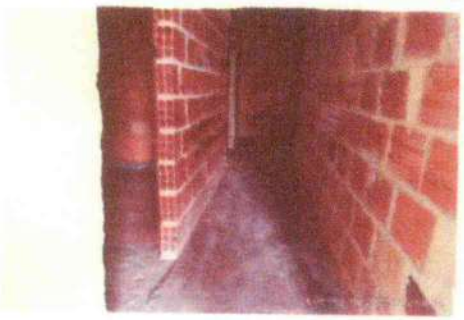

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1073 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall




miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1141 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

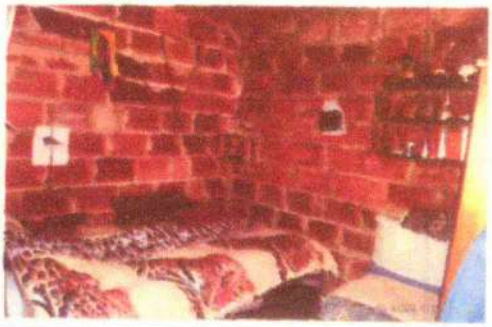

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1148 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual habitacion niños



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1110 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1118 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1128 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1117 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba

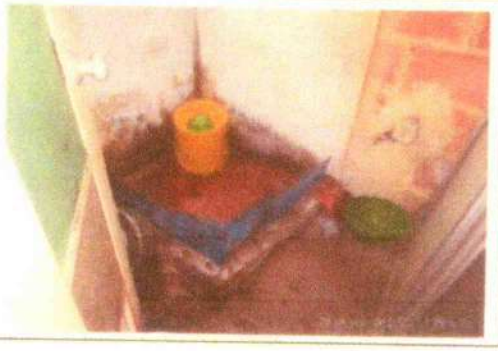

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1111 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

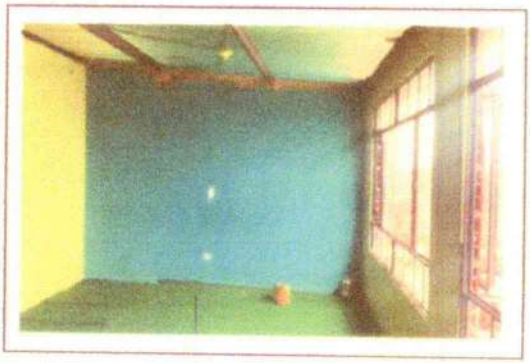

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1124 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1130 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1121 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba




lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de baño 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1108 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina

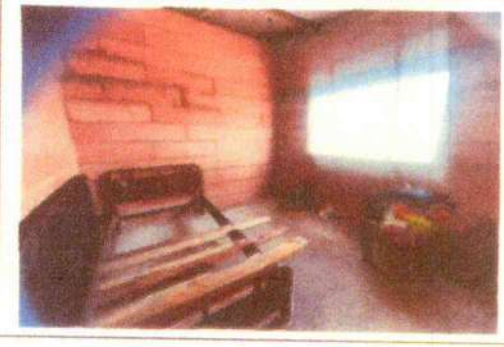


lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2

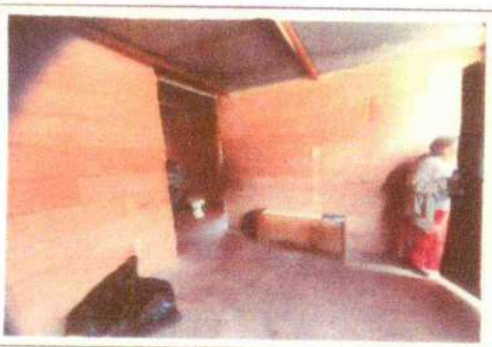

lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual comedor

ANEXO 3

Registro fotográfico caracterizaciones sociales

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES



Actividad: Caracterización social
MVBF_1121
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1108
Fecha: 26/0/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF-1130
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1117
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1110
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1128
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF-1118
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_11124
Fecha: 26/09/2022




Actividad: Caracterización social
MVBF_1073
Fecha: 28/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1048
Fecha: 28/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1111
Fecha: 28/09/2022

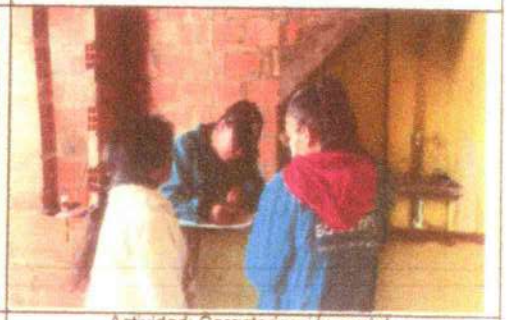

Actividad: Caracterización social
MVBF_1072
Fecha: 28/09/2022

			
Actividad: Caracterización social MVBF_1141 Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 26/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 1/10/2022

ANEXO 3
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

136

INPLAYCO

Bogotá D.C., septiembre 30 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 023
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HÁBITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE 2 EXPEDIENTES REMPLAZOS

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito enviar dos expedientes entregados por la SDHT como remplazo de las dos renuncias presentadas a la fecha.

ID_DMV	NOMBRE	CEDULA	CHIP	FOLIOS
MVBF_0482	MARIA DAISSY BEJARANO	39795637	AAA0147EADM	24
MVBF_495	MARIA FABIOLA GUEVARA I.	25403021	AAA0195DJKC	25

Adjunto expedientes escaneados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.300.962 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
C.C. ARQ. CAROLINA POSADA APOYO A LA SUPERVICION SDHT

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

131

Copia

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 022
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores:
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN

Cordial saludo

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoria al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y tomando de referencia la programación presentada con el oficio **INP-SDHT-1009- 2022- 013**, se solicita aclarar porque no se ha cumplido a cabalidad, toda vez que fueron validados mejoramientos que no correspondian al periodo, semana mes de trabajo.

En este sentido es necesario ajustar la programación., incluyendo estas viviendas y se solicita informar el motivo del por qué se realizaron estas validaciones sin estar en la programación presentadas a la fecha, esto para evitar posteriores reclamaciones por demora en el inicio de ejecución.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
C.C SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCION DE BARRIOS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

COPIA

138

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 021

Señores:
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Cordial saludo

Con gran preocupación la interventoria detecta que no se han realizado las correcciones y solicitudes requeridas a través de los oficios **INP-SDHT-1009-2022-016, INP-SDHT-1009-2022-017, INP-SDHT-1009-2022-018 INP- SDHT-1009- 2022- 019,** ni las que se mencionan en los comités de obra, es así como aún están pendiente lo siguiente:

- Chaquetas del personal administrativo de acuerdo al manual de marca del distrito.
- Instalación de Equipo de emergencia del Punto PAC (Botiquín, camilla, Medevac, etc.).
- Por ser el PAC, un requerimiento del proyecto y con el fin de evitar pasivos, se solicita allegar el soporte de paz y salvo del pago del canon del mes vencido.
- Complementar la documentación requerida planes, SST, Ambiental, Calidad.
- Se recuerda que falta un profesional SST y el único avalado es quien puede participar en los comités de obra.
- Afiliaciones previas al ingreso del personal de obra, maestros, oficiales, ayudantes etc., con las inducciones, notificación de riesgos y entrega de EPP.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
C.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DIAZA
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

COPIA

139

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA NR. 2-2022-57750 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega de las subsanaciones y de las hojas de vida entregadas y la nueva hoja de vida del personal que no cumple.

A continuación, indico las subsanaciones del personal que no presenta remplazos:

RESIDENTES TECNICOS		
CARGO	**NOMBRE**	**SUBSANACIÓN**
RESIDENTE DE INT 3	LUISA FERNADA PINZON	• Se anexa certificación dando cumplimiento a los 3 años solicitados en la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones del contrato de la referencia • Se anexa la carta de compromisos firmada por el profesional de acuerdo a lo solicitado en los documentos previos del proceso.

A continuación, indico los rempiazos del profesional que presenta cambio:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	OBSERVACION
RESIDENTES TECNICOS			
RESIDENTE DE INT 1	MARTHA PATRICIA NEIRA RUEDAS	INGENIERA CIVIL	Debido a que se realizó la entrega de la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ remplazando la hoja de vida del Ing. Para el FERNANDO CAMPOS y al no cumplir con los requisitos solicitados esta Interventoria procede al cambio del profesional presentando la hoja de vida de la Ing. MARTHA PATRICIA NEIRA RUEDAS dando cumplimiento a lo solicitado en el pliego de condiciones

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Es de aclara que lo anteriormente subsanado es basado en las observaciones presentadas en el documento NR. 2-2022-57750 entregado por la SDHT y que indica lo siguiente:

- ✓ Se aporte la CARTA DE COMPROMISO en la cual se indique el porcentaje de dedicación de conformidad con lo requerido por la entidad para la ejecución del contrato, debidamente firmada por el profesional. (formato de compromiso), según lo estipulado en los estudios y documentos previos para el proceso de concurso de méritos *"DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE GANADOR CON RELACIÓN AL EQUIPO CLAVE Y EVALUABLE (HABILITANTE)"*
- ✓ Según lo estipulado en los estudios y documentos previos para el proceso de concurso de méritos *"Se deberá demostrar que todos los perfiles tienen un año (1) de experiencia relacionada (especifica) adicional a la definida en el presente proceso "personal clave". Es decir, si el requisito mínimo de experiencia relacionada (específica) es de 2 años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años"*

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO SAS

141

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 019

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: INFORME SEMANA 3 DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE.

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal No. 3 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

142

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 26 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 019

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: SOLICITUD PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO N.° 2.

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que a la fecha no se ha recibido la hoja de vida del PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO faltante dentro de las condiciones contractuales PERSONAL CLAVE - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA CADA GRUPO.

Hasta la fecha solo se ha recibido la hoja de vida de la profesional VANESSA LOPEZ PAYARES.

Dos (2) (Por cada grupo)	Profesionales de Calidad y SISO	100% (En terreno)	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad	Mínimo cuatro (4) años de experiencia Profesional, contados a partir de la terminación de materias o de la tarjeta profesional. (por cada profesional) (según aplique)	Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia específica como profesional de calidad y SISO. Dentro de las certificaciones aportadas deberá acreditar por lo menos un contrato como profesional de calidad y SISO a proyectos de uso residencial y en sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial estimado para cada grupo.

Se solicita de manera urgente la entrega de la documentación.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CC. ARQ. CAROLINA POSADA APOYO A LA SUPERVICION SDHT

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

143

INPLAYCO S.A.S
NIT No. 860.524168-8

Bogotá D.C., septiembre 23 de 2022

INP- CVP-001- 2021- 018

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 – 2022.

ASUNTO: HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA OBRA BUILDING SAS.

RESPETADOS SEÑORES

Por medio de la presente, enviamos oficio con el aval a las hojas de vida del personal contratista de obra **BUILDING SAS.**, una vez revisadas por esta interventoria, en cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Queremos mencionar que en esta relación del personal mínimo requerido hace falta la aprobación de la segunda profesional SST lo cual ya se solicito subsanar al contratista.

Por lo anterior anexamos formato de VERIFICACION HOJA DE VIDA CONTRATOS, de la firma BUILDING SAS., con sus respectivos anexos.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos CD
folios: (1)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167
Email inplayco@yahoo.com.mx

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

Versión: 03

14 de Septiembre de 2022

CONTRATO No.	994 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	Arq. Carolina Posada

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional ó Documento Requerido No.	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formacion Educativa	Experiencia Laboral (Segun condiciones y terminos)		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la HV)				
			General	Especifica		General	Especifica			
RICARDO JAIMES RUIZ	Director de obra	Arquitecto o ingeniero con titulo de posgrado (especialización, maestria o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	3 años	25700 -07044	SI	N/A
DIANA RIOS	Residente de obra No. 1	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 Años	2 años, 2 meses	A1202018-1032475285	SI	N/A
LUIS FELIPE CAÑON	Residente de obra No. 2	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil y Arquitecto	3 años, 8 meses	3 años	Ingeniero Civil 25202-347863	SI	N/A
YEIMI [illegible]CIO MART[illegible]JSSA	Residente de obra No. 3	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	5 años, 11 meses	2 años y 2 meses	A22202016-53046266	SI	N/A
NEXY MILENA ROJAS SANCHEZ	Residente de obra No. 4	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 años, 10 meses	2 años	A22682017-1110470031	SI	N/A
ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA	Coordinador(a) Social	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	4 años	1 Cto. como Coordinador Social	Trabajador Social	9 años, 3 meses	CUMPLE	220221023-I	SI	N/A
JESSICA FARFAN	Profesional Social No. 1	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE	1019064723	SI	N/A
YENY SANGUINO	Profesional Social No. 2	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Psicologa	3 años, 9 meses	CUMPLE	188831	SI	N/A
TATIANA RODRIGUEZ	Profesional Social No. 3	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 4 meses	CUMPLE	1032452156	SI	N/A
DARY YASMINA BOLIVAR GOMEZ	Profesional Social No. 4	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	12 años, 4 meses	CUMPLE	52806714	SI	N/A
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
VANESSA LOPEZ VILLARES	Profesionales de Calidad y SISO	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad.	4 años	2 años	Profesional en salud ocupacional	4 años, 10 meses	3 años, 4 meses		SI	N/A

[illegible] EXANO HOYOS

Nombre del Supervisor / Interventor

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

145

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-017
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Recibi
22-0922

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO N°4 HABITAT 994-2022 CON ASUNTO ENTREGA DE PLANES SST, CALIDAD Y AMBIENTE

En respuesta al oficio de la referencia se entregan las siguientes observaciones indicando además que estos documentos y lo plasmado en ellos es verificable en el proyecto, por eso deben ser ajustados al tiempo, lugar y actividades del mismo, cumpliendo los parámetros legales y contractuales aplicables.

PLAN DE CALIDAD

Dentro del plan de calidad se debe tener entregar como soporte y referencia de los productos las fichas técnicas y las fichas de calidad de los materiales a utilizar, no se pueden tener fichas de materiales que no sean los utilizados en obra.

El documento tiene observaciones de forma que hacen ver un documento desordenado, empezando por la tabla de contenido.

Se debe Incluir:

REQUISITOS ESPECÍFICOS Los requisitos para asegurar la calidad durante la ejecución de cada una de las etapas del proyecto son:

- Entregables de ingeniería.
- Normas y especificaciones

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

- Especificaciones técnicas del contrato
- Identificación de los datos, normas, estándares y requerimientos técnicos.
- Incluir requisitos que apliquen.

Requisitos para las Compras

Para el proyecto las principales actividades de aseguramiento de calidad se deben hacer durante el proceso de gestión de compras, entre otras son las siguientes:

- Requisitos para productos y servicios
- Asegurar que los materiales/equipos adquiridos para el proyecto cumplan con los requerimientos de calidad.
- Especificaciones para compras de equipos y materiales del proyecto.
- Incluir el tema de las licencias ambientales y certificado minero requeridas para los materiales pétreos.
- Certificados de madera ya que la tiene incluida dentro de los materiales.
- Requerimientos de calidad para las compras en el proyecto.

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

Falta incluir actividades, Y

- Revisar los controles que sean aplicables a los aspectos e impactos identificados, revisar la escritura y ortografía.
- Aclarar cuales son los vertimientos de la planta y el manejo de la caja de inspección
- Entregar los programas establecidos en los controles, programa de ahorro de agua, programa de ahorro y uso de energía, programa integral de residuos sólidos.
- Indicar como se realizará la caracterización vertimientos.
- Aclarar el uso de bicicletas en el sector, tener presente el orden público y la posibilidad de robos, si persiste la opción incluir esto en matriz de peligros.

MATRIZ DE RIESGOS

Se debe verificar toda la matriz, las actividades y las tareas no son coherentes, algunos controles deben comprobar si son aplicables dentro del tiempo de ejecución del contrato, se menciona legislación derogada, actividades eléctricas que no se realizan en los mejoramientos, los colores en riesgo medio y bajo están cambiados.

- Medición y corte de cable.
- Medición y corte de cable eléctrico (Normal y regulada)
- Montaje de cable en cablofilm y ducto porta cable
- Organización de acometidas
- Instalación de tubería EMT.
- cableado de tubería
- ubicación de breakers.
- conexión de circuitos (cable)
- Conexión de circuitos (cable trenzado), circuitos normales o regulados a los breakers
- cableado y conexión de acometida (fases, tierra, neutro)
- Marquillado de circuitos
- Verificación de amperaje

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

MATRIZ LEGAL

Se debe actualizar, incluir legislación vigente y actualizada en SST, ambiental.
Tiene incluidas normas aplicables sólo en departamentos de Antioquia,

Aterrizar al proyecto, incluir el nombre del representante legal que es quien aprueba de acuerdo al formato

MATRIZ DE EPP

Se recuerda que los EPP aquí consignados son exigibles en obra, incluir los EPP para el manejo de Respel, y asbesto cemento, si algún trabajador debe tener contacto con las tejas retiradas.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones deben estar de acuerdo a los resultados de la matriz de riesgo y los controles, faltan las firmas del gerente general de acuerdo al formato entregado de su parte.

RELACION PERSONAL BUILDING

El archivo entregado no incluye personal el contenido es la matriz de capacitación

MATRIZ DE EXAMANES MEDICOS

De acuerdo al documento algunos exámenes entregados no cumplen con los exámenes exigidos en su matriz, verificar y actualizar, tener en cuenta los cargos.

PLAN ANUAL 2022

Verificar el contenido y ajustar con actividades que se alcancen a cumplir en el plazo del contrato, hay actividad programada para enero y marzo 2023. El contrato termina a finales de diciembre.
En enero 2023 está contemplada la liquidación del contrato.

MANUAL SG- SST

El manual entregado es un documento convertido de PDF a Word, razón por la cual, al igual que el plan de calidad, tiene observaciones de forma que hacen ver un documento desordenado, empezando por la tabla de contenido.

Adicional a lo anterior esta desactualizado en legislación ya que está sólo hasta el año 2018 y del 2019 contempla solamente la resolución 0312.

Tiene conceptos y actividades que ya no se realizan por ejemplo radicar el COPASST al ministerio.

Dentro de las actividades no contempla los riesgos de caídas, manejo de químicos, materiales peligrosos - RESPEL, no tiene instructivos para uso de herramientas manuales, pulidora, por ejemplo, se debe aclarar el manejo del COPASST O VIGIA según corresponda en la obra, así como las actividades del comité de convivencia, se considera que es necesario ajustar de tal modo que lo plasmado en el documento pueda ser verificado en la obra.

148

INPLAYCO

Bogotá D. C., septiembre 21 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-016
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
Bucaramanga - oficina 303

Recibí:
22-09-22

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 994-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: **SOLICITUDES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA**

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoria al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales y teniendo en cuenta que se culminaron las validaciones e inicia el proceso de ejecución de las obras por cada vivienda validada, se recuerda que antes iniciar deben tener los siguientes requerimientos cumplidos:

- Entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal de obra que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, adicional a esto el personal debe contar con los EPP, mínimo guantes, gafas, casco, botas con puntera contra impacto y la dotación que incluye pantalón y chaqueta siguiendo las especificaciones del manual de identidad del distrito, sobra decir que todos estos elementos deben ser nuevos
- El personal que va a realizar trabajo en cubiertas debe incluir la certificación de trabajo seguro en altura cumpliendo la legislación vigente, así como el coordinador de alturas que va a hacer seguimiento a la actividad
- Listado general del personal que va a ingresar maestros, oficiales ayudantes
- Dirección del sitio de almacenamiento temporal de materiales los cuales deben tener áreas designadas de acuerdo a los residuos o materiales a manejar, estos deben tener medidas de seguridad industrial como botiquin camilla, señalización y servicios públicos.(ACOPIO)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO

- Certificados de seguridad social de las personas que van a manejar vehiculos para la distribución de materiales en cada MV.
- Documentos del vehiculo donde se realiza la distribución de materiales. SOAT, revisión tecno mecánica, etc. incluido el pase del conductor; de igual manera la documentación de la volqueta con el PIN que tenga asignado por SDA.
- Si se da el caso de manipulación de tejas asbesto cemento por parte del personal contratado y no por empresa externa, estos deben cumplir con las dotaciones especificas, como el uso de trajes de protección desechables, los cuales deben cubrir totalmente la ropa de trabajo del operario, evitando que ésta se contamine. Los trajes desechables de protección deben contar con capucha, ser impermeables a particulas sólidas y estar confeccionados en un material ligero y flexible que impida en lo posible la adherencia de fibras. El diseño de mangas, capuchas y perneras debe permitir el ajuste de guantes, máscaras y botas. No debe llevar bolsillos, y las costuras deben estar selladas por la parte interna. Adicionalmente se sugiere que los trajes sean de material respirable con el fin de reducir la sensación de calor., Para la selección y utilización de los elementos de protección personal respiratoria, se debe cumplir los requisitos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia o quien haga sus veces, y/o requisitos de la norma OSHA 29CFR 1910.134, y/o Guias internacionales, se debe utilizar como protección respiratoria la MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE TIPO FFP3 O MASCARILLA CON FILTROS TIPO P3.
- Certificados mineros para materiales pétreos
- Si se va a utilizar madera como lo tienen establecido en los materiales a usar en el plan de calidad deben entregar certificados ambientales de su adquisición.
- Licencias ambientales de los sitios donde se realizará la disposición final RCD
- Licencias ambientales de los sitios donde se realizará la disposición final materiales peligrosos RESPEL
- Licencia ambiental del sitio de disposición final de las tejas asbesto cemento.

Todo lo anterior para dar cumplimiento a la legislación vigente sobre los temas SST, Ambiental

Esta interventoria no permitirá la ejecución de las obras sin antes tener la siguiente información.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

C.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUBDIRECCION DE BARRIOS
CRA 13 No 13-64

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

15D

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 015

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA EXPEDIENTES RENUNCIAS MVBF_1100 Y MVBF_0801

Cordial saludo,

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito entregar 2 expedientes de renuncias radicadas en la secretaria distrital de hábitat.

MVBF_1100 – OLGA LUCIA LOZANO – radicado N.° 1-2022-39168
MVBF_0801 – AMPARO TIQUE ROMERO - radicado N.° 1-2022-38912

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Se anexa 2 expedientes

Carolina Posada P
Recibi 22 de septiembre

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

151

INPLAYCO

electrónicos y números de contacto tanto del contratista de obra como el de interventoria y profesionales a cargo. Subrayado fuera de texto.

Se les recuerda que debe tener en cuenta que los dias de atención deberán tener por lo menos dos profesionales para la atención de requerimientos PQR e información.

Uniformes y dotación

La firma contratista, deberá contar con uniformes (overoles para el personal de mano de obra y chaquetas para el personal profesional) con el logo de la Empresa y los requeridos por el área de comunicaciones de la SDHT, además deberá contar con todos los elementos de protección personal para el personal idóneo para la prestación del servicio.

Se solicita que el personal del contrato en mención debe tener el uniforme y carnet que los identifiquen como técnicos del contrato.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

152

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 013

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: AVAL DE PROGRAMACION DE OBRA CONTRATO No 994-2022.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que se aval la programación recibida el 9 de septiembre con los ajustes solicitados respecto al flujo de inversión.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.
CD. (01)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

153

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 20 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 012

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA N° 2-2022-56495 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hace entrega de las subsanaciones de las hojas de vida entregadas por esta Interventoria solicitadas en el oficio de referencia n° 2-2022-56495

A continuación, indico las subsanaciones de cada profesional:

RESIDENTES SOCIALES		
CARGO	**NOMBRE**	**SUBSANACIÓN**
PROFESIONAL SOCIAL 1	JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ	• Se realiza la corrección de la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Con respecto a la terminación del contrato n° 701de 2020 • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 797. • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 928.
PROFESIONAL SOCIAL 2	ANGIE QUINTERO PLATA	• Se envia el certificado de vigencia el cual remplaza la tarjeta profesional (numeral 7) con aprobación desde el 31 de agosto de 2012 con numero de resolución 0321 • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 797. • Se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 928.
PROFESIONAL CALIDAD SISO		
SISO N° 2	VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ	• Se anexa la resolución de la profesional de con fecha de 29 de julio de 2018 y diploma como profesional en salud ocupacional con fecha de diciembre 9 de 2017; con los anteriores documentos se evidencia que la profesional a la fecha cuenta con (4.5) cuatro puntos cinco años de experiencia profesional cumpliendo con los (2) dos años que solicitan el pliego de condiciones

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

154

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

A continuación, indico los remplazos de cada profesional:

- Para el residente social 4 DIANA MARCELA MORA OME este se remplazará por la hoja de vida del Arq. KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO del cual adjunto la documentación correspondiente (6 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

155

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 928- 2021,** suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 3 -2021.

FECHA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE MAYO DE 2022
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$6 15.594.670
DEDICACIÓN:	100%

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social, para las obras de mejoramiento de 175 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar - Engativá. Las actividades realizadas fueron, actas de vecindad, socialización del proyecto, seguimiento en temas relacionados a Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR), actas de verificación en viviendas, seguimiento de metodología historias de vida beneficiarios, atención a la comunidad en punto de atención al ciudadano, acompañamiento en componente técnico en visitas de obra, entre otros.

Expedida en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2022, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

156

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 797- 2021,** suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2022
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$6 15.594.670
DEDICACIÓN:	100%

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social, para las obras de mejoramiento de 322 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar - Engativá. Las actividades realizadas fueron, actas de vecindad, socialización del proyecto, seguimiento en temas relacionados a Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR), actas de verificación en viviendas, seguimiento de metodología historias de vida beneficiarios, atención a la comunidad en punto de atención al ciudadano, acompañamiento en componente técnico en visitas de obra, entre otros.

Expedida en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2022, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860 524168-8

157

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 701- 2020,** suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (GRUPO 1)
FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DE 2021
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 894.285.952,00
DEDICACIÓN:	100%
CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social del grupo 1 contrato 694 para las obras de mejoramiento de 249 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme y Suba. Las actividades ejecutadas desde el componente social fueron Acompañar, inspeccionar y aprobar las siguientes actividades:

Validaciones, Caracterizaciones sociales, Socialización de presupuesto, Apertura de obra, Seguimientos a la ejecución, Finalización de obra-entrega del mejoramiento de vivienda, Atención a PQRS, Atención en PAC, Entrega de informes semanales a la coordinación social

Expedida en Bogotá D.C., a los cinco (20) días del mes de a de 2021, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

Angie Quintero

158

Consejo Nacional de Trabajo Social

Ley 53 de 1977 Decreto No. 2833 de 1981

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
HACE CONSTAR QUE:

1. **ANGIE JACQUELINE QUINTERO PLATA**, con cédula No. 1018438195 de Bogotá, D.C. (Bogotá, D.C.), el 22 de Agosto de 2012 solicitó su inscripción ante este Consejo.

2. Después de verificar la documentación recibida, se constató que cursó la carrera de Trabajo Social en la **FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE**, la cual le otorgó el título correspondiente.

3. Al cumplir con lo ordenado por el artículo 4 del Decreto 2833 de 1981, con respecto a la documentación presentada, fue aprobada la inscripción por medio de la Resolución 0321 del 31 de Agosto de 2012, en la que también se incluyeron otros trabajadores sociales.

4. Cumpliendo con el mandato del artículo 22 de la Ley 962 de 2005 (julio 8), acerca del *Número Único de Identificación Personal* (NUIP), el número de la inscripción es el mismo de la cédula de ciudadanía: 1018438195.

5. Para verificación y control se le asignó un código interno: 205381013-I, utilizado exclusivamente para uso del Consejo.

6. Por tanto, ya inscrita ante el Consejo, esta persona podrá ejercer legalmente la profesión de Trabajo Social en Colombia, según lo estipulado en el artículo sexto de la Ley 53 de 1977.

7. Como los artículos 18 y 19 del decreto 2106 (22 de noviembre de 2019) suprimen tarjetas, matrículas y registros profesionales, esta certificación reemplaza el *registro profesional* que se venía utilizando en Trabajo Social.

8. De acuerdo con la Resolución 0014 (abril 24 de 1991) que autoriza a la presidencia del Consejo la aprobación de la inscripción, se expidió este documento, en Bogotá, D.C., el 22 de Agosto de 2012.

9. Que este certificado tiene vigencia por seis (6) meses a partir del 19 de Julio de 2022, dado en Bogotá D.C.

Elaborado por EjerzoLegalmente
Valide éste documento ingresando el código 165dK1hzLP en el siguiente enlace.
https://ejerzo.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/public/documentmanagement/validate

Dirección Ejecutiva: Calle 78 # 12A 15 Barrio, Espartillal, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C., Colombia
Correo: correogeneral@consejonacionaldetrabajosocial.org.co
Whatsapp: 320 304 89 33 - 320 304 80 20 - 317 264 16 81

159

República de Colombia
ADMINISTRACION TEMPORAL SECTOR SALUD
Departamento de La Guajira

16

RESOLUCIÓN No

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" A PERSONA NATURAL

LA ADMINISTRADORA TEMPORAL SECTOR SALUD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, en uso de sus atribuciones legales y en general de las que le confiere la en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto-ley 128 de 2008 y los Decretos reglamentarios, el documento Conpes 3883 de 2017, Decreto 1068 de 2015 y Resolución No. de 2017 del Ministerio de Salud y Tiempo Parcial la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 y la Resolución 4502 de 28 de diciembre de 2012

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el Art. 1° de la Resolución No. 4502 de 2012, le corresponde a las Direcciones Seccionales y Locales de Salud la función de expedir y renovar las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicios en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en dicha Resolución.

Que **VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **1.121.328.200 Expedida en Villanueva** ha solicitado licencia para la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a su nivel y título de formación en salud ocupacional seguri. Acta de grado: **8** y Registro No **C84314**. Folio No. **836** Libro No. **17** de fecha 08/12/2017 anexando con su petición la documentación exigida en la Resolución 4502 de Diciembre 28 de 2012.

Que de acuerdo a lo normado en el Art. 6° de la Resolución 4502 de Diciembre 28 de 2012 la mencionada las licencias tendrán vigencia de 10 años y podrán ser renovadas por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos y procedimientos señalados en la normatividad vigente al momento de expedir o renovar la licencia.

Que la Administración temporal del Sector Salud del Departamento de la Guajira de acuerdo a las disposiciones legales remitió los documentos allegados por el Ciudadano **VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° **1.121.328.200 Expedida en Villanueva**, para su estudio por parte de la Oficina de Jurídica y la Oficina de Desarrollo Institucional.

Que con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal efectuado por esta institución, se ha considerado procedente otorgar la respectiva licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo.

Que en mérito de lo antes expuesto, este despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo al ciudadano **VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.121.328.200 Expedida en Villanueva** de acuerdo con su nivel y título de formación, como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL** está en capacidad de prestar los servicios dentro del siguiente campo de acción: Higiene Industrial Seguridad Industrial, Investigación de Accidente de Trabajo Enfermedad, Capacitación Diseño, Administración y Ejecución de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y podrá ser renovada por un término igual.

ARTICULO TERCERO: Esta Licencia es valida en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO CUARTO: La autoridad sanitaria aplicará las sanciones correspondientes, en especial las estipuladas en la Ley 09 del 24 de Enero de 1979, cuando se sorprenda a la persona natural o jurídica haciendo uso indebido de la Licencia para la Prestación de los Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo expedida por la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: Toda solicitud para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo que el titular de esta Licencia presente a instituciones públicas o privadas, deberá estar acompañada de copia de la presente, que acredite el otorgamiento de su respectiva licencia.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de Reposición ante el Administrador Temporal Sector Salud del Departamento de La Guajira y de su Subsidio el de Apelación en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley y como lo prescribe el Art. 12° de la Resolución 4502 de 2012.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Nuestra Capital de Distrito Especial de la Guajira, a

LUZ MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA ACOSTA
Administradora Temporal Sector Salud del Departamento de La Guajira

Proyectó: Adriana M. Iguarán Arias - Técnico de Apoyo a la Gestión
Revisó: Dunia Pitre Guzmán - Directora Técnica Desarrollo Institucional
Aprobó: Jesús Suárez Arregoces - Jefe Oficina Administrativa Temporal Sector Salud de la Guajira

Universidad del Tolima

OTORGA EL TITULO DE

Profesional en Salud Ocupacional

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

A

Valeria Milàreà Orcasita Gonzàlez

Quien cumplio satisfactoriamente los requisitos academicos exigidos.
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

Diciembre 8 de 2017

Universidad del Tolima
Libro de registro No. 13
Folio No. 326
Diploma No. 6111

160

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57297562

BRITO BOLAÑO

APELLIDOS

KARELLYS TATIANA

NOMBRES

Karellys Brito B.

FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1983
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-ENE-2002 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



P-<COLOMBIA<BRITO<BOLANO<<KARELLYS<TATIANA 2002021M

0147803045F 01 1241011834

162

GOBERNACION DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
DESARROLLO DE SERVICIOS

RESOLUCIÓN No. 47 6293
"Por la cual se registra un titulo"
EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL
En cumplimiento del Decreto 1875 de Agosto 3 de 1994, según facultad otorgado por el Decreto 3134 de 1956 y

CONSIDERANDO:

Que el (la) Señor (a) **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO**, identificado (a) con CC N° 57.297.562 Expedida en Santa Marta - Magdalena solicito ante esta Secretaria a **AUTORIZACIÓN** del ejercicio de su profesión según titulo de profesional en **PSICOLOGIA** otorgado por **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, de Santa Marta según Acta de Grado N° 0004 del día 28 de Abril del 2007 y Registrado en el Libro 20, Folio 46 del año 2007.

Que estudiada la Documentación presentada por el (la) solicitante esta cumple con los Requisitos establecidos en las Normas Legales vigentes.
Que en virtud de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO** identificado (a) con CC N° 57.297.562 Expedida en Santa Marta - Magdalena para ejercer la profesión de **PSICOLOGA** en el Territorio Nacional e Inscribirlo para laborar en el Departamento.

ARTICULO SEGUNDO: para poder ejercer la profesión en Zona Geográfica diferente a donde se Autoriza el Titulo o Certificado la persona deberá inscribir su nombre en la Secretaria de Salud del Departamento donde va a laborar con el fin de ejercer el control y vigilancia que corresponde.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H. en fecha 12 MAR 2008

CARLOS RETAMOSO INSIGNARES
Secretario de Salud Del Magdalena

JUAN SIERRA AVENDAÑO
Coordinador Área Desarrollo de Servicio

Proyectado por: Angélica Restrepo Garceranth.



164

República de Colombia.
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Magdalena

Confiere el título de

Psicóloga

A

Karellys Taliana Brito Bolaño

C.C. N° 57.297.362 de Santa Marta

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

D I P L O M A

Dado en Santa Marta, a los 28 días del mes Abril de 2007

El Rector de la Universidad

Secretario General

Registrado en el folio 96 del libro de diplomas No 2 de la Universidad del Magdalena

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ACTA DE GRADO N° 0004

En Santa Marta D.T.C.H., siendo las 10:00 AM del día 28 del mes de Abril de 2007, se realizó la graduación colectiva en ceremonia privada, presidida por el **CONSEJO ACADEMICO** de la Universidad del Magdalena, otorgando al estudiante:

KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO
C.C. N° 57.297.562 de Santa Marta

El título Profesional como **PSICOLOGA**, por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** para tal efecto.

Se tomó juramento de rigor a **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO**, y se hizo entrega del diploma que lo acredita como **PSICOLOGA**.

ALVARO ESPELETA MAYA
Rector (E)

WILLIAM RENAN RODRIGUEZ
Secretario General (E)

166

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO MASTER-HM
NIT 901029642-3

CERTIFICA

Que KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO identificada con cedula de ciudadanía 57297562, laboró en esta empresa desde el 20 de abril de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, desempeñándose en el cargo de RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA con contrato individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada, en el siguiente proyecto:

> Contrato No. 1007-2015 suscrito con FONDECUN: cuyo objeto consistió en realizar la **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL A MEJORAMIENTO DE CONDICIONMES DE HABITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, MUNIICPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**. Valor $514.203.661

La presente se expide a solicitud de la interesada, en la ciudad de Barranquilla, a los treinta (30) dias del mes de marzo de 2016.

Atentamente,

JAIME LUIS AMIN MARTELO
Representante Legal

Carrera 57 # 99 A – 65 Ofc 110
Edif. Torres del Atlántico
Barranquilla Colombia

Tel: (5) 4212588
Cel: 3146759718
Correo: talento.humano@master.net.co

Building / INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 860.524.166-8

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A	Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A	Plazo Prorroga 1	N.A
Plazo Prórroga 2	N.A	Plazo Prórroga 2	N.A
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A	Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A	Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las ultimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACION ACUMULATIVO
Programado VS. Ejecutado



VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado VS. Ejecutado



COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado VS. Ejecutado



	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	30	8%	0	0%	8%	8%	30	0	0	8%	1	0	0	2	30	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Segun la programación presentada por el Contratista de Obra el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debia iniciar el dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado.
3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado:
MVBF_022, MVBF_027, MVBF_048, MVBF_047, MVBF_064, MVBF_068, MVBF_006, MVBF_071, MVBF_085, MVBF_087, MVBF_089, MVBF_094, MVBF_096, MVBF_1001, MVBF_1015, MVBF_1046, MVBF_1062, MVBF_106, MVBF_1088, MVBF_107, MVBF_1072, MVBF_1078, MVBF_1080, MVBF_1085, MVBF_1094, MVBF_1100, MVBF_1108, MVBF_1117, MVBF_114

2.2 AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las ultimas cuatro (4) semanas))





	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	1	0	0	2	0	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Segun la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el dia 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no indica ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

Building ...	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORIA PROCESO EJECUCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCION DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($) $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) 0%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el mes(s) y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta adelanto o atraso con la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para...)

Durante la semana el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de validaciones ni de ejecución de obras por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO ANTERIOR	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIERIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39158
SEMANA X	MVBF_1100	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CEROUERA IDENTIFICADA CON C.C. 28473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39912
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO ANTERIOR				
SEMANA X				
SEMANA X				

Building SAS	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta interventoría se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, en el cual se evidencio que según la programación presentada por el Contratista Building SAS esta presenta atraso ya que a la fecha no se ha dado inicio a las labores contempladas, por tal motivo se realizo la solicitud de arranque de obra y observaciones de posibles incumplimientos mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-006.
2. Pasados 16 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de Septiembre de 2022 se debió iniciar con 30 validaciones y a la fecha no ha iniciado.
3. Luego de las revisión de las hojas de vide presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-006 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta Interventoría.
4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, al mismo tiempo se radicaron mediante oficios No. INP -SDHT-1009-2022-007, PGS Building sas, radicado 1-2022-39024 y No. INP -SDHT-1009-2022-008 plan de acompañamiento de gestión social Inplayco sas radicado 1-2022-39023.
5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoría, en donde se realizo a presentación de los profesionales por parte de los contratistas Building SAS e Inplayco SAS, con respecto al balance de fiducia la Interventoría informa que se recibieron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el balance de validaciones y ejecución de obras la Interventoría manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 2	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA		
SEMANA 2	0 M3			
MES	septiembre			
SECTOR	BF			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3	

Contratista Building entrega PMA el día viernes 9 de septiembre , se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continúan la falencia en la entrega de formatos y soportes adicionales.
Participación en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se aclara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por este motivo aun no aparecen activos, solo se dejan 3 sociales que tenían documentos completos para esta semana.
Se realiza charla de inducción al personal de interventoría, se tratan diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato.
Se incluye solo 3 personas del contratista por ser las que están aprobadas y afiliaciones debidamente presentadas.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

Nota: Si es requiere

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente en Bogotá, D.C., a los DIECINUEVE (Día en letras) 19 (Día en numeros) días del mes del SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Nombre(Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S. 170

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 010

COPIA

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA 1** DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL12 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal número 1 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

	FORMATO
Building SAS / INPLAYCO SAS	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 860.524.188-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACION ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

VALIDACION PROGRAMADO ..... VALIDACION REALIZADA

AVANCE SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

VALIDACION PROGRAMADO ..... VALIDACION REALIZADA

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

VALIDACION PROGRAMADO ..... VALIDACION REALIZADA

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES (Realizar analisis y comentarios sobre el retraso y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio

2.2 AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE APERTURAS ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

APERTURAS PROGRAMADAS ..... APERTURAS REALIZADAS REALIZADA ..... CIERRES GENERALES

VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

APERTURAS PROGRAMADAS / APERTURAS REALIZADAS / CIERRES GENERALES

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

[redacted]

APERTURAS PROGRAMADAS ..... APERTURAS REALIZADAS ..... CIERRES GENERALES

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad de Aperturas	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.	Semana	Prog	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES (Realizar analisis y comentarios sobre el retraso y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022


Building INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($) $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) 0%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la

Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato

3. ASPECTOS TECNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1 Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-002 y INP-SDHT-1009-2022-004. Se realizo la remision de las hojas de vida de la Interventoria a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-001.

2 Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio, el archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.

3 Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. AB000035, Factura AB000282 y de CUMPLIMIENTO con No. AB000033, Factura AB000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 994 - 2022.

4 El 3 de septiembre de 2022 se realizó la reunion de inico en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 200 beneficiarios, a los cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se entabló comunicacion por via telefonica, asistieron en totas 173 beneficiarios o familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los mejoramientos de vivienda a ellos adjudicados.

5 Se realizo reunion en las instalaciónes de la SDH en compañia del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a aspectos tecnicos, sociales y SST. Adicional se recibieron los 200 expedientes correspondientes al grupo 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

Entrega en socialización y presentación a la comunidad:

Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo minimo requerido para el contrato.

Contratista Building entrega PMA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos especificos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar par a disposición de residuos peligrosos y de otra indole, asi como los certificados mineros y licencias de la cantera.

Personal del contratista está en cero (00), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.

Se hace reunión a interventoria informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se contó con la participación de director quien informa los aspectos técnicos y Social quien hace divulgación de su área especifica

Participación en SDHT de reunión con el personal SST y ambiental.

Reunion en las oficinas de interventoria entre los dos equipos obra - interventoria donde se dieron aspectos importantes a colaborar en todas las áreas: social, Mariam, SST, MA y calidad.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL

Nota: Si lo requiere


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoria, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá D.C. a los DOCE (Dia en letras) 12 (Dia en numeros) dias del mes del SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A. PUENMAYOR

Cargo: Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNION DE INICIO

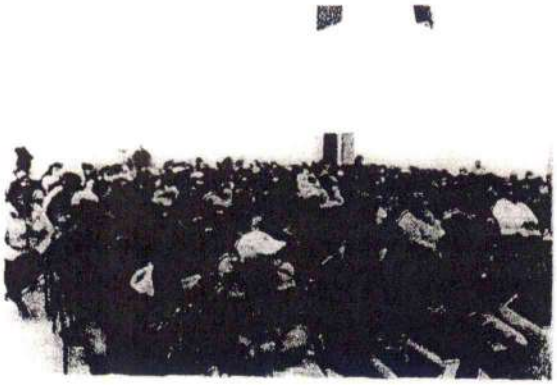







Se envio por correo el 175

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 16 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 009

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que a la fecha no se ha enviado las correcciones solicitadas referentes a las obligaciones del contrato de obra y compromisos adquiridos por el comité de seguimiento realizado el día 15 de septiembre los cuales mencionamos a continuación:

- Se solicita indicar la localización de la bodega indicar si se encuentre el material suficiente al momento de iniciar las obras.
- Certificados de Calidad de materiales.
- Todo el personal deberá estar afiliado tanto en seguridad social y ARL.
- El personal técnico social y operativo deberá contar con las chaquetas y uniformes autorizados, para comenzar obras.

La interventoria recibió la programación de obra., obligación descrita en el anexo técnico la cual debe realizar los ajustes referentes al flujo de inversión de las actividades de las viviendas ya que el archivo recibido presenta error a ejecutar.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

176

Bogotá 19 de Septiembre de 2022

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
Subsecretario de Coordinación Operativa
ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN
Supervisión
CLL 52 No.13-64, PISO 12
Bogotá D, C.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022".

ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Respetado señor,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito solicitar amablemente dar trámite a la cuenta de anticipo, avalada por nosotros mediante correo electrónico el pasado viernes 16 de septiembre de 2022.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
Representante Legal
INPLAYCO SAS
Interventor

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.

177

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las subsanaciones de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra BUILDING SAS. Se solicita la subsanación del personal que a la fecha presenta observaciones para la total aprobación por parte de esta Interventoría del personal indicado en el contrato que usted representa.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

178

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Cordial saludo,

Reciba de mis manos un cordial saludo. En calidad de interventor INPLAYCO S.A.S, y realizando las funciones de revisión y/o, verificación y/o validación en el control a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 994 2022, se adjunta el PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (10)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

179

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 2022

Cordial saludo,

Adjunto se envía PLAN DE GESTION SOCIAL del contratista BUILDING SAS, dentro del contrato 994 de 2022, al cual se le realizará acompañamiento para su implementación. a través del PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL de la interventoria.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (40)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

180

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

COPIA

181

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S.

142

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que pasados 12 días de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra el contratista de obra BUILDING SAS no ha iniciado labores en terreno situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de septiembre se debió iniciar con 30 de las validaciones y que hasta el momento **NO** ha iniciado.

A continuación, indico los MV que debieron haber iniciado de acuerdo a la programación presentada

VALIDACIÓN	63 días	vie 9/09/22	lun 21/11/22
BELLA FLOR	**63 días**	**vie 9/09/22**	**lun 21/11/22**
MVBF_022	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_027	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_046	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_047	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_054	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_058	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_066	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_087	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_089	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_094	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

MVBF_1001	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1015	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1045	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1052	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_106	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1068	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_107	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1072	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1078	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1080	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1100	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1108	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1117	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_115	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Por lo anterior se solicita al contratista de obra BUILDING SAS iniciar de manera inmediata las labores contempladas ya que a la fecha se presenta atrasos con respecto a la programación presentada. (Se solicita anexo a la programación el flujo de caja impreso y firmado para la legalización del mismo)

Por otro lado, desde el día 06 de septiembre se enviaron las observaciones para la subsanación de las hojas de vida del contratista de obra BUILDING SAS en oficio de referencia **INP- SDHT-1009-2022- 004** y hasta el momento no se ha podido realizar la legalización de los profesionales incumpliendo con la CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

> 3 Presentar al interventor del contrato o la Entidad según aplique, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato

Uno de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en las reuniones efectuadas era la entrega del oficio donde se indicará la persona quien realizaría la gerencia del proyecto con la aprobación del representante legal y hasta el momento no se ha realizado la entrega del oficio.

Se recuerda al contratista que el no cumplimiento de las obligaciones del contrato que usted representa conlleva a presuntos incumplimientos y por tanto se solicita subsanar lo anteriormente indicado.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

INPLAYCO S.A.S.

184

Bogotá D.C., septiembre 12 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 005
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoría al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales se solicita de carácter urgente hacer la entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, toda vez que ya se firmaron los documentos de inicio y se tienen programadas actividades para ejecutar dentro proyecto.

Por otro lado es necesario complementar los documentos entregados el día viernes 09 de septiembre de 2022 vía mail , e incluir entre otros la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de identificación de peligros y determinación de controles IPERC, la matriz de EPP, plan de calidad cumpliendo con la ISO 9001:2015 incluyendo las fichas técnicas y de calidad de los productos que van a ser utilizados en los mejoramientos, recordando que estos deben ser actualizados y veraces; procedimiento instalación de cubiertas aplicable, plan de emergencias y MEDEVAC, PMA ajustado al proceso de mejoramiento de vivienda, Manejo de sustancias químicas, reglamento de higiene y SI, etc, los cuales fueron debidamente socializados en la reunión de inicio del personal SST realizada en la SDHT y están descritos en la documentación recibida por parte de la entidad y la descrita en los pliegos y otros documentos contractuales. Los documentos enviados son devueltos con observaciones dentro del cuerpo de cada procedimiento, se recuerda nuevamente que deben ser ajustados al proyecto.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
Anexo 4 archivos digitales

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

INPLAYCO S.A.S.

185

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 011

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA 2** DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL19 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal número 2 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS — NIT 860.524.166-8

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.	Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las ultimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACION ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado



VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado



COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado



Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	38	0%	0	0%	0%	0%	38	0	0	0%	1	0	0	2	38	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo


1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado
2. Segun la programación presentada por el Contratista de Obra el día 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debia iniciar el día 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado
3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado

MVBF_072, MVBF_077, MVBF_049, MVBF_047, MVBF_064, MVBF_068, MVBF_066, MVBF_071, MVBF_085, MVBF_087, MVBF_089, MVBF_094, MVBF_096, MVBF_1001, MVBF_1015, MVBF_1046, MVBF_1062, MVBF_106, MVBF_1088, MVBF_107, MVBF_1072, MVBF_1078, MVBF_1086, MVBF_1085, MVBF_1084, MVBF_1100, MVBF_1108, MVBF_1117, MVBF_114

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acuiado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanes))





Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado
2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciara a partir del día 23 de septiembre de 2022 por tal motivo a la fecha no indica ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado

157

Building / INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA			
INVERSION SEMANAL			
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA	
$ 0		$ 0	
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO	
0%		0%	
INVERSION ACUMULADA			
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA	
$ 0		$ 0	
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO	
0%		0%	
ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($) $ 0			
ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) 0%			

OBSERVACIONES: Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta adelanto o atraso en la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

Durante la semana el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de validaciones ni de ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIERIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39158
	MVBF_1100	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39912
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

188

Building SAS	INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta interventoría se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, en el cual se evidencio que según la programación presentada por el contratista Building SAS esta presenta atraso ya que a la fecha no se ha dado inicio a las labores contempladas, por tal motivo se realizo la solicitud de arranque de obra y observaciones de posibles incumplimientos mediante oficio No. INP -SDHT-1009-2022-006.
2. Pasados 16 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de Septiembre de 2022 se debió iniciar con 30 validaciones y a la fecha no ha iniciado.
3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-008 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta Interventoría.
4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, al mismo tiempo se radicaron mediante oficios No. INP -SDHT-1009-2022-007, PGS Building sas. radicado 1-2022-39024 y No. INP -SDHT-1009-2022-008 plan de acompañamiento de gestión social Inplayco sas radicado 1-2022-39023.
5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoría, en donde se realizo a presentación de los profesionales por parte de los contratistas Building SAS e Inplayco SAS, con respecto al balance de fiducia la Interventoría informa que se recibieron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el balance de validaciones y ejecución de obras la Interventoría manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 2	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 2	0 M3	
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

Contratista Building entrega PMA el día viernes 9 de septiembre , se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continúan la falencia en la entrega de formatos y soportes adicionales.
Participación en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se aclara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por este motivo aun no aparecen activos, solo se dejan 3 sociales que tenían documentos completos para esta semana.
Se realiza charla de inducción al personal de interventoría, se tratan diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato.
Se incluye solo 3 personas del contratista por ser las que están aprobadas y afiliaciones debidamente presentadas.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

Nota: Si lo requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los DIECINUEVE (Día en letras) 19 (Día en numeros) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre(Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.

189

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 010

COPIA

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA 1** DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL12 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal número 1 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Building SAS / INPLAYCO SAS	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.	Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACION ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado



AVANCE SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado



COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado



Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programacion y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE APERTURAS ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado



VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad de Aperturas	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X			X			X		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programacion y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoria y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022.


Building SAS / INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No.: 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la

Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato

3. ASPECTOS TECNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

Building INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden al componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-002 y INP-SDHT-1009-2022-004. Se realizo la remision de las hojas de vida de la Interventoria a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-001.

2. Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio, el archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.

3. Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. AB000035, Factura AB000282 y de CUMPLIMIENTO con No. AB000033, Factura AB000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 994 - 2022.

4. El 3 de septiembre de 2022 se realizó la reunion de inico en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 200 beneficiarios, a los cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se entabló comunicacion por via telefonica, asistieron en totas 173 beneficiarios o familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los mejoramientos de vivienda a ellos adjudicados.

5. Se realizo reunion en las instalaciónes de la SDH en compañía del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a aspectos tecnicos, sociales y SST. Adicional se recibieron los 200 expedientes correspondientes al grupo 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

Participación en socialización y presentación a la comunidad:
Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo mínimo requerido para el contrato.
Contratista Building entrega PMA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar par a disposición de residuos peligrosos y de otra índole, así como los certificados mineros y licencias de la cantera.
Personal del contratista está en cero (00), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.
Se hace reunión a interventoría informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se contó con la participación de director quien informa los aspectos técnicos y Social quien hace divulgación de su área específica.
Participación en SDHT de reunión con el personal SST y ambiental.
Reunion en las oficinas de interventoria entre los dos puntos obra - interventoria donde se dieron aspectos importantes y relevantes en todas las áreas: social, Manejo, SST, MA y calidad.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL


Nota: Si lo requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá D.C., a los DOCE (Día en letras) 12 (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A. FUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNION DE INICIO









Se envio por correo el 19/4

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 16 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 009

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo.


Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que a la fecha no se ha enviado las correcciones solicitadas referentes a las obligaciones del contrato de obra y compromisos adquiridos por el comité de seguimiento realizado el día 15 de septiembre los cuales mencionamos a continuación:

- Se solicita indicar la localización de la bodega indicar si se encuentre el material suficiente al momento de iniciar las obras.
- Certificados de Calidad de materiales.
- Todo el personal deberá estar afiliado tanto en seguridad social y ARL.
- El personal técnico social y operativo deberá contar con las chaquetas y uniformes autorizados, para comenzar obras.

La interventoría recibió la programación de obra., obligación descrita en el anexo técnico la cual debe realizar los ajustes referentes al flujo de inversión de las actividades de las viviendas ya que el archivo recibido presenta error a ejecutar.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO SAS

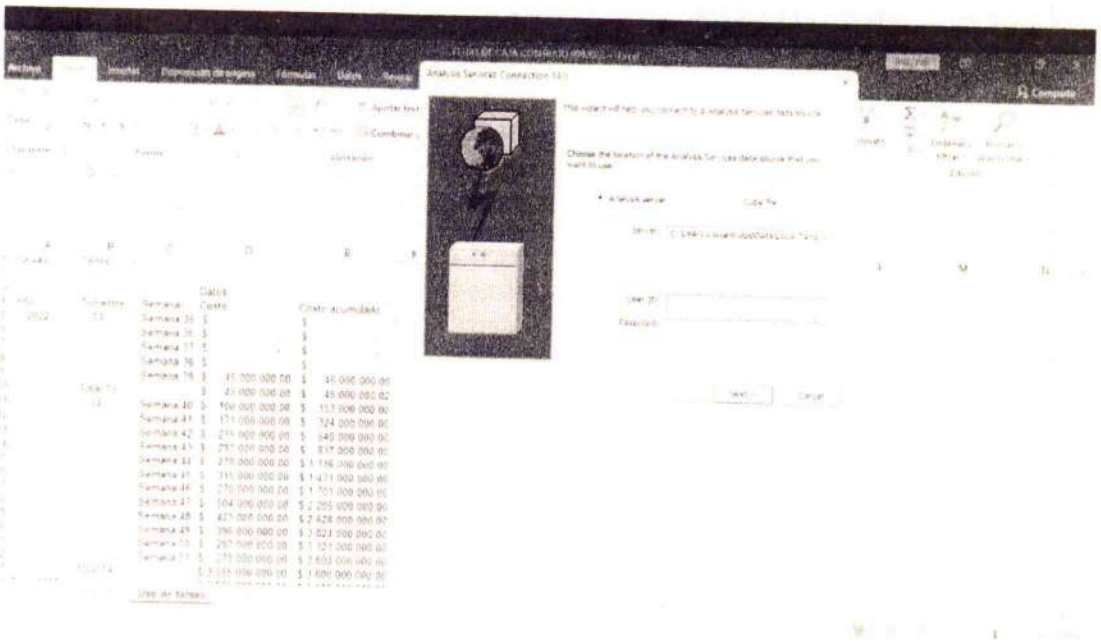

En la programación de obra *el contratista debe garantizar que está en la capacidad de ejecutar el número de Viviendas entregadas por SDHT por grupo de viviendas, y el tiempo empezará a contar a partir de la entrega de estos conforme a la programación descrita para cada uno en el presente documento y deberá garantizar el personal mínimo por cada uno.* "Subrayado fuera de texto".

Se solicita de manera urgente presentar los APUs conversados en el comité de obra.

- APU DE APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MURO
- PREPARACION DE MURO PARA PINTURA
- DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO

Se solicita de manera urgente la entrega de la documentación referente al gerente del proyecto el cual a la fecha no se ha recibido.

En el siguiente cuadro se presenta el seguimiento de verificación afiliaciones y documentación inicial de inducciones personal administrativo - mínimo requerido., El cual debe ser de estricto cumplimiento

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

176

Bogotá 19 de Septiembre de 2022

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
Subsecretario de Coordinación Operativa
ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN
Supervisión
CLL 52 No.13-64, PISO 12
Bogotá D, C.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022".

ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Respetado señor,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito solicitar amablemente dar trámite a la cuenta de anticipo, avalada por nosotros mediante correo electrónico el pasado viernes 16 de septiembre de 2022.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
Representante Legal
INPLAYCO SAS
Interventor

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO SAS

197

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que una vez revisadas las subsanaciones de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra BUILDING SAS. Se solicita la subsanación del personal que a la fecha presenta observaciones para la total aprobación por parte de esta Interventoría del personal indicado en el contrato que usted representa.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

198

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Cordial saludo,

Reciba de mis manos un cordial saludo. En calidad de interventor INPLAYCO S.A.S, y realizando las funciones de revisión y/o, verificación y/o validación en el control a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 994 2022, se adjunta el PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (10)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

199

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 2022

Cordial saludo,

Adjunto se envía PLAN DE GESTION SOCIAL del contratista BUILDING SAS, dentro del contrato 994 de 2022, al cual se le realizará acompañamiento para su implementación. a través del PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL de la interventoria.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (40)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

206

INPLAYCO S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

COPIA

201

INPLAYCO SAS
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que pasados 12 días de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra el contratista de obra BUILDING SAS no ha iniciado labores en terreno situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de septiembre se debió iniciar con 30 de las validaciones y que hasta el momento **NO** ha iniciado.

A continuación, indico los MV que debieron haber iniciado de acuerdo a la programación presentada

VALIDACIÓN	**63 días**	**vie 9/09/22**	**lun 21/11/22**
BELLA FLOR	**63 días**	**vie 9/09/22**	**lun 21/11/22**
MVBF_022	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_027	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_046	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_047	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_054	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_058	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_066	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_087	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_089	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_094	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

MVBF_1001	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1019	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1045	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1052	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_106	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1068	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_107	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1072	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1078	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1080	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1100	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1108	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1117	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_115	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Por lo anterior se solicita al contratista de obra BUILDING SAS iniciar de manera inmediata las labores contempladas ya que a la fecha se presenta atrasos con respecto a la programación presentada. (Se solicita anexo a la programación el flujo de caja impreso y firmado para la legalización del mismo)

Por otro lado, desde el día 06 de septiembre se enviaron las observaciones para la subsanación de las hojas de vida del contratista de obra BUILDING SAS en oficio de referencia **INP- SDHT-1009-2022- 004** y hasta el momento no se ha podido realizar la legalización de los profesionales incumpliendo con la CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

3 Presentar al interventor del contrato o la Entidad según aplique, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato

Uno de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en las reuniones efectuadas era la entrega del oficio donde se indicará la persona quien realizaría la gerencia del proyecto con la aprobación del representante legal y hasta el momento no se ha realizado la entrega del oficio.

Se recuerda al contratista que el no cumplimiento de las obligaciones del contrato que usted representa conlleva a presuntos incumplimientos y por tanto se solicita subsanar lo anteriormente indicado.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.

204

Bogotá D.C., septiembre 12 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 005
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoría al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales se solicita de carácter urgente hacer la entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, toda vez que ya se firmaron los documentos de inicio y se tienen programadas actividades para ejecutar dentro proyecto.

Por otro lado es necesario complementar los documentos entregados el día viernes 09 de septiembre de 2022 vía mail , e incluir entre otros la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de identificación de peligros y determinación de controles IPERC, la matriz de EPP, plan de calidad cumpliendo con la ISO 9001:2015 incluyendo las fichas técnicas y de calidad de los productos que van a ser utilizados en los mejoramientos, recordando que estos deben ser actualizados y veraces; procedimiento instalación de cubiertas aplicable, plan de emergencias y MEDEVAC, PMA ajustado al proceso de mejoramiento de vivienda, Manejo de sustancias químicas, reglamento de higiene y SI, etc, los cuales fueron debidamente socializados en la reunión de inicio del personal SST realizada en la SDHT y están descritos en la documentación recibida por parte de la entidad y la descrita en los pliegos y otros documentos contractuales. Los documentos enviados son devueltos con observaciones dentro del cuerpo de cada procedimiento, se recuerda nuevamente que deben ser ajustados al proyecto.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
Anexo 4 archivos digitales

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

205

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 7 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-004

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022.

ASUNTO: APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 994-2022.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las pólizas **RCE (PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** con No AB000035, Factura AB000282, y de **CUMPLIMIENTO** con No AB000033, Factura AB000282 las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el contrato de obra No 904-2021 clausula garantia única.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO AB000033

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
11	08	2022	DESDE	10	08	2022	HORA	12:00	11	08	2022
			HASTA	10	12	2025	HORA	12:00			

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA		
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL

R.C.E - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
			DESDE				HORA				
			HASTA				HORA				

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.982 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CC. ARQ. CAROLINA POSADA APOYO A LA SUPERVICION SDHT - folios 4

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

206

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad

PÓLIZA
AB000035

FACTURA
AB000284

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Modificación	**PRODUCTO**	R.C.E. ENTIDAD ESTATAL	**ORDEN**	1
CERTICADO	AB00[illegible]11	**FORMA DE PAGO**	Contado	**TELEFONO**	
AGENCIA	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS	**DIRECCIÓN**	CARRERA 35 NO 48-12 - CABECERA	**USUARIO**	YYAIMA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
23	08	2022	**DESDE**	10	08	2022	**HORA**	12:00	23	08	2022
			HASTA	10	12	2022	**HORA**	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR	BUILDING SAS			**NIT/ CC**	804002715
DIRECCIÓN	CALLE 50 N°27 A -41			**TEL/ MOVIL**	6345900000
ASEGURADO	BOGOTA DC SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT			**NIT/ CC**	899999061
DIRECCIÓN	CL 20 NO 68A-06	**E-MAIL**	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	**TEL/ MOVIL**	6013581600
BENEFICIARIO	BOGOTA DC SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT			**NIT/ CC**	899999061
DIRECCIÓN	CL 20 NO 68A-06	**E-MAIL**	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	**TEL/ MOVIL**	6013581600

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
[illegible]	
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C
LOCALIDAD	BOGOTA D.C
DIRECCION	BOGOTA
ANALISIS CLIENTA	BOGOTA
	Directo

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Contratistas y Operaciones	$400.000.000.00	10.00%	1.00 smmlv	$ 00
Contratistas y Subcontratistas	$ 00	10.00%	1.00 smmlv	$ 00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$400.000.000.00	$ 00		$ 00	$ 00

COASEGURO	
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
000900199592	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros: Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7465992
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 051 0538 opción servicio al cliente

VIGILADO

207

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad

NIT 860028415

PÓLIZA AB000035

FACTURA AB000284

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificacion **PRODUCTO** R.C.E. ENTIDAD ESTATAL **ORDEN** 1
CERTICADO AB000511 **FORMA DE PAGO** Contado **TELEFONO** _____ **USUARIO** YYAIMA
AGENCIA BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS **DIRECCIÓN** CARRERA 35 NO 48-12 - CABECERA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
23	08	2022	DESDE	10	08	2022	HORA	12:00	23	08	2022
			HASTA	10	12	2022	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR BUILDING SAS **NIT/ CC** 804002715
DIRECCIÓN CALLE 50 N°27 A -41 **EMAIL** **TEL/ MOVIL** 6345900000

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE CONFIRMAN:

ASEGURADO: BUILDING S.A.S. NIT: 804002715 Y BOGOTA DC SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT NIT:899999061

BENEFICIARIO:BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT:899999061 Y/O TERCEROS AFECTADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

.....

CONTRATO DE OBRA No. 994-2022

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022.

PLAZO INICIAL: 4 MESES

VALOR ASEGURADO: 400 SMMLV
Terceros afectados y Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9

ESTA POLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 20-10-2021-1501-P-06-00000000001007-D001, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CODIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460344
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 3538 opción servicio al cliente.

VIGILADO

206

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

equidad SEGUROS

CODIGO DE RECAUDO
1100200003300001

PÓLIZA AB000033

FACTURA AB000282

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0103 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL

COD. AGENCIA 0002 **CERTIFICADO** AB000267 **DOCUMENTO** Nuevo **TEL:**

AGENCIA BUCARAMANGA **DIRECCIÓN** CARRERA 35 NO. 48-12 - CABECERA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							FECHA DE IMPRESIÓN		
11	08	2022	**DESDE**	10	08	2022	**HORA**	12:00		11	08	2022
			HASTA	10	12	2025	**HORA**	12:00				

DATOS GENERALES

TOMADOR	BUILDING SAS			**NIT/CC**	804002715
DIRECCIÓN	CALLE 50 N°27 A -41	**E-MAIL**		**TEL/MOVIL**	6345900000
ASEGURADO	BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			**NIT/CC**	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52#13-64	**E-MAIL**	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	**TEL/MOVIL**	6013581600
BENEFICIARIO	BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			**NIT/CC**	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52#13-64	**E-MAIL**	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	**TEL/MOVIL**	6013581600
AFIANZADO	BUILDING SAS			**NIT/CC**	804002715
DIRECCIÓN	CALLE 50 N°27 A -41	**E-MAIL**		**TEL/MOVIL**	6345900000

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo)	BOGOTA D.C.
Departamento	BOGOTA D.C.
Localidad,Comuna o Barrio	BOGOTADC
Dirección (Ubicación del Riesgo)	BOGOTA D.C.

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
Cumplimiento del Contrato	$720.000.000.00
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$1.080.000.000.00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$360.000.000.00
Calidad del Servicio	$720.000.000.00
Estabilidad y Calidad De Obra	$720.000.000.00

VIGENCIAS GARANTÍA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
10/08/2022	10/04/2023	243
10/08/2022	10/04/2023	243
10/08/2022	10/12/2025	1218
10/12/2022	10/06/2023	182
10/12/2022	10/12/2024	731

VALOR ASEGURADO TOTAL $3.600.000.000.00

NÚMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$21.003.286	$7.000	$3.991.954	$25.002.240

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO

COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA

CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
0009001995 92	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460192
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 0538 opción servicio al cliente

VIGILADO

209

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 6 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 004

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina
303Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAMODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: DEVOLUCIÓN HOJAS DE VIDA V2CONTRATO 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de obra BUILDING SAS el dia 2de septiembre de 2022 vía correo electrónico. Se solicita la subsanación de las hojas de vida de los profesionales para la aprobación por parte de esta Interventoría.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

Versión: 02

CONTRATO No.	994 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	Arq. Edwin Ulloa

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional o Documento Requerido No	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formacion Educativa	Experiencia Laboral (Según condiciones y términos)		Formacion Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la HV)				
			General	Especifica		General	Especifica			
RICARDO JAIMES RUIZ	Director de obra	Arquitecto o ingeniero con título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	25 meses	25700 - 107044	NO	La certificación laboral de la empresa MARCAS INGENIERIA SAS, debe indicar los numeros de contratos, nombres de proyectos a los cuales hace referencia y adicionar el valor contractual de cada uno de ellos; como lo indica en el pliego de condiciones. Adicional por favor adjuntar copia de los contratos mencionados.
ANDRES MELO	Residente de obra No. 1	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	11 años, 9 meses	30 meses	A2[illegible]555 2010 - 7[illegible]4418	SI	Pendiente certificación laboral de UT MIC 2020
JOHANA GACHARNA BALAGUERA	Residente de obra No. 3	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	6 años, 4 meses,	2 años	A1620165 - 1015426714	NO	Dentro de las certificaciones presentadas ninguna cumple con lo requerido en el pliego de condiciones el cual indica que debe acreditar por lo menos un contrato como residente de obra en proyectos de uso residencial y adicional la certificación debe tener el valor del contrato el cual sea superior al 50% del presupuesto oficial.
JESSICA FARFAN	Profesional Social No. 1	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE	1019069423	SI	N/A
DIANA PARRAGA	Profesional Social No. 4	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	8 años, 6 meses	CUMPLE	2383110123-1	SI	N/A

Apoyo: DONALDO UBEIMAR MOYOS

Nombre del Supervisor - Interventor

Fecha: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1

212

211

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., septiembre 08 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 003

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito entregar de las pólizas actualizadas de acuerdo al contrato de Interventoria n° 1009-2022 suscrito el dia 18 de agosto de 2022.

- Póliza de RCE n° 15-40-101081212
- Póliza de cumplimiento n° 15-44-101266948

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de las pólizas anteriormente mencionadas.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

212

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081212	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2022	18	08	2022	00:00	22	01	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INPLAYCO S.A.S	NIT: 860.524.168-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1009-2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ESTABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 2022.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/08/2022	22/01/2023	$200,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****172,054.00	$ *******3,000.00	$ ******33,260.00	$ **********208,315.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081212

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

ADRIANABERNALC 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

213

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101266948	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2022	18	08	2022	00:00	22	01	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INPLAYCO S.A.S		NIT: 860.524.168-8
DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3581600

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1009-2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2022	22/07/2023	$86,400,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	18/08/2022	22/01/2026	$43,200,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2022	22/01/2025	$86,400,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA CALIDAD

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******216,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101266948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO

214

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C	NORTE	15	15-44-101266948	

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2022	18	08	2022	00:00	22	01	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INPLAYCO S.A.S			NIT: 860.524.168-8
DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101266948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

215

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101266948, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de AGOSTO de 2022

15-44-101266948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Bogotá D.C. Septiembre 9 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-003

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUITRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 1 2 3 - 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIÓN PARA CONTRATO DE OBRA 994.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito solicitar de manera perentoria la entrega de la programación y actividades a realizar. Recordando que ya fue firmado el acta de inicio.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.462 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INFLAYCO SAS

216

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

217

Bogotá D.C., agosto 29 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 002

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: DEVOLUCIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de obra BUILDING SAS el dia 26 de agosto de 2022 via correo electrónico. Se solicita la subsanación de las hojas de vida de los profesionales para la aprobación por parte de esta Interventoria.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Recibi:
29-08-22
Building SAS
Rep. Legal.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

Version: 01

Vigente desde: 03-01-2022

CONTRATO No.	994 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional ó Documento Requerido No.	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Según condiciones y términos)		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la HV)				
			General	Especifica		General	Especifica			
RICARDO JAIMES RUIZ	Director de obra	Arquitecto o ingeniero con título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	1 mes	25700 -07044	NO	No cumple con el tiempo minimo de experiencia especifica como director de obra
ANDRES MELO	Residente de obra No. 1	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	11 años, 9 meses	15 meses	A205552010-79690448	NO	No cumple con el tiempo minimo de experiencia especifica como residente de obra. Adicional hay inconsistencias entre certificaciones laborales y HV (Certificacion AG Constructores SAS indica cargo de Residente de Obra y en la HV indica cargo de Residente de Interventoria); Pendiente Certificacion laboral UT MIC 2020
DIEGO ACEVEDO	Residente de obra No. 2	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil	7 años, 10 meses	19 meses	68202-286958 STD	NO	No cumple con el tiempo minimo de experiencia especifica como residente de obra
XIOMARA ORTEGA	Residente de obra No. 3	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 años, 10 meses	19 meses	A1222017-1018469657	NO	No cumple con el tiempo minimo de experiencia especifica como residente de obra
SERGIO BUTRON	Residente de obra No. 4	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil	18 años, 2 meses	1mes	68202-108598	NO	No cumple con el tiempo minimo de experiencia especifica como residente de obra, adicional en la HV no se evidencia la experiencia laboral ni se anexan certificaciones.
ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA	Coordinador (a) Social	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	4 años	1 Cto. como Coordinador Social	Trabajador Social	9 años, 3 meses	CUMPLE	220221023-I	SI	N/A
JESSICA FARFAN	Profesional Social No. 1	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE			En la hoja de vida referencia 2 contratos con la empresa COINCO en el cual los tiempos se traslapan por 1 mes. Adicional la certificacion presentada no incluye el valor del Contrato
YENY SANGUINO	Profesional Social No. 2	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Psicologa	3 años, 9 meses	CUMPLE	188831	SI	N/A

TATIANA RODRIGUEZ	Profesional Social No. 3	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 4 meses	CUMPLE		SI	N/A
DIANA PARRAGA	Profesional Social No. 4	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	8 años, 6 meses	CUMPLE			En la certificacion no incluye el valor del Contrato.
ANGY LORENA OROZCO MONTILLA	Profesionales de calidad y SISO	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad.	4 años	2 años	Profesional en salud ocupacional	2 años, 2 meses			NO	

Aprobó: GONZALO LIEVANO HOYOS
Nombre del Supervisor / Interventor

Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2022

212

COPIA

220

INPLAYCO S.A.S

Bogota D C., septiembre 05 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 001

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito entregar la documentación referente a las hojas de vidas del personal que integraran el grupo de profesionales para el contrato de interventoria No. 1009-2022, a continuación

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	
DIRECTORES			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CESAR FUENMAYOR	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTES TECNICOS			
RESIDENTE DE INT 1	FERNANDO CAMPOS RODRÍGUEZ	INGENIERO CIVIL	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 2	EDWIN ALBERTO BÁEZ SEPÚLVEDA	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 3	JULIETH FERNANDA CASTRO SANDOVAL	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 4	LEONARDO SOLANO SOLANO	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
COORDINADORES			
COORDINADOR SOCIAL	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	PSICOLOGA	Se hace entrega de la hoja de vida (16 folios)
RESIDENTES SOCIALES			
PROFESIONAL SOCIAL 1	JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (14 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 2	ANGIE QUINTERO PLATA	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (13 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 3	DORA CAROLINA AREVALO BOHÓRQUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (25 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 4	DIANA MARCELA MORA OME	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (15 folios)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.ar
INPLAYCOCONTRATO2976@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

221

INPLAYCO SAS

PROFESIONAL CALIDAD SISO			
SISO N° 1	ROBERT ROJAS TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Se hace entrega de la hoja de vida (15 folios)
SISO N° 2	VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Se hace entrega de la hoja de vida (7 folios)
ASESOR FINACIERO			
FINACIERO	MAURICIO SAIZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Se hace entrega de la hoja de vida (4 folios)
ASESOR JURIDICO			
JURIDICO	NATALIA RESTREPO SALAZAR	ABOGADA ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL	Se hace entrega de la hoja de vida (16 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

fiduciaria popular

0031247

Titular/Razón Social:

Tipo y No. de Identificación:

Teléfono de contacto:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

Fondo: No. de Encargo Fiduciario:

Fondo: No. de Encargo Fiduciario:

Fondo: No. de Encargo Fiduciario:

Fondo: No. de Encargo Fiduciario:

Fondo: No. de Encargo Fiduciario:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUCIA ESTRUCTURADA

Nombre del Fideicomiso: **Código Fideicomiso**

Registro de Firmas de: Fideicomitente Supervisor Veedor **El Negocio requiere interventor o Supervisor:** Si No
Administrador Interventor

Titular / R. Legal

Nombres y Apellidos:

Tipo y No. Identificación:

Firma:

Tipo: A B C No.
Actualización:

Gonzalo Lievano Hoyos.
C.C. 19.100.762.

Autorizado para:

222

223

fiduciaria popular	FORMULARIO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		C-RG-055
	Proceso: Comercial	Responsable: Vicepresidente Comercial	05
	Clasificación de la información diligenciada: Reservada		08/06/2021
	Uso de la información: Operacional		

Si no aplica anule los espacios con una linea.

Fecha de Diligenciamiento	Nombre del Negocio:
DD 10 MM 08 AAAA 2022	

1. INFORMACION PERSONA NATURAL (Aplica si el interventor y/o supervisor es Persona natural)

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: R.C. ☐ T.I. ☐ C.C. ☐ C.E ☐ Otro:	Número de Identificación	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Expedición: DD: MM: AAAA:

Sexo: M ☐ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento DD: MM: AAAA:

Nivel de Educación: Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Profesional ☐ Especialista ☐ PHD ☐ Técnico ☐ Master ☐ Sin Estudios ☐	Profesión:	Código CIIU

Dirección residencia:	Teléfono Residencia:	Celular	Ciudad:

Dirección Oficina:	Teléfono Oficina:	Extensión	Celular	Ciudad:

2. INFORMACION PERSONA JURIDICA (Aplica si el interventor y/o supervisor es Persona Jurídica)

Razón Social:	Siglas o Nombre Corto:
INPLAYCO SAS.	

NIT:	Dígito de Chequeo:	Clase de Entidad: Econ. Solidaria ☐ Pública Extranjera ☐ Pública Nacional ☐ Pública Municipal ☐ Priv. Multinacional ☐ Sin animo de lucro ☐ Privada Extranjera ☐ Pública Dep/tal ☐ Privada Nacional ☒ Economia Mixta ☐
860524168	8	

Actividad Económica	Código CIIU:	Cantidad de empleados	Tipo de contribuyente
Interventoria de Obras	7112	3	Regimen Comun

Tipo de Ubicación: División ☐ Filial ☐ Sede ☐ Sucursal ☐ Ubicación única ☒	Naturaleza Jurídica:	Página Web:
	Privada	

Dirección Sucursal Principal:	Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:
Carrera 16A # 82-13 oficina 201	3118584510		Bogota D.C

Dirección otra Sucursal:	Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:

Correo Electrónico:	Envio de Correspondencia: E-mail ☐ Oficina ☐ Otra ☐ ¿Cual?
inplayco@yahoo.com.mx	

Primer Nombre (Representante legal)	Segundo Nombre (Representante legal)	Primer Apellido (Representante legal)	Segundo Apellido (Representante legal)
Gonzalo		Llevano	Hoyos.

Tipo de Identificación: R.C. ☐ T.I. ☐ C.C. ☒ C.E ☐ Otro:	Número de Identificación (Representante legal)	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País) (Representante legal)	Fecha de Expedición: DD: MM: AAAA:
	19.100962	Bogota. D.C.	27 05 1971

Sexo: M ☒ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento DD: MM: AAAA:
	Colombiana	Separado	Bogota. D.C	16 04 1950

3. INFORMACION AUTORIZADO (aplica cuando el interventor y/o supervisor es Persona Jurídica y nombra a un autorizado)

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: R.C. ☐ T.I. ☐ C.C. ☐ C.E ☐ Otro:	Número de identificación	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Expedición: DD: MM: AAAA:

Sexo: M ☐ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento DD: MM: AAAA:

Nivel de Educación: Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Profesional ☐ Especialista ☐ PHD ☐ Técnico ☐ Master ☐ Sin Estudios ☐	Profesión:	Código CIIU

Dirección residencia:	Teléfono Residencia:	Celular	Ciudad:

Dirección Oficina:	Teléfono Oficina:	Extensión	Celular	Ciudad:

224

4. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones al BANCO POPULAR S.A. (en adelante "EL BANCO"), a sus cesionarios o a quien represente los derechos, para que efectúe el Tratamiento de mis Datos Personales de la manera y para las finalidades que se señalan a continuación. Para efectos de la presente autorización, se entiende por "Datos Personales" la información personal de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible (definidas en la ley tales como mis huellas, imagen o voz entre otros), técnico y administrativo, privada, semiprivada pasada, presente o futura, contenida en medios físicos, digitales o electrónicos y por "Tratamiento de datos personales" todo tipo de actividad, acción, operación o proceso, incluyendo pero sin limitarse a: recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir, circularizar, suministrar, suprimir, procesar, solicitar, verificar, intercambiar, retirar, transferir nacional o internacionalmente, transmitir, disponer, organizar, ajustar, modelar, unir, consolidar, fusionar, combinar, agregar, resumir, digitalizar, explotar, rentabilizar, aprovechar, emplear y/o divulgar, y, efectuar operaciones sobre mis Datos Personales.

Esta autorización para el Tratamiento de mis Datos Personales se hace extensiva a las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, listadas en la Resolución 0155 de 2019 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra norma que la modifique, adicione o reemplace, así como a las entidades que forman parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, listadas en el Certificado de Existencia y Representación Legal de El BANCO expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en conjunto "LAS ENTIDADES AUTORIZADAS").

La autorización que otorgo a EL BANCO y a LAS ENTIDADES AUTORIZADAS por el presente medio para el Tratamiento de mis Datos Personales tendrá las siguientes finalidades:

a. Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta productos y/o servicios propios u ofrecidos en alianza comercial, a través de los canales autorizados en la ley o contrato, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos.
b. Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener relaciones contractuales, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos: I) Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida. II) Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como mi huella, imagen o voz. III) Obtener conocimiento de mi perfil comercial o transaccional. IV) Conocer sobre el nacimiento, modificación, celebración, extinción, novedades, hábitos de pago, comportamiento crediticio o cumplimiento de obligaciones directas, contingentes o indirectas, de las obligaciones vigentes, activas o pasivas, o las que en el futuro llegue a celebrar, incluyendo información referente al manejo, estado, cumplimiento de mis obligaciones de pago derivadas de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros, en bases de datos administradas directamente por las partes contratantes, por operadores de información financiera, autoridades o entidades estatales, operadores de información y/o entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, o administrador de bases de datos o entidades similares que en un futuro se establezca y que tenga por objeto alguna de las anteriores actividades. v)Ejercer mis derechos, incluyendo los referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo o de mi empleador. vi) Recolectar y entregar información a autoridades extranjeras con competencia sobre EL BANCO, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares.
c. Realizar la transferencia nacional o internacional de mis datos personales a aliados comerciales, contractuales o afines y sus terceros, que vinculados a EL BANCO en desarrollo de su objeto social, y con el fin de brindarme beneficios sobre los productos o servicios adquiridos, me contacten telefónicamente, o por cualquier medio de comunicación, para ser informado sobre respuestas a mis consultas, publicidad, comunicados, servicios, tarifas, ofertas, entre otros

Para efectos de lo dispuesto en el presente literal b, EL BANCO en lo que resulte aplicable, podrá efectuar el Tratamiento de mis Datos Personales ante entidades de consulta, que manejen o administren bases de datos para los fines legalmente definidos, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras,

d. Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por EL BANCO o por alguna de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida,
e. Elaborar y reportar información contenida en encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, para lo cual autorizo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos,
f. Enviar mensajes a través de medios físicos o digitales, sobre promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, sorteos, eventos u otros beneficios, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por El BANCO; LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales,
g. Enviar notificaciones a través de medios físicos o digitales, para remitir extractos, campañas institucionales o de educación financiera e informar acerca de las innovaciones o modificaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención,
h. Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba.

Mis Datos Personales podrán consultarse, circular, transmitirse y/o transferirse a la totalidad de las áreas de EL BANCO así como a los proveedores de servicios, entidades públicas o que presten servicios públicos tales como notarías, Registraduría nacional del Estado Civil, Contraloría, Procuraduría, DIAN, oficinas de registro, cajas de compensación, administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, operadores de información a través de las cuales se liquidan cesantías, aportes a seguridad social y parafiscales (tales como Aportes en Línea, SOI, SIMPLE), usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos y servicios, incluidos call centers, domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras a su fuerza comercial, equipos de telemercadeo y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de EL BANCO, incluyendo contratistas, delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago y cobranza, implementación de software o servicios tecnológicos (en adelante los "Terceros") los cuales están obligados a garantizar la reserva de la información de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, como titular, entiendo y acepto que mediante la presente autorización concedo a estos Terceros, autorización para:

• Acceder a mis Datos Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados y sujeto al cumplimiento de los deberes que les correspondan como encargados del Tratamiento de mis Datos Personales.
• Compartir mis Datos Personales con las entidades gremiales a las que pertenezca la entidad, para fines comerciales, estadísticos y de estudio y análisis de mercadeo.

Es entendido que las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras mencionadas anteriormente ante las cuales EL BANCO puede llevar a cabo el Tratamiento de mis Datos Personales, también cuentan con mi autorización para permitir dicho Tratamiento.

I)que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos, II)que conozco y entiendo que el suministro de la presente autorización es voluntaria, razón por la cual no me encuentro obligado a otorgar la presente autorización, III) que conozco y entiendo que mediante la simple presentación de una comunicación escrita puedo limitar en todo o en parte el alcance de la presente autorización, y haber sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso, IV) que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante EL BANCO, revocar la presente autorización, solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y ejercer en forma gratuita mis derechos y garantías constitucionales y legales.

El tratamiento de mis Datos Personales se efectuará de acuerdo con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en la materia, la cual puede ser consultada en www.bancopopular.com.co.

Para el ejercicio de mis derechos, y la atención de consultas y reclamos, podré acercarme a las oficinas de EL BANCO a nivel nacional o usar la línea de servicio al cliente 743 4646 o en la Línea Nacional 01 8000 184646.

De conformidad con lo anterior, autorizo para que FIDUCIARIA POPULAR de TRATAMIENTO de mis datos personales: SI _____ NO _____

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

En mi calidad de interventor autorizo de manera expresa e irrevocable a FIDUCIARIA POPULAR S.A. a consultar, solicitar, suministrar, reportar, reprocesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero comercial, de servicios en la Central de Información – CIFIN – que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia a DATACREDITO y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.
Las anteriores declaraciones y autorizaciones aplican para los numerales 1,2,3, según corresponda

1) Firma del Representante legal empresa interventora o Persona Natural		2) Firma del interventor autorizado	
No. Documento de Identidad:	Huella registrada en el documento de identidad	No. Documento de Identidad:	Huella registrada en el documento de identidad

6. ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA

Nombre del Funcionario responsable de la verificación de la información

Cargo: _____ Fecha: _____

Resultados de la verificación: _____

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

226

Building SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoría

OFICION N°1 HABITAT 994-2022

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 999-2022

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Entrega de afiliaciones y exámenes médicos ocupacionales

Cordial saludo, me permito enviar afiliaciones y exámenes ocupacionales del personal que hacía falta por entregar los documentos, se adjunta los soportes de la Srta. ANNY TATIANA RODRIGURES y el del Sr. ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
C.C. No. 91.518.218 de Bucaramanga

227

Building SAS

Bogotá D.C., 13 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal
Interventoría

994-2022-001 BUILDING SAS

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-006

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al oficio INP-SDHT-1009-006 a través del cual se emite pronunciamiento respecto de nuestro oficio HABITAT 994-2022 en cuanto al atraso del inicio de las actividades de validaciones, en este referente nos permitimos informar que se han presentado imprevistos que han impedido que el inicio de actividades se haya realizado en la semana anterior, no obstante, esta semana cumpliremos con lo programado de acuerdo a la etapa de validación del mes de septiembre.

De igual manera se informa que las validaciones ya se encuentran en curso y desde del día de mañana se ubica personal en campo y se iniciara la fase correspondiente a validaciones.

228

Building
SAS

Por otro lado, se hace relación de hojas de vida con el fin de subsanar solicitud realizada en el oficio INP-SDHT-1009-2022-004 y así dar paso a legalización de los profesionales que estarán en obra a cargo del proyecto.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales sin otro particular me suscribo.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO BUTRÓN GELVEZ
Representante legal BUILDING SAS

229

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

PROGRAMACION DE OBRA CONTRATO 994-2022

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 17:44
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com

Bogotá D.C., Septiembre 3 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-003

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1,2,3 – 2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIÓN PARA CONTRATO DE OBRA 994.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito solicitar de manera perentoria la entrega de la programación y actividades a realizar. Recordando que ya fue firmado el acta de inicio.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

230

Building SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoría

OFICION N°4 HABITAT 994-2022

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Entrega de Planes SST, CALIDAD, CUBIERTA Y AMBIENTAL

Cordial saludo, me permito hacer entrega de los planes correspondientes al área de SST, CALIDAD, INSTALACIÓN DE CUBIERTA y GESTIÓN AMBIENTAL de manera digital con el compromiso de hacer radicación de los documentos físicos y foliados en carpetas yute el día Lunes 19 de Septiembre del año en curso.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
C.C. No. 91.518.218 de Bucaramanga

16 SEP 2022

231

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 17:17
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com
CC: stella.acevedo@habitatbogota.gov.co

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Oficio INP- SDHT-1009- 2022- 006.pdf
749K

232

Building
SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoría

994-2022-006 BUILDING SAS

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No 999-2022**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: INDISPONIBILIDAD DE MATERIAL 33*33 Y SOLICITUD DE INCORPORACION DE APU NUEVO

Cordial saludo

Me permito informar que luego de haber realizado la revisión detallada de la base ofertada, tan solo se dejo un enchape para piso de 33*33, y a la fecha este material no se encuentra disponible, anexamos pantallazos de la pagina de corona, donde se puede observar la indisponibilidad del material, por tal razón ponemos a su consideración la posibilidad de incluir un nuevo apu de gran formato, que es el material que se encuentra disponible en el mercado y que permite que las obras puedan ser entregadas el 30 de Diciembre del año en curso.
Anexamos soportes de corona sobre la disponibilidad del material

Quedamos atentos a sus comentarios, sin otro nos suscribimos.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal

233

corono



Piso Mikonos Ard Gris Caras Diferenciadas 33.8x33.8

$ 29.200

¡Agotado temporalmente!
Déjanos tu correo electrónico, te avisaremos en cuanto esté disponible

Unirme a lista de espera

Ventajas

234

corona




Piso Fortaleza Blanco Cara Unica
33.8x33.8

$ 31.100

Calcular


Piso Duropiso Blanco Cara Unica
33.8x33.8

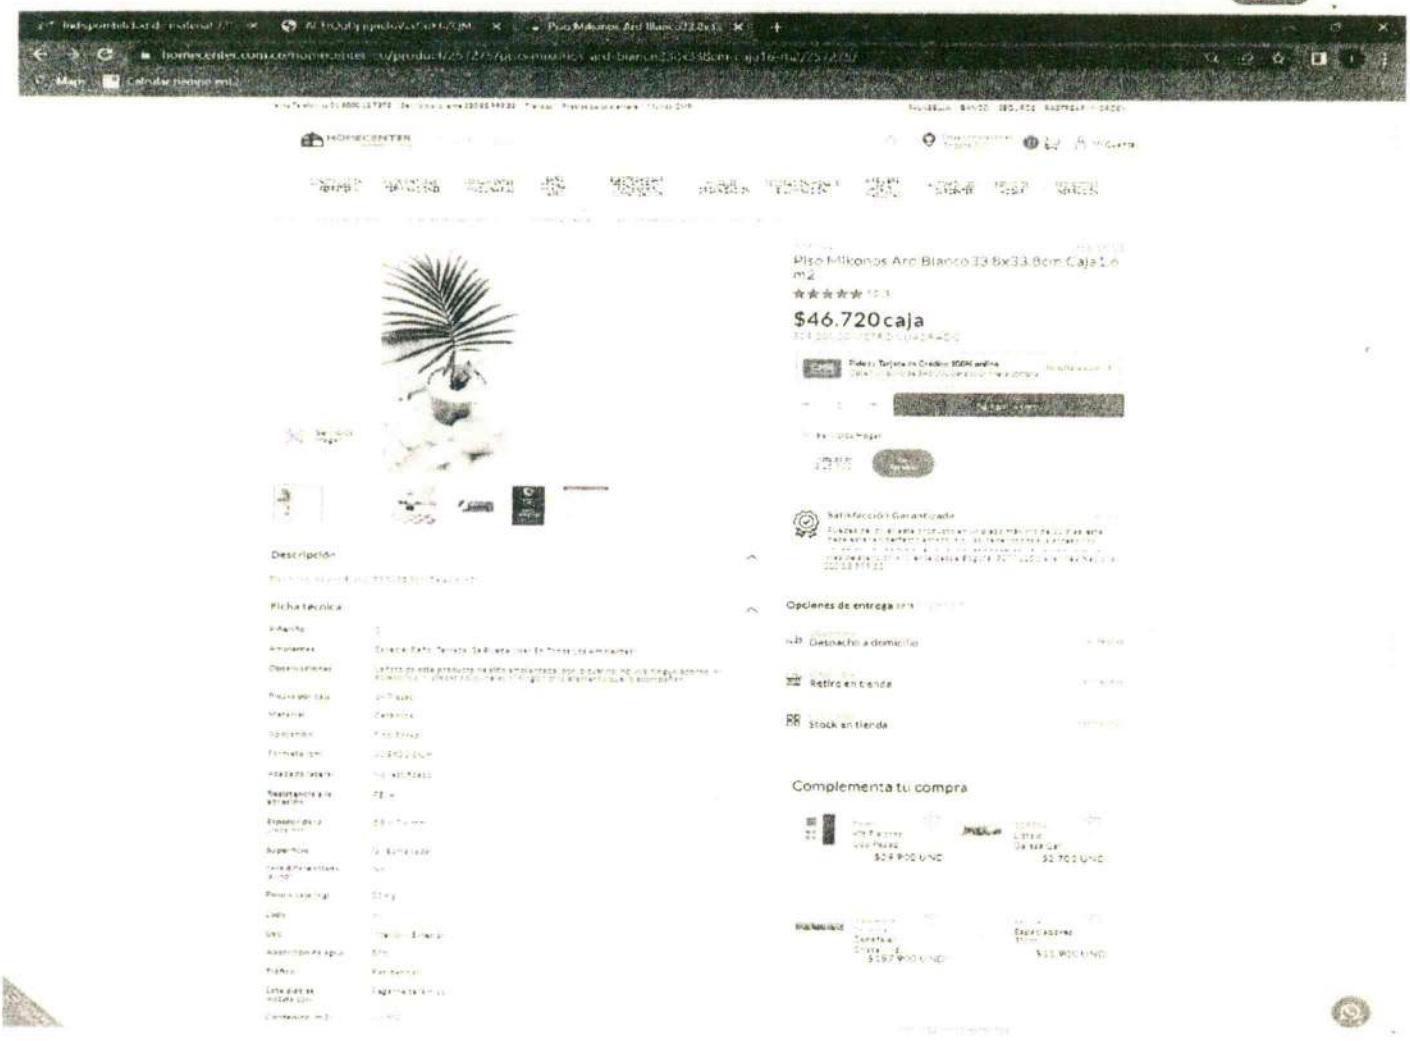
Piso Mikonos Ant Blanco 33.8x33.8cm Caja 1.6 m2
$46.720 caja
Descripción
Ficha técnica
Opciones de entrega
Complementa tu compra

236

Building
SAS

Bogotá D.C., 28 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoría

994-2022-007 BUILDING SAS

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No 999-2022**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Solicitud aprobación de APU no previstos.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la aprobación de APU no previstos, se realiza esta solicitud de manera urgente ya que se están presentando atrasos en los ajustes de presupuesto.

Como anexo se incluirá Excel con especificación de cada ítem.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal

237

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 15 de septiembre de 2022, 17:13
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Oficio INP- SDHT-1009- 2022- 008.pdf
1011K

238

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

Aval a las hojas de vida del personal contratista de obra BUILDING SAS

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 27 de septiembre de 2022, 08:00
Para: BUILDING HABITAT <buildinghabitat.grupo2@gmail.com>
CC: diana.posada@habitatbogota.gov.co

Bogotá D.C., septiembre 23 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-018

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022.

ASUNTO: HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA OBRA BUILDING SAS.

RESPETADOS SEÑORES

Por medio de la presente, enviamos oficio con el aval a las hojas de vida del personal contratista de obra **BUILDING SAS.**, una vez revisadas por esta interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Queremos mencionar que en esta relación del personal mínimo requerido hace falta la aprobación de la segunda profesional SST lo cual ya se solicitó subsanar al contratista.

Por lo anterior anexamos formato de VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS, de la firma BUILDING SAS., con sus respectivos anexos.

INP-SDHT-1009-2022-018 AVAL HOJAS DE VIDA CONTRATISTA DE OBRA .pdf
149K

ANEXO 4

INFORME REUNION DE INICIO

240

INFORME REUNION DE INICIO

Contrato 994 de 2022 - BUILDING SAS

1009 de 2022 - INPLAYCO SAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

241

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 – 2022

CONTRATO DE OBRA No 994 DE 2022

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA
OBJETIVO	INFORMAR LOS ASPECTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
LUGAR	AUDITORIO DE LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
FECHA Y HORARIO	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8:00 AM
POBLACIÓN OBJETO	Beneficiarios (as) del Programa de Mejoramiento de Vivienda
ORGANIZADOR(ES) RESPONSABLE(S)	CONTRATISTA BUILDING AREA DE GESTION SOCIAL EN CABEZA DEL COORDINADOR ROBERT BENAVIDES NOVOA
TIEMPO ESTIMADO	Hora y media para la reunión
ASISTENCIA ESTIMADA	200 beneficiarios

AGENDA - ORDEN DEL DÍA

1. INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS(AS)
2. SALUDO Y BIENVENIDA
3. DESARROLLO DE LA REUNION
4. RESOLUCION DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD
5. DESPEDIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS

PROTOCOLO DE INGRESO

LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES: El área social del contratista organizará en orden de llegada a los beneficiarios fuera del recinto.

REGISTRO DE ASISTENCIA: Se realizó una distribución interna de los beneficiarios para facilitar su ingreso organizándolos en tres grupos teniendo en cuenta su número de cedula, una vez identificado se realiza la verificación en las listas y se firma la asistencia.

INGRESO AL AUDITORIO: Una vez se registre al beneficiario se realizará el ingreso al auditorio.

UBICACIÓN EN EL AUDITORIO: Cuando los participantes ingresen al salón se realizará acompañamiento para que al ubicarse en el salón. Se realizará control sobre esta ubicación de los participantes teniendo previamente las sillas ubicadas.

INICIO DE REUNIÓN: Se dará inicio a la reunión una vez los beneficiarios se encuentren ubicados dentro del auditorio, en este momento ya se debe haber probado los equipos tecnológicos para evitar cualquier novedad.

242

PROTOCOLO DE SALIDA

SALIDA DEL AUDITORIO: Se realizará control de la salida de los participantes al finalizar la reunión solicitando salir del salón de acuerdo con la ubicación de los participantes, iniciando por las filas más cercanas a la puerta de salida hasta evacuar el salón en este mismo orden.
En este punto se realizará la entrega de los refrigerios a los asistentes en tanto van saliendo del auditorio.

FINALIZACIÓN: Al llevar a cabo la evacuación de los participantes se revisará la entrega del espacio del auditorio y con ello la finalización de la actividad.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INSUMOS
7:30-8:00 AM - INGRESO A LOS BENEFICIARIOS(AS).	VERIFICACION DE DATOSDE LOS BENEFICIARIOS E INGRESO AL AUDITORIO	CONTRATISTA CON APOYO DE INTERVENTORIA	LISTADOS RECURSO HUMANO
8:15- 8:45 AM - SALUDO Y BIENVENIDA.	PRESENTAR A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y A SUS INTEGRANTES. DAR A CONCER EL OBJETO DEL CONTRATO.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
8:46-9:20 AM DESARROLLO DE LA REUNIÓN.	INFORMAR LAS GENERALIDADES Y ETAPAS DEL PROYECTO.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
9:21-9:40 AM INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD	DAR LA PALABRA A LA PERSONAS BENEFICIARIAS PARA CONOCER SUS INQUIETUDES Y GENERAR RESPUESTAS A LAS MISMAS.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
9:41 - 10:00 AM DESPEDIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS	AGRADECIMIENTOS, SALIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS.	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	RECURSO HUMANO.

Firma. Elaborado por: Robert Benavides Novoa	**Fecha de Planeación y elaboración:** **29 agosto de 2022**
Firma. Aprobado por: Shirley Vitola Serrano	**Fecha de Aprobación:** **31 agosto de 2022**

Compromisos: No se realizaron compromisos en la reunión.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Robert Benavides Novoa	Coordinador Social Builiding SAS	Buildinghabitat.grupo2@gmail.com	3005556060	
Shirley Vitola Serrano	Coordinadora Social Inplayco SAS	Inplaycosocial2022@gmail.com	3023763199	

Anexo 1. Listados de llamadas realizadas, correos certificados, listados de asistencia.

ELABORÓ: Robert Benavides Novoa Coordinador social contratista Building SAS
REVISÓ:
APROBÓ:

Observaciones y/o conclusiones:

La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación, en total 12 correos fueron enviados, a los siguientes: MVBF_1315, MVBF_605, MVBF_0679, MVBF_1117, MVBF_1324, MVBF_1080, MVBF_066, MVBF_0749, MVBF_850, MVBF_1076, MVBF_585, MVBF_0987.

Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés continúe conforme se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar.

Se puede identificar alto nivel de aceptación de la comunidad beneficiada con respecto al programa de Mejoramiento de Vivienda.

El alto nivel de asistencia, garantizo un amplio ejercicio de información y divulgación del proceso, lo cual incide directamente en claridad de la información y disminución de expectativas o dudas qué estuviesen fuera del alcance del programa.

Registro fotográfico (si aplica):









9. Se informa a los beneficiarios acerca de la cenefa decorativa en baño, cocina y el Kit ecológico, valores agregados que el contratista obsequia al mejoramiento.
10. Se les socializa a los beneficiarios el monto del programa al cual están accediendo que es de hasta dieciocho SMLV, sin embargo, puede variar, de acuerdo al análisis de las necesidades en relación a la habitabilidad, sin superar el valor máximo definido en la norma, especificando que el costo directo es el 75% utilizado para material, mano de obra, transporte y herramientas, y el 25% para los A.I.U, los gastos administrativos, imprevistos y utilidades.
11. Finalmente se da paso a las inquietudes de las personas teniendo en cuenta y haciendo la salvedad que las preguntas sean generales al proceso y no temas específicos de un único beneficiario:

- Claudia Martínez: Se intervino un área de la casa y el dinero no alcanzo para unas zonas ¿puede el mejoramiento terminarme esas actividades que quedaron pendientes?
  Rta Sí, el mejoramiento puede intervenir esas zonas como lo son enchape de piso y cielo raso, de igual forma pueden tumbar el mesón y hacer uno nuevo, la invitación es que el beneficiario aproveche la ayuda de los profesionales para hacer un buen trabajo en cada vivienda.

- Pregunta general ¿Cuáles son los horarios del personal de obra?
  Rta El contratista de obra trabaja de lunes a viernes inicia labores de 7:30 am y termina a las 4:00 pm y los sábados de 7:00 a 12:00 M, debe haber siempre un adulto responsable para el ingreso de los trabajadores y que este pendiente de la obra, si hay menores de edad no se pueden realizar labores, además les entregamos un librito, la bitácora de obra en donde se registra el nombre de los profesionales, el interventor hace las anotaciones, ustedes pueden anotar cualquier duda, los maestros van a ejecutar la obra, ellos no les van a solucionar absolutamente nada, el conducto regular de comunicación siempre va a ser beneficiario-contratista de obra, los profesionales, los residentes, director de obra, trabajador social o profesional Siso de obra, si ellos no atienden esta la interventoría con sus profesionales y de ultima esta la SDHT, quien estará pendiente a colaborar con cualquier novedad, van a tener también un punto de atención que más adelante les informaran horarios establecidos y en el librito quedara la información de contacto y los medios para la comunicación con el contratista o interventoría.

- Melquisedec Ortiz ¿Cuánto es el monto del subsidio de vivienda?
  Rta. El monto del subsidio según la resolución que le llegó a su casa es de dieciocho millones de pesos.

- Heriberto Vargas ¿Es necesario desocupar la vivienda?
  Rta No es necesario desocupar la vivienda, es responsabilidad de cada persona el espacio que se va a intervenir.

- Pregunta general ¿Qué pasa si no me ha llegado la resolución?
  Rta No hay problema, le puede llegar mientras está en construcción su vivienda, de igual forma puede gestionar con las profesionales sociales para que le ayuden con sus dudas.

Como punto seguido indica que el proceso de mejoramiento de vivienda posee unas etapas en la cual están expresas de la siguiente manera:

- Estructuración del proyecto: Etapa en la que se desarrolla las actividades requeridas para validar las viviendas y los hogares que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento operativo.
- Otorgamiento: Etapa en la que se otorga el subsidio a los hogares que cumplieron con todos los requisitos establecidos.
- Asignación: Etapa en la cual se asigna el proyecto a los consorcios que ganaron la licitación pública.
- Ejecución: Es el proceso en el que se desarrolla la elaboración del proyecto en cada uno de los hogares a intervenir.
- Liquidación: Parte final del proyecto dedicada a la construcción de documentación y cierre de este.

5. Seguido de la explicación anterior se presentan los agentes que participan en la ejecución del proyecto, iniciando con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la SDHT; el contratista que ejecutara el proyecto otorgado a BUILDING. SAS y por último la interventoría quien es el veedor de todo el proceso constructivo, otorgado a INPLAYCO S.A.S.
6. A continuación, se informa que el proceso de ejecución tendrá un plazo máximo de 4 meses; distribuidos en la fase de preconstrucción donde se realiza organización de expedientes y elaboración de cronograma, las fases uno y dos con 4 meses de duración donde se realiza la validación y ejecución de las obras y la fase 3, donde se realiza el cierre del proyecto.
7. Se informa también acerca del reglamento operativo, los deberes de los beneficiarios los cuales de no cumplirse darían lugar al retiro del subsidio teniendo en cuenta el art 35 de la resolución: los cuales son
   - Aportar a la entidad estructuradora la información veraz y consistente con la cual se fundamente su vinculación al proyecto.
   - Asistir a las actividades de socialización desarrolladas en el marco de los proyectos de mejoramiento de vivienda.
   - Participar de manera activa en la ejecución del proyecto, para lo cual deberá estar presto a los requerimientos de la entidad otorgante, operadora, ejecutora o interventora.
   - Permitir el acceso a las viviendas para la ejecución de las intervenciones.
8. A continuación, la arquitecta Stella, explica las recomendaciones que deben tener en cuenta los beneficiaros durante la ejecución de la obra, haciendo énfasis en cada una de ellas para evitar inconvenientes
   - Todas las herramientas son suministradas por el contratista de obra; No se debe alquilar ni prestar herramientas a los trabajadores de obra.
   - Los trabajadores de obra solamente están programados para las obras relacionadas con el mejoramiento de vivienda.
   - Todos los materiales que sobran de la obra pertenecen al contratista.
   - No prestar dinero, ni vender los alimentos a los trabajadores de obra.
   - La buena culminación de la obra es un éxito cuando se desarrolla respeto absoluto por las 2 partes (beneficiario – contratista).
   - No es necesario que desocupen la vivienda, se busca que durante las intervenciones realizadas las familias se reacomoden y así garantizar que no se trasladen.

247

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día)	(Mes)	(Año)		
03	09	2022	8:00	10:00

CONVOCADO POR: Building. SAS

DIRECCIÓN: Bogotá, Auditorio Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

OBJETIVO: Desarrollar la reunión de socialización con la comunidad del territorio Bella Flor–paraíso, esto, con el fin de informar el alcance, equipos profesionales, generalidades del proyecto en la intervención, así como también, solucionar las dudas que existan en relación al proceso.

TEMAS PARA TRATAR:

1. Firmas de Asistencia.
2. Apertura de la socialización del proyecto contrato 994 de 2022 informando a los 173 beneficiarios(as) que acudieron a la convocatoria del programa de la subdirección de Mejoramiento de Vivienda – secretaria Distrital del Hábitat, en la jornada realizada de la siguiente manera:

FECHA	HORA	CONVOCADOS	ASISTENTES
03-09-2022	8:00 AM	200	173

3. Aclaración de dudas e inquietudes expresados por los beneficiarios.
4. Despedida y entrega de refrigerios

DESARROLLO:

1. Firma de asistencia de los beneficiarios a quienes se organizó por grupos para hacer más rápido el proceso de ingreso.
2. Al ingreso al salón, se da la bienvenida a los asistentes, con videos de los mejoramientos realizados en diferentes territorios antes de iniciar de manera formal la reunión.
3. Las reuniones son desarrolladas por parte de los profesionales de la SDHT, sus asistentes son: del área social, María Isabel Serrano y del área técnica Carolina Posada y Stella Acevedo, quienes son los encargados de realizar la presentación en general.
4. Stella Acevedo, profesional técnico de la SDHT, inicia la reunión explicando detalladamente las generalidades del proyecto, determinado por el decreto distrital 145 de 2021, indicando que el subsidio está destinado a realizar obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de las viviendas, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente a las intervenciones en baños, cocinas, instalación de enchapes de pisos y muros, reemplazo de cubiertas, instalación de aparatos sanitaros, pañete, pintura, entre otros.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO O DESARROLLO:	**BELLA FLOR**
OBJETIVO:	**CITACIÓN REUNION INICIO A BENEFICIARIOS GRUPO 2 CONTRATO 994 - 2022**

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
1	Sonia milena giraldo herrera	Cl 75a sur 27 22	3143454628	X				30/08/2022	8:20	Beneficiaria/o			
2	Janeth medina diaz	Cl 73b sur 27b 40	3112106280	X				30/08/2022	8:24	Beneficiaria/o			
3	Mariana alexandra velandia vásquez	Cl 73d bis a sur 27 39 mj	3223942691	X				30/08/2022	8:27	Beneficiaria/o			
4	Doly argenis rivera avirama	Kr 27 bis a 73d 87 sur mj	3203669721	X				30/08/2022	13:46	Beneficiaria/o			
5	María ruth cortes losada	Cl 75a bis sur 27 58	3017387205	X				30/08/2022	12:46	Beneficiaria/o			
6	María escilda cabezas galíndez	Cl 74a sur 27b 55	3125306032	X				30/08/2022	8:40	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
7	María olinda sarmiento castro	Kr 27b 74 14 sur mj	3007834335	X				30/08/2022	8:49	Beneficiaria/o			
8	Teofilde forero aguilar	Cl 73a sur 26d 07	3202586473	X				30/08/2022	8:52	Beneficiaria/o			
9	Maria nohemy matta lozano	Cl 73c bis a sur 26f 27 mj	3125694417	X				30/08/2022	9:12	Beneficiaria/o			
10	Elizabeth giraldo delgado	Kr 27 72c 40 sur	3102215550	X				30/08/2022	13:30	Beneficiaria/o			
11	Amparo arias gonzález	Kr 27b 72 d 11 sur	3202478817	X				30/08/2022	9:15	Jasbleidy arias (hija)			
12	Isabelina patiño	Cl 75 sur 27 39	3124878109	X				30/08/2022	9:00	Beneficiaria/o			
13	Gustavo rodríguez rodríguez	Cl 72f sur 26c 69			X					Teléfonos fuera de servicio			
14	Luis hernando rodríguez	Kr 27a bis 73 27 sur	3196052252	X				30/08/2022	9:04	Beneficiaria/o			
15	Jorge enrique quinones melo	Kr 27a bis 73 27 sur		X				30/08/2022	9:40	Teléfono apagado			

247

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
16	José fermin rocha	Cl 72c sur 26c 59	3144789089	X				30/08/2022	9:11	María camacho (cónyuge)			
17	Luis alberto chitiva cortes	Cl 73 c bis sur 27 55	3216692804	X				30/08/2022	9:17	Beneficiaria/o			
18	José antonio moya zamora	Tv 27h 73a 36 sur	3134879806	X				30/08/2022	9:20	Beneficiaria/o			
19	Hebert fredy arias beltrán	Cl 73 c bis a sur 26f 02 mj 1	3222437847	X				30/08/2022	9:22	Beneficiaria/o			
20	José german garavito yate	Cl 73a sur 26d 16	3103650258	X				30/08/2022	9:28	Beneficiaria/o			
21	Julio cesar lemus zuleta	Kr 27 bis a 73 52 sur	3102641468	X				30/08/202	13:30	Beneficiaria/o			
22	Miller alejandro hurtado saenz	Cl 73 c sur 27 b 78	3133298798	X				30/08/2022	9:32	Beneficiaria/o			
23	José demetrio cruz velandia	Kr 27 bis b 72g 08 sur	3134650570	X				30/08/2022	10:32	Margot silva (cónyuge)			
24	Laurentino burgos rincón	Cl 75a bis sur 26f 18 mj	3103054330	X				30/08/2022	9:38	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

LISTADO DE REGISTRO DE[illegible]S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA[illegible]AS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
25	Anibal moreno	Cl 75b sur 27 52	3143996870	X				30/08/2022	9:42	Beneficiaria/o			
26	Fidel antonio téllez escarraga	Kr 27 73b 09 sur	3118604887	X				30/08/2022	9:46	Beneficiaria/o			
27	Celimo padilla vega	Kr 27 b 72d 23 sur	3127476592	X				30/08/2022	9:45	Beneficiaria/o			
28	Omar ferney niño	Tv 26c bis a 75b 45 sur	3124413043	X				30/08/2022	9:48	Beneficiaria/o			
29	Uriel casallas murcia	Kr 27a bis 72d 08 sur	3224654117	X				30/08/2022	10:58	Beneficiaria/o			
30	Florentino pico bastilla	Cl 73b sur 27c 24	3208846346	X				30/08/2022	9:53	Beneficiaria/o			
31	Julio cesar builes muriel	Cl 73a sur 26d 19	3118487659	X				30/08/2022	11:01	Beneficiaria/o			
32	Aengie esmeralda rojas alayon	Cl 74a sur 27b 25	3003824423	X				30/08/2022	9:56	Beneficiaria/o			
33	Yamile darley londoño cardona	Cl 73 sur 27 43 mj	3124630017	X				30/08/2022	9:59	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

LISTADO DE REGISTRO DE INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
34	Deyanira franco montenegro	Cl 73 sur 26g 08	3108884984	X				30/08/2022	10:01	Beneficiaria/o			
35	Leidy alejandra palacios reyes	Kr 27 bis a 73d 79 sur mj 1	3175184863	X				30/08/2022	11:03	Beneficiaria/o			
36	Meleidy torifio valencia	Kr 27 72g 09 sur	3003862691	X				30/08/2022	10:05	Beneficiaria/o			
37	Jorge luis perez ibañez	Cl 74a bis a sur 27 22	3222216871	X				30/08/2022	10:07	Beneficiaria/o			
38	Iris soto	Cl 73 sur 26f 03 mj	3014945406	X				30/08/2022	10:10	Beneficiaria/o			
39	Diana alejandra orjuela vivas	Cl 73c bis a sur 26c 90	3133174166	X				30/08/2022	10:17	Herberth enciso (cónyuge)			
40	Luisa fernanda tapiero trujillo	Cl 73b sur 27b 34	3204225899	X				30/08/2022	10:14	Beneficiaria/o			
41	Mayerly sánchez mendoza	Cl 75a bis sur 27 15	3005337559	X				30/08/2022	10:19	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
42	Luz angela rodríguez mesa	Kr 26f 72h 60 sur	3007661630	X				30/08/2022	10:21	Beneficiaria/o			
43	Paola andrea orjuela vivas	Cl 73c bis sur 27 61 mj	3188307282	X				30/08/2022	12:15	Beneficiaria/o			
44	Nicol johana sunce guarnizo	Cl 73d bis a sur 27 22 mj	3118483746	X				30/08/2022	10:23	Beneficiaria/o			
45	Jisel sarime lozano cerquera	Cl 73a sur 26f 02	3223203522	X				30/08/2022	10:26	Beneficiaria/o			
46	Beatriz bryith cangrejo moreno	Cl 75a bis a sur 27 64	3006144175	X				30/08/2022	10:29	Rubí cristina cangrejo (mamá)			
47	Heriberto vargas capera	Kr 27 bis 72g 15 sur	3104118734	X				30/08/2022	10:34	Iliani valencia (cónyuge)			
48	Claudia martínez clavijo	Cl 73b sur 27b 21	3103182894	X				30/08/2022	10:38	Beneficiaria/o			
49	Mayerly elsy arias gonzález	Kr 27 bis 72g 10 sur mj	3233441833	X				30/08/2022	10:41	Jimena arias (sobrina)			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
50	July andrea sanchez alonso	Dg 73 sur 27b 59	3208683396	X				30/08/2022	1:35	Beneficiaria/o			
51	Mayerly hernandez mendez	Cl 73b sur 26c 90	3147535044	X				30/08/2022	1:37	Beneficiaria/o			
52	Cindy jasbleidy duarte muñoz	Cl 72f sur 26d 23	3214223115	X				30/08/2022	1:44	Beneficiaria/o			
53	Virginia cortes pardo	Dg 74 b bis a sur 26 c 41	3045818605	X				30/08/2022	8:20	Oscar gomez			
54	Carmen elena socarraz quiroz	Tv 26c bis b 75a 10 sur	3182260567	X				30/08/2022	11:20	Beneficiaria/o			
55	Ines diaz	Cl 73b sur 27c 05	3115376448	X				30/08/2022	8:25	Beneficiaria/o			
56	Hermencia chitiva	Tv 26c bis a 75b 93 sur	3133470118	X				30/08/2022	8:27	Beneficiaria/o			
57	Lucila trujillo	Kr 27 bis a 73 22 sur	3504249750	X				30/08/2022	9:20	Armel zambrano			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE L S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
58	Zoila rosa gonzalez castro	Kr 26g 75a 08 sur	3213754804	X				30/08/2022	9:20	Sol heredia			
59	Flor herelia escobar vargas	Cl 74b sur 27b 24	3124371462	X				30/08/2022	9:40	Beneficiaria/o			
60	Maria helena baquero macana	Dg 73a bis sur 27c 34	3153776277	X				30/08/2022	11:40	Beneficiaria/o			
61	Alexandra patricia laverde cuadros	Kr 26g bis 72 g 11 sur	3106956737	X				30/08/2022	9:40	Beneficiaria/o			
62	Maria eva pulido celis	Cl 73 sur 26f 16	3123969119	X				30/08/2022	9:50	Beneficiaria/o			
63	Sandra yaneth rey vanegas	Kr 27 73c 32 sur	3114631050	X				30/08/2022	9:52	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
64	Luz miriam marulanda rodriguez	Cl 73a sur 26f 08 mj	3227306208	X				30/08/2022	9:55	Lesly maruranda			
65	Olga lucila riveros higuera	Kr 27 bis 72c 38 sur mj 1	3045743140 / 3004294852	X				30/08/2022	10:00	Guilermo tinjaca			
66	Alicia carreño	Cl 73a sur 26d 08	3222033561	X				30/08/2022	10:00	Beneficiaria/o			
67	Mary luz arredondo gonzalez	Cl 74 sur 27b 06	3209575218	X				30/08/2022	10:20	Brayan gonzalez			
68	Ana milena abaunza	Cl 75 sur 27 33	3223347856	X				30/08/2022	10:20	Leiddy soto			
69	Sandra patricia rodriguez ayala	Kr 26 d 72d 45 sur	3118774755	X				30/08/2022	10:23	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

LISTADO DE REGISTRO DE(S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA(.S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
70	Sandra patricia sanabria	Kr 26g 75 a sur 22	3112058058	X				30/08/2022	10:25	Beneficiaria/o			
71	Carmen rosa gonzalez	Cl 74b bis a sur 26f 38	3125338535	X				30/08/2022	10:27	Beneficiaria/o			
72	Raquel mendez peña	Cl 74b bis a sur 26f 28 mj	3222231450/	X				30/08/2022	10:30	Jose monroy			
73	Leidy sabogal ramirez	Tv 27h 73 34 sur	3125816464	X				30/08/2022	10:40	Beneficiaria/o			
74	Luz dary alonso pachon	Kr 27 bis 72c 44 sur	3208418290	X				30/08/2022	10:43	Beneficiaria/o			
75	Luz marina piragauta granados	Cl 73 d sur 27 45	3105922628	X				30/08/2022	10:46	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE(.S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA(.S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
76	Maria aurora perez avella	Kr 27a 73 38 sur mj	3132058469	X				30/08/2022	10:49	Beneficiaria/o			
77	Marisol latorre devia	Kr 26 g no. 75 a 26 sur	3142509800	X				30/08/2022	10:52	Beneficiaria/o			
78	Doris hernandez hernandez	Cl 75a bis sur 26f 60	3043704820	X				30/08/2022	11:00	Beneficiaria/o			
79	Ingrit mayerly salamanca vallarino	Kr 27 bis 72g 11 sur	3144403974	X				30/08/2022	11:03	Beneficiaria/o			
80	Claudia smit lucas tangarife	Cl 75 sur 27 a 05	3058812995	X				30/08/2022	11:07	Beneficiaria/o			

352

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

LISTADO DE REGISTRO DE I[illegible]S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAI[illegible]S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
81	Sandra paola bejarano reyes	Kr 27 bis a 73d 75 sur	3204380163	X				30/08/2022	11:10	Beneficiaria/o			
82	Maria elia meneses gomez	Kr 27a bis 73 23 sur mj	7925828	X				30/08/2022	14.20	Beneficiaria/o			
83	Maria consuelo perez salamanca	Cl 75a bis sur 27 46	3142406593	X				30/08/2022	14.22	Antonio			
84	Nury esperanza melo	Cl 72d bis a sur 26d 21	3228029294	X				30/08/2022	14.25	Beneficiaria/o			
85	Ana leonora ruiz mendez	Cl 72f sur 26f 05	3202166480	X				30/08/2022	17.10	Beneficiaria/o			
86	Celina caravali gonzalez	Kr 26f 75a 31 sur	3013367087	X				30/08/2022	15.02	Beneficiaria/o			
87	Franquelina ballesteros saenz	Kr 27 bis a 73 39 sur mj 1	3124927431	X				30/08/2022	14.29	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE L[illegible]S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL[illegible]S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
88	Miguelina gomez hoyos	Tv 26c bis 75c 16 sur	3224477519	X				30/08/2022	14.32	Osyesnid			
89	Ana aurora becerra vargas	Cl 73b sur 26f 03	3124018411	X				30/08/2022	14.34	Antonio			
90	Jaidi riaño	Cl 75a sur 27 27	3214827970	X				30/08/2022	14.36	Beneficiaria/o			
91	Custodia lugo quesada	Dg 73 sur 27b 13 mj	3132470983	X				30/08/2022	14.38	Beneficiaria/o			
92	Maria elvia arero cotrina	Kr 27 bis 72c 15 sur	3118580242	X				30/08/2022	14.40	Beneficiaria/o			
93	Flor triana avila	Cl 73 d sur 27 86	3219875796	X				30/08/2022	14.45	Beneficiaria/o			
94	Nubia herrera quintero	Cl 73 sur 27a 21	3103210032	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
95	Marina navas rojas	Cl 73c sur 26f 02	3115987980	X				30/08/2022	15.05	Beneficiaria/o			
96	Luz stella franco diaz	Cl 73b sur 27c 29	3232377049	X				30/08/2022	15.07	Luis garzón			
97	Rosalba rojas rojas	Cl 73 sur 26f 40	3217261483	X				30/08/2022	15.09	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE I[illegible]S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAI[illegible]S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
98	Ismelda perez garcia	Cl 73d sur 27 62	3146416452	X				30/08/2022	15.11	Beneficiaria/o			
99	Mariela sandoval vera	Cl 73b sur 26f 38	3125416090	X				30/08/2022	15.20	Beneficiaria/o			
100	Maria del carmen vallejo ruano	Kr 27a 72d 02 sur	3115022681	X				30/08/2022	15.15	Ivon			
101	Maria odilia martinez cabrera	Cl 73c bis sur 27a 23	3232154019	X				30/08/2022	15.17	Esperanza			
102	Evangelina madrigal tapia	Kr 27 bis 72c 27 sur	3023880355	X				30/08/2022	15.19	Jackeline			
103	Andrea herrera rangel	Cl 73a sur 27b 17	3157927170		X			30/08/2022	15.22	Beneficiaria/o			
104	Maria del carmen rodriguez bacares	Cl 73a sur 26f 20 mj	3213369716	X				30/08/2022	15.24	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
105	Maria claudia martinez velasquez	Kr 27b 72d 29 sur	3553980	X				30/08/2022	15.26	Nubia			
106	Purificacion cortes	Cl 73 b sur 26 c 74	3123300432		X			30/08/2022	15.30	Beneficiaria/o			
107	Carmen semanate	Kr 26f 75a 35 sur	3128418184	X				30/08/2022	15.32	Kely chavez			
108	Emperatriz ramirez bohorquez	Cl 73 a sur 26f 15	3017239448	X				30/08/2022	15.34	Zulma			
109	Blanca flor rincon	Cl 73 d sur 27 91	3222546879	X				30/08/2022	15.40	Beneficiaria/o			
110	Carmen elvira reyes caro	Cl 73d bis a sur 27 33 mj	3214649810	X				30/08/2022	15.42	Beneficiaria/o			
111	Herminia forero bustos	Kr 27 bis 72c 50 sur	3123569927	X				30/08/2022	16.20	Beneficiaria/o			
112	Maria del rosario baez chaparro	Kr 27 bis a 73 34 sur mj	3222391330		X			30/08/2022	15.46	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
113	Leonor chisco saray	Cl 76 sur 26h 04	3144495633	X				30/08/2022	15.48	Beneficiaria/o			
114	Norma constanza melo	Cl 73d bis sur 26g 02 mj	3212342802	X				30/08/2022	15.50	Milena			
115	Lastenia palacios murillo	Cl 75a bis sur 26f 53	3133693896	X				30/08/2022	15.52	Beneficiaria/o			
116	Olga maria alonso moreno	Dg 73 sur 27b 53	3133434948	X				30/08/2022	15.54	Beneficiaria/o			
117	Maria cristina quiroga ruge	Cl 73a sur 26d 04	3015701136	X				30/08/2022	16.00	Beneficiaria/o			
118	Maria gladys triana	Kr 27a 73 18 sur mj	3053313205	X				30/08/2022	16.02	Jorge			
119	Maria ligia rojas	Cr27 h 72c 34 sur	3165601531	X				30/08/2022	17.44	Beneficiaria/o			
120	Ana feliz diaz patiño	Cl 73d bis a sur 27a 50	3203274420	X				30/08/2022	16.08	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
121	Maria nancy canacue romero	Kr 27 73 02 sur	3114624076	X				30/08/2022	16.10	Beneficiaria/o			
122	Aracelly lievano de mahecha	Kr 27 72c 45 sur	3013626711	X				30/08/2022	16.12	Beneficiaria/o			
123	Martha helena pardo cortes	Kr 26h 75b 19 sur mj	3046441426	X				30/08/2022	16.15	Beneficiaria/o			
124	Maria hemir tapia hernandez	Cl 72 f sur 26c 74 mj	3228972083	X				30/08/2022	16.17	Beneficiaria/o			
125	Ana silvia aguilar barrera	Kr 27 72g 17 sur	3214983047	X				30/08/2022	16.20	Beneficiaria/o			
126	Amanda bernal ortiz	Cl 73 sur 26f 09	3144776066	X				30/08/2022	16.22	Ivon vargas			
127	Carmen elisa tolosa cepeda	Kr 27b 74a 06 sur	3212379907	X				30/08/2022	16.25	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
128	Maria elba arias bonilla	Cl 73 c bis sur 27 77	3005565180	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
129	Maria elizabeth cedano burbano	Kr 27a 72c 22 sur	3208991478	X				30/08/2022	17.32	Beneficiaria/o			
130	Maria eugenia gonzalez	Kr 26g 75a 38 sur	3222299160	X				30/08/2022	16.34	Beneficiaria/o			
131	Orfanides losada perdomo	Cll 73c sur 27b 62	3024631097	X				30/08/2022	16.36	Beneficiaria/o			
132	Esther marina yara tique	Kr 27 72c 27 sur	3134330712		X			30/08/2022	16.40				
133	Julia martinez segura	Cl 73a sur 26f 27	3214401590	X				30/08/2022	17.42	B beneficiaria/o			

292

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
134	Rosa elena gomez quintero	Kr 27 73b 15 sur	3204003218	X				30/08/2022	16.44	Beneficiaria/o			
135	Ines sofia reyes castro	Kr 27 bis a 73d 83 sur mj	3143126795	X				30/08/2022	16.46	Beneficiaria/o			
136	Monica andrea cristancho quimbayo	Cl 73c sur 27b 26	3042372414	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
137	Amparo tique romero	Cl 72c sur 26c 73 mj	3217412036	X				30/08/2022	16.52	Beneficiaria/o			
138	Ana delia gonzalez mateus 1	Dg 73a sur 27c 57 mj	3138762671	X				30/08/2022	16.54	Beneficiaria/o			
139	Elizabeth sepulveda diaz	Cl 73c sur 26f 38	3124891094	X				30/08/2022	16.56	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
140	Esperanza castillo alturo	Kr 27 bis a 73 40 sur mj	3227710293 / 3224467710		X			30/08/2022	16.58				
141	Querubin tirado medina	Kr 27 bis b 72g 16 sur	3134247138		X			30/08/2022	10:00 am				
142	Gumersindo soler silva	Cl 75a bis sur 27 39	3012239646		X			30/08/2022	10:02 am	Beneficiaria/o			
143	Pablo enrique calderon gaitan	Kr 27 bis 72g 38 sur	3132275594	X				30/08/2022	10:04 am	Beneficiaria/o			
144	Leopoldo leon morales	Kr 27 a 73 46 sur	3107827583 / 7925803	X				30/08/2022	10:06am	Beneficiaria/o			
145	Jose saul monroy martinez	Cl 75a sur 26f 60 mj	3016275293	X				30/08/2022	10:08 am	Beneficiaria/o			
146	Florentino juez barreto	Kr 27 bis a 73 31 sur	3138057772	X				30/08/2022	10:10 am	Beneficiaria/o			
147	José alonso muñoz scarpetta	Cl 73b sur 26f15 mj	3204206698	X				30/08/2022	10:12 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
148	Fermin madrigal tique	Kr 27 72c 33 sur	3222433981	X				30/08/2022	10:14 am	Beneficiaria/o			
149	Salomon urrea baquero	Kr 27a 72c 34 sur mj	3143823775	X				30/08/2022	10:16 am	Beneficiaria/o			
150	Luis moreno viuche	Kr 27 bis 72g 34 sur	3214721310	X				30/08/2022	10:18 am	Beneficiaria/o			
151	Luis alfonso piay	Kr 27 bis 72c 33 sur	3195538905	X				30/08/2022	10:20 am	Beneficiaria/o			
152	Omar medina ortega	Cl 73b 27b 33 mj	3214915290 / 3134742520	X				30/08/2022	10:22 am	Beneficiaria/o			
153	Gustavo monroy fonseca	Cl 73d sur 27 75	3123568476	X				30/08/2022	10:24 am	Beneficiaria/o			
154	Jorge eliecer huertas gil	Kr 27a bis 73 11 sur mj 1	3116557439 / 3127651217	X				30/08/2022	10:26 am	Beneficiaria/o			
155	Luis libardo londoño velazquez	Kr 27 72g 24 sur	3123222778	X				30/08/2022	10:28 am	Beneficiaria/o			
156	Carlos rodriguez	Cl 74 sur 27b 36	3124743394 / 3185803394	X				30/08/2022	10:30 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
157	Luis alirio correa lopez	Kr 27a 73 06 sur	3132436817	X				30/08/2022	10:32 am				
158	Misael macana	Dg 73a bis sur 27c 28	3025220316		X			30/08/2022	10:34 am	Beneficiaria/o			
159	Juan de jesus sedano ayala	Cl 73d sur 27 50	3142396890 / 3108078918	X				30/08/2022	10:36 am	Beneficiaria/o			
160	Alejandrino españa garcia	Cr 27a bis 72d 05 sur	3143741713	X				30/08/2022	10:38 am	Beneficiaria/o			
161	Aristobulo triana garzon	Kr 27 72c 70 sur	3134701577	X				30/08/2022	10:40 am	Beneficiaria/o			
162	Gildardo morales velez	Kr 27 72c 21 sur	3144692922	X				30/08/2022	10:42 am				
163	Rafael rodriguez zamora	Cl 73c bis sur 27 49	3125816906		X			30/08/2022	10:44 am				
164	Posidio huerta huertas	Tv 27h 72d 14 sur	3143842751 - 305706490		X			30/08/2022	10:46 am	Beneficiaria/o			
165	Oscar henry misnaza rivera	Kr 27 72c 12 sur	3193081784 / 3052829834	X				30/08/2022	10:48 am	Beneficiaria/o			
166	Melquisedec ortiz	Kr 27 bis a 73 28 sur	3204112471	X				30/08/2022	10:50 am				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE[illegible]AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA[illegible]AS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
167	Maria teresa montoya de bermudez	Cl 73b sur 26f 32	3223716225 / 3219967830		X			30/08/2022	10:52 am	Beneficiaria/o			
168	Luz marina tribiño ramirez	Kr 27 bis 72g 27 sur mj	3052740270	X				30/08/2022	10:54 am	Beneficiaria/o			
169	Berenice rincon tellez	Cl 75a bis sur 26f 47	3014460832	X				30/08/2022	10:56 am	Beneficiaria/o			
170	Anayibe castro	Cl 73a sur 26f 45 mj	3229427288 / 3229427288	X				30/08/2022	10:58 am	Beneficiaria/o			
171	Ana gladys pachon churque	Kr 27b 72d 05 sur	3195107827	X				30/08/2022	11:00 am	Beneficiaria/o			
172	Mercedes vasquez bonilla	Cl 73d bis a sur 27 28	3114056810	X				30/08/2022	11:02 am	Beneficiaria/o			
173	Maria lucia barreño agudelo	Kr 27 75 24 sur	7665948	X				30/08/2022	11:04 am	Beneficiaria/o			
174	Mariela cardona cardona	Kr 27a bis 73 10 sur	3106661661	X				30/08/2022	11:06 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
175	Ofelia medina arcila	Kr 27a 73 26 sur	3204976449 / 3213514640	X				30/08/2022	11:08 am	Beneficiaria/o			
176	Maribel hurtado	Dg 73 bis sur 27b 03	3113064713 / 7688374	X				30/08/2022	11:10 am	Beneficiaria/o			
177	Lucia herrera quintero	Cl 75a sur 27 63	3045431591	X				30/08/2022	11:12 am	Beneficiaria/o			
178	Blanca elvira ramirez montes	Tv 26c bis a 75a 03 sur	3207052229	X				30/08/2022	11:14 am	Beneficiaria/o			
179	Maria sixta hurtado garcia	Dg 73 sur 27b 11	3212648214	X				30/08/2022	11:16 am	Beneficiaria/o			
180	Maria nubia lozano cerquera	Kr 27 bis a 73 64 sur	3118351248	X				30/08/2022	11:20 am	Beneficiaria/o			
181	Olga lucia lozano cerquera	Kr 27 bis a 73 70 sur	3132800086	X				30/08/2022	11:22 am	Beneficiaria/o			
182	Elizabeth ospina caicedo	Cl 72 d bis a sur 26c 79	3044015485 / 3134403693	X				30/08/2022	11:24 am	Mónica velosa			
183	Hector hernando velosa	Cl 73c bis sur 27a 11	3138907366 / 7422890	X				30/08/2022	11:26 am	Floriceni libarda			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE[illegible]AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA[illegible]AS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
184	Santiago olaya bolaños	Cl 74a sur 27b 61	3144182123	X				30/08/2022	11:28 am	Graciela sánchez			
185	Jose javier olarte mahecha	Cl 75a bis a sur 27 28	3115343936	X				30/08/2022	11:30 am	Arnulfo moncada			
186	Luis carlos lombana	Kr 26f 72d 14 sur	3219699007	X				30/08/2022	11:32 am	Gladys pérez			
187	Emiliano perez avella	Kr 27b 73a 16 sur	3202715994	X				30/08/2022	11:34 am	Edilia moncada			
188	Manuel moncada fandiño	Cl 72 c sur no. 26 c 69	3133354936	X				30/08/2022	11: 36 am	Paula gonzález			
189	Willians gonzalez pedroza	Cl 73c sur 26f 03 mj	3026587856	X				30/08/2022	11:38 am	Carlos salcedo			
190	Luis hernando salcedo zamudio	Kr 27 bis b 72g 28 sur	3208957466 / 3043860442	X				30/08/2022	11:40 am	Yuly infante hija			
191	Gilberto infante marino	Cl 72g sur 27a 01 in 2 mj1	3206787352	X				30/08/2022	11:42 am	July sánchez			

272

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
192	Jose alfonso mora arevalo	Dg 73 sur 27b 54	3125950342	X				30/08/2022	11:44 am	Maria ramirez			
193	Sergio toro	Dg 73 bis sur 27b 36	3224249878 / 31223962348	X				30/08/2022	11:46 am	Luz valencia			
194	Virgelina rodriguez	Kr 26f 73b 16 sur	3133020903 / 3166965757	X				30/08/2022	11:48 am	Diana jaimes			
195	Blanca marina martinez rodriguez	Kr 27 72g 68 sur	3118936887 / 3107809112	X				30/08/2022	11:50 am	María soledad pachanchique			
196	Rosalba pacanchique de martinez	Kr 27 bis 72c 22 sur	3194981414	X				30/08/2022	11:52 am	Luis ballesteros			
197	Magdalena lemus chaparro	Cl 75b sur 27 58	7901023	X				30/08/2022	11:54 am	Joselyn pérez			
198	Liliana rendon lozano	Cl 75 sur 26f 29	3014692772	X				30/08/2022	11:56 am	Jeison cárdenas			
199	Luz stella betancourth giraldo	Cl 73b sur 26f 02 mj	3022341082 / 7902940	X				30/08/2022	11:58 am				

274

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20290 GUIA No.: 9153364306

Cód. CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CALLE 73 B SUR # 26 F - 32 BARRIO BELLA FLOR

MARIA TERESA MONTOYA

Tel/cel: 3223716225 D.I./NIT: 20407697

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951781

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:SE0000051241696

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

25f830efbcf65e750ecdb8a30d739d12567a365e1763220f15d81c28696827e7f0c2a31ad

ef0ea035b8cdb13e2d33b444

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364306

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-S-CL-FDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declaran aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 855 de Marzo 9/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 10:24

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20287 GUIA No.: 9153364303

Cód. CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

DG 73A BIS SUR # 27 C - 28 BARRIO BELLA FLOR

MISAEL MACANA

Tel/cel: 3025220316 D.I./NIT: 11384721

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951817

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:SE0000051241693

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

7e2621a45e9ddbd458fd1e54cd3be36b3e0e2a4b6b44b1b63388d6db0154e2f5f3a215

740cfebb4bf229ode8adab9268

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364303

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-S-CL-FDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declaran aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 855 de Marzo 9/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 10:18

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20285 GUIA No.: 9153364301

Cód. CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

TRV 27 H # 72 D - 14 SUR BARRIO BELLA FLOR

POSIDIO HUERTA HUERTAS

Tel/cel: 3143842751 D.I./NIT: 19414665

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951923

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:SE0000051241738

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

49c86ee3b745e1190d328ff6271d9bedce32d33d1a11c1efa3477687ea011fd1a7130d4e4

2aad13f20567e6f385cc80fe

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364301

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-S-CL-FDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declaran aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 855 de Marzo 9/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

servientrega

DIAN:09898 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA, Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 19/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20291 GUIA No.: 9153364307

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CUFE:
1b40e30be06a2013f84e7cb4ed92d125e48084542d50d8c128dde3585db9e1b58cc7ce
d50fe48b33817c3d4733558b06a
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364307

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: **BOGOTA**

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CALLE 73 C BIS SUR # 27 - 49 BARRIO BELLA FLOR

RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA

Tel/cel: 3125816906 D.I./NIT: 19369086
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951809
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 5,000
Vr. Total: $ 5,350
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241695
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :
MONICA ROMERO CANACUE

OG-S-CL-IDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declarar acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Mintransporte de Transporte: Licencias No. 895 de Marzo 6/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

REMITENTE

275

---

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09898 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 19/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 9:49

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20281 GUIA No.: 9153364297

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
d4755df983099828b159f00ab649701ba8c5447811285250083338071fd7817317943
3e565e4fb7104a648b23734a1
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364297

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: **BOGOTA**

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CALLE 73 B SUR # 26 C - 74

PURIFICACION CORTES

Tel/cel: 3123300432 D.I./NIT: 41596028
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951782
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería exp/esa: $ 5,000
Vr. Total: $ 5,350
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241740
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :
MONICA ROMERO CANACUE

OG-S-CL-IDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declarar acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Mintransporte de Transporte: Licencias No. 895 de Marzo 6/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

REMITENTE

---

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09898 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 19/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 9:38

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20278 GUIA No.: 9153364294

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
e373dd93b430de30eed152867594727210c6e38538e083447e00f988e45e0f192c82f51
d3ce4dc7e1638d1ce15e147cff
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364294

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: **BOGOTA**

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

KRA 27 BIS A # 73 - 34 SUR MJ BARRRIO BELLA FLOR

MARIA DEL ROSARIO BAEZ

Tel/cel: 3222391330 D.I./NIT: 41738651
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951805
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 5,000
Vr. Total: $ 5,350
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241744
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :
MONICA ROMERO CANACUE

OG-S-CL-IDM-F-66 V.4

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declarar acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Mintransporte de Transporte: Licencias No. 895 de Marzo 6/2001, MINTIC: Licencia No. 1778 de Sept. 7/2010.

REMITENTE

servientrega

DIAN:09086 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20280 GUIA No.: 9153364296

276

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CUFE:
122f344ae78e55963933c02b8b1a9dd1d7e84dc99aa006b610b9909f1b6773247edace
dfb995a73c31d8b84335497416
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364296

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CALLE 75 A BIS SUR # 27 - 39

GUMERCINDO SOLER SILVA

Tel/cel: 3012239646 D.I./NIT: 2934082
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951798
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 5,000
Vr. Total: $ 5,350
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241732
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 885 de Marzo 9/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido disuelve acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

---

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09086 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 10:15

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20284 GUIA No.: 9153364300

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
f9324645908c2aba1e136a11db3560a3eb5341e75a5985dc043a53114f00125155e89
932307e9a58842fb0899bc8d5
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9153364300

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.:CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CRA 27 # 72 C - 27 SUR BARRIO BELLA FLOR

ESTHER MARINA YARA TIQUE

Tel/cel: 3134330712 D.I./NIT: 51906876
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951822
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 5,000
Vr. Total: $ 5,350
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241734
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 885 de Marzo 9/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido disuelve acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

---

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09086 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18764027327455 DEL 4/1/2022 AL 10/1/2023 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:01 / 09 / 2022 11:36

Fecha Prog. Entrega:02 / 09 / 2022

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2529

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20294 GUIA No.: 9154585568

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
s2b84fab35c3b1e8e3fd4b44373648298d4f9b1d204a7731c7553fdb0087a36acbeab26
cd38375949fab5814cb9e0ff6
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330

GUÍA No. 9154585568

DESTINATARIO

BOG 10 S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P.: CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

CALLE 72 F SUR # 26 C - 69 BARRIO BELLA FLOR

GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Tel/cel: 3212400841 D.I./NIT: 79100762
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951772
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 500
Vr. Mensajería expresa: $ 5,500
Vr. Total: $ 6,000
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:SE0000051241701
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :

MONICA ROMERO CANACUE

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

REMITENTE Ministerio de Transporte: Licencias No. 885 de Marzo 9/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido disuelve acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Socializacion contrato 999 - 2022

Fecha:	Día	Mes	Año
	03	09	2022

Hora: 7:30 AM **Dependencia:**

No.	Nombres y Apellidos	Entidad - Área	Vinculación				Cargo						Genero			Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Director	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Tecnico	Conductor	Masculino	Femenino	Otro			
1	Amy Tatiana Rodriguez M	Building social				X			X					X		Tatiro17@gmail.com	3133573957	ATRM
2	Yeny Elizabeth Sanguino	Building Social				X			X					X		Yeny.Sanguino@hotmail.com	3132218006	Yeny Sanguino R
3	Angy Lorena Orozco Montilla	Building-HSE				X			X					X		angy.orozco96@gmail.com	3155172218	
4	Robert Bernardo Nova	Building - Social				X			X				X			Robertbn882@gmail.com	3005560 60	
5	RICARDO JAIMES ROJAS	BUILDING ARQ				X			X				X			RJANZOAR@HOTMAIL.COM	3123637209	
6	Jessica Larlon Lancero	Building Social				X			X					X		jancerlon@umanizarte.edu.co	3162869278	Jessica M.
7	Dora Carolina Arevalo B.	Inplayco				X								X		dcarevalo73@gmail.com	3213737742	
8	Luisa Fernanda Pinzon F	Inplayco.				X								X		luisa.pinzon@hotmail.com	3223155680	
9	Jessica Sepulveda M	Inplayco.				X								X		Jessicasepulveda.trabajos@gm	3103317442	
10	Leidy Lambis Castro	Inplayco				X								X		llambiscastro@gmail.com	3202474431	Leidy Lambis
11	Stanley Ortola	Inplayco				X								X		Socialinplayco@gmail.	3023163198	
12	Robert Rojas	inplayco				X		X					X			Sysoluciones1a02@gmail.ca	3125226162	
13	Carla Eraldo Jimenez	Inplayco				X											3214946042	
14	Cesar Fuenmayor S	Inplayco				X										inplayco sdht 0096	3133640891	
15	Maria Isabel Serrano P	SDHT-SB-MV														maria.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

TÜVRheinland CERTIFICADO Sistema de Gestión ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105638812

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Socialización Contrato 909 - 2021

Fecha:	Dia	Mes	Año
	13	09	2021

Hora		Dependencia	
	7:30 Am		

No.	Nombres y Apellidos	Entidad - Área	Vinculación				Cargo							Genero			Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Director	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Tecnico	Conductor	contratista	Masculino	Femenino	Otro			
	Carolina Posada R	SDHT-SB-MV				X											diana.posada@habitatbogota.gov.co	3124157755	Carolina P.
	JHILA ACEVEDO B	SDHT-SB-MV				X											jhila.acevedo@habitatbogota.gov.co	3114602490	JHILA

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO			EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ		OTRO						ETNIA: A: Afro R: Romgitanos Ra: Raizal I: Indigena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto				SI	NO		
													ETNIA	DIS	VC	CH				
1	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	23443742						60	3195107827		KR 27B 72D 05 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0677	Ana Gladys P.
2	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	23574119						58	3102469327 / 3114056810		CL 73D BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR							MVBF_1166	Mercedes Vasq.
3	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	23623355							3118936887 / 3107809112		KR 27 72G 68 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0938	
4	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO	23777086						73	7665948		KR 27 75 24 SUR	BELLA FLOR							MVBF_241	M. Lucia B.
5	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	23923683						83	3194981414		KR 27 BIS 72C 22 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0767	Elberia Soledad
6	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	23943497						66	7901023		CL 75B SUR 27 58	BELLA FLOR							MVBF_046	Magdalena
7	MARIELA CARDONA CARDONA	24328098						64	3106661661		KR 27A BIS 73 10 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1045	Mariela C.
8	OFELIA MEDINA ARCILA	24364928						52	3204976449 / 3213514640		KR 27A 73 26 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1052	Ofelia.
9	MARIBEL HURTADO	24575764						59	3113064713 / 7688374		DG 73 BIS SUR 27B 03	BELLA FLOR							MVBF_0622	Maribel
10	LILIANA RENDON LOZANO	24589579						52	3014692772		CL 75 SUR 26F 29	BELLA FLOR							MVBF_236	Liliana R.
11	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	24660532						59	3022341082 / 7902940		CL 73B SUR 26F 02 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1306	Luz Stella
12	LUCIA HERRERA QUINTERO	24727583						61	3045431591		CL 75A SUR 27 63	BELLA FLOR							MVBF_085	Lucia He
13	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES	25220503						57	3207052229		TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1496	Blanca Elvira
14	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA	26366802						51	3212648214		DG 73 SUR 27B 11	BELLA FLOR							MVBF_645	Maria Sixta H.
15	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	26473577						57	3118351248		KR 27 BIS A 73 64 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1078	M. Nubia L.
16	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	26473801						50	3132800086		KR 27 BIS A 73 70 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1100	Olga Lozano
17	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	28435285						64	3044015486 / 3134403693		CL 72 D BIS A SUR 26C 79	BELLA FLOR							MVBF_0841	Elizabeth Ospina
18	VIRGINIA CORTES PARDO	28482942						69	3222931060 / 3045818605		DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	BELLA FLOR							MVBF_312	Virginia Cortes
19	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ	28554499						40	3182260567		TV 26C BIS B 75A 10 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0225	
20	INES DIAZ	28696565						76	3115376448		CL 73B SUR 27C 05	BELLA FLOR							MVBF_0531	
21	HERMENCIA CHITIVA	28787016						76	3133470118		TV 26C BIS A 75B 93 SUR	BELLA FLOR							MVBF_232	Hermencia

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

280

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 964 - 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	QUERUBIN TIRADO MEDINA	2110005								KR 27 BIS B 72G 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0987	
2	GUMERSINDO SOLER SILVA	2934082								CL 75A BIS SUR 27 39	BELLA FLOR							MVBF_066	
3	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN	3202905					58	3132275594		KR 27 BIS 72G 38 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0972	Pablo Enrique Calderon
4	HECTOR HERNANDO VELOSA	3202934					55	3138907366 / 7422890		CL 73C BIS SUR 27A 11	BELLA FLOR							MVBF_1124	Hector Velosa
5	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	3253819					64	3144182123		CL 74A SUR 27B 61	BELLA FLOR							MVBF_1465	Santiago O
6	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA	3256255					52	3115343936		CL 75A BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR							MVBF_071	Gracias S
7	LUIS CARLOS LOMBANA	3279905					81	3219699007		KR 26F 72D 14 SUR	BELLA FLOR							MVBF_820	
8	LEOPOLDO LEON MORALES	4111769					73	3107827583 / 7925803		KR 27 A 73 46 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1073	
9	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ	4171683					59	3016275293		CL 75A SUR 26F 60 MJ	BELLA FLOR							MVBF_235	
10	FLORENTINO JUEZ BARRETO	4269201					62	3138057772		KR 27 BIS A 73 31 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1061	
11	EMILIANO PEREZ AVELLA	4297712						3202715994		KR 27B 73A 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1013	Gladys Perez Avella
12	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	4937396					93	3204206698		CL 73B SUR 26F15 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1264	
13	MANUEL MONCADA FANDIÑO	5599492					72	3133354936		CL 72 C SUR No. 26 C 69	BELLA FLOR							MVBF_805	
14	FERMIN MADRIGAL TIQUE	5883598					57	3222433981		KR 27 72C 33 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0760	
15	SALOMON URREA BAQUERO	5935899					60	3143823775		KR 27A 72C 34 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_0727	
16	LUIS MORENO VIUCHE	5970061					54	3214721310		KR 27 BIS 72G 34 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0953	
17	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	6116305					55	3026587856		CL 73C SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1234	Paola Gonzalez
18	LUIS ALFONSO PIAY	6185068					74	3195538905		KR 27 BIS 72C 33 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0736	
19	OMAR MEDINA ORTEGA	6460989					64	3214915290 / 3134742520		CL 73B 27B 33 MJ	BELLA FLOR							MVBF_530	Omar Medina
20	GUSTAVO MONROY FONSECA	6764955					62	3123568476		CL 73D SUR 27 75	BELLA FLOR							MVBF_1149	
21	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	7506142					74	3116557439 / 3127651217		KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	BELLA FLOR							MVBF_1000	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 964 - 2022					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO			EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO							ETNIA: A: Afro R: Romgitanos Ra:Raizal I: Indígena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto				SI	NO		
													ETNIA	DIS	VC	CH				
1	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	8242940							3123222778		KR 27 72G 24 SUR	BELLA FLOR							MVBF_950	
2	CARLOS RODRIGUEZ	10163877						71	3124743394 / 3185803394		CL 74 SUR 27B 36	BELLA FLOR							MVBF_1424	
3	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	11250842						68	3132436817		KR 27A 73 06 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1068	
4	MISAEL MACANA	11384721									DG 73A BIS SUR 27C 28	BELLA FLOR							MVBF_605	
5	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	11450108						63	3208957466 / 3043860442		KR 27 BIS B 72G 28 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0975	
6	GILBERTO INFANTE MARINO	12192023						55	3206787352		CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	BELLA FLOR							MVBF_0990	
7	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	13844873						67	3142396890 / 3108078918		CL 73D SUR 27 50	BELLA FLOR							MVBF_1130	
8	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA	14269244						64	3143741713		CR 27A BIS 72D 05 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0694	
9	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	17090081						79	3125950342		DG 73 SUR 27B 54	BELLA FLOR							MVBF_683	
10	SERGIO TORO	17640148						56	3224249878 / 3123962348		DG 73 BIS SUR 27B 36	BELLA FLOR							MVBF_0657	
11	ARISTOBULO TRIANA GARZON	19189748						69	3134701577		KR 27 72C 70 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0793	
12	GILDARDO MORALES VELEZ	19274929						70	3144692922		KR 27 72C 21 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0761	
13	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	19369086									CL 73C BIS SUR 27 49	BELLA FLOR							MVBF_1117	
14	POSIDIO HUERTA HUERTAS	19414665									TV 27H 72D 14 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0679	
15	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA	19436227			X			62	3193081784 / 3052829834		KR 27 72C 12 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0789	
16	MELQUISEDEC ORTIZ	19494365						62	3204112471		KR 27 BIS A 73 28 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1081	
17	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	20407697									CL 73B SUR 26F 32	BELLA FLOR							MVBF_1315	
18	VIRGELINA RODRIGUEZ	20408377						77	3133020903 / 3166965757		KR 26F 73B 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1295	
19	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	20905820						50	3052740270		KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_0979	
20	BERENICE RINCON TELLEZ	21116348						70	3014460832		CL 75A BIS SUR 26F 47	BELLA FLOR							MVBF_145	
21	ANAYIBE CASTRO	21145488						73	3229427288 / 3229427288		CL 73A SUR 26F 45 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1303	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

262

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra: Raizal I: Indígena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Víctima del conflicto				SI	NO		
												ETNIA	DIS	VC	CH				
1	LUCILA TRUJILLO	28851583					71	3204012378-3504249750		KR 27 BIS A 73 22 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1096	
2	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	28879603					67	3213754804		KR 26G 75A 08 SUR	BELLA FLOR							MVBF_094	
3	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	28985573					49	3124371462		CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR							MVBF_1455	
4	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS	30248898					56	3138762671		DG 73A SUR 27C 57 MJ	BELLA FLOR							MVBF_0595	
5	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	31257494					69	313255301 / 7925828		KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1003	
6	MARIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA	35486613					62	3142406593		CL 75A BIS SUR 27 46	BELLA FLOR							MVBF_089	
7	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ	35492802				X	61	3124891094		CL 73C SUR 26F 38	BELLA FLOR							MVBF_1276	
8	NURY ESPERANZA MELO	35498062					61	3228029294 / 3118649727		CL 72D BIS A SUR 26D 21	BELLA FLOR							MVBF_835	
9	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	35508882					58	3202166480		CL 72F SUR 26F 05	BELLA FLOR							MVBF_854	
10	CELINA CARAVALI GONZALEZ	35526752					47	3204441733		KR 26F 75A 31 SUR	BELLA FLOR							MVBF_107	
11	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	35530377					44	3124927431		KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	BELLA FLOR							MVBF_1050	
12	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	36285832					46	3224477519 / 3108767562		TV 26C BIS 75C 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0294	
13	ANA AURORA BECERRA VARGAS	37706467					77	3124018411		CL 73B SUR 26F 03	BELLA FLOR							MVBF_1270	
14	JAIDI RIAÑOS	38202862					52	3214827970		CL 75A SUR 27 27	BELLA FLOR							MVBF_075	
15	CUSTODIA LUGO QUESADA	38220773					74	3132470983 / 3003992760 / 3154570441		DG 73 SUR 27B 13 MJ	BELLA FLOR							MVBF_660	
16	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	39566424					62	3118580242		KR 27 BIS 72C 15 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0730	
17	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	39639396								KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1076	
18	FLOR TRIANA AVILA	39700614						3219875796		CL 73 D SUR 27 86	BELLA FLOR							MVBF_1110	
19	NUBIA HERRERA QUINTERO	39712925					59	3103210032		CL 73 SUR 27A 21	BELLA FLOR							MVBF_1007	
20	MARINA NAVAS ROJAS	39715971					57	3115987980		CL 73C SUR 26F 02	BELLA FLOR							MVBF_1280	
21	LUZ STELLA FRANCO DIAZ	39722355					54	3232377049 / 3112160353		CL 73B SUR 27C 29	BELLA FLOR							MVBF_0540	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 08	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra: Raizal I: Indigena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto							
												ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	MARIA GLADYS TRIANA	51578449		X	X		62	3227191487 / 3053313205		KR 27A 73 18 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1048	
2	MARIA LIGIA ROJAS	51595274				X	66	3165601531		CR27 H 72C 34 SUR	BELLA FLOR							MVBF_791	
3	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	51595874		X	X			3203274420		CL 73D BIS A SUR 27A 50	BELLA FLOR				X			MVBF_1155	
4	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	51613335	X	X		X	61	3114624076 / 3202623396		KR 27 73 02 SUR	BELLA FLOR				X			MVBF_1347	
5	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	51638001					65	3013626711 / 3015079273		KR 27 72C 45 SUR	BELLA FLOR				X			MVBF_0758	
6	MARTHA HELENA PARDO CORTES	51652618		X	X		63	3046441426		KR 26H 75B 19 SUR MJ	BELLA FLOR				X			MVBF_022	
7	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	51731350		X		X	59	3228972083 /3148836272		CL 72 F SUR 26C 74 MJ	BELLA FLOR							MVBF_0840	
8	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	51735225		X	X		59	3115791705 / 3214983047		KR 27 72G 17 SUR	BELLA FLOR			X	X			MVBF_964	
9	AMANDA BERNAL ORTIZ	51740130		X	X		58	3203564152-3144776066		CL 73 SUR 26F 09	BELLA FLOR		X					MVBF_1343	
10	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	51753672		X	X		58	3212379907		KR 27B 74A 06 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1191	
11	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	51759078					61	3005565180		CL 73 C BIS SUR 27 77	BELLA FLOR							MVBF_1121	
12	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO	51759163					60	3208991478 / 3005126060		KR 27A 72C 22 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0741	
13	MARIA EUGENIA GONZALEZ	51790417					57	3222299160		KR 26G 75A 38 SUR	BELLA FLOR							MVBF_117	
14	ORFANIDES LOSADA PERDOMO	51895481				X	55	3024631097		CLL 73C SUR 27B 62	BELLA FLOR							MVBF_552	
15	ESTHER MARINA YARA TIQUE	51906676					55			KR 27 72C 27 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0749	
16	JULIA MARTINEZ SEGURA	52008175				X	52	3214401590		CL 73A SUR 26F 27	BELLA FLOR							MVBF_1311	
17	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	52037700					51	3204003218		KR 27 73B 15 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1083	
18	INES SOFIA REYES CASTRO	52058750		X		X	53	3143126795	Iglesia	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	BELLA FLOR				X			MVBF_1196	
19	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO	52130951		X		X	48	3042372414		CL 73C SUR 27B 26	BELLA FLOR				X			MVBF_0558	
20	AMPARO TIQUE ROMERO	52152205				X	48	3217412036 / 3132634350		CL 72C SUR 26C 73 MJ	BELLA FLOR							MVBF_801	
21	MARIA HELENA BAQUERO MACANA	52156811		X	X		46	3153776277	JAC	DG 73A BIS SUR 27C 34	BELLA FLOR				X	X		MVBF_0592	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	-	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN (ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra:Raizal I: Indígena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto)				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	ROSALBA ROJAS ROJAS	39746063				+	57	3007493579 / 3217261483		CL 73 SUR 26F 40	BELLA FLOR							MVBF_0924	Rosalba
2	ISMELDA PEREZ GARCIA	40277609					78	3146416452		CL 73D SUR 27 62	BELLA FLOR							MVBF_1128	
3	MARIELA SANDOVAL VERA	41315402					77	3212640341 / 312541609		CL 73B SUR 26F 38	BELLA FLOR							MVBF_1314	
4	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO	41331200				+	79	3115022681 / 3115580426		KR 27A 72D 02 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0731	
5	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	41332143		X	X		78	3232154019		CL 73C BIS SUR 27A 23	BELLA FLOR							MVBF_1108	
6	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	41348698						3023880355 / 3004294852		KR 27 BIS 72C 27 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0737	
7	ANDREA HERRERA RANGEL	41409242								CL 73A SUR 27B 17	BELLA FLOR							MVBF_585	
8	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES	41483662				+	75	3213369716-3144855680		CL 73A SUR 26F 20 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1339	
9	MARIA CLAUDIA MRTINEZ VELASQUEZ	41551577				+	72	3205036463 / 3553980		KR 27B 72D 29 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0669	
10	PURIFICACION CORTES	41596028								CL 73 B SUR 26 C 74	BELLA FLOR							MVBF_1324	
11	CARMEN SEMANATE	41598201			+		69	3128418184		KR 26F 75A 35 SUR	BELLA FLOR							MVBF_106	Kelly Chaves
12	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	41620741			+		70	3227912117 /3017239448		CL 73 A SUR 26F 15	BELLA FLOR							MVBF_1307	
13	BLANCA FLOR RINCON	41663712						3222546879		CL 73 D SUR 27 91	BELLA FLOR							MVBF_1141	
14	CARMEN ELVIRA REYES CARO	41700162				+	67	3214649810		CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1198	
15	HERMINIA FORERO BUSTOS	41736233					69	312356927		KR 27 BIS 72C 50 SUR	BELLA FLOR							MVBF_770	
16	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	41738651								KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1080	
17	LEONOR CHISCO SARAY	41741574					63	3144495633		CL 76 SUR 26H 04	BELLA FLOR							MVBF_027	
18	NORMA CONSTANZA MELO	42094265				+	53	3212342802		CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1213	
19	LASTENIA PALACIOS MURILLO	43919733				+	40	3133693896 / 3004175728		CL 75A BIS SUR 26F 53	BELLA FLOR							MVBF_149	
20	OLGA MARIA ALONSO MORENO	51551543				+	62	3133434948 / 3115627688		DG 73 SUR 27B 53	BELLA FLOR							MVBF_0649	
21	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE	51571444			+		69	3015701136 /3133119180		CL 73A SUR 26D 04	BELLA FLOR							MVBF_1363	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

285

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 9108638812

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra: Raizal I: Indígena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto				SI	NO		
												ETNIA	DIS	VC	CH				
1	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	52207124					48	3106956737		KR 26G BIS 72 G 11 SUR	BELLA FLOR							MVBF_948	
2	MARIA EVA PULIDO CELIS	52221942					48	3123969119 / 3204425532		CL 73 SUR 26F 16	BELLA FLOR							MVBF_0925	
3	SANDRA YANETH REY VANEGAS	52238152					47	3114631050		KR 27 73C 32 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1228	
4	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	52238329					215	3227306208 / 3209421267		CL 73A SUR 26F 08 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1337	
5	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	52238407					46	3045743140 / 3004294852		KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	BELLA FLOR							MVBF_745	
6	ALICIA CARREÑO	52240299					45	3222033561		CL 73A SUR 26D 08	BELLA FLOR							MVBF_1362	
7	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	52241361						3209575218		CL 74 SUR 27B 06	BELLA FLOR							MVBF_1427	
8	ANA MILENA ABAUNZA	52255884				✓	49	3223347856 / 3006946327		CL 75 SUR 27 33	BELLA FLOR							MVBF_0157	
9	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA	52279611						3118774755 / 3209053921		KR 26 D 72D 45 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0837	
10	SANDRA PATRICIA SANABRIA	52306084					43	3112058058		KR 26G 75 A SUR 22	BELLA FLOR							MVBF_113	
11	CARMEN ROSA GONZALEZ	52327599					49	3125338535		CL 74B BIS A SUR 26F 38	BELLA FLOR							MVBF_287	
12	RAQUEL MENDEZ PEÑA	52373476					40	3222231450/ 3142443152		CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	BELLA FLOR							MVBF_0286	
13	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	52428645					34	3125816464		TV 27H 73 34 SUR	BELLA FLOR							MVBF_631	
14	LUZ DARY ALONSO PACHON	52440093					48	3208418290		KR 27 BIS 72C 44 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0753	
15	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	52445393				✓	43	3105922628		CL 73 D SUR 27 45	BELLA FLOR							MVBF_1148	
16	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	52459929			X		42	3132058469 / 3107507277 /6156664		KR 27A 73 38 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1072	
17	MARISOL LATORRE DEVIA	52460646					42	3142509808		KR 26 G No. 75 A 26 SUR	BELLA FLOR							MVBF_096	
18	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	52656235					45	3043704820		CL 75A BIS SUR 26F 60	BELLA FLOR							MVBF_0183	
19	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	52725818					42	3144403974 / 3157514367		KR 27 BIS 72G 11 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0984	
20	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE	52741337					40	3058812995		CL 75 SUR 27 A 05	BELLA FLOR							MVBF_154	
21	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	52881335						3204380163		KR 27 BIS A 73D 75 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1200	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

216

TÜVRheinland CERTIFICADO Sistema de Gestión ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105030812

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra Raizal I: Indigena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto							
												ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ	80132273	X		X		39	3133298798 / 3017638820		CL 73 C SUR 27 B 78	BELLA FLOR							MVBF_549	Autorizado
2	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	80366834	X			X	55	3134650570		KR 27 BIS B 72G 08 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0985	
3	LAURENTINO BURGOS RINCON	80386624	X			X	47	3103054330 / 3012939715		CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	BELLA FLOR							MVBF_172	Laurentino
4	ANIBAL MORENO	80559301	X			X	45	3143996870		CL 75B SUR 27 52	BELLA FLOR							MVBF_047	Anibal
5	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	80559667	X			X	42	3118604887		KR 27 73B 09 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1084	
6	CELIMO PADILLA VEGA	80559937		X		X	42	3127476592		KR 27 B 72D 23 SUR	BELLA FLOR							MVBF_675	Celimo Padi
7	OMAR FERNEY NIÑO	80895688	X		X		37	3124413043		TV 26C BIS A 75B 45 SUR	BELLA FLOR							MVBF_223	
8	URIEL CASALLAS MURCIA	82392453					45	3224654117		KR 27A BIS 72D 08 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0719	Uriel casalla
9	FLORENTINO PICO BASTILLA	91105520					56	3208846346		CL 73B SUR 27C 24	BELLA FLOR							MVBF_567	
10	JULIO CESAR BUILES MURIEL	98792748	X			X	39	3118487659		CL 73A SUR 26D 19	BELLA FLOR							MVBF_1329	
11	AENGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON	1022323071		X	X		36	3003824423		CL 74A SUR 27B 25	BELLA FLOR							MVBF_1462	
12	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	1022940463		X	X		35	3208683396 / 3143570464		DG 73 SUR 27B 59	BELLA FLOR							MVBF_650	July Sanchez
13	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	1022956909		X			32	3147535044 / 3223765410		CL 73B SUR 26C 90	BELLA FLOR							MVBF_1330	
14	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	1023905084						3214223115		CL 72F SUR 26D 23	BELLA FLOR							MVBF_853	
15	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	1023913805						3007235310 / 3103584592		CL 73A SUR 26F 33 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1302	
16	YAMILE DARLEY LONDOÑO CARDONA	1024503785		X	X		32	3124630017		CL 73 SUR 27 43 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1049	Yamile Londoño
17	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO	1031135392					30	3108884984		CL 73 SUR 26G 08	BELLA FLOR							MVBF_0946	Deyanira Franco
18	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	1032380518		X			35	3175184863		KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	BELLA FLOR							MVBF_1197	Leidy Palacios
19	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	1032385818			X		35	3003862691/ 3118378244		KR 27 72G 09 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0966	
20	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	1032414775		X	X		34	3222216871		CL 74A BIS A SUR 27 22	BELLA FLOR							MVBF_0072	J Perez
21	IRIS SOTO	1033713372		X	X		62	3014945406		CL 73 SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1338	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 964 - 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN (ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra Raizal I: Indigena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto)				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	53002551		X	X		40	3007353924 / 3143454628		CL 75A SUR 27 22	BELLA FLOR						X	MVBF_0155	Sonia Giraldo H
2	JANETH MEDINA DIAZ	53040711		X	X		61	3112106280 / 7925409		CL 73B SUR 27B 40	BELLA FLOR						X	MVBF_588	
3	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	53081191		X	X		37	3223942691 / 3208431622		CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	BELLA FLOR						X	MVBF_1201	Mariana
4	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	53082240		X		X	39	3227597193		KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1195	Doly Rivera
5	MARIA RUTH CORTES LOSADA	55173610		X		X	47	3017387205		CL 75A BIS SUR 27 58	BELLA FLOR						X	MVBF_087	M ruth cortes
6	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ	55182475		X		X	40	3125306032		CL 74A SUR 27B 55	BELLA FLOR							MVBF_1464	Maria Cabezas
7	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	60285679						3203552458 / 3007834335		KR 27B 74 14 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_1187	
8	TEOFILDE FORERO AGUILAR	63332847		X		X	56	3202586473		CL 73A SUR 26D 07	BELLA FLOR						X	MVBF_1321	teofilde forero
9	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	65726290		X		X	22	3125694417		CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1220	Julieth
10	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	65741895		X		X	54	3053192800		KR 27 72C 40 SUR	BELLA FLOR						X	MVBF_0780	Elizabeth Giraldo
11	AMPARO ARIAS OGONZALEZ	65807040					54	3028508794		KR 27B 72 D 11 SUR	BELLA FLOR							MVBF_676	
12	ISABELINA PATIÑO	65808595		X		X	50	3124878109		CL 75 SUR 27 39	BELLA FLOR						X	MVBF_158	Isabelina
13	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	79100762								CL 72F SUR 26C 69	BELLA FLOR							MVBF_850	
14	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	79213212		X	X		60	3196052252		KR 27A BIS 73 27 SUR	BELLA FLOR						X	MVBF_1014	Luis H Rg
15	JORGE ENRIQUE QUINONES MELO	79250214						3203812784		KR 27B 72C 20 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0715	
16	JOSE FERMIN ROCHA	79579113	X		X		50	3144789089		CL 72C SUR 26C 59	BELLA FLOR						X	MVBF_808	Jose F Rocha
17	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	79631680	X			X	70	3216692804		CL 73 C BIS SUR 27 55	BELLA FLOR							MVBF_1118	Luis Alberto Chitiva
18	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA	79637050						3134879806		TV 27H 73A 36 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0570	
19	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	79727898	X		X		43	3222437847		CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	BELLA FLOR						X	MVBF_1240	Fredy Arias
20	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	79838964	X		X		46	3103650258		CL 73A SUR 26D 16	BELLA FLOR						X	MVBF_1358	Adriana Moreno Autorizada
21	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	80129628	X		X		41	3173136135		KR 27 BIS A 73 52 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1098	NO Vargas

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

288

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FECHA	DD: 03	MM: 09	AA:2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 994 - 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN (ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra: Raizal I: Indígena N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto)				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS	1033736139		X	X		31	3133174166 / 3044940620		CL 73C BIS A SUR 26C 90	BELLA FLOR							MVBF_1255	
2	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	1033739994		X	X		30	3204225899		CL 73B SUR 27B 34	BELLA FLOR							MVBF_589	
3	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	1033749564						3005337559		CL 75A BIS SUR 27 15	BELLA FLOR							MVBF_054	
4	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	1033754558		X	X		24	3007661630		KR 26F 72H 60 SUR	BELLA FLOR							MVBF_894	
5	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	1033754768		X	X		24	3188307282		CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1111	
6	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	1033781018		X	X		24	3118483746		CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1167	
7	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	1033807926					24	3223203522		CL 73A SUR 26F 02	BELLA FLOR							MVBF_1354	
8	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO	1033810928		X	X		55	3006144175		CL 75A BIS A SUR 27 64	BELLA FLOR							MVBF_058	
9	HERIBERTO VARGAS CAPERA	1036838682	X			X	35	3104118734 / 320120490		KR 27 BIS 72G 15 SUR	BELLA FLOR							MVBF_983	
10	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	1073507379		X	X		32	3103182894		CL 73B SUR 27B 21	BELLA FLOR							MVBF_536	
11	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	1082687096		X	X		36	3233441833		KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_0952	
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes
