FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 15/10/2022 (dd-mm-aa) **AL** 21/10/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023


SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

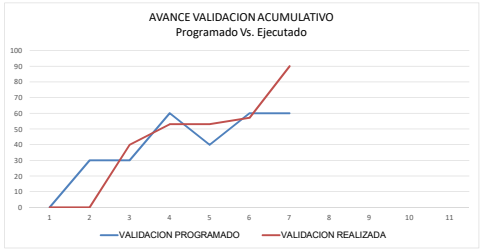



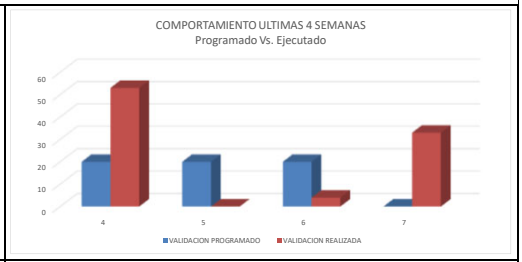

	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana 4	Prog.	Ejec.	Semana 5	Prog.	Ejec.	Semana 6	Prog.	Ejec.	Semana 7	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	60	30%	90	45,0%	15%	0,00%	0	33	16,50%	0%		20	53		20	0		20	4		0	33

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Se evidencia que con respecto a la ultima semana de ejecucion el Contratista realizo 33 validaciones para un total de 90 mv validados lo que refiere a un 45% que según lo programado tiene un adelanto del 15%


2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta presenta un avance del 16,5 con respecto a la semana esto quedando al dia con los MV que se habian incluido en la programacion durante este periodo.

3. Según la programación actual se evidencia que a la fecha el contratista de obra presenta un avance acumulado del 15% del total de las viviendas adjudicadas al contrato 994 de 2022.


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

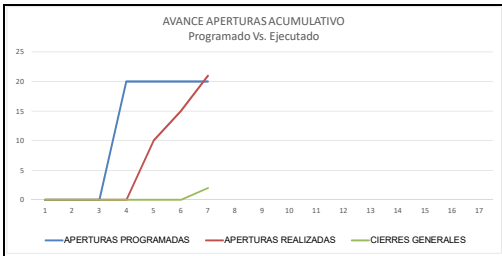



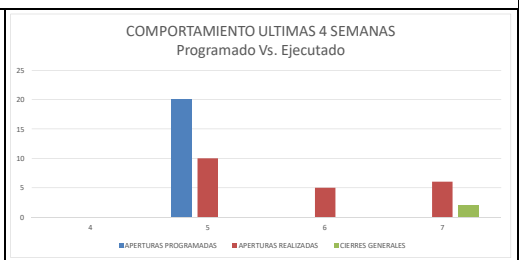

	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana 4	Prog.	Ejec.	Semana 5	Prog.	Ejec.	Semana 6	Prog.	Ejec.	Semana 7	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	20	10%	21	10,5%	0,5%	0,0%	0	6	3,0%	0%		0	0		20	10		0	5		0	6

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra durante la ultima semana no presenta aperturas de viviendas en la programacion, sin embargo se realizo la apertura de 6 viviendas.
2. Según la programación de obra ajustada que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 20 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 21 viviendas, teniendo 2 mv entregados y 19 en ejecucion, esto presenta un avance del 0,5% con respecto al 10%


Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 15/10/2022 (dd-mm-aa) **AL** 21/10/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

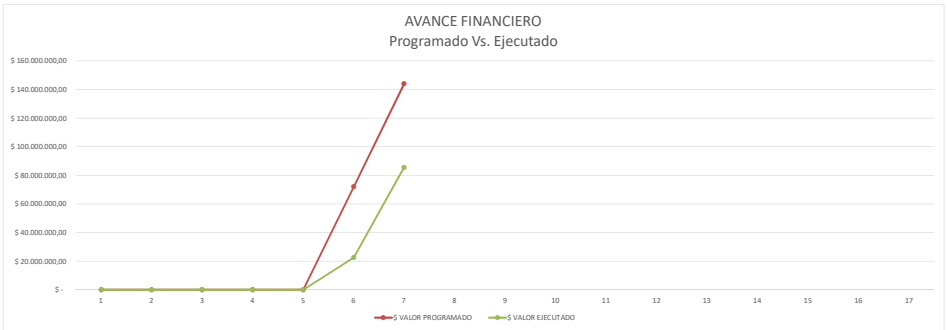

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 72.000.000		**$ 85.536.279,94**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
2,00%		**2,38%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 144.000.000		**$ 118.759.566,09**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
4,00%		**3,30%**

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): **$ 25.240.433,91**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **-0,7%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Según el ajuste a la programación y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, a la fecha se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $25.240.433,91 lo que hace referencia a un 0,7% de atraso frente al valor total del contrato.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 15/10/2022 (dd-mm-aa) **AL** 21/10/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 6. El día miércoles 19 de octubre de 2022 se acerca al PAC la beneficiaria Mercedes Bonilla junto a su esposo. Manifiestan inconformidad por las actividades a ejecutar y solicita nuevamente socialización del presupuesto. Dirección: Cll 73 D bis A sur # 27-28. el 20 de octubre de 2022, se acercaron los profesionales sociales y tecnicos encargados de la vivienda para dialogar con el beneficiario, se le explicaron las actividades nuevamente a realizar y el presupuesto en ejecucion. el beneficiario se muestra conforme y firma la socializacion en bitacora.

2. Durante el periodo se acompaña por parte de las profesionales sociales las siguientes actividades: cacacterizaciones sociales 33. aperturas de obra: 6 y entregas de mejoramiento de vivienda a completa satisfaccion de los beneficiarios 2.

3. En el periodo de presentaron 3 validacones fallidas por las siguientes razones: **MVBF_1013 EMILIANO PÉREZ** (20 cot 22) Atiende la visita el beneficiario. No se logra hacer la validación ya que el beneficiario desea hacer adecuaciones estructurales en el predio; se hace el acuerdo de darle plazo de una semana para que realice dichas adecuaciones. La profesional social se pondrá en contacto para nueva programación. **MVBF_1076 ESPERANZA CASTILLO** (20 cot 22) No se logra realizar la validación ya que la beneficiaria no se encontraba en el predio y no se ha logrado contacto telefónico. **MVBF_1014 LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ** (20 cot 22) Atiende la visita el beneficiario; no es posible realizar la validación ya que los espacios a intervenir están ocupados por acumulación de enseres de los arrendatarios, por petición del beneficiario se realizará en noviembre ya que manifiesta que en dicha fecha desocuparan la vivienda. La profesional social se pondrá en contacto con el beneficiario para acordar otra visita.

4.MVBF_1048 MARÍA GLADYS TRIANA Se realiza seguimiento de obra por parte técnica y social de la interventoría. Se observa personal de obra en el predio. La beneficiaria manifiesta que el contratista realizo la entrega parcial de una habitación. Se le indica que las entregas parciales se hacen en compañía del contratista y la interventoría. La señora María refleja conformidad por las labores constructivas realizadas.

5. Visita SDHT caso especial MVBF_1121: Beneficiaria MARIA ELBA ARIAS BONILLA, Se realiza visita al predio ubicado en la calle 73 C BIS SUR # 27 - 77 en compañía de los profesionales técnicos sociales contratista e interventoría, para verificar estado de la vivienda estructuralmente, y verificar la viabilidad para realizar el mejoramiento de vivienda, donde se realiza acta de visita y se dejan compromisos.

6. Se le recuerda al Contratista que para efectos del contrato en ejecución, todos los materiales a utilizar deben de estar marcados dentro su programa de calidad y cumplir cabalmente los requisitos de compra.

7. El Contratista Building SAS presenta mediante oficio No. 994-2022-019 el dia 21 de octubre de 2022 la solicitud del cambio 2 residentes de obra y la entrega por primera vez del profesional SST pendiente, se hace la respectiva revision y se evidencia que las hojas de vida presentadas no cumplen con lo requerido. Se le da respuesta mediante el radicado No. INP- SDHT-1009- 2022- 040

8. El Contratista realiza la entrega de los APU's solicitados los cuales no son aprobados por esta Interventoria, por lo cual se realizan observaciones para posterior subsanacion.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 7	0 M3	Se hizo retiro de RCD, dispuesto en lonas de las viviendas que se entregaron, pero no se ha realizado disposición en sitio autorizado	N/A
MES	Octubre		
SECTOR	BF		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 7	0 M3	En la semana se iniciaron actividades de obra No se ha realizado disposición de RESPEL
MES	octubre	
SECTOR	BF	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

- Se reitera al contratista la necesidad de cumplir con los requerimientos del personal mínimo requerido, aún falta un profesional del área SST. Contratista envía hoja de vida de Profesional SST pero no es aprobado por que no cumple los requerimientos contractuales; los dos profesionales presentados para el área técnica para reemplazo de los profesionales no se han aprobado y deben subsanar situación que fue notificada mediante oficio.
- La interventoría recibe charla sobre la divulgacion de la resolución 2184 de 2019 . codigo de colores para clasificación de residuos.
- Se hace acompañamiento SISOMA en las aperturas y seguimientos de vivienda, se ha recalcado el cuidado especial que se debe tener por el riesgo publico inminente en el sector.
- Al cierre del informe no se ha recibido nueva documentación de personal Operativo.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	4	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			19	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL.

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los VEINTICUATRO (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes del OCTUBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoria

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	24-oct-22

BUILDING SAS

Contrato de Obra	**994 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"**	**Fecha de Terminacion**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	**TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**1009 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."**	**Fecha de Terminacion**	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/Cte**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							**Fase 2: Ejecución de obras**					
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validacion**		**Ejecución**					
					Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	**Arq Leonardo Solano**	BELLA FLOR	50	200	24	26	9	0	0	41	5,91%	0
	Arq Luisa Franco		50		34	16	6	2	0	42	7,10%	0
	Ing Martha Neira		50		18	32	2	0	0	48	1,96%	0
	Arq. Edwin Baez		50		14	36	2	0	0	48	1,80%	0
Subtotal			**50**	**200**	**90**	**110**	**19**	**2**	**0**	**179**	**4,19%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**OCTUBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**		**Tiempo Programación**			**% ACUMULADO**	SEMANA DEL 15 AL 21
No. Etiq.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 7**
BARRIO BELLA FLOR										
GRUPO No. 1										
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO					VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS					VALIDADA	0,00%	0,00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO					VALIDADA	0,00%	0,00%
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA					VALIDADA	0,00%	0,00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$	14.369.650,00	12/10/2022		EJECUCION	59,37%	57,37%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$	13.769.930,00	7/10/2022		EJECUCION	40,08%	33,81%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES					VALIDADA	0,00%	0,00%
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO					VALIDADA	0,00%	0,00%

9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$ 14.399.376,00		5/10/2022		EJECUCION	32,26%	27,05%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$ 14.358.554,00		21/10/2022		EJECUCION	2,00%	2,00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$ 14.258.458,00		5/10/2022		EJECUCION	73,00%	40,00%
13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$ 14.381.322,00		5/10/2022		EJECUCION	83,00%	50,00%
14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$ 14.397.146,00		21/10/2022		EJECUCION	2,00%	2,00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES					VALIDADA	0,00%	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA					VALIDADA	0,00%	0,00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO					VALIDADA	0,00%	0,00%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA					VALIDADA	0,00%	0,00%
46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$ 13.396.482,00		21/10/2022		EJECUCION	2,00%	2,00%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$ 14.400.000,00		21/10/2022		EJECUCION	2,00%	2,00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON					VALIDADA	0,00%	0,00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS					VALIDADA	0,00%	0,00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 2										
15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS					VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA					VALIDADA	0,00%	0,00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$ 14.000.000,00		13/10/2022		EJECUCION	30,00%	30,00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$ 14.000.000,00		20/10/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA					VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$ 14.000.000,00		18/10/2022		EJECUCION	8,00%	8,00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$ 14.000.000,00		13/10/2022		EJECUCION	15,00%	15,00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$ 14.000.000,00	$ 14.399.644,00	5/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	100,00%	30,00%

23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$ 14.000.000,00	$ 14.396.219,00	7/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	100,00%	85,00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES					VALIDADA	0,00%	0,00%
25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA					VALIDADA	0,00%	0,00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$ 14.000.000,00		7/10/2022		EJECUCION	25,00%	10,00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$ 14.000.000,00		7/10/2022		EJECUCION	70,00%	45,00%
56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS					VALIDADA	0,00%	0,00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA					VALIDADA	0,00%	0,00%
59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA					VALIDADA	0,00%	0,00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO					VALIDADA	0,00%	0,00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO					VALIDADA	0,00%	0,00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA					VALIDADA	0,00%	0,00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA					VALIDADA	0,00%	0,00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO					VALIDADA	0,00%	0,00%
67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA					VALIDADA	0,00%	0,00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO					VALIDADA	0,00%	0,00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO					VALIDADA	0,00%	0,00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON					VALIDADA	0,00%	0,00%
120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE					VALIDADA	0,00%	0,00%

122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE					VALIDADA	0,00%	0,00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA					VALIDADA	0,00%	0,00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA					VALIDADA	0,00%	0,00%
127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA					VALIDADA	0,00%	0,00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 3										
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO					VALIDADA	0,00%	0,00%
30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$ 14.400.000,00		13/10/2022		EJECUCION	20,00%	20,00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO					VALIDADA	0,00%	0,00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$ 14.400.000,00		10/10/2022		EJECUCION	78,00%	70,00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA					VALIDADA	0,00%	0,00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS					VALIDADA	0,00%	0,00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO					VALIDADA	0,00%	0,00%

89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS					VALIDADA	0,00%	0,00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA					VALIDADA	0,00%	0,00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE					VALIDADA	0,00%	0,00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE					VALIDADA	0,00%	0,00%
94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR					VALIDADA	0,00%	0,00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL					VALIDADA	0,00%	0,00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA					VALIDADA	0,00%	0,00%
97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 4										
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO					VALIDADA	0,00%	0,00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$ 14.400.000,00		13/10/2022		EJECUCION	45,00%	30,00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA					VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ					VALIDADA	0,00%	0,00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS					VALIDADA	0,00%	0,00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$ 14.400.000,00		7/10/2022		EJECUCION	45,00%	40,00%
71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 2

Registro fotográfico componente social

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES			
			
Actividad: Seguimientos de obra MVBF_1124 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Seguimientos de obra MVBF_1072 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Seguimientos de obra MVBF_1111 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Seguimientos de obra MVBF_1111 Fecha: 11/10/2022
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1072 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Seguimientos de obra MVBF_1073 Fecha: 11/10/2022	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_1128 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_1108 Fecha: 13/10/2022
			
Actividad: Apertura MVBF_1083 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Apertura Fallida MVBF_1068 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Apertura Fallida MVBF_1052 Fecha: 13/10/2022	AActividad: Seguimiento de obra MVBF_1149 Fecha: 10/10/2022

			
Actividad: Atención PAC Fecha: 10/10/2022	Actividad: Atención PAC Fecha: 08/10/2022	Actividad: Atención PAC Fecha: 12/10/2022	Actividad: Seguimiento de Obra MVBF_1197 Fecha: 10/10/2022
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1155 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1166 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Apertura de obra MVBF_1196 Fecha: 12/10/2022	Actividad: Validación MVBF_1462 Fecha: 13/10/2022
			
Actividad: Validación MVBF_1187 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Validación MVBF_1427 Fecha: 13/10/2022	ctividad: Validación MVBF_1455 Fecha: 13/10/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1084 Fecha: 10/10/2022

			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1048 Fecha: 10/10/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1084 Fecha: 11/10/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1048 Fecha: 11/10/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1061 Fecha: 11/10/2022
			
Actividad: Seguimiento de obra SDHT MVBF_1061 Fecha: 14/10/2022			
