
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ED SEÑALIZACION TURISTICA**	**202 días**	**mar 01/02/**	**mié 09/11/**	
2		Orden de inicio	21 días	mar 01/02/22	mar 01/03/22	
3		**Validacion de actividades y diagnostico**	**123 días**	**mar 01/02/22**	**jue 21/07/22**	
4		**Propuesta metodológica**	**80 días**	**mar 01/02/22**	**lun 23/05/22**	
5		Analisis informacion primaria y secundar	10 días	mar 01/02/22	lun 14/02/22	
6		Atención observaciones diagnóstico	15 días	mar 03/05/22	lun 23/05/22	19
7		Elaboración de cronograma	3 días	mar 15/02/22	jue 17/02/22	5
8		Elaboración de matriz de seguimiento	3 días	vie 18/02/22	mar 22/02/22	7;5
9		Análisis normativo	10 días	mié 23/02/22	mar 08/03/22	8
10		Emisión de concepto por Min Transporte	15 días	vie 01/07/22	jue 21/07/22	12
11		Propuesta de ubicación SV	9 días	mié 25/05/22	lun 06/06/22	12
12		**Propuesta de diseño detallado**	**1 día**	**mar 24/05/22**	**mar 24/05/22**	**6**
13		Presentación propuesta metodológica	1 día	mar 24/05/22	mar 24/05/22	9
14		**Diagnóstico**	**49 días**	**mié 23/02/22**	**lun 02/05/22**	
15		Matriz de identificación de actores	5 días	mié 23/02/22	mar 01/03/22	5;8
16		Diseño de ficha técnica	4 días	mié 23/02/22	lun 28/02/22	15CC
17		Verificación de señalización vial turistica actual	23 días	jue 24/03/22	lun 25/04/22	
18		Elaboración diagnostico	4 días	mar 26/04/22	vie 29/04/22	17
19		Entrega diagnostico	1 día	lun 02/05/22	lun 02/05/22	18
20						
21		**Propuesta de implementación**	**20 días**	**vie 22/07/22**	**jue 18/08/22**	**19**
22						
23		Entrega manual de señalizacion	18 días	vie 22/07/22	mar 16/08/22	10
24		Socializacion entidades	2 días	mié 17/08/22	jue 18/08/22	23
25		**Estudios y diseños implementacion**	**30 días**	**mar 20/09/22**	**lun 31/10/22**	
26		Propuesta a nivel de detalle STV	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	
27		Primera entrega de contenidos propuestos	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	
28		Primera entrega manual de mantenimiento	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	27CC
29		**Informe Final o entregable final**	**22 días**	**mar 11/10/22**	**mié 09/11/22**	
30		Ajuste de fichas técnicas según formato aprobado	5 días	mar 18/10/22	lun 24/10/22	
31		Planimetría final detallada	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
32		Detalles constructivos	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
33		Elaboración Manual de Señalización Turística Vial de Bogotá	20 días	mar 11/10/22	lun 07/11/22	26
34		Manual final de mantenimiento de señalización turística vial	10 días	mar 11/10/22	lun 24/10/22	28
35		Presupuesto detallado	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
36		Socialización de la consultoría	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22	30;31;32;33;34;35

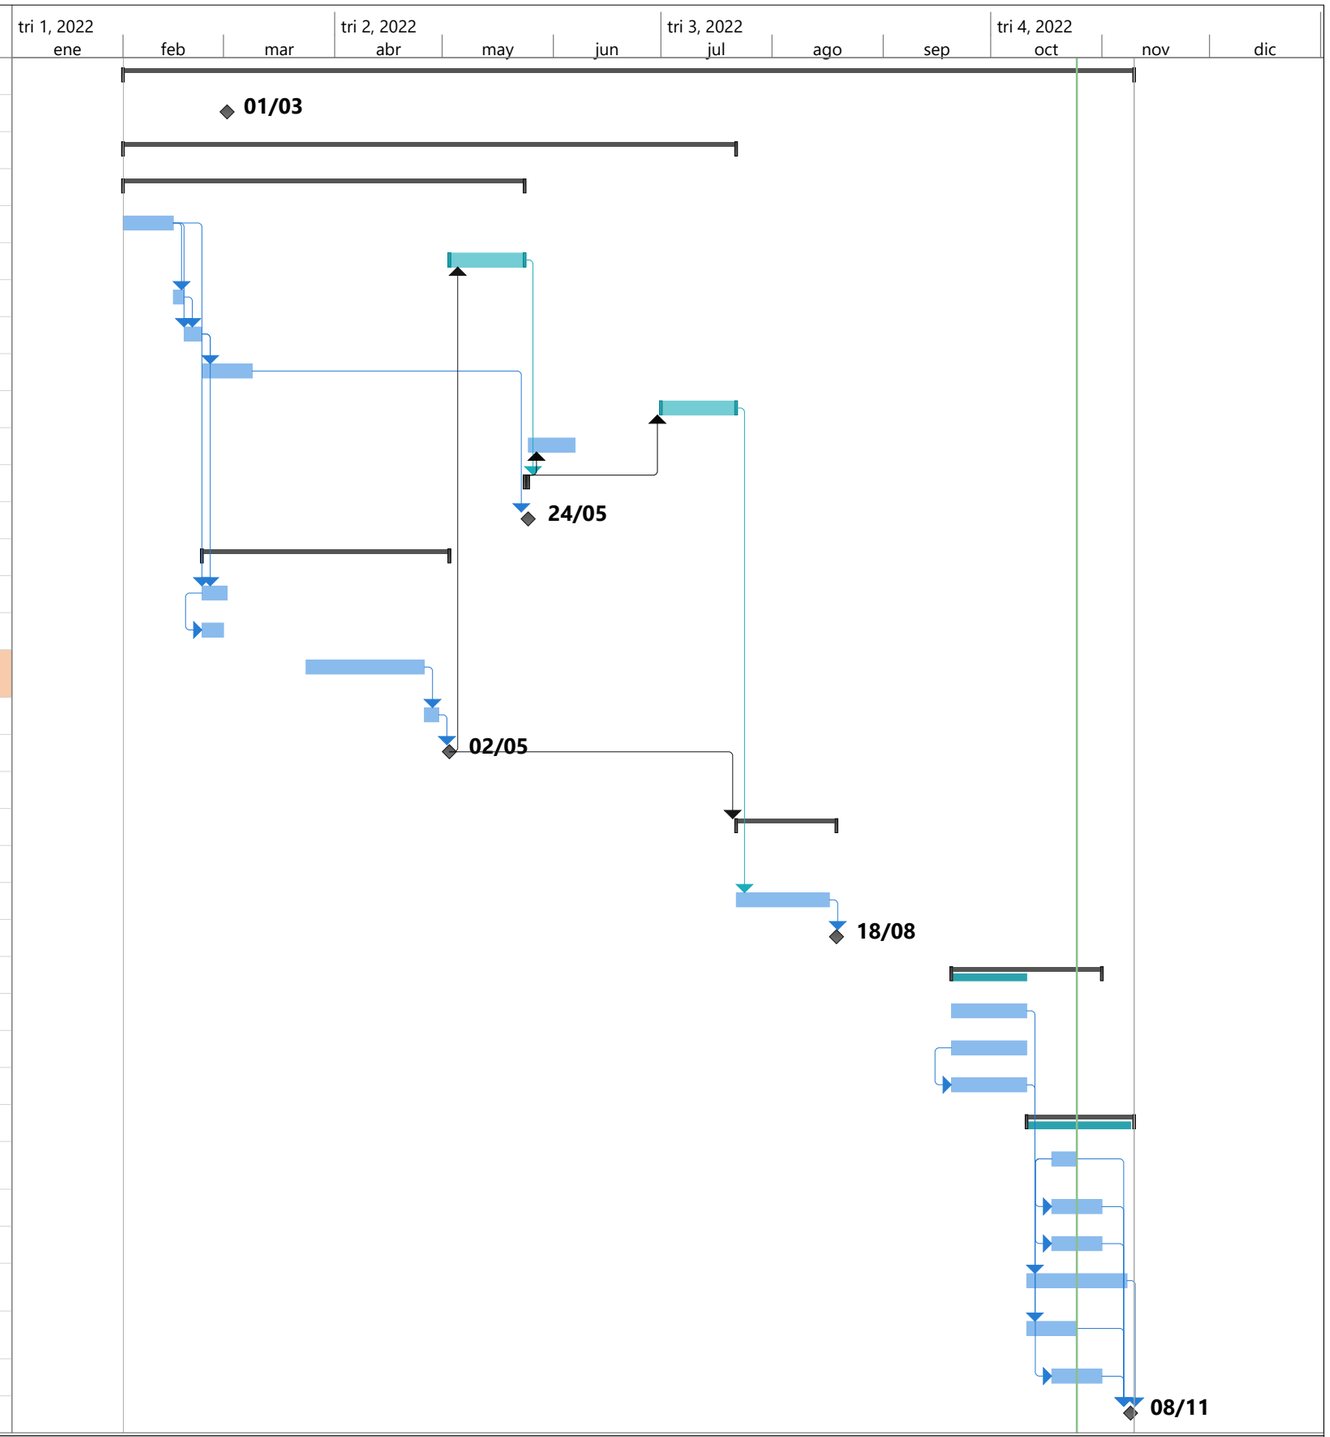

Proyecto: Cronograma Señaliza
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA**

Contrato N.	**391**	**de**	**24 de diciembre**	**de**	**2021**

Fecha de la solicitud:	**26**	**de**	**octubre**	**de**	**2022**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATACIÓN:					
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.				
Supervisor:	Edison Sarache Suárez				
Contratista:	NOGAALL S.A.S.				
Valor inicial del contrato:	$ 339.707.813				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	CINCO (5) MESES				
Fecha de inicio del contrato:	1	de	marzo	de	2022
Fecha de terminación del contrato:	30	de	julio	de	2022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)	
Prórrogas	
Contrato adicional No.	**Tiempo**
1	Del 31 de julio de 2022 al 28 de octubre de 2022

Fecha actual de terminación del contrato:	28	de	octubre	de	2022

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**
N/A	
Valor actual del contrato:	

Modificaciones		
Documento Adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A		

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD		
El presente documento tiene por objeto solicitar una	PRÓRROGA	**Al contrato anteriormente**
Citado así:	Prorrogar el contrato No. 391 de 2021 hasta el 11 de noviembre de 2022.	

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.	**Tiempo**				
CUARTA: PLAZO	Prorrogar el contrato No. 391 de 2021 hasta el 11 de noviembre de 2022.				
Fecha actual de terminación del contrato:	11	de	noviembre	de	2022

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor ($)**
N/A	N/A
Forma de pago de los recursos que se adicionan	N/A
Valor actual del contrato:	N/A

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Descripción**
N/A	
Cláusula Nº	**Descripción**

Justificación de la solicitud:	En mi calidad de supervisor del contrato número 391 de 2021 suscrito entre el IDT y NOGAALL S.A.S. con valor inicial de $ 339.707.813, un plazo de ejecución inicial de cinco (5) meses y una modificación de prórroga del 31 de julio de 2022 al 28 de octubre de 2022, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del IDT se le realice prórroga al mismo teniendo en cuenta la solicitud remitida por el contratista el pasado 25 de octubre de 2022 en la que se indica: *Como es de su debido conocimiento el contrato de consultoría No 391 de 2021, inicio sus actividades el 01 de marzo de 2022 y conforme a la prórroga 01 otorgada la fecha de terminación del contrato de consultoría actualmente es el 28 de octubre de 2022, quedando 4 días restantes que impiden dar cumplimiento al objeto contractual y por lo cual nos permitimos elevar nuestra solicitud de prórroga 02 hasta el 11 de noviembre de 2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones:* *• Que mediante comunicado NG.391.21-024, con fecha del 221 de octubre del presente año, la consultoría realizó la entrega final de los productos estipulados en el anexo técnico.* *• Que el numeral 7 del anexo técnico establece como uno de los productos de la entrega final lo siguiente:* *Socialización de los resultados de la consultoría ante las entidades competentes, para garantizar el conocimiento del proyecto a nivel institucional* *• Que dicha socialización solo es posible realizarla una vez se encuentre aprobado por parte del IDT los productos finales entregados.* *• Que es necesario ampliar el plazo contractual con el fin de que la entidad contratante pueda revisar los documentos entregados y emitir sus respectivas observaciones y/o aprobaciones.* *Que las causas que originan la ampliación en el plazo contractual no son imputables a ninguna de las partes y corresponden a los tiempos internos que toma cada entidad en el proceso de revisión y validación, según matriz de involucrados avalada.* *• Que la ampliación en el plazo solicitado no genera adición de recursos por parte del IDT.* *• Que el consultor debe realizar la redistribución de los recursos según propuesta económica de tal manera que garantice la entrega de los productos y la disponibilidad de los profesionales necesarios para culminar el contrato de consultoría de manera satisfactoria.* *De acuerdo a lo expuesto nos permitimos solicitar una ampliación del plazo contractual hasta el 11 de noviembre de 2022.*

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente por el contratista, en mi calidad de supervisor del contrato se verificó que evidentemente se requiere del tiempo adicional para la ejecución del contrato, con siguiente reprogramación de las actividades que faltarían por ejecutar:

25		**Estudios y diseños implementacion**	**30 días**	**mar 20/09/22**	**lun 31/10/22**	
26		Propuesta a nivel de detalle STV	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	
27		Primera entrega de contenidos propuestos	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	
28		Primera entrega manual de mantenimiento	15 días	mar 20/09/22	lun 10/10/22	27CC
29		**Informe Final o entregable final**	**22 días**	**mar 11/10/22**	**mié 09/11/22**	
30		Ajuste de fichas técnicas según formato aprobado	5 días	mar 18/10/22	lun 24/10/22	
31		Planimetría final detallada	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
32		Detalles constructivos	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
33		Elaboración Manual de Señalización Turística Vial de Bogotá	20 días	mar 11/10/22	lun 07/11/22	26
34		Manual final de mantenimiento de señalización turística vial	10 días	mar 11/10/22	lun 24/10/22	28
35		Presupuesto detallado	10 días	mar 18/10/22	lun 31/10/22	30CC
36		Socialización de la consultoría	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22	30;31;32;33;34;35

Adicionalmente, mediante acta de comité de seguimiento técnico del 19 de octubre de 2022, se manifestó la necesidad de solicitar una prórroga hasta el 11 de noviembre de 2022, con los argumentos expuestos anteriormente.

El contratista ha ejecutado lo correspondiente a los primeros tres pagos y realizó una entrega parcial de los productos correspondientes al cuarto pago el pasado 21 de octubre de 2022, para lo cual el equipo técnico de apoyo a la supervisión requiere revisar para emitir las respectivas observaciones al contratista, y que así mismo una vez los productos estén recibidos a satisfacción, el contratista de proceder a realizar la socialización de los resultados de la consultoría ante las entidades competentes.

A la fecha el contrato cuenta con el siguiente avance de ejecución:

Ejecución física	80%
Ejecución presupuestal	75%

Teniendo en cuenta lo anterior y que el plazo contractual no es suficiente para la ejecución del contrato, en mi calidad de supervisor del contrato 391 de 2021, acepto y considero viable la prórroga del contrato antes citado sin incurrir en desequilibrio económico para el contrato y manifiesto que para la ejecución del mismo durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos.

	Por tanto, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del IDT la modificación del contrato realizando una prórroga partir del 29 de octubre de 2022 hasta el 11 de noviembre de 2022 inclusive.



EDISON SARACHE SUÁREZ
Profesional Especializado código 222 grado 04, Subdirección de Gestión del Destino
Supervisor contrato 391 de 2021

Proyectó: Jairo Andrés Arenas, apoyo a la supervisión, Subdirección de Gestión de Destino

Revisó: Liliana Satoque, Contratista, Subdirección de Gestión de Destino
