FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3- FECHA (23-09-22)

FECHA		DIA	22	MES	0	9		AÑO	2022

SEMANA N°	3	DEL	viernes, 23 de septiembre de 2022		AL	jueves, 29 de septiembre de 2022	
FECHA INICIO :	12-sep-22		FECHA TERMINACION INICIAL :	30-oct-22	NUEVO PLAZO DE EJECUCION	30-oct-22	
No.PRORROGAS			No. SUSPENCIONES	DEL	HASTA	OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE LA ESCUELA DE LA POLICIA MILITAR				
INTERVENTOR	JONY RINCON ZARATE	NIT O C.C.		CONTRATO N°	MC.231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSTRUEQUIPOS BOGOTA	NIT O C.C.	901.079.794-8	CONTRATO N°	MC.231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANAL No.1

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE EJECUCION SEMANAL	FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION REALIZADO ACTIVIDAD	CONSOLIDADO DE EJECUCION POR ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS DE ATRASO POR ACTVIDAD LO	COMPROMISOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
PRELIMINARES	DEMOLICION ENCHAPE PISO - DESMONTE CIELO RASO	12/09/2022	15/09/2022	92,00%	90,00%	90,00%	NA	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	DEMOLICION ENCHAPE PISO - DESMONTE CIELO RASO - INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC - DESMONTE DE GUARDA ESCOBA - DESMONTE DE MUROS EN DRAYWALL - RETIRO DE ESCOMBROS - DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	16/09/2022	22/09/2022	95,00%	95,00%	95,00%	NA	
PAÑETES RESANES	RESANE DE PAREDES- PAÑETES - FILOS - MASILLADO - HUMEDAD - LIJADA	23/09/2022	23/09/2022	99,00%	99,00%	99,00%	NA	
TECHOS	INSTALACION DEL PVC- INTALACIONES DE LAS 24 ILUMINARIAS- INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO, INTERRUPTOR DOBLE, INTERRUPTOR TRIPLE.						NA	
PINTURA								
VIDRIOS								
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								

DESARROLLO DE LA EJECUCION POR CAPITULO DE ACUERDO A LA SEMANAL No.1

FECHA INICIO CAPITULO	FECHA TERMINACION CAPITULO	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO CAPITULO	PORCENTAJE DE EJECUCION REALIZADO CAPITULO	CONSOLIDADO DE EJECUCION POR CAPITULO	VALOR PAGO POR CAPITULO
12/09/2022	17/09/2022	90%	90%	90%	
19/09/2022	24/09/2022	94%	94%	94%	
23/09/2022	29/09/2022	95%	95%	95%	
23/09/2022	29/09/2022	95%	95%	95%	

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 68.485.155,62	SEMANA	$ 17.053.000,00	$ 51.432.155,62		$ 17.053.000,00	$ 51.432.155,62
		ACUMULADO	$ 17.053.000,00				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Residente	1	Oficial	1
Profesional HSQ	0	Ayudantes	1
Maestro	1		

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO


V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				NO

TIEMPO COMPLETO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



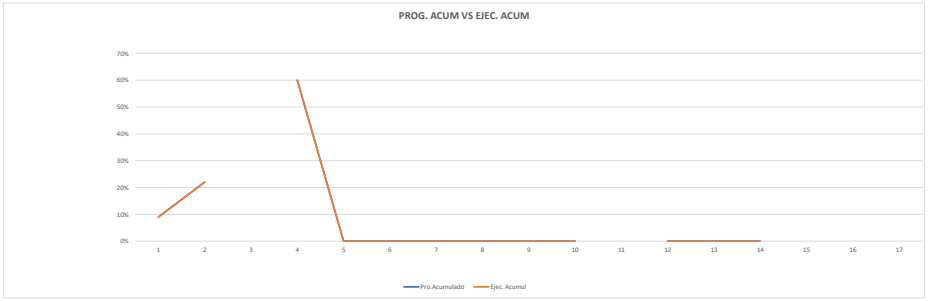

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3- FECHA (23-09-22)

FECHA		DIA	22	MES	0	9		AÑO	2022

SEMANA N°	3	DEL		viernes, 23 de septiembre de 2022					AL	jueves, 29 de septiembre de 2022							
Semana	inicio	2		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			12
Fecha	12/09/2022	17/09/2022		24/09/2022	1/10/2022	8/10/2022	15/10/2022	22/10/2022	5/10/2020	12/10/2020		19/10/2020	26/10/2020	2/11/2020			9/11/2020
Pro. Semanal	9%	22%		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Pro.Acumulado	9%	22%		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Ejec. Semanal	9%	22%		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Ejec. Acumul	9%	22%		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Balance	9%	22%		60,00%										0,00%			0,00%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3- FECHA (23-09-22)

FECHA	DIA	22	MES	0	9		AÑO	2022

SEMANA N°	3	DEL	viernes, 23 de septiembre de 2022		AL	jueves, 29 de septiembre de 2022

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DESCRIPCION:

Se ejecutan actividades normalmente según la programacion presentada

Se ejecutan actividades en la sede, según lo estipulado con el cronograma de actividades

OBSERVACIONES TECNICAS.

Se ejecutan actividades estipuladas en el cronograma de obra

CALIDAD.

El contratista ejecuta actividades con las condiciones establecidas en el plan de aseguramiento de calidad.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL

JURIDICA

RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES.

1	
2	
3	
4	
5	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CEDULA O IDENTIFICACION

NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CEDULA O IDENTIFICACION

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA
CEDULA O IDENTIFICACION

Cristian Camilo Garcia Valencia
C.C. 1.026.372.672 de Bogotá

Original : CEPAC DE INGENIEROS
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista
