INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	14 de febrero de 2019	**PERIODO No.**	43	DEL	**7/02/2019**	AL	**13/02/2019**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	2018363			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de abril de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	378			PLAZO ACTUALIZADO:	348		
PLAZO TRANSCURRIDO:	300	EQUIVALE AL	79,37%	PLAZO TRANSCURRIDO:	300	EQUIVALE AL	86,21%
VALOR INICIAL :	$		433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$		4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$		359.305.625,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$		1.627.646.525,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		792.513.225,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		6.186.087.724,00
VALOR PAGADO:	$		458.458.075,00	VALOR PAGADO:	$		4.035.453.695,00
VALOR POR PAGAR:	$		334.055.150,00	VALOR POR PAGAR:	$		2.150.634.029,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez			INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
40	20	20
41	0	0
42	12	12
43	9	9
acum		41

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ **100,00%**

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
acum		0

Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$ **0,00%** V0

0,00% V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
acum		0

Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	0,00%
acumulado	0
porcentaje acumulado	0,00%

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
40	1	0
41	2	1
42	4	4
43	3	3
Acum		**8**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	2,27%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	16,67%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	14 de febrero de 2019	**PERIODO No.**	43	DEL	**7/02/2019**	AL	**13/02/2019**

6. Actividades Administrativas

En la cuadragésima tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

El 19 de diciembre de 2018se efectúo la aprobación del trámite de adición (1) y prórroga (2) al contrato de obra, por un valor de 1,627,646,525 COP, con un rubro para el componente de consultoría de 31,383,275 COP. El contrato se prorrogó por un período de 3,5 meses, con fecha de terminación el día 02 de abril de 2019. El contrato de Interventoría igualmentre tramitó y se aprobó por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad por un valor de 284,353,475 COP por un período de 4,5 meses, con fehca de terminación a 02 de mayo del 2019.

Las tablas de avance del contrato inicial se cerraron y para la adición se presentará el avance de diseños y obras independiente, iniciando en la semana 40 que es donde se cierran los aspcetos del contrao inicial e inician los trabajos de las obras de la adición.

Durante la presente semana de contrato, se ha trabajado entre todas las partes del contrato en la definición de las obras a ejecutar y la menra como se evaluará el tema de los diseños dadas las limitantes para desarrollar un número alto de nuevos diseños en la adición del contrato, de la definición se tiene establecidas que las obras a ejecutar se tomarán de ID's diseñados en el contrato inicial, fichas de mantenimmiento para resposición de defensas metálicas, complementos a ID's ejecutados o diseñados inicialmente y diseños suministrados por la SDM para el caso de las plazoletas. Continúa la priorización sin embargo algunos complementos ya estaban, ya se tiene una tabla más aterrizada y a más tardar la próxima semana, estarán listas las obras a ejecutar.

Esta semana se definió el listado definitivo de ID's priorizados para la adición del contrato, para evitar dificultades con la disponibilidad de materiales, se estableció que sobre la lista de prioridades el Contratista solicite los elementos a instalar y si llega a presentarse alguna nueva priorización por parte de la SDM, esta reemplace un ID que contenga el mismo elemento, el número de ID's a ejecutar se estableció en 41.

- •En el componente de Consultoría el Contratista, se definió que el Contratista debe efectuar el diseño de 9 ID's para la adición, el Contratista solicitó el aval para trabajar con el personal al mínimo para poder desarrollar ese número de diseños.

- •En el componente de obra, se teabajó en la instalación de materas tipo m 502 en la plazoleta Santa Paula, siguiendo el diseño suministrado por la Secretaría Distrital de Movilidad.
- •En el ID 10_4 (Av. Boyacá con Calle 66a), se efectúo la reposición de defensas metálicas en mal estado, el ID se reporta como finalizado.
- •En el ID 10_5 (Av. Boyacá con Calle 51), se efectúo la reposición de defensas metálicas en mal estado, el ID se reporta como finalizado.
- •En el ID 15_7 (Calle 11 Sur con Carrera 16), se efectúo la instalación de 29 unidades de matera tipo M502, siguiendo el diseño suministrado por la SDM.

• Se realiza comité de seguimineto de obra # 43.


• El contratista envia informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

por solicitud de la Entidad se está trabajndo con tablas de avance y porcentajes nuevos para cada componente y actividad de la adición y prórroga al contrato de obra.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.



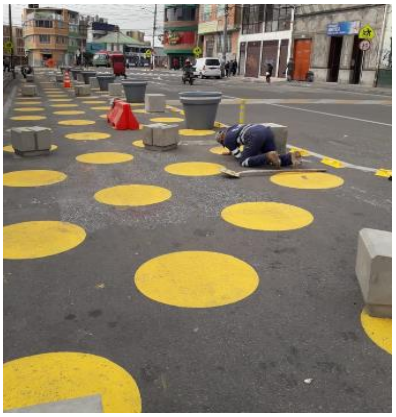



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Nathalie Castillo Curieux

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
