SGC-CP-14235-22
Neiva, noviembre 15 de 2022

Ingeniero
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado SGA
Supervisor

Referencia: Contrato de interventoría No. 184 de 2022

Asunto: Informe de interventoría No.7.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 22 de octubre al 08 de noviembre de 2022, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual No.7
2. Informes semanales (No.26 al No.27)
3. Actas de comité técnico de la No.26 al No.27.
4. Correspondencia.
5. Seguridad social.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ - Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	7	Periodo comprendido entre el :	22 de octubre de 2022	y el:	8 de noviembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. 346 DE 2021, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN"	**Objeto:**	ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN
Contrato Nº:	184 DE 2022	**Contrato Nº:**	346 DE 2021
Contratista:	SINCO LTDA.	**Contratista:**	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 11-11-2021
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	**Plazo Inicial:**	SEIS (6) MESES
Plazo adicional:	DOS (2) MESES	**Plazo adicional:**	DOS (2) MESES
Fecha de Inicio:	22 de abril de 2022	**Fecha de Inicio:**	22 de abril de 2022
Fecha de Terminación:	21 de diciembre de 2022	**Fecha de Terminación:**	21 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 127.721.434,00	**Valor Inicial:**	$ 1.275.930.290,00
Valor pagado:	$ 30.895.814,88	**Valor pagado:**	$ 308.618.597,00
Valor por pagar:	$ 96.825.619,12	**Valor por pagar:**	$ 967.311.693,00
Nombre Supervisor:	Ing. FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE	**Nombre interventor:**	SINCO LTDA. - RL CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	23/03/2022	1/06/2023	$ 25.544.286,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	23/03/2022	30/01/2026	$ 12.772.143,40
Calidad del servicio	3/10/2022	30/01/2028	$ 25.544.286,80

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	22/04/2022	30/04/2023	$ 255.186.058,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	22/04/2022	28/10/2027	$ 127.593.029,00
Estabilidad y calidad de las obras	22/04/2022	5 años mas	$ 255.186.058,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	22/04/2022	31/12/2022	$ 200.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de Interventoría No.1	13/10/2022	$ 30.895.814,88
Acta parcial de Interventoría No.2	En tramite	$ 19.822.366,56
Total facturado		$ 50.718.181,44

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta de recibo parcial de obra No.1	13/10/2022	$ 308.618.597,00
Acta de recibo parcial de obra No.2		$ 198.068.652,00
Total facturado		$ 506.687.249,00

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	50,90%	10,83%	61,73%
% Ejecutado	39,19%	3,99%	43,18%
Diferencia	-11,72%	-6,84%	-18,55%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 649.480,76	$ 138.187,40	$ 787.668,16	61,73%
% Ejecutado	$ 499.976,68	$ 50.908,90	$ 550.885,57	43,18%
Diferencia	$ (149.504,09)	$ (87.278,50)	$ (236.782,58)	-18,55%


DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Con el avance del presente periodo, se han intervenido 137 de 277 sistemas sépticos contractuales de la siguiente manera:

* Pitalito (109) de los cuales (98) están terminados y los demás están en proceso de construcción.
* La Argentina 6 sistemas sépticos terminados.
* Suaza (9) de los cuales 6 están terminados y los demás están en proceso constructivo.
* Garzon (8) en proceso constructivo.
* Acevedo (5) en proceso constructivo.

El contratista durante el período igualmente subsanó las observaciones realizadas por parte de la Entidad y la Interventoría a los sistemas construidos en el municipio de Pitalito.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

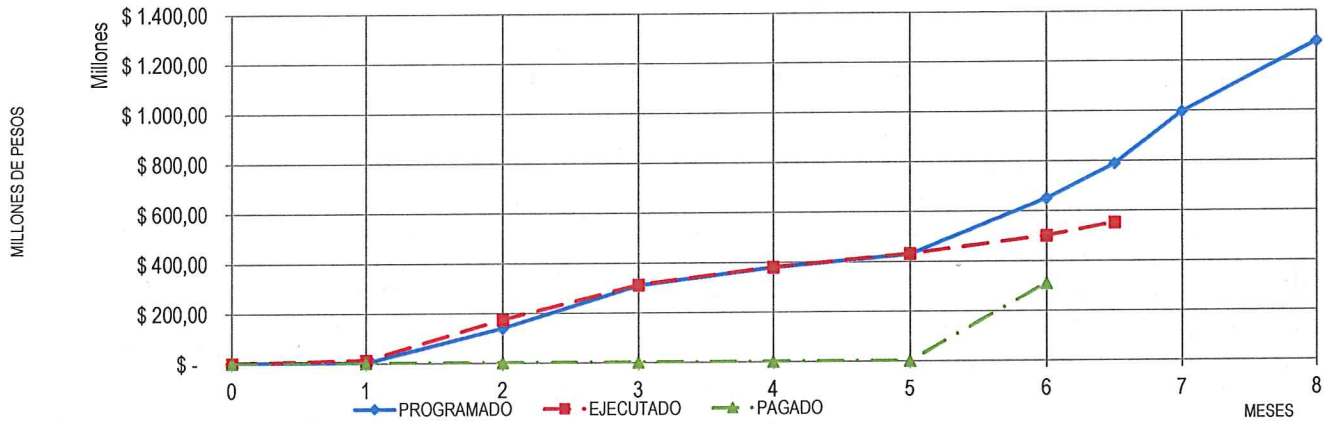

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo se presentaron fuertes lluvias que afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas, tales como visitas prediales, transporte y entrega de materiales, debido al mal estado de las vías de acceso a los sitios de construcción; al igual que el proceso constructivo de los sistemas.

A cierre del período continúa el atraso en el avance de obra, debido a las situaciones anteriormente mencionadas y a la poca disponibilidad de mano de obra para la ejecución de las actividades, no obstante la mejoría en este aspecto, no se tiene el número de cuadrillas necesarias para tener los rendimientos óptimos. Por tanto, el contratista presentó las gestiones realizadas de contratación de personal por municipio teniendo a la fecha 12 frentes de trabajo entre los municipios de Garzón, Acevedo, Suaza y Pitalito; sin embargo, se le insiste que debe continuar mejorando para dar cumplimiento de la terminación de los sistemas en el plazo contractual.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Humberto Quiza Camacho Cargo: Profesional de apoyo	Nombre: William Parra Olaya Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7

ANEXO 1

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N.º:	346 DE 2021	Contratista:	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 11-11-2021
Periodo:	22 de octubre de 2022 al 8 de noviembre de 2022	Interventor:	SINCO LTDA.
Director de obra:	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	Director de Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
			277,00										
1,1	Localización y replanteo manual	M2	3,84	$ 2.822,00	$ 3.001.572,00	441,60	84,48	526,08	$ 1.246.195,20	$ 238.402,56	$ 1.484.597,76	537,60	$ 1.516.974,24
1,2	Excavación manual con acarreo horizontal	M3	6,57	$ 28.878,00	$ 52.554.656,00	722,70	144,54	867,24	$ 20.870.130,60	$ 4.174.026,12	$ 25.044.156,72	952,65	$ 27.510.499,28
1,3	Muro en bloque de arcilla macizo e=10 m (10x15x30)	M2	13,12	$ 74.977,00	$ 272.484.346,00	1.416,96	91,84	1.508,80	$ 106.239.409,92	$ 6.885.887,68	$ 113.125.297,60	2.125,44	$ 159.359.048,40
1,4	Acero de refuerzo de 60000 psi, incluye figurado y armada de estructura (incluye acero de la placa de la tapa de tanque, placa de fondo, cámara de inspección, trampa de grasas y placa perforada de lecho filtrante)	KG	32,00	$ 9.544,00	$ 84.598.016,00	3.616,00	704,00	4.320,00	$ 34.511.104,00	$ 6.718.976,00	$ 41.230.080,00	4.544,00	$ 43.367.936,00
1,5	Concreto para tapa de tanque de 20,7 Mpa(3000 P.S.I) e= 0.10m, incluye vaciado de mezcla, colocación de refuerzo armado de formaleta y construcción de la placa y acarreo horizontal	M3	0,32	$ 618.567,00	$ 54.829.657,00	34,56	7,04	41,60	$ 21.377.675,52	$ 4.354.711,68	$ 25.732.387,20	47,04	$ 29.097.269,80
1,6	Concreto para placa de fondo de tanque de 3000 P.S.I e=0.10m, incluye vaciado de mezcla, colocación de refuerzo armado de formaleta y construcción de la placa y acarreo horizontal	M3	0,32	$ 616.016,00	$ 54.603.625,00	34,56	7,04	41,60	$ 21.289.512,96	$ 4.336.752,64	$ 25.626.265,60	47,04	$ 28.977.359,40
1,7	Accesorio PVC - sanitario de 4" para sistema Séptico	UN	1,00	$ 223.360,00	$ 61.870.720,00	114,00	6,00	120,00	$ 25.463.040,00	$ 1.340.160,00	$ 26.803.200,00	157,00	$ 35.067.520,00
1,8	Suministro e instalación de material filtrante piedra o grava de 2 1/2"	M3	0,50	$ 189.175,00	$ 26.200.876,00	53,00	2,00	55,00	$ 10.026.275,00	$ 378.350,00	$ 10.404.625,00	83,50	$ 15.796.251,00
1,9	Concreto de 3000 P.S.I para placa de fondo del lecho filtrante con perforaciones de 1" e=0.10m, incluye Vaciado de mezcla, colocación de refuerzo armado de formaleta y construcción de la placa y acarreo horizontal	M3	0,06	$ 649.095,00	$ 10.788.042,00	6,48	1,32	7,80	$ 4.206.135,60	$ 856.805,40	$ 5.062.941,00	8,82	$ 5.725.101,00
1,10	Caja de inspección de 40x40cm, concreto de 3000 P.S.I	UN	1,00	$ 178.066,00	$ 49.324.282,00	109,00	10,00	119,00	$ 19.409.194,00	$ 1.780.660,00	$ 21.189.854,00	158,00	$ 28.134.428,00
1,11	Construcción caja de 0,8x0,8x0,8 en concreto de 3000 PSI, paredes de 0,10, según diseño. Incluye tapa reforzada	UN	1,00	$ 369.383,00	$ 102.319.091,00	109,00	11,00	120,00	$ 40.262.747,00	$ 4.063.213,00	$ 44.325.960,00	157,00	$ 57.993.131,00
1,12	Accesorios PVC sanitario de 2" para trampa de grasas	UN	1,00	$ 85.411,00	$ 23.658.847,00	106,00	6,00	112,00	$ 9.053.566,00	$ 512.466,00	$ 9.566.032,00	165,00	$ 14.092.815,00
1,13	Suministro e instalación de tubería de desagüe en PVC 2"	ML	12,00	$ 19.558,00	$ 65.010.792,00	1.272,00	72,00	1.344,00	$ 24.877.776,00	$ 1.408.176,00	$ 26.285.952,00	1.980,00	$ 38.724.840,00
1,14	Tubería de desagüe en PVC 4"	ML	12,00	$ 44.295,00	$ 147.236.580,00	1.272,00	72,00	1.344,00	$ 56.343.240,00	$ 3.189.240,00	$ 59.532.480,00	1.980,00	$ 87.704.100,00
				SUB TOTAL	$ 1.008.481.102,00				$ 395.176.002	$ 40.237.827	$ 435.413.829		$ 573.067.273
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.008.481.102,00				$ 395.176.002	$ 40.237.827	$ 435.413.829		$ 573.067.273
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 267.449.188,00				$ 104.800.675,00	$ 10.671.071,00	$ 115.471.746,00		$ 151.977.441,00
	ADMINISTRACION	12%			$ 121.017.732,00				$ 47.421.120,00	$ 4.828.539,00	$ 52.249.659,00		$ 68.768.073,00
	IMPREVISTOS	5%			$ 50.424.055,00				$ 19.758.800,00	$ 2.011.891,00	$ 21.770.691,00		$ 28.653.363,00
	UTILIDAD	8%			$ 80.678.488,00				$ 31.614.080,00	$ 3.219.026,00	$ 34.833.106,00		$ 45.845.382,00
	IVA DE UTILIDAD	19%			$ 15.328.913,00				$ 6.006.675,00	$ 611.615,00	$ 6.618.290,00		$ 8.710.623,00
VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					$ 1.275.930.290,00				$ 499.976.677,00	$ 50.908.898,00	$ 550.885.575		$ 725.044.715

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.275.930.290,00	V/R ANTICIPO:	N/A
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	N/A
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.275.930.290,00	% RETEGARANTIA:	10%

N.º	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N.º	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial de obra No.1	FESS-1	13/10/2022	$ 308.618.597,00	$ -	$ -	$ -	$ 308.618.597,00	$ 967.311.693,00	39,71%
2	Acta de recibo parcial de obra No.2		En trámite	$ 198.068.652,00	$ -	$ -	$ -	$ 198.068.652,00	$ 769.243.041,00	
	TOTAL			$ 506.687.249,00	$ -	$ -	$ -	$ 506.687.249,00	$ 769.243.041,00	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 127.721.434,00	V/R ANTICIPO:	N/A
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	N/A
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 127.721.434,00	% RETEGARANTIA:	10%

N.º	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N.º	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial de Interventoría No.1	FEAL-14	13/10/2022	$ 30.895.814,88	$ -	N/A	N/A	$ 30.895.814,88	$ 96.825.619,12	24,19%
2	Acta parcial de Interventoría No.2		En tramite	$ 19.822.366,56				$ 19.822.366,56	$ 77.003.252,56	15,52%
	TOTAL			$ 50.718.181,44	$ -	$ -	$ -	$ 50.718.181,44	$ 77.003.252,56	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 11-11-2021	Director de obra:	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	22 de octubre de 2022	al	8 de noviembre de 2022

FOTOGRAFÍA No.1



EXCAVACION DE POZO - LEIDY JOHANA CASTRO - GARZON

FOTOGRAFÍA No.2



CAJILLA DE INSPECCION - SANTIAGO QUINTERO - ACEVEDO

FOTOGRAFÍA No.3



TRAMPA GRASA - LUIS OCTAVIO TITIMBO - PITALITO

FOTOGRAFÍA No.4



FUNDICION DE TAPAS - NICOMEDES BENAVIDES - PITALITO

FOTOGRAFÍA No.5



SISTEMA SÉPTICO TERMINADO - MILCIADES MUÑOZ - PITALITO

FOTOGRAFÍA No.6



SISTEMA SÉPTICO TERMINADO - CARLOS PEÑA - PITALITO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 346 de 2021

FECHA REALIZACIÓN	28-oct-22	PERIODO No.	26	DEL	21/10/2022	AL	27/10/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. 346 DE 2021, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS: ACEVEDO, GARZÓN, GUADALUPE, PALESTINA, PITALITO, SUAZA, LA PLATA, TIMANÁ, LA ARGENTINA, ÍQUIRA Y SANTA MARÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	184 DE 2022	CONTRATO No.:	346 DE 2021
PLAZO INICIAL (6 MESES):	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL (6 MESES):	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022
ADICION DE TIEMPO:	2 MESES	ADICION DE TIEMPO:	2 MESES
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	55	DÍAS POR EJECUTAR	55
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	188 EQUIVALE AL 77,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	188 EQUIVALE AL 77,4%
VALOR INICIAL :	$ 127.721.434,00	VALOR INICIAL :	$ 1.275.930.290,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 127.721.434,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.275.930.290,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 127.721.434,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.275.930.290,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/04/2022	22/04/2022	0
	VISITA PREDIAL BENEFICIARIOS	2/06/2022		en proceso
	DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES	22/09/2022		en proceso
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	20/12/2022		en proceso
1,2	EXCAVACION MANUAL CON ACARREO HORIZONTAL	20/12/2022		en proceso
1,3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA MACIZO E=10 M (10X15X30)	20/12/2022		en proceso
1,4	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO Y ARMADA DE ESTRUCTURA (INCLUYE ACERO DE LA	20/12/2022		en proceso
1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA(3000 P.S.I) E= 0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	20/12/2022		en proceso
1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	20/12/2022		en proceso
1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO	20/12/2022		en proceso
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2"	20/12/2022		en proceso
1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA DE FONDO DEL LECHO FILTRANTE CON PERFORACIONES DE 1"	20/12/2022		en proceso
1,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, CONCRETO DE 3000 P.S.I	20/12/2022		en proceso
1,11	CONSTRUCCIÓN CAJA DE 0,8X0,8X0,8 EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	20/12/2022		en proceso
1,12	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA TRAMPA DE GRASAS	20/12/2022		en proceso
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	20/12/2022		en proceso
1,14	TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 4"	20/12/2022		en proceso
	RECIBO DE OBRA A SATISFACCION	21/12/2022		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 718.574.461,00	56,32%	-15,42%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 521.846.694,00	40,90%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	1.080.290.331	Director de obra
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	83.116.819	Residente de obra
LEIDY KATHERINE SALAS ROJAS	1.080.290.676	Ingeniera ambiental
MIGUEL ANGEL FIGUEROA	18.103.698	Maestro de obra
OSCAR MARTIN GARRIDO	PT 5172249	Maestro de obra
ROBINSON GONZALEZ LOSADA	12.145.116	Maestro de obra
ANCIZAR QUEVEDO	7.694.836	Maestro de obra
EDUAR FERNANDO CABRERA	1.007.432.583	Ayudante de obra
FRANKLIN HERNANDEZ RAMOS	7.698.319	Ayudante de obra
HAROLD ENRIQUE CABRERA	1.006.995.036	Ayudante de obra
HERNANDO MORENO JARAMILLO	12.137.822	Ayudante de obra
JOSE VICENTE QUEVEDO	12.126.570	Maestro de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	25,0%	3
	TECNICO	2	3	16,7%	25,0%	5
	M.O/N.C	4	0	33,3%	0,0%	4
	TOTALES	**6**	**6**	**50,0%**	**50,0%**	**12**
	TOTAL	12		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En la presente semana el contratista terminó un sistemas séptico en el municipio de Pitalito, actualmente se encuentran en proceso constructivo 18, de los cuales se encuentran 5 en un 9%, 3 en un 30%, 1 en un 80% y el otro en un 25% de avance en el municipio de Pitalito. Otros 3 sistemas se encuentran en proceso constructivo en el municipio de Suaza en un 80% de avance y 5 intervenidos en el municipio de Acevedo con avance del 25% aproximadamente. Hasta la fecha se han intervenido 125 sistemas sépticos de la totalidad contractual. También se realizaron visitas para verificar condiciones iniciales de los predios de los beneficiarios en el municipio de La Plata y continuaron entrega de materiales en el municipio de Acevedo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A


7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se continúa solicitando al contratista aumentar el número de frentes de trabajo, ya que no cuenta con la suficiente mano de obra para dar cumplimiento a la programación de sistemas construidos por semana y a la fecha como se evidencia en el presente informe sigue aumentando el atraso con respecto a lo programado. Además se informa que debido a la temporada de invierno se dificulta el acceso de materiales y personal a los lugares de intervención.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EXCAVACION PARA POZO - SANTIAGO QUINTERO - ACEVEDO

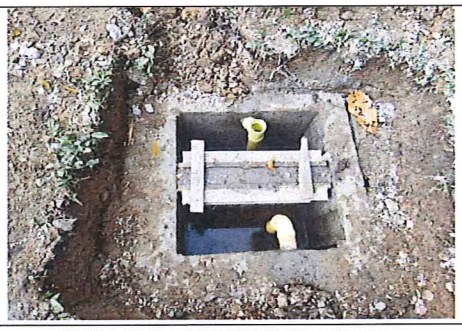

TRAMPA GRASA - OMAR BARRETO - PITALITO



CAJILLA DE INSPECCION - LUZ MARTHA DELGADO - ACEVEDO



PEGA DE LADRILLO - FRAY AUGUSTO - SUAZA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR CONTRATO No.184 DE 2022 (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 346 de 2021

FECHA REALIZACIÓN	4-nov-22	PERIODO No.	27	DEL	28/10/2022	AL	3/11/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. 346 DE 2021, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS: ACEVEDO, GARZÓN, GUADALUPE, PALESTINA, PITALITO, SUAZA, LA PLATA, TIMANÁ, LA ARGENTINA, ÍQUIRA Y SANTA MARÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	184 DE 2022	CONTRATO No.:	346 DE 2021
PLAZO INICIAL (6 MESES):	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL (6 MESES):	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022
ADICION DE TIEMPO:	2 MESES	ADICION DE TIEMPO:	2 MESES
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	48	DÍAS POR EJECUTAR	48
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	195 EQUIVALE AL 80,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	195 EQUIVALE AL 80,2%
VALOR INICIAL :	$ 127.721.434,00	VALOR INICIAL :	$ 1.275.930.290,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 127.721.434,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.275.930.290,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 127.721.434,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.275.930.290,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/04/2022	22/04/2022	0
	VISITA PREDIAL BENEFICIARIOS	2/06/2022		en proceso
	DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES	22/09/2022		en proceso
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	20/12/2022		en proceso
1,2	EXCAVACION MANUAL CON ACARREO HORIZONTAL	20/12/2022		en proceso
1,3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA MACIZO E=10 M (10X15X30)	20/12/2022		en proceso
1,4	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO Y ARMADA DE ESTRUCTURA (INCLUYE ACERO DE LA	20/12/2022		en proceso
1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA(3000 P.S.I) E= 0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	20/12/2022		en proceso
1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	20/12/2022		en proceso
1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO	20/12/2022		en proceso
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2"	20/12/2022		en proceso
1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA DE FONDO DEL LECHO FILTRANTE CON PERFORACIONES DE 1"	20/12/2022		en proceso
1,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, CONCRETO DE 3000 P.S.I	20/12/2022		en proceso
1,11	CONSTRUCCIÓN CAJA DE 0,8X0,8X0,8 EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	20/12/2022		en proceso
1,12	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA TRAMPA DE GRASAS	20/12/2022		en proceso
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	20/12/2022		en proceso
1,14	TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 4"	20/12/2022		en proceso
	RECIBO DE OBRA A SATISFACCION	21/12/2022		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 787.668.159,00	61,73%	-18,58%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 550.646.232,00	43,16%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	1.080.290.331	Director de obra
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	83.116.819	Residente de obra
LEIDY KATHERINE SALAS ROJAS	1.080.290.676	Ingeniera ambiental
MIGUEL ANGEL FIGUEROA	18.103.698	Maestro de obra
OSCAR MARTIN GARRIDO	PT 5172249	Maestro de obra
ROBINSON GONZALEZ LOSADA	12.145.116	Maestro de obra
ANCIZAR QUEVEDO	7.694.836	Maestro de obra
EDUAR FERNANDO CABRERA	1.007.432.583	Ayudante de obra
FRANKLIN HERNANDEZ RAMOS	7.698.319	Ayudante de obra
HAROLD ENRIQUE CABRERA	1.006.995.036	Ayudante de obra
HERNANDO MORENO JARAMILLO	12.137.822	Ayudante de obra
JOSE VICENTE QUEVEDO	12.126.570	Maestro de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	25,0%	3
	TECNICO	2	3	16,7%	25,0%	5
	M.O/N.C	4	0	33,3%	0,0%	4
	TOTALES	**6**	**6**	**50,0%**	**50,0%**	**12**
	TOTAL	**12**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En la presente semana el contratista terminó un sistema séptico en el municipio de Suaza, actualmente se encuentran en proceso constructivo 29, de los cuales 13 son del municipio de Pitalito y se encuentran 4 en un 95%, 2 en un 15%, 1 en un 35% y 6 en un 9% de avance. Otros 3 sistemas se encuentran en proceso constructivo en el municipio de Suaza en un 80% de avance. En el municipio de Acevedo se encuentran intervenidos 5 sistemas, 2 en un 5%, 2 en un 30% y uno en el 80% de avance. En el municipio de Garzón se inició proceso contructivo con 8 sistemas sépticos. Hasta la fecha se han intervenido 137 sistemas sépticos de la totalidad contractual. También se realizaron visitas para verificar condiciones iniciales de los predios de los beneficiarios en el municipio de Palestina y continuaron entrega de materiales en el municipio de Acevedo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El 02 de noviembre de 2022 el contratista de obra presentó por escrito a la interventoría y a la Supervisión el plan de acción a implementar, incrementando los frentes de trabajo con el fin de mejorar rendimientos y el porcentaje de avance en obra; con el compromiso de reportar cada 8 días la gestión realizada para dar cumplimiento a lo propuesto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EXCAVACION PARA POZO - VERONICA MORENO - ACEVEDO



CAJILLA DE INSPECCION - KELLY JOHANA ROJAS - PITALITO



CAJILLA DE INSPECCION - LUIS OCTAVIO TITIMBO - PITALITO



SISTEMA SEPTICO TERMINADO - MILCIADES MUÑOZ - PITALITO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR CONTRATO No.184 DE 2022 (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.26	CONTRATO DE OBRA No.346 DE 2021

PROYECTO: Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría distrito regional de manejo integrado y humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE (FA) - Profesional Especializado SGA Supervisor CAM Contrato No.184 de 2022	
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO (EM) - Director de Obra	
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría.	

II. OBJETO

Seguimiento semanal a la ejecución del contrato.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ manifiesta que a la fecha se encuentran intervenidos 125 sistemas sépticos en los municipios de Pitalito, La Argentina, Suaza y Acevedo, para un total de 107 terminados (95 en Pitalito, los 6 de La Argentina y 6 en Suaza) los otros sistemas se encuentran en proceso constructivo: 10 en el municipio de Pitalito, 3 en el municipio de Suaza y 5 en el municipio de Acevedo; se realizaron visitas técnicas prediales 9 de 10 en el municipio de La Plata, sin novedades.

EM informa que durante la semana se terminó 1 sistema séptico en Pitalito, se continuaron con la intervención de 18 sistemas sépticos: 10 en Pitalito, 3 en Suaza y 5 en Acevedo. Durante la semana las condiciones climáticas fueron lluvias permanentes en los municipios de intervención. También se continuó con la entrega de materiales en el municipio de Acevedo.

FA comunica con gran preocupación la situación de atraso que presenta el contrato, considerando que faltan aproximadamente 2 meses para su terminación, por lo que reitera al contratista de obra las directrices dadas a través de la interventoría de implementar las medidas que sean necesarias y definitivas para lograr culminar el número de sistemas en el plazo contractual y que sólo del contratista depende cumplir dicho propósito, para evitar alguna intervención radical por parte de la Entidad, si continúa sin evidenciar avances positivos en la ejecución.

EM insiste en la dificultad que ha tenido con respecto a la contratación de mano de obra, debido a que ha sido dificil encontrar personal que se comprometa 100% para la construcción de los sistemas, se ha vinculado personal y luego no se presentan a laborar, incluso se ha pagado más del valor para este tipo de actividades, por lo que se optó llevar personal de otros municipios como Neiva, Palermo y del Departamento del Caquetá, logrando así vincular durante la presente semana a 4 maestros; de manera que, continuará con el compromiso de seguir buscando más personal de otras zonas.

Dado que el atraso a la fecha sigue en aumento (40,90%) y que el contratista en el presente comité se compromete a mostrar resultados que favorezcan el avance significativo en la ejecución del contrato, CQ solicita que de manera puntual se entreguen resultados cada 8 días (lunes a las 3:00 pm) de las gestiones y acciones realizadas para evitar que continúe dicho atraso y pueda cumplir con la construcción de la totalidad de los sistemas en el plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2022.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.27	CONTRATO DE OBRA No.346 DE 2021

PROYECTO: Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría distrito regional de manejo integrado y humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE (FA) - Profesional Especializado SGA Supervisor CAM Contrato No.184 de 2022	
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO (EM) - Director de Obra	
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría.	Lindsay Daza S.

II. OBJETO

Seguimiento semanal a la ejecución del contrato.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

Según el compromiso del contratista de reportar los lunes la gestión realizada para mejorar rendimientos e incrementar el avance de obra, CQ manifiesta que el lunes 31 de octubre de 2022 el contratista presentó el estado actual por municipio de los grupos de trabajo con que cuenta y las actividades que se están ejecutando; a su vez, la manera como tiene programado incrementar los frentes de trabajo y conforme a eso presentar cada 8 días ante la Interventoría y Supervisión los resultados obtenidos de estas medidas a implementar.

De acuerdo a la reunión realizada el día lunes de la presente semana, que también tuvo la participación de las profesionales de apoyo a la Supervisión por parte de la CAM las ingenieras Yamileth Ortega Calderón y Adriana María Calderon, con el fin de informar sobre del estado actual de los sistemas construidos y los que presentan algunas no conformidades en el municipio de Pitalito; FA solicita al contratista de obra que en la reunión programada para el día 8 de noviembre se tenga por escrito la solución definitiva a estas observaciones.

CQ manifiesta que a la fecha se encuentran intervenidos 137 sistemas sépticos en los municipios de Pitalito, La Argentina, Suaza y Acevedo, para un total de 108 terminados (95 en Pitalito, los 6 de La Argentina y 7 en Suaza) los otros 29 sistemas se encuentran en proceso constructivo: 13 en el municipio de Pitalito, 3 en el municipio de Suaza, 5 en el municipio de Acevedo y 8 en el municipio de Garzón; se realizaron visitas técnicas prediales 10 de 10 en el municipio de Palestina, con 4 novedades porque no contaban con espacio para la construcción y una porque no cuenta con las conexiones por separado.

EM informa que durante la semana se terminó 1 sistema séptico en Suaza, se continuaron con la intervención de 29 sistemas sépticos: 3 en el municipio de Pitalito, 3 en el municipio de Suaza, 5 en el municipio de Acevedo y 8 en el municipio de Garzón. Durante la semana las condiciones climáticas fueron lluvias permanentes en los municipios de intervención. También se realizó entrega de materiales en Pitalito, Garzón y Acevedo.

EM informa que el día miércoles 02 de noviembre de los corrientes, presentó por escrito a la interventoría y a la Supervisión el plan de acción a implementar, de acuerdo a lo mencionado en reunión del 31 de octubre y a la gestión de contratación de personal que se logró realizar el día de ayer 01 de noviembre, con el fin de mejorar rendimientos y dar cumplimiento a la construcción de los sistemas en el plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022.

SGC-CP-14229-22
Neiva, octubre 24 de 2022

Ingeniero
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
RL Consorcio San Sebastián 11-11-2021
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No. 346 de 2021

Asunto: Solicitud Plan de Contingencia.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la ejecución del contrato en el asunto, las cuales han generado un atraso significativo en el avance de obra, manifestado mediante oficios y comités técnicos; se le reitera la entrega inmediata de un plan de contingencia en el cual se presenten las posibles alternativas para lograr un mejor rendimiento y avance en las actividades programadas y cumplir con el plazo contractual.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ - Interventoría

c.c. Ingeniero FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE – Supervisor Contrato 184 de 2022.

SGC-CP-14230-22
Neiva, octubre 25 de 2022

Ingeniero
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
RL Consorcio San Sebastián 11-11-2021
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No. 346 de 2021

Asunto: Comité técnico de obra.

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del contrato en la referencia, nos permitimos convocarlo a comité técnico el día viernes 28 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la CAM, con el fin de revisar programación de obra, avance, compromisos, aspectos técnicos y administrativos.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

Proyectó: Lindsay Daza Salgado.
Coordinadora HSEQ - Interventoría

c.c. Ingeniero FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE – Supervisor Contrato 184 de 2022.

SGC-CP-14231-22

LA SUSCRITA INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021** con NIT. 901.551.315-7, con representación legal de Eduar Mauricio Gordo Barreiro, en calidad de contratista de obra del contrato No.346 de 2021, cuyo objeto es "*adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado y Humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.*", tiene a fecha de 31 de octubre de 2022 los siguientes avances de obra:

Avance físico	**40,90%**
Avance financiero*	**24,18%**

*Acta parcial No.1

El avance físico desde el inicio se vio afectado por las condiciones climáticas en la zona de intervención y en los últimos periodos por la disposición de frentes de trabajo acorde al número de sistemas sépticos programados por semana.

Dado en Neiva, a los treintaiún (31) días del mes de octubre de 2022.

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
R.L SINCO LTDA - Interventoría

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24673534
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SINCO LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800195924	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 8 C 34 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@SINCOLTDA.COM	TELÉFONO	8623333
FAX	8667064	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	actualizada
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79142300	PRIMER APELLIDO	QUIZA	SEGUNDO APELLIDO	CAMACHO
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	ARTURO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$16.082.001		24673534

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-6530826	01	No	No	No	41	1	Fijo	COLONIA ALVAREZ JAIME	$1.100.000
CC-49609707	01	No	No	No	41	1	Fijo	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	$1.250.000
CC-55113957	01	No	No	No	41	1	Fijo	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	$2.000.000
CC-1020742526	01	No	No	No	41	1	Fijo	MORENO SEGURA JULIAN DAVID	$4.000.000
CC-79844756	01	No	No	No	41	20	Fijo	PINTO MARIN SIMEON	$1.800.000
CC-79142300	01	No	No	No	41	1	Fijo	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	$3.000.000
CC-12123533	01	No	No	No	41	1	Fijo	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	$1.432.000
CC-12193648	01	No	No	No	41	298	Fijo	TOVAR RIVERA ADOLFO	$1.500.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 6530826																													0		
CC - 49609707																													0		
CC - 49609707																						X	2022-10-08	2022-10-15					0		
CC - 55113957																													0		
CC - 1020742526																													0		
CC - 79844756																													0		
CC - 79142300																													0		
CC - 12123533																													0		
CC - 12193648																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 6530826	PORVENIR	30	$1.100.000	0.1600000	$176.000	$0	$0	$176.000	$0	$0	$0
CC - 49609707	PORVENIR	22	$916.667	0.1600000	$146.700	$0	$0	$146.700	$0	$0	$0
CC - 49609707	PORVENIR	8	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 55113957	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1020742526	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$20.000	$20.000	$0
CC - 79844756	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 79142300	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 12123533	COLFONDOS	30	$1.432.000	0.1600000	$229.200	$0	$0	$229.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12193648	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 6530826	SANITAS	30	$1.100.000	0.0400000	$44.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.100.000	2	0.0696000	$76.600
CC - 49609707	SANITAS	22	$916.667	0.0400000	$36.700	$0	0	$0	0	$0	22	$916.667	2	0.0696000	$63.900
CC - 49609707	SANITAS	8	$333.334	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	8	$333.334	2	0.0000000	$0
CC - 55113957	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0052200	$10.500
CC - 1020742526	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	2	0.0696000	$278.400
CC - 79844756	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	2	0.0696000	$125.300
CC - 79142300	SANITAS	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0052200	$15.700
CC - 12123533	SANITAS	30	$1.432.000	0.0400000	$57.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.432.000	2	0.0696000	$99.700
CC - 12193648	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	2	0.0696000	$104.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6530826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.100.000	0.0400000	$44.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-49609707	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$916.667	0.0400000	$36.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-49609707	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$333.334	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55113957	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020742526	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79844756	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79142300	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12123533	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.432.000	0.0400000	$57.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12193648	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.256.100	$0	$0	$20.000	$20.000	7	$8.900	$200	$200	$1.305.400
COLFONDOS	2	$517.200	$0	$0	$0	$0	7	$3.700	$0	$0	$520.900
COLPENSIONES	2	$800.000	$0	$0	$0	$0	7	$5.700	$0	$0	$805.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	$571.400	$0	0	$0	0	$0	$571.400	7	$4.100	$0	$575.500	$0	0	$0	$0	$575.500	$0	$0	$575.500
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	7	$600	$0	$72.600	$0	0	$0	$0	$72.600	$0	$0	$72.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$774.500	0	$0	$0	$774.500	7	$5.500	$780.000	0	$0	$7.800	$780.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$643.400	7	$4.600	$648.000
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$648.100
PENSIONES	3	$2.632.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$780.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$648.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.708.100
