	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 8	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **8** (Consecutivo) **DEL** **22 De octubre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **28 de octubre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

""CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.""

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: **GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ** (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900.372.215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: **S Y C INGENIERIA S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.509.427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	431,990,875.00
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	431,990,875.00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/9/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/1/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/1/2023

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/9/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022


SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CAMILA CORTES DAZA (Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

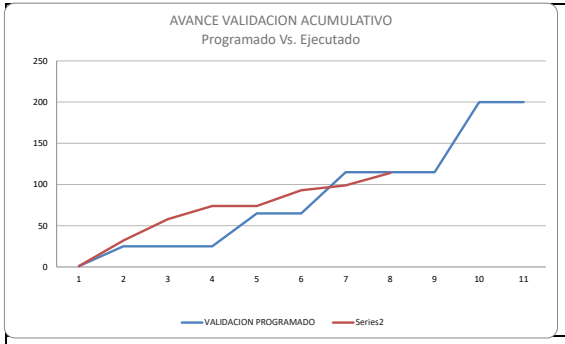

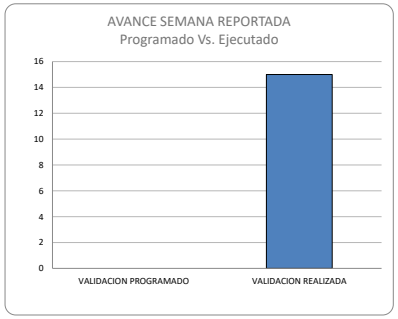

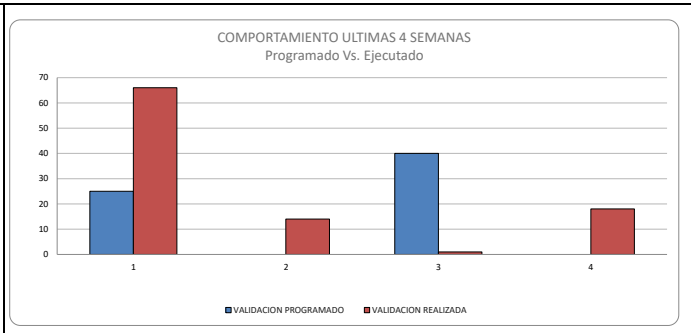

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
	115	**57,50**	**114**	**57,0**	**0**	**1**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
0	**15**	**15**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 5	Pros.	Ejecutado	**Semana 6**	Pros.	Ejecutado	**Semana 7**	Pros.	Ejecutado	**Semana 8**	Prog.	Ejecutado
	40	**1**		**0**	**18**		**50**	**6**		**0**	**15**


OBSERVACIONES:

Durante el periodo transcurrido del presente informe se evidencia que en las validaciones solo se presenta un atraso de una validación la cual será subsanada en la semana entrante mas sin embargo se solicitó al contratista la justificación del cambio de programación puesto que las siguientes viviendas MVAL_02039, MVAL_02100, MV_01670, MV_1279, MV_1293, MV_1299, MV_1649, MV_1660, MV_1668, MV_1669, MV_1693 no se han validado es decir estas viviendas fueron remplazadas en programación.


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)


(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

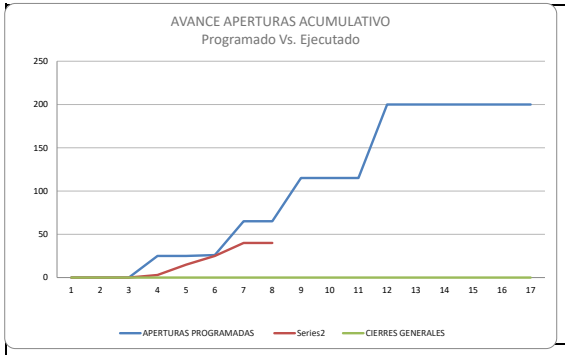

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

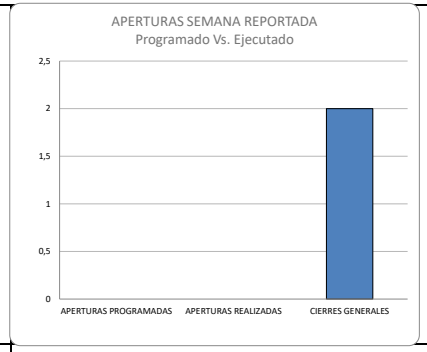

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

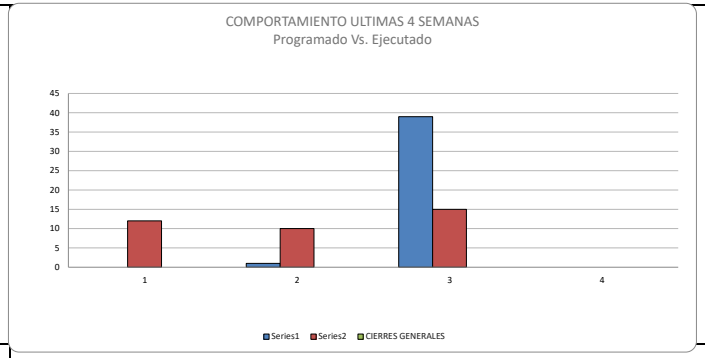

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo	Semana 5	Prog.	Ejecutado	Semana 6	Prog.	Ejecutado	Semana 7	Prog.	Ejecutado	Semana 8	Prog.	Ejecutado
Cantidad de Aperturas	65	0%	40	0%	0	25	0	0	0	0		0	12		1	10		39	15		0	0

OBSERVACIONES:

Durante la tapa de ejecución se presenta una demora en el inicio de ejecución de las siguientes viviendas MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02408, MVAL_02422, MVAL_02436, MVAL_02569, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02484, MV_1595, MV_1598, MVAL_01767, MVAL_01787, MVAL_01879, MVAL_01957, MVAL_01959, MVAL_01977, MVAL_01998, MVAL_02034, MVAL_02039, MVAL_02043, MVAL_02066, MVAL_02079, MVAL_02083, MVAL_02100, MVAL_02113, MVAL_02121, MVAL_02366, esto se debe según lo manifestado por el contratista por falta de material mas sin embargo se están desarrollado medidas pertinentes por parte del contratista para el cumplimiento del cronograma de obra


2.2.1. RESUMEN POR TECNICO

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	USME - CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validación		Ejecución					
					Validada	Por validar	En ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Álvaro Solano	USME - CIUDAD BOLIVAR	51	201	23	27	0	0	1	0	0	0
	Arq. Maritza Vega		50		32	18	16	0	0	16	1,25	0
	Arq. José Robayo		50		34	16	18	0	0	18	1,34	0
	Ing. Erick Veloza		50		25	25	6	2	0	4	1,48	2
subtotal				201	114	86	40	2	1	9,5	4,07	2

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

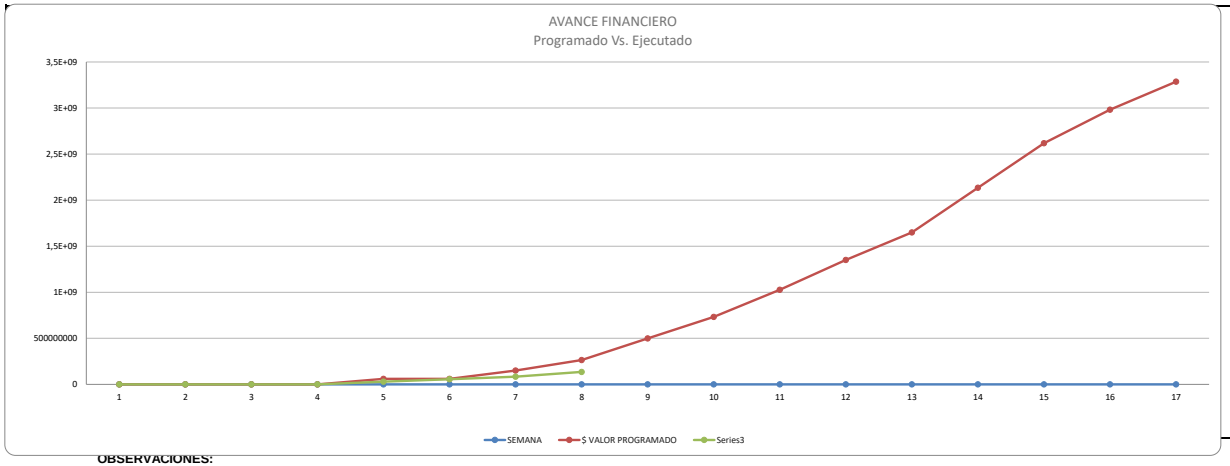

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 368.470.588,24		$ 40.458.271,21
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
10,35		1,14
INVERSION ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 672.882.352,94		$ 135.613.923,35
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
18,82		3,79
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($)	$ 537.268.429,59	ATRASO
ATRASO ADELANTE EN PRCENTAJE (%)	15,03	ATRASO

OBSERVACIONES:

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL				
SEMANA 2	MVAL_02589	Beneficiario: William González Llano Descripción caso: La mitad del predio fue vendido y solamente existe un poder notariado y autenticado en el que se estipula la compra y venta de esta parte. La prioridad dentro de la intervención en el mejoramiento de la vivienda es el cambio de cubierta por sus condiciones y porque el material de la teja es asbesto, por cuánto se requiere definir si existe la posibilidad de que se cambie solo el área de la cubierta de la cual es propietario el beneficiario con el fin de que se pueda invertir el resto del presupuesto en la parte interna de la vivienda y no exista ningún inconveniente durante la ejecución y la entrega de obra.	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
	MVAL_01977	Beneficiario: Víctor Hernán Rodríguez Al realizar la visita de validación se encontró que la vivienda está separada por un muro, el beneficiario no es el dueño del predio, ya que manifiesta que el predio está sin desenglobar pero la vecina que hace parte de la otra parte acepta el mejoramiento. Es caso especial por esta razón y por qué las actividades de mejora se comparten, ya que la prioridad es cambio de cubierta. Se avalará que el muro ya estaba levantado para la asignación del subsidio	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
SEMANA 1	MVJE_068	El día 6 de octubre por medio del comité de obra , se oficializa la entrega de dicho MV perteneciente al territorio de Ciudad Bolívar con nombre de beneficiaria María Leída Bernal Mosca con numero de cedula 26512299 donde la SDHT entrega por medio de acta el expediente en físico con 51 folios en reemplazo de la renuncia MVJE_807	Se realiza verificación recepción por parte de la interventoría con la respectiva verificación donde , le refiere la información al contratista para adelante y agilice la gestión con el MV en mención.	
	MVJE_1000	María del Carmen Alfonso. Se realiza acercamiento al predio según agenda del contratista y con el fin de dar cumplimento a compromiso del comité, se informa que en dicha visita se evidencia que la Sra. María no ha adecuado y desocupado los espacios de la vivienda (se presenta acumulación de enseres), de hecho, no deja ingresar al predio, se atiende desde la ventana, seguido a esto, se estable una segunda visita para el día 25 de octubre del 2022 en el transcurso del día.	No se logra establecer acuerdos con al Sra. María. Se esta en proceso de constricción el respectivo informe contado y soportando la gestión realizada tanto de obra e interventoría.	
	MVJA_1405	César Cruz Molano. Se realiza acercamiento al predio debido a programación según oficio de correspondencia, en dónde no se evidencia nadie en el predio, no sé obtiene contacto con el hijo o el beneficiario; Se realiza acercamiento vecinal donde se levanta acta de compromiso, además se establece contacto telefónico con el beneficiario quien indica que no está cerca al predio.	No se logra establecer acuerdos . Se esta en proceso de constricción el respectivo informe contado y soportando la gestión realizada tanto de obra e interventoría.	
	MVAL_1555	Rosalba Narváez de Meléndez. Se realiza acercamiento para visita de validación el día 26 de octubre del 2022, donde los profesionales técnicos y sociales ingresan al predio, y se evidencia que desde la visita de estructuración se contempló intervención en dos predios independientes con un solo chip. Esta situación se genera porque el predio tiene dos propietarios quienes son hermanos. Durante esta visita de Validación la beneficiaria manifestó que actualmente se encuentran en un proceso de des englobe legal. Y aclara que desde la visita de estructuración se había contemplado intervención de cubierta, información que fue verificada en la revisión del expediente. Durante el tiempo transcurrido entre esta visita y la de validación, se evidencia que la beneficiaria realizó una instalación de una nueva cubierta, de aproximadamente 5 meses debido a la necesidad del predio. Por otro lado, se realiza contacto telefónico con la hermana de la beneficiaria, quien es la propietaria del predio del lado a quien se le contempló también intervención y tiene conocimiento sobre el mejoramiento de vivienda, el predio en la actualidad esta es un proceso constructivo de segundo y tercer tipo.	Se solicita mencionar en comité de obra.	

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizando a medida que se vayan realizado actividades frente a caso (ir adicionando semanalmente)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL			
SEMANA X	MVJE_807	El 19 de septiembre del 2022 el señor Ariel Quintana del sector de Jerusalén del la Localidad de Ciudad Bolívar firma la renuncia, el día 22 de septiembre del 2022 por medio del comunicado HÁBITAT-S&C INTER-ADMI-011 remisión de una renuncia , la en mención. Por motivo "No le gustan los materiales "	El 22 de septiembre se realiza radicación por medio del Número : 1-2022-40057 donde se adjunta la renuncia y respectiva justificación puesto que el propietario y padre del beneficiario manifestaron obtener el recurso económico (subsidio en efectivo), por lo cual , desde el contratista e interventoría se realiza dos visitas de seguimiento donde se explica el detalle de la regulación y la realización del mismo.
SEMANA X			

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizando a medida que se vayan realizado actividades frente a caso (ir adicionando semanalmente)

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL				
SEMANA X				
SEMANA X				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizando a medida que se vayan realizado actividades frente a caso (ir adicionando semanalmente)
En todo caso se deberá adjuntar el documento "Matriz Seguimiento PQRS - por interventoría."

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:	
Gestión Administrativa	1) se solicito al contratista un cronograma semanal para poder hacer un mejor seguimiento en conjunto
Gestión social	El 24 de octubre del 2022, se realiza la postulación de siete mejoramientos de vivienda del sector de Ciudad Bolívar. Durante la semana del 24 al 29 de octubre del 2022. Se realiza revisión de la matriz social cualitativa y cuantitativa del contrato 993 del 2022 Grupo 3. El 28 de octubre de 2022, se recibe observaciones sobre el documento de postulación de las historias de vida para enviar al contratista y hacer la respectiva subsanación

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 8	0 M3	Por el momento no se han generados escombros	
MES	2		
SECTOR			

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 8	0 M3	Por el momento no se han generado residuos peligrosos
MES	2	
SECTOR		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			52	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		PERSONAL OBRERO	7	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					14

9. ANEXOS

Registro Fotográfico

								
Visita de validación casa #116 MVAL_1471 Camilo Ortiz Mora.	Se realizó visita al beneficiario Milton González Rodríguez, MVAL_02039. Casa # 38. Se deja formato de renuncia con la esposa del beneficiario, al evidenciar nulo interés por el mejoramiento							

3. XXXXXXXX

4. XXXXXXXX

5. XXXXXX

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los

veintiocho	28	días del mes del	OCTUBRE	de	2022
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en letras)		(Año de firma del informe)

Nombre: (Nombre) ING. Pedro Beltrán

Cargo: Director de Interventoría

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA 8

CONSULTORÍA

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 3

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ

Contrato de Obra	993 del 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022"	Fecha de Terminacion	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte

S Y C INGENIERIA S.A.S

Contrato de interventoría	1010 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022."	Fecha de Terminacion	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (431,990,875.00) M/Cte

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION				EJECUCION				CIERRE		DIRECCION	NOMBRE
			PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	REAL		
1	MVAL_02252	EJECUCION	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34	13-oct	15	1-nov		KR 7B ESTE 108 53 SUR	ORLINDA JURADO GARZON
2	MVAL_02253	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	19-oct	9	1-nov		KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON
3	MVAL_02339	EJECUCION	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34	5-oct	23	1-nov		KR 7F ESTE 108 27 SUR MJ	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN
4	MVAL_02347	EJECUCION	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34	5-oct	23	1-nov		KR 7F ESTE 108 53 SUR	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ
5	MVAL_02356	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7G ESTE 108 52 SUR	GRACIELA MARTINEZ CAÑON
6	MVAL_02363	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7G ESTE 108 28 SUR MJ 1	ANA HILDA BUSTOS GAONA
7	MVAL_02403	EJECUCION	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34	5-oct	23	1-nov		KR 7I ESTE 108 41 SUR	MARIA INES BONILLA MORALES
8	MVAL_02408	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 63 SUR	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO
9	MVAL_02409	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	32	1-nov		CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
10	MVAL_02410	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	5-oct	23	1-nov		CL 109 SUR 7I 18 ESTE	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN
11	MVAL_02422	VALIDADA	16-sep	12	19-sep	3	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 36 SUR	JUDITH IBAGUE VILLALBA
12	MVAL_02436	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 108 29 SUR	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA
13	MVAL_02466	ENTREGADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	32	1-nov	28-oct	KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ
14	MVAL_02470	EJECUCION	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34	6-oct	22	1-nov		KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	ORVEIN QUINTERO
15	MVAL_02493	ENTREGADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	32	1-nov	28-oct	KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO
16	MVAL_02506	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	13-oct	15	1-nov		CL 109 SUR 7B 09 ESTE	OLGA EDIT MORENO MORENO
17	MVAL_02511	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	13-oct	15	1-nov		KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	VICTOR GABRIEL CONTRERAS
18	MVAL_02527	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	19-oct	9	1-nov		KR 7D ESTE 109 15 SUR	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO
19	MVAL_02530	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	5-oct	23	1-nov		KR 7D ESTE 109 29 SUR	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ
20	MVAL_02569	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7H ESTE 109 13 SUR	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO
21	MVAL_02572	EJECUCION	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34	10-oct	18	1-nov		CL 109 SUR 7H 23 ESTE	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO
22	MVAL_02575	EJECUCION	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34	3-oct	25	1-nov		KR 7H ESTE 109 18 SUR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO
23	MVAL_02585	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 109 24 SUR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA
24	MVAL_02589	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 109 31 SUR	WILIAN GONZALEZ LLANO
25	MVAL_02590	EJECUCION	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34	21-oct	7	1-nov		KR 8 ESTE 109 37 SUR	LUZ YAMILE MARIN

26	MVAL_02484	VALIDADA	3-oct	11	12-sep	-21	14-oct	34			17-nov		KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	LUIS EDUARDO MORA
27	MV_1595	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		CL 105A SUR 7B 54 ESTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA
28	MV_1598	VALIDADA	4-oct	11	28-sep	-6	15-oct	34			18-nov		CL 105 SUR 7B 05 ESTE	GILBERTO JUNCO CICUA
29	MVAL_01739	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	19-oct	9	18-nov		CL 108 SUR 7B 16 ESTE	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ
30	MVAL_01767	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	ALFONSO BOGOTA MORENO
31	MVAL_01768	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		KR 7C ESTE 107 39 ESTE	HERMENCIA MONSALVE MEJIA
32	MVAL_01787	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 105A 09 SUR	EVELIO CAICEDO ROBAYO
33	MVAL_01876	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	CLARA INES HERNANDEZ TORRES
34	MVAL_01879	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 106 62 SUR	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ
35	MVAL_01890	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	13-oct	15	18-nov		KR 7I ESTE 106 47 SUR	ROSA ELENA CAMACHO CELIS
36	MVAL_01894	EJECUCION	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		KR 7I ESTE 106 63 SUR	HERMELINDA BARBOSA PINZON
37	MVAL_01902	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	13-oct	15	18-nov		KR 7I ESTE 106 44 SUR	BLANCA YANETH ANZOLA
38	MVAL_01913	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	13-oct	15	18-nov		KR 8 ESTE 106 53 SUR	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA
39	MVAL_01914	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	12-oct	16	18-nov		KR 8 ESTE 106 57 SUR	VICTOR MANUEL YATE YATE
40	MVAL_01915	EJECUCION	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34	12-oct	16	18-nov		KR 8 ESTE 106 61 ESTE	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ
41	MVAL_01957	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 17 SUR	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO
42	MVAL_01959	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 29 SUR	JOSE MIGUEL MORENO PARADO
43	MVAL_01977	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 54 SUR	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON
44	MVAL_01990	EJECUCION	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		KR 7I ESTE 107 08 SUR	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA
45	MVAL_01998	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	MARLENI LADINO DE LOPEZ
46	MVAL_02015	EJECUCION	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		KR 7H ESTE 107 54 SUR	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ
47	MVAL_02017	EJECUCION	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34	5-oct	23	18-nov		KR 7H ESTE 107 44 SUR	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ
48	MVAL_02034	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 13 SUR	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES
49	MVAL_02039		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 33 SUR	MILTON GONZALEZ RODRIGUEZ
50	MVAL_02043	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 55 SUR	CAROLINA CARRILLO
51	MVAL_02066	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	YAZMIN GARCIA VARGAS
52	MVAL_02079	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 55 ESTE	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ
53	MVAL_02083	VALIDADA	4-oct	11	10-oct	6	15-oct	34			18-nov		CL 108 SUR 7F 22 ESTE	MARIA HERCELIA CAPERA
54	MVAL_02089	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	5-oct	23	18-nov		KR 7F ESTE 107 46 SUR	FROILAN RUIZ BELTRAN
55	MVAL_02096	EJECUCION	4-oct	11	10-oct	6	15-oct	34	20-oct	8	18-nov		KR 7F ESTE 107 20 SUR	ROSAURA PATRON SOLANO
56	MVAL_02098	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	6-oct	22	18-nov		CL 107 SUR 7F 13 ESTE	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS
57	MVAL_02100		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7F 21 ESTE	ANGELICA MARIA TAUTIVA POVEDA
58	MVAL_02113	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 64 SUR	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ
59	MVAL_02114	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	6-oct	22	18-nov		KR 7D ESTE 107 60 SUR	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ
60	MVAL_02115	EJECUCION	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34	21-oct	7	18-nov		KR 7D ESTE 107 54 SUR	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ
61	MVAL_02121	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 30 SUR	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA
62	MVAL_02165	EJECUCION	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34	12-oct	16	18-nov		KR 7D ESTE 107 23 SUR	ROMULO LOZANO
63	MVAL_02166	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	6-oct	22	18-nov		KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	ARGELIA GUTIERREZ DURAN
64	MVAL_02169	EJECUCION	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34	19-oct	9	18-nov		KR 7D ESTE 107 43 SUR	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS
65	MVAL_02366	VALIDADA	4-oct	11	14-sep	-20	15-oct	34			18-nov		KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARINA MOTTA MEDRANO
66	MV_01277	VALIDADA	21-oct	12	27-oct	6	2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 04 SUR	ANA ELVIA GALINDO DUARTE

67	MV_01288	VALIDADA	21-oct	12	27-oct	6	2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 58 SUR	RUBY ESTHELA GOMEZ REYES
68	MV_01581	VALIDADA	21-oct	12	20-oct	-1	2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7 32 ESTE	ROSALBA VARGAS VARGAS
69	MV_01670		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 102 SUR 7D 11 ESTE	CARLINA PINEDA DE CAMELO
70	MV_01680	VALIDADA	21-oct	12	20-oct	-1	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 24 ESTE	RAMON BUSTAMANTE TARAZONA
71	MV_1279		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 14 SUR	JOAN SEBASTIAN PRECIADO VANEGAS
72	MV_1292	VALIDADA	21-oct	12	27-oct	6	2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7A 14 ESTE	JULIA ESTHER VANEGAS NOVOA
73	MV_1293		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 39 SUR	ROSA DELIA CASTELLANOS ARIZA
74	MV_1299		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 15 SUR	ANGELICA MARIA ORDOÑES FERNANDEZ
75	MV_1301	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 03 SUR	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ
76	MV_1316	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 103 05 SUR	LUIS ARNULFO PARADA NIÑO
77	MV_1317	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 51 SUR	ANA SILVIA RIVEROS GARZON
78	MV_1322	VALIDADA	21-oct	12	18-oct	-3	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 33 SUR	MARIBEL CASTRO MANRIQUE
79	MV_1323	VALIDADA	21-oct	12	19-oct	-2	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 29 SUR	BIBIANA ANGELICA MONROY
80	MV_1324	VALIDADA	21-oct	12	19-oct	-2	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 25 SUR	JULIO ALBERTO MORENO CRUZ
81	MV_1325	VALIDADA	21-oct	12	18-oct	-3	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 21 SUR	JOSE SANTOS TIQUE TIQUE
82	MV_1327	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 11 SUR	RODRIGO AREVALO AREVALO
83	MV_1336	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		TV 7D ESTE 100 33 SUR	VICTOR HUGO CAMPO ESPITIA
84	MV_1338	VALIDADA	21-oct	12	13-oct	-8	2-nov	34			6-dic		TV 7D ESTE 100 29 SUR	LUZ MARINA AMAYA ALEY
85	MV_14679	VALIDADA	21-oct	12	1-oct	-20	2-nov	34			6-dic		CL 101 SUR 7D 29 ESTE	ESPERANZA LIZARAZO ARCINIEGAS
86	MV_1470	VALIDADA	21-oct	12	25-oct	4	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7 40 ESTE	ALBA GLADYS VELOZA CASTRO
87	MV_1611	VALIDADA	21-oct	12	26-sep	-25	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 77 ESTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA
88	MV_1612	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 70 ESTE	NEYLA VARGAS
89	MV_1614	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 58 ESTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ
90	MV_1635	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		KR 7D ESTE 103 17 SUR	JUAN ISIDRO LOPEZ
91	MV_1638	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7B 26 ESTE	MARGARITA MARTIN CARDENAS
92	MV_1649		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 102 SUR 7D 34 ESTE	OMAR ESLAVA
93	MV_1655	VALIDADA	21-oct	12	13-oct	-8	2-nov	34			6-dic		CL 101 SUR 7D 11 ESTE	JOSE HECTOR LESMES
94	MV_1660		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 42 ESTE	DORIS ADRIANA OCHOA YAZO
95	MV_1668		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 12 ESTE	DIVA CARVAJAL CHILITO
96	MV_1669		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 06 ESTE	GLORIA PEÑALOZA GOMEZ
97	MV_1676	VALIDADA	21-oct	12	14-oct	-7	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 52 ESTE	ALIRIO URRUTIA CHAGUENDO
98	MV_1677	VALIDADA	21-oct	12	10-oct	-11	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 42 ESTE	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ
99	MV_1682	VALIDADA	21-oct	12	12-oct	-9	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 18 ESTE	RAMIRO MEDINA BOLAÑOZ
100	MV_1684	VALIDADA	21-oct	12	12-oct	-9	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 06 ESTE	AMALIA NARANJO MOLANO
101	MV_1685	VALIDADA	21-oct	12	28-oct	7	2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 05 ESTE	ANA FAYNED SANTAMARIA MURILLO
102	MV_1689	VALIDADA	21-oct	12	28-oct	7	2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 29 ESTE	JOSELIN BONILLA ACUÑA
103	MV_1690	VALIDADA	21-oct	12	28-oct	7	2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 35 ESTE	ROBINSON REYES HERNANDEZ
104	MV_1693		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 45 ESTE	LUZ MARY ALARCON
105	MV_1697	EJECUCION	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34	21-oct	7	6-dic		CL 105 SUR 7D 48 ESTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA
106	MV_1698	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 42 ESTE	EVANGELINA AMAYA ALEY
107	MV_1699	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 36 ESTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA

108	MV_1701	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 24 ESTE	CESAR GORDO BARRERO
109	MV_1705	VALIDADA	21-oct	12	10-oct	-11	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 08 ESTE	ELVIRA LOPEZ DIAZ
110	MV_1708	VALIDADA	21-oct	12	12-oct	-9	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 11 ESTE	OFELIA ALARCON ACEVEDO
111	MV_1711	VALIDADA	21-oct	12	10-oct	-11	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 35 ESTE	BLANCA NIEVES PEÑA DIAZ
112	MV_1716	VALIDADA	21-oct	12	12-oct	-9	2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 53 ESTE	LEONARDO FABIO OSORIO BARRAGAN
113	MV_1724	EJECUCION	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34	21-oct	7	6-dic		CL 105A SUR 7F 06 ESTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA
114	MV_1733	EJECUCION	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34	21-oct	7	6-dic		CL 105 SUR 7D 23 ESTE	ELCIRA SANTOS TINOCO
115	MV_1735	VALIDADA	21-oct	12	28-sep	-23	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 35 ESTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA
116	MV_01446	VALIDADA	8-nov	13	27-oct	-12	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 38 SUR	YANETH ROCIO MERCHAN
117	MV_01451		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 14 SUR	BLANCA LILIA CANTOR GAITAN
118	MV_01480	VALIDADA	8-nov	13	28-oct	-11	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 52 SUR	JULIO BARRETO ROJAS
119	MV_01507		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 69 SUR	FREDY ALEXANDER SANCHEZ GIRALDO
120	MV_01508		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 105 SUR 7 20 ESTE	SONIA RODRIGUEZ VALERO
121	MV_01541		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 33 SUR	ROSA AURA ROJAS BERNAL
122	MV_01549	VALIDADA	8-nov	13	28-oct	-11	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 53 SUR MJ	MYRIAM ELENA MERCHAN VILLAMIL
123	MV_1471	VALIDADA	8-nov	13	25-oct	-14	21-nov	33			24-dic		CL 105 SUR 7 36 ESTE	CAMILO ORTIZ MORA
124	MV_1476	VALIDADA	8-nov	13	26-oct	-13	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 68 SUR	ARSENIO RAMOS BERNAL
125	MV_1478	VALIDADA	8-nov	13	27-oct	-12	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 64 SUR	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ
126	MV_1483	VALIDADA	8-nov	13	27-oct	-12	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 38 SUR	NOREDIS RODRIGUEZ POLOCHE
127	MV_1485		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 32 SUR	EGMIDIO MARTINEZ MEDINA
128	MV_1487		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 16 SUR	JORGE GONZALEZ TRIVIÑO
129	MV_1499		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 29 SUR	ROSA ADELINA CASTAÑEDA PEREZ
130	MV_1545	VALIDADA	8-nov	13	28-oct	-11	21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 45 SUR	ESNEDA CASTAÑEDA VARGAS
131	MV_1555		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 69 SUR	ROSALBA NARVAEZ DE MELENDEZ
132	MV_42865-IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 18U BIS 67C 23 SUR	ERISINDA DURAN DE ECHEVERRI
133	MV_42881IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 63 SUR 18N 14	LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ
134	MV_42883IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 618P BIS A 69A SUR 16	CLARA ISABEL ALDANA
135	MV_42885IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 69 SUR 18N 70	FLOR ELISA ROMERO
136	MVBF_358		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27 G No. 73 D 71 SUR MJ	MARIA NELLY LOPEZ PEÑA
137	MVBF_360		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		K 27 G 73 D 95 SUR	JOSÉ DEL CARMEN MARTINEZ
138	MVBF_383		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 27H 73D 78 SUR	LEIDY VIVIANA GONZALEZ CARO
139	MVBF_403		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27F 73D 57 SUR	JOSE IGNACIO RIASCOS
140	MVBF_412		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27 G 73D 48 SUR	JORGE HUMBERTO MARÍN
141	MVBF_437		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS B SUR 27B 83	LIDA FLOR MONTENEGRO QUINTANA
142	MVBF_440		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS B SUR 27B 95	NOHEMY PINTO
143	MVBF_447		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS SUR 27B 93	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ
144	MVBF_453		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS SUR 27B 81	JOSE ANTONIO CHACON CHAVES
145	MVBF-0424		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 74B SUR 27F 10	CLAUDIA PATRICIA CHACON CHAVEZ
146	MVCB_4859	VALIDADA	8-nov	13	8-sep	-61	21-nov	33			24-dic		CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ
147	MVCB_5557		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 18Q BIS B 69 64 SUR	LUZ MARINA ZULUAGA OSORIO
148	MVJ_0003		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 48 73B 09 SUR	GLORIA YAMIL LEON PATIÑO

149	MVJ_0013		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 46A 76 35 SUR	MARIO EDGAR DIAZ MORENO
150	MVJ_0019		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 47A 76A 34 SUR	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ
151	MVJ_0024		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45 75A 55 SUR	MIRYAM CRUZ ARIZA
152	MVJ_0032		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 78 SUR 44B 24	MARGARITA HELENA BARON RODRIGUEZ
153	MVJ_0036		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44B 77 43 SUR	CLARA ROCIO RODRIGUEZ AGUDELO
154	MVJ_0044		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44B 78 24 SUR	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ
155	MVJ_0050		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44A BIS 79 10 SUR	LILIANA MARIA RODRIGUEZ DURAN
156	MVJ_0072		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 69F SUR 48 70	ANGELICA GIRALDO MURILLO
157	MVJ_0102		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 77 SUR 44 03 MJ	LUZ MARINA ESPITIA SALAZAR
158	MVJ_0103		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 47 69 B 39 SUR	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS
159	MVJ_0110		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 40 76 47 SUR	HURDIS CARTAGENA HERNANDEZ
160	MVJ_0115		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 48 69B 16 SUR MJ 2	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARCIA
161	MVJ_0116		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 69B SUR 47 31 MJ 3	GLADYS INES BASTOS
162	MVJ_0120		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44 76 39 SUR	HENRY VARGAS BARRETO
163	MVJ_0121		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82B SUR 46A 18	RODRIGO JIMENEZ SAENZ
164	MVJ_0122	VALIDADA	8-nov	13	14-sep	-55	21-nov	33			24-dic		CL 82A SUR 46A 37	RICAURTE GRAJALES
165	MVJ_0123		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45B 82C 09 SUR	MARIA ALCIRA NUÑEZ
166	MVJ_0124		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45 80B 21 SUR	EFREN PRIETO MATIZ
167	MVJ_0127		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44 77 22 SUR	EMILCE ALARCON DELGADO
168	MVJ_0128		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 44A 78A 87 SUR	RAFAEL PINZON SANCHEZ
169	MVJ_0131		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 79B SUR 42 44	ANA DELINA BAUTISTA POVEDA
170	MVJ_0132		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 42 80B 13 SUR	GLORIA YANET RODRIGUEZ RAYO
171	MVJ_0133		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 80A SUR 44A 12	HERMENCIA GACHA CALLEJAS
172	MVJ_0136		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82C BIS SUR 44B 19	YAMILE SANDOVAL LUGO
173	MVJ_0138		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 41 76 76 SUR	MIRIAM LOAIZA CHICO
174	MVJ_0139		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 80B SUR 40 24 MJ	WENDY MICHEL CUASTUMAL
175	MVJ_0140		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82C BIS SUR 44 A 52 MJ	RUBY SOLEY ALZATE ORTIZ
176	MVJ_0141		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 39 79A 62 SUR	MARIA SERGINA AGUIRRE TORO
177	MVJ_0142		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82 SUR 44A 49 MJ 1	ABEL MATEUS RUIZ
178	MVJ_0143		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 80A SUR 45 49	AMPARO ROMERO RODRIGUEZ
179	MVJ_137		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 78 SUR 43 05	MARIA HERMENCIA PAEZ DE JIMENEZ
180	MVJA_1405		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 65 SUR 18R 42	CESAR CRUZ MOLANO
181	MVJE_1000		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 46A 82A 35 SUR	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA
182	MVJE_807	RENUNCIA											KR 45A 75A 55 SUR	ARIEL QUITIAN MATEUS
183	MVPA_0133		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71I SUR 27K 03	CARMENZA JUTINICO ROJAS
184	MVPA_0502		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CLL 71P SUR 27J 10	JOSE FERLEIN AMADO BERNAL
185	MVPA_0529		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71K 26 SUR	AURA MARIA SEPULVEDA CORONADO
186	MVPA_1009		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 72	GILDA IRLEY CASTILLO SERRANO
187	MVPA_1066		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H SUR 27L 34 MJ 1	LUZ AMPARO PARRA ROSAS
188	MVPA_1205		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 81 SUR	ELSA MARIA VERA PORTELA
189	MVPA_1226		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27J 71D 15 SUR	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO ROMERO

190	MVPA_1244		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 70 SUR	MARIA DORAIDA CARRILLO LOPEZ
191	MVPA_1298		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71I SUR 27N 34	ANA BEATRIZ CHAVES ZAMBRANO
192	MVPA_142		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71K SUR 27K 16	OLGA LUCIA BENITEZ FLORIAN
193	MVPA_144		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71K SUR 27K 22	JOSE MARTIN DIAZ
194	MVPA_156		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27L 71I 28 SUR MJ	CRUZ QUITORA CAPERA
195	MVPA_1909		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 58 SUR	JAIME MURILLO ROJAS
196	MVPA_1995		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71F BIS A SUR 27L 61	MARINELA MIRANDA PIÑEROS
197	MVPA_915		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71J SUR 27N 52	MARIA BELLA AVILA ANZOLA
198	MVPA_973		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 75	MARIA JACQUELINE GUEVARA ORDUÑA
199	MVPA_985		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 17	EMILIO CARO QUINTERO
200	MVTT_0320		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 73I 75B 25 SUR	MARIA MYRIAM MAHECHA CAMACHO

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS EN EJECUCION	NUMERO DE VIVIENDAS POR INICIAR OBRAS	NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS	NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR	NUMERO DE VIVIENDAS FACTURADA	NUMERO DE VIVIENDAS REMPLAZADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
201	**114**	**86**	**38**	**160**	**2**	**198**	**0**	**1**	**1**
