ACTA PARCIAL 4	CONTRATO DE OBRA No: 1874 de 2022 Fecha: Noviembre 5 de 2022 Objeto: ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD Contratista: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Interventor: RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL	ACTA DE OBRA No. 4 VALOR: $ 36,123,230

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 4		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
1	PRELIMINARES								
ITE025	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	35.00	$ 32,000	$ 1,120,000	63.59	2,034,880	101.54	3,249,280
ITE967	Demolición baldosa	M2	62.00	$ 4,000	$ 248,000		0	51.53	206,120
ITE077	Demolición enchape y/o revoque	M2	15.00	$ 5,400	$ 81,000		0	6.77	36,558
ITE006	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape	M2	3.00	$ 10,800	$ 32,400		0	25.25	272,700
ITE008	Demolición manual de concreto	M3	0.32	$ 170,000	$ 53,550		0	13.23	2,249,100
ITE020	Desmonte de ventana metálicas o de madera	M2	9.65	$ 8,000	$ 77,184		0	6.58	52,640
ITE925	Desmonte reja metálica	M2	3.00	$ 9,000	$ 27,000		0	0.00	0
ITE021	Desmonte de puerta metálicas o de madera	M2	8.00	$ 13,000	$ 104,000		0	5.34	69,420
ITE921	Desmonte de tubería de alcantarillado hasta 12"	M	22.89	$ 7,600	$ 173,964		0	0.00	0
ITE099	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos	Un	1.00	$ 15,000	$ 15,000		0	1.00	15,000
ITE919	Desmonte luminarias	Un	6.00	$ 14,000	$ 84,000		0	11.00	154,000
ITE048	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	35.00	$ 13,000	$ 455,000	58.09	755,170	83.63	1,087,190
ITE063	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	7.00	$ 40,000	$ 280,000	7.15	286,000	51.81	2,072,400
2	Mampostería								
ITE254	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m	M2	8.00	$ 48,000	$ 384,000		0	4.84	232,320
3	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario								
ITE114	Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi)	Un	2.00	$ 420,000	$ 840,000	2.00	840,000	2.00	840,000
ITE115	Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi)	M	2.00	$ 550,000	$ 1,100,000	3.00	1,650,000	3.00	1,650,000
ITE116	Cono para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), incluye refuerzo	M	2.00	$ 450,000	$ 900,000	1.00	450,000	1.00	450,000
ITE117	Tapa en concreto reforzado de 20,7 Mpa (3000 psi) para cámara de inspección d = 0,60 m, incluye aro base y aro tapa	Un	2.00	$ 500,000	$ 1,000,000	1.00	500,000	1.00	500,000
ITE076	Lleno con arena para tubería conduit	M	22.89	$ 30,000	$ 686,700	16.00	480,000	16.00	480,000
ITE642	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado	M	22.89	$ 43,000	$ 984,270		0	0.00	0
ITE334	Lavamanos tipo Acuacer de colgar con grifería	Un	1.00	$ 215,000	$ 215,000		0	1.00	215,000
ITE337	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	Un	1.00	$ 280,000	$ 280,000		0	1.00	280,000
ITE341	Orinal blanco tipo Residencial con grifería	Un	1.00	$ 915,000	$ 915,000		0	1.00	915,000
ITE565	Sanitario tipo Trevi con grifería antivandálica	Un	1.00	$ 720,000	$ 720,000		0	0.00	0
ITE560	Lavamanos de pared tipo push	Un	1.00	$ 260,000	$ 260,000	1	260,000	1.00	260,000
4	Instalaciones eléctricas y luminarias								
ITE1006	Acometida en cable 4 No. 12 THHN AWG en tubería EMT 3/4" + accesorios	ml	30.00	$ 42,000	$ 1,260,000		0	0.00	0
ITE720	Revisión punto eléctrico	Un	5.00	$ 6,300	$ 31,500		0	43.00	270,900
ITE713	Salida toma doble con polo a tierra longitud promedio 6 m	Un	6.00	$ 128,000	$ 768,000		0	4.00	512,000

ACTA PARCIAL 4	CONTRATO DE OBRA No: 1874 de 2022 Fecha: Noviembre 5 de 2022 Objeto: ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD Contratista: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Interventor: RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL	ACTA DE OBRA No. 4 VALOR: $ 36,123,230

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 4		ACUMULADO	
ITE704	Salida interruptor sencillo longitud promedio 4.5 m	Un	4.00	$ 97,000	$ 388,000		0	3.00	291,000
ITE705	Salida interruptor doble longitud promedio 4,5 m	Un	2.00	$ 105,000	$ 210,000		0	0.00	0
ITE702	Salida eléctrica alumbrado incandescente no incluye lámpara, longitud promedio 6 m	Un	4.00	$ 115,000	$ 460,000		0	6.00	690,000
ITE709	Lámpara incandescente de 150 W (bombillo)	Un	7.00	$ 1,387	$ 9,709		0	0.00	0
6	Pisos y acabados								
ITE223	Mortero de nivelación e = 0,05 m	M2	244.00	$ 31,000	$ 7,564,000		0	18.54	574,740
ITE260	Piso en cerámica de 1ra. de 32 x 32 cm tipo Terranova trafico 4	M2	244.00	$ 62,000	$ 15,128,000		0	279.17	17,308,540
ITE813	Guarda escobas en cerámica tipo Ecocerámica h = 0.08 m	M	120.00	$ 14,000	$ 1,680,000		0	159.97	2,239,580
ITE221	Enchape en cerámica de 1ra. de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo	M2	5.00	$ 67,000	$ 335,000		0	6.75	452,250
ITE234	Granito pulido para paso de escalera h = 0,30 ch = 0,175 m	M2	12.00	$ 160,000	$ 1,920,000		0	0.00	0
ITE300	Estuco y pintura muros 3 manos	M2	55.00	$ 30,000	$ 1,650,000		0	468.52	14,055,600
ITE363	Pintura y resane con vinilo cielo raso, incluye dilataciones y filos	M2	200.00	$ 23,000	$ 4,600,000		0	90.20	2,074,600
ITE303	Pintura con esmalte 3 manos	M2	440.00	$ 16,000	$ 7,040,000		0	35.96	575,360
ITE374	Pintura con esmalte estructura metálica	M2	40.00	$ 26,000	$ 1,040,000		0	0.00	0
ITE990	Cielo falso en lamina de PVC importado incl estructura aluminio omegas y perfiles, remate contra pared, tornillos y andamios	M2	60.00	$ 90,000	$ 5,400,000		0	0.00	0
ITE215	Revoque muro incluye dilataciones y filos	M2	20.00	$ 30,000	$ 600,000		0	26.59	797,700
ITE995	Revoque muro impermeabilizado incluye dilataciones y filos	M2	50.00	$ 33,000	$ 1,650,000	17.40	574,200	44.28	1,461,240
ITE284	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara incluye pintura	M2	14.00	$ 65,000	$ 910,000		0	2.29	148,850
ITE272	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras incluye pintura	M2	22.05	$ 100,000	$ 2,205,000		0	30.07	3,007,000
ITE376	Pintura transparente protectora de fachadas para muro en bloques o ladrillo, incluye filos y dilataciones	M2	50.00	$ 22,000	$ 1,100,000		0	0.00	0
ITE338	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	50.00	$ 26,000	$ 1,300,000		0	0.00	0
6	Puertas, ventanas y rejas								0
ITE400	Puerta de madera, marco en lámina C 20 de 0,9 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	Un	2.00	$ 400,000	$ 800,000		0	0.00	0
ITE402	Puerta en lámina C 20 0,80 x 2,05 m, incluye Anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	2.00	$ 600,000	$ 1,200,000		0	0.00	0
ITE403	Puerta en lámina C 20 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	2.00	$ 650,000	$ 1,300,000		0	0.00	0
ITE405	Puerta en lámina C 20 1,20 x 2,05 m (2 naves), incluye anticorrosivo, pintura, chapa tipo portón, manija y tope	Un	1.00	$ 830,000	$ 830,000		0	0.00	0
ITE266	Puerta en ángulo y malla eslabonada para cerramiento, incluye manija, pasador, anticorrosivo y pintura	M2	6.00	$ 380,000	$ 2,280,000		0	0.00	0
ITE419	División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación todo costo	M2	2.16	$ 345,000	$ 745,200		0	0.00	0
ITE424	Pasamanos en tubería de H. G. de 2", incluye accesorios	M	3.00	$ 265,000	$ 795,000	2.00	530,000	2.00	530,000
ITE409	Ventana en aluminio anoloc, incluye vidrio de 4 mm	M2	13.65	$ 295,000	$ 4,026,160		0	15.84	4,672,800
ITE348	Reja panal de abeja de 0,60 x 1,20 m	M2	5.94	$ 110,000	$ 653,400		0	0.00	0
7	Estructuras metálicas y en concreto								

ACTA PARCIAL 4	CONTRATO DE OBRA No: 1874 de 2022 Fecha: Noviembre 5 de 2022 Objeto: ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD Contratista: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Interventor: RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL	ACTA DE OBRA No. 4 VALOR: $ 36,123,230

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA 4		ACUMULADO	
ITE991	Estructura metalica en perlin doble incluye anticorrosivo y pintura de acabados	Kg	85.00	$ 16,000	$ 1,360,000		0	0.00	0
ITE282	Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,15 m	Un	32.00	$ 14,000	$ 448,000		0	98.00	1,372,000
ITE178	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	M	8.00	$ 80,000	$ 640,000		0	2.20	176,000
ITE177	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	5.50	$ 90,000	$ 495,000		0	0.00	0
ITE122	Zanja colectora en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) a = 0,30 e = 0,10 h = 0,30 m	M	20.00	$ 110,000	$ 2,200,000		0	0.00	0
	Obras Adicionales								
AD1	Mortero de nivelación espesor promedio 0,08 m	M2		$ 43,083			0	255.26	10,997,367
AD2	Desmonte tableros electrico	und		$ 39,068			0	2.00	78,136
AD3	Breacker a 120/240 V - 15, 20, 30 AMP	und		$ 32,191			0	7.00	225,337
AD4	Demolición de placa entrepiso concreto y madera	M2		$ 18,913			0	24.75	468,097
AD5	Viga en concreto de 20,7 Mpa	M3		$ 772,995			0	0.00	0
AD6	Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	KG		$ 6,650		163.39	1,086,544	736.59	4,898,324
AD7	Placa maciza en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	M2		$ 107,082			0	25.53	2,733,803
AD8	Encorozado en cubierta	ml		$ 9,735			0	52.20	508,167
AD9	Limpieza de canales en concreto existentes	ml		$ 3,273			0	37.20	121,756
AD10	Limpieza y raspado paredes	ml		$ 4,942			0	476.10	2,352,886
AD11	Impermeabilización de cubierta con SikaFill Power 12	m2		$ 24,057				0.00	0
AD12	Tuberia pvc novafort Ø= 315 mm	ml		$ 168,261			0	0.00	0
AD13	Sanitario push para baño PMR	und		$ 730,708		1.00	730,708	1.00	730,708
AD14	Barra de seguridad plegable para baño	und		$ 798,629			0	0.00	0
AD15	Barra de seguridad 18" para baño	und		$ 242,999			0	0.00	0
AD16	Limpieza de superficies con hidrolavadora	m2		$ 3,233			0	179.55	580,485
AD17	Acabado grano lavado para escalera (PASO)	ml		$ 90,314			0	22.22	2,006,777
AD18	Puerta metalica con pasador seccion 0.95x1.75m	und		$ 360,000			0	1.00	360,000
AD19	Estuco muros para pintura esmalte	m2		$ 15,000			0	35.96	539,400
AD20	Suministro e instalacion de tablero bifasico de 12 ctos, incluye cable de cobre #12 para la prologacion de circuitos, conectores de resorte R/Y, accesorios de fijacion para el tablero	Un		$ 250,000			0	1.00	250,000
AD21	Suministro e instalacion de tomacorriente levinton con tapa tipo intemperie incluye tomacorriente leviton y tapa tipo intemperie y accesorios de instalacion	Un		$ 85,000			0	5.00	425,000
AD22	Suministro e instalacion de panel led de 18 w para iluminacion del piso 2 incluye panel led y accesorios de instalacion	Un		$ 125,000		-6.00	-750,000	0.00	0
AD23	Piso en color mineral escobeado	m2		$ 35,000			0	0.00	0
AD24	Fachaleta	m2		$ 70,000			0	0.00	0
AD25	Afirmado compactado e = 0.10 m manual	m2		$ 7,500			0	139.12	1,043,400
AD26	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.07 m, incluye acabado con helicoptero, corte y sello de dilataciones	m2		$ 84,785		82.49	6,993,901	82.49	6,993,901
AD27	Muro en sb 6mm 2 caras, incluye estructurado y pintura	m2		$ 170,000		17.32	2,944,400	17.32	2,944,400
AD28	Tuberia sanitaria 6" pvc	ml		$ 95,000		16.00	1,520,000	16.00	1,520,000
AD29	Tuberia sanitaria 3" pvc	ml		$ 40,000			0	18.00	720,000
AD30	Escalon en concreto para pasos	m3		$ 614,200		0.17	104,414	0.17	104,414

ACTA PARCIAL 4	CONTRATO DE OBRA No: 1674 de 2022 Fecha: Noviembre 5 de 2022 Objeto: ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD Contratista: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Interventor: RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL	ACTA DE OBRA No. 4 VALOR: $ 36,123,230

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA 4		ACUMULADO	
AD31	Estuco bajo placa de entrepiso	m2		$ 26,000			0	27.10	704,600
AD32	Suministro e instalacion de tapas ciegas 2x4 y/o octogonales, incluye tapa ciega pvc color blanco y accesorios de instalaciones	un		$ 9,000			0	5.00	45,000
AD33	Suministro e instalacion de plafones plasticos, incluye plafon y elementos de fijacion	un		$ 15,000			0	2.00	30,000
AD34	Suministro e instalacion de canaleta plastica de 10x10 adhesiva	ml		$ 16,000			0	2.00	32,000
AD35	Suministro e instalacion tapa registro pvc 15x15	und		$ 15,000		2.00	30,000	2.00	30,000
AD36	Suministro e instalacion circuito electrico en tuberia pvc 1/2", incluye tuberia, cable de cogre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG	ml		$ 28,000		22.00	616,000	22.00	616,000
AD37	Suministro e instalacion tuberia pvc para red de comunicaciones	ml		$ 18,000			0	0.00	0
AD38	Cuneta y resalto en concreto para acceso	ml		$ 110,000		6.80	748,000	6.80	748,000
AD39	Puerta de madera entamborada con marco en lámina C 20. ancho maximo hasta 0,75m, altura maxima hasta 2,0 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	Un	2.00	$ 420,000		1.00	420,000	1.00	420,000
AD40	Puerta en lámina C 20 ancho variable hasta 0,80 m, altura hasta 2,00 m, incluye marco con anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	2.00	$ 600,000		1.00	600,000	1.00	600,000
AD41	Puerta en lámina C 20, ancho entre 0.85 y 0,90 m, altura maxima 2,0 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	2.00	$ 650,000		1.00	650,000	1.00	650,000
AD42	Puerta en lámina con marco C 20, seccion 1.2 x 2,0 m, fijo 0.2m, puerta ancho 1 m baño pmr. Incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	1.00	$ 830,000		1.00	830,000	1.00	830,000
AD43	Zanja colectora en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) a = 0,30 e variable 0.5 y 0,10 h total = 0,30 m	ml		$ 90,000		26.70	2,403,000	26.70	2,403,000
AD44	Boca puertas en grano natural ancho entre 10 y 25 cms.	ml		$ 28,000		3.28	91,840	3.28	91,840
AD45	Carteras en mortero	ml		$ 15,000		7.15	107,250	7.15	107,250
AD46	Suministro e instalacion de panel led de 12 a 18 w para iluminacion del piso 2 incluye panel led y accesorios de instalacion	und		$ 85,000		7.00	595,000	7.00	595,000
AD47	Suministro e instalacion de luminaria tipo tortuga para pasillo hacia baño de primer piso	und		$ 89,000		1.00	89,000	1.00	89,000

SUBTOTAL		$ 86,058,037	$ 28,170,306.00		$ 115,090,935.00
ADMINISTRACION	23.23%	$ 19,992,648	$ 6,544,409.00		$ 26,737,448
IMPREVISTOS	0.00%	$ -	$ -		$ -
UTILIDAD	5.00%	$ 4,302,902	$ 1,408,515.00		$ 5,754,547
TOTAL		$ 110,353,585	$ 36,123,230		$ 147,582,930

ACTA PARCIAL 4	CONTRATO DE OBRA No: 1874 de 2022 Fecha: Noviembre 5 de 2022 Objeto: **ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA** Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD Contratista: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Interventor: RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL	**ACTA DE OBRA No. 4** VALOR: **$ 36,123,230**

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	ACTA 4	ACUMULADO

VALOR DEL ACTA: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

BALANCE CONTRATO		
Vr. contrato		$ 155,353,584
Vr. actas anteriores	$ 111,459,701	
Vr. presente acta	$ 36,123,230	
Saldo por ejecutar	$ 7,770,654	
SUMAS IGUALES	**$ 155,353,585**	**$ 155,353,584**

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	ITE025	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	UNID.	M3	UBICACIÓN	







Descripción	Dimensiones alto	ancho	long	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
excavacion para tuberia sanitaria	1.20	2.75	18.00	1.00	59.40	59.40
Excavacion zanja colectora	0.45	0.30	31.00	1.00	4.19	63.59
Subtotal						63.59
Vienen						
TOTAL						63.59

OBSERVACIONES:

PREACTA 01	13.35	PREACTA 04	63.59				
PREACTA 02	12.19	PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	12.41	PREACTA 06				101.54	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	ITE048	Lleno compactado con material del sitio manual	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Descripción	Dimensiones espesor	ancho	long	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
excavacion para tuberia sanitaria	1.20	2.75	18.00	1.00	59.40	59.40
Menos diametro de tuberia	- 1.00	1.00	18.00	0.07	-1.31	58.09
Subtotal						58.09
Vienen						
TOTAL						58.09

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	58.09				
PREACTA 02	25.54	PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				83.63	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	ITE063





Retiro de material sobrante cargue manual — UNID. M3

Descripción	Dimensiones VOL	AREA	ESP	EXP	Medida Total	Acumulado Medidas
Cantidades de acta 4						
Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	63.59			1.30	82.67	82.67
menos llenos	-58.09			1.30	-75.52	7.15
Subtotal						7.15
Vienen						
TOTAL						7.15

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	7.15				
PREACTA 02	9.39	PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	35.27	PREACTA 06				51.81	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE 114	Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi)	UNID.	und	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
camara 1				1.00	1.00	1.00
camara 2				1.00	1.00	2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						2.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	2.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				2.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE 115	Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi)	UNID.	ML	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones				Medida Total	Acumulado Medidas
	largo	ancho	alto	cant		
camara 1			1.50	1.00	1.50	1.50
camara 2			1.50	1.00	1.50	3.00
Subtotal						3.00
Vienen						
TOTAL						3.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	3.00			ACUMULADO ITEM	
PREACTA 02		PREACTA 05				3.00	
PREACTA 03		PREACTA 06					

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE 116	Cono para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), incluye refuerzo	UNID.	ML	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
camara 1			1.00	1.00	1.00	1.00
Subtotal						0.00
Vienen						
TOTAL						0.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				0.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE 117	Tapa en concreto reforzado de 20,7 Mpa (3000 psi) para cámara de inspección d = 0,60 m, incluye aro base y aro tapa	UNID.	UND	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
camara 1				1.00	1.00	1.00
Subtotal						0.00
Vienen						
TOTAL						0.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				0.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N° 1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE 076	Lleno con arena para tubería conduit	UNID.	M	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones				Medida Total	Acumulado Medidas
	largo	ancho	alto	cant		
TUBERIA ENTRE CAMARAS 1 Y 2	16.00			1.00	16.00	16.00
Subtotal						16.00
Vienen						
TOTAL						16.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	16.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				16.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Redes - aparatos sanitarios - hidrosanitario	ITEM	ITE660	Lavamanos de pared tipo push	UNID.	UND	UBICACIÓN	





Descripción	Dimensiones				Medida Total	Acumulado Medidas
	largo	ancho	alto	cant		
lavamanos de pared en baño pmr				1.00	1.00	1.00
Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	1.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				1.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	PISOS Y ACABADOS	ITEM	ITE 995

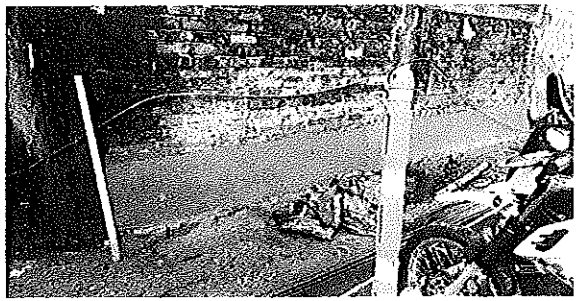



Revoque muro impermeabilizado incluye dilataciones y fios

UNID.	M2	UBICACIÓN	

Descripción	Dimensiones				Medida Total	Acumulado Medidas
	largo	ancho	alto	cant		
PATIO EXTERIOR	29.00	0.60			17.40	17.40
Subtotal						17.40
Vienen						
TOTAL						17.40

OBSERVACIONES:

PREACTA 01	21.60	PREACTA 04	17.40				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	5.28	PREACTA 06				44.28	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4


CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	Puertas, ventanas y rejas	ITEM	ITE 424	Pasamanos en tubería de H. G. de 2", Incluye accesorios	UNID.	ml	UBICACIÓN	

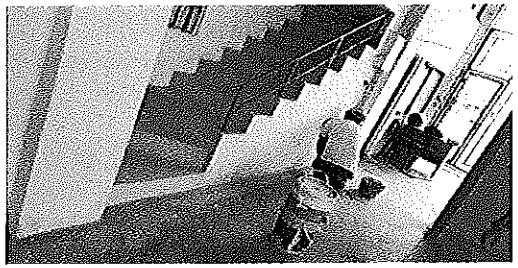



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
pasamanos en escalera de primer a segundo piso	2.00			1.00	2.00	2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						2.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	2.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				2.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	NO PACTADOS	ITEM	AD6





Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa — UNID. kg — UBICACIÓN

Descripción	Dimensiones LONG	cant	Diam	PESO	TOTAL	Medida Total	Acumulado Medidas
cuerpo de camara y tapas	6.00	19.00	1/2"	1.00	114.00	114.00	114.00
	4.20	21	3/8"	0.56	49.39	49.39	163.39
Subtotal							163.39
Vienen							
TOTAL							163.39

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	163.39				
PREACTA 02	462.82	PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	110.38	PREACTA 06				736.59	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA. INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD13	Sanitario push para baño PMR	UNID.	UNO



Descripción	Dimensiones CANT	largo	alto	Medida Total	Acumulado Medidas
BAÑO PMR PRIMER PISO	1.00			1.00	1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	1.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				1.00	

Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA. INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N° 1674 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD22

Suministro e instalacion de panel led de 18 w para iluminacion del piso 2 incluye panel led y — UNID. UND

Descripción	Dimensiones CANT	largo	alto	Medida Total	Acumulado Medidas
MENOS COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	-6.00			-6.00	-6.00
Subtotal					-6.00
Vienen					
TOTAL					-6.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	-6.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				-6.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	NO PACTADOS	ITEM	AD26	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.07 m, incluye acabado con helicoptero, corte y sello de dilataciones	UNID.	M2	UBICACIÓN	







Descripción	Dimensiones				Medida Total	Acumulado Medidas
	largo	ancho	alto	cant		
PLACA CONTRAPISO 7CM	11.30	7.30		1.00	82.49	82.49

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	PISOS Y ACABADOS	ITEM	AD 27	Muro en sb 6mm 2 caras, incluye estructurado y pintura	UNID.	M2	UBICACIÓN	

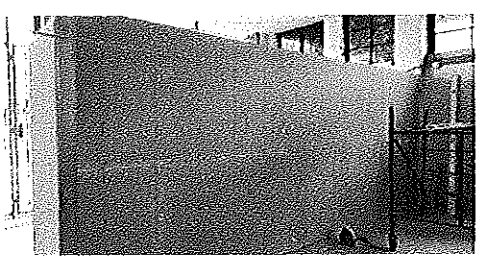





Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
muro interno division acceso	5.90	2.44		1.00	14.40	14.40
	0.60	2.44		2.00	2.93	17.32
Subtotal						17.32
Vienen						
TOTAL						17.32

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	17.32				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				17.32	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1674 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 28	Tuberia sanitaria 6" pvc	UNID.	ML	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
tuberia entre camaras	16.00			1.00	16.00	16.00
Subtotal						16.00
Vienen						
TOTAL						16.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	16.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				16.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA


CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 30	Tuberia sanitaria 6" pvc	UNID.	ML	UBICACIÓN	









Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
Escalones para salida a patio	0.90	0.30	0.18	1.00	0.05	0.05
	0.90	0.50	0.18	1.00	0.08	0.13
escalon para entrada oficina posterior en segundo piso	0.90	0.25	0.18	1.00	0.04	0.17
Subtotal						0.17
Vienen						
TOTAL						0.17

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	0.17				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				0.17	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 35







Suministro e instalacion tapa registro pvc 15x15 — UNID.: UND — UBICACIÓN:

Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
baño segundo piso				1.00	1.00	1.00
baño pmr primer piso				1.00	1.00	2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						2.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	2.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				2.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1074 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 36	Suministro e instalacion circuito electrico en tuberia pvc 1/2", incluye tuberia, cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG	UNID.	ml	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
General	11.00			1.00	11.00	11.00
	4.00			1.00	4.00	15.00
	7.00			1.00	7.00	22.00
Subtotal						22.00
Vienen						
TOTAL						22.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	22.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				22.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N° 1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 38





Cuneta y resalto en concreto para acceso — UNID.: m

Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	UBICACIÓN cant	Medida Total	Acumulado Medidas
acceso a patio interior	6,80			1,00	6,80	6,80
Subtotal						6,80
Vienen						
TOTAL						6,80

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	6,80			ACUMULADO ITEM	
PREACTA 02		PREACTA 05				6,80	
PREACTA 03		PREACTA 06					

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N° 1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 43	Zanja colectora en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) a = 0,30 e variable 0.5 y 0,10 h total = 0,30 m	UNID.	ml	UBICACIÓN	





Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
patio	26,70			1,00	26,70	26,70
Subtotal						26,70
Vienen						
TOTAL						26,70

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	26,70			
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM
PREACTA 03		PREACTA 06				26,70

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO Nº	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 39	Puerta de madera enlamborada con marco en lámina C 20. ancho maximo hasta 0,75m, altura maxima hasta 2,0 m, incluye antioxrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	UNID.	UND	UBICACIÓN	





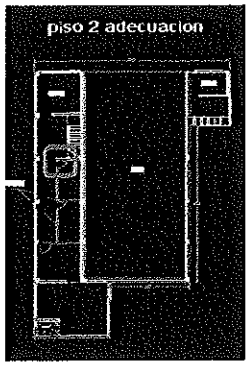

Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
Oficinas segundo piso				1.00	1.00	1.00
Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	1.00			
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM
PREACTA 03		PREACTA 06				1.00

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 40	Puerta en lámina C 20 ancho variable hasta 0,80 m, altura hasta 2,00 m, incluye marco con anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	UNID.	UND	UBICACIÓN	



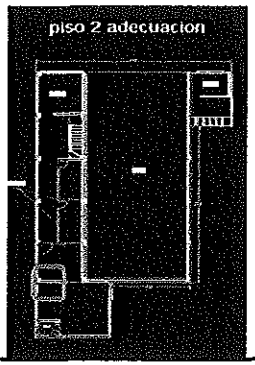

Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
Puerta acceso a oficina posterior en segundo piso				1.00	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	1.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				1.00	

Subtotal								1.00
Vienen								
TOTAL								1.00

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 41	Puerta en lámina C 20, ancho entre 0.85 y 0,90 m, altura maxima 2,0 m, induye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	UNID.	UND	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
Puerta de salida a patio primer piso				1.00	1.00	1.00
Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04					
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	1.00	PREACTA 06				1.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA

FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 42	Puerta en lámina con marco C 20, seccion 1.2 x 2,0 m, fijo 0.2m, puerta ancho 1 m baño pmr. Incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	UNID.	UND	UBICACIÓN	



Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
Puerta de salida a patio primer piso				1.00	1.00	1.00
Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04					
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03	1.00	PREACTA 06				1.00	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 44	Boca puertas en grano natural ancho entre 10 y 25 cms	UNID.	ml	UBICACIÓN	





Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
oficina primer piso	0.90	0.20		1.00	0.90	0.90
oficina primer piso contigua a patio	0.95	0.15		1.00	0.95	1.85
pasillo patio interior hacia auditorio	1.43	0.30		1.00	1.43	3.28
Subtotal						3.28
Vienen						
TOTAL						3.28

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	3.28				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				3.28	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoría

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA.
INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD 45

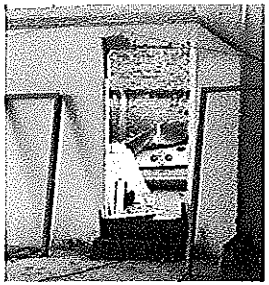



Carteras en mortero — UNID. ml — UBICACIÓN

Descripción	Dimensiones largo	ancho	alto	cant	Medida Total	Acumulado Medidas
baño pmr	2.20	0.20		1.00	2.20	2.20
salida a patio	2.18	0.15		1.00	2.18	4.38
	0.91	0.15		2.00	1.82	6.20
oficina contigua a patio	0.95	0.15		1.00	0.95	7.15
Subtotal						7.15
Vienen						
TOTAL						7.15

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	7.15				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				7.15	

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA. INGENIERO CIVIL


PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	6	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA


CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD22	Suministro e instalación de panel led de 12 a 18 w para iluminación del piso 2 incluye panel led y accesorios de instalación	UNID.	UND









Descripción	Dimensiones CANT	largo	alto	Medida Total	Acumulado Medidas
Oficina de guardas primer piso	3.00			3.00	3.00
oficina comandante segundo piso	1.00			1.00	4.00
hall pasillo hacia oficina posterior segund	2.00			2.00	6.00
hall acceso a escaleras tercer piso	1.00			1.00	7.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	7.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				7.00	

Subtotal											7.00
Vienen											
TOTAL											7.00

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoría

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Municipio de Dosquebradas

ACTA PARCIAL 4

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA. INGENIERO CIVIL

PREACTA DE OBRA


FECHA	DD	5	MM	11	AA	22	ACTA No	4	ELABORÓ	ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE OPERATIVA DE AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA

CONTRATO N°	1874 DE 2022

CAPÍTULO	OBRAS ADICIONALES	ITEM	AD22







Suministro e instalacion de luminaria tipo tortuga para pasillo hacia baño de primer piso — UNID. UND

Descripción	Dimensiones CANT	largo	alto	Medida Total	Acumulado Medidas
PASILLO HACIA BAÑOS EN PRIMER PISO	1.00			1.00	1.00

OBSERVACIONES:

PREACTA 01		PREACTA 04	1.00				
PREACTA 02		PREACTA 05				ACUMULADO ITEM	
PREACTA 03		PREACTA 06				1.00	

Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						1.00

INTERVENTORIA

RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL
Interventoria

JUAN DAVID ALZATE
APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Contratista

CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA
Ingeniera Residente de obra
