	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **993 del 2022**

(Número de Contrato) (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

""CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.""

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ** **NIT** 900.372.215-7

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: **S Y C INGENIERIA S.A.S** **NIT** 830.509.427-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	431,990,875.00
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	431,990,875.00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

(Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)


CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

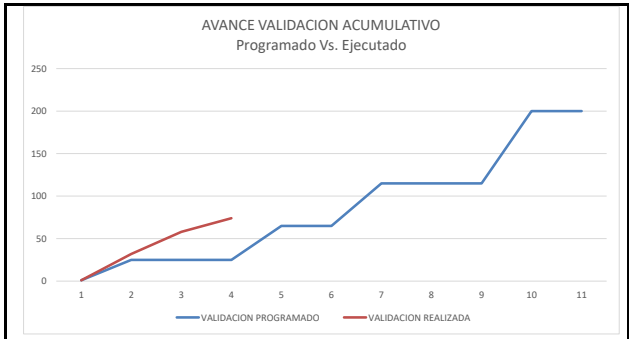

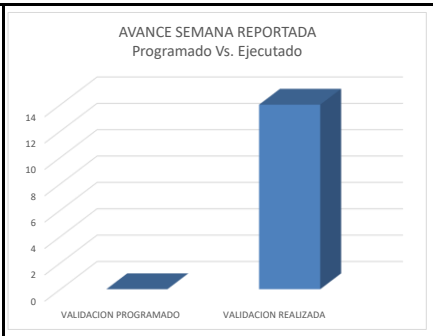

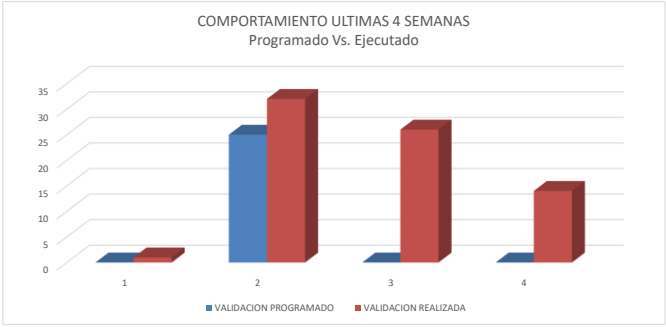

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
	25	12,50	74	37,0	49	0

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
0	14	14	0

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 1	Prog.	Ejecutado	Semana 2	Prog.	Ejecutado	Semana 3	Prog.	Ejecutado	Semana 4	Prog.	Ejecutado
	0	1		25	33		0	26		0	14

OBSERVACIONES:

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 **DEL** 1 de septiembre de 2022 **AL** 30 de septiembre de 2022

Consecutivo | dd-mm-aa | dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

VALIDACIONES.

8 SEP: MVCB_4859.
12 SEP: MVAL_02253, MVAL_02409, MVAL_02410, MVAL_02466, MVAL_02493, MVAL_02506, MVAL_02511, MVAL_02527, MVAL_02530, MVAL_02484.
13 SEP: MVAL_02403, MVAL_02436, MVAL_02575, MVAL_02590.
14 SEP: MVAL_02339, MVAL_02347, MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02408, MVAL_02470, MVAL_02569, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02366, MVJ_0122.
15 SEP: MVAL_02252, MVAL_02572, MVAL_01977, MVAL_01998, MVAL_02015, MVAL_02043, MVAL_02113.
19 SEP: MVAL_02422, MVAL_01957, MVAL_01959, MVAL_02017, MVJE_807.
20 SEP: MVAL_01739, MVAL_01767, MVAL_01768, MVAL_02034, MVAL_02066, MVAL_02079, MVAL_02089, MVAL_02098, MVAL_02114, MVAL_02166, MVAL_02169.
21 SEP: MVAL_01876, MVAL_01890, MVAL_01902, MVAL_01913, MVAL_01914, MVAL_01915, MVAL_02121.
23 SEP: MVAL_01879, MVAL_01894, MVAL_01990.
26 SEP: MV_1595, MVAL_01787, MVAL_02115, MVAL_02165, MV_1611.
28 SEP: MV_1598, MV_1301, MV_1612, MV_1614, MV_1697, MV_1698, MV_1699, MV_1701, MV_1724, MV_1733, MV_1735.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)


(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS


MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

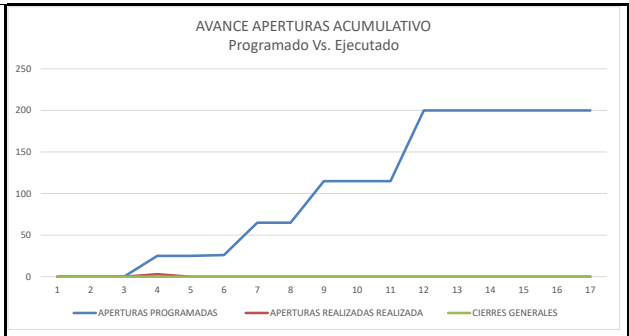



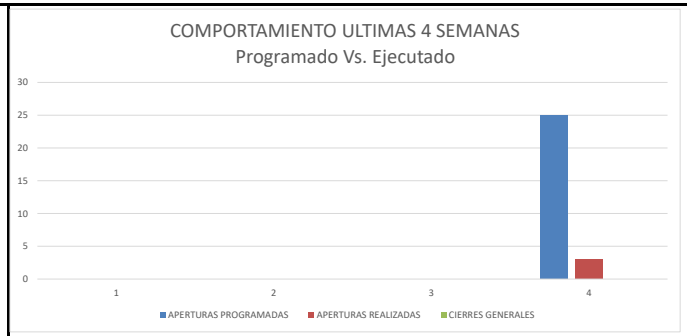

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
Cantidad de Aperturas	**25**	**0%**	**3**	**0%**	**0**	**22**

Avnace semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
25	**3**	**0**	**22**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 1	Prog.	Ejecutado	**Semana 2**	Prog.	Ejecutado	**Semana 3**	Prog.	Ejecutado	**Semana 4**	Prog.	Ejecutado
	0	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**25**	**3**

OBSERVACIONES: **A LA FECHA SE TIENE UN ATRAZO EN 22 VIVIENDAS QUE NO SE HAN APERTURADO PUESTO QUE SE DEBERIAN TENER 25 PERO SOLO SE APERTURARON 3 LAS VIVIENDAS POR APERTURAR SON LAS SIGUIENTES:**

MVAL_02252, MVAL_02253, MVAL_02339, MVAL_02347, MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02403, MVAL_02408, MVAL_02410, MVAL_02422, MVAL_02436, MVAL_02470, MVAL_02506, MVAL_02511, MVAL_02527, MVAL_02530, MVAL_02569, MVAL_02572, MVAL_02575, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02590

VIVIENDAS QUE SE HAN APERTURADO SON: el 26 de septiembre del 2022 se aperturaron las siguientes viviendas : MVAL_02409 (15%), MVAL_02466 (20%), MVAL_02493 (0%)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo | dd-mm-aa | dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa


CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

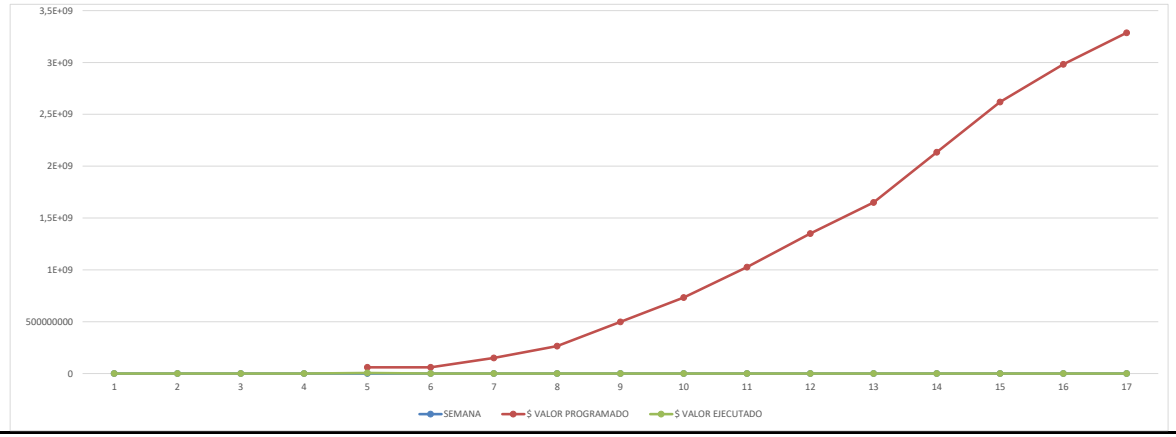

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		**$ 5,292,830,7**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		**0,14%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		$ 5,292,830,7
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		0,14%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): **$ 21177757,53% ATRAZO**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **0,59% ATRAZO**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

El porcentaje de avance de las siguientes viviendas aperturadas el 26 de septiembre del 2022 es el siguiente: MVAL_02409 (15%), MVAL_02466 (20%), MVAL_02493 (0%)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **993 del 2022**

(Número de Contrato) (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA 2	MVAL_02589	Beneficiario: William González Llano Descripción caso: La mitad del predio fue vendido y solamente existe un poder notariado y autenticado en el que se estipula la compra y venta de esta parte. La prioridad dentro de la intervención en el mejoramiento de la vivienda es el cambio de cubierta por sus condiciones y porque el material de la teja es asbesto, por cuánto se requiere definir si existe la posibilidad de que se cambie solo el área de la cubierta de la cual es propietario el beneficiario con el fin de que se pueda invertir el resto del presupuesto en la parte interna de la vivienda y no exista ningún inconveniente durante la ejecución y la entrega de obra.	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
	MVAL_01977	Beneficiario: Victor Hernán Rodriguez Al realizar la visita de validación se encontró que la vivienda está separada por un muro, el beneficiario no es el dueño del predio, ya que manifiesta que el predio está sin desenglobar pero la vecina que hace parte de la otra parte acepta el mejoramiento. Es caso especial por esta razón y por qué las actividades de mejora se comparten, ya q la prioridad es cambio de cubierta. Se avalará que el muro ya estaba levantado para la asignación del subsidio	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
ANA 1				

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMA				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO			
SEMANA X	MVJE_807	El 19 de septiembre del 2022 el señor Ariel Quintana del sector de Jerusalén del la Localidad de Ciudad Bolívar firma la renuncia, el día 22 de septiembre del 2022 por medio del comunicado HÁBITAT-S&C INTER-ADMI-011 remisión de una renuncia , la en mención. Por motivo "No le gustan los materiales "	El 22 de septiembre se realiza radicación por medio del Numero : 1-2022-40057 donde se adjunta la renuncia y respectiva justificación puesto que el propietario y padre del beneficiario manifestaron obtener el recurso económico (subsidio en efectivo), por lo cual , desde el contratista e interventoría se realiza dos visitas de seguimiento donde se explica el detalle de la regulación y la realización del mismo.
SEMANA X			

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMANA X				
SEMANA X				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)
En todo caso se deberá adjuntar el documento "Matriz Seguimiento PQRS - por interventoria."

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:	
Gestión Administrativa	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-TEC-017 Remisión Cronograma de obra del grupo 3.
	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-016 Remisión de informe semanal de interventoria No 3.
	el 29 de septiembre se envio al contratsita el comunicado HABITAT-S&CINTER-TEC-018 ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA -GRUPO 3.

5. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

DISPOSICIÓN RCD M3		**ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorizació)**	**No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA**
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generados escombros	
MES	**1**		
SECTOR			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		**CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA**		
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generado residuos peligrosos		
MES	**1**			
SECTOR				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**	

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						**INTERVENTORIA**					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**6**	**CAPACITACONES REALIZADAS**	**13**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**	**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**	**3**	**CAPACIONES REALIZADAS**	**3**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			**31**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**9**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**	**CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA**					**12**
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**N/A**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**						

7. ANEXOS

1. INFORME MENSUAL AMBIENTAL

	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

MENSUAL No. **1** (Consecutivo) **DEL** **1 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

4. INFORME MENSUAL SST

5. INFORME MENSUAL AMBIENTAL

	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo | dd-mm-aa | dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los treinta (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes del septiembre (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)



Nombre: (Nombre) ING.Pedro Beltran

Cargo: Director de Interventoría
